	REPORTE SEMANAL SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.8496912 DE 2025							
DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS		**FORMATO:**	**INFORME SEMANAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**				
FECHA DE EMISIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2025				**HOJA:**		**DE**	
SEMANA N°	2	**DEL**	12 DE NOVIEMBRE	**AL**	20 DE NOVIEMBRE			
FECHA INICIO :	**31/10/2025**	**FECHA TERMINO :**	**15/12/2025**					

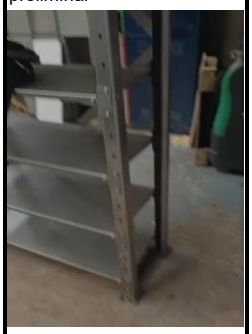
I. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

OBJETO DEL CONTRATO	**Adquisición e instalación de elementos de dotación para el archivo central de la Dirección General del SENA.**				
CONTRATISTA	**SYNERGY B&O S.A.S**	**NIT O C.C.**	**901.661.195-1**	**CONTRATO N°**	**CO1.PCCNTR.8496912 DE 2025**

II. RESUMEN ESTADO SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS

CAPITULO SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO	PORCENTAJE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO	ACTIVIDADES	MOTIVOS DE RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO
Adquisición, instalación y puesta en servicio de estanteria fija, cumpliendo con los requisitos tecnicos señalados en la ficha técnica "ESPECIFICACIONES ESTANTERIA 3M DE ALTURA"	5,00%	10,00%	Elaboración de piezas de estantería y presentación preliminar  	Posterior a la visita técnica realizada el martes 18 de noviembre, el contratista realiza ajustes solicitados por el apoyo a la supervisión del contrato: 1. Instalación de refuerzos en bandejas. 2. ajuste de dimensiones de bases de 10x10x4mm a 13x13x5mm 3. aseguramiento interno de bandejas con doble tornillo de 3/8" 4. Cambiar ultima bandeja por bandeja de 40mm acorde a especificaciones del proceso. 5. Cambio en asegurameinto de paneles de GRC de paneles de 1.5m a 0.5 m hasta cubrir los 3m acorde especificaciones pero ajsutado la longitud de secciones por facilidad de instalación.
Adquisición, instalación y puesta en servicio de de archivador de Planos Planoteca Horizontal.	0,00%	5,00%	Elaboración de piezas de planotecas	
Adquisición, instalación y puesta en servicio de de sensor termohigrometro (datalogger) para medición y registro de temperatura y humedad relativa (calibrable), en edificios y espacios cerrados	32,00%	32,00%	El contratista reporta que la ultima semana de noviembre se realizará entrega de los insumos.	
Adquisición, instalacion y puesta en servicio de deshumidificador industrial de e 300 a 320 PPD. Equipo portatil con ruedas, con ruedas para facilitar su traslado. Con bomba integrada, Reinicio automático, Pantalla digital, Control de humedad ajustable, Filtro lavable. Visualización en tiempo real de la temperatura de entrada y salida, humedad relativa.	32,00%	32,00%	El contratista reporta que la ultima semana de noviembre se realizará entrega de los insumos.	
Adquisición, instalación y puesta en servicio de Termonebulizador	32,00%	32,00%	El contratista reporta que la ultima semana de noviembre se realizará entrega de los insumos.	
TOTALES				

III. RESUMEN PORCENTAJES DE AVANCE FINANCIERO

REPORTE SEMANAL SEGUIMIENTO CONTRATO DE COMPRAVENTA CO1.PCCNTR.8496912 DE 2025

DEPENDENCIA	GRUPO DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS	**FORMATO:**	**INFORME SEMANAL DEL ESTADO DEL CONTRATO**				
FECHA DE EMISIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2025			**HOJA:**		**DE**	

SEMANA N°	2	**DEL**	12 DE NOVIEMBRE	**AL**	20 DE NOVIEMBRE

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	**VR.TOTAL CONTRATO**	**VR. TOTAL EJECUTADO**	**VR. POR EJECUTAR**	**AVANCE DE INVERSION**	**SEMANA**	**ACUMULADO**
	352.664.012,00	0,00	**352.664.012,00**		0,00%	0,00%

VI. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

El contratista informa que antes de finalizar el mes entregará los items 3 al 6. Posterior a la visita técnica realizada el martes 18 de noviembre, el contratista realiza ajustes solicitados por el apoyo a la supervisión del contrato:

1. Instalación de refuerzos en bandejas.

2. ajuste de dimensiones de bases de 10x10x4mm a 13x13x5mm

3. aseguramiento interno de bandejas con doble tornillo de 3/8"

4. Cambiar ultima bandeja por bandeja de 40mm acorde a especificaciones del proceso.

5. Cambio en asegurameinto de paneles de GRC de paneles de 1.5m a 0.5 m hasta cubrir los 3m acorde especificaciones pero ajsutado la longitud de secciones por facilidad de instalación.

Edgardo J Paternina C.
CC. 75100592 Manizales/Colombia.

Ing Edgardo J Paternina Castillo
Apoyo a la supervisión del contrato
