INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA N° 1

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.8561044 del 07 de noviembre de 2025
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO CONCEPCION**
Nit o C.C. No.	800104060
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DE CONCEPCIÓN
VALOR INICIAL:	$396,739,410.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
VALOR TOTAL:	**$396,739,410.00**
ANTICIPO TOTAL:	**$0.00**
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y UN (45) - DÍAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PLAZO TOTAL:	**45 DÍAS CALENDARIO**

SUPERVISOR:	**DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZALEZ**
Acto Administrativo de Supervisión:	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2025

SOLO PARA CONVENIOS:	
APORTE ENTIDAD (GOBERNACION):	$396,739,410.00
APORTE OTRAS ENTIDADES:	$0.00
VALOR TOTAL CONVENIO:	**$396,739,410.00**

OFICINA GESTORA:	SECRETARIO DEL INTERIOR

VALOR A PAGAR:	**$ 357,065,469.00**	**Cobros realizados:** (incluyendo el actual)	**N° 1**	**de**	**2**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**20-11-2025**	**Hasta:**	**19-12-2025**

No. del RP:	25008638	
Fuente del RP:	CONTRIBUCCION SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA - DECRETO 0161 DEL 27 DE FEBRERO DE 2020 REC BCE	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	N° 1	$ 357,065,469.00

MENOS APORTE	$0
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR POR PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 357,065,469.00**

OBSERVACIONES AL ACTA: (estas observaciones son las digitadas al generar la cuenta desde el Portal de Tramite de cuentas de Guane, cuando tenga una condición atípica en su cuenta).

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
1.	Acta de inicio	Se realiza el acta de inicio del convenio interadministrativo, firmada el día 07 de noviembre del 2025 por el alcalde municipal de concepción y el supervisor departamental	Anexo No, 1 Al final del documento
2.	Plan de trabajo	Se realiza la formulación del plan de trabajo para el proyecto, el cual comprende las actividades propias para su ejecución en un total de 5 semanas desde su inicio hast asu entrega.	Anexo No, 2 Al final del documento


CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMENTO APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: En calidad de Contratista declaro bajo la gravedad de juramento, que las planillas y soportes adjuntos, cargados en el Secop, corresponden al pago de aportes obligatorios al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para gestionar el pago del periodo. *(Recuerde que, las normas que regulan la retención en la fuente en materia tributaria y deducción de dichos aportes no han sido objeto de modificación, por lo tanto, si requiere bajar la base de retención en la fuente, las planillas deberán corresponder al periodo cobrado).*

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	12-2025	
	Fecha de pago	19-12-2025	
	Nº de Planilla	6000149918	
	Ingreso Base de Cotización	$6.378.254	
	Valor cotizado	$4.131.700	
	EPS	Sanitas S.A Y Nueva EPS	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	12-2025	
	Fecha de pago	19-12-2025	
	Nº de Planilla	6000149918	
	Ingreso Base de Cotización	$6.378.254	
	Valor cotizado	$5.411.100	
	Fondo de Pensiones	PROTECCION Y COLPENCIONES	
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	12-2025	
	Fecha de pago	19-12-2025	
	Nº de Planilla	6000149918	
	Ingreso Base de Cotización	$6.378.254	
	Valor cotizado	$887.500	
	A.R.L.	Positiva compañía de seguros	
PARAFISCALES	SENA	$165.700	

TIPO DE APORTE	DETALLE	MES 1	MES 2
	I.C.B.F.	$992.000	
	Caja de Compensación COMFENALCO SANTANDER	$1.322.300	
	MINISTERIO DE EDUCACION	$330.900	
	ESAP	$165.700	
VALOR TOTAL PAGADO		**$13.406.900**	

Recuerde que si su planilla fue pagada fuera de los plazos establecidos los valores a registrar corresponden al total pagado incluyendo la mora.

Se firma para tramite de pago, a los 16 días del mes de diciembre de 2025



ABRIL BORRERO EDUAR
MUNICIPIO CONCEPCIÓN
IDENTIFICACION No. 800104060
CORREO: Contratacion@concepcion-santander.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO: 310 5736944

ANEXO N.1. ACTA DE INICIO CONVENIO



	ACTA DE INICIO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-48
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	
CONTRATO	**No.** CO1.PCCNTR.8561044	**FECHA:** 07 de noviembre de 2025
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DE CONCEPCIÓN	
CONTRATISTA	**MUNICIPIO CONCEPCION**	
CEDULA O NIT	800104060	
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($396.739.410.00 COP)	
ANTICIPO	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y UN (41) - DIAS CALENDARIO	
NOMBRE INTERVENTOR		
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	0	
SUPERVISOR	DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZALEZ acto administrativo 07 de noviembre de 2025	
FECHA DE INICIACION:	20 de noviembre de 2025	
FECHA DE TERMINACION:	30 de diciembre de 2025	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIO DEL INTERIOR	

En Bucaramanga, a los 20 de noviembre de 2025, en las instalaciones de la Gobernación de Santander se reunieron, **DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZALEZ**, en calidad de Supervisor del Departamento y **MUNICIPIO CONCEPCION ABRIL BORRERO EDUAR**, quien comparece a nombre propio y/o como representante Legal, de la parte contratista; y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACIÓN PÓLIZAS

A Continuación, se describen las garantías, los amparos, vigencias y fecha de aprobación

ASEGURADORA		FECHA DE APROBACIÓN
No. DE LA PÓLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA Desde (DD/MM/AAAA) / Hasta (DD/MM/AAAA)

1. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
CD	20000000	06.11.2025	2.3.2.02.02.006.05.4001.05 01002.52	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA DECRETO 0161 DEL 27 DE FEBRERO DE 2025 RECIDS	$396.739.410.00
CF	20000038	07.11.2025	2.3.2.02.02.006.05.4001.05 01002.52	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATO DE OBRA PUBLICA DECRETO 0161 DEL 27 DE FEBRERO DE 2025 RECIDS	$396.739.410.00

2. FORMA DE PAGO:

el departamento determina como forma de desembolso del aporte a realizar, el siguiente: 1) un primer desembolso, correspondiente al noventa por ciento (90%) del valor del aporte del departamento de



	ACTA DE INICIO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-48
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

santander por valor de: trescientos cincuenta y siete millones seiscientos cincuenta y nueve pesos m/cte ($357.065.469) el cual se realizará previa suscripción del acta de inicio, así como la presentación y aprobación del plan de trabajo y 2) un segundo y último desembolso correspondiente al diez por ciento (10%) del aporte del departamento, por valor de treinta y nueve millones seiscientos setenta y tres novecientos cuarenta y un pesos m/cte ($39.673.941) el cual se desembolsará una vez se haya ejecutado el 100% de las actividades del convenio y se haya presentado el informe final de ejecución, acompañado de los soportes físicos y digitales, el informe de evaluación de resultados, y la certificación de cumplimiento por parte de la supervisión designada por la gobernación de santander. parágrafo: para los desembolsos requiere que el convenio se encuentre debidamente legalizado, suscrita la correspondiente acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecución de que trata el inciso 2do del artículo 41 de la ley 80 de 1993, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. para ello, se deberá allegar todos los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago y contar con el visto bueno del supervisor que designe el departamento para el convenio.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
0	0	0

ACUERDAN:


1. Firmar la presente acta de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8561044 del 07 de noviembre de 2025.
2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. CO1.PCCNTR.8561044, el dia 20 de noviembre de 2025.
3. Fijar como fecha de terminacion del contrato No. CO1.PCCNTR.8561044, el dia 30 de diciembre de 2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 20 de noviembre de 2025.

ABRIL BORRERO EDUAR
MUNICIPIO CONCEPCION
CONTRATISTA

DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZALEZ
SUPERVISOR / INTERVENTOR

ANEXO N.2. PLAN DE TRABAJO

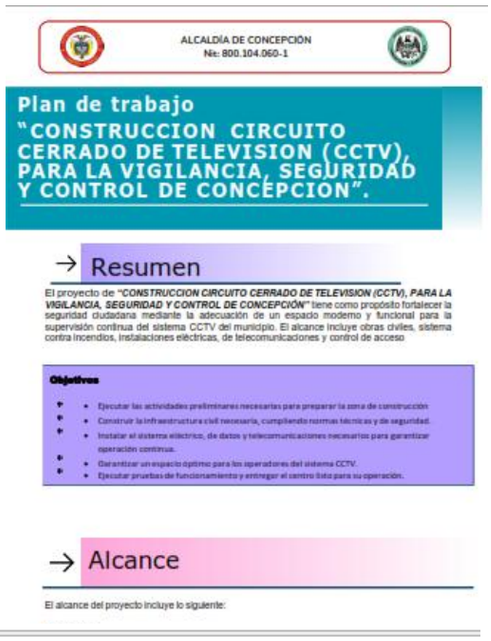

ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN
Nit: 800.104.060-1

Plan de trabajo
"CONSTRUCCION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DE CONCEPCION".

→ Resumen


El proyecto de ***"CONSTRUCCION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DE CONCEPCIÓN"*** tiene como propósito fortalecer la seguridad ciudadana mediante la adecuación de un espacio moderno y funcional para la supervisión continua del sistema CCTV del municipio. El alcance incluye obras civiles, sistema contra incendios, instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y control de acceso

Objetivos

- Ejecutar las actividades preliminares necesarias para preparar la zona de construcción
- Construir la infraestructura civil necesaria, cumpliendo normas técnicas y de seguridad.
- Instalar el sistema eléctrico, de datos y telecomunicaciones necesarios para garantizar operación continua.
- Garantizar un espacio óptimo para los operadores del sistema CCTV.
- Ejecutar pruebas de funcionamiento y entregar el centro listo para su operación.

→ Alcance

El alcance del proyecto incluye lo siguiente:

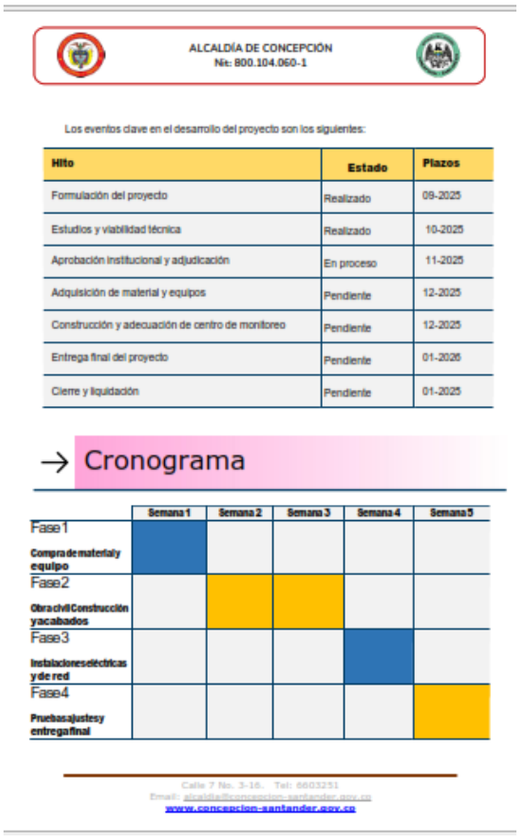

ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN
Nit: 800.104.060-1


Los eventos clave en el desarrollo del proyecto son los siguientes:

Hito	Estado	Plazos
Formulación del proyecto	Realizado	09-2025
Estudios y viabilidad técnica	Realizado	10-2025
Aprobación institucional y adjudicación	En proceso	11-2025
Adquisición de material y equipos	Pendiente	12-2025
Construcción y adecuación de centro de monitoreo	Pendiente	12-2025
Entrega final del proyecto	Pendiente	01-2026
Cierre y liquidación	Pendiente	01-2025

→ Cronograma

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Fase 1 Compra de material y equipo					
Fase 2 Obra civil Construcción y acabados					
Fase 3 Instalaciones eléctricas y de red					
Fase 4 Pruebas ajustes y entrega final					

Calle 7 No. 3-16. Tel: 6603251
Email: alcaldia@concepcion-santander.gov.co
www.concepcion-santander.gov.co

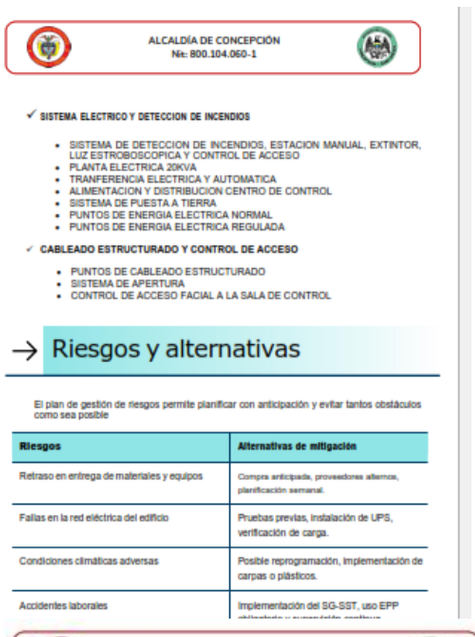

ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN
Nit: 800.104.060-1

✓ **SISTEMA ELECTRICO Y DETECCION DE INCENDIOS**

- SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL, EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO
- PLANTA ELECTRICA 20KVA
- TRANFERENCIA ELECTRICA Y AUTOMATICA
- ALIMENTACION Y DISTRIBUCION CENTRO DE CONTROL
- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
- PUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA NORMAL
- PUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA REGULADA


✓ **CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONTROL DE ACCESO**

- PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
- SISTEMA DE APERTURA
- CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL

→ Riesgos y alternativas

El plan de gestión de riesgos permite planificar con anticipación y evitar tantos obstáculos como sea posible

Riesgos	Alternativas de mitigación
Retraso en entrega de materiales y equipos	Compra anticipada, proveedores alternos, planificación semanal.
Fallas en la red eléctrica del edificio	Pruebas previas, instalación de UPS, verificación de carga.
Condiciones climáticas adversas	Posible reprogramación, implementación de carpas o plásticos.
Accidentes laborales	Implementación del SG-SST, uso EPP

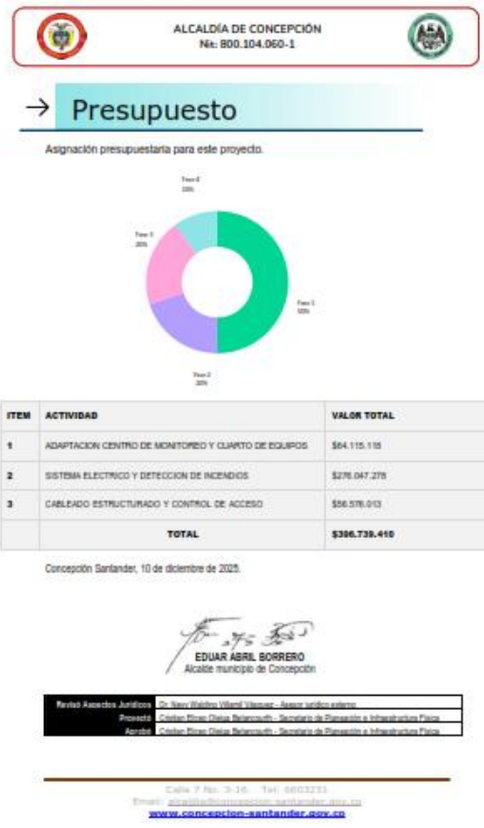

ALCALDÍA DE CONCEPCIÓN
Nit: 800.104.060-1

→ Presupuesto

Asignación presupuestaria para este proyecto.

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	$64.115.118
2	SISTEMA ELECTRICO Y DETECCION DE INCENDIOS	$276.047.278
3	CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONTROL DE ACCESO	$56.576.013
	TOTAL	**$396.739.410**

Concepción Santander, 10 de diciembre de 2025.

EDUAR ABRIL BORRERO
Alcalde municipio de Concepción

Revisó Aspectos Jurídicos	Dr. Nery Waldino Villamil Vásquez - Asesor jurídico externo
Proyectó	Cristian Rivas Olaya Betancourth - Secretario de Planeación e Infraestructura Física
Aprobó	Cristian Rivas Olaya Betancourth - Secretario de Planeación e Infraestructura Física

Calle 7 No. 3-16. Tel: 6603251
Email: alcaldia@concepcion-santander.gov.co
www.concepcion-santander.gov.co

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8561044 del 07 de noviembre de 2025

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DE CONCEPCIÓN

INFORME DE AVANCE DE CONVENIO N.1

CONVENIDO:
MUNICIPIO DE CONCEPCION SANTANDER
R/L **ABRIL BORRERO EDUAR**

SUPERVISOR:
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZÁLEZ

PERIODO DE EJECUCIÓN:
DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPCIÓN
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DICIEMBRE DE 2025

INTRODUCCIÓN

El municipio de concepción en virtud del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8561044 del 07 de noviembre de 2025 cuyo OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DE CONCEPCIÓN, ha llevado a cabo las acciones pertinentes solicitadas en la cláusula **TERCERA. FORMA DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS. numeral 1) Un primer desembolso correspondiente al 90% del valor del aporte del departamento de Santander con valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 357,065,469.00), el cual se realizará previa suscripción del acta de inicio, así como la presentación y aprobación del plan de trabajo.**

Teniendo en cuenta lo anterior se realiza el presente informe inicial el cual contiene lo solicitado, junto con la información general del proyecto.

1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se llevará a cabo en la estación de policía del municipio de concepción Santander ubicada en la Carrera 3 # 6 – 46, Centro de Concepción



Estación de policía del municipio frente al parque principal

2. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

TIPO DE CONTRATO :	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.8561044 del 07 de noviembre de 2025**
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO CONCEPCION**
Nit o C.C. No.	800104060
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DE CONCEPCIÓN
VALOR INICIAL:	$396,739,410.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y UN (41) - Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION:	UNO (1%)
SUPERVISOR:	**DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZALEZ** Acto Administrativo de fecha 07 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	20 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de diciembre de 2025
MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIO DEL INTERIOR

3. AVANCE DEL PROYECTO

ITEM	ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES ESPECIFICAS	% DE AVANCE
COBRO 90%			100%
1.	Acta de inicio	Se realiza el acta de inicio del convenio interadministrativo, firmada el día 07 de noviembre del 2025 por el alcalde municipal de concepción y el supervisor departamental	
2.	Plan de trabajo	Se realiza la formulación del plan de trabajo para el proyecto, el cual comprende las actividades propias para su ejecución en un total de 5 semanas desde su inicio hasta su entrega.	
COBRO DEL 10%			0%
3.	Actividades del convenio al 100%	-	
4.	Informe de ejecución físico y digital	-	
5.	Informe de evaluación de resultados	-	
6.	Certificación de cumplimiento del supervisor	-	

4. AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$396,739,410.00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. N° 1	$ 357,065,469.00
MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 90%	**$ 357,065,469.00**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR 10%	**$39.673.941.00**

5. ANEXOS DEL INFORME

Para validar los avances de ejecución del convenio, se presentan los siguientes anexos que soportan la ejecución anteriormente descrita:

- ACTA DE INICIO DEL CONVENIO
- PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO
- PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE ALCALDE
- ACTA DE RECIBIDO PARCIAL N.1
- INFORME DEL CONTRATISTA (ALCALDÍA)

6. CONCLUSIONES

- A la fecha del presente informe el contratista ha elaborado el presente informe para solicitar formalmente el pago del 90% estipulado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.8561044 del 07 de noviembre de 2025.
- A la fecha nos encontramos dentro de los plazos contractuales iniciales.

Concepción, dieciséis (16) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

EDUAR ABRIL BORRERO
Alcalde Municipal.

CERTIFICADO TRIBUTARIO EMPRESA

RETEICA

Yo **EDUAR ABRIL BORRERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.928.430 de Málaga, Santander, en mi condición de **Representante Legal** del **MUNICIPIO DE CONCEPCION, SANTANDER,** identificado con NIT. 800.104.060-1, una vez verificado la ejecución de las actividades económicas del presente cobro, de conformidad con el contrato, me permito certifica los MUNICIPIO DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES PARA EL DESCUENTO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO – ICA, así:

MUNICIPIO(S) DONDE SE EJECUTARON LAS ACTIVIDADES	ACTIVIDAD REGISTRADA	TARIFA A APLICAR	VALOR BASE (ANTES DE IVA)
CONCEPCIÓN	PLANTA ELÈCTRICA DE 20 KVA	3 * 1000	$ 97.633.333
CONCEPCIÓN	TRANSFERENCIA ELÈCTRICA AUTOMATICA 60a	3 * 1000	$ 62.083.333
CONCEPCIÓN	ALIMENTACIÒN Y DISTRIBUCIÒN ELÈCTRICA CENTRO DE CONTROL		$ 21.820.314
CONCEPCIÓN	PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO		$ 20.791.522
CONCEPCIÓN	PUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA NORMAL		19.314.629
CONCEPCIÓN	PUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA REGULADA		$ 19.358.882
CONCEPCIÓN	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (Puntos de cámara y sala de control)		$ 5.983.565
CONCEPCIÓN	SISTEMA DE DETECCIÒN DE INCENDIOS, ESTACIÒN MANUAL, EXTENTIR, LUZ ESTROBOSCÒPICA		$ 45.791.541
CONCEPCIÓN	CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL		$ 28.266.662
CONCEPCIÓN	SISTEMA DE APERTURA		$ 8.556.074
CONCEPCIÓN	Demolición de piso existente		$ 1.731.687
CONCEPCIÓN	Retiro de Sobrantes demolición		$ 1.845.320
CONCEPCIÓN	Suministro e instalación de piso en Porcelanato 0.60 x		$ 12.059.623

	0.60, e=3mm tipo clásico color marfil. Incluye pego, boquilla y separadores.		
CONCEPCIÓN	Suministro e instalación de guarda escoba en Porcelanato, tipo clásico color marfil. Incluye pego, boquilla y separadores.		$ 5.294.200
CONCEPCIÓN	Suministro e instalacion de muro en Drywall 2 CARAS, Incluye frescasa, estructura metálica para armado y soporte parales separados a 61 cm, perfiles esquineros, placa de drywall de 1/2", cinta en fibra de vidrio de 5 cm., tornillería de 6x1.		$ 2.741.701
CONCEPCIÓN	Dintel en DRYWALL, INCLUYE Fajas y remates y refuerzos para fijaciones de puertas, Encintado y masillado.		$ 67.100
CONCEPCIÓN	Pañete liso para Muro 1:4		$ 7.076.250
CONCEPCIÓN	Estuco para muros		$ 6.991.250
CONCEPCIÓN	Pintura tipo 1 superlavable, tres manos.		$ 3.204.153
CONCEPCIÓN	Impermeabilización de muro a exterior.		$ 2.062.590
CONCEPCIÓN	Suministro e instalación de cielo raso en DRYWALL, acabado en pintura vinílica tipo 1. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, perfilería de aluminio para soporte, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, arnés.		$ 3.168.694
CONCEPCIÓN	Aplicación de pintura a base de agua sobre cielo raso, tres manos.		$ 3.292.987
CONCEPCIÓN	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado 10mm incoloro, con sistema de chapeta y haladera de 60cm. Con grabado en vidrio con nombre CCTV.		$ 10.933.333
CONCEPCIÓN	Suministro e Instalación de puerta en aluminio con vidrio		$ 1.233.333

	fondo plano. Incluye cerradura, marco y vidrio.		
CONCEPCIÓN	Suministro e instalación de panel LED de 60*60		$ 5.437.333

NOTAS: Inserte las filas necesarias de acuerdo con sus actividades contractuales.

Si no me aplica el descuento por favor en la celda de tarifa referenciar la norma exacta que así lo autoriza y adjuntar el documento.

Se firma para tramite de pago, a los dieciséis (16) días del mes de diciembre de 2025

Firma del Contratista:	
Representante legal:	EDUAR ABRIL BORRERO - ALCALDE
C.C. No.	13.928.430 DE MÁLAGA
Nombre:	MUNICIPIO CONCEPCION
C.C. No.	800104060-1
CORREO ELECTRONICO:	Contratacion@concepcion-santander.gov.co
TELEFONO DE CONTACTO:	3125706103

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1

TIPO DE CONTRATO :	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**CO1.PCCNTR.8561044 del 07 de noviembre de 2025**
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO CONCEPCION**
Nit o C.C. No.	800104060
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE CONCEPCION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DE CONCEPCIÓN
VALOR INICIAL:	$396,739,410.00
VALOR ADICIONAL:	$0.00
PLAZO INICIAL:	CUARENTA Y UN (41) - Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION:	UNO (1%)
SUPERVISOR:	**DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZALEZ** Acto Administrativo de fecha 07 de noviembre de 2025
FECHA DE INICIACION:	20 de noviembre de 2025
FECHA DE TERMINACION:	30 de diciembre de 2025
MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN SANTANDER
OFICINA GESTORA:	SECRETARIO DEL INTERIOR

En Concepción Santander, a los 16 días del mes de diciembre de 2025, se reunieron, **DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZÁLEZ**, en calidad de Supervisor del Departamento y **ABRIL BORRERO EDUAR**, quien comparece en calidad de Representante legal de **MUNICIPIO CONCEPCION,** como Contratista, con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo del 20 de noviembre al 19 de diciembre , del presente Contrato de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo de la cuenta N.1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. **N° 1**	$ 357,065,469.00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	0.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 357,065,469.00**

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 357,065,469.00)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 16 días del mes de diciembre de 2025

ABRIL BORRERO EDUAR
MUNICIPIO CONCEPCION

Contratista

DOUGLAS JAVIER ARENAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Supervisor

EL SUSCRITO SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

CERTIFICA

Que el **MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN · DEPARTAMENTO DE SANTANDER,** Identificado con NIT 800.104.060-1 de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se encuentra a **PAZ Y SALVO** por concepto de cancelación de Aportes de sus empleados al Sistema General de Seguridad Social, Pensión, ARP y Parafiscales, con corte nómina del mes de diciembre de 2025, según pago realizado a través de planilla integrada de autoliquidación N. **6000149918** de la plataforma SOI el día Diecinueve (19) de diciembre de 2025.

En constancia de lo anterior se expide y firma en el Municipio de Concepción - Santander a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de Dos mil Veinticinco (2025).

Atentamente.

Sandra Patricia Russi
Secretaria de hacienda

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800104060
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE CONCEPCION	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CONCEPCION	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 3-16	TELÉFONO:	6603219
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades ejecutivas de la administración públi
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - ADMINITRACION CENTRAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000149918**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2021875310

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.808.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.808.300	$ 0	$ 1.808.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 3.480.000	$ 0	$ 0	$ 61.400	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 3.602.800	$ 0	$ 3.602.800
SUBTOTALES:										**$ 5.411.100**	**$ 0**	**$ 5.411.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.558.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.558.600	$ 0	$ 0	$ 1.558.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.573.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.573.100	$ 0	$ 0	$ 2.573.100
SUBTOTALES:													**$ 4.131.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.131.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 887.500	$ 887.500	$ 0	$ 0	$ 887.500
SUBTOTALES:									**$ 887.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 887.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	8	$ 1.322.300	$ 0	$ 1.322.300
SUBTOTALES:			**$ 1.322.300**	**$ 0**	**$ 1.322.300**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAESAP	PAESAP - ESAP	8	$ 165.700	$ 0	$ 165.700
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	$ 992.000	$ 0	$ 992.000
PAMIED	PAMIED - MINISTERIO DE EDUCACION	8	$ 330.900	$ 0	$ 330.900
PASENA	PASENA - SENA	8	$ 165.700	$ 0	$ 165.700
SUBTOTALES:			**$ 1.654.300**	**$ 0**	**$ 1.654.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																									
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1096949843	OLEJUA BETANCOURTH CRISTIAN ELICEO	DEPEND		$ 4.721.791	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 4.721.791	$ 755.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 755.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.721.791	$ 590.300	$ 0	$ 590.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.721.791		$ 328.700	30	$ 4.721.791	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 188.900	$ 23.700	$ 141.700	$ 23.700	$ 47.300
2	CC 1096949944	CACERES PEREZ LEIDY KATHERINE	DEPEND		$ 2.927.477	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.927.477	$ 468.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 468.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.927.477	$ 366.000	$ 0	$ 366.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.927.477		$ 15.300	30	$ 2.927.477	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 117.100	$ 14.700	$ 87.900	$ 14.700	$ 29.300
3	CC 13906411	ROJAS SANCHEZ LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 2.544.445	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.544.445	$ 407.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 407.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.544.445	$ 318.100	$ 0	$ 318.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.544.445		$ 13.300	30	$ 2.544.445	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 101.800	$ 12.800	$ 76.400	$ 12.800	$ 25.500
4	CC 13906822	OTERO FAJARDO JUAN JOSE	DEPEND		$ 5.887.663	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.887.663	$ 942.100	$ 29.500	$ 29.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.001.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.887.663	$ 736.000	$ 0	$ 736.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.887.663		$ 30.800	30	$ 5.887.663	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 235.600	$ 29.500	$ 176.700	$ 29.500	$ 58.900
5	CC 13928430	ABRIL BORRERO EDUAR	DEPEND		$ 6.378.254	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.378.254	$ 1.020.600	$ 31.900	$ 31.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.084.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 6.378.254	$ 797.300	$ 0	$ 797.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 6.378.254		$ 444.000	30	$ 6.378.254	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 255.200	$ 31.900	$ 191.400	$ 31.900	$ 63.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800104069
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE CONCEPCION	SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	CONCEPCION	DEPARTAMENTO:	6603219
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 3-16	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Actividades ejecutivas de la administración públi
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	03 - ADMINITRACION CENTRAL
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6000149918	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2021875310

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Agrario de Colombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800104060
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE CONCEPCION	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CONCEPCION	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 3-16	TELÉFONO:	6603219
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades ejecutivas de la administración públi
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	03 - ADMINITRACION CENTRAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6000149918**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	2021875310

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	3	$ 1.808.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.808.300	$ 0	$ 1.808.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 3.480.000	$ 0	$ 0	$ 61.400	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 3.602.800	$ 0	$ 3.602.800
SUBTOTALES:										**$ 5.411.100**	**$ 0**	**$ 5.411.100**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.558.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.558.600	$ 0	$ 0	$ 1.558.600
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.573.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.573.100	$ 0	$ 0	$ 2.573.100
SUBTOTALES:													**$ 4.131.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 4.131.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 887.500	$ 887.500	$ 0	$ 0	$ 887.500
SUBTOTALES:									**$ 887.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 887.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	8	$ 1.322.300	$ 0	$ 1.322.300
SUBTOTALES:			**$ 1.322.300**	**$ 0**	**$ 1.322.300**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAESAP	PAESAP - ESAP	8	$ 165.700	$ 0	$ 165.700
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	8	$ 992.000	$ 0	$ 992.000
PAMIED	PAMIED - MINISTERIO DE EDUCACION	8	$ 330.900	$ 0	$ 330.900
PASENA	PASENA - SENA	8	$ 165.700	$ 0	$ 165.700
SUBTOTALES:			**$ 1.654.300**	**$ 0**	**$ 1.654.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																												PENSIÓN								SALUD						ARP																									
N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1096949843	OLEJUA BETANCOURTH CRISTIAN ELICEO	DEPEND		$ 4.721.791	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 4.721.791	$ 755.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 755.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 4.721.791	$ 590.300	$ 0	$ 590.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 4.721.791		$ 328.700	30	$ 4.721.791	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 188.900	$ 23.700	$ 141.700	$ 23.700	$ 47.300
2	CC 1096949944	CACERES PEREZ LEIDY KATHERINE	DEPEND		$ 2.927.477	FIJO			NO																		230201-PROTECCION	30	$ 2.927.477	$ 468.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 468.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.927.477	$ 366.000	$ 0	$ 366.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.927.477		$ 15.300	30	$ 2.927.477	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 117.100	$ 14.700	$ 87.900	$ 14.700	$ 29.300
3	CC 13906411	ROJAS SANCHEZ LUIS ALBERTO	DEPEND		$ 2.544.445	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.544.445	$ 407.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 407.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.544.445	$ 318.100	$ 0	$ 318.100	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.544.445		$ 13.300	30	$ 2.544.445	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 101.800	$ 12.800	$ 76.400	$ 12.800	$ 25.500
4	CC 13906822	OTERO FAJARDO JUAN JOSE	DEPEND		$ 5.887.663	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 5.887.663	$ 942.100	$ 29.500	$ 29.500	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.001.100	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 5.887.663	$ 736.000	$ 0	$ 736.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 5.887.663		$ 30.800	30	$ 5.887.663	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 235.600	$ 29.500	$ 176.700	$ 29.500	$ 58.900
5	CC 13928430	ABRIL BORRERO EDUAR	DEPEND		$ 6.378.254	FIJO			NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 6.378.254	$ 1.020.600	$ 31.900	$ 31.900	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.084.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 6.378.254	$ 797.300	$ 0	$ 797.300	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 6.378.254		$ 444.000	30	$ 6.378.254	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	$ 255.200	$ 31.900	$ 191.400	$ 31.900	$ 63.800

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800104069
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		MUNICIPIO DE CONCEPCION	SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	CONCEPCION	DEPARTAMENTO:	6603219
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 3-16	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Actividades ejecutivas de la administración públi
TIPO EMPRESA:	PUBLICA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	03 - ADMINITRACION CENTRAL
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	NO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6000149918	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2026
DIAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2021875310

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

Plan de trabajo "CONSTRUCCION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DE CONCEPCIÓN".

→ Resumen

El proyecto de ***"CONSTRUCCION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DE CONCEPCIÓN".*** tiene como propósito fortalecer la seguridad ciudadana mediante la adecuación de un espacio moderno y funcional para la supervisión continua del sistema CCTV del municipio. El alcance incluye obras civiles, sistema contra incendios, instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y control de acceso

Objetivos

- Ejecutar las actividades preliminares necesarias para preparar la zona de construcción Construir la
- infraestructura civil necesaria, cumpliendo normas técnicas y de seguridad. Instalar el sistema
- eléctrico, de datos y telecomunicaciones necesarios para garantizar operación continua.
- Garantizar un espacio óptimo para los operadores del sistema CCTV.
- Ejecutar pruebas de funcionamiento y entregar el centro listo para su operación.

→ Alcance

El alcance del proyecto incluye lo siguiente:

Entregas

✓ **OBRAS CIVILES**

- ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS

✓ **SISTEMA ELECTRICO Y DETECCION DE INCENDIOS**

- SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS, ESTACION MANUAL, EXTINTOR, LUZ ESTROBOSCOPICA Y CONTROL DE ACCESO
- PLANTA ELECTRICA 20KVA
- TRANFERENCIA ELECTRICA Y AUTOMATICA
- ALIMENTACION Y DISTRIBUCION CENTRO DE CONTROL
- SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
- PUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA NORMAL
- PUNTOS DE ENERGIA ELECTRICA REGULADA

✓ **CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONTROL DE ACCESO**

- PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO
- SISTEMA DE APERTURA
- CONTROL DE ACCESO FACIAL A LA SALA DE CONTROL

→ Riesgos y alternativas

El plan de gestión de riesgos permite planificar con anticipación y evitar tantos obstáculos como sea posible

Riesgos	**Alternativas de mitigación**
Retraso en entrega de materiales y equipos	Compra anticipada, proveedores alternos, planificación semanal.
Fallas en la red eléctrica del edificio	Pruebas previas, instalación de UPS, verificación de carga.
Condiciones climáticas adversas	Posible reprogramación, implementación de carpas o plásticos.
Accidentes laborales	Implementación del SG-SST, uso EPP obligatorio y supervisión continua.

→ Hitos

Los eventos clave en el desarrollo del proyecto son los siguientes:


Hito	Estado	Plazos
Formulación del proyecto	Realizado	09-2025
Estudios y viabilidad técnica	Realizado	10-2025
Aprobación institucional y adjudicación	En proceso	11-2025
Adquisición de material y equipos	Pendiente	12-2025
Construcción y adecuación de centro de monitoreo	Pendiente	12-2025
Entrega final del proyecto	Pendiente	01-2026
Cierre y liquidación	Pendiente	01-2025

→ Cronograma

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Fase1 **Compra de material y equipo**					
Fase2 **Obra civil Construcción y acabados**					
Fase3 **Instalaciones eléctricas y de red**					
Fase4 **Pruebas ajustes y entrega final**					

Presupuesto

Asignación presupuestaria para este proyecto.

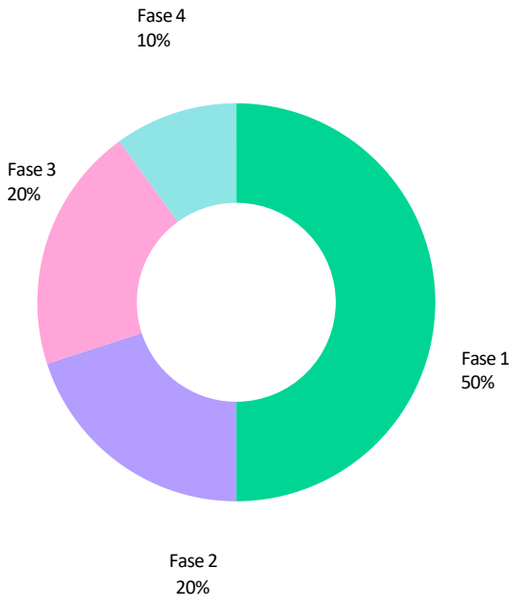

ITEM	ACTIVIDAD	VALOR TOTAL
1	ADAPTACION CENTRO DE MONITOREO Y CUARTO DE EQUIPOS	$64.115.118
2	SISTEMA ELECTRICO Y DETECCION DE INCENDIOS	$276.047.278
3	CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONTROL DE ACCESO	$56.576.013
	TOTAL	**$396.739.410**

Concepción Santander, 10 de diciembre de 2025.

EDUAR ABRIL BORRERO
Alcalde municipio de Concepción

Revisó Aspectos Jurídicos	Dr. Nevy Waldino Villamil Vásquez - Asesor jurídico externo
Proyectó	Cristian Eliceo Olejua Betancourth - Secretario de Planeación e Infraestructura Física
Aprobó	Cristian Eliceo Olejua Betancourth - Secretario de Planeación e Infraestructura Física

CRONOGRAMA

PROYECTO CONSTRUCCION CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), PARA LA VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONTROL DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN:



Concepción Santander, 10 de diciembre de 2025.

EDUAR ABRIL BORRERO
Alcalde municipio de Concepción

Revisó Aspectos Jurídicos	Dr. Nevy Waldino Villamil Vásquez - Asesor jurídico externo
Proyectó	Cristian Eliceo Olejua Betancourth - Secretario de Planeación e Infraestructura Física
Aprobó	Cristian Eliceo Olejua Betancourth - Secretario de Planeación e Infraestructura Física
