	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACTA DE SUPERVISIÓN A CONTRATO DE INTERVENTORÍA PROCESO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-500-001
		VERSIÓN	2
		APROBADO	14/FEB/2025

1. TIPO DE SUPERVISIÓN

ACTA PARCIAL	X	ACTA FINAL	

FECHA ELABORACION DEL ACTA: 13/11/2025

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	No. IND-24-3154	FECHA	22 DE JULIO DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024	NIT	901.846.651-4
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS: MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.		
REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO CÁRDENAS RODRIGUEZ	IDENTIFICACION	16,254,057
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN MODULO COMPLEMENTARIO EN EL SALÓN RECREATIVO DEL BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, DIRECCIÓN: Calle 69 con Carrera 7R Bis – 90; ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD RECREATIVA PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, DIRECCIÓN: Carrera 49ª Calles 12 y 12B comuna 10; ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES CORREGIMIENTO MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, DIRECCIÓN: CALLE 9 OESTE / AV. 42 OESTE; MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DIRECCIÓN: INSTITUCION EDUCATICA ROZO SEDE CARDENAS		
PLAZO INICIAL	8 MESES	FECHA DE INICIACIÓN	14 / 3 / 2025
VALOR INICIAL	$ 442.765.090,oo		
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	30/01/2025	No.	325
REGISTROS PRESUPUESTALES DEL COMPROMISO	30/01/2025	No.	325
DIRECTOR (A)	OSCAR CARDENAS O.	IDENTIFICACION	16,865,991
SUPERVISOR	WILSON DELGADO REYES	IDENTIFICACION	13,511,429

3. INFORME JURÍDICO

FECHA DE INICIO	14-mar-25	PLAZO DE EJECICIÓN	8 MESES

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO

ADICIONES

ADICION No.	VALOR

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	8 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	14/11/2025
VALOR ACTUAL	$ 442.765.090,oo

CESIÓN

NOMBRE DE CESIONARIO	VALOR	NIT	FECHA CESION

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 442.765.090,00
ADICIÓN No.	
PRORROGA No.	
SUSPENSION No.	
REINICIO No.	
SECIÓN No.	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	
ACTA RECIBO FINAL DE OBRA No.	
ACTA DE LIQUIDACIÓN No.	

LA SUMA DE:	Cuatrocientos cuarenta y dos millones setecientos sesenta y cinco mil noventa pesos.

RESUMEN CONTABLE Y FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	VR. CUOTA A CANCELAR	VR. ACUMULADO	SALDO POR CANCELAR
$ 442.765.090,00	$ 56.076.637,00	$ 409.015.888,00	$ 33.749.202,00

INFORME # 8 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES

CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	SI	X	NO	
No. PLANILLA DE PAGO	91141181, 1076495165, 1076199643, 80889866, 9492910361, 35001380			
No. PIN / REFERENCIA DE PAGO	1908226966, 1076495165, 1076199643, 80889866, 1824566147, 35001380			
OPERADOR	COMPENSARMIPLANILLA.COM, SIMPLE, SIMPLE, ENLACE, APORTES, ASOPAGOS			
FECHA DE PAGO	6/11/2025, 10/11/2025, 08/10/2025, 07/10/2025, 03/10/2025, 13/11/2025			

Powered by CamScanner

5. INFORME TÉCNICO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN POR CAPITULOS O ACTIVIDADES DEL CONTRATO	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	P	I
	MODULOS AUXILIARES A SALON MULTIPROPOSITO BARRIO LAS CEIBAS, DISTRITO ESPECIAL CALI VALLE DEL CAUCA	2,24%	PEGA DE MAMPOSTERÍA, MESONES,CONTRAPISOS, ANDENES		
	ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE CALI	4,43%	CONSTRUCCION PANTALLA DE SEGURIDAD, CORDONES PERIMETRALES.		
	ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI	2,67%	LLENOS CON MATERIAL IMPORTADO, OBRAS DE BIO INGENIERIA.		
	CONSTRUCCIÓN CANCHA MÚLTIPLE CON CUBIERTA, CORREGIMIENTO DE ROZO, MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	2,73%	INSTALACION DE CUBIERTA, VIGAS Y CANALES PERIMETRALES.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO (IMÁGENES RELEVATES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA)

CONSTRUCCIÓN CANCHA MÚLTIPLE CON CUBIERTA, CORREGIMIENTO DE ROZO, MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

FOTO No.1	DESCRIPCIÓN:INSTALACIÓN CUBIERTA. SEGUNDA HOJA	FOTO No.2	VIGAS METÁLICAS Y MONTAJE CUBIERTA

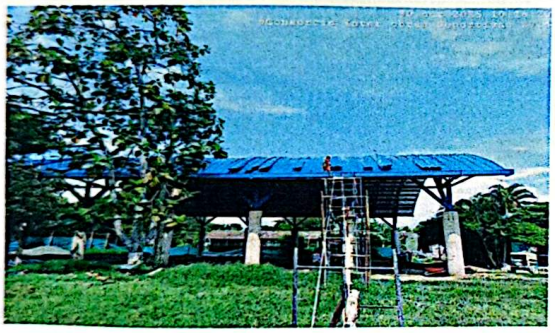





FOTO No.3	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN VIGAS PERIMETRALES	FOTO No.4	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN VIGA PERIMETRAL. INSTALACIÓN SUB BASE.





MODULOS AUXILIARES A SALON MULTIPROPOSITO BARRIO LAS CEIBAS, DISTRITO ESPECIAL CALI VALLE DEL CAUCA


FOTO No.5	DESCRIPCIÓN:INSTALACIÓN CUBIERTA. FUNDICIÓN CONTRA PISO.	FOTO No.6	DESCRIPCIÓN: FUNDICIÓN CONTRA PISO. LLEGADA DE PISO





Powered by CamScanner

FOTO No 7	DESCRIPCIÓN: PPEGA DE MAMPOSTERÍA. FUNDICION DE MESONES	FOTO No 8	DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DILATACIONES DE LOSA DE PISO





ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO

FOTO No.9	DESCRIPCIÓN: INSTALACIÓN PANTALLA DE PROTECCIÓN	FOTO No.10	DESCRIPCIÓN: PANTALLA DE PROTECCIÓN





FOTO No.11	DESCRIPCIÓN: LOSA DE CONCRETO Y PANTALLA DE PROTECCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE ANDEN.	FOTO No.12	DESCRIPCIÓN: RETIRO DE LUMINARIA





ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI


FOTO No.13	DESCRIPCIÓN:MATERIALES BIO INGENIERÍA	FOTO No.14	DESCRIPCIÓN:RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO-BIO INGENIERIA





Powered by CamScanner

FOTO No.15	DESCRIPCIÓN REVISIÓN DE BIO INGENIERÍA CON LA COMUNIDAD	FOTO No.16	CONFORMACIÓN Y LLENO CON MATERIAL IMPORTADO

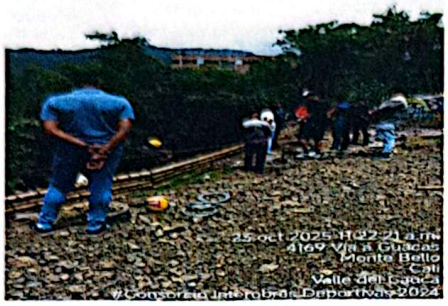



6. OBSERVACIONES GENERALES DEL ESTADO DEL CONTRATO

Las obras se han ejecutado para el mes de OCTUBRE en los 4 frentes de los Escenarios deportivos,. Las actividades representativas han sido : Para el Frente CONSTRUCCIÓN CANCHA MÚLTIPLE CON CUBIERTA, CORREGIMIENTO DE ROZO, MUNICIPIO DE PALMIRA, Instalacion de cubierta, relleno con sub base para placa de cancha.; en el frente MODULOS AUXILIARES A SALON MULTIPROPOSITO BARRIO LAS CEIBAS construcción de mamposteria, andenes en concreto e instalaciones hidrosanitarias, fundicion contrapisos; En el Frente ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA,construccion de pantalla de proteccion ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, allenos con material importado, actividades de bio ingeniería de control de talud,

	DIA	MES	AÑO
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			

	DIA	MES	AÑO
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EN LA FECHA			

7. AUTORIZACIÓN DE PAGO A LA PRESENTE ACTA

1. En mi calidad de Supervisor del Contrato No. IND-24-3154, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de la Interventoria en la obra realizada en los diferentes frentes de obra que hacen parte del contrato. Conforme a las obligaciones del contrato, dentro del periodo equivalente a la interventoria se tiene un avance financiero del 12,67% para el periodo comprendido desde el 01/10/2025 hasta el 31/10/2025 y un acumulado total de ejecucion de 92,38% para el contrato de interventoria de los frentes de obra **MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.**, en ejecución dentro del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA **IND-25-0686**

2. Que el contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al periodo **del 01 al 31 de octubre de 2025**

	DIA	MES	AÑO
3. Que a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR autorizar el pago por valor de **$56,076,637(cincuenta y seis millones setenta y seis mil seiscientos treinta y siete pesos mcte.),** al contratista **CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024** identificado con Nit. **901.846.651-4**. Para constancia se firma la presente acta por quienes intervinieron.	13	11	2025

8. FIRMAS DE RESPONSABLES

FIRMA
NOMBRE:WILSON DELGADO REYES
SUPERVISOR - INDERVALLE

Vo Bo
NOMBRE: MARIA VIRGINIA CASTRO
APOYO SUPERVISION - INDERVALLE

FIRMA
NOMBRE: EDUARDO CÁRDENAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA

Powered by CamScanner

INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
	ACTA DE EJECUCIÓN DE INTERVENTORÍA	APROBACIÓN	

ACTA No.	8	FECHA DEL ACTA	31 DE OCTUBRE DE 2025	PLAZO DEL CONTRATO:	8 Meses
CONTRATO No.	IND-24-3154				
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS: MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES UNIDAD PANAMERICANA, BARRIO PANAMERICANO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI. ADECUACIÓN JUEGOS INFANTILES, CORREGIMIENTO DE MONTEBELLO, DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO, INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORREGIMIENTO DE ROZO MUNICIPIO DE PALMIRA, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.				
CONTRATISTA	CONSORCIO INTEROBRAS DEPORTIVAS 2024	NIT - CC	901.846.651-4	CDP: 624 DE 07 DE MAYO DE 2024, 325 DE 30 DE ENERO DE 2025	
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	WILSON DELGADO REYES	NIT - CC	13,511,429	RPC: 124 DE 31 DE OCTUBRE DE 2024, 325 DE 30 DE ENERO DE 2025	
PERIODO A PAGAR: DEL	01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025				

Mediante el presente documento INDERVALLE y EL INTERVENTOR, dejan constancia de las actividades ejecutadas por el contratista interventor en las condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIÓN CONTRACTUAL						CANTIDAD ACUMULADA ANTERIOR		CANTIDAD PRESENTE MES		ACUMULADO TOTAL		CANTIDAD SALDO	
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION %	DURACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)	DURACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL ($)
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)		(1)*(2)*(3)*(4) = (5)	(4)	(1)*(2)*(3)*(4) = (5)
	COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
	PERSONAL PROFESIONAL												
1	Director de Interventoria - Categoria 1	$ 7.700.000	50%	8,00	$ 30.800.000	6,58	$ 25.333.000	1,00	$ 3.850.000	7,58	$ 29.183.000	0,42	$ 1.617.000
2	Ingeniero Residente de Interventoria - Categoria 4	$ 4.950.000	100%	7,00	$ 69.300.000	6,58	$ 65.142.000	0,42	$ 4.158.000	7,00	$ 69.300.000	0,00	$ 0
1	Topografo Inspector	$ 3.300.000	20%	3,00	$ 1.980.000	1,00	$ 660.000	1,00	$ 660.000	2,00	$ 1.320.000	1,00	$ 660.000
1	Esp. Social	$ 6.050.000	20%	3,00	$ 3.630.000	1,00	$ 1.210.000	1,00	$ 1.210.000	2,00	$ 2.420.000	1,00	$ 1.210.000
1	Esp. Estructural	$ 6.050.000	40%	3,00	$ 7.260.000	1,00	$ 2.420.000	1,00	$ 2.420.000	2,00	$ 4.840.000	1,00	$ 2.420.000
1	Esp. Electrico	$ 6.050.000	20%	3,00	$ 3.630.000	1,00	$ 1.210.000	1,00	$ 1.210.000	2,00	$ 2.420.000	1,00	$ 1.210.000
1	Esp. Hidraulico	$ 6.050.000	20%	3,00	$ 3.630.000	1,00	$ 1.210.000	1,00	$ 1.210.000	2,00	$ 2.420.000	1,00	$ 1.210.000
1	Esp. Ambiental	$ 6.050.000	20%	3,00	$ 3.630.000	1,00	$ 1.210.000	1,00	$ 1.210.000	2,00	$ 2.420.000	1,00	$ 1.210.000
	PERSONAL TECNICO												
1	Inspector SISO	$ 3.300.000	40%	7,00	$ 9.240.000	6,58	$ 8.685.600	0,42	$ 554.400	7,00	$ 9.240.000	0,00	$ 0
	PERSONAL ADMINISTRATIVO												
1	Contador	$ 3.300.000	15%	7,00	$ 3.465.000	6,58	$ 3.257.100	0,42	$ 207.900	7,00	$ 3.465.000	0,00	$ 0
1	Abogado	$ 3.300.000	15%	7,00	$ 3.465.000	6,00	$ 2.970.000	1,00	$ 495.000	7,00	$ 3.465.000	0,00	$ 0
1	Secretaria 1	$ 1.980.000	50%	8,00	$ 7.920.000	6,58	$ 6.514.200	1,00	$ 990.000	7,58	$ 7.504.200	0,42	$ 415.800
	PERSONAL AUXILIAR TECNICO												
1	Cadenero 1	$ 2.200.000	30%	3,00	$ 1.980.000	1,00	$ 660.000	1,00	$ 660.000	2,00	$ 1.320.000	1,00	$ 660.000
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)				$ 149.930.000		$ 120.481.900		$ 18.835.300		$ 139.317.200		$ 10.612.800
	FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,19		2,19		2,19		2,19		2,19
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)				$ 328.348.700		$ 263.855.361		$ 41.249.307		$ 305.104.568		$ 23.242.032

CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO ($)		UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)	UTILIZACION	VALOR PARCIAL ($)
(8)			(9)		(10)	(8)*(9)*(10) = (11)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)	(10)	(8)*(9)*(10) = (11)
	OTROS COSTOS DIRECTOS													
	COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA													
	Equipo completo de topografia	Según comprobante por mes	$ 685.000		4,00	$ 2.740.000	1,00	$ 685.000	1,00	$ 685.000	2,00	$ 1.370.000	2,00	$ 1.370.000
	Resistencia a la compresión de concreto hidráulico	8,00	$ 65.000			$ 520.000	3,00	$ 195.000	1,00	$ 65.000	4,00	$ 260.000	4,00	$ 260.000
	COMPACTACION PROCTOR MODIFICADO	8,00	$ 75.000			$ 600.000	1,00	$ 75.000	1,00	$ 75.000	2,00	$ 150.000	6,00	$ 450.000
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					$ 3.860.000,00		$ 955.000,00		$ 825.000,00		$ 1.780.000,00		$ 2.080.000,00
	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					$ 332.208.700,00		$ 264.810.362,00		$ 42.074.307,00		$ 306.884.669,00		$ 25.322.031,00
	IMPUESTO Y RETENCIONES DE LEY				12%	$ 39.864.804,00	12%	$ 31.777.243,00	12%	$ 5.048.917,00	12%	$ 36.826.160,00	12%	$ 3.038.644,00
	SUBTOTAL CON IMPUESTO					$ 372.071.504,00		$ 296.587.605,00		$ 47.123.224,00		$ 343.710.829,00		$ 28.360.675,00
	IVA				19%	$ 70.693.586,00	19%	$ 56.351.645,00	19%	$ 8.953.413,00	19%	$ 65.305.059,00	19%	$ 5.388.528,00
	COSTO TOTAL = (E) + (F)					$ 442.765.090,00		$ 352.939.251,00		$ 56.076.637,00		$ 409.015.888,00		$ 33.749.202,00

FIRMA
NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO INTEROBRAS DEPORTIVAS 2024
NOMBRE REP LEGAL: ING. EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ

FIRMA
NOMBRE SUPERVISOR: ING. WILSON DELGADO REYES
INDERVALLE

VoBo.
NOMBRE: MARIA VIRGINIA CASTRO
APOYO SUPERVISION INDERVALLE

Powered by CamScanner

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICACION

Mediante la presente CERTIFICAMOS que nuestro cliente **CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024** identificado con NIT. **901.846.651-4** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE con la cuenta de ahorros No. **019-92748-2** la cual se encuentra **ACTIVA.**

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación **CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 10 de octubre del 2025 Dirigida a ***quién le pueda interesar***

Cordialmente,

Elizabeth Martinez

Maria Elizabeth Martinez Giraldo
Asesora de servicios
Banca empresarial

BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Banco de Occidente | *Del lado de los que hacen.*

Grupo AVAL

Powered by CamScanner

DECLARACIÓN JURAMENTADA

DE PAGO DE APORTES ALSISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

(ARTÍCULO 50, LEY 789 DE 2002)
(PERSONA NATURAL)

Que el ingeniero civil EDUARDO CÁRDENAS RODRÍGUEZ identificado con la cedula de ciudadanía número 16.254.057 expedida en la ciudad de Palmira (V), en su calidad de representante legal del CONSORCIO INTEROBRAS DEPORTIVAS 2024, con nit 901.846.651-4, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, conforme al cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en consecuencia se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto referente al pago de aportes y de salarios, hasta el mes de octubre de 2025.

La presente certificación va dirigida al INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA INDERVALLE
Dado en Cali a los doce (12) días del mes de noviembre de 2025.

Cordialmente,

EDUARDO CARDENAS RODRIGUEZ
C.C. 16.254.057
Representante Legal
CONSORCIO INTEROBRAS DEPORTIVAS 2024

SANDRA PATRICIA PEÑA BURBANO
C.C. 38.460.488 de Cali
Contador Público- TP 161319-T

Powered by CamScanner

'ORTE, LA EDUCACION FISICA Y RECREACION DEL

NIT

COMPROBANTE EGRESO No: 20

CON AFECTACIÓN **FECHA: 15/12/2025**

A FAVOR DE: CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024 **CEDULA O NIT: 901846651**

DESCRIPCION: SGR-RP-325-2025 PAGO FACT FEOD9 INFORME NO. 8 POR VALOR 47.123.224 MAS IVA 8.953.413 TOTAL 56.076.637 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. IND-24-3154, REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS: MEJORAMIENTO SALÓN MÚLTIPLE RECREATIVO BARRIO LAS CEIBAS

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
38	1295057	56,076,637.00	4,570,952.00	2,596,489.00	0.00	48,909,196.00
	TOTAL	56,076,637.00	4,570,952.00	2,596,489.00	0.00	48,909,196.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
275239	Traslado	317	29- SGR ADECUACIÓN DE	901846651	CONSORCIO INTER OBRAS DEPORTIVAS 2024	48,909,196.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
244024005	SGR TASA PRODEPORTE 2,5% DEC.1405-2020	1,178,081.00
244035008	SGR E.PRO UNIVALLE 2%	942,464.00
244035009	SGR E. PRO DESARROLLO 2%	942,464.00
244035010	SGR E. PRO HOSPITALES 1%	471,232.00
244035011	SGR E. PRO CULTURA 1%	471,232.00
244035013	SGR E. PRO UCEVA 0,5%	235,616.50
244035014	SGR E. PRO UPACIFICO 0.5%	235,616.50
244035023	SGR E. PRO ELECTRIFICACION RURAL: 0.2%	94,246.00

RETENCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
243625002	SGR RETEIVA 15%	1,343,012.00
243626003	SGR RETEFUENTE 2% CONST.OBRA PUBLICA	942,464.00
243627009	SGR RETEICA 6.6x1000	311,013.00



ALEXANDER GARCIA ROJAS
TESORERIA

ELABORADO POR:DIANA FERNANDA ORDOÑEZ ESCOBAR
