INFORME DE SUPERVISION PARA EL PAGO UNICO

NOMBRE CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARBOL SOLO		
IDENTIFICACIÓN:	890.212863-9		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	9499	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ __X__	
	DECLARA:	SI __X__ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	ACTIVIDADES DE OTRAS ASOCIACIONES N.C.P		
SUPERVISOR:	CAMILO JOSE BLANCO RANGEL - Secretario de Infraestructura		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONVENIO SOLIDARIO		
NÚMERO DE CONTRATO	CDRE-SOC-2025-013	**FECHA:** 31/07/2025	
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA ARBOL SOLO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO, SANTANDER.		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo del convenio solidario será UN (01) MES, contados a partir de la firma del acta de inicio.		
VALOR:	Para efectos de la celebración del Convenio Solidario, el presupuesto oficial estimado asciende a la suma de **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DIECISIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS MCTE ($39.820.017,06).** Para efecto de aportes conjuntos, se tendrá en cuenta lo siguiente: - Por el Municipio de El Socorro la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE. ($38.467.517,06).** - Por parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda Árbol Solo del Municipio del Socorro, se aportará la mano de obra no calificada para la realización de la obra por un valor de **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($1.352.500,00)** y de un ingeniero civil.		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8149080		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00608	**FECHA:** 24/06-2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00980	**FECHA:** 01/08/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo/Fte de financiación: SGPI SGP LIBRE INVERSION – OTROS SECTORES 2: Total gastos administración central 2.3: INVERSION 2.3.2: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2.3.2.02: ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 2.3.2.02.01: MATERIALES Y SUMINISTROS 2.3.2.02.01.003: OTROS BIENES TRANSPORTABLES		

	2.3.2.02.01.003.02: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACION E INNOVACION 2.3.2.02.01.003.02.24: TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.02.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.02.01.003.02.24.2402.2402041: Vía terciaria mejorada		
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	B-100018132 / B-100066048	
	COMPAÑÍA:	SEGUROS MUNDIAL	
	FECHA EXPEDICIÓN:	13/08/2025	
	FECHA DE APROBACIÓN:	26/08/2025	
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. El valor aportado por el Municipio será cancelado de la siguiente Manera: (i) Un único pago una vez se haya ejecutado la totalidad de la obra conforme a las condiciones establecidas, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARBOL SOLO.** El valor del valor del aporte del Municipio contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar por la ejecución del mismo, es decir, los establecidos por las leyes, ordenanzas y acuerdos municipales. Por lo tanto, la asociación no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y aportados por el Municipio y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	19/09/2025		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	18/10/2025		
PERIODO DE COBRO	19/09/2025		
	18/10/2025		
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NUMERO DE PLANILLA	35024153	35024189
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	NUMERO DE PLANILLA	35024153	35024189
APORTE A ARL	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	NUMERO DE PLANILLA	35024153	35024189

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES -ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUB-BASE GRANULAR	SE EVIDENCIA SUMINISTRO E INSTALACION DE 27.60m3 DE SUBBASE GRANULAR SE VERIFICA CON VISITA REALIZADA AL LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y MEMORIA DE CANTIDADES ANEXADAS AL PRESENTE INFORME	NINGUNA	CUMPLE

	2.3.2.02.01.003.02: LE:2 INFRAESTRUCTURA PARA LA TRANSFORMACION E INNOVACION 2.3.2.02.01.003.02.24: TRANSPORTE 2.3.2.02.01.003.02.24.2402: Infraestructura red vial regional 2.3.2.02.01.003.02.24.2402.2402041: Vía terciaria mejorada		
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	B-100018132 / B-100066048	
	COMPAÑÍA:	SEGUROS MUNDIAL	
	FECHA EXPEDICIÓN:	13/08/2025	
	FECHA DE APROBACIÓN:	26/08/2025	
FORMA DE PAGO:	Las obligaciones que resulten de la presente contratación serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente certificado disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal. El valor aportado por el Municipio será cancelado de la siguiente Manera: (i) Un único pago una vez se haya ejecutado la totalidad de la obra conforme a las condiciones establecidas, el cual se desembolsará una vez se suscriba el acta de recibo final, informe del supervisor y liquidación del respectivo convenio; pagos que se efectuaran a la cuenta bancaria de la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARBOL SOLO.** El valor del valor del aporte del Municipio contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar por la ejecución del mismo, es decir, los establecidos por las leyes, ordenanzas y acuerdos municipales. Por lo tanto, la asociación no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y aportados por el Municipio y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	19/09/2025		
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	18/10/2025		
PERIODO DE COBRO	19/09/2025		
	18/10/2025		
APORTE A SALUD	PERIODO DE COTIZACION	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	NUMERO DE PLANILLA	35024153	35024189
APORTE A PENSION	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	NUMERO DE PLANILLA	35024153	35024189
APORTE A ARL	PERIODO DE COTIZACION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
	NUMERO DE PLANILLA	35024153	35024189

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$ 39.820.017,06	
VALOR ANTICIPO:		$ 00,00
APORTE JUNTA DE ACCION COMUNAL		$ 1.352.500,00
UNICO PAGO PRESENTE ACTA: Fecha: 25/11/2025		$ 38.467.517,06
VALOR POR COBRAR:		$00,00
SUMAS IGUALES	**$ 39.820.017,06**	**$ 39.820.017,06**

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 25 de noviembre de 2025

Supervisor

CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARBOLSOLO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER". 2025

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

ITEM

1.1	Suministro e instalacion de Sub-base granular	UNIDAD	M3

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	VOLUMEN
1	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR	1	40,00	3,60	144,00	0,15	21,60
2	SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE GRANULAR	2	40,00	0,50	20,00	0,15	6,00
						CANTIDAD	27,60

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS



Ing. CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

ELI VESGA ARDILA
Presidente JAC VEREDA ARBOL SOLO

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARBOLSOLO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER". 2025


ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO


ITEM			
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2.000 PSI PARA SOLADO DE ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	VOLUMEN
1	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	2	40,00	0,20	8,00	0,05	0,80
2	SUMINISTRO CONCRETO PARA RIOSTRAS	15	5,00	0,20	1	0,05	0,75
						CANTIDAD	1,55

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

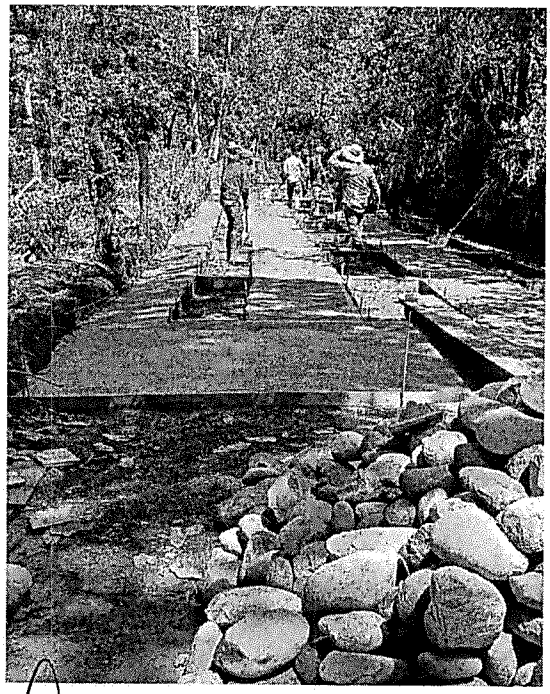

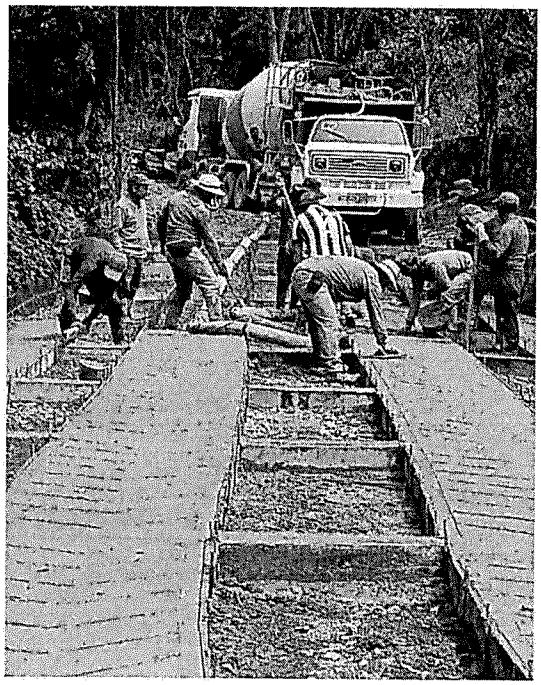

Ing. CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

ELI VESGA ARDILA
Presidente JAC VEREDA ARBOL SOLO

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARBOLSOLO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER". 2025


ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

ITEM			
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3.000 PSI PARA ESTRUCTURAS	UNIDAD	M3

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	VOLUMEN
1	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS HUELLAS	2	40,00	0,90	36,00	0,15	10,80
2	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS CUNETA	2	40,00	0,55	22,00	0,15	6,60
3	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS bordillo	2	40,00	0,20	8,00	0,55	8,80
4	Resta de Area bordillo inclinacion (2 triangulos)	-1	40,00	0,05	2,00	0,25	-0,50
5	SUMINISTRO CONCRETO PARA ESTRUCTURAS riostras vigas	15	5,00	0,20	1	0,15	2,25
						CANTIDAD	27,95

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

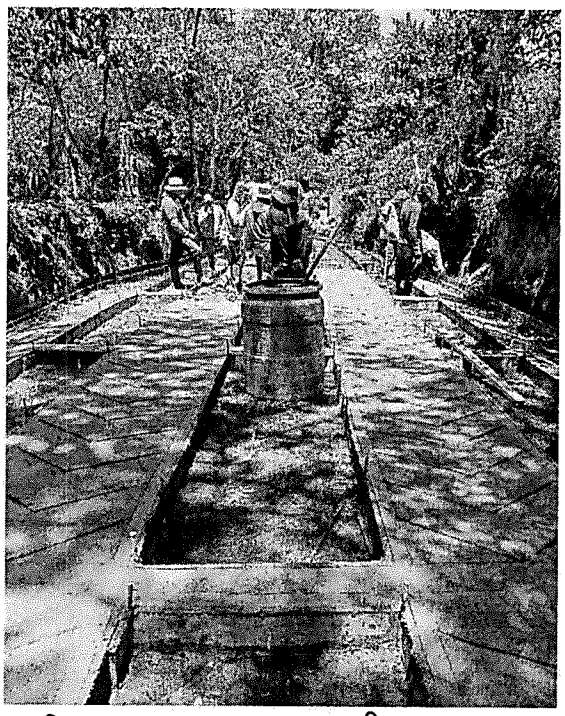



Ing. CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

ELI VESGA ARDILA
Presidente JAC VEREDA ARBOL SOLO

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARBOLSOLO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER". 2025

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO


ITEM

1.4	Suministro de Acero de refuerzo con varilla corrugada Fy=420 MPA ✓	UNIDAD	KG

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	DIAMETRO	N. LOSAS	kgxml	Kg
1	Acero de refuerzo longitudinal	22,00	40,00	1/2" ó N.4		0,996	876,48
2	Acero de ganchos	534,00	0,60	3/8" ó N.3		0,560	179,42
3	Acero transversal	134	2,20	N.2		0,250	73,70
4	Acero riostra flejes viga	31	1,00	N.2	15	0,250	116,25
5	Acero riostra longitudinal viga	4	4,85	1/2" ó N.4	15	0,996	289,81
						CANTIDAD	1535,67 ✓

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS

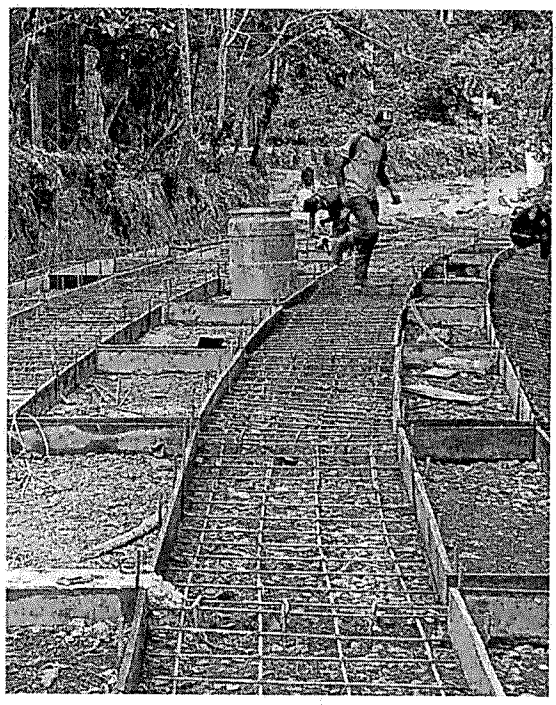



Ing. CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

ELI VESGA ARDILA
Presidente JAC VEREDA ARBOL SOLO

MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES

"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DEL SOCORRO Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA ARBOLSOLO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL VEREDAL DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO SANTANDER". 2025

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

ITEM

1.5	CONCRETO TIPO CICLOPEO DE 3.000 PSI. PORCENTAJE DE PIEDRA PEGADA DE 40% Y DE CONCRETO 60%	UNIDAD	M3

MEMORIAS DE CALCULO

N°	DESCRIPCION	CANTIDAD	LONGITUD	ANCHO	AREA	ALTO	TOTAL
1	Concreto ciclopeo huellas	1	40,00	1,80	72,00	0,15	10,80
						CANTIDAD	10,80

REGISTRO FOTOGRAFICO Y ESQUEMAS



Ing. CAMILO JOSE BLANCO RANGEL
Secretario de Infraestructura

ELI VESGA ARDILA
Presidente JAC VEREDA ARBOL SOLO
