


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1334	3	Antioquia, Zaragoza; Calle Principal, Salon Pastoral Piso 1	20Mbps	24,1

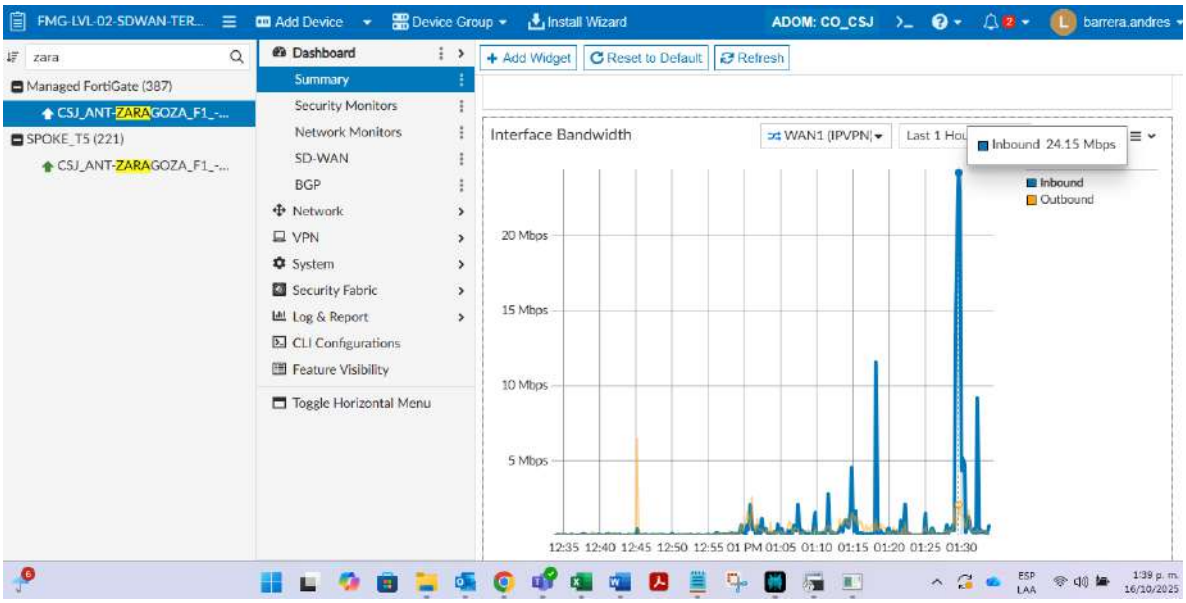


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1335	3	Antioquia, Yolombó; Cra 18 No 19-125	20Mbps	21,5

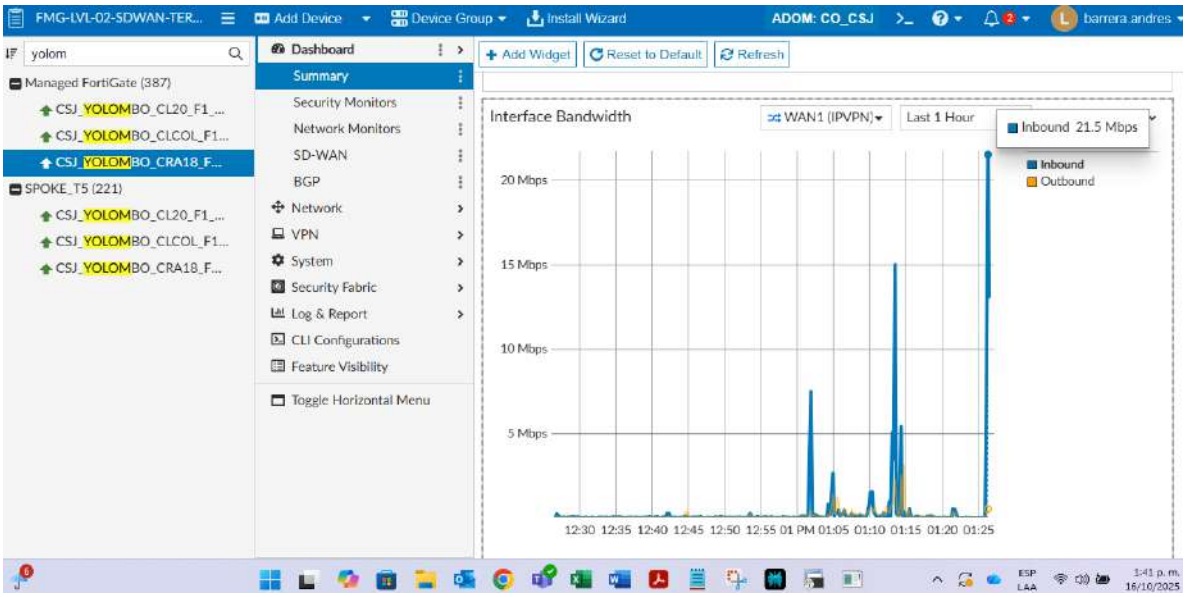


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1336	3	Nariño, Santa Cruz; Carrera 3 # 5-13	20Mbps	19,8

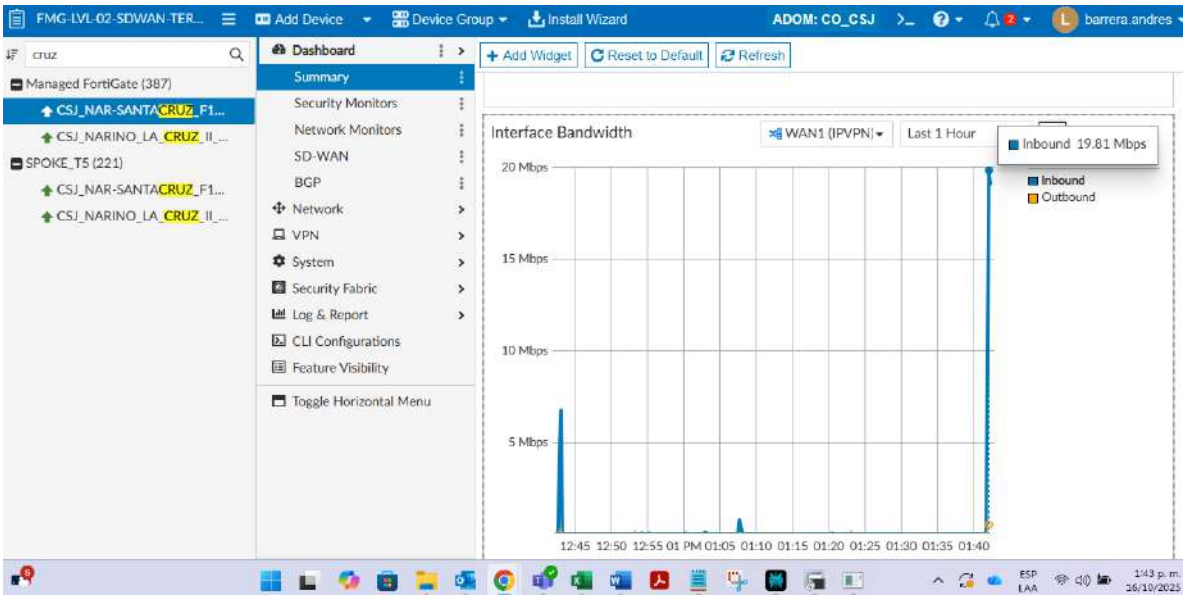


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1341	3	Antioquia, Yolombó; Calle Colombia # 20 - 288	20Mbps	24,6

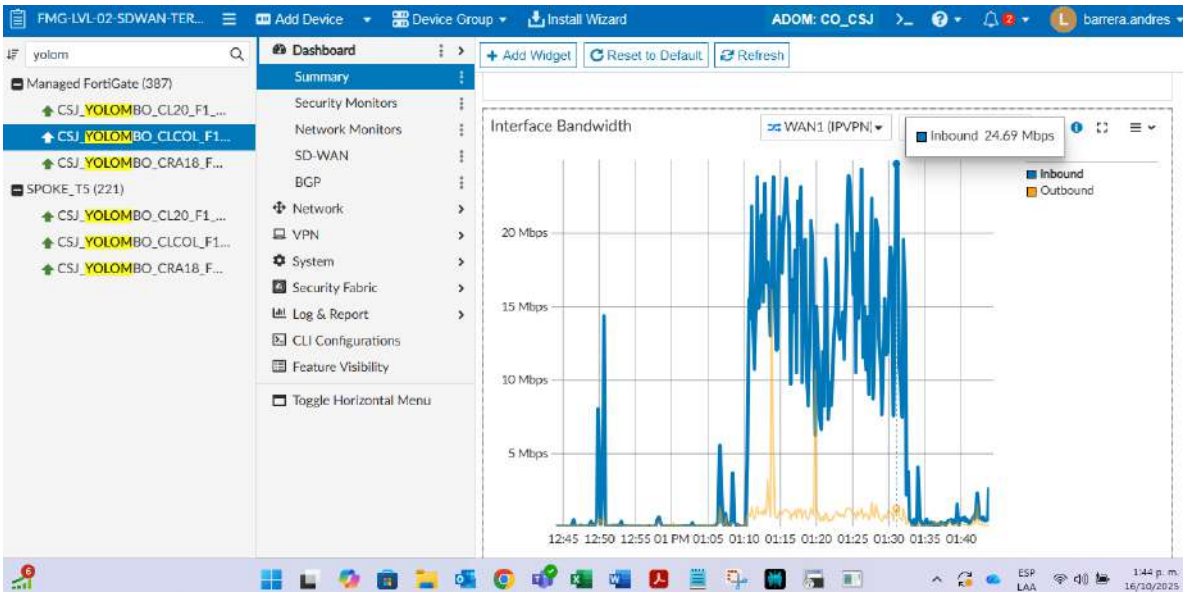


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1355	4	Antioquia, Angostura; Carrera 9 # 8-129 Piso 1	20Mbps	20,7

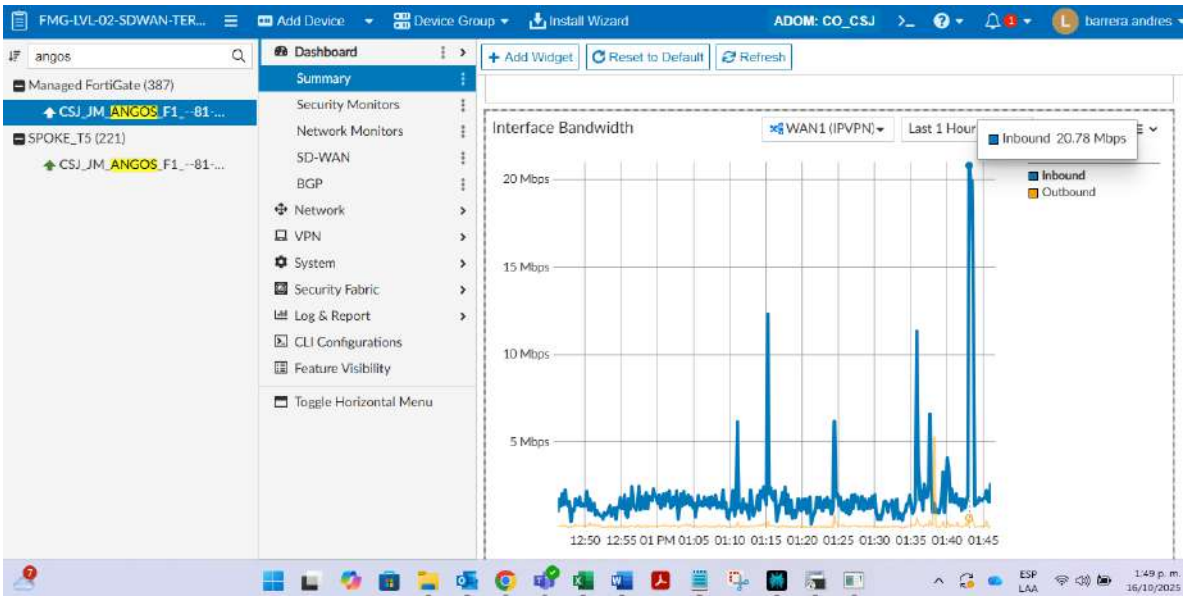


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1356	4	Antioquia, Betania; Carrera 20 # 19-42	20Mbps	64

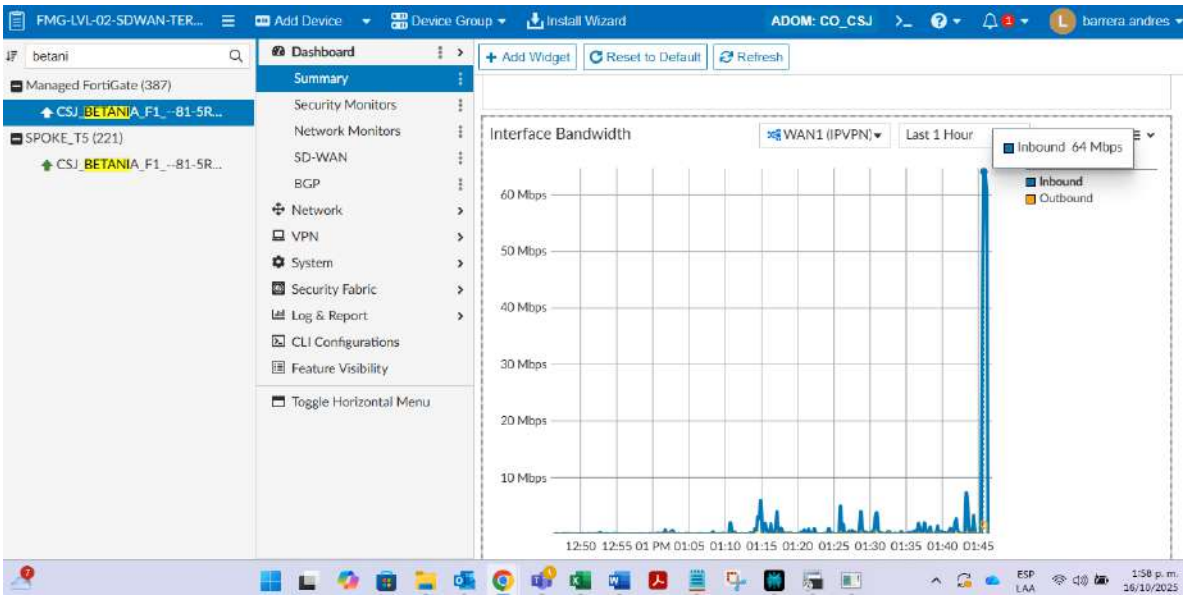


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1357	4	Antioquia, Betulia; Calle Principal	32 Mbps	34,5

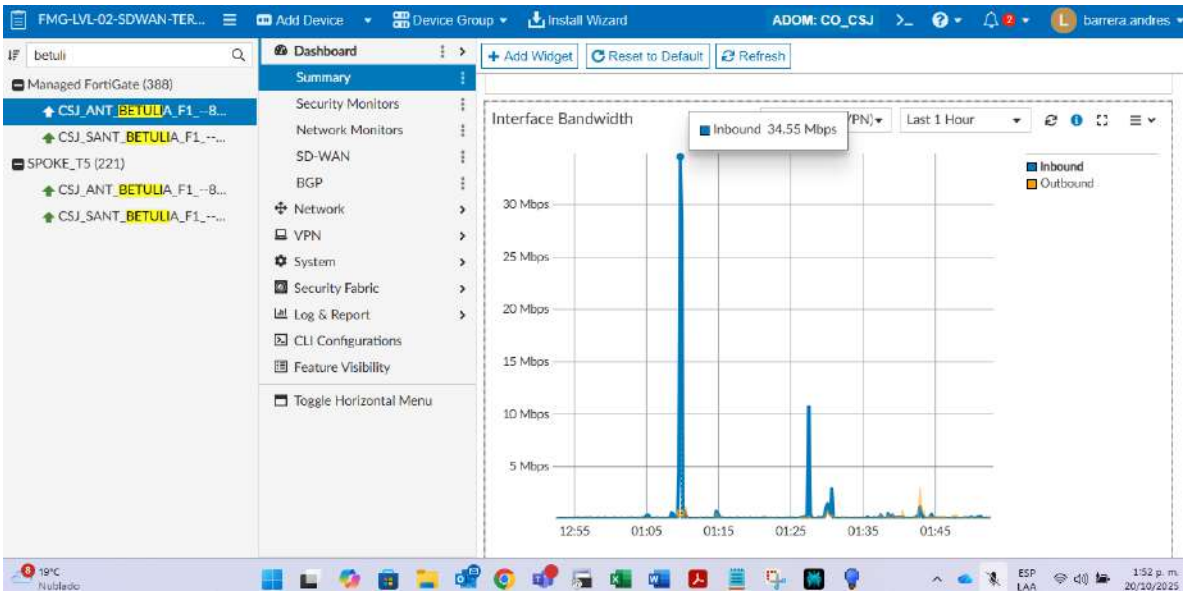


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1361	4	Antioquia, Ebéjico; Carrera 20 # 20-29	32 Mbps	35,7

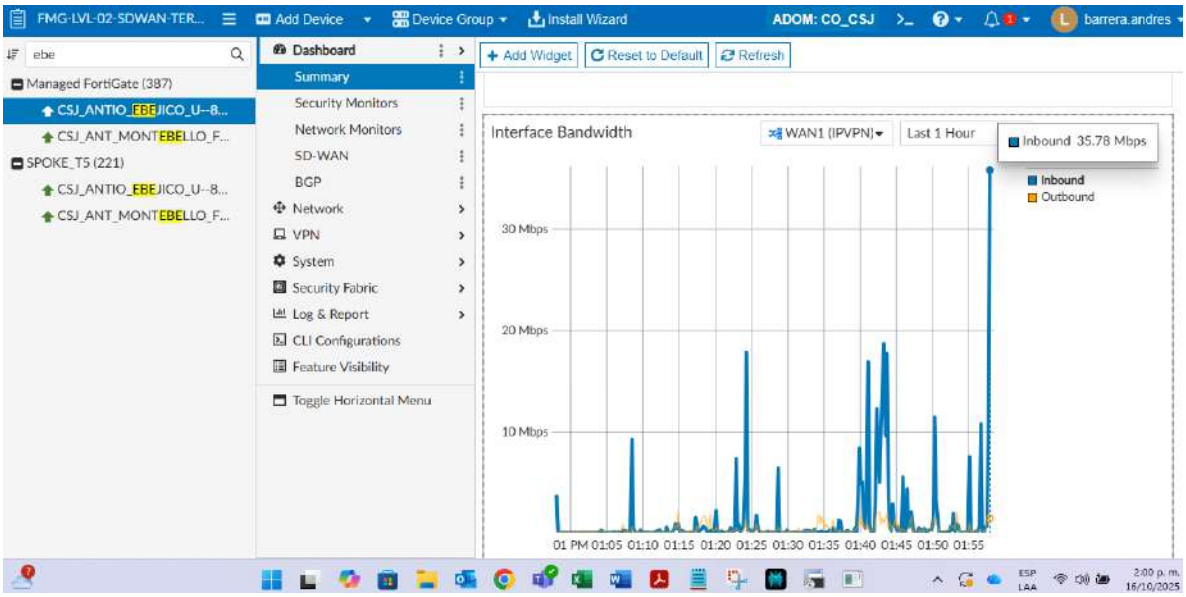


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1362	4	Antioquia, El Jardín; Carrera 5 # 11 -71 Piso 1	32 Mbps	30

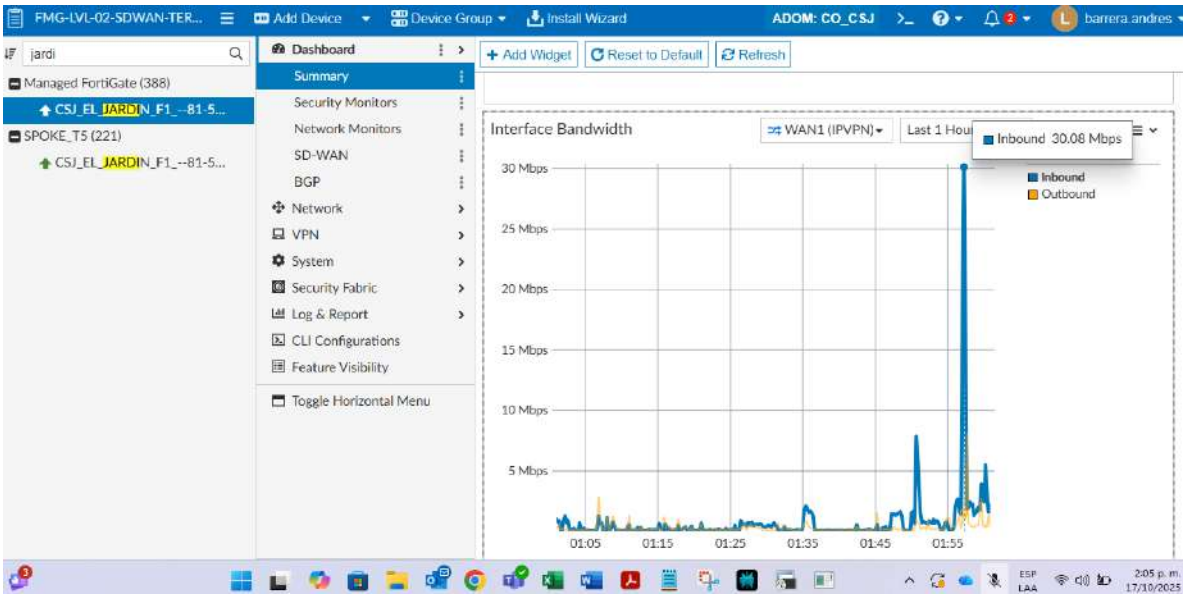


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1367	4	Antioquia, Pueblorrico; Palacio Municipal	32 Mbps	35,9

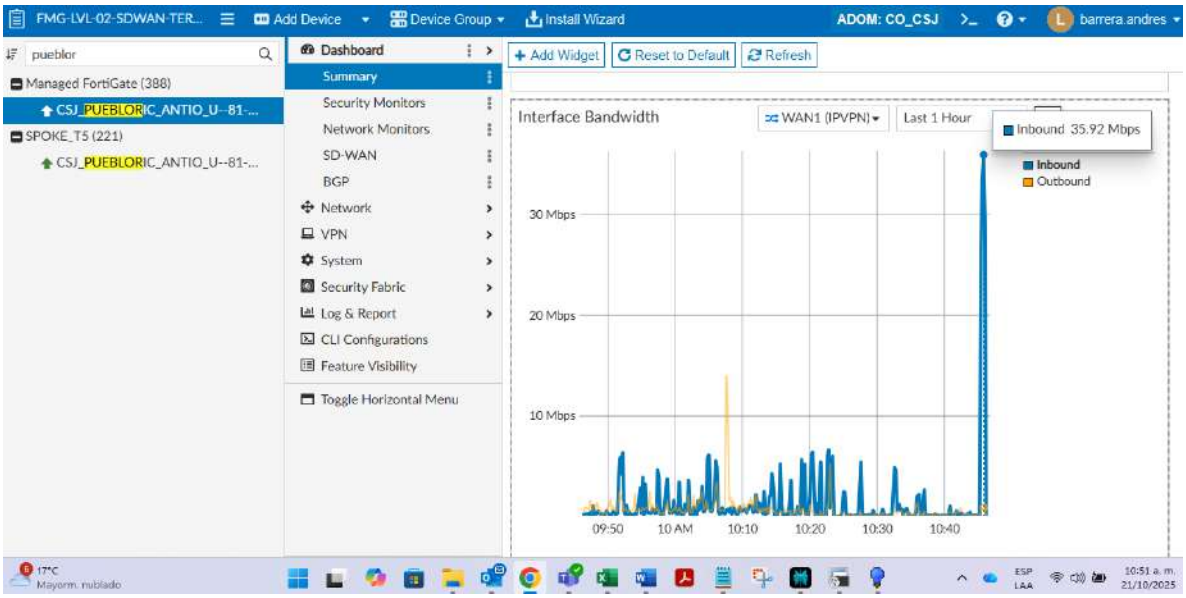


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1528	4	Antioquia, Montebello; Calle 20 # 21-20	32 Mbps	32,3

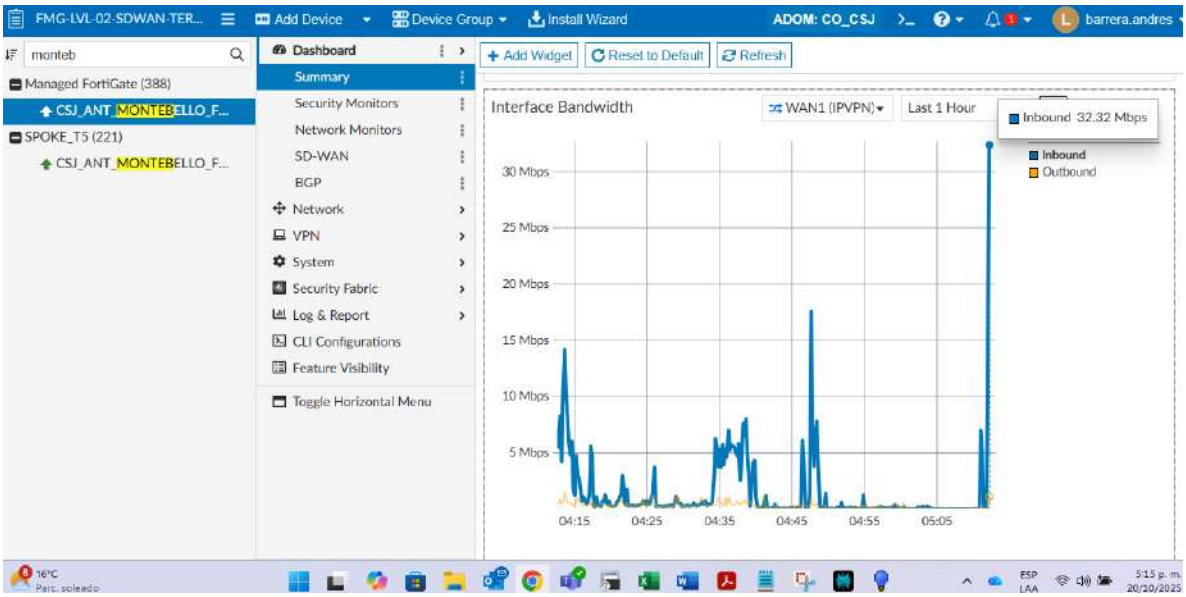


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1530	3	Antioquia, San Pedro de los Milagros; Carrera 51 # 49-27/35, Edificio Belen	32 Mbps	34,5

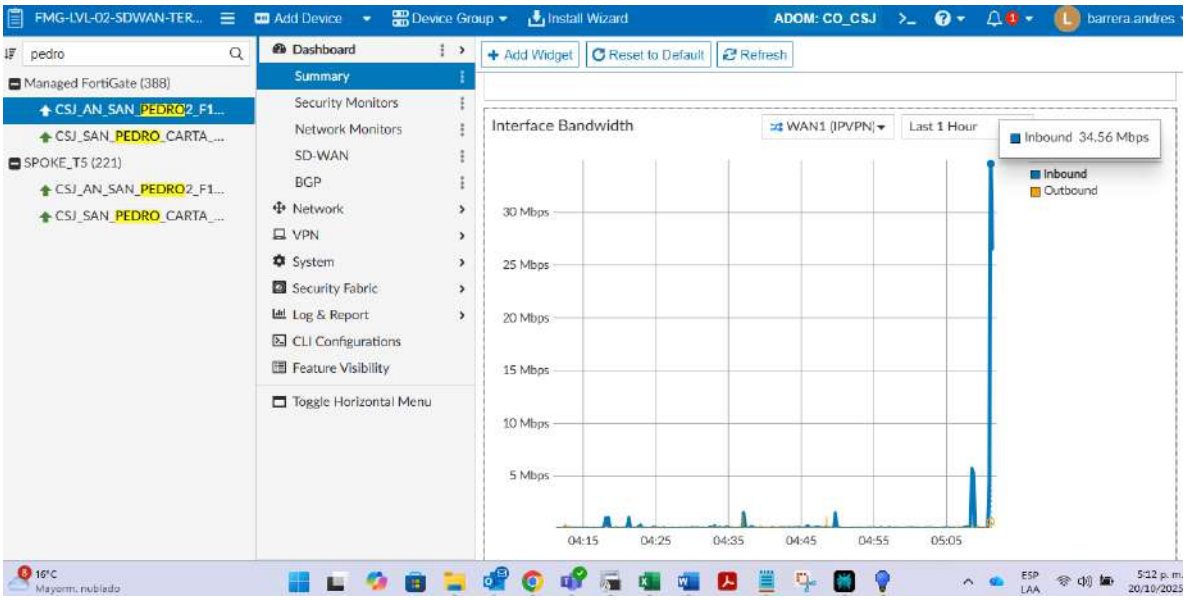


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1546	2	Cauca, Puerto Tejada; Carrera 20 # 23-42 Piso 1 Barrio La Esperanza	25 Mbps	23,8

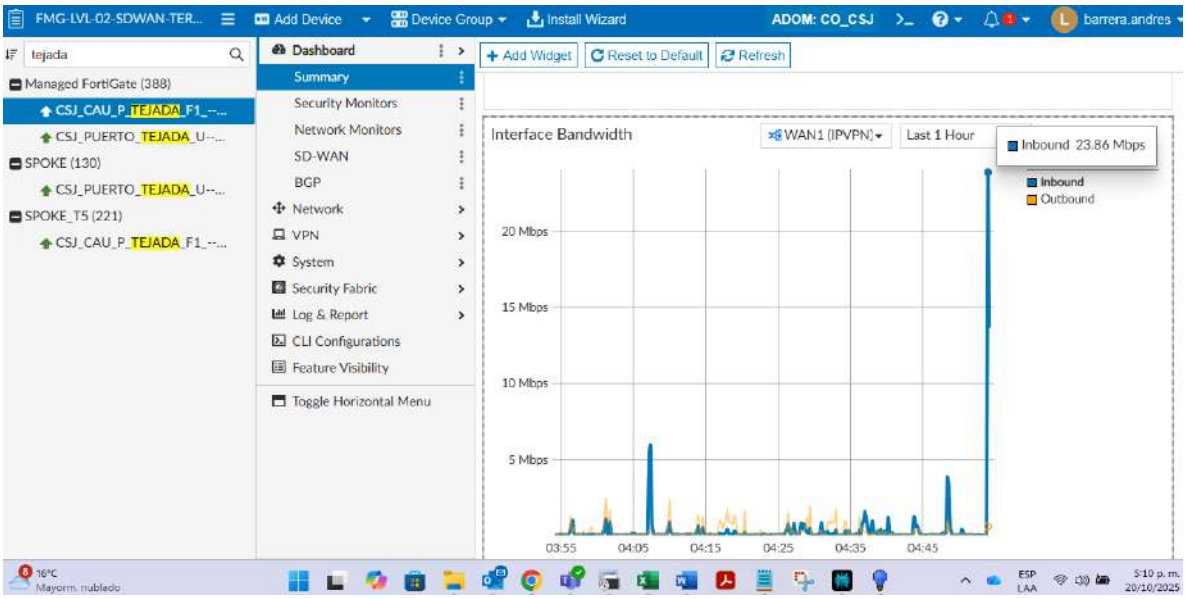


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1593	3	Sucre, Morroa; Calle 7 # 2-118	25 Mbps	24,7

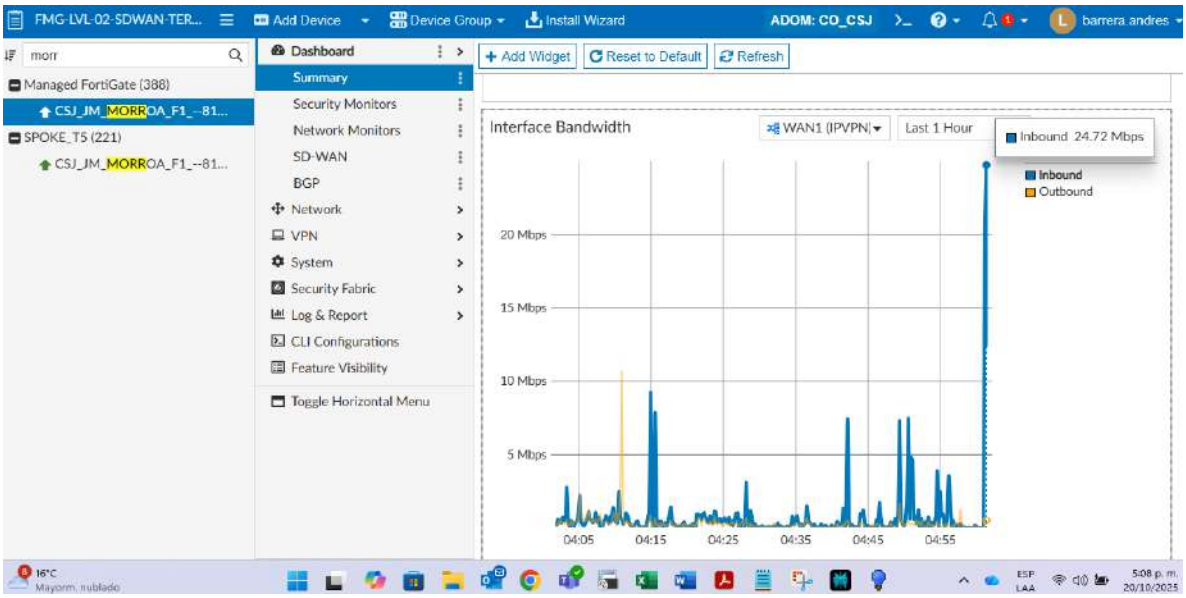


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1601	4	Antioquia, Concordia; Calle 18 # 19-10 Edificio Gabriel Mesa	32 Mbps	34,6

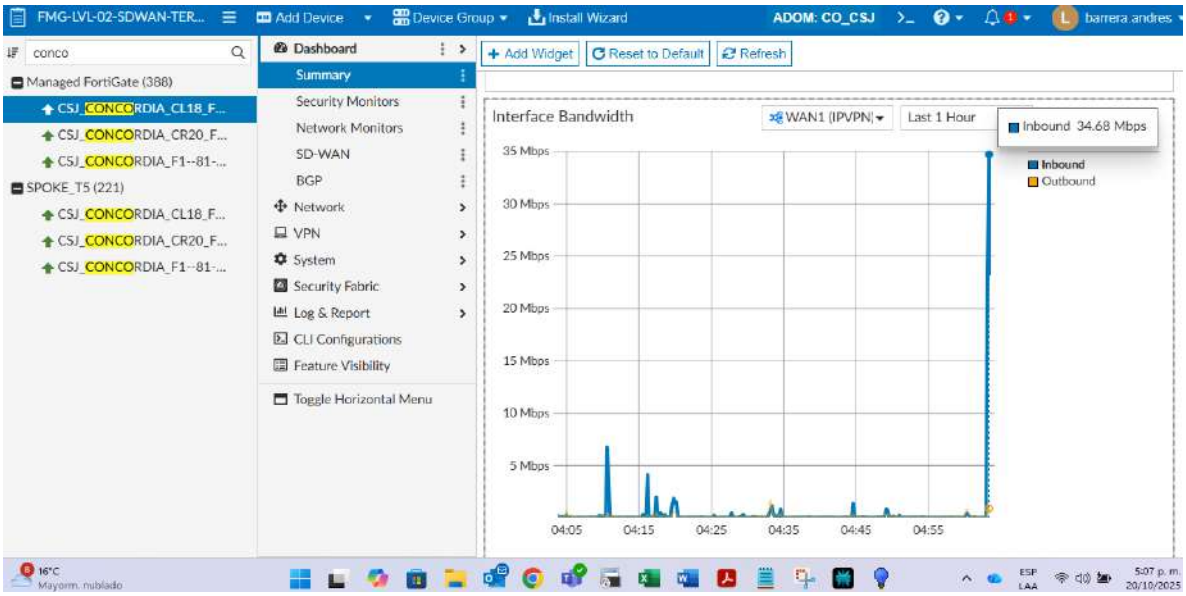


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1771	1	Caldas, Manizales; Carrera 23 # 21-48, Palacio de Justicia Fanny González Franco	384 Mbps	378

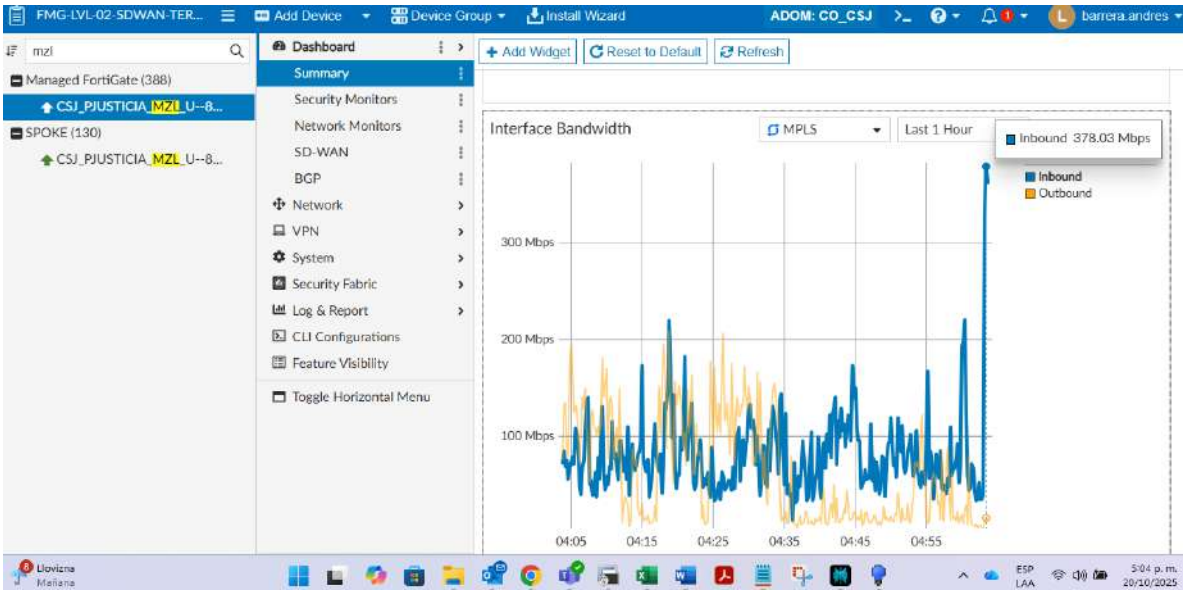


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1778	2	Casanare, Yopal; Carrera 14 # 13-60, Palacio de Justicia	128 Mbps	123,3

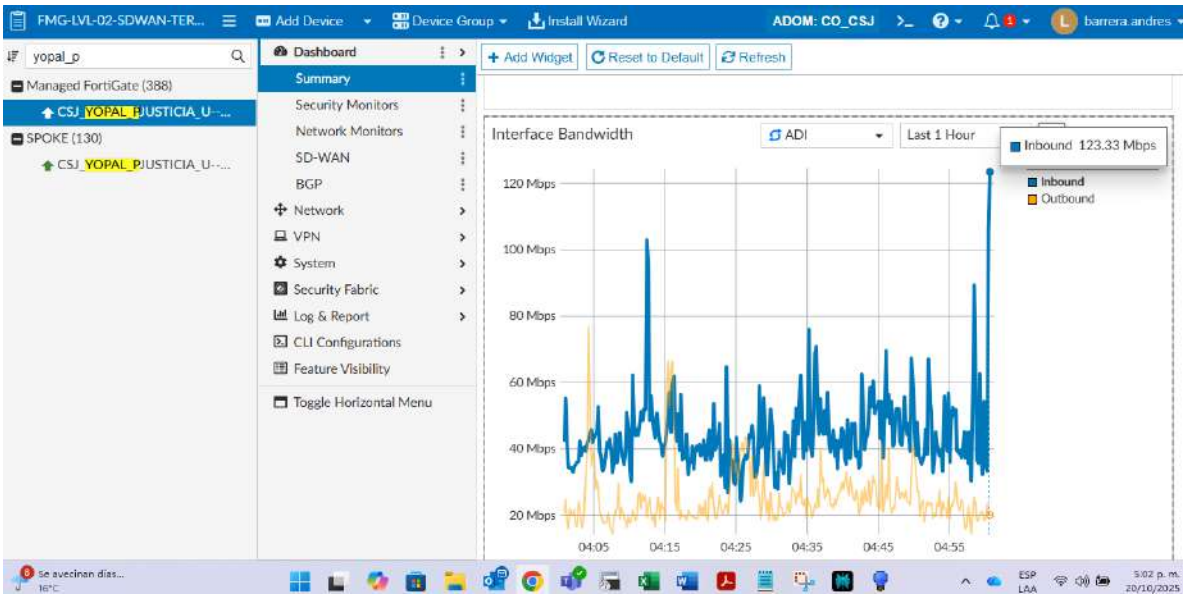


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1804	1	Magdalena, Santa Marta; Calle 23 # 5-63, Edificio Benavides Macea	128 Mbps	127,8

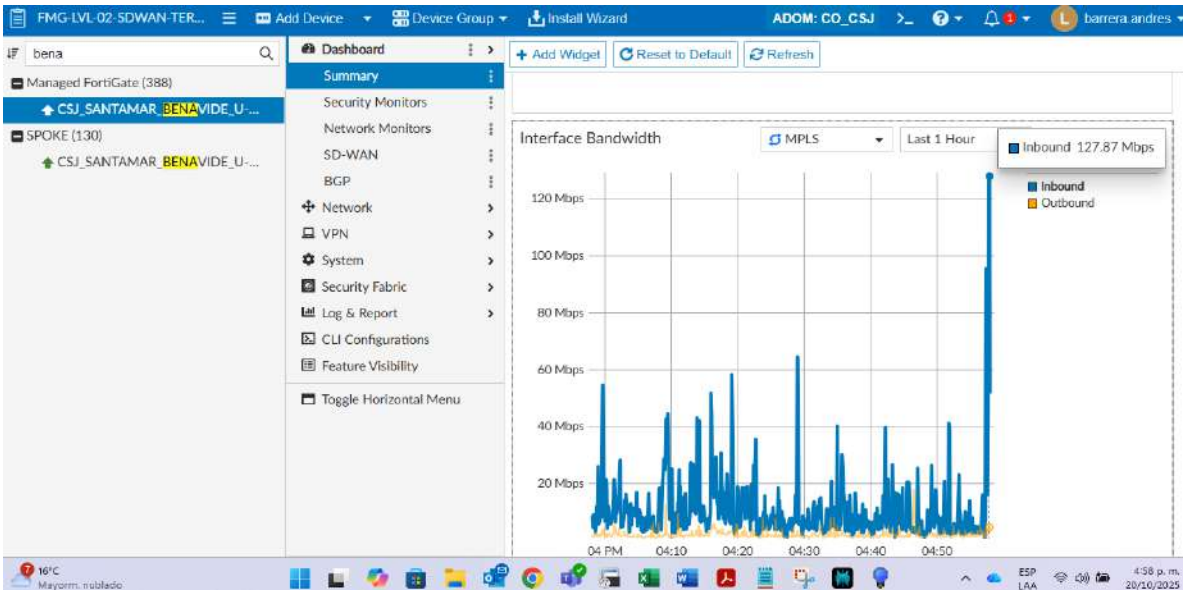


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1807	1	Antioquia, Medellín; Cra. 52 # 42-73, Edificio José Félix de Restrepo	400 Mbps	391,2

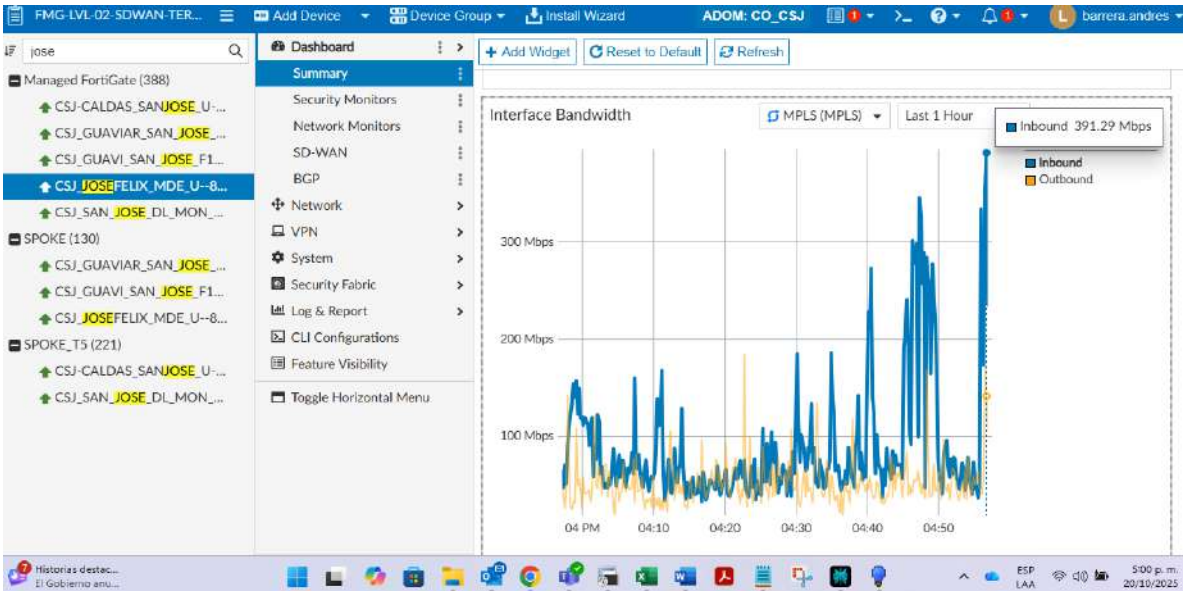


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1811	1	Huila, Neiva; Carrera 4 # 6-99, Palacio de Justicia	400 Mbps	389,6

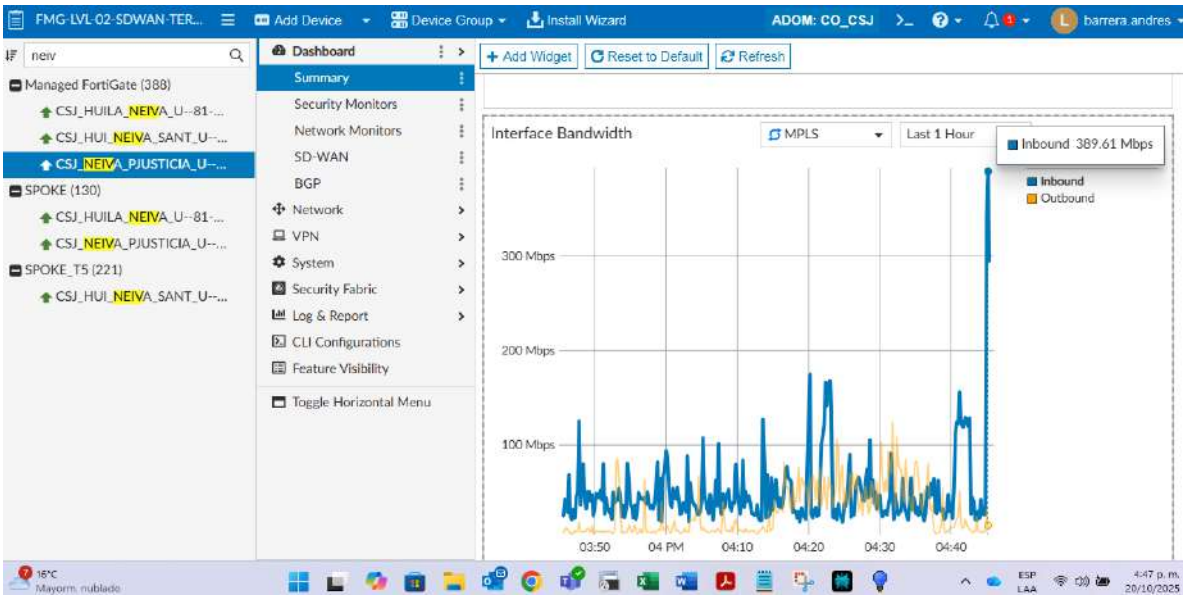


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1813	1	Cesar, Valledupar; Carrera 14 Calle 14 Esquina, Palacio de Justicia	256 Mbps	239,5

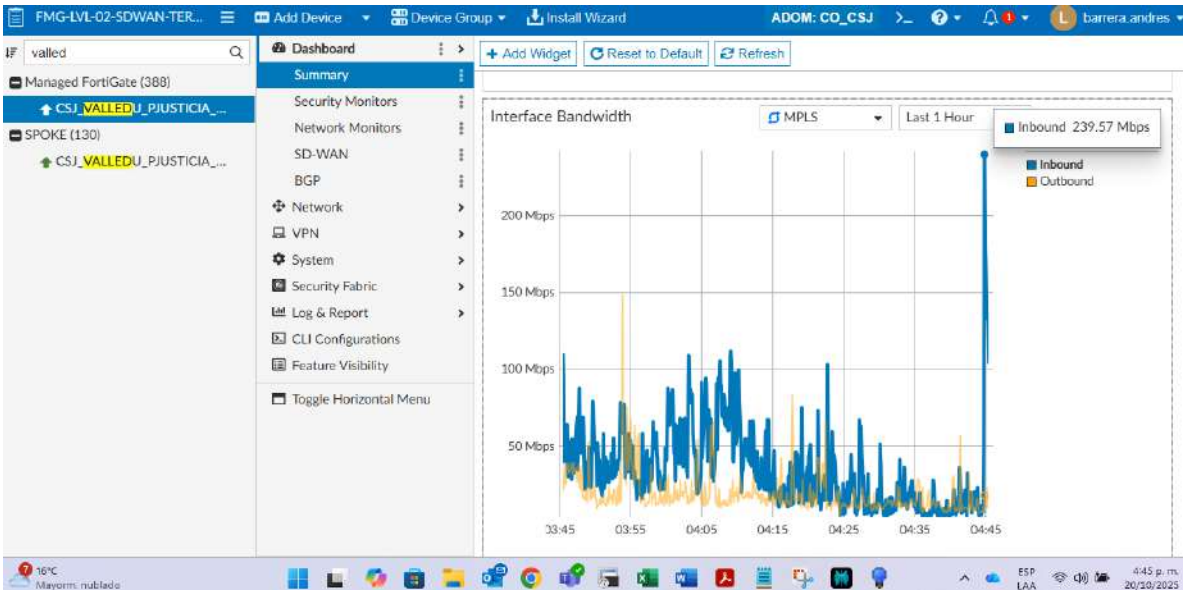


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1818	1	Quindío, Armenia; Carrera 12 # 20-63, Palacio de Justicia Fabio Calderón Botero	256 Mbps	251,3

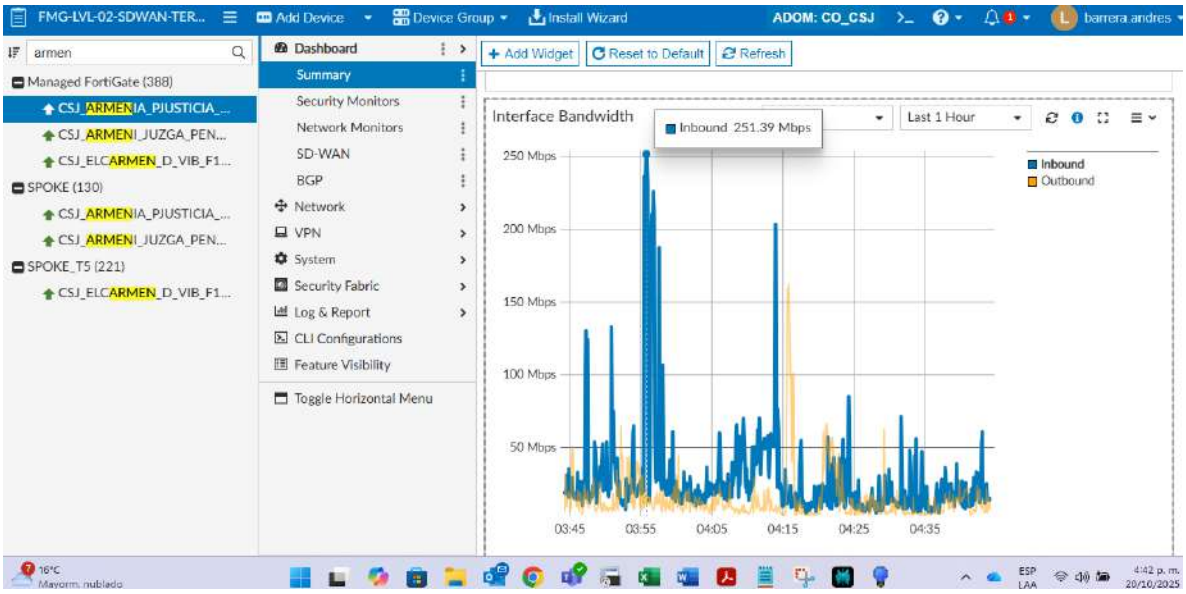


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1821	2	Cauca, Popayán; Calle 8 # 10-00, Palacio de Justicia	150 Mbps	141

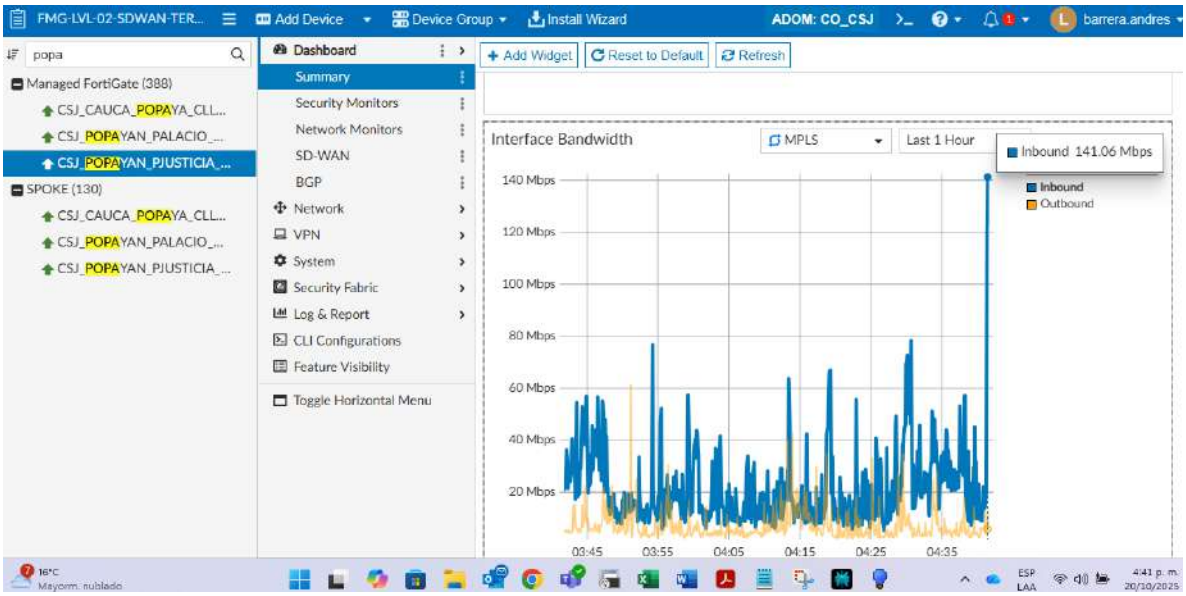


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1823	2	Casanare, Yopal; Carrera 14 # 13-60, Palacio de Justicia	128 Mbps	127,6

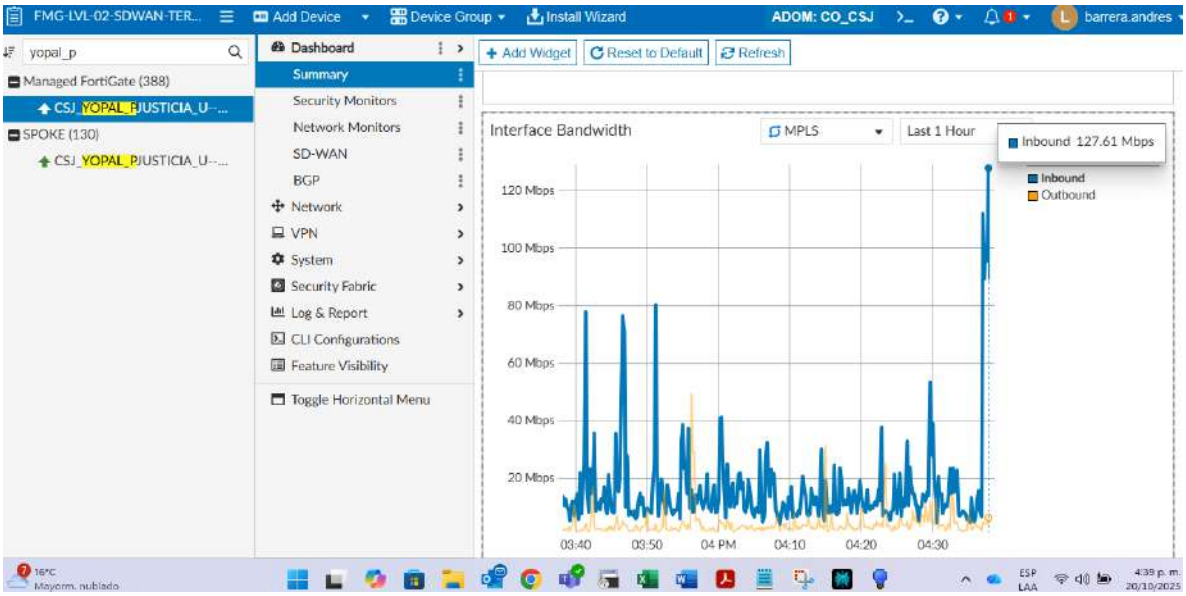


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1825	1	Valle Del Cauca, Cali; Carrera 4 # 12 -02, Palacio Nacional	256 Mbps	255,3

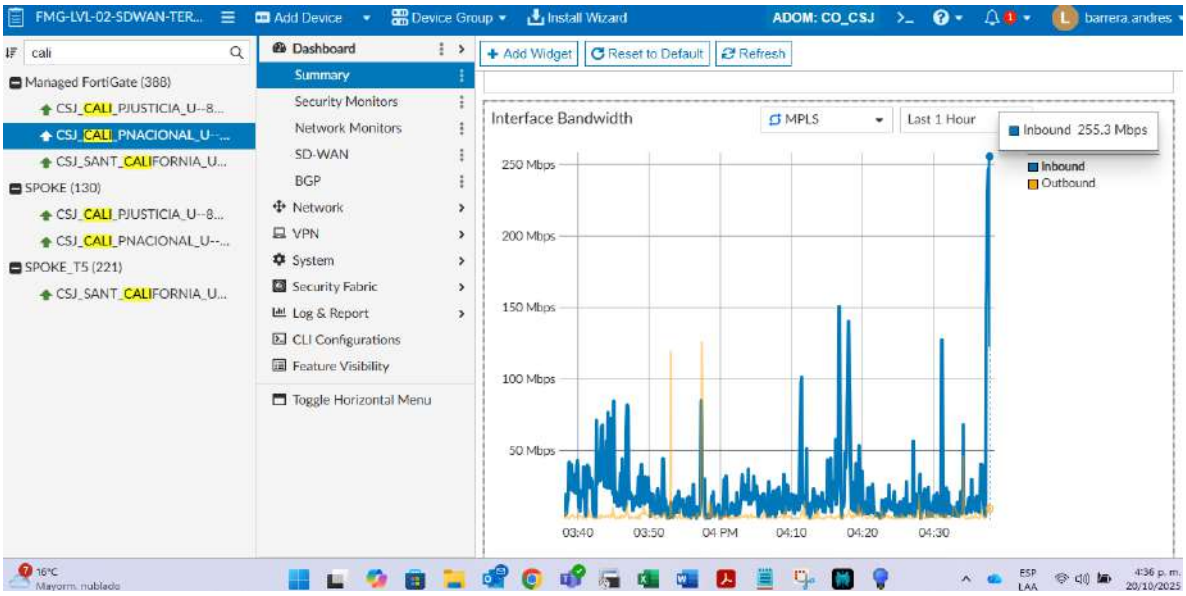


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1828	1	Valle Del Cauca, Cali; Calle 8 # 1-16, Edificio Entreceibas	256 Mbps	258,3

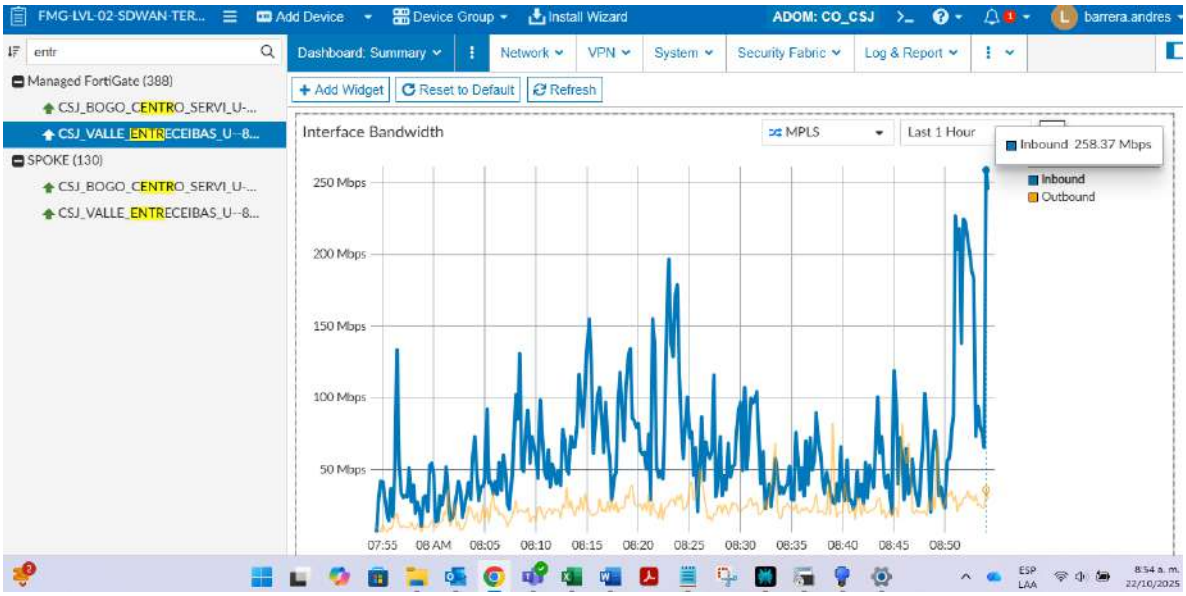


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1887	1	Cundinamarca, Bogotá; Sede Judicial del CAN, Carrera 57 # 43-91 Av. La Esmeralda	256 Mbps	237,3

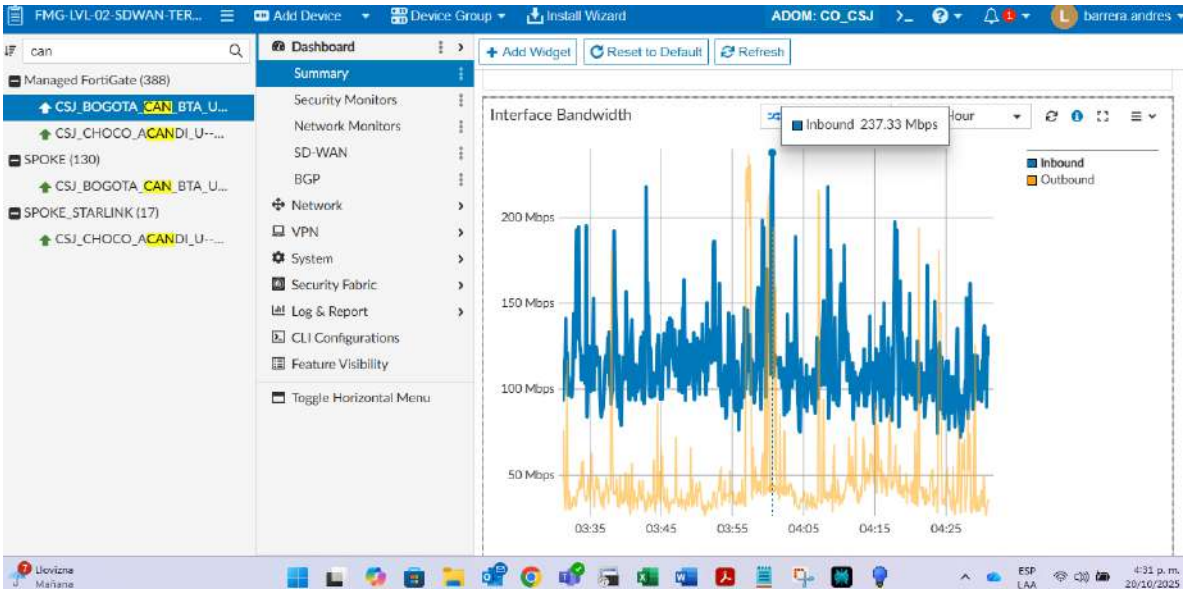


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1907	1	Cundinamarca, Bogotá; Sede Judicial del CAN, Carrera 57 # 43-91 Av. La Esmeralda	256 Mbps	259,3

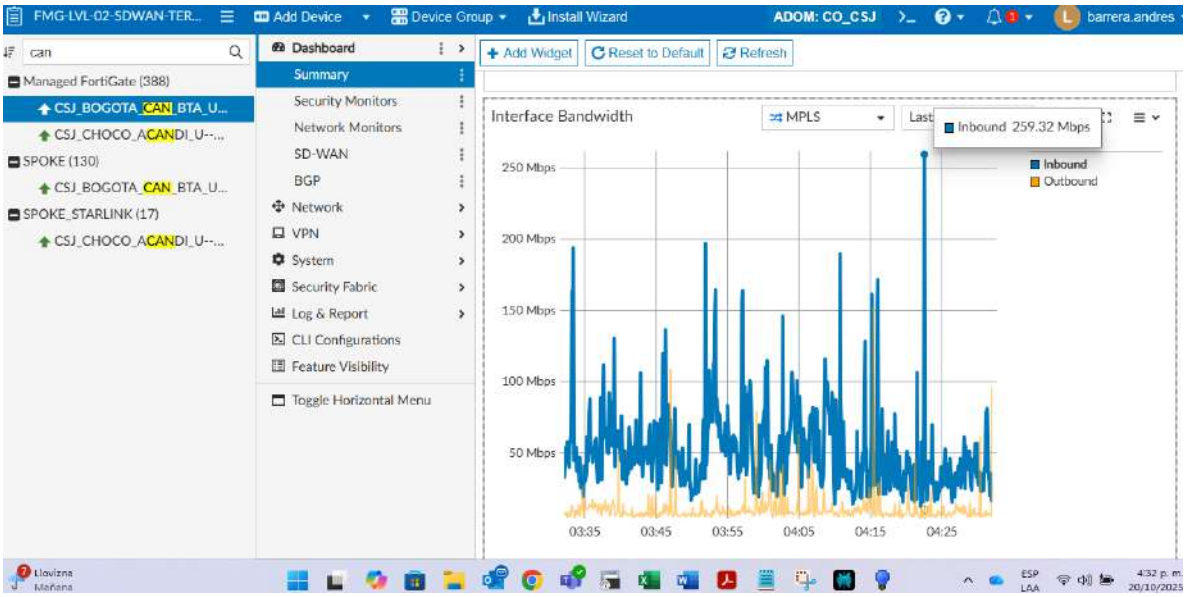


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1943	1	Antioquia, Itagüí; Carrera 52 # 51-40, Palacio de Justicia	128 Mbps	123,8

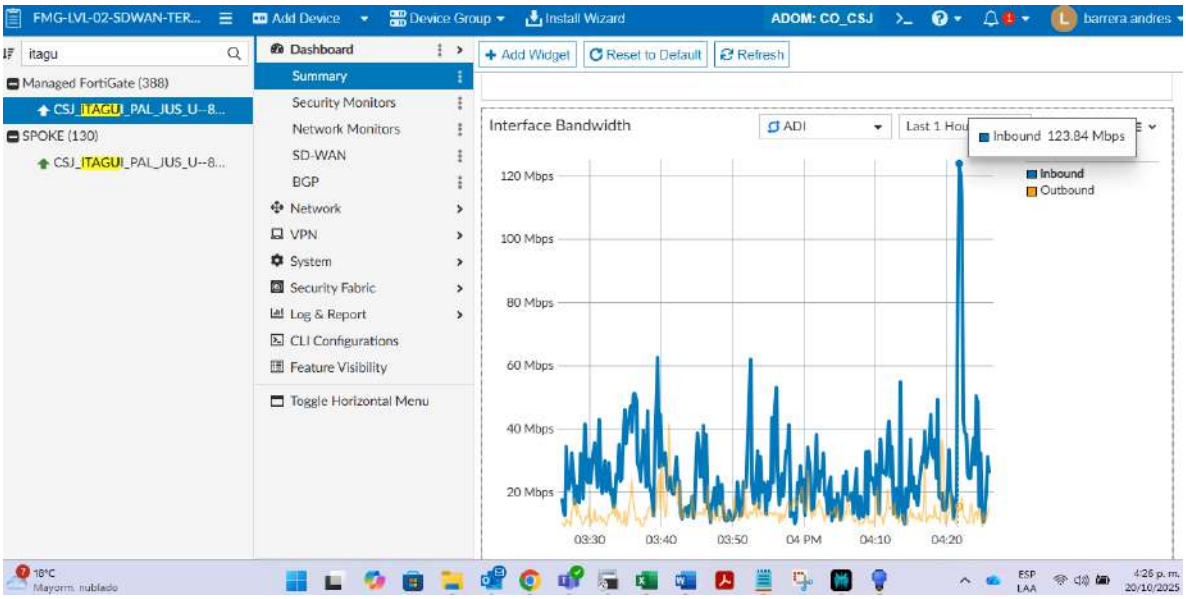


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1946	1	Atlántico, Barranquilla; Carrera 45 # 44-20, Tribunal Superior de Barranquilla	256 Mbps	253,5

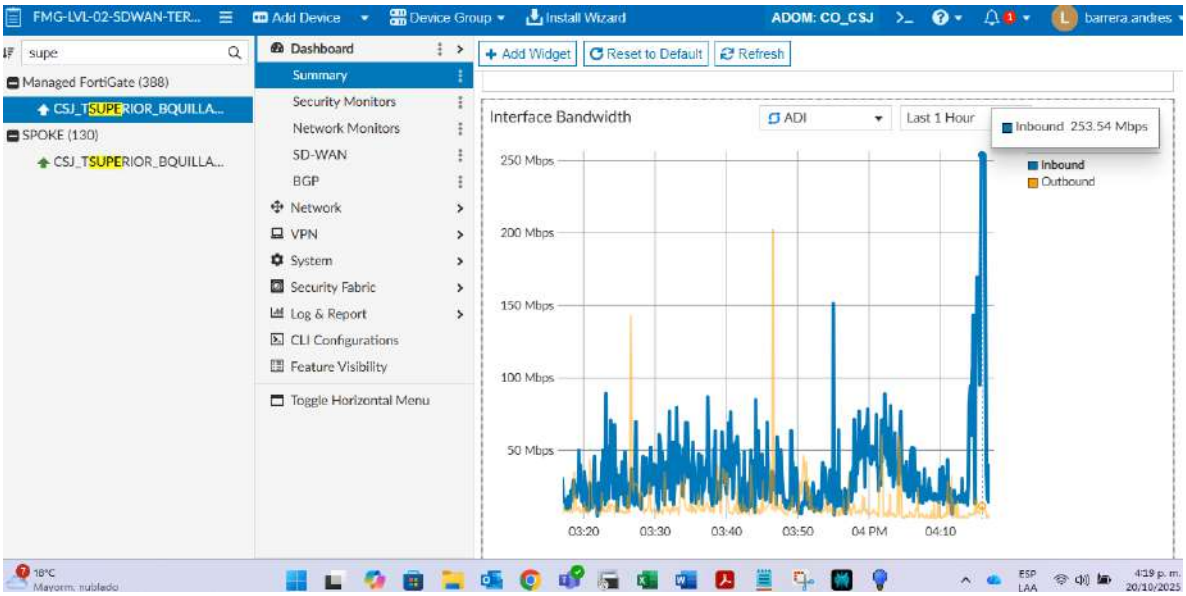


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1960	3	Antioquia, Turbo; Calle 100 # 13-75 Piso 4	128 Mbps	121,5

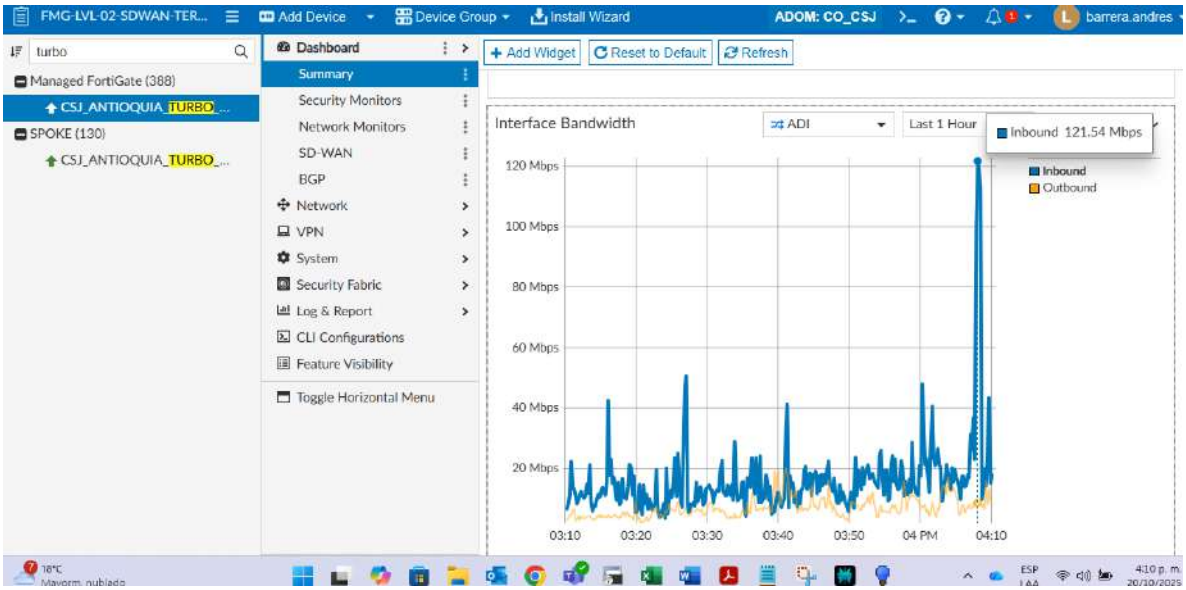


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1971	1	Antioquia, Itagüí; Carrera 52 # 51-40, Palacio de Justicia	128 Mbps	126,9

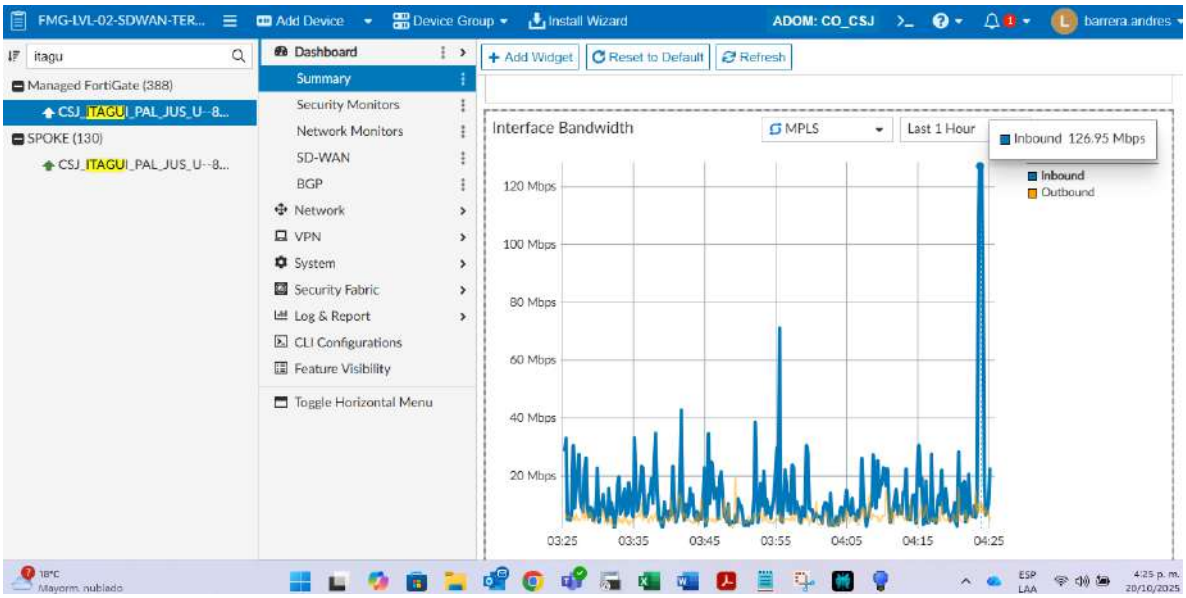


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1974	1	Atlántico, Barranquilla; Carrera 45 # 44-20, Tribunal Superior de Barranquilla	256 Mbps	258,4

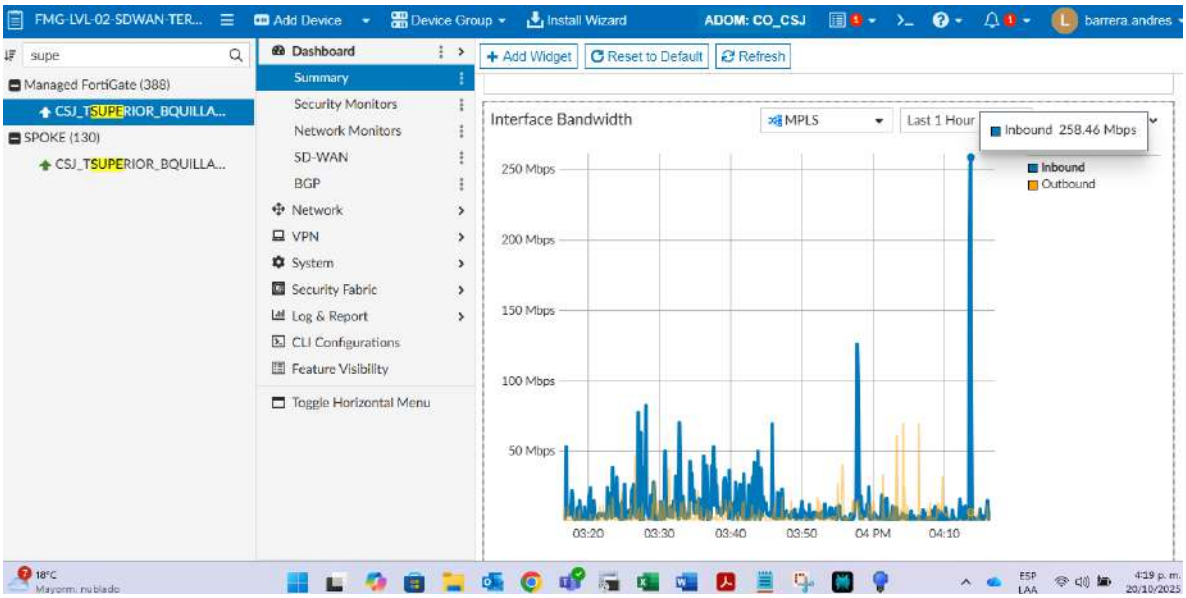


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1986	2	Antioquia, Rionegro; Carrera 47 # 60-50, Palacio de Justicia José Hernando Albeláez	256 Mbps	248,8

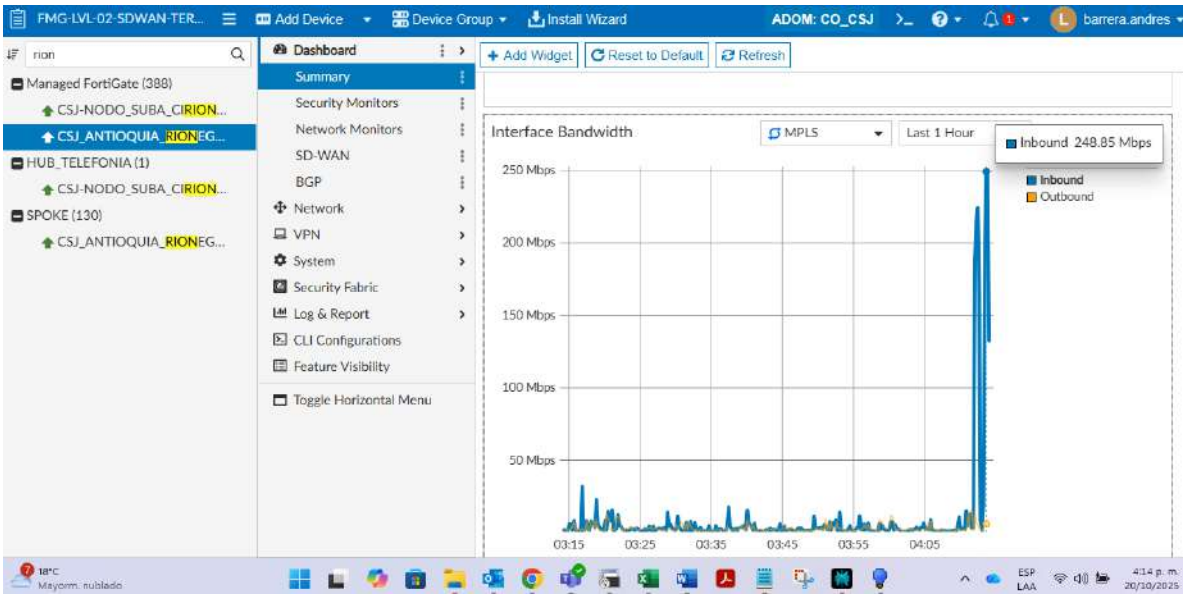


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1988	3	Antioquia, Turbo; Calle 100 # 13-75 Piso 4	128 Mbps	121,7

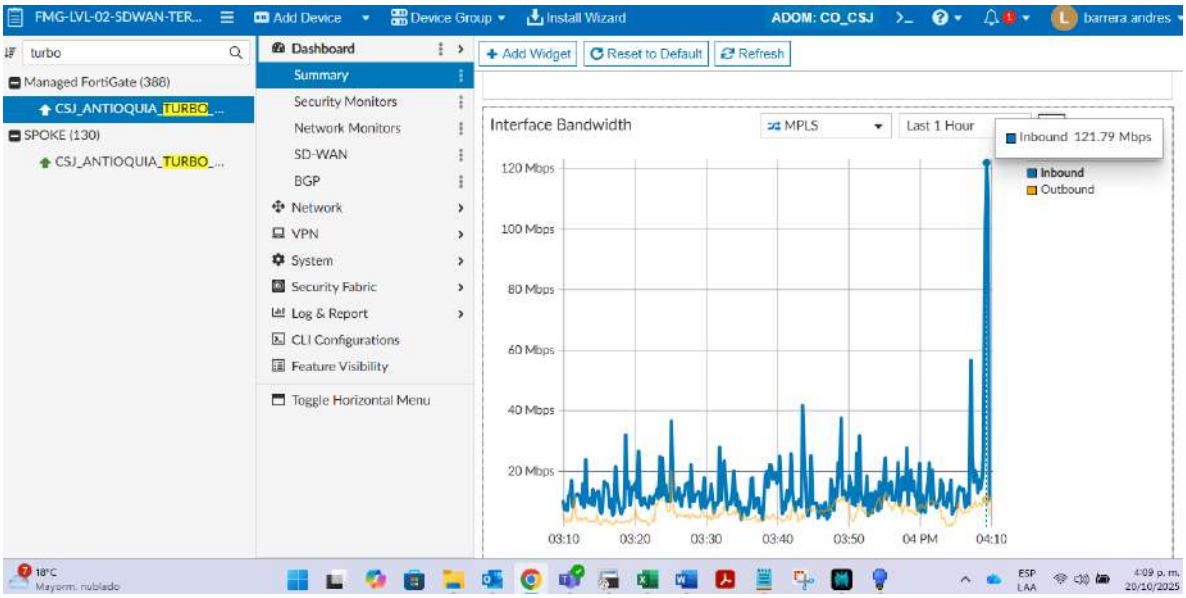


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
2105	1	Atlántico, Soledad; Calle 20 # 20-26 piso 3	256 Mbps	268,6

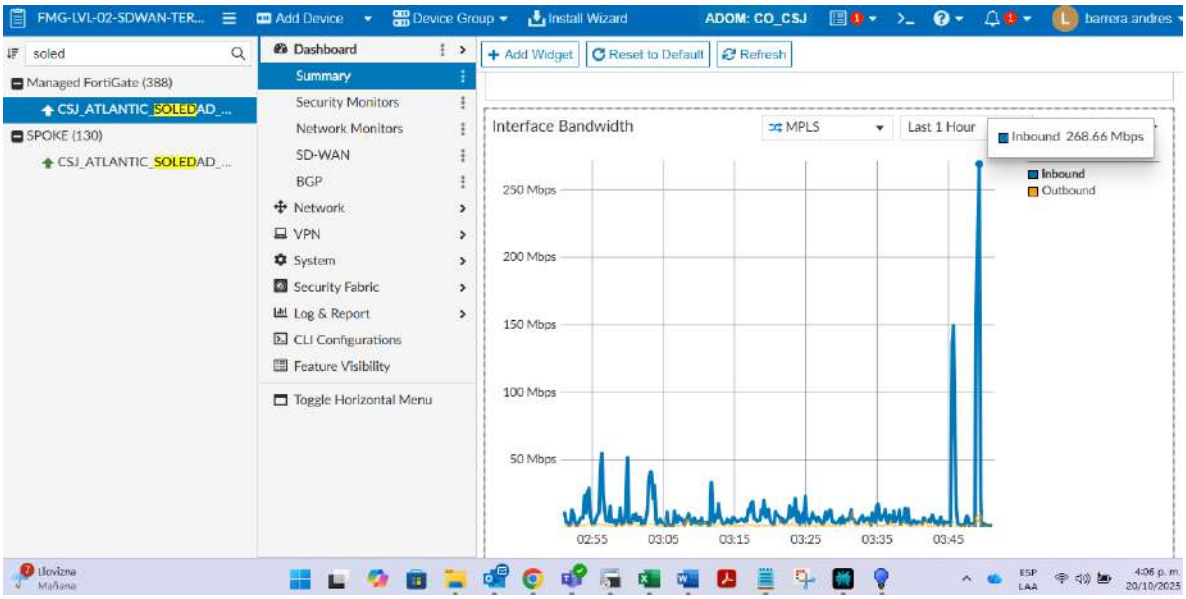


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
2140	1	Atlántico, Soledad; Calle 20 # 20-26 piso 3	256 Mbps	241,5

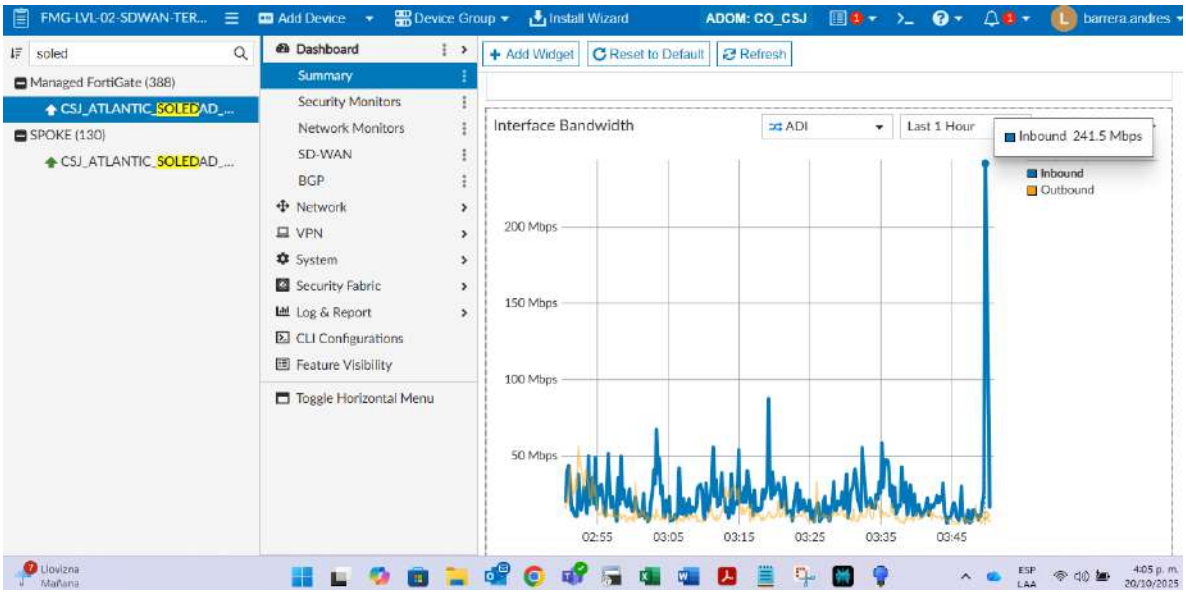


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
3003	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 137 C sur # 13-33	32 Mbps	31,6

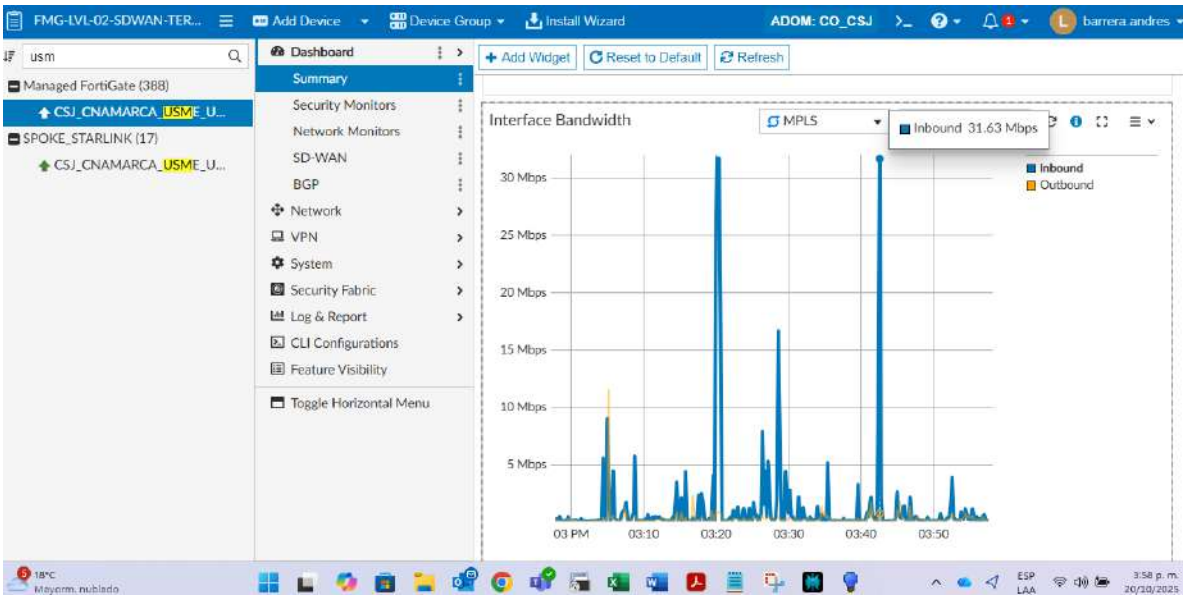


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
3301	2	Cauca, Popayán; Calle 3 # 3-31, Palacio Nacional	125 Mbps	128,7

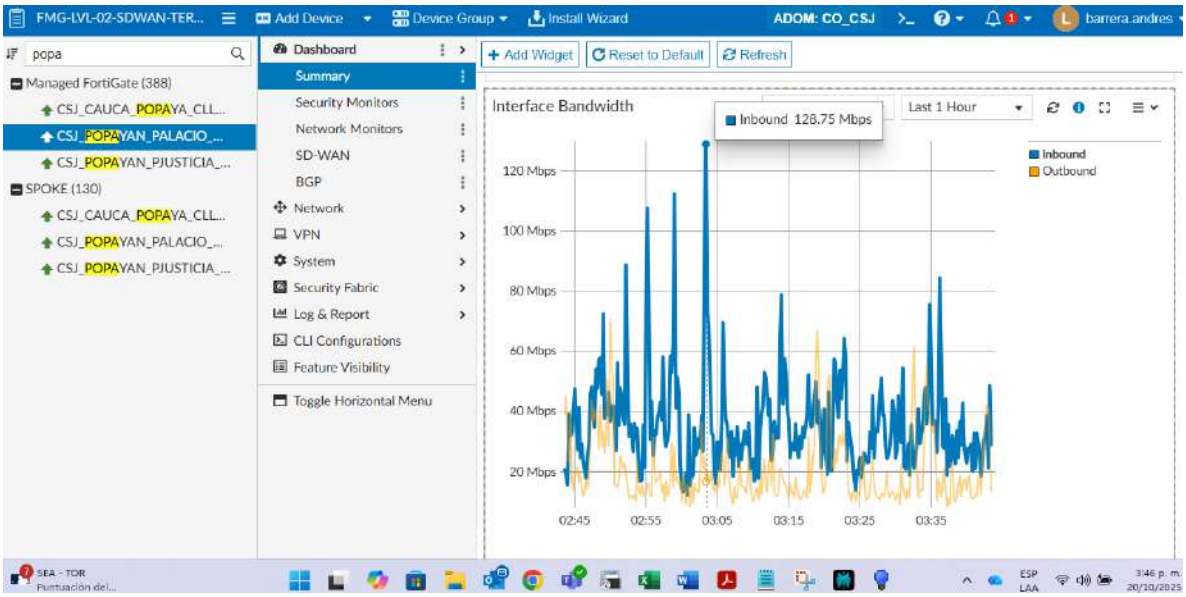


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
3352	2	Cauca, Popayán; Calle 3 # 3-31, Palacio Nacional	125 Mbps	137,5

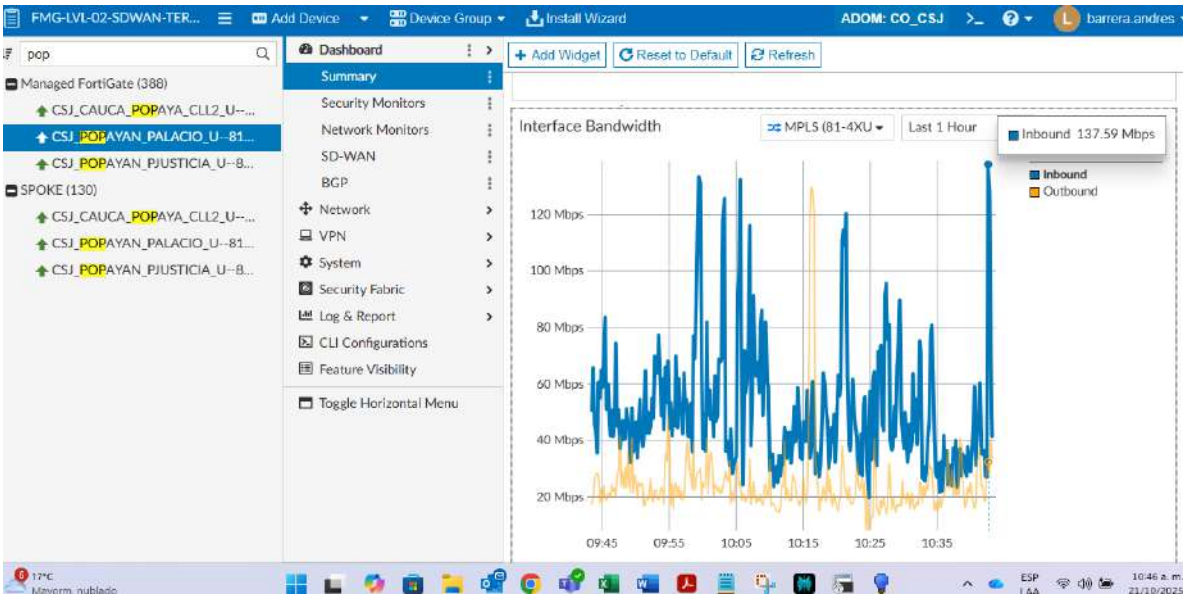


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
5020	2	Cauca, Puerto Tejada; Carrera 20 # 21-70, Palacio de Justicia	50 Mbps	49,5

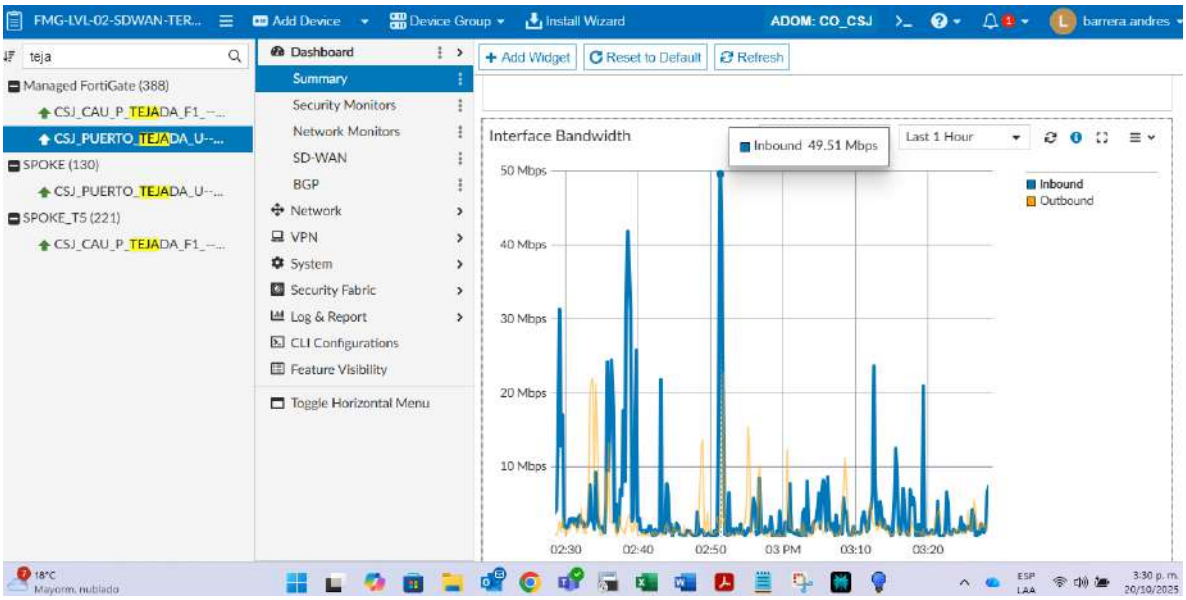


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
5021	2	Cauca, Santander de Quilichao; Calle 3 # 8-33, Palacio de Justicia	50 Mbps	45,9

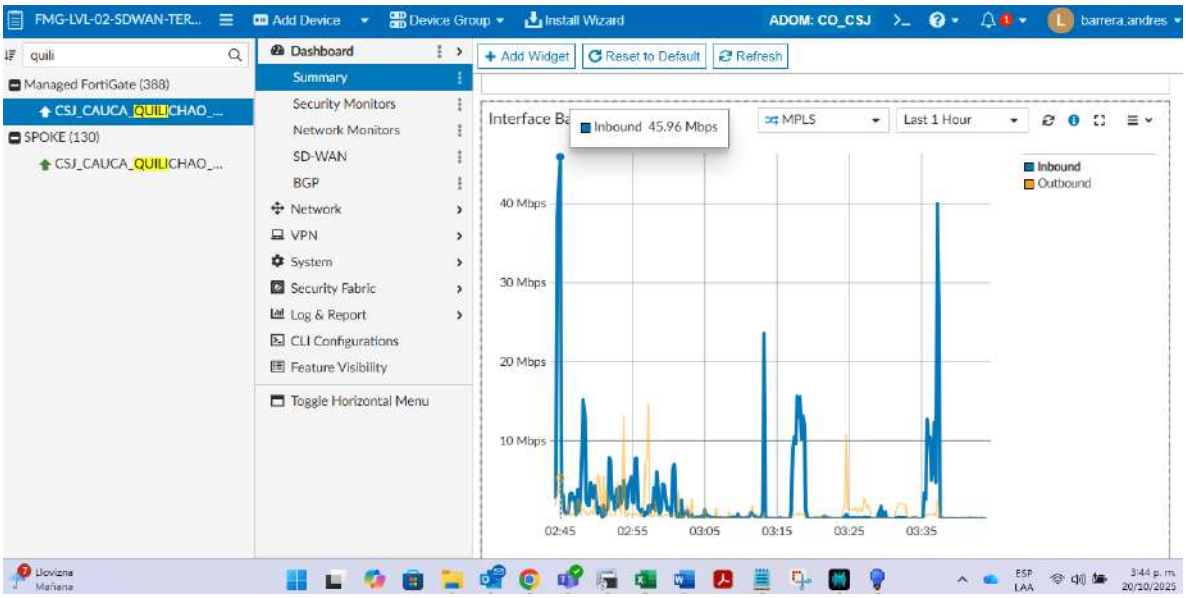


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
5023	4	Cesar, Chiriguana; Calle 7 # 5-04, Palacio de Justicia	50 Mbps	48,9

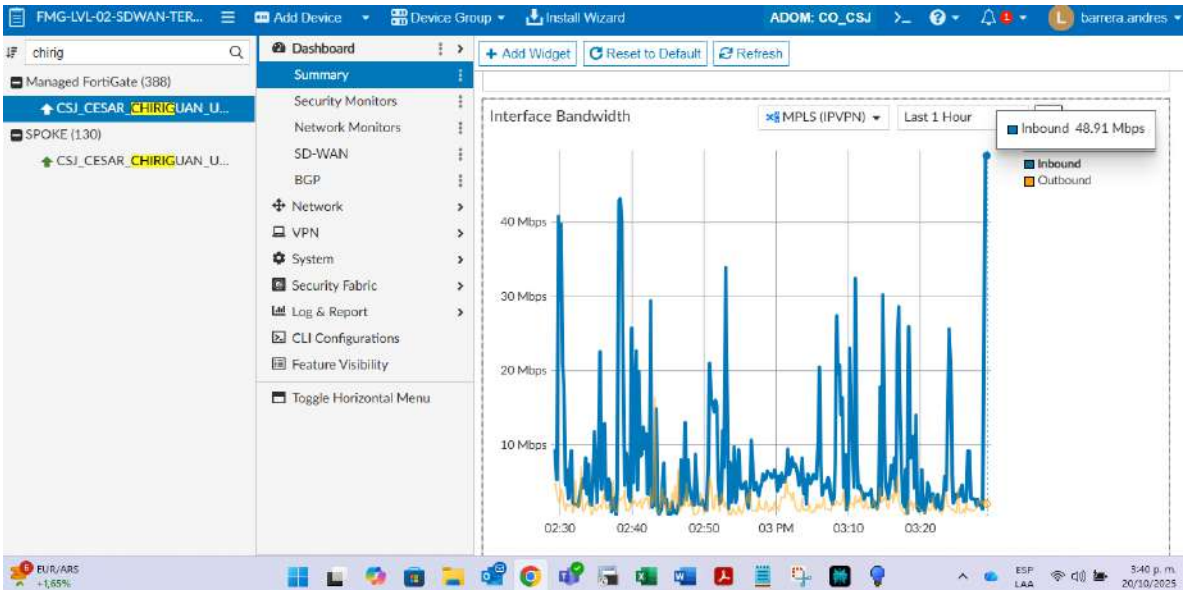


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
5024	2	Córdoba, Cerete; Calle 12 # 11-14 Calle del Carmen	50 Mbps	47,4

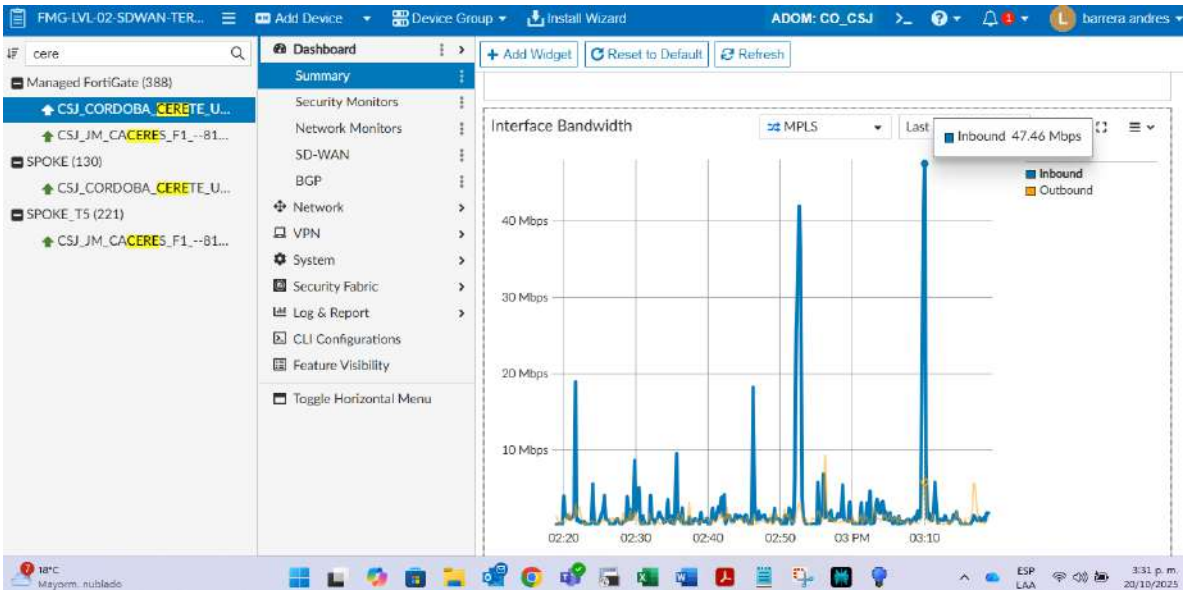


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
5031	1	Huila, Neiva; Calle 11 # 2-55	64 Mbps	63,3

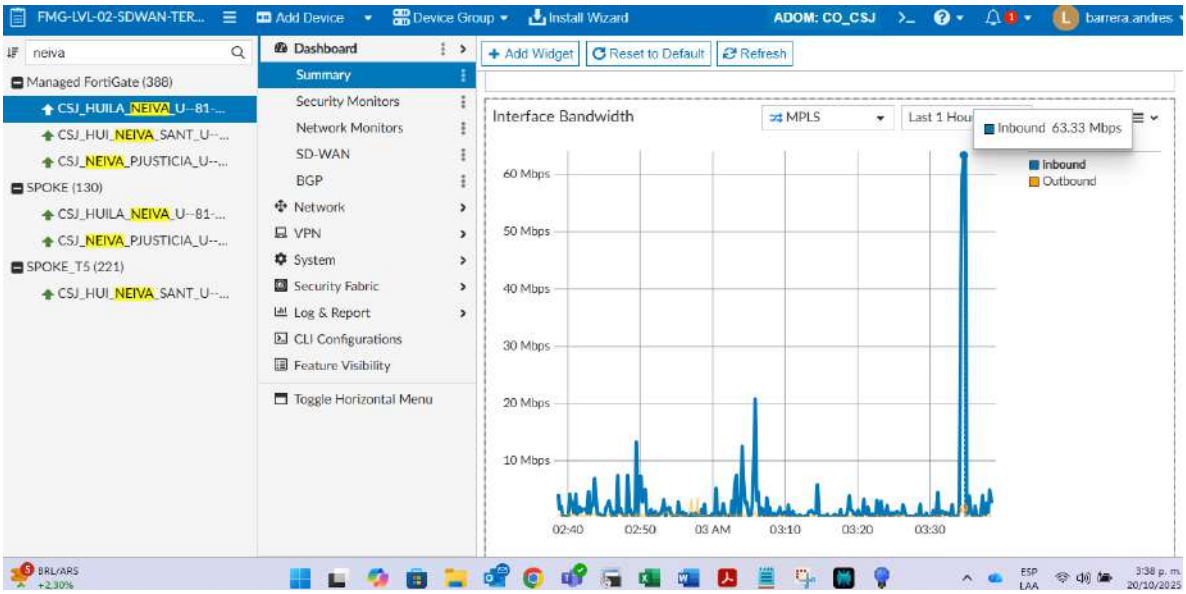


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
5053	3	Santander, Vélez; Carrera 2 # 9-06, Palacio de Justicia	50 Mbps	50,6

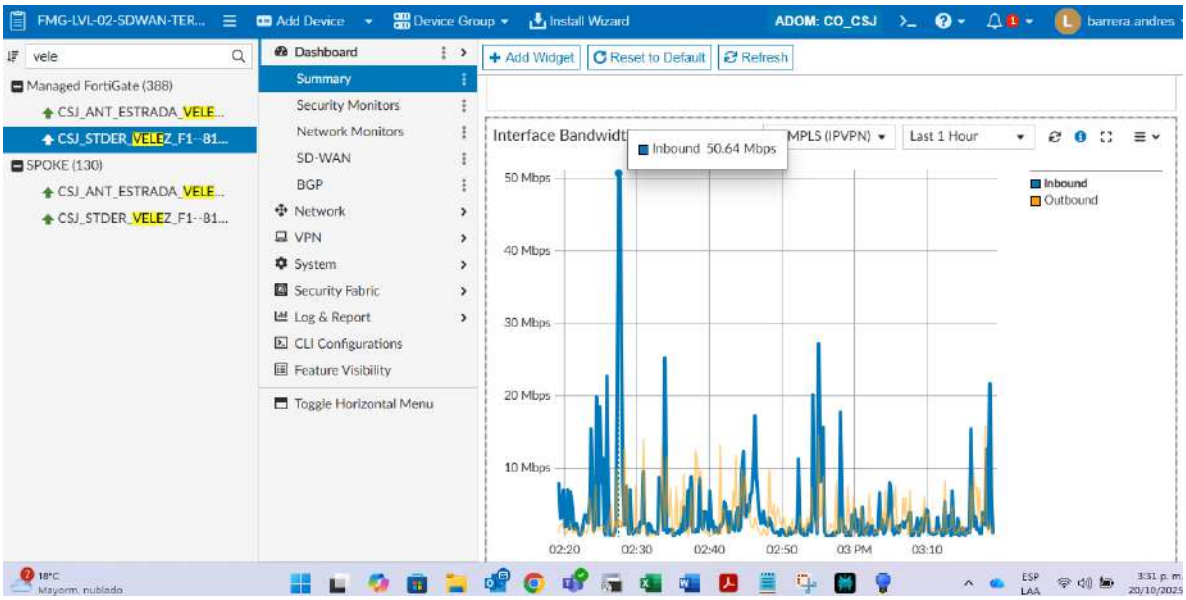


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
5161	2	Cauca, Puerto Tejada; Carrera 20 # 21-70, Palacio de Justicia	50 Mbps	47

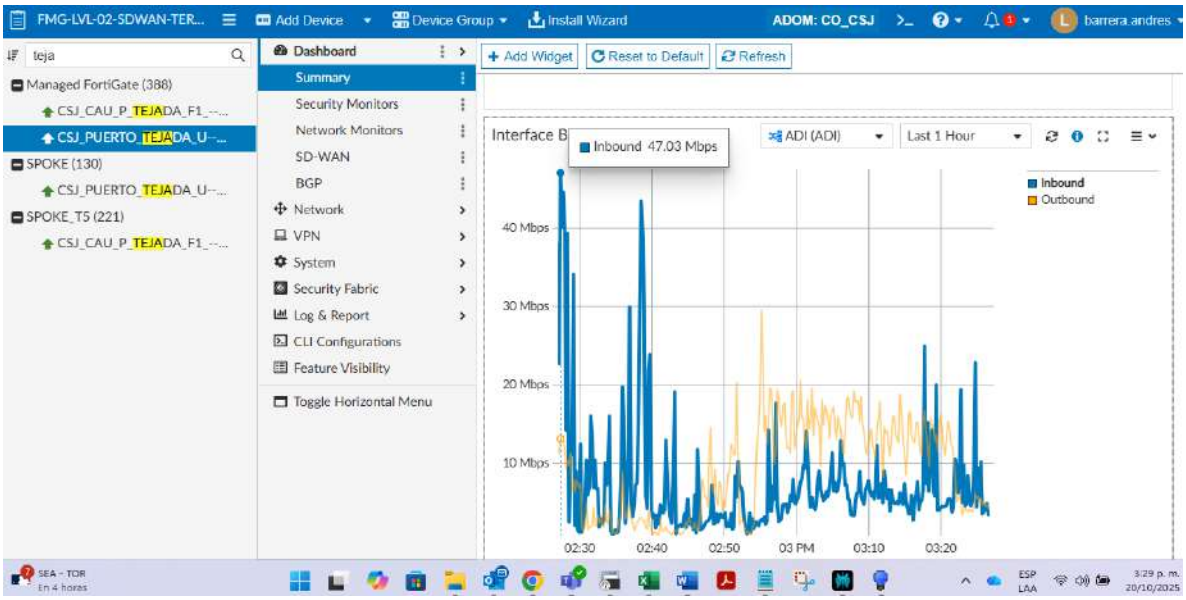


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
5165	2	Córdoba, Cerete; Calle 12 # 11-14 Calle del Carmen	50 Mbps	49,4

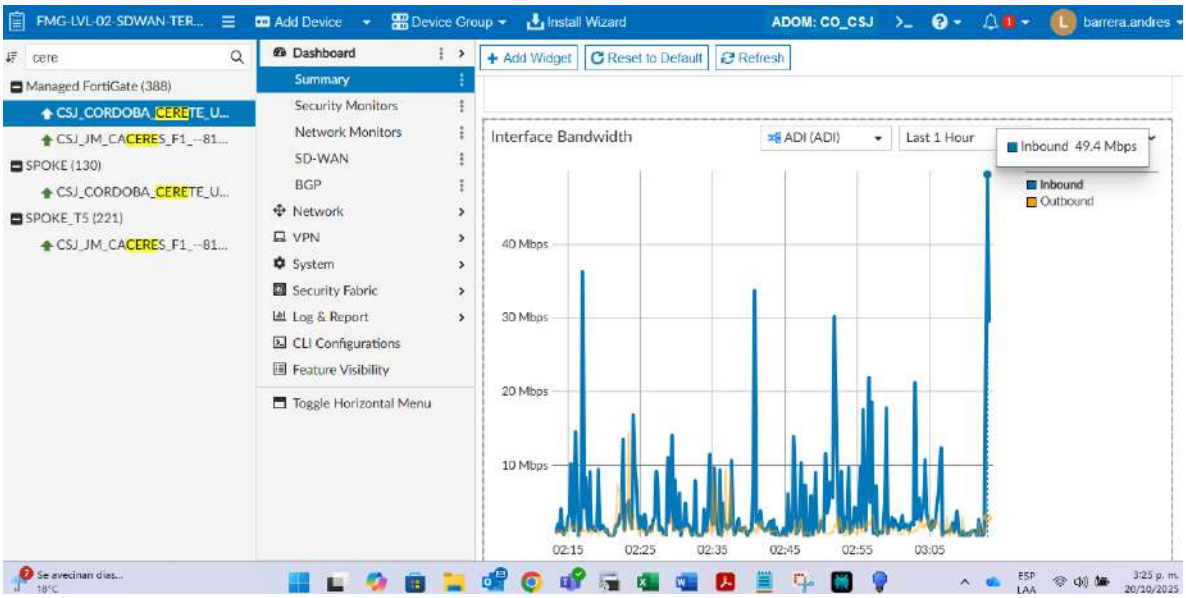


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
5194	3	Santander, Vélez; Carrera 2 # 9-06, Palacio de Justicia	50 Mbps	48,8

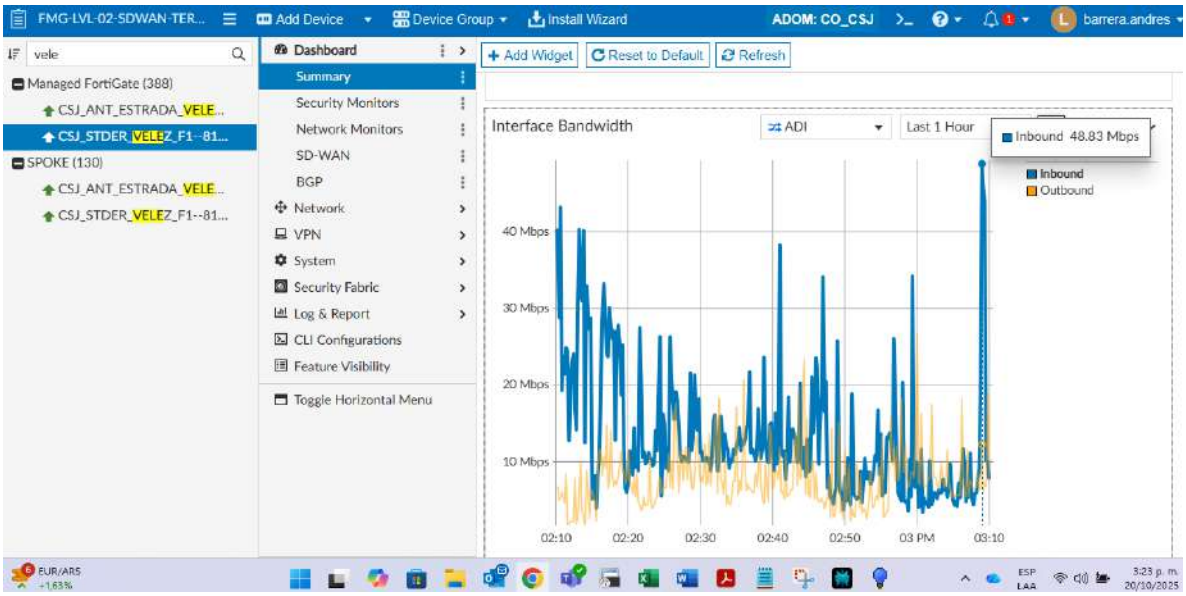


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1827	2	Caquetá, Florencia; Calle 16 # 6-47, Palacio de Justicia	200 Mbps	198,8

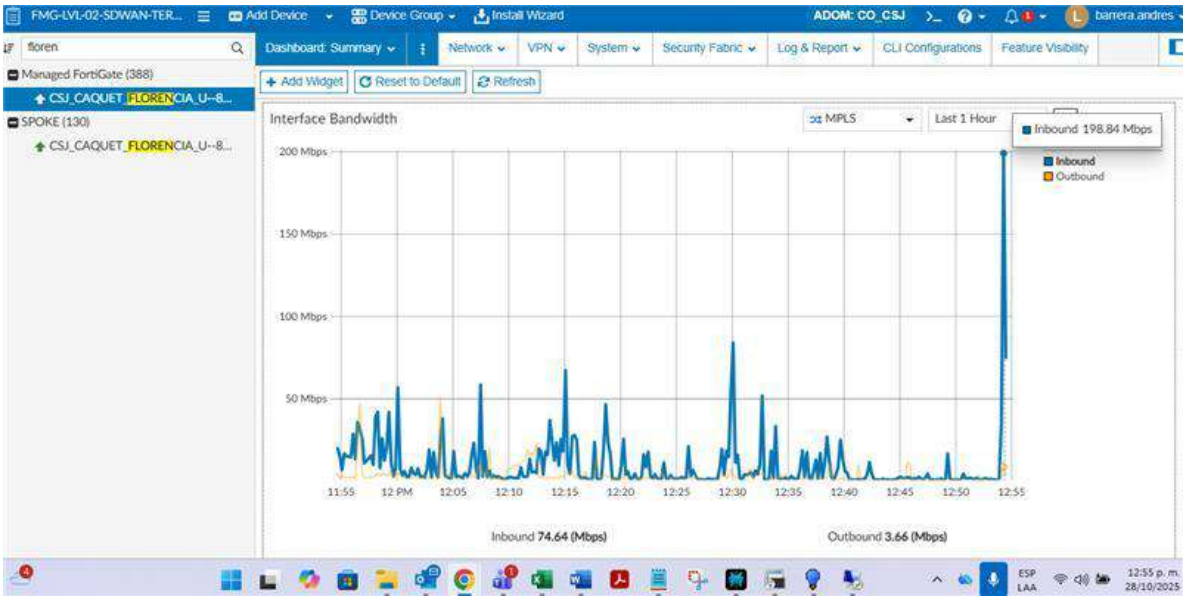


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5070	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 8 # 11-73	256 Mbps	254,5

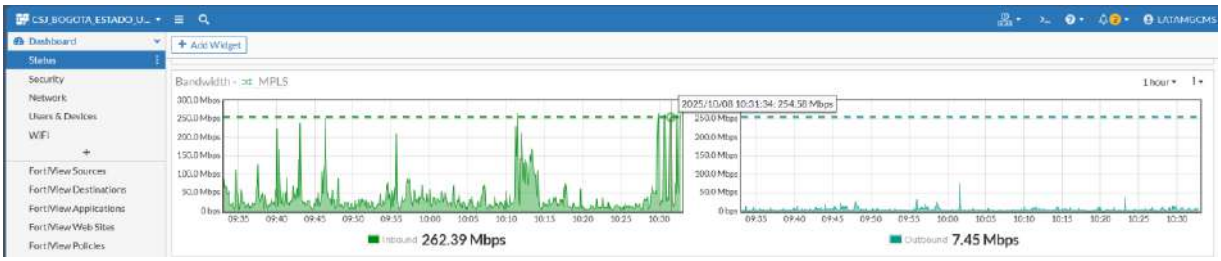


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5056	3	Sucre, Since; Calle 7 No. 12-57 Sincé	50 Mbps	52,6

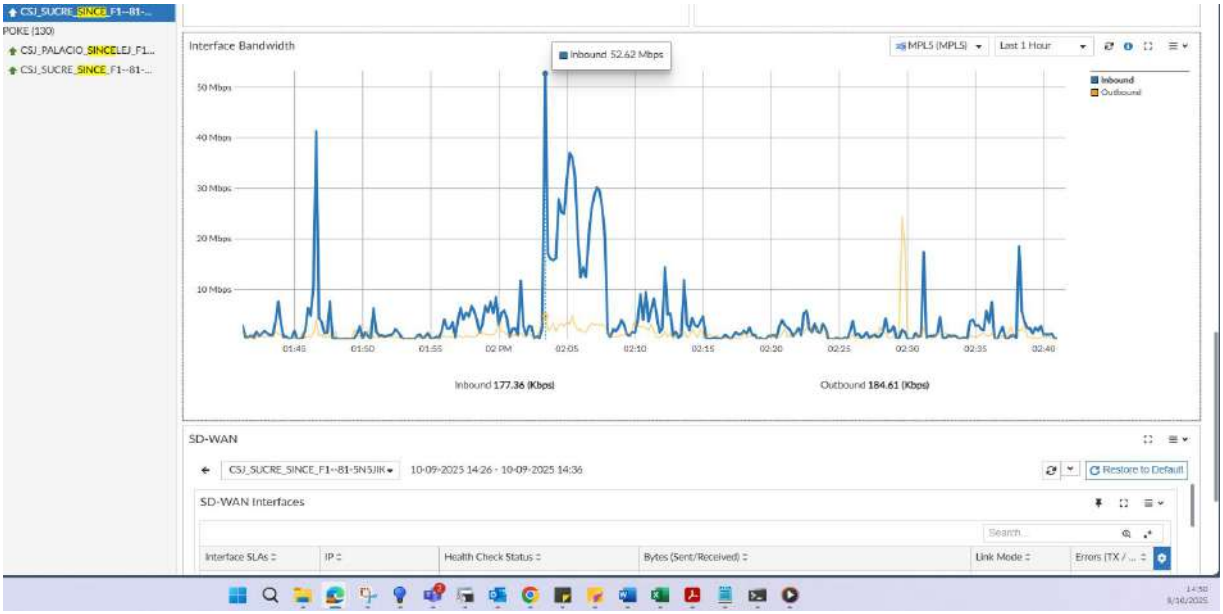


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5054	3	Sucre, Majagual; Calle 5 # 17-54	50 Mbps	47,2

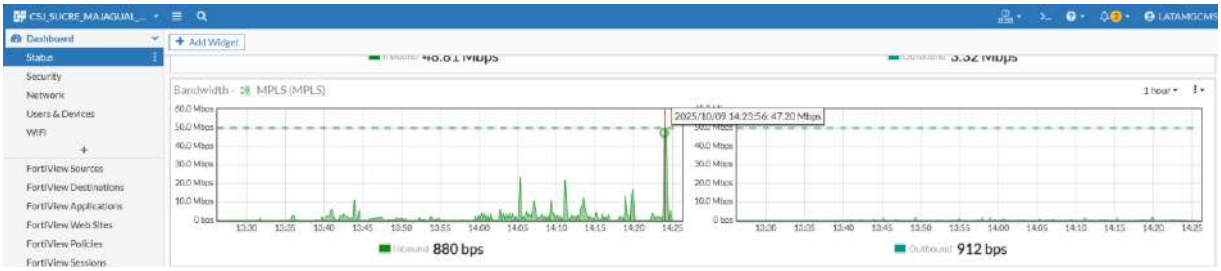


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5038	2	Nariño, Pasto; Calle 19 # 21B-22, Edificio Montana	50 Mbps	48,2

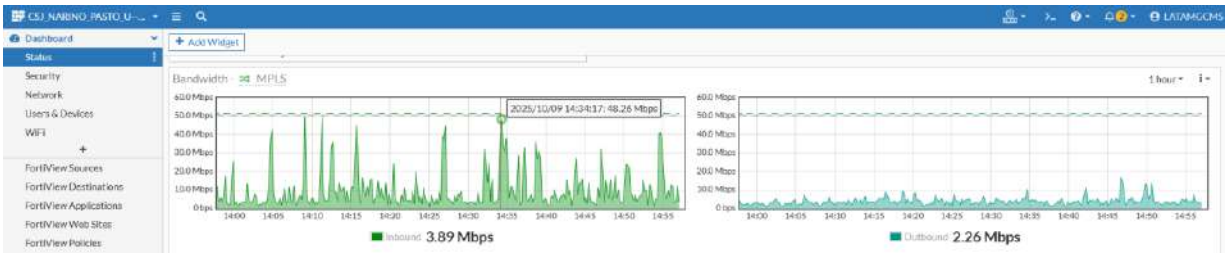


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5211	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 8 # 11-73	256 Mbps	251,4

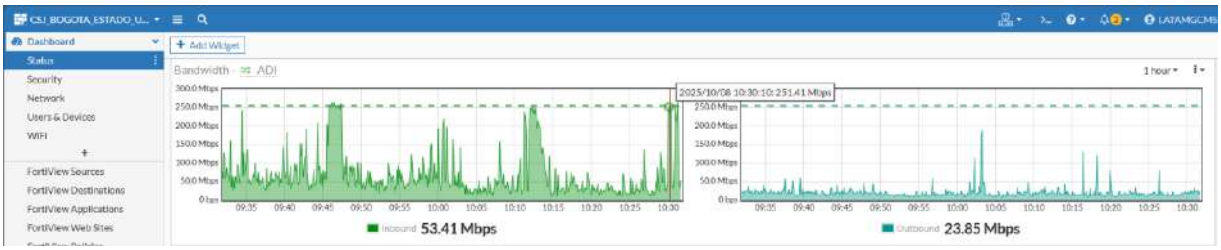


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5197	3	Sucre, Since; Calle 7 No. 12-57 Sincé	50 Mbps	50,1

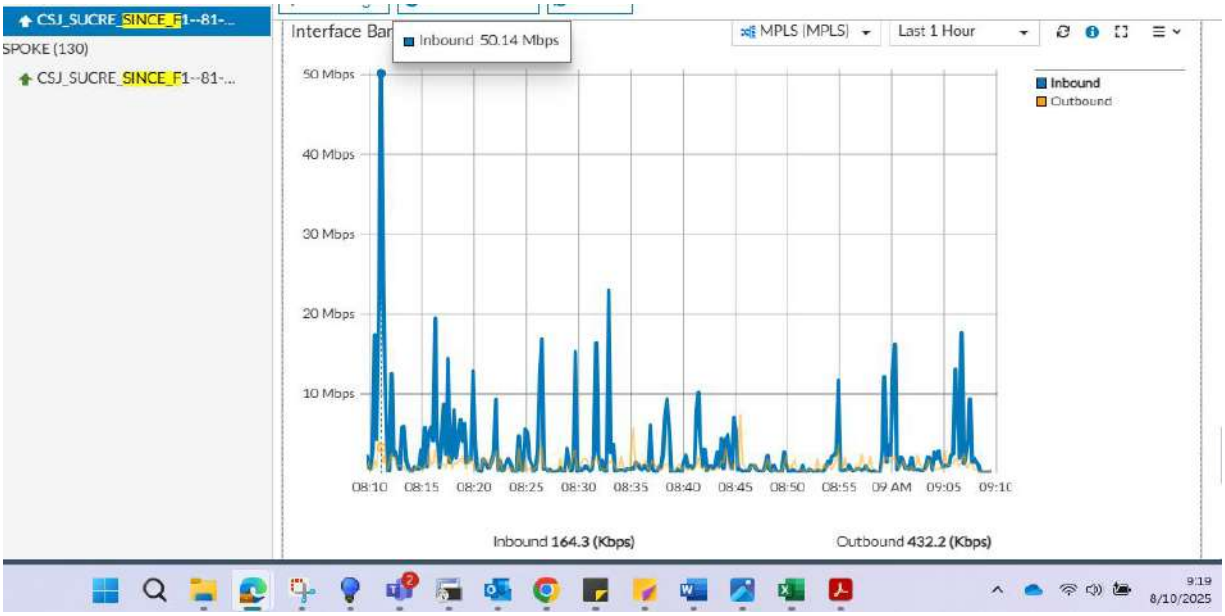


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5195	3	Sucre, Majagual; Calle 5 # 17-54	50 Mbps	48,8

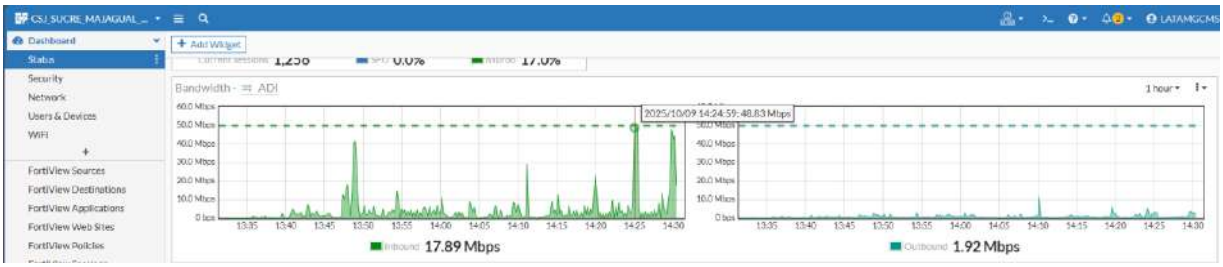

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5008	1	Antioquia, Envigado; Carrera 41 No 38 Sur - 43 Piso 4, Edificio Emporio	50 Mbps	49,6

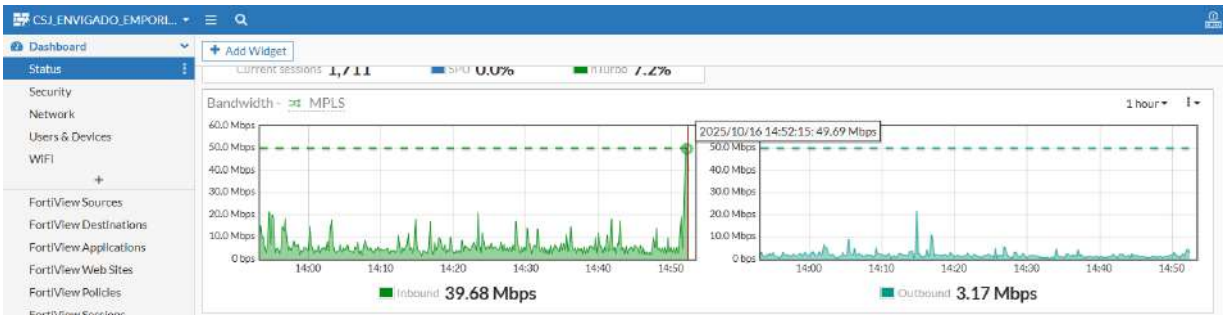


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1903	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 8 # 13-82, Edificio Antigua Bolsa de Valores	256 Mbps	245

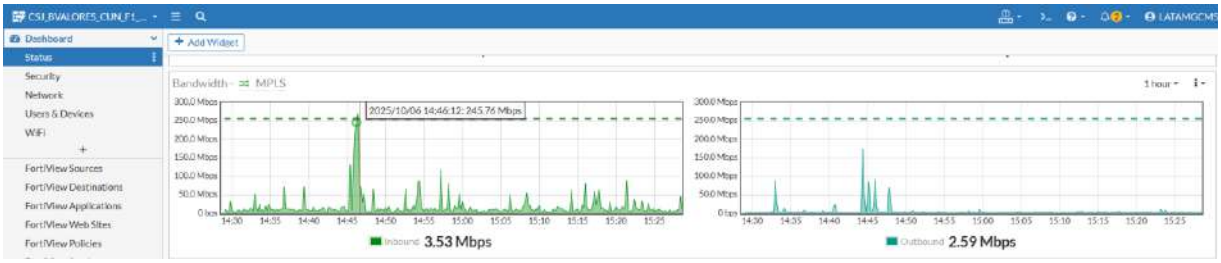

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1729	4	Vaupés, Carurú; Calle 2 # 5-21	15 Mbps	14,8




PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
235	3	Nariño, Ipiales; Carrera 5 # 19 Esquina	64 Mbps	64,6

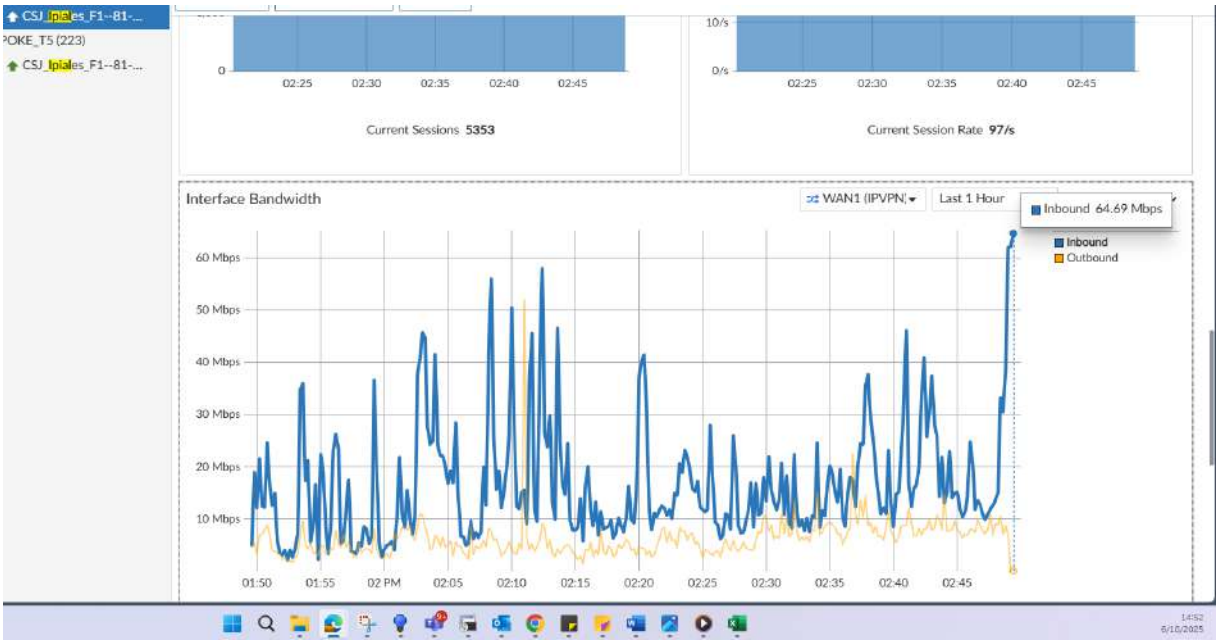

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
271	4	Sucre, Palmito; Calle 6 # 6-29	25 Mbps	23,1


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0           0    23183000           3        2000           3           0
* GiÔ/0/0.2440                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0        3000           0           0           0           0
  GigabitEthernet0              0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel13                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel23                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan11                        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan3362                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER063093#sh clo
*16:24:53.694 gmt Fri Oct 10 2025
CER063093#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
273	4	Sucre, San Juan de Betulia; Calle 7A # 7-29	25 Mbps	23,1

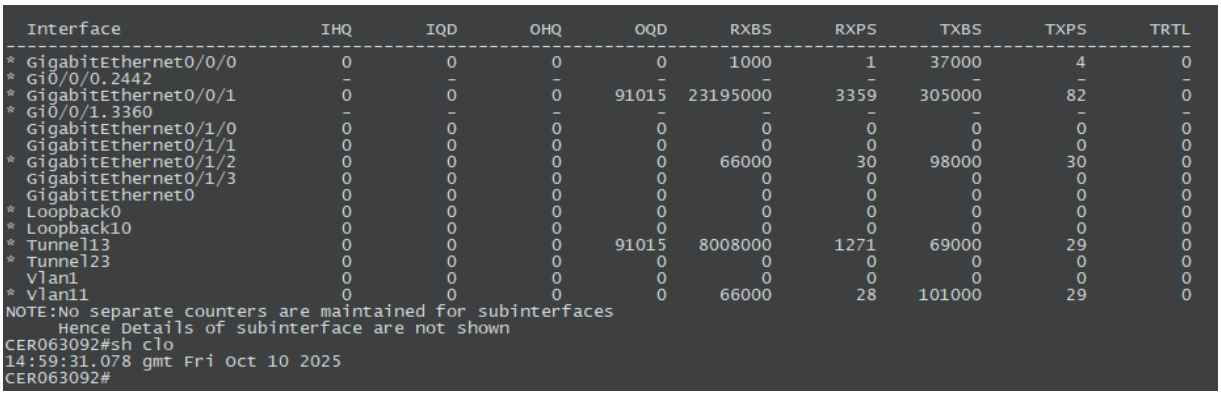


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           0           1000        1           37000       4           0
* GiO/0/0.2442                -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           91015       23195000    3359        305000      82          0
* GiO/0/1.3360                -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0           66000       30          98000       30          0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0            0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel13                    0           0           0           91015       8008000     1271        69000       29          0
* Tunnel23                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                      0           0           0           0           66000       28          101000      29          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER063092#sh clo
14:59:31.078 gmt Fri Oct 10 2025
CER063092#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
361	3	Cauca, Villa Rica; Carrera 8 # 3-04 Parque Principal	25 Mbps	23

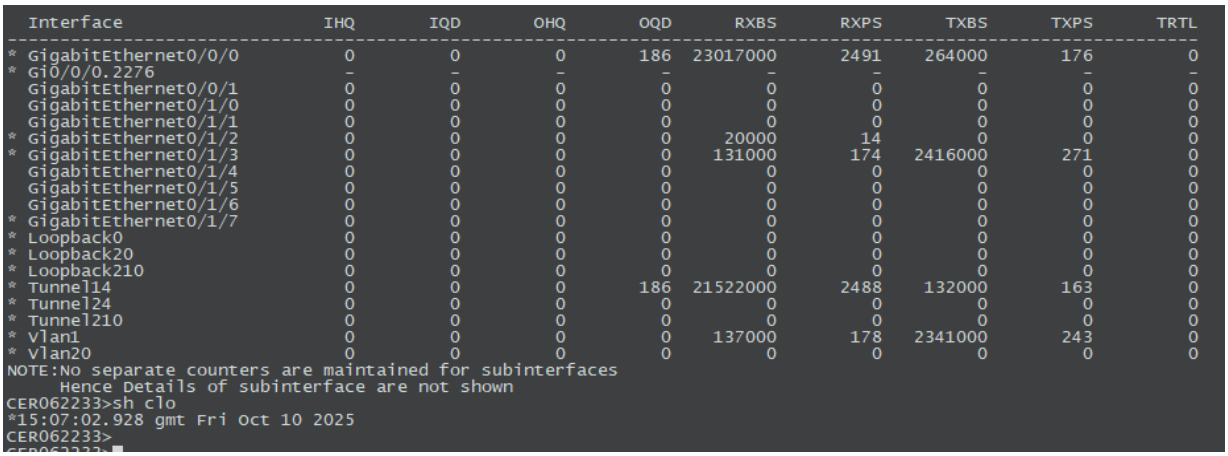


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0         186   23017000       2491     264000        176          0
* Gi0/0/0.2276                  -           -           -           -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0      20000         14          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0     131000        174    2416000        271          0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback210                   0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      0           0           0         186   21522000       2488     132000        163          0
* Tunnel24                      0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Tunnel210                     0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Vlan1                         0           0           0           0     137000        178    2341000        243          0
* Vlan20                        0           0           0           0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062233>sh clo
*15:07:02.928 gmt Fri Oct 10 2025
CER062233>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
380	4	Cundinamarca, Beltrán; Calle 4 # 2-80	25 Mbps	23,1

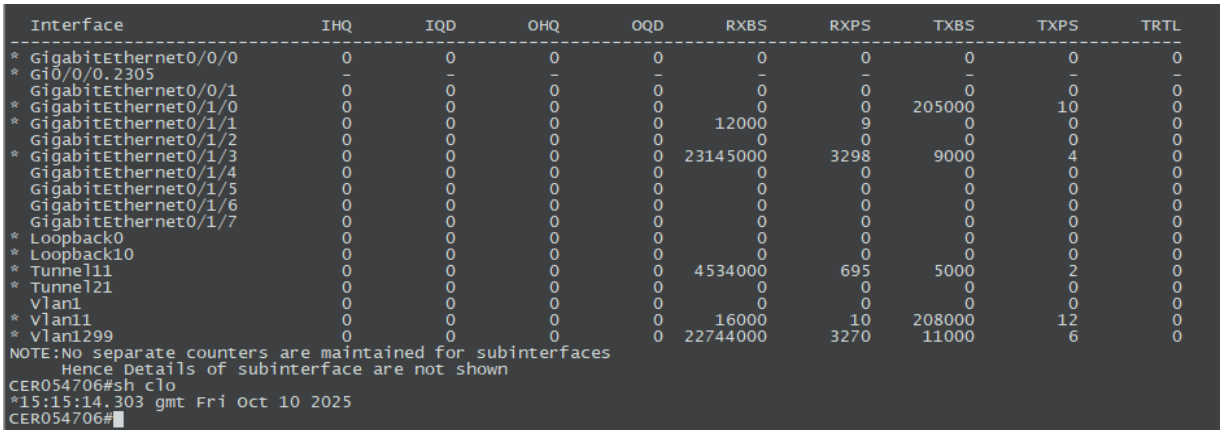


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/0.2305                -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0     205000         10          0
* GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0      12000          9          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0   23145000       3298       9000          4          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                     0          0          0          0    4534000        695       5000          2          0
* Tunnel21                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                       0          0          0          0      16000         10     208000         12          0
* Vlan1299                     0          0          0          0   22744000       3270      11000          6          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054706#sh clo
*15:15:14.303 gmt Fri Oct 10 2025
CER054706#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
383	3	Cundinamarca, Paratebueno; Calle 2 # 9-21 piso 1	25 Mbps	24,3

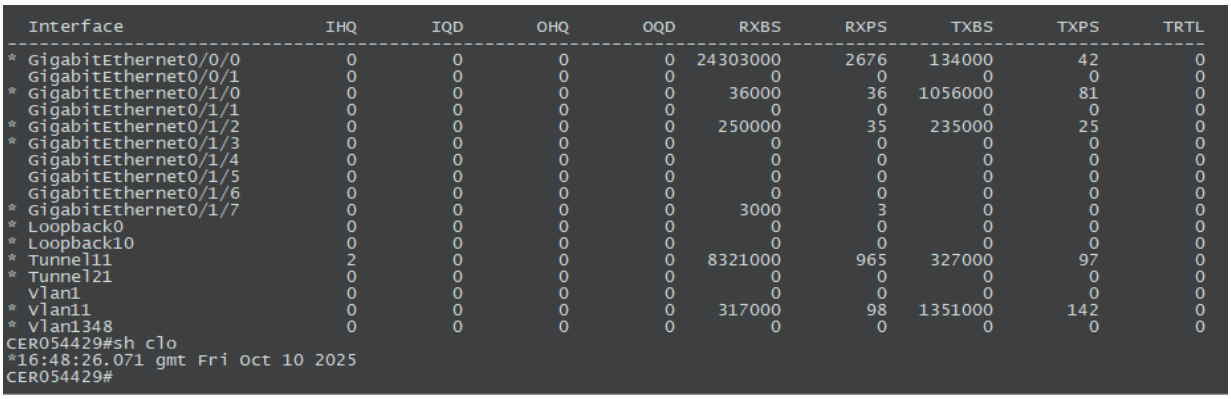

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0          0          0          0     24303000       2676     134000         42          0
  GigabitEthernet0/0/1     0          0          0          0            0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0     0          0          0          0        36000         36    1056000         81          0
  GigabitEthernet0/1/1     0          0          0          0            0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2     0          0          0          0       250000         35     235000         25          0
* GigabitEthernet0/1/3     0          0          0          0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4     0          0          0          0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5     0          0          0          0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6     0          0          0          0            0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7     0          0          0          0         3000          3          0          0          0
* Loopback0                0          0          0          0            0          0          0          0          0
* Loopback10               0          0          0          0            0          0          0          0          0
* Tunnel11                 2          0          0          0      8321000        965     327000         97          0
* Tunnel21                 0          0          0          0            0          0          0          0          0
  Vlan1                    0          0          0          0            0          0          0          0          0
* Vlan11                   0          0          0          0       317000         98    1351000        142          0
* Vlan1348                 0          0          0          0            0          0          0          0          0
CER054429#sh clo
*16:48:26.071 gmt Fri Oct 10 2025
CER054429#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
433	4	Risaralda, Belén de Umbría; Carrera 11 # 6-20	50 Mbps	45,8

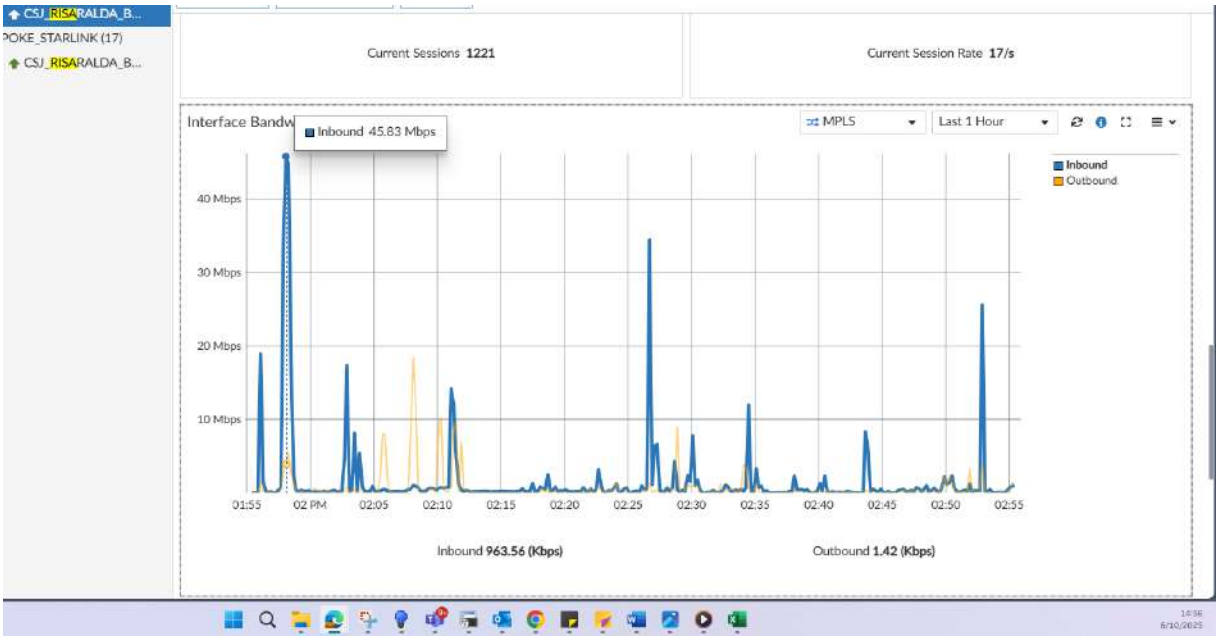

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
451	4	Sucre, Sucre; Calle 10 # 2-21 Edificio Cure	32 Mbps	31,3


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     318931    31303000        5855      484000         114           0
* Gi0/0/0.1676                  -          -          -          -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      188000          44      241000          46           0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback0                     0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback20                    0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel10                      0          0          0     318799    27684000        5865      394000         102           0
* Tunnel20                      0          0          0          3           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan3358                      0          0          0          0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054482#sh clo
21:30:44.769 gmt Fri Oct 24 2025
CER054482#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
456	3	Tolima, Armero Guayabal; Carrera 6 # 3-89	25 Mbps	23,6

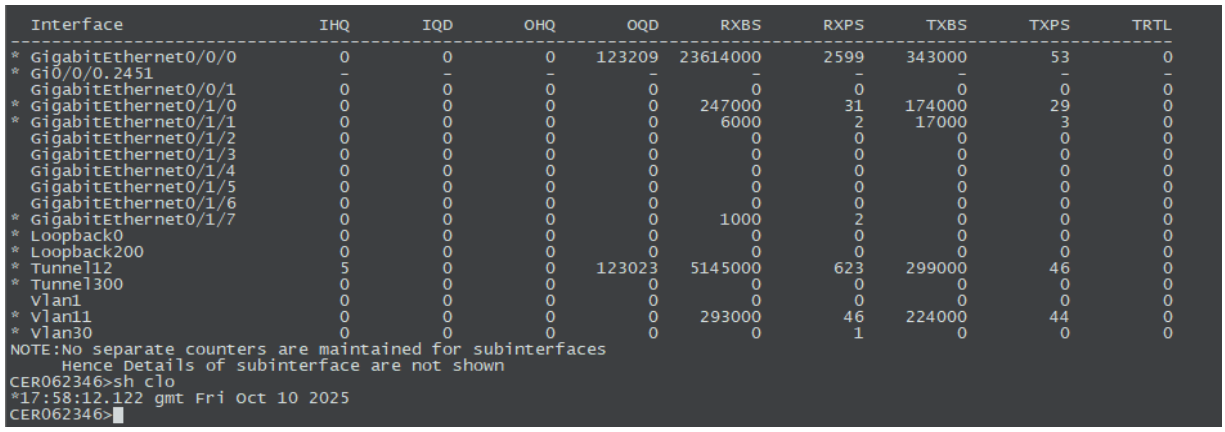

```
  Interface                IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0           0           0           123209    23614000   2599       343000     53        0
* GI0/0/0.2451             -           -           -           -         -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1     0           0           0           0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0     0           0           0           0         247000     31         174000     29        0
* GigabitEthernet0/1/1     0           0           0           0         6000       2          17000      3         0
  GigabitEthernet0/1/2     0           0           0           0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3     0           0           0           0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4     0           0           0           0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5     0           0           0           0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6     0           0           0           0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7     0           0           0           0         1000       2          0          0         0
* Loopback0                0           0           0           0         0          0          0          0         0
* Loopback200              0           0           0           0         0          0          0          0         0
* Tunnel12                 5           0           0           123023    5145000    623        299000     46        0
* Tunnel300                0           0           0           0         0          0          0          0         0
  Vlan1                    0           0           0           0         0          0          0          0         0
* Vlan11                   0           0           0           0         293000     46         224000     44        0
* Vlan30                   0           0           0           0         0          1          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062346>sh clo
*17:58:12.122 gmt Fri Oct 10 2025
CER062346>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
457	4	Tolima, Ataco; Carrera 6 # 8-21, Barrio Campo Alegre	25 Mbps	23,9

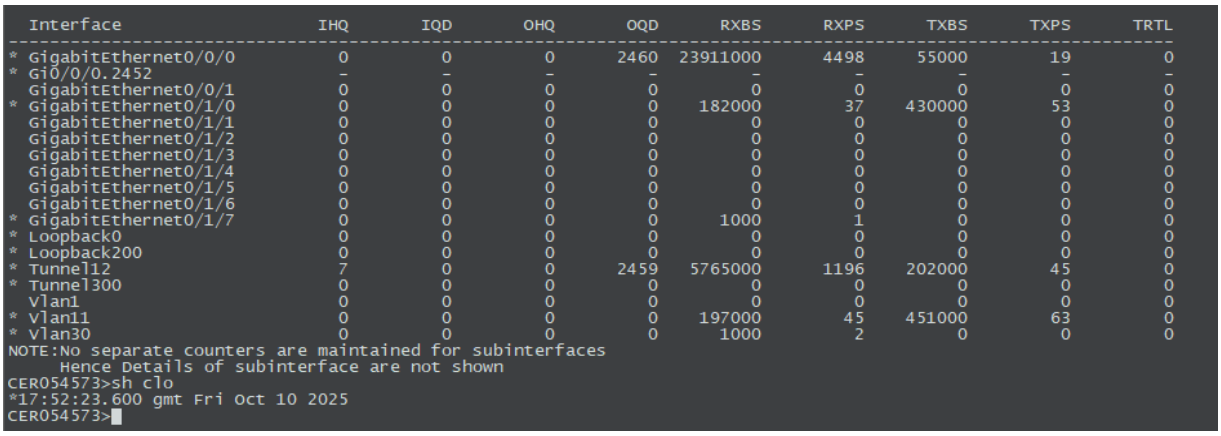


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0       2460   23911000       4498      55000         19          0
* GiO/0/0.2452                -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0     182000         37     430000         53          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                    7          0          0       2459    5765000       1196     202000         45          0
* Tunnel300                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0     197000         45     451000         63          0
* Vlan30                      0          0          0          0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054573>sh clo
*17:52:23.600 gmt Fri Oct 10 2025
CER054573>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
471	3	Tolima, Planadas; Calle 8 # 5-54/58	25 Mbps	23,9


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0      279698     23978000        4507       36000          15           0
* Gi0/0/0.2470                  -           -            -           -            -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0            0           0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0            0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0        14000          11       26000          19           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0            0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/4          0           0            0           0        12000          10        1000           1           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0            0           0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0            0           0            0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0            0           0         1000           1           0           0           0
* Loopback0                     0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Loopback200                   0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Tunnel12                     11           0            0      275914      5548000        1185       13000          10           0
* Tunnel22                      0           0            0        3491            0           0           0           0           0
* Tunnel300                     0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Vlan1                         0           0            0           0        25000          19       12000           8           0
* Vlan30                        0           0            0           0         1000           2           0           0           0
  Vlan3372                      0           0            0           0            0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054529>sh clo
*17:56:48.871 gmt Fri Oct 10 2025
CER054529>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
475	4	Tolima, Roncesvalles; Carrera 2 # 7-38	25 Mbps	23,3

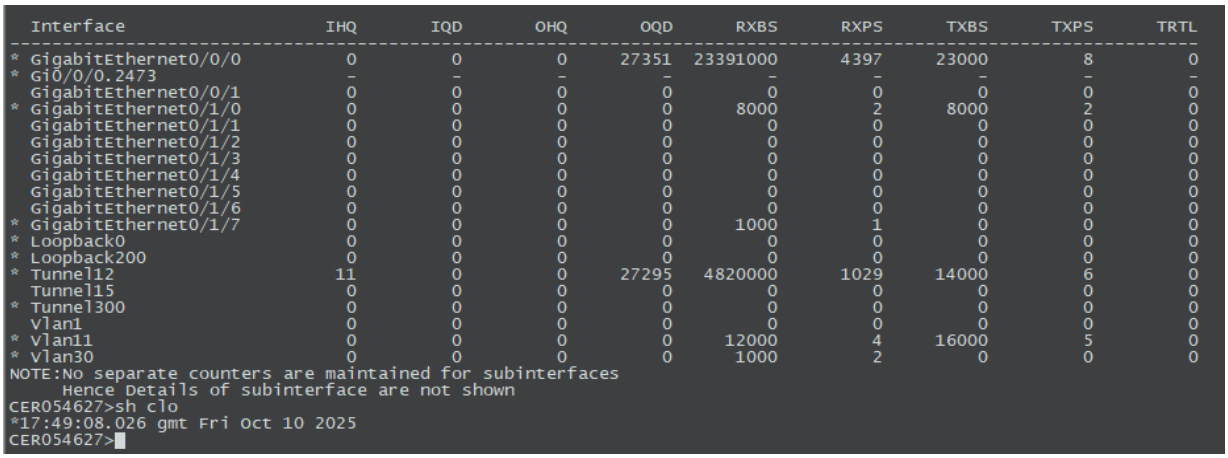

```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0         0         0     27351   23391000      4397     23000         8         0
* Gi0/0/0.2473               -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0      8000         2      8000         2         0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4       0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5       0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7       0         0         0         0      1000         1         0         0         0
* Loopback0                  0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel12                  11         0         0     27295   4820000      1029     14000         6         0
  Tunnel15                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel300                  0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                     0         0         0         0     12000         4     16000         5         0
* Vlan30                     0         0         0         0      1000         2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054627>sh clo
*17:49:08.026 gmt Fri Oct 10 2025
CER054627>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
477	4	Tolima, San Antonio; Calle 6 # 3-50	25 Mbps	23

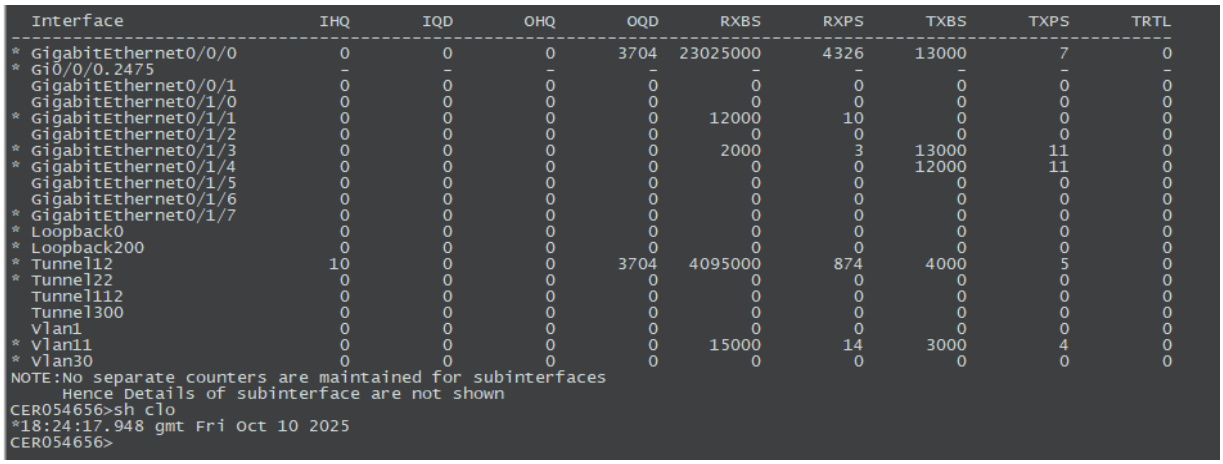

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0       3704   23025000       4326      13000          7          0
* Gi0/0/0.2475                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0      12000         10          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0       2000          3      13000         11          0
* GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0      12000         11          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                     10          0          0       3704    4095000        874       4000          5          0
* Tunnel22                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel112                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      15000         14       3000          4          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054656>sh clo
*18:24:17.948 gmt Fri Oct 10 2025
CER054656>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
478	4	Tolima, San Luis; Calle 7 # 6-70/74	25 Mbps	23

```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD         RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0      478900     23000000       2516     109000         40          0
* Gi0/0/0.2476                  -           -            -           -            -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0            0           0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0            0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/4          0           0            0           0       132000         16     128000         18          0
* GigabitEthernet0/1/5          0           0            0           0            0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/6          0           0            0           0        74000          2      23000          1          0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0            0           0         1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0           0            0           0            0          0          0          0          0
* Loopback200                   0           0            0           0            0          0          0          0          0
* Tunnel12                      0           0            0      478474      4501000        543     231000         37          0
* Tunnel300                     0           0            0           0            0          0          0          0          0
  Vlan1                         0           0            0           0            0          0          0          0          0
* Vlan11                        0           0            0           0       239000         40     168000         35          0
* Vlan30                        0           0            0           0         1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055009>sh clo
*17:53:35.821 gmt Fri Oct 10 2025
CER055009>
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
498	4	Valle Del Cauca, Dovio; Calle 12 # 10-12	25 Mbps	23,7

```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS     TXBS     TXPS     TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0            0         326632   23781000       4467    12000        5        0
* Gi0/0/0.2491                -           -            -              -          -          -        -        -        -
* GigabitEthernet0/0/1        0           0            0              0       4000          3     3000        3        0
  GigabitEthernet0/1/0        0           0            0              0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0            0              0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0            0              0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0            0              0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0            0              0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0            0              0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0            0              0          0          0        0        0        0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0            0              0       4000          3     6000        2        0
* Loopback0                   0           0            0              0          0          0        0        0        0
* Loopback10                  0           0            0              0          0          0        0        0        0
* Tunnel14                    6           0            0         325742    4980000       1062     5000        6        0
* Tunnel24                    0           0            0              0          0          0        0        0        0
  Vlan1                       0           0            0              0          0          0        0        0        0
* Vlan2085                    0           0            0              0          0          0     6000        2        0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062358>sh clo
*18:12:20.932 gmt Fri Oct 10 2025
CER062358>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
500	3	Valle del Cauca, Guacarí; Calle 5a # 4-94 barrio Chapinero	25 Mbps	23,3


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0      670975   23390000       2567     515000        187         0
* Gi0/0/0.865                   -           -            -           -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0            0           0     262000        125    1540000        191         0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0            0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0            0           0       6000          8          0          0         0
* Loopback0                     0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Tunnel14                      9           0            0      640611    6002000        715     279000        127         0
* Tunnel24                      0           0            0       22957          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Vlan3164                      0           0            0           0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054232#sh clo
04:10:24.771 gmt Thu Oct 2 2025
CER054232#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
502	3	Valle Del Cauca, La Victoria; Carrera 7 # 8-45	25 Mbps	22,7

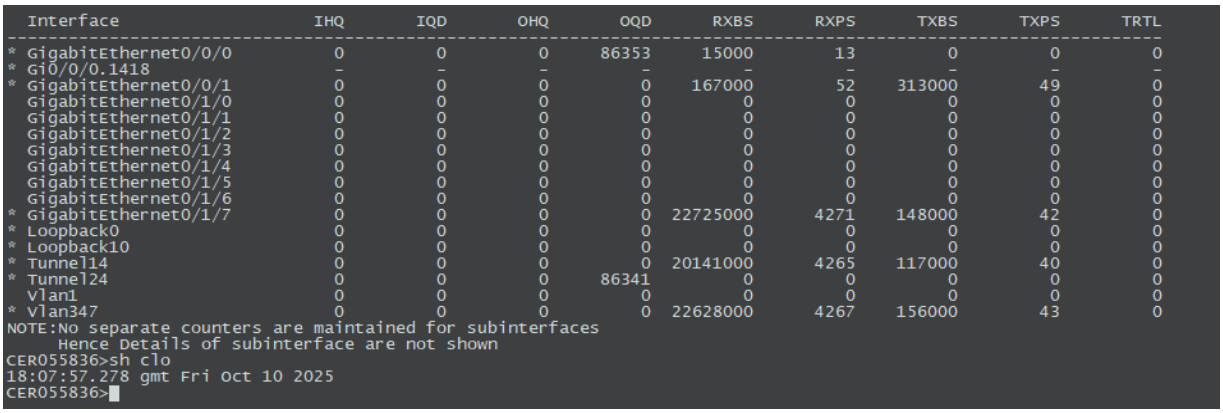


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0            0         86353      15000         13          0          0         0
* Gi0/0/0.1418                -           -            -             -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0           0            0             0     167000         52     313000         49         0
  GigabitEthernet0/1/0        0           0            0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0            0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0            0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0            0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0            0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0            0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0            0             0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0            0             0   22725000       4271     148000         42         0
* Loopback0                   0           0            0             0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0           0            0             0          0          0          0          0         0
* Tunnel14                    0           0            0             0   20141000       4265     117000         40         0
* Tunnel24                    0           0            0         86341          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0           0            0             0          0          0          0          0         0
* Vlan347                     0           0            0             0   22628000       4267     156000         43         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055836>sh clo
18:07:57.278 gmt Fri Oct 10 2025
CER055836>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
506	4	Valle Del Cauca, Restrepo; Carrera 12 # 12-15	25 Mbps	23,3

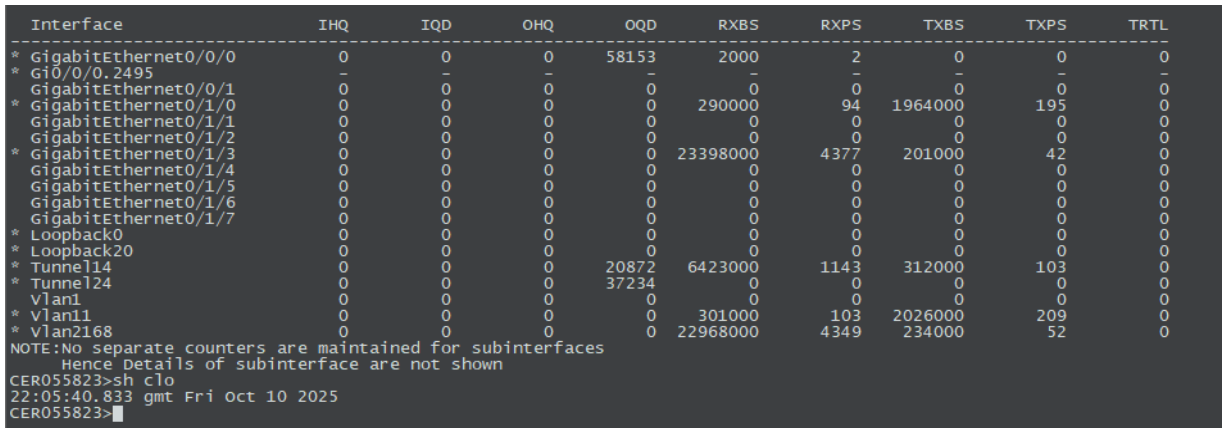


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0       58153        2000           2           0           0           0
* Gi0/0/0.2495                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0      290000          94     1964000         195           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0    23398000        4377      201000          42           0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback20                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel14                      0           0           0       20872     6423000        1143      312000         103           0
* Tunnel24                      0           0           0       37234           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                        0           0           0           0      301000         103     2026000         209           0
* Vlan2168                      0           0           0           0    22968000        4349      234000          52           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055823>sh clo
22:05:40.833 gmt Fri Oct 10 2025
CER055823>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
513	4	Valle Del Cauca, Versalles; Carrera 6 # 6-43, Alcaldía	25 Mbps	22,6

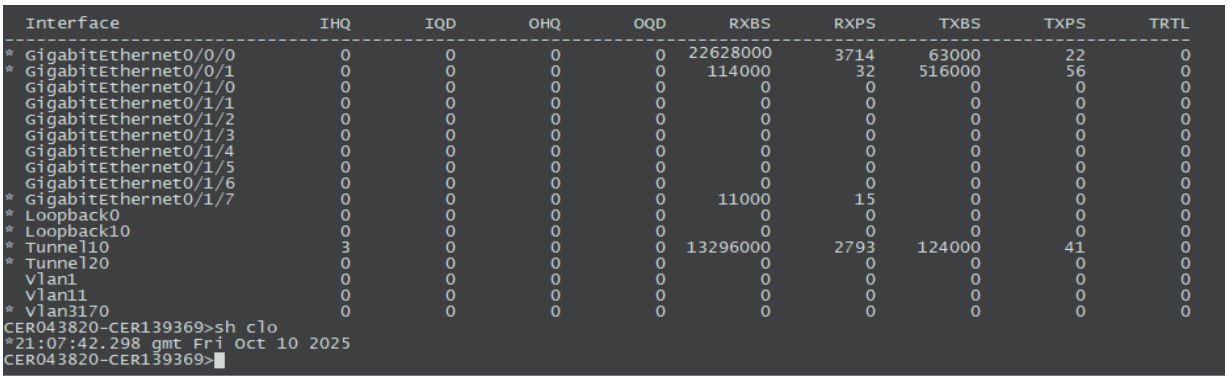

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0      22628000       3714      63000         22          0
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0        114000         32     516000         56          0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0             0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         11000         15          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0             0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0             0          0          0          0          0
* Tunnel10                    3          0          0          0      13296000       2793     124000         41          0
* Tunnel20                    0          0          0          0             0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0             0          0          0          0          0
  Vlan11                      0          0          0          0             0          0          0          0          0
* Vlan3170                    0          0          0          0             0          0          0          0          0
CER043820-CER139369>sh clo
*21:07:42.298 gmt Fri Oct 10 2025
CER043820-CER139369>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
546	3	La Guajira, Uribia; Calle 12 # 5-03 Plaza Principal	32 Mbps	31

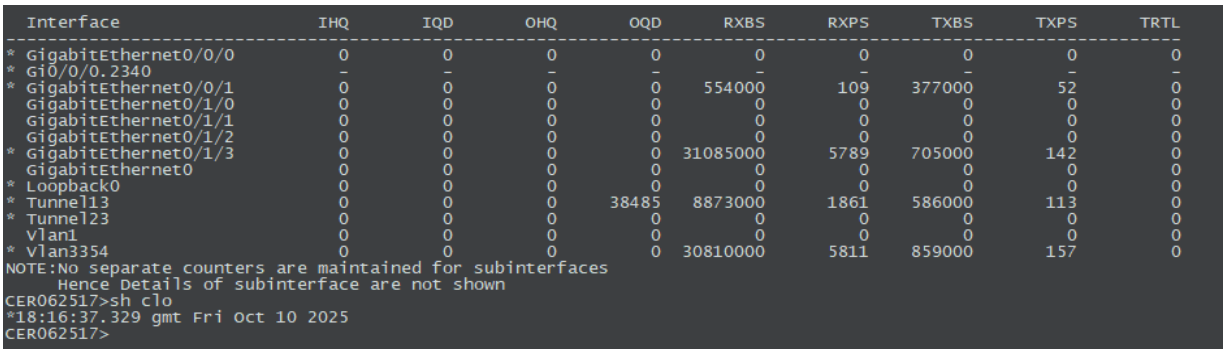


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GI0/0/0.2340                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0      554000         109      377000          52           0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0    31085000        5789      705000         142           0
  GigabitEthernet0              0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel13                      0           0           0       38485     8873000        1861      586000         113           0
* Tunnel23                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan3354                      0           0           0           0    30810000        5811      859000         157           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062517>sh clo
*18:16:37.329 gmt Fri Oct 10 2025
CER062517>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
552	4	Sucre, Ovejas; Calle 24 # 15C-23 Calle La Nariño	25 Mbps	23


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0       2640   23062000       2912     474000        150          0
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      33000         43          0          0          0
* Gi0/0/1.338                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     501000        299    5871000        651          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0       1000          1          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel10                      0          0          0       2640    9537000       1138     534000        311          0
* Tunnel20                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     507000        311    6133000        677          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER044453#sh clo
*20:29:19.491 gmt Thu Oct 16 2025
CER044453#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
691	4	Sucre, Galeras; Carrera 12 # 9 -95	25 Mbps	24,5

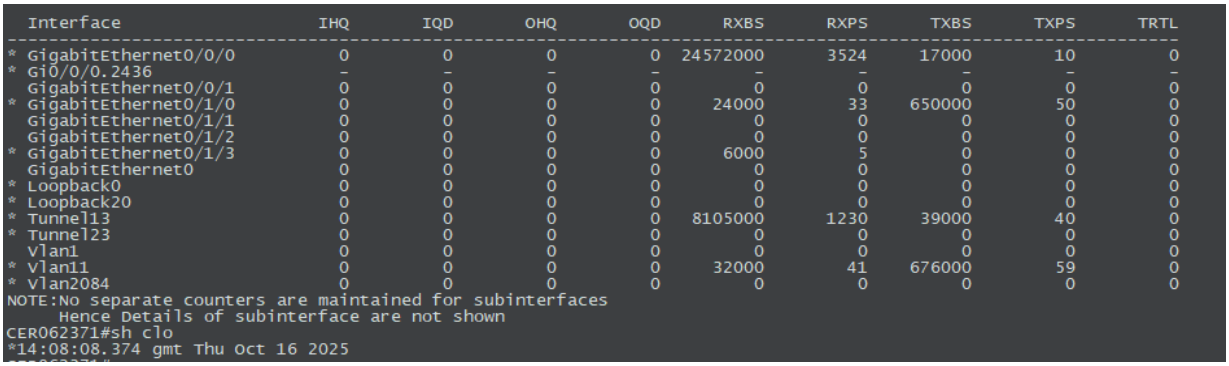

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   24572000       3524      17000         10          0
* Gi0/0/0.2436                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      24000         33     650000         50          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0       6000          5          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                      0          0          0          0    8105000       1230      39000         40          0
* Tunnel23                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      32000         41     676000         59          0
* Vlan2084                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062371#sh clo
*14:08:08.374 gmt Thu Oct 16 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
609	3	Caquetá, Solita; Calle 4 # 2-20-22, Barrio El Centro	25 Mbps	23,6

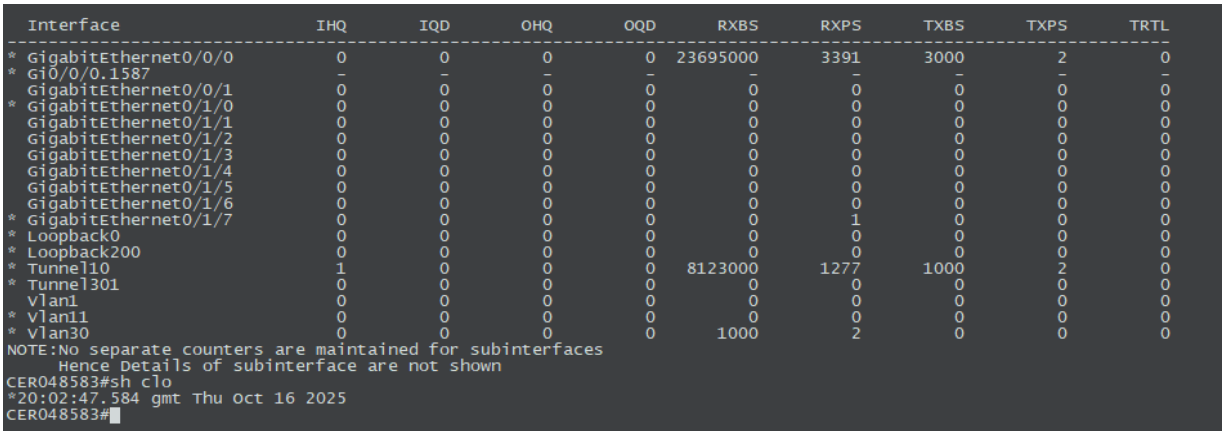

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   23695000       3391       3000          2          0
* Gi0/0/0.1587                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel10                      1          0          0          0    8123000       1277       1000          2          0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER048583#sh clo
*20:02:47.584 gmt Thu Oct 16 2025
CER048583#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
644	4	Cundinamarca, El Peñón; Carrera 3 # 3-44, Palacio Municipal	32 Mbps	31,2

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0       1000          2      22000          5          0
* Gi0/0/0.2310                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2530                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0    2278000        353    1916000        282          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0   31207000       4083    2564000        374          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0      12000         10          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      0          0          0          0    4838000        533    2302000        337          0
* Tunnel21                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1035                      0          0          0          0   30870000       3943    2519000        353          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER053983>sh clo
*20:02:49.194 gmt Thu Oct 16 2025
CER053983>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
648	3	Cundinamarca, Nimaima; Calle 3 con Carrera 3 Esquina	32 Mbps	30


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0        602   30004000       4558    2727000        353          0
* Gi0/0/0.2317                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2533                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0    2477000        338    1193000        201          0
* GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                     0          0          0        602    1414000        218    2506000        325          0
* Tunnel21                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                       0          0          0          0          0          2          0          0          0
* Vlan100                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CSJ_NIMAIMA_DESPACHOS_JUDICIALES#sh clo
*20:05:05.720 gmt Thu Oct 16 2025
CSJ_NIMAIMA_DESPACHOS_JUDICIALES#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
645	4	Cundinamarca, Guataqui; Carrera 4 # 5-03, Palacio Municipal	25 Mbps	24,1

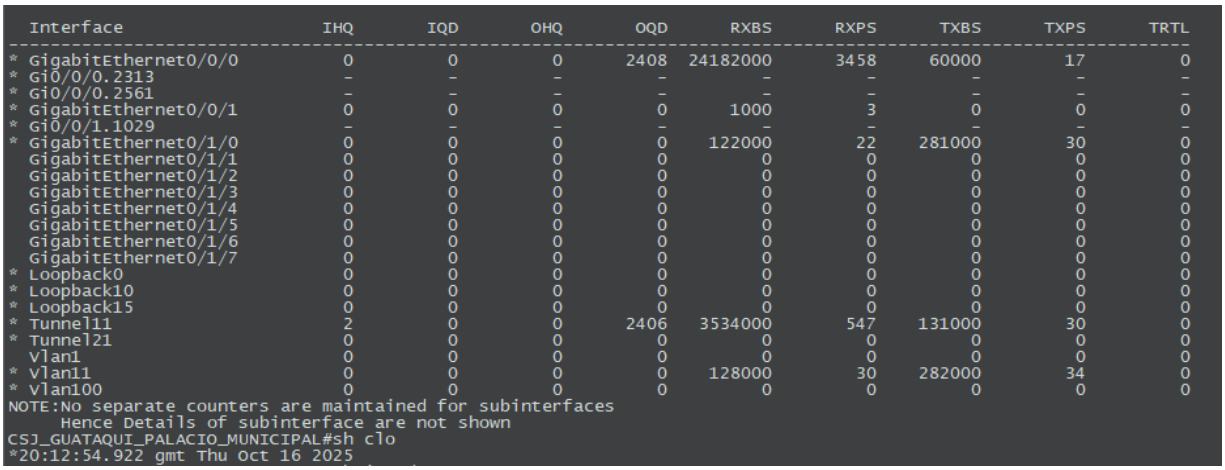

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0       2408   24182000       3458      60000         17          0
* Gi0/0/0.2313                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2561                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0       1000          3          0          0          0
* Gi0/0/1.1029                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     122000         22     281000         30          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback15                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      2          0          0       2406    3534000        547     131000         30          0
* Tunnel21                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     128000         30     282000         34          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CSJ_GUATAQUI_PALACIO_MUNICIPAL#sh clo
*20:12:54.922 gmt Thu Oct 16 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
650	4	Cundinamarca, Puli; Calle 6 # 6-70, Palacio de Justicia	32 Mbps	30,9

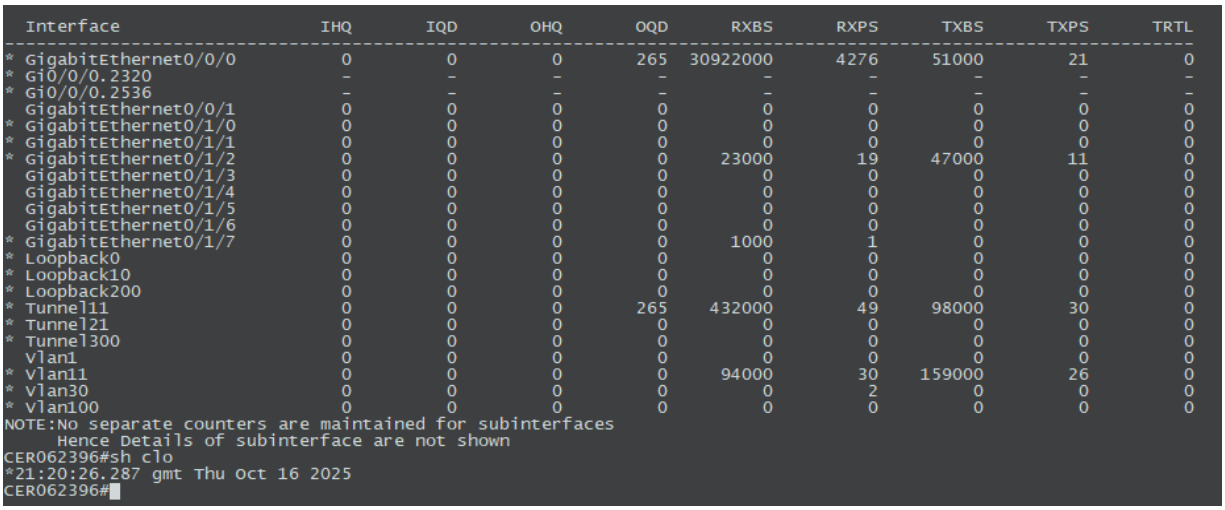


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0        265   30922000       4276      51000         21          0
* Gi0/0/0.2320                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2536                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0      23000         19      47000         11          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      0          0          0        265     432000         49      98000         30          0
* Tunnel21                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      94000         30     159000         26          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          2          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062396#sh clo
*21:20:26.287 gmt Thu Oct 16 2025
CER062396#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
652	3	Cundinamarca, Quetame; Calle 2 # 4-18, Parque principal, Palacio de Justicia	32 Mbps	31,8

```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0               0          0         0          0          0          0          0          0         0
* FastEthernet1               0          0         0          0     149000         38     996000        110         0
* FastEthernet2               0          0         0          0   31848000       4521     317000         62         0
  FastEthernet3               0          0         0          0          0          0          0          0         0
* FastEthernet4               0        535         0     125316       4000          5       5000          1        40
* FastEthernet4.2322          -          -         -          -          -          -          -          -         -
* FastEthernet4.2538          -          -         -          -          -          -          -          -         -
* Loopback0                   0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Loopback20                  0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel11                    0     678221         0          8    2781000        395     175000         39         0
  Tunnel14                    0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel21                    0          0         0          2          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                      0          0         0          0     149000         38     988000        110         0
* Vlan100                     0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Vlan2081                    0          0         0          0   31443000       4483     304000         60         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062394>sh clo
*21:12:20.404 gmt Thu Oct 16 2025
CER062394>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
660	4	Cundinamarca, Villagomez; Carrera 3 # 4-22	25 Mbps	23,9

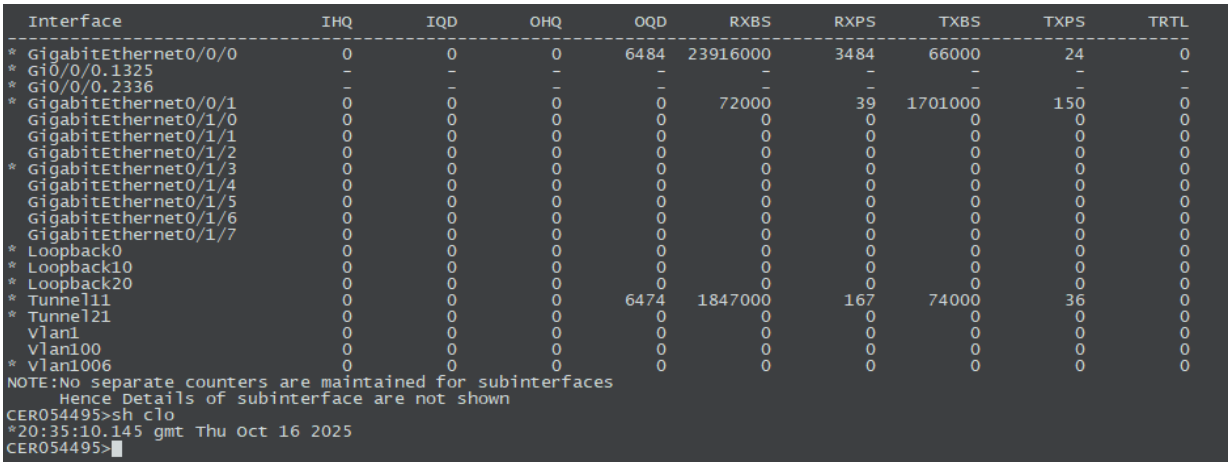

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           6484        23916000    3484        66000       24          0
* Gi0/0/0.1325                -           -           -           -           -           -           -           -           -
* Gi0/0/0.2336                -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           0           72000       39          1701000     150         0
  GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback20                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel11                    0           0           0           6474        1847000     167         74000       36          0
* Tunnel21                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan100                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan1006                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054495>sh clo
*20:35:10.145 gmt Thu Oct 16 2025
CER054495>
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
687	4	Sucre, Buenavista; Carrera 10 #7-33	25 Mbps	23,2

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   23211000       3323       3000          2          0
* Gi0/0/0.1609                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel10                     11          0          0          0    4447000        700       1000          2          0
* Tunnel20                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan3367                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054260#sh clo
*06:19:40.691 gmt Thu Oct 16 2025
CER054260#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
918	3	Santander, Guepsa; Carrera 5 Calle 3 Esquina, Palacio Municipal	25 Mbps	23,1

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          13638    23141000  3583      4000      2         0
* Gi0/0/0.1756                -          -          -          -        -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0        0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0        0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0        1000      1         0         0         0
* Loopback0                   0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Loopback200                 0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Tunnel15                    2          0          0          13620    8542000   996       1000      2         0
* Tunnel300                   0          0          0          0        0         0         0         0         0
  Vlan1                       0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Vlan11                      0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Vlan30                      0          0          0          0        1000      2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056615>sh clo
*20:17:02.373 gmt Thu Oct 16 2025
CER056615>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
699	4	Valle Del Cauca, El Aguila;Calle 9 Nro.3-02 Palacio Municipal piso 1º	25 Mbps	24,8

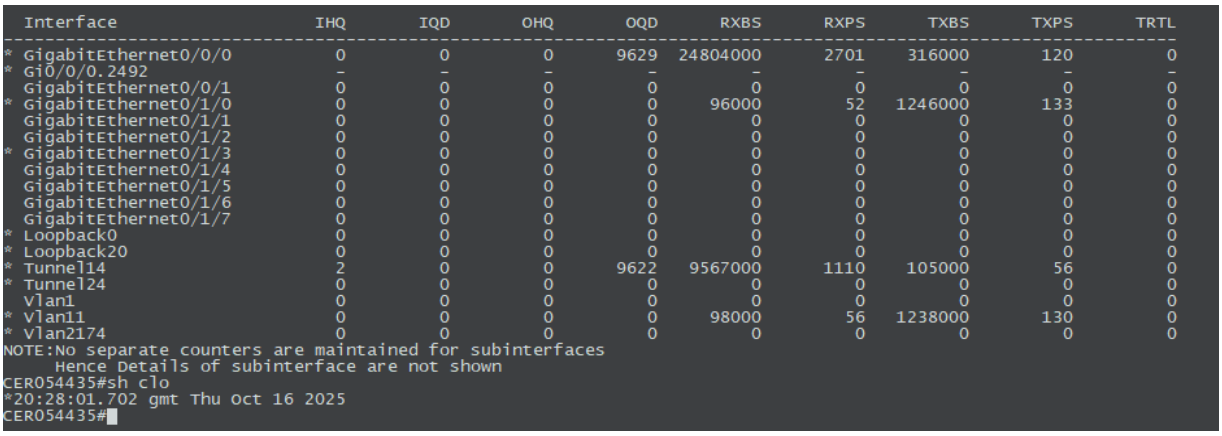

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0       9629   24804000       2701     316000        120          0
* Gi0/0/0.2492                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      96000         52    1246000        133          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      2          0          0       9622    9567000       1110     105000         56          0
* Tunnel24                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      98000         56    1238000        130          0
* Vlan2174                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054435#sh clo
*20:28:01.702 gmt Thu Oct 16 2025
CER054435#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
701	3	Valle Del Cauca, Riofrio; Calle 6 # 9-38	25 Mbps	23,3

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     380159   23332000       3589    1398000        132          0
* Gi0/0/0.2496                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0    1371000        138     225000        117          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      0          0          0     369916    1016000        133     650000         74          0
* Tunnel24                      0          0          0      10072          0          0          0          0          0
* Tunnel210                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062367#sh clo
*20:23:12.132 gmt Thu Oct 16 2025
CER062367#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
705	3	Quindío, Buenavista; Carrera 3 A # 2-29, Palacio Municipal	32 Mbps	30


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   30003000       4295      17000          6          0
* GI0/0/0.2411                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0       4852      21000          2      25000          2          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0       1000          2          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                      4          0          0          0    5509000        865      35000          6          0
* Tunnel22                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel301                     0        352          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER063105#sh clo
15:37:59.858 gmt Thu Oct 16 2025
CER063105#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
916	1	Santander, Bucaramanga; Calle 45 # 14A-50	25 Mbps	23,1

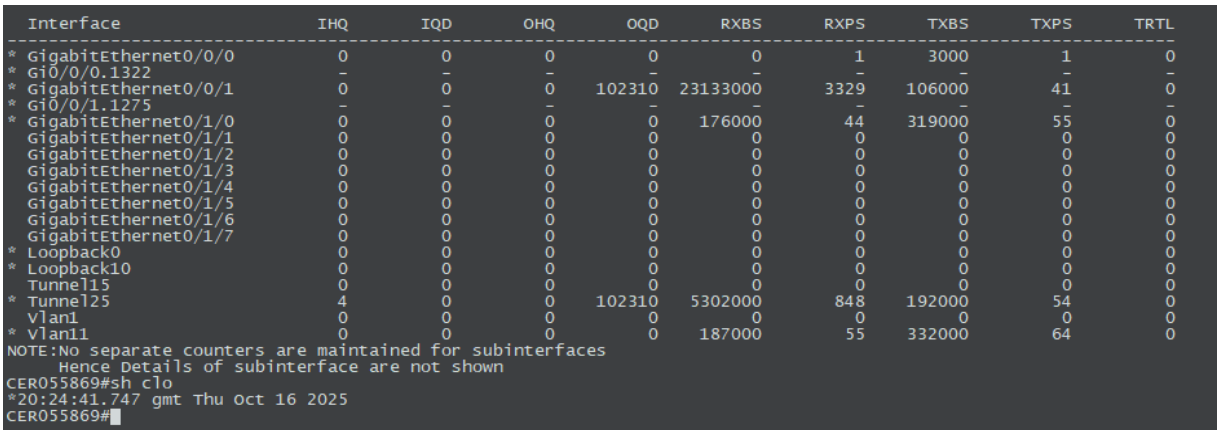


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS     TXBS     TXPS     TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0           0          0          1     3000        1        0
* Gi0/0/0.1322                  -           -            -           -          -          -        -        -        -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0            0      102310   23133000       3329   106000       41        0
* Gi0/0/1.1275                  -           -            -           -          -          -        -        -        -
* GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0     176000         44   319000       55        0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0            0           0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0            0           0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0            0           0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/7          0           0            0           0          0          0        0        0        0
* Loopback0                     0           0            0           0          0          0        0        0        0
* Loopback10                    0           0            0           0          0          0        0        0        0
  Tunnel15                      0           0            0           0          0          0        0        0        0
* Tunnel25                      4           0            0      102310    5302000        848   192000       54        0
  Vlan1                         0           0            0           0          0          0        0        0        0
* Vlan11                        0           0            0           0     187000         55   332000       64        0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055869#sh clo
*20:24:41.747 gmt Thu Oct 16 2025
CER055869#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
919	3	Santander, Lebrija; Carrera 12 No. 12-36 Barrio centro de Lebrija, Santander	25 Mbps	24,4

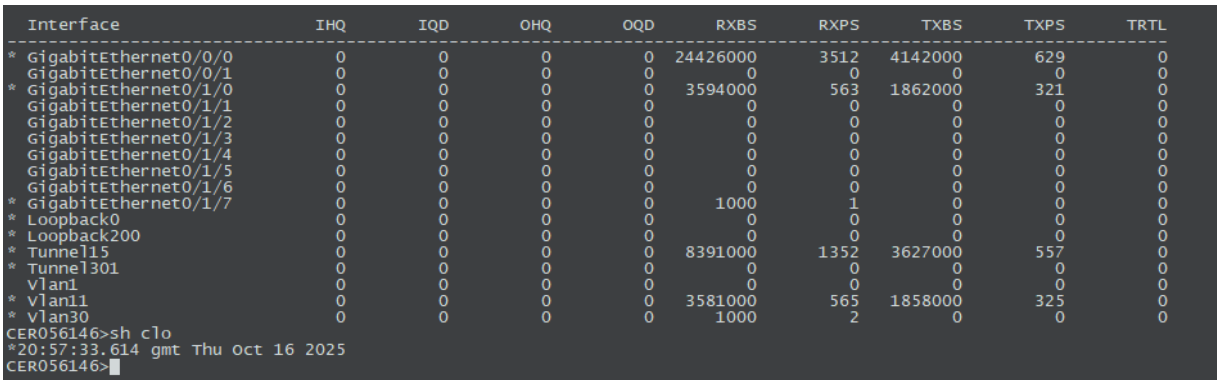

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   24426000       3512    4142000        629          0
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0    3594000        563    1862000        321          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                      0          0          0          0    8391000       1352    3627000        557          0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0    3581000        565    1858000        325          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
CERO56146>sh clo
*20:57:33.614 gmt Thu Oct 16 2025
CERO56146>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
917	4	Santander, Bolívar; Calle 9 # 3-31 Piso 2, Palacio Municipal	25 Mbps	24,2

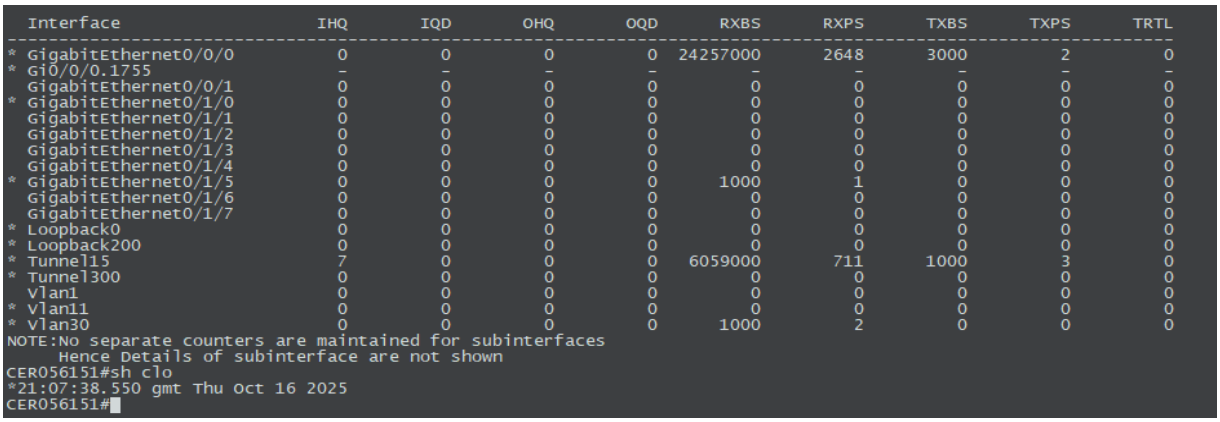


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0           0   24257000       2648       3000          2         0
* Gi0/0/0.1755                  -           -            -           -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0            0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0            0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/5          0           0            0           0       1000          1          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Tunnel15                      7           0            0           0    6059000        711       1000          3         0
* Tunnel300                     0           0            0           0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Vlan11                        0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Vlan30                        0           0            0           0       1000          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056151#sh clo
*21:07:38.550 gmt Thu Oct 16 2025
CER056151#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
920	4	Santander, Pinchote; Carrera 5 # 4-13	25 Mbps	23,1


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0           0   23147000       3515      44000         18          0
* GiO/0/0.1757                  -           -            -           -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0            0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0      79000         13     122000         13          0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0            0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0            0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0            0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0            0           0          0          1          0          0          0
* Loopback0                     0           0            0           0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0           0            0           0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                      1           0            0           0    1791000        160      93000         16          0
* Tunnel300                     0           0            0           0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0           0            0           0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0           0            0           0      91000         16     135000         17          0
* Vlan30                        0           0            0           0          0          1          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055950>sh clo
*20:52:53.287 gmt Thu Oct 16 2025
CER055950>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
921	4	Santander, Puerto Wilches; Carrera 3 # 3-16 Barrio El Centro	25 Mbps	23,8

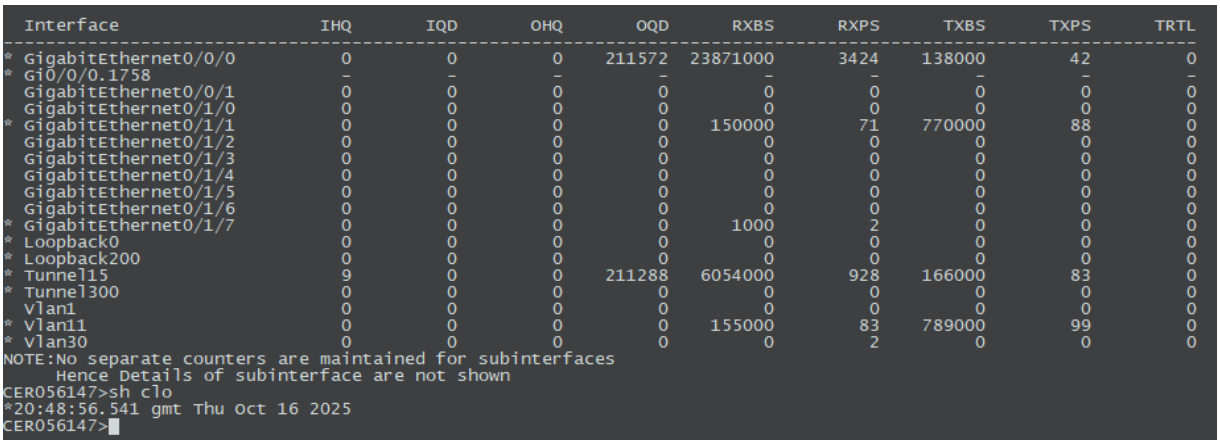


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0            0           211572      23871000    3424        138000      42          0
* Gi0/0/0.1758                -           -            -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/0        0           0            0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/1        0           0            0           0           150000      71          770000      88          0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0            0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0            0           0           1000        2           0           0           0
* Loopback0                   0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200                 0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel15                    9           0            0           211288      6054000     928         166000      83          0
* Tunnel300                   0           0            0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                      0           0            0           0           155000      83          789000      99          0
* Vlan30                      0           0            0           0           0           2           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056147>sh clo
*20:48:56.541 gmt Thu Oct 16 2025
CER056147>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
923	3	Santander, Sucre; Calle 6 # 4-85, Casa de la Cultura	25 Mbps	23,1

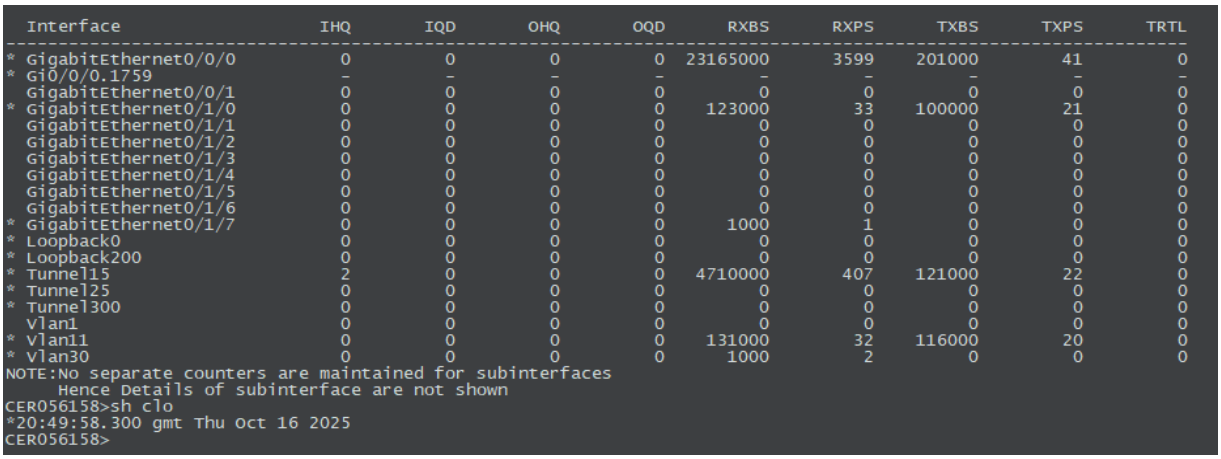

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0           0   23165000       3599     201000         41          0
* Gi0/0/0.1759                  -           -           -           -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0     123000         33     100000         21          0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                      2           0           0           0    4710000        407     121000         22          0
* Tunnel25                      0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                     0           0           0           0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0           0           0           0     131000         32     116000         20          0
* Vlan30                        0           0           0           0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056158>sh clo
*20:49:58.300 gmt Thu Oct 16 2025
CER056158>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
934	4	Santander, Curití; Calle 8 # 8-55, Alcaldia Municipal	25 Mbps	23

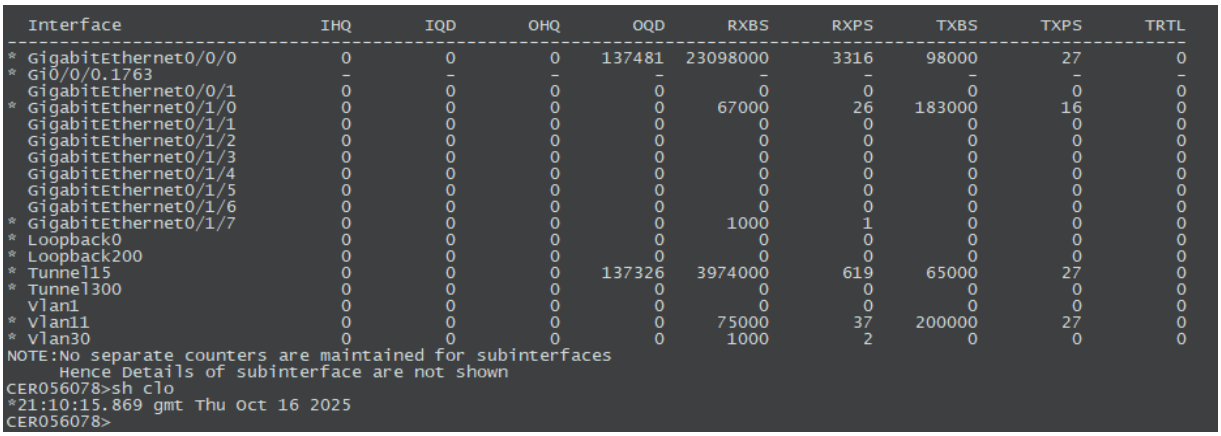

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          137481    23098000   3316       98000      27         0
* Gi0/0/0.1763                -          -          -          -         -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         67000      26         183000     16         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         1000       1          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Tunnel15                    0          0          0          137326    3974000    619        65000      27         0
* Tunnel300                   0          0          0          0         0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0         75000      37         200000     27         0
* Vlan30                      0          0          0          0         1000       2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056078>sh clo
*21:10:15.869 gmt Thu Oct 16 2025
CER056078>
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
936	4	Santander, Guavatá; Calle 4 # 3-01	25 Mbps	24,6

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0   24653000       3527       3000          2          0
* Gi0/0/0.1765               -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                   6          0          0          0    8320000       1303       1000          2          0
* Tunnel300                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                     0          0          0          0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056737>sh clo
21:13:33.411 gmt Thu Oct 16 2025
CER056737>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
937	4	Santander, Jesus María; Carrera 6 # 5-01	25 Mbps	23,5

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0        329   23535000       3510      33000         14          0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0       8000          4      38000          4          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                   0          0          0        329     805000         72      11000          6          0
* Tunnel300                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0      11000          7      47000          6          0
* Vlan30                     0          0          0          0       1000          2          0          0          0
CER056230>
CER056230>sh clo
*21:14:19.668 gmt Thu Oct 16 2025
CER056230>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
939	4	Santander, Rionegro; Calle 11 # 8-40	25 Mbps	24

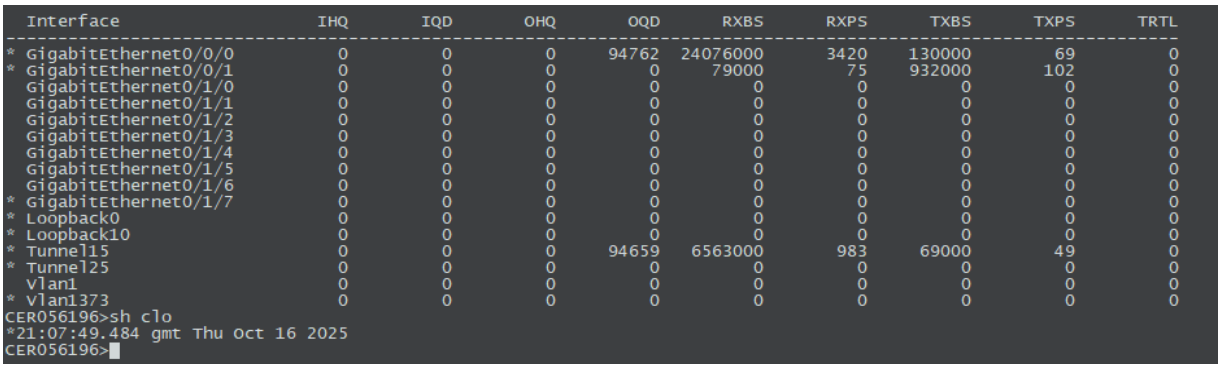

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      94762   24076000       3420     130000         69          0
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      79000         75     932000        102          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                      0          0          0      94659    6563000        983      69000         49          0
* Tunnel25                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1373                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER056196>sh clo
*21:07:49.484 gmt Thu Oct 16 2025
CER056196>
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
941	3	Santander, Suaita; Calle 7 # 7-22	25 Mbps	23,6

```
  Interface                IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0           0           0           0   23600000       3506     374000        108          0
* GiO/0/0.1769               -           -           -           -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0           0           0           0      91000         51     730000         96          0
* GigabitEthernet0/1/1       0           0           0           0     175000         52     211000         43          0
  GigabitEthernet0/1/2       0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0           0           0           0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                  0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                   1           0           0           0    2189000        247     280000        104          0
* Tunnel300                  0           0           0           0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0           0           0           0     284000        112     963000        139          0
* Vlan30                     0           0           0           0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055788>sh clo
*21:21:49.629 gmt Thu Oct 16 2025
CER055788>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
943	4	Santander, Coromoro; Carrera 5 # 5-22 Piso 2, Palacio Municipal	25 Mbps	23,7

```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0            0           0     23749000       3402      42000         15          0
* Gi0/0/0.1771                -           -            -           -            -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0            0           0            0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0            0           0        79000         28     224000         22          0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0            0           0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0            0           0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0            0           0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0            0           0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0            0           0            0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0            0           0            0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0            0           0         1000          1          0          0          0
* Loopback0                   0           0            0           0            0          0          0          0          0
* Loopback200                 0           0            0           0            0          0          0          0          0
* Tunnel15                    0           0            0           0      5173000        810      81000         24          0
* Tunnel300                   0           0            0           0            0          0          0          0          0
  Vlan1                       0           0            0           0            0          0          0          0          0
* Vlan11                      0           0            0           0        86000         34     240000         31          0
* Vlan30                      0           0            0           0            0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056610>sh clo
*21:17:41.229 gmt Thu Oct 16 2025
CER056610>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
965	4	Santander, Suratá; Carrera 4 # 4-19	25 Mbps	23,9

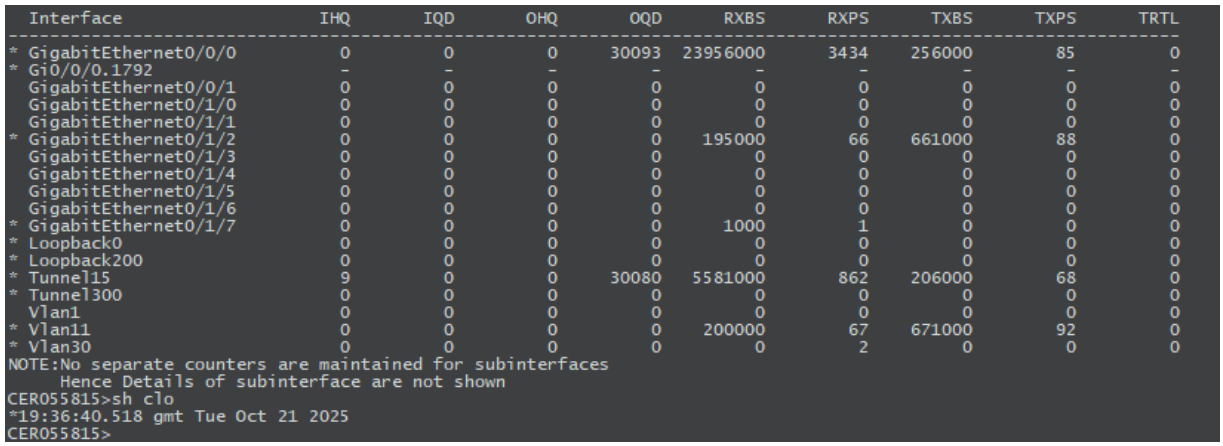

```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0       30093   23956000        3434      256000          85           0
* Gi0/0/0.1792                  -           -            -           -          -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0            0           0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0          0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0     195000          66      661000          88           0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0            0           0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0            0           0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0            0           0          0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0            0           0       1000           1           0           0           0
* Loopback0                     0           0            0           0          0           0           0           0           0
* Loopback200                   0           0            0           0          0           0           0           0           0
* Tunnel15                      9           0            0       30080    5581000         862      206000          68           0
* Tunnel300                     0           0            0           0          0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0            0           0          0           0           0           0           0
* Vlan11                        0           0            0           0     200000          67      671000          92           0
* Vlan30                        0           0            0           0          0           2           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055815>sh clo
*19:36:40.518 gmt Tue Oct 21 2025
CER055815>
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
947	4	Santander, Mogotes; Carrera 6 # 5-63	25 Mbps	23,6

```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0       14249     23684000        3462      186000         103           0
* Gi0/0/0.1775                  -           -            -           -            -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0       90000          74     1677000         293           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0            0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0            0           0        1000           1           0           0           0
* Loopback0                     0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel15                      0           0            0       14232     6531000        1041       98000          66           0
* Tunnel300                     0           0            0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                        0           0            0           0       89000          65     1685000         284           0
* Vlan30                        0           0            0           0           0           1           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055971>sh clo
*21:15:48.534 gmt Thu Oct 16 2025
CER055971>
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
948	4	Santander, Molagavita; Carrera 3 # 4-15, Palacio Municipal	25 Mbps	24,6

```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0            0           2156        24667000    2699        22000       11          0
* Gi0/0/0.1776                -           -            -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0            0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0            0           0           15000       6           177000      5           0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0            0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0            0           0           1000        1           0           0           0
* Loopback0                   0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200                 0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel15                    8           0            0           2155        7207000     844         27000       7           0
* Tunnel25                    0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel300                   0           0            0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                      0           0            0           0           25000       7           194000      17          0
* Vlan30                      0           0            0           0           0           1           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056235>sh clo
*19:37:39.178 gmt Tue Oct 21 2025
CER056235>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1531	3	Antioquia, Santa Rosa de Osos; Carrera 31 # 29-03	64 Mbps	62,6

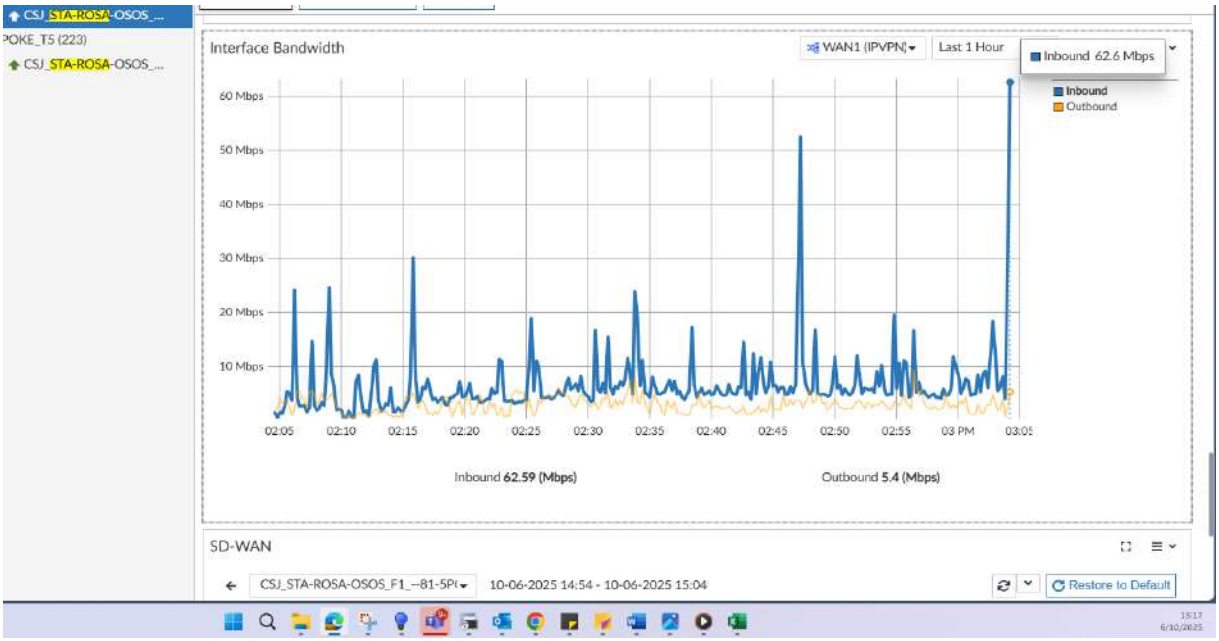


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
688	4	Sucre, Chalán; Carrera 3 # 5A-08	25 Mbps	23,4

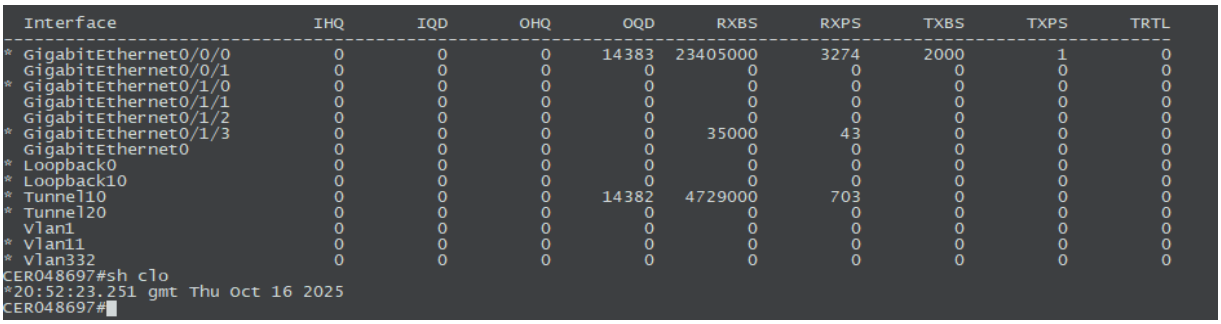


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0      14383   23405000       3274       2000          1         0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0      35000         43          0          0         0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel10                   0          0          0      14382    4729000        703          0          0         0
* Tunnel20                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan332                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
CER048697#sh clo
*20:52:23.251 gmt Thu Oct 16 2025
CER048697#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
944	4	Santander, Gambita; Carrera 9 # 4-28, Palacio Municipal	25 Mbps	23,2

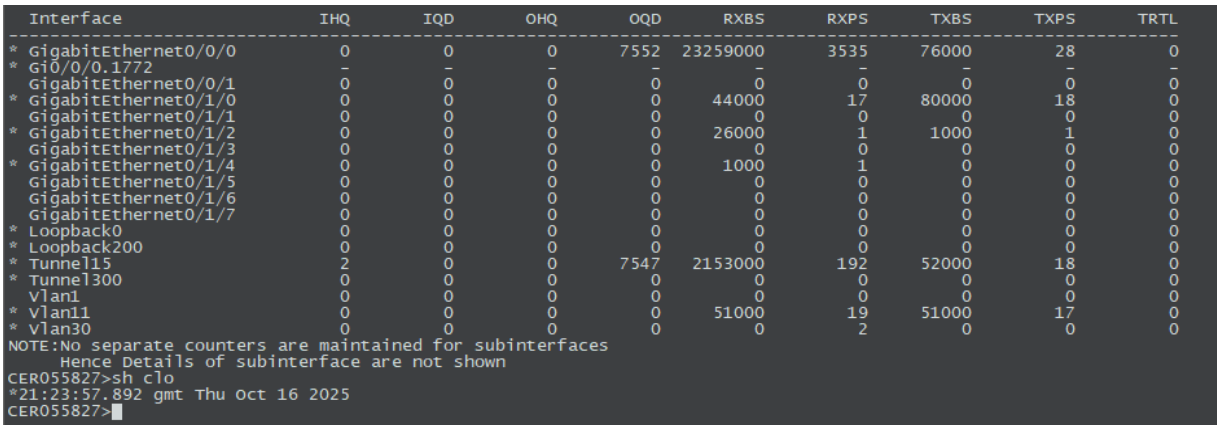

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           7552      23259000    3535        76000       28          0
* Gi0/0/0.1772                -           -           -           -         -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           0         0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0         44000       17          80000       18          0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0         0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0         26000       1           1000        1           0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0         0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/4        0           0           0           0         1000        1           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0           0           0         0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0           0         0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7        0           0           0           0         0           0           0           0           0
* Loopback0                   0           0           0           0         0           0           0           0           0
* Loopback200                 0           0           0           0         0           0           0           0           0
* Tunnel15                    2           0           0           7547      2153000     192         52000       18          0
* Tunnel300                   0           0           0           0         0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0           0           0         0           0           0           0           0
* Vlan11                      0           0           0           0         51000       19          51000       17          0
* Vlan30                      0           0           0           0         0           2           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055827>sh clo
*21:23:57.892 gmt Thu Oct 16 2025
CER055827>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
964	4	Santander, San Miguel; Carrera 4 # 4-15, Palacio Municipal	25 Mbps	23,2

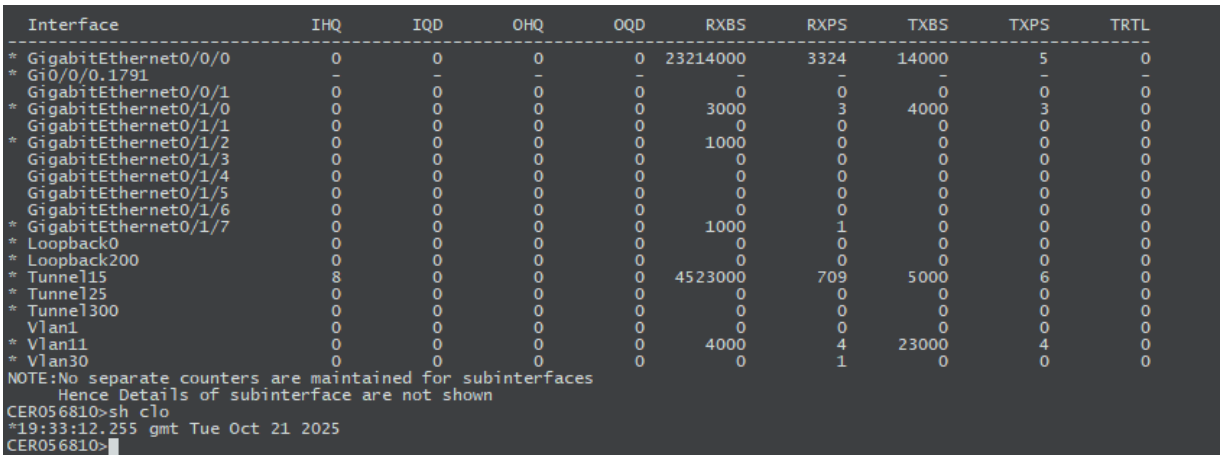


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   23214000       3324      14000          5          0
* Gi0/0/0.1791                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0       3000          3       4000          3          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0       1000          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                      8          0          0          0    4523000        709       5000          6          0
* Tunnel25                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0       4000          4      23000          4          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          1          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056810>sh clo
*19:33:12.255 gmt Tue Oct 21 2025
CER056810>
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
951	4	Santander, Santa Helena del Opón; CARRERA 3 No. 4-03 centro	25 Mbps	24,1

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0       1511  24199000      2646     17000         9         0
* Gi0/0/0.1779                  -          -          -          -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      5000         5      7000         5         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0      1000         2         0         0         0
* Loopback0                     0          0          0          0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0          0          0          0         0         0         0         0         0
* Tunnel15                      0          0          0       1509   5835000       688      3000         4         0
* Tunnel300                     0          0          0          0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0          0          0          0         0         0         0         0         0
* Vlan30                        0          0          0          0      1000         2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056540#sh cl
% Ambiguous command:  "sh cl"
CER056540#sh clo
*19:35:54.098 gmt Tue Oct 21 2025
CER056540#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
617	4	Cauca, Lopez de Micay; Calle de la Pola Piso 2, Notaria	20Mbps	22,9

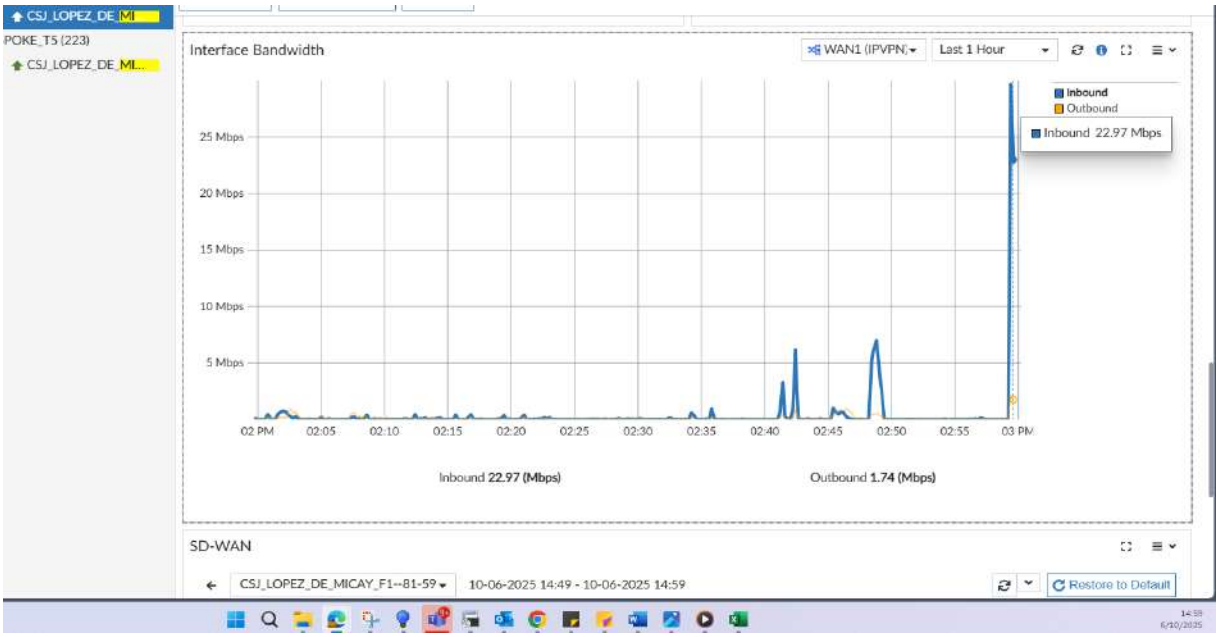


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
953	4	Santander, Aratoca; Carrera 5 con calle 5 Esquina, Local 1	25 Mbps	23,7

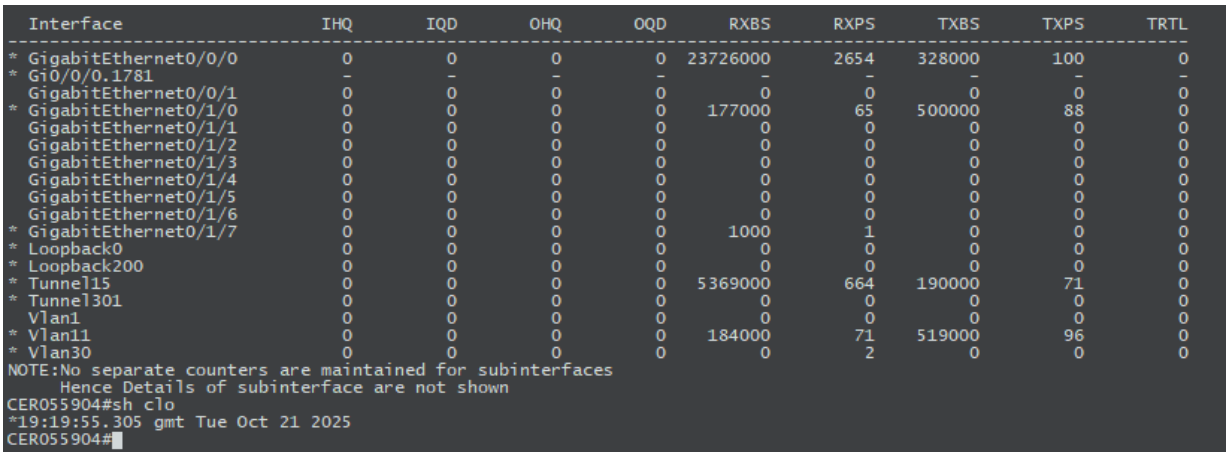

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   23726000       2654     328000        100          0
* Gi0/0/0.1781                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     177000         65     500000         88          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                      0          0          0          0    5369000        664     190000         71          0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     184000         71     519000         96          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055904#sh clo
*19:19:55.305 gmt Tue Oct 21 2025
CER055904#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
954	4	Santander, Capitanejo; Carrera 5 # 3-70	25 Mbps	22,7

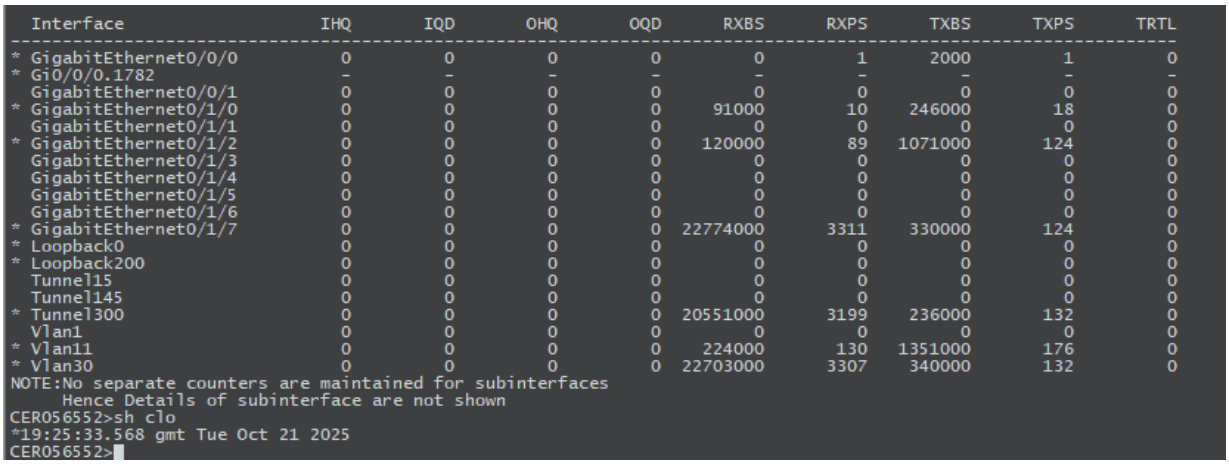


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0           0           0           1        2000           1           0
* Gi0/0/0.1782                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0       91000          10      246000          18           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0      120000          89     1071000         124           0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0    22774000        3311      330000         124           0
* Loopback0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Tunnel15                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Tunnel145                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel300                     0           0           0           0    20551000        3199      236000         132           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                        0           0           0           0      224000         130     1351000         176           0
* Vlan30                        0           0           0           0    22703000        3307      340000         132           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056552>sh clo
*19:25:33.568 gmt Tue Oct 21 2025
CER056552>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
957	4	Santander, El Playón; Calle 11 No. 5-27/29	25 Mbps	23,5


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/0.1814                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     124000         58     258000         53          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   23559000       2586     159000         45          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                      0          0          0          0    6233000        732     201000         71          0
* Tunnel25                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1266                      0          0          0          0    6777000        744     273000         75          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056184>sh clo
*19:37:29.887 gmt Tue Oct 21 2025
CER056184>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
956	3	Santander, Confines; Calle 5 # 5-44, Palacio de Justicia	25 Mbps	23,7

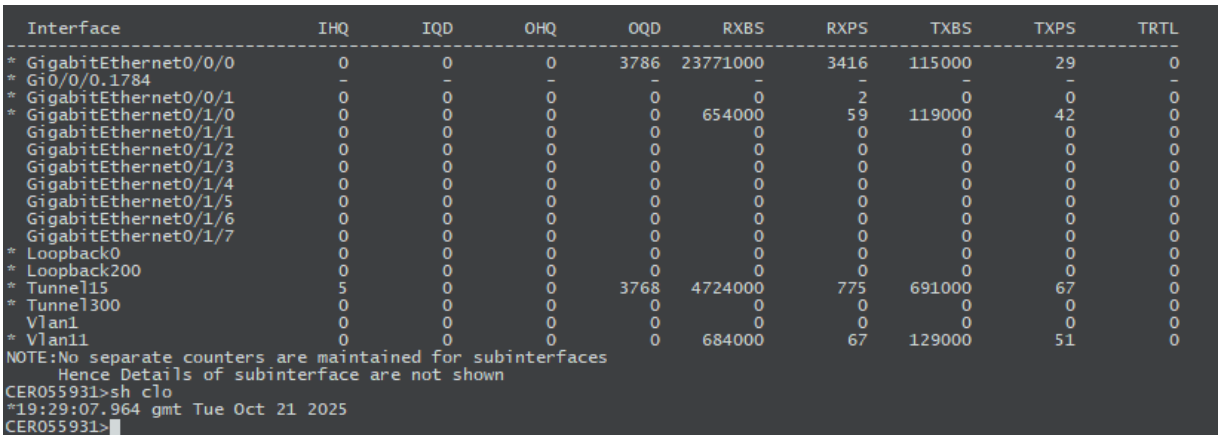

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0       3786   23771000       3416     115000         29         0
* Gi0/0/0.1784                -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          2          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0     654000         59     119000         42         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel15                    5          0          0       3768    4724000        775     691000         67         0
* Tunnel300                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                      0          0          0          0     684000         67     129000         51         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO55931>sh clo
*19:29:07.964 gmt Tue Oct 21 2025
CERO55931>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
959	4	Santander, Guadalupe; Carrera 4 # 5-31, Palacio Municipal	25 Mbps	23,2

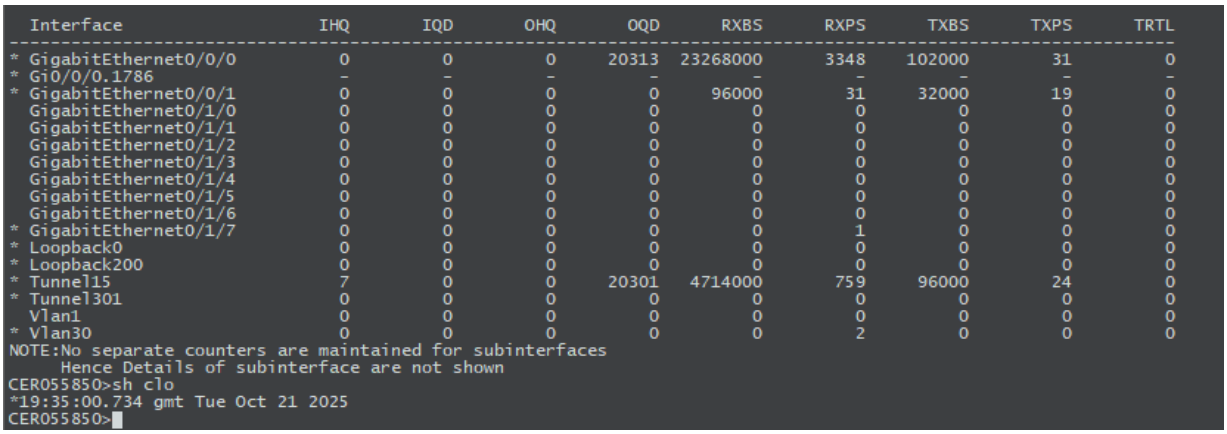

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      20313   23268000       3348     102000         31          0
* Gi0/0/0.1786                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      96000         31      32000         19          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                      7          0          0      20301    4714000        759      96000         24          0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055850>sh clo
*19:35:00.734 gmt Tue Oct 21 2025
CER055850>
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
960	4	Santander, La Belleza; Calle 6 # 2-62, Palacio de Justicia	25 Mbps	23

```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0         0          0   23026000       3297     16000         7         0
* Gi0/0/0.1787                 -          -         -          -          -          -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1         0          0         0          0          0          0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0         0          0         0          0       3000          2     52000         2         0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0         0          0          0          0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0         0          0          0          0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0         0          0          0          0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0         0          0          0          0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0         0          0          0          0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0         0          0          0          0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0          0         0          0       1000          2         0         0         0
* Loopback0                    0          0         0          0          0          0         0         0         0
* Loopback200                  0          0         0          0          0          0         0         0         0
* Tunnel15                     0          0         0          0    4272000        664     10000         4         0
* Tunnel300                    0          0         0          0          0          0         0         0         0
  Vlan1                        0          0         0          0          0          0         0         0         0
* Vlan11                       0          0         0          0       7000          2     66000         3         0
* Vlan30                       0          0         0          0          0          2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO56393>sh clo
*19:39:41.386 gmt Tue Oct 21 2025
CERO56393>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
961	3	Santander, Los Santos; Carrera7 # 2-22, Alcaldía Municipal	25 Mbps	23,7


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      28020   23797000       2611     312000         92         0
* Gi0/0/0.1788                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     174000         78     902000        118         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          2          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel15                      0          0          0      27613    5927000        688     180000         66         0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          1          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO55930>sh clo
*19:51:56.263 gmt Tue Oct 21 2025
CERO55930>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
963	4	Santander, San Andres de Buga; Carrera 5 # 7-41 Piso 2	25 Mbps	23,8

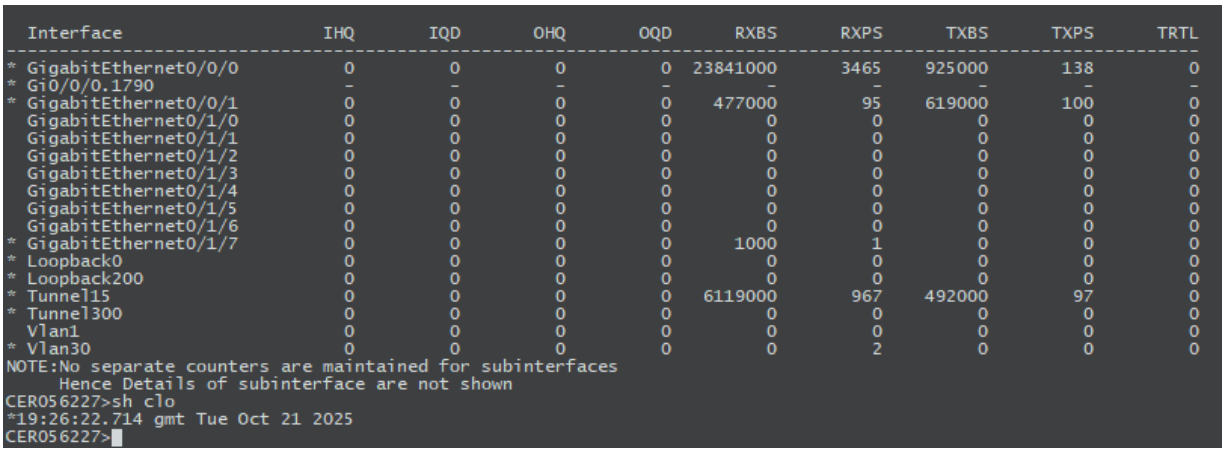

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           0       23841000        3465      925000         138           0
* Gi0/0/0.1790                -           -           -           -              -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           0         477000          95      619000         100           0
  GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0              0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0              0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0              0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0              0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0           0           0              0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0           0           0              0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0           0              0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0           0           0           1000           1           0           0           0
* Loopback0                   0           0           0           0              0           0           0           0           0
* Loopback200                 0           0           0           0              0           0           0           0           0
* Tunnel15                    0           0           0           0        6119000         967      492000          97           0
* Tunnel300                   0           0           0           0              0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0           0           0              0           0           0           0           0
* Vlan30                      0           0           0           0              0           2           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056227>sh clo
*19:26:22.714 gmt Tue Oct 21 2025
CER056227>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
967	4	Santander, Villanueva; Carrera 15 # 17-55	25 Mbps	24,4

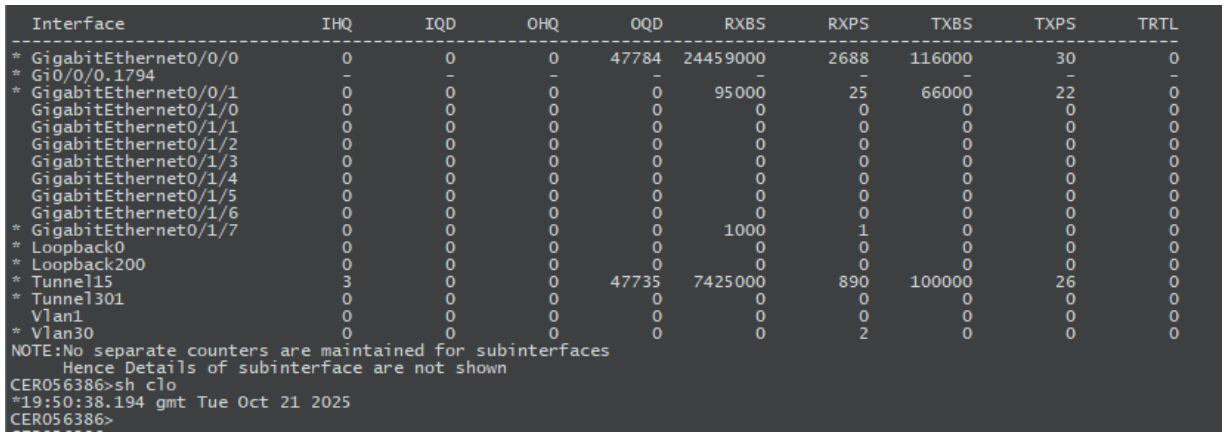


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0       47784   24459000       2688     116000         30         0
* Gi0/0/0.1794                  -           -           -           -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0      95000         25      66000         22         0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                     0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Tunnel15                      3           0           0       47735    7425000        890     100000         26         0
* Tunnel301                     0           0           0           0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Vlan30                        0           0           0           0          0          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056386>sh clo
*19:50:38.194 gmt Tue Oct 21 2025
CER056386>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
968	4	Santander, Zapatoca; Carrera 9 # 20-36, Palacio Municipal	25 Mbps	24,4

```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0           0   24451000       4575     146000         60         0
* GiO/O/O.1795                  -           -            -           -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0            0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0     315000        133    2289000        237         0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0            0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/6          0           0            0           0       1000          1          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Tunnel15                     12           0            0           0    9828000       1845     336000        146         0
* Tunnel300                     0           0            0           0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Vlan11                        0           0            0           0     325000        146    2351000        254         0
* Vlan30                        0           0            0           0          0          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055880>sh clo
19:50:46.708 gmt Tue Oct 21 2025
CER055880>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
972	3	Santander, Contratación; Cra 4 # 6-51, Palacio Municipal	25 Mbps	23,8

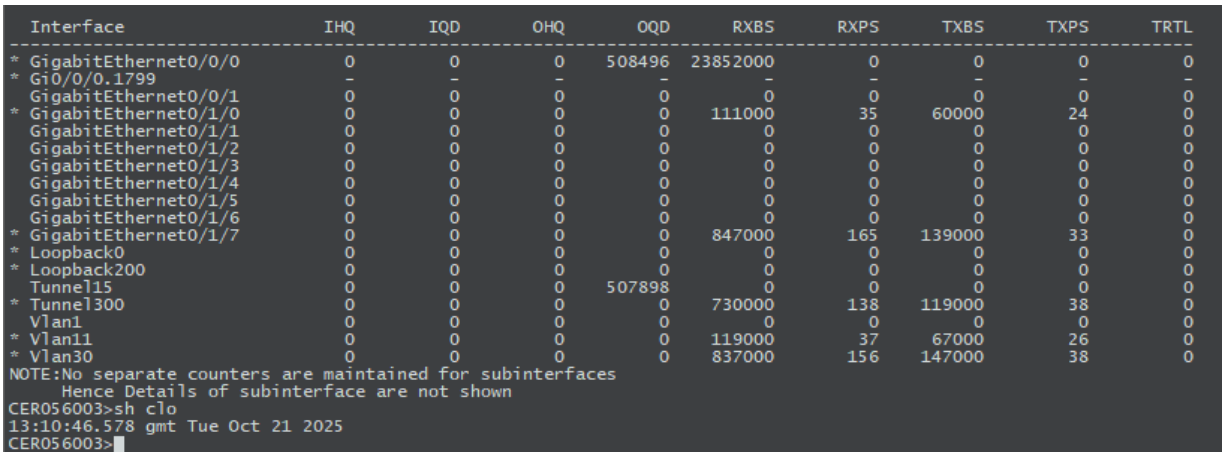


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0        508496   23852000          0          0          0          0
* Gi0/0/0.1799                -          -          -             -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0             0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0             0     111000         35      60000         24          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0             0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0             0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0             0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0             0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0             0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0             0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0             0     847000        165     139000         33          0
* Loopback0                   0          0          0             0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0             0          0          0          0          0          0
  Tunnel15                    0          0          0        507898          0          0          0          0          0
* Tunnel300                   0          0          0             0     730000        138     119000         38          0
  Vlan1                       0          0          0             0          0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0             0     119000         37      67000         26          0
* Vlan30                      0          0          0             0     837000        156     147000         38          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056003>sh clo
13:10:46.578 gmt Tue Oct 21 2025
CER056003>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
590	3	Boyacá, Socha; Calle 5 # 9-55	32 Mbps	29,6


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0      41768   29686000       4368    3174000        517          0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0    3237000        557    3486000        620          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                   5          0          0      41620    8745000       1450    3304000        557          0
* Tunnel300                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                     0          0          0          0          0          2          0          0          0
CER062497#sh clo
20:05:40.442 gmt Thu Oct 16 2025
CER062497#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
882	4	CSJ - CUNDINAMARCA EL ROSAL JUZGADO PROMISCUO CLL 7	32 Mbps	29,1

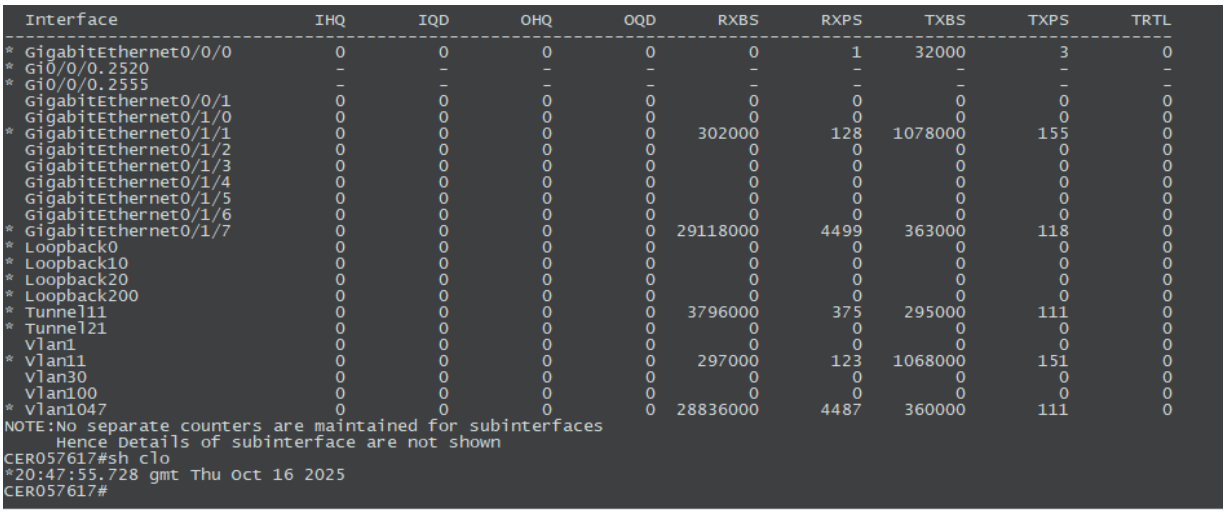

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0          0          1      32000          3          0
* Gi0/0/0.2520                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2555                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0     302000        128    1078000        155          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   29118000       4499     363000        118          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      0          0          0          0    3796000        375     295000        111          0
* Tunnel21                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     297000        123    1068000        151          0
  Vlan30                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1047                      0          0          0          0   28836000       4487     360000        111          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER057617#sh clo
*20:47:55.728 gmt Thu Oct 16 2025
CER057617#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
982	4	Cundinamarca, Pandi; Carrera 3A # 3-39	32 Mbps	31,1

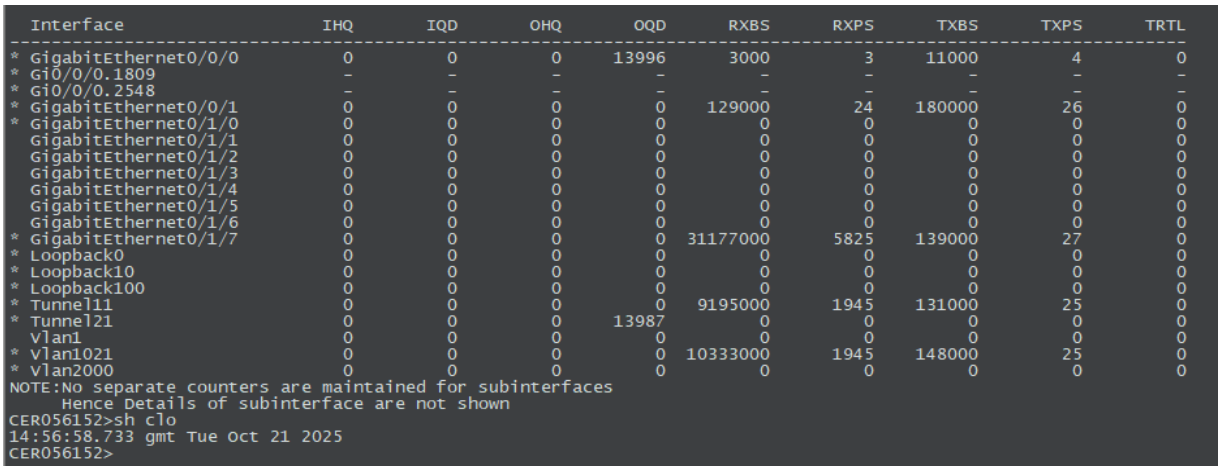


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      13996       3000          3      11000          4          0
* Gi0/0/0.1809                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2548                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     129000         24     180000         26          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   31177000       5825     139000         27          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback100                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      0          0          0          0    9195000       1945     131000         25          0
* Tunnel21                      0          0          0      13987          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1021                      0          0          0          0   10333000       1945     148000         25          0
* Vlan2000                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056152>sh clo
14:56:58.733 gmt Tue Oct 21 2025
CER056152>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1049	4	Cundinamarca, Fomeque; Calle 6 # 3-15/19	32 Mbps	29,9


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      35988   29973000       3283      69000         18          0
* Gi0/0/0.3697                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4038                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     194000         23     162000         26          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      0          0          0      35956   12806000       1514     170000         26          0
* Tunnel21                      0          0          0          0     257000         26          0          0          0
* Tunnel200                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067554#sh clo
20:13:24.129 gmt Tue Oct 21 2025
CER067554#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1041	4	Cundinamarca, Anapoima; Calle Principal	32 Mbps	29,2

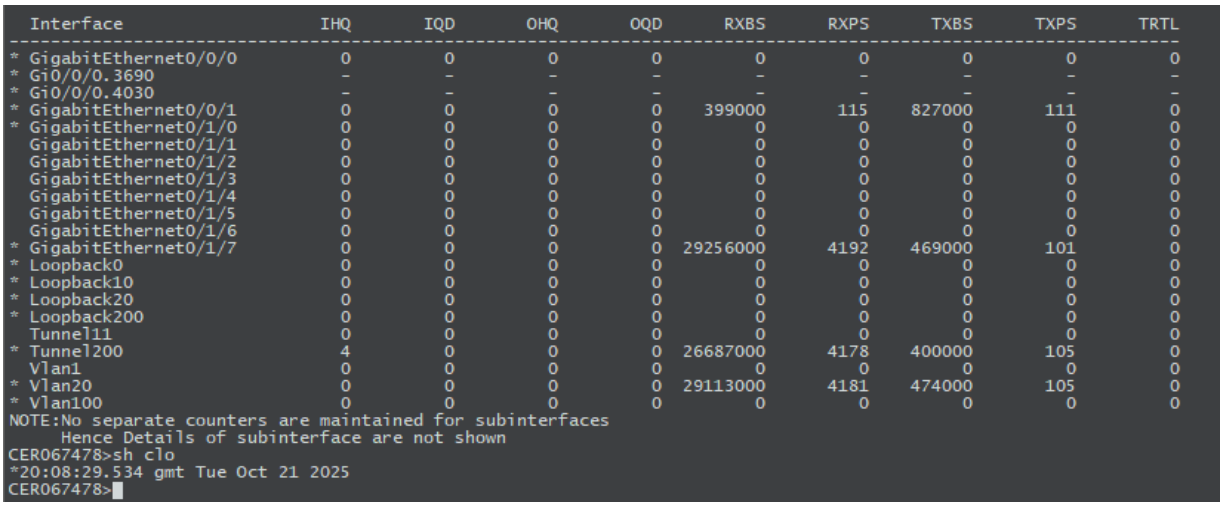


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Gi0/0/0.3690                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
* Gi0/0/0.4030                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0      399000         115      827000         111           0
* GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0    29256000        4192      469000         101           0
* Loopback0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback20                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Tunnel11                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel200                     4           0           0           0    26687000        4178      400000         105           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan20                        0           0           0           0    29113000        4181      474000         105           0
* Vlan100                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067478>sh clo
*20:08:29.534 gmt Tue Oct 21 2025
CER067478>
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1132	4	Antioquia, Ciudad Bolívar; Calle 49 # 54-33	64 Mbps	57,8

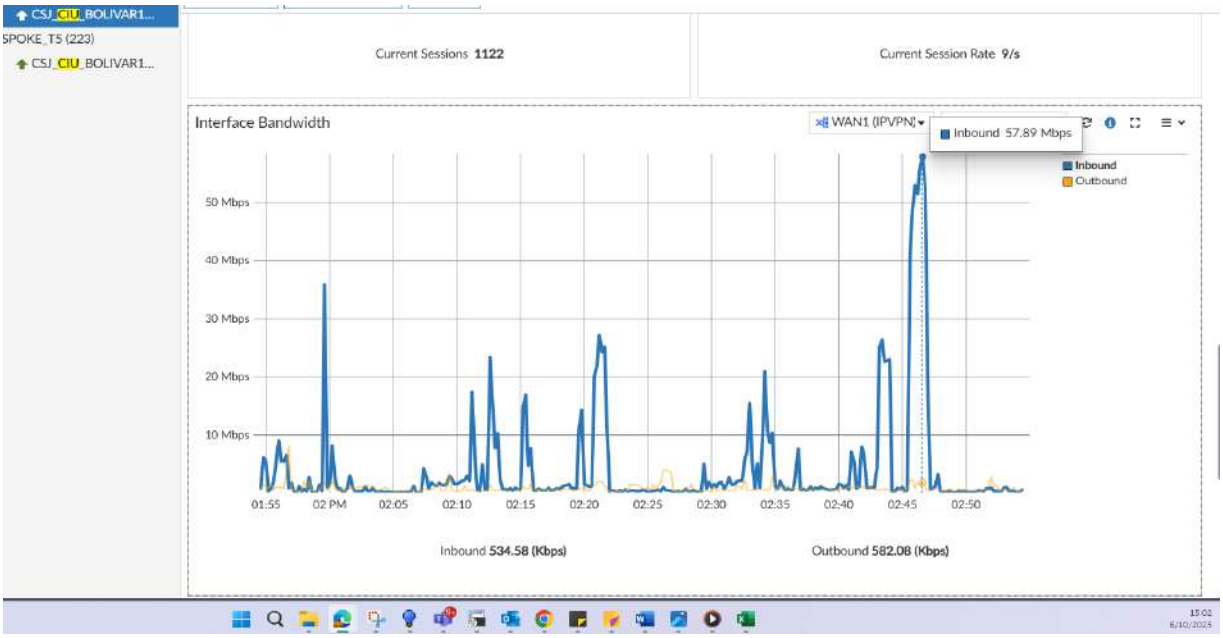


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1136	2	Antioquia, El Carmen de Viboral; Carrera 30 # 30-14	50 Mbps	49,2

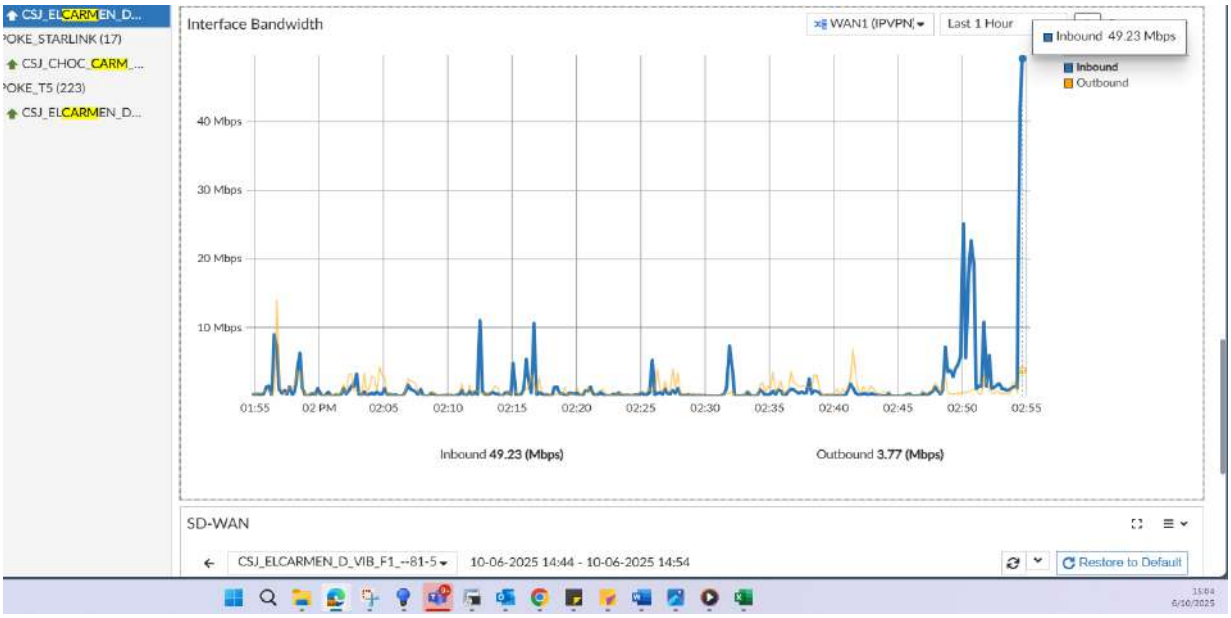

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1313	4	Antioquia, Campamento; Calle Córdoba Piso 2	32 Mbps	32,6

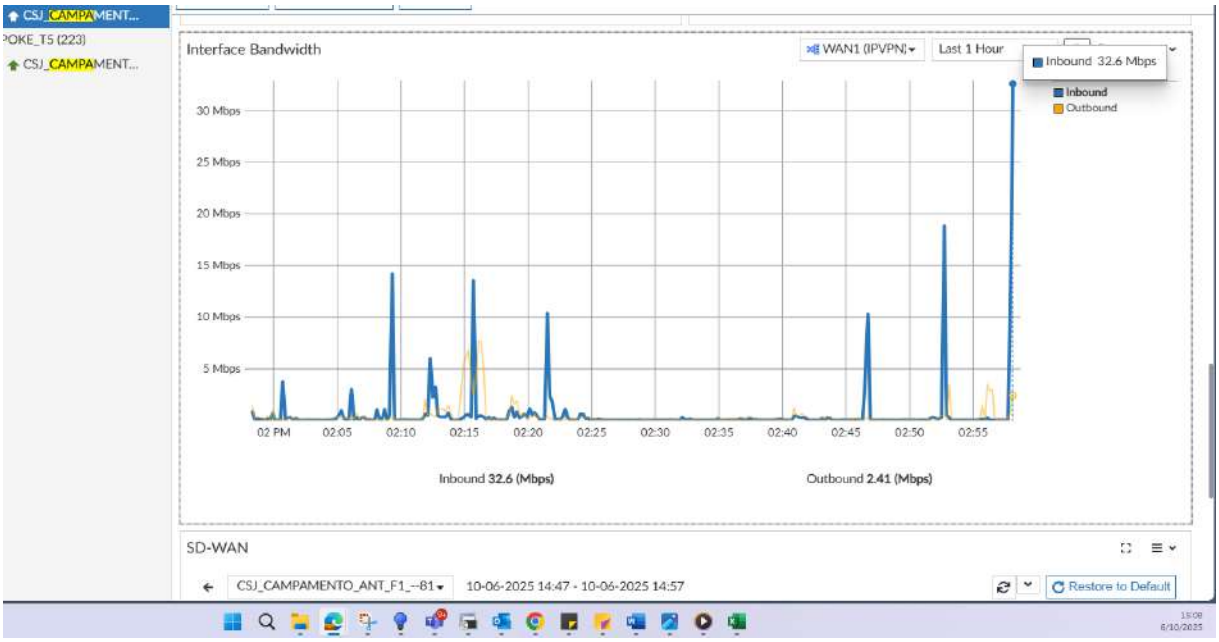


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3503	3	Cundinamarca, Cáqueza; Calle 2 # 3-20	32 Mbps	30,7

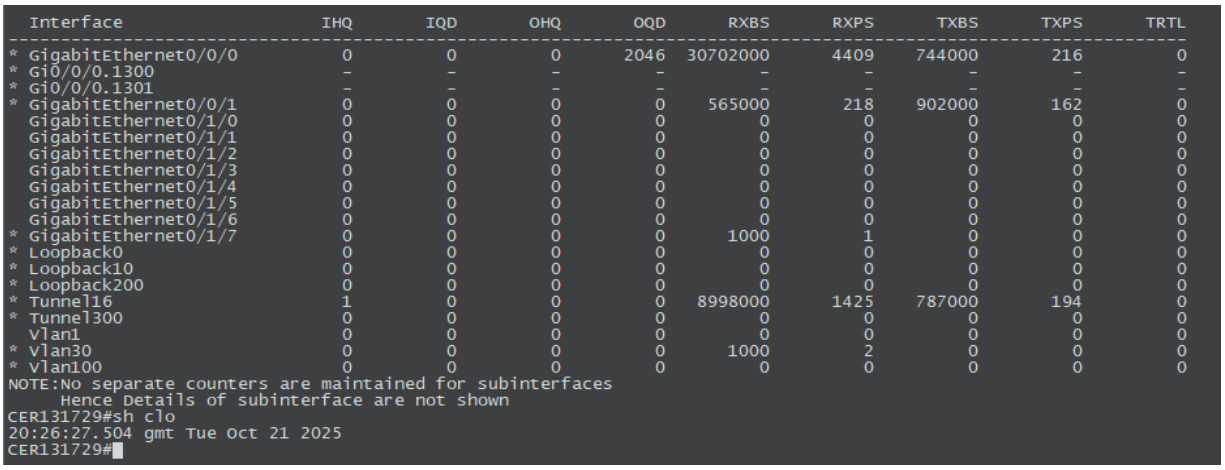


```
  Interface                IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0           0           0           2046        30702000    4409        744000      216         0
* Gi0/0/0.1300             -           -           -           -           -           -           -           -           -
* Gi0/0/0.1301             -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1     0           0           0           0           565000      218         902000      162         0
  GigabitEthernet0/1/0     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7     0           0           0           0           1000        1           0           0           0
* Loopback0                0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10               0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200              0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel16                 1           0           0           0           8998000     1425        787000      194         0
* Tunnel300                0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan30                   0           0           0           0           1000        2           0           0           0
* Vlan100                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER131729#sh clo
20:26:27.504 gmt Tue Oct 21 2025
CER131729#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3479	2	Valle Del Cauca, Florida; Calle 9 # 17-47 Piso 1	32 Mbps	29,2

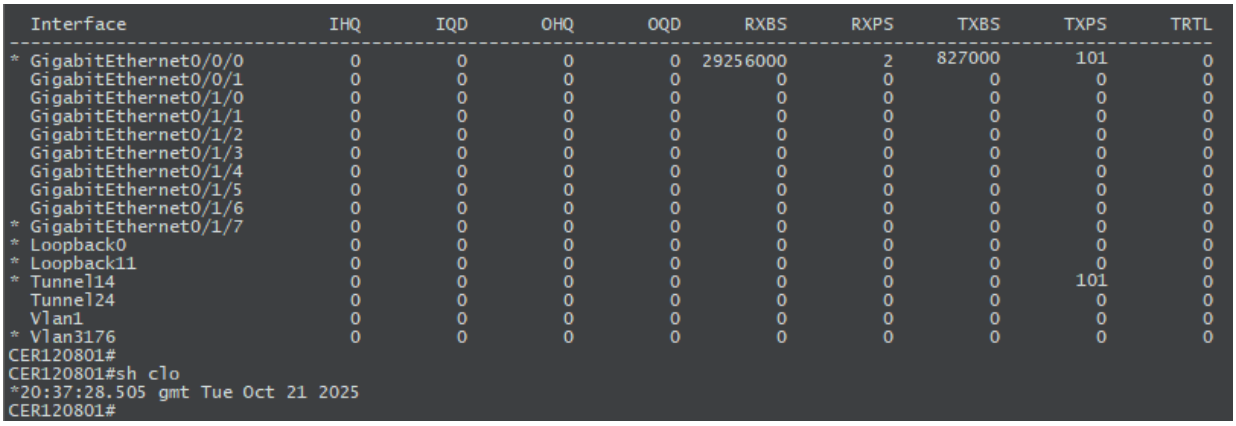


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0    29256000           2      827000         101           0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback11                 0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel14                   0          0          0          0           0           0           0         101           0
  Tunnel24                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan3176                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
CER120801#
CER120801#sh clo
*20:37:28.505 gmt Tue Oct 21 2025
CER120801#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1314	3	Antioquia, Frontino; Calle 30 # 31 -38	50 Mbps	46,2

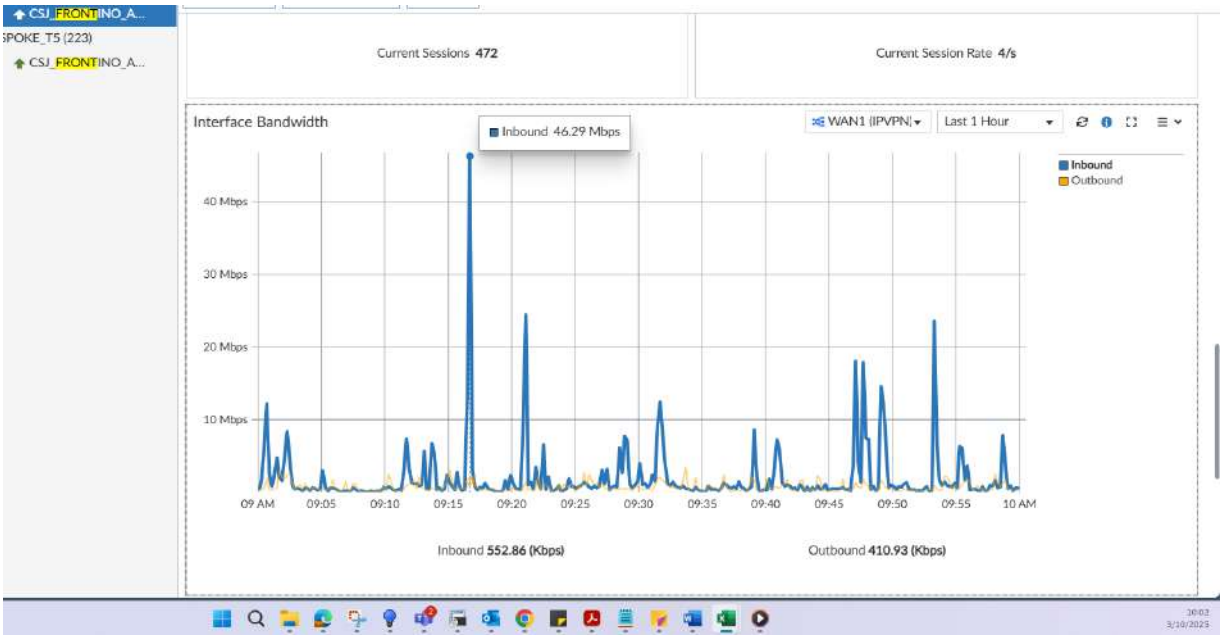


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1360	4	Antioquia, Concordia; Carrera 20 # 17 A-12 Piso 2	64 Mbps	63,7

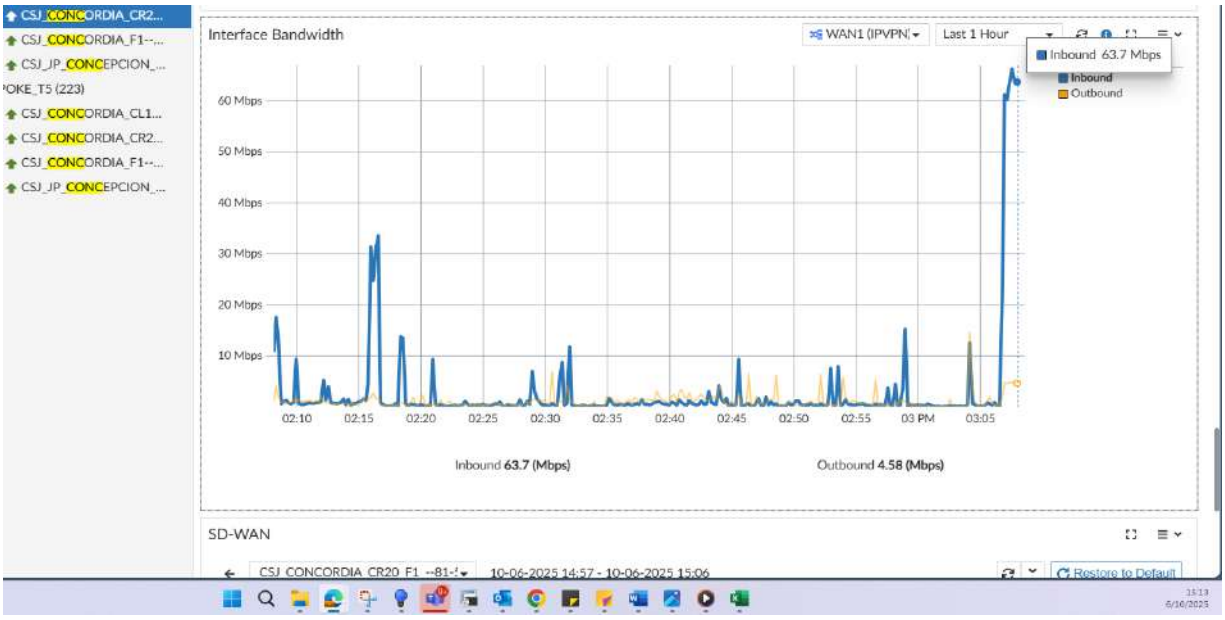


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1798	2	Sucre, Sincelejo; Calle 22 # 16-40 piso 1, Palacio de Justicia	128 Mbps	128,8

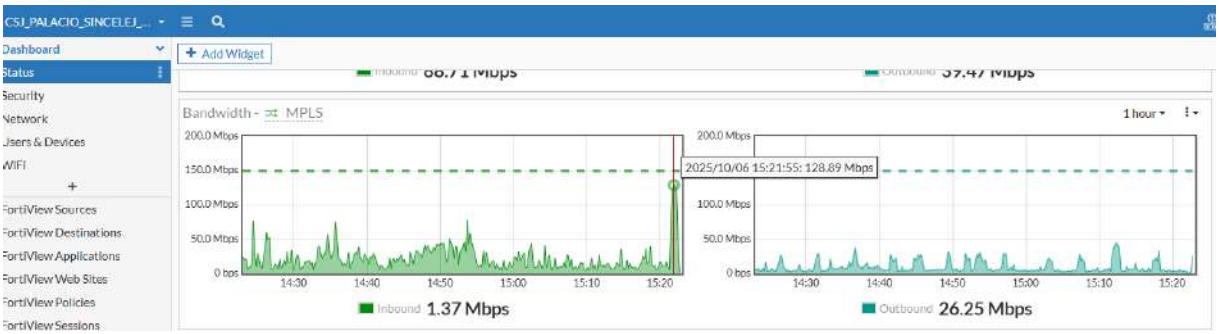


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5169	1	Cundinamarca, Chía; Carrera 12 # 9-73	50 Mbps	47,7

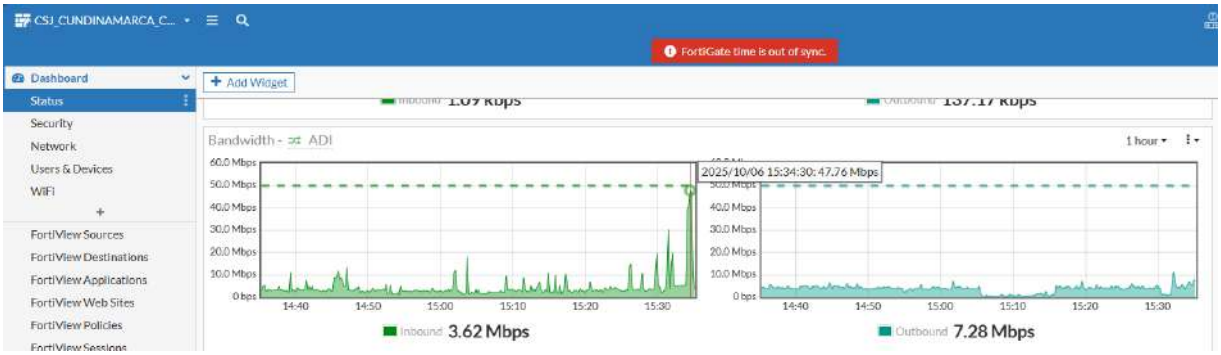


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5028	1	Cundinamarca, Chía; Carrera 12 # 9-73	50 Mbps	46,6

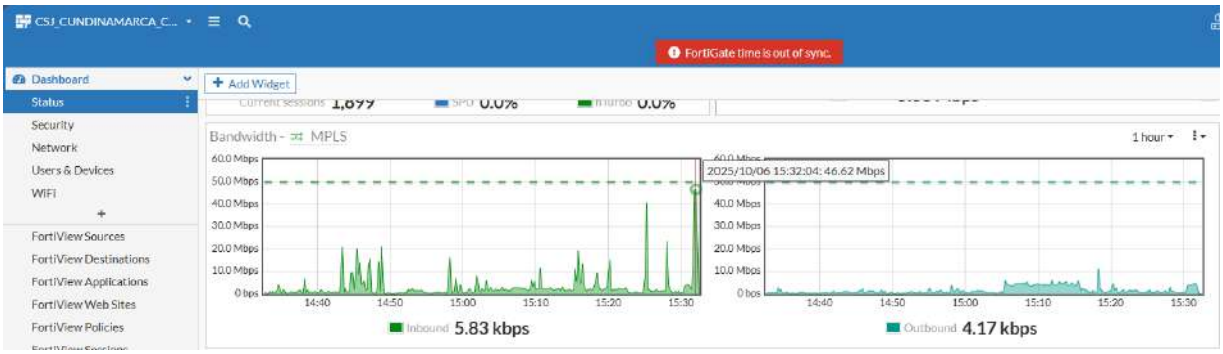


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5046	1	Quindío, Armenia; Calle 5 # 22-67	50 Mbps	49,7

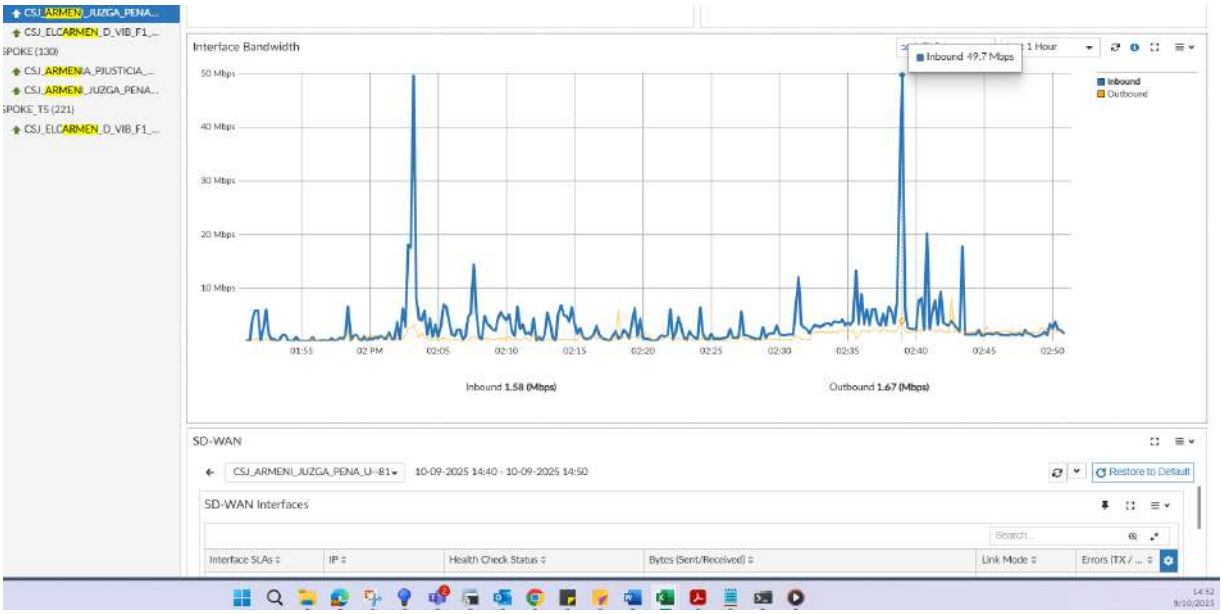


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5045	1	Quindío, Armenia; Calle 22 # 16-54, Edificio Cervantes	50 Mbps	48,9

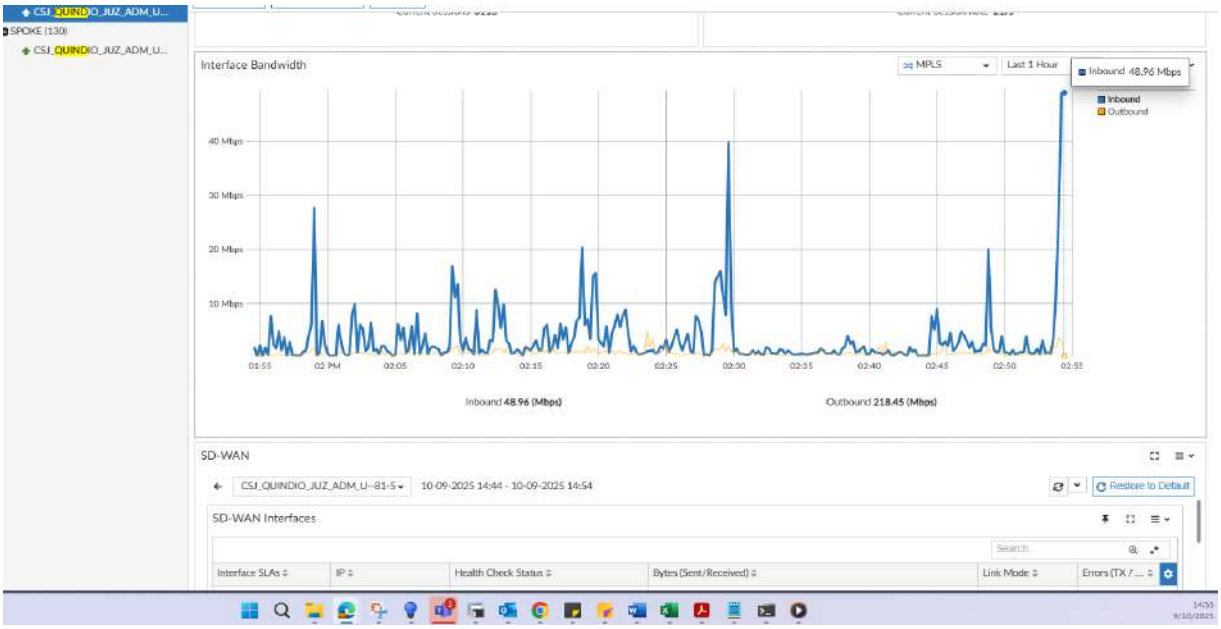


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3364	1	Córdoba, Montería; Carrera 6 # 61-44, Edificio Elite	256 Mbps	253,9

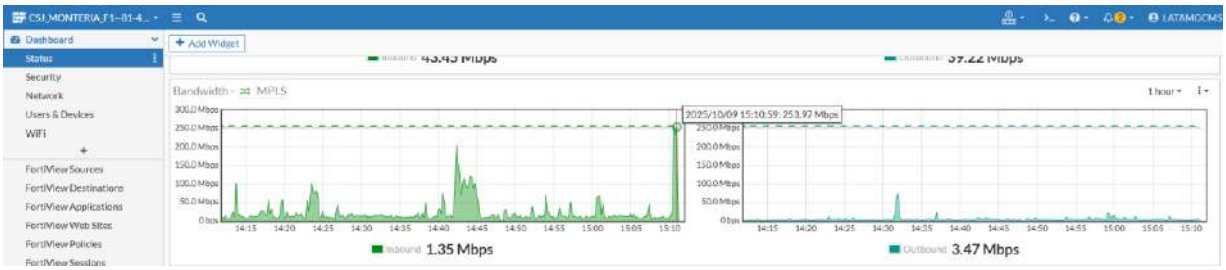

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3313	1	Córdoba, Montería; Carrera 6 # 61-44, Edificio Elite	256 Mbps	265

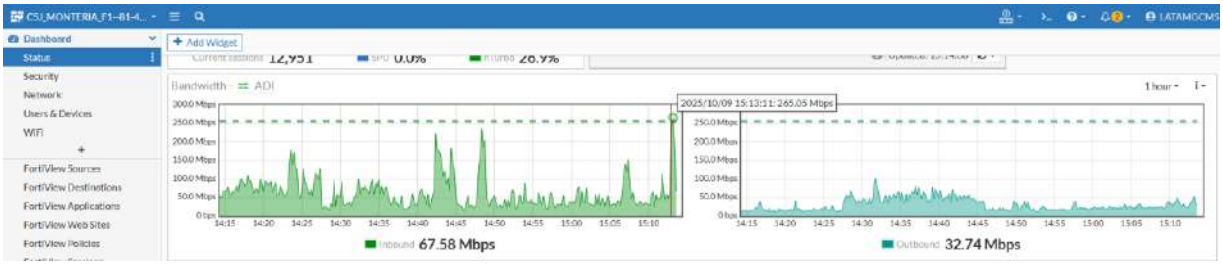


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
935	4	Santander, Encino; Calle 4 # 4-13	25 Mbps	23,2

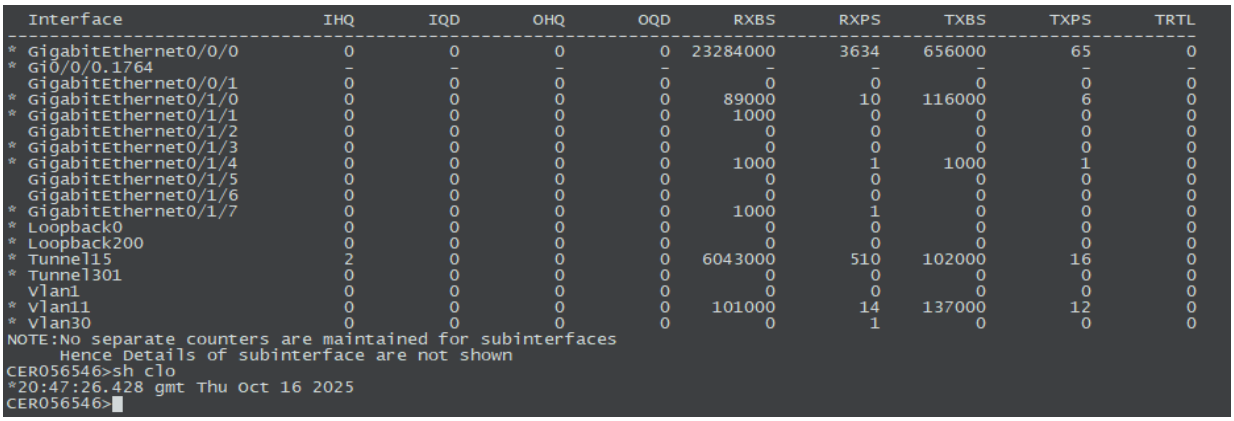


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0      23284000       3634     656000         65          0
* Gi0/0/0.1764                -          -          -          -             -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0             0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         89000         10     116000          6          0
* GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          1000          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0             0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0             0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          1000          1       1000          1          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0             0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          1000          1          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0             0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0             0          0          0          0          0
* Tunnel15                    2          0          0          0       6043000        510     102000         16          0
* Tunnel301                   0          0          0          0             0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0             0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0        101000         14     137000         12          0
* Vlan30                      0          0          0          0             0          1          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056546>sh clo
*20:47:26.428 gmt Thu Oct 16 2025
CER056546>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
981	4	Cundinamarca, Nariño; Carrera 16 # 6-68 piso 2	32 Mbps	29,5

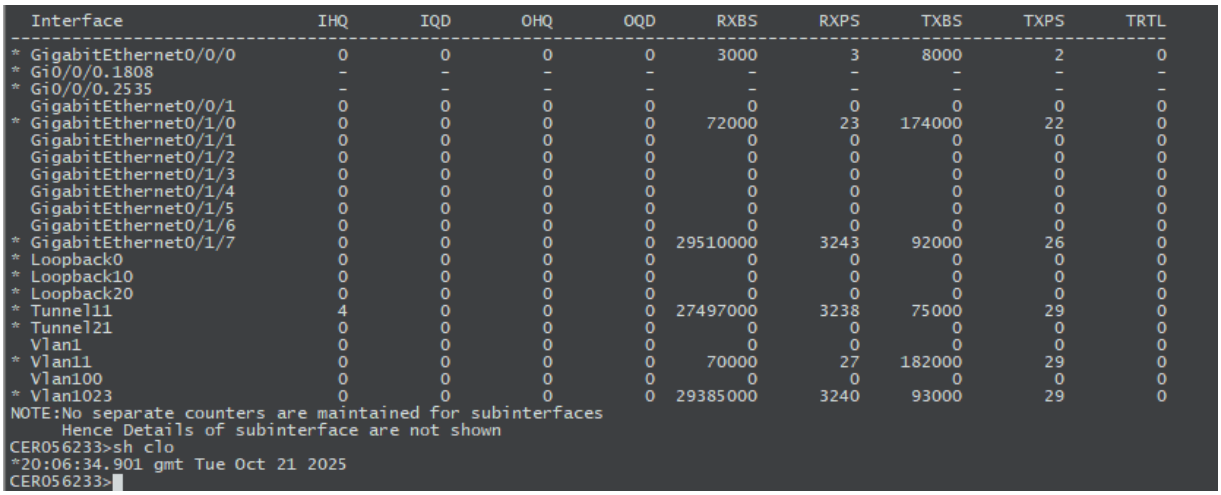


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           0           3000        3           8000        2           0
* Gi0/0/0.1808                -           -           -           -           -           -           -           -           -
* Gi0/0/0.2535                -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0           72000       23          174000      22          0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0           0           0           29510000    3243        92000       26          0
* Loopback0                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback20                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel11                    4           0           0           0           27497000    3238        75000       29          0
* Tunnel21                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                      0           0           0           0           70000       27          182000      29          0
  Vlan100                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan1023                    0           0           0           0           29385000    3240        93000       29          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056233>sh clo
*20:06:34.901 gmt Tue Oct 21 2025
CER056233>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1113	3	Risaralda, Marsella; calle 9 # 9-12, Edificio Alcaldía Municipal	25 Mbps	24,9

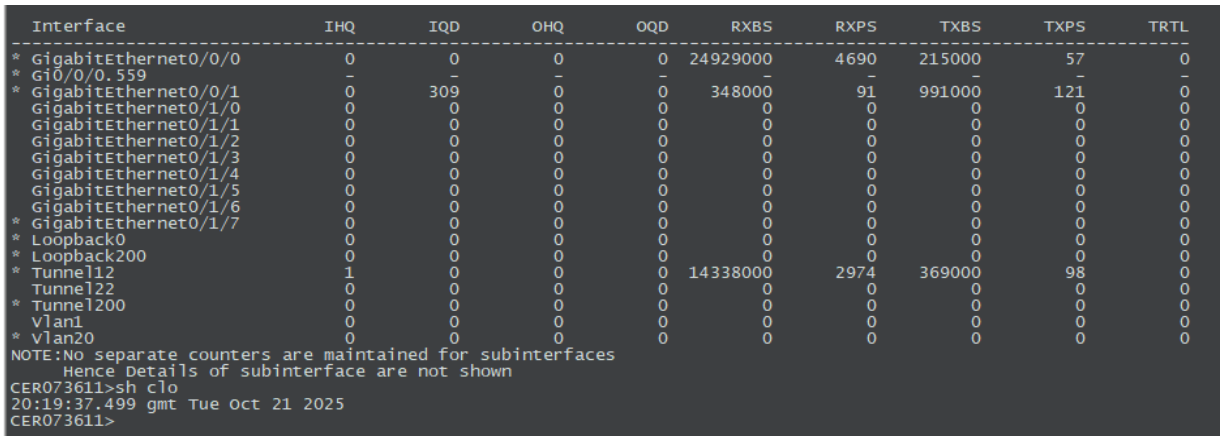


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0   24929000       4690     215000         57          0
* Gi0/0/0.559                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0        309          0          0     348000         91     991000        121          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                   1          0          0          0   14338000       2974     369000         98          0
  Tunnel22                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER073611>sh clo
20:19:37.499 gmt Tue Oct 21 2025
CER073611>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1195	4	Cundinamarca, Lenguazaque; Palacio Municipal	32 Mbps	30,3

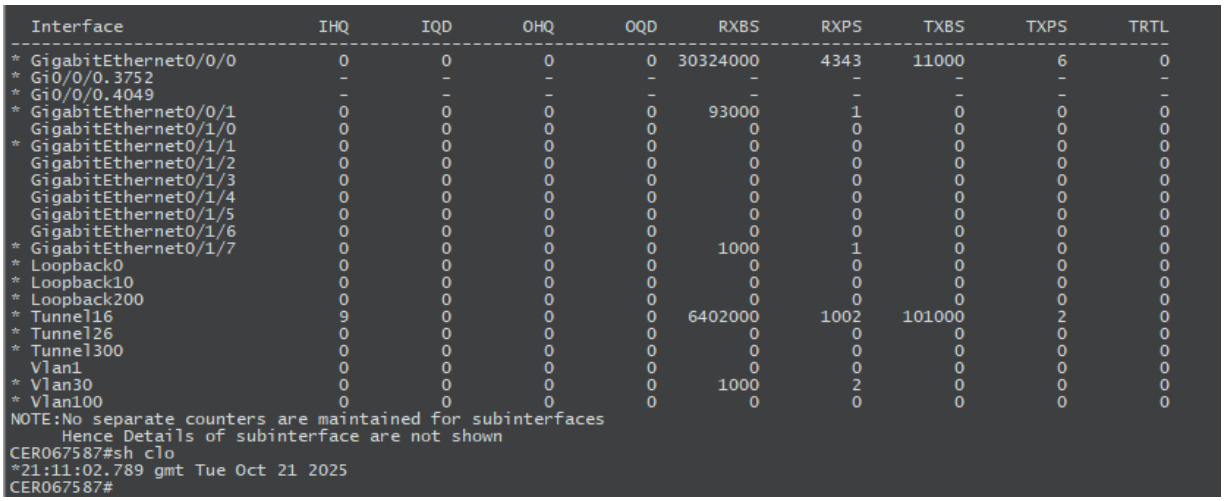


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   30324000       4343      11000          6          0
* Gi0/0/0.3752                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4049                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      93000          1          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      9          0          0          0    6402000       1002     101000          2          0
* Tunnel26                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067587#sh clo
*21:11:02.789 gmt Tue Oct 21 2025
CER067587#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1200	4	Cundinamarca, Quipile; Carrera 2 # 6-02	32 Mbps	30,8

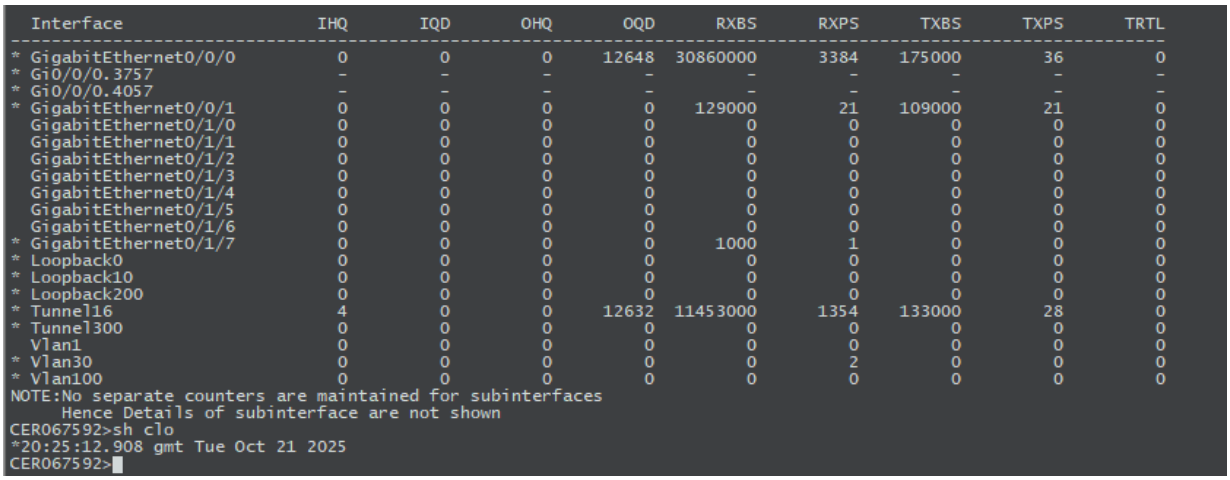


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0         12648   30860000       3384     175000         36         0
* Gi0/0/0.3757                -           -           -             -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.4057                -           -           -             -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0           0           0             0     129000         21     109000         21         0
  GigabitEthernet0/1/0        0           0           0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0           0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0           0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0           0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0             0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0           0             0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                   0           0           0             0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0           0           0             0          0          0          0          0         0
* Loopback200                 0           0           0             0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                    4           0           0         12632   11453000       1354     133000         28         0
* Tunnel300                   0           0           0             0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0           0           0             0          0          0          0          0         0
* Vlan30                      0           0           0             0          0          2          0          0         0
* Vlan100                     0           0           0             0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067592>sh clo
*20:25:12.908 gmt Tue Oct 21 2025
CER067592>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1201	4	Cundinamarca, San Antonio del Tequendama; Carrera 4 # 4-14	32 Mbps	29,9

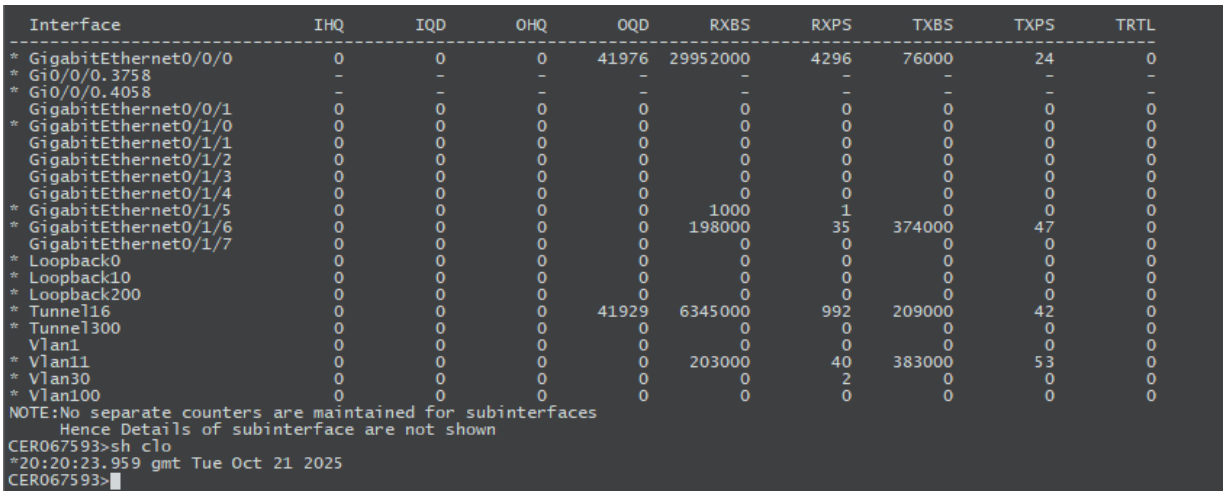


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          41976     29952000   4296       76000      24         0
* Gi0/0/0.3758                -          -          -          -         -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4058                -          -          -          -         -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         1000       1          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         198000     35         374000     47         0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Tunnel16                    0          0          0          41929     6345000    992        209000     42         0
* Tunnel300                   0          0          0          0         0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0         203000     40         383000     53         0
* Vlan30                      0          0          0          0         0          2          0          0          0
* Vlan100                     0          0          0          0         0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067593>sh clo
*20:20:23.959 gmt Tue Oct 21 2025
CER067593>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1211	4	Cundinamarca, Ubaque; Calle 2 # 3-67	32 Mbps	30,1

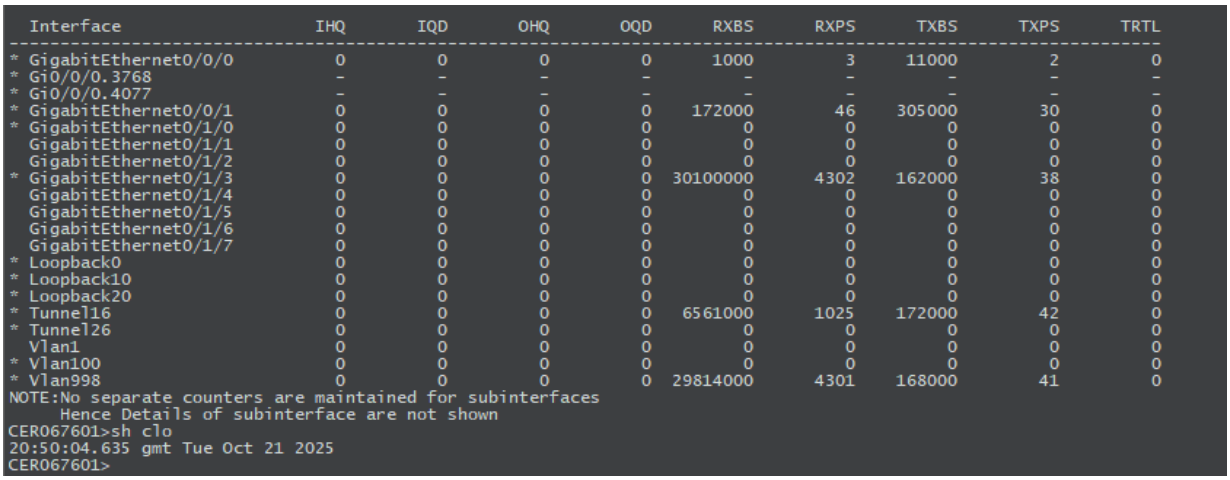

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0         1000           3      11000          2          0
* Gi0/0/0.3768                -          -          -          -            -           -          -          -          -
* Gi0/0/0.4077                -          -          -          -            -           -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0       172000          46     305000         30          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0            0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0            0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0            0           0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0     30100000        4302     162000         38          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0            0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0            0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0            0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0            0           0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0            0           0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0            0           0          0          0          0
* Loopback20                  0          0          0          0            0           0          0          0          0
* Tunnel16                    0          0          0          0      6561000        1025     172000         42          0
* Tunnel26                    0          0          0          0            0           0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0            0           0          0          0          0
* Vlan100                     0          0          0          0            0           0          0          0          0
* Vlan998                     0          0          0          0     29814000        4301     168000         41          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067601>sh clo
20:50:04.635 gmt Tue Oct 21 2025
CER067601>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1202	4	Cundinamarca, San Francisco; Calle 6 # 7-04 (primer piso)	32 Mbps	30

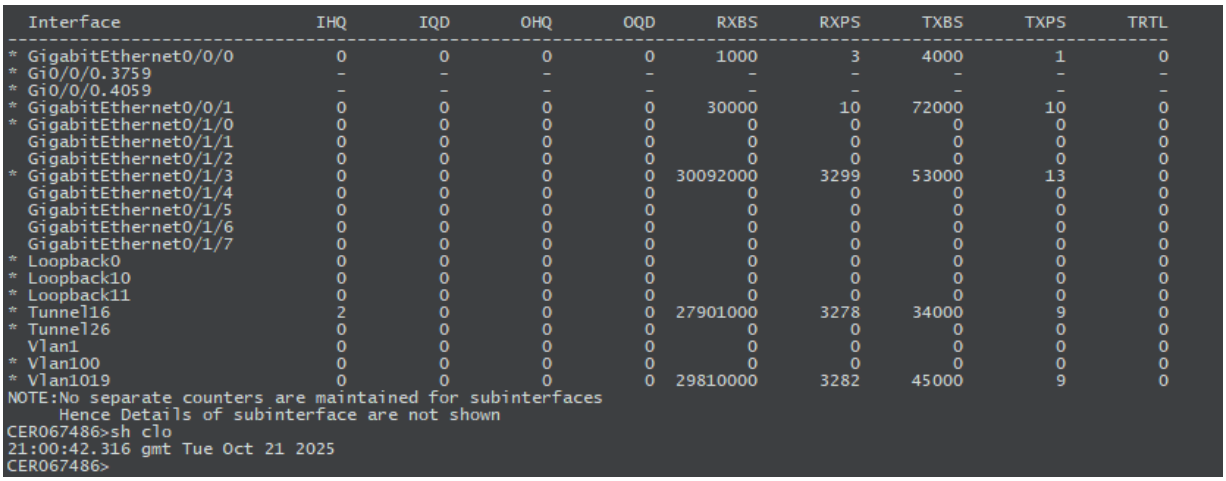


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0       1000          3       4000          1         0
* Gi0/0/0.3759                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.4059                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      30000         10      72000         10         0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0   30092000       3299      53000         13         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback11                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                      2          0          0          0   27901000       3278      34000          9         0
* Tunnel26                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan1019                      0          0          0          0   29810000       3282      45000          9         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067486>sh clo
21:00:42.316 gmt Tue Oct 21 2025
CER067486>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1299	1	Cesar, Valledupar; Carrera 14 # 14-46 Barrio Alfonso López	32 Mbps	32,5

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0     111563   32575000       5970     858000        302          0
* Gi0/0/0.1300                -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0     960000        303    2559000        401          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0      19000          4      81000         27          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                    3          0          0     111377    7929000       1546     997000        289          0
* Tunnel210                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0     981000        306    2609000        423          0
* Vlan20                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER130797#sh clo
*21:02:34.926 gmt Tue Oct 21 2025
CER130797#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1213	4	Cundinamarca, Venecia; Calle 2 No 3- 64/74 Segundo Piso	32 Mbps	30,6

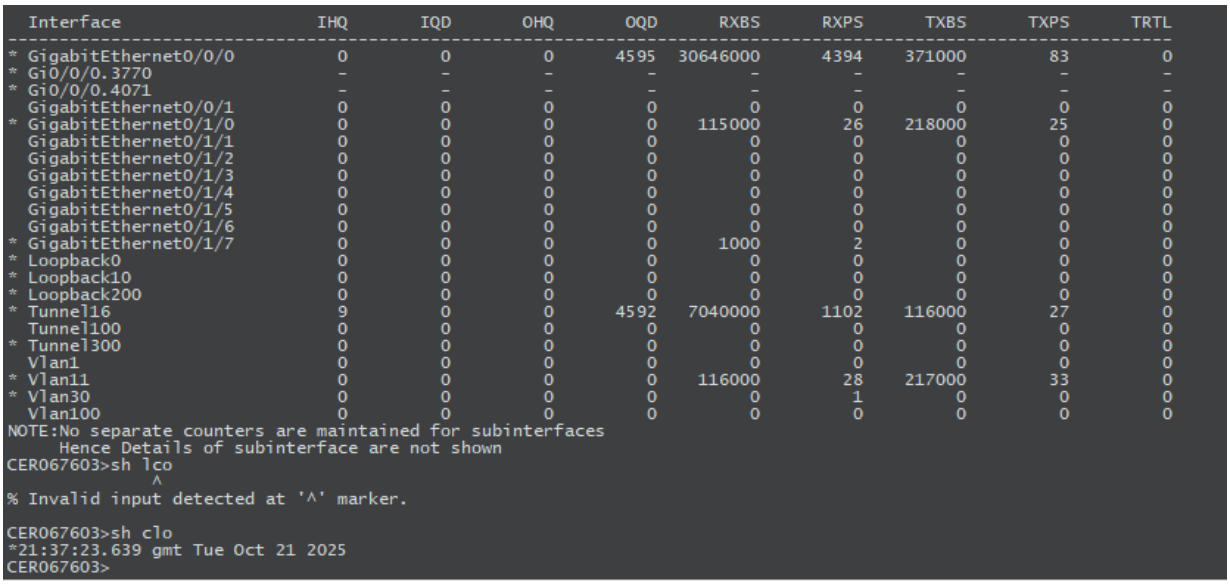

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0       4595   30646000       4394     371000         83          0
* Gi0/0/0.3770                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4071                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     115000         26     218000         25          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      9          0          0       4592    7040000       1102     116000         27          0
  Tunnel100                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     116000         28     217000         33          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          1          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067603>sh lco
             ^
% Invalid input detected at '^' marker.


CER067603>sh clo
*21:37:23.639 gmt Tue Oct 21 2025
CER067603>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1217	4	Cundinamarca, Yacopí; Carrera 4 # 4-23	32 Mbps	29,7

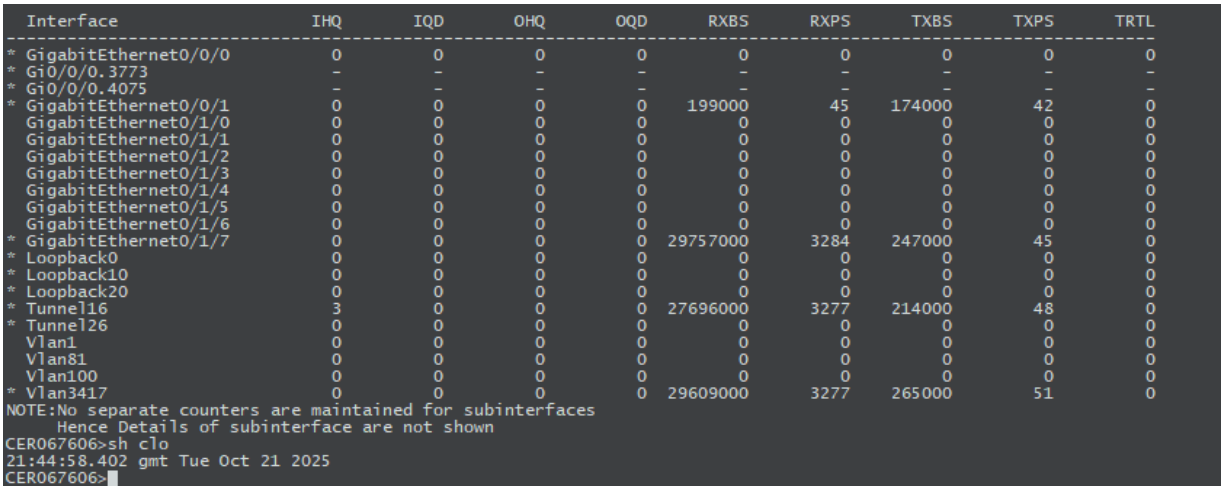


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/0.3773                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4075                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     199000         45     174000         42          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   29757000       3284     247000         45          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      3          0          0          0   27696000       3277     214000         48          0
* Tunnel26                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan81                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan3417                      0          0          0          0   29609000       3277     265000         51          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067606>sh clo
21:44:58.402 gmt Tue Oct 21 2025
CER067606>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1330	4	Antioquia, Tarazá; Carrera 29 Frente al Banco Agrario	32 Mbps	32,9

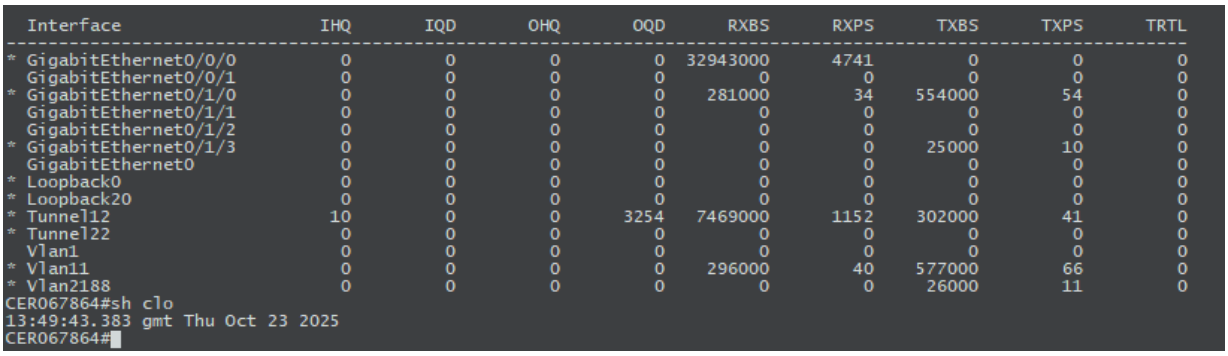


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0   32943000       4741          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     281000         34     554000         54          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0      25000         10          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                  10          0          0       3254    7469000       1152     302000         41          0
* Tunnel22                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     296000         40     577000         66          0
* Vlan2188                   0          0          0          0          0          0      26000         11          0
CERO67864#sh clo
13:49:43.383 gmt Thu Oct 23 2025
CERO67864#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1321	3	Antioquia, Jericó; Carrera 4 N 6-12, segundo piso.	40 Mbps	39,4

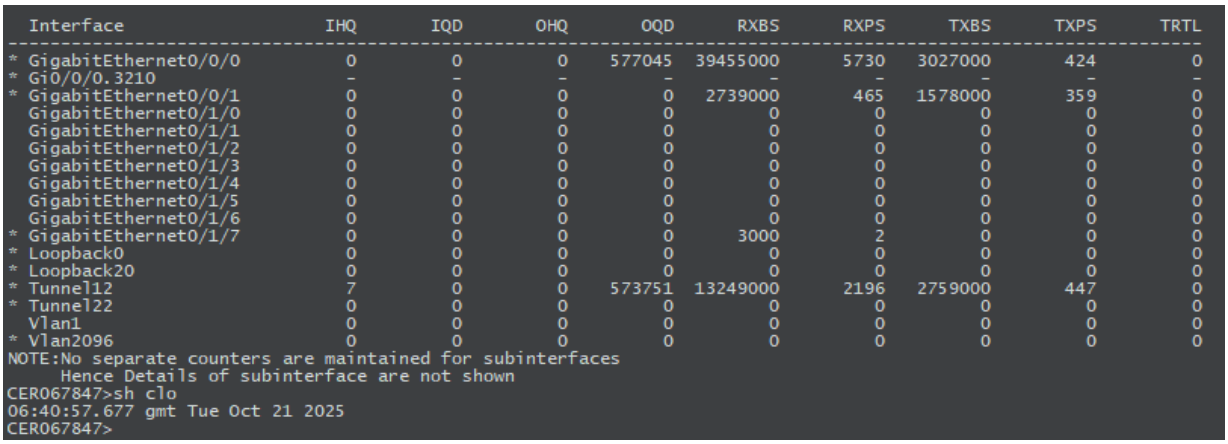

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          577045    39455000   5730       3027000    424       0
* Gi0/0/0.3210                -          -          -          -         -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         2739000    465        1578000    359       0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         3000       2          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback20                  0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Tunnel12                    7          0          0          573751    13249000   2196       2759000    447       0
* Tunnel22                    0          0          0          0         0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Vlan2096                    0          0          0          0         0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067847>sh clo
06:40:57.677 gmt Tue Oct 21 2025
CER067847>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1332	3	Antioquia, Valdivia; Carrera 9 # 8-14 Piso 4	32 Mbps	30,7

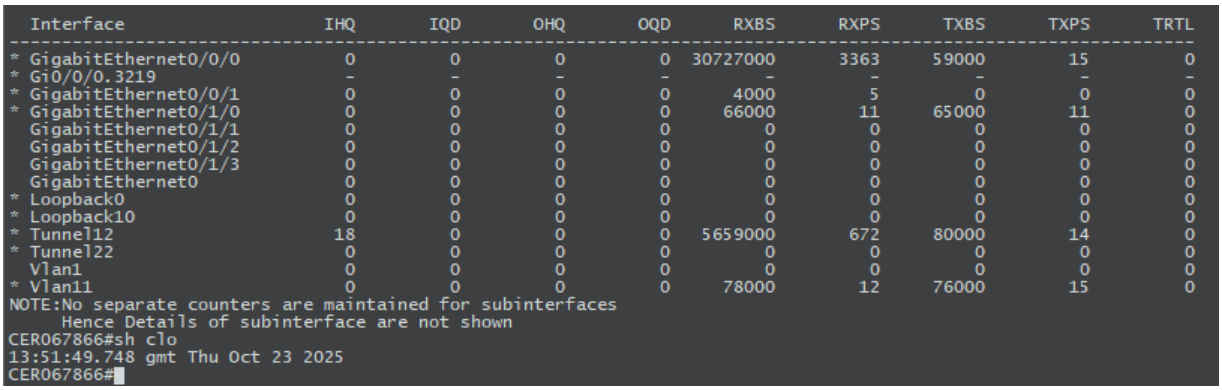


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0           0    30727000        3363       59000          15           0
* Gi0/0/0.3219                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0        4000           5           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0       66000          11       65000          11           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0              0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel12                     18           0           0           0     5659000         672       80000          14           0
* Tunnel22                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                        0           0           0           0       78000          12       76000          15           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067866#sh clo
13:51:49.748 gmt Thu Oct 23 2025
CER067866#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1363	4	Antioquia, Giraldo; Carrera 10 # 9-28	32 Mbps	30,4

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   30463000       4423      66000         22          0
* Gi0/0/0.1424                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0       7505      43000         13     332000         16          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0    2733000        362          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                      2          0          0          0    9351000       1470      19000         11          0
* Tunnel22                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel200                     0          0          0        829    2604000        383      38000         13          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                        0          0          0          0    2842000        386      52000         13          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067880#sh clo
*14:00:23.073 gmt Thu Oct 23 2025
CER067880#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1354	3	Arauca, Fortul; Carrera 22 entre Calle 5 y 6	25 Mbps	24,5

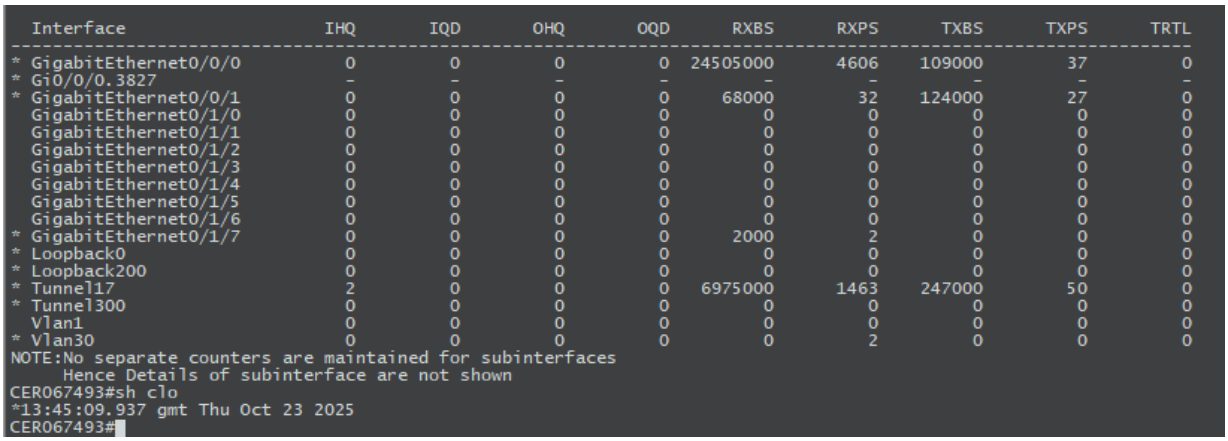


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0       24505000    4606       109000     37         0
* Gi0/0/0.3827                -          -          -          -       -           -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0       68000       32         124000     27         0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0       0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0       0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0       0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0       0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0       0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0       0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0       0           0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0       2000        2          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0       0           0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0       0           0          0          0          0
* Tunnel17                    2          0          0          0       6975000     1463       247000     50         0
* Tunnel300                   0          0          0          0       0           0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0       0           0          0          0          0
* Vlan30                      0          0          0          0       0           2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067493#sh clo
*13:45:09.937 gmt Thu Oct 23 2025
CER067493#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1364	4	Antioquia, Gómez Plata; Carrera 51 # 49-39	32 Mbps	30,7

```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS        RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0            0         372911   30741000        4431   2909000       474         0
* Gi0/0/0.1300                -           -            -              -          -           -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0            0              0          0           0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0            0              0    2513000         471   2312000       397         0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0            0              0          0           0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0            0              0          0           0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/3        0           0            0              0      42000          59         0         0         0
  GigabitEthernet0            0           0            0              0          0           0         0         0         0
* Loopback0                   0           0            0              0          0           0         0         0         0
* Loopback11                  0           0            0              0          0           0         0         0         0
* Tunnel12                    0          55            0         360142   14767000        2359   2540000       470         0
* Tunnel22                    0           0            0          17367          0           0         0         0         0
  Vlan1                       0           0            0              0          0           0         0         0         0
* Vlan11                      0           0            0              0    2490000         468   2344000       408         0
* Vlan1432                    0           0            0              0          0           0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067881#sh clo
14:08:22.504 gmt Thu Oct 23 2025
CER067881#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1365	3	Antioquia, La Pintada; Calle 30 # 30-30 Oficina 202	32 Mbps	31

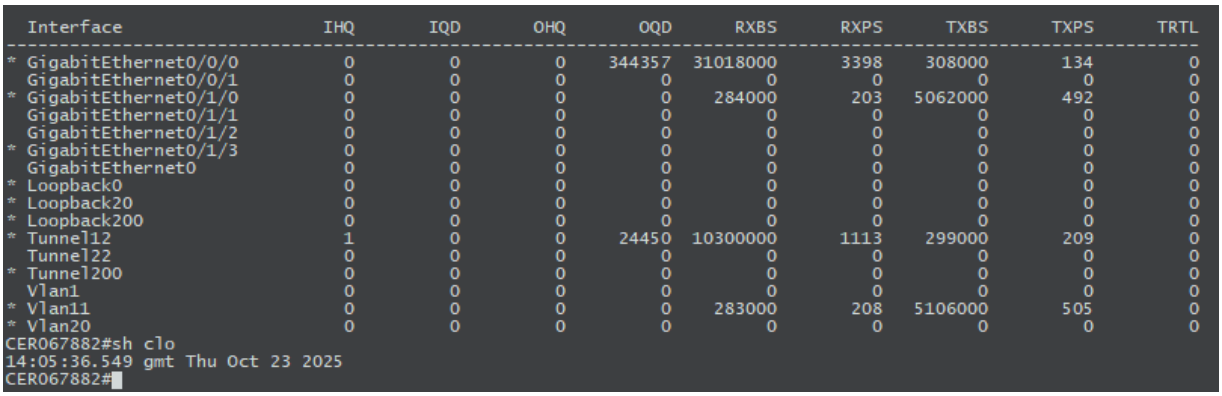


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS        RXPS      TXBS        TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0            0        344357   31018000        3398    308000         134         0
  GigabitEthernet0/0/1        0           0            0             0          0           0         0           0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0            0             0     284000         203   5062000         492         0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0            0             0          0           0         0           0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0            0             0          0           0         0           0         0
* GigabitEthernet0/1/3        0           0            0             0          0           0         0           0         0
  GigabitEthernet0            0           0            0             0          0           0         0           0         0
* Loopback0                   0           0            0             0          0           0         0           0         0
* Loopback20                  0           0            0             0          0           0         0           0         0
* Loopback200                 0           0            0             0          0           0         0           0         0
* Tunnel12                    1           0            0         24450   10300000        1113    299000         209         0
  Tunnel22                    0           0            0             0          0           0         0           0         0
* Tunnel200                   0           0            0             0          0           0         0           0         0
  Vlan1                       0           0            0             0          0           0         0           0         0
* Vlan11                      0           0            0             0     283000         208   5106000         505         0
* Vlan20                      0           0            0             0          0           0         0           0         0
CER067882#sh clo
14:05:36.549 gmt Thu Oct 23 2025
CER067882#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1369	4	Antioquia, San Pedro de Urabá; Carrera 49 A # 48-04 Oficina 308	32 Mbps	30,9

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   30959000       5856    1228000        129          0
* Gi0/0/0.3267                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     364000         46     135000         34          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0      55000         83          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                     21          0          0          0    7793000       1665     310000         43          0
* Tunnel22                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     305000         41     145000         34          0
* Vlan1346                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER070103#sh clo
14:13:18.661 gmt Thu Oct 23 2025
CER070103#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1373	4	Antioquia, Uramita; Carrera 20 # 17-34	32 Mbps	30,6

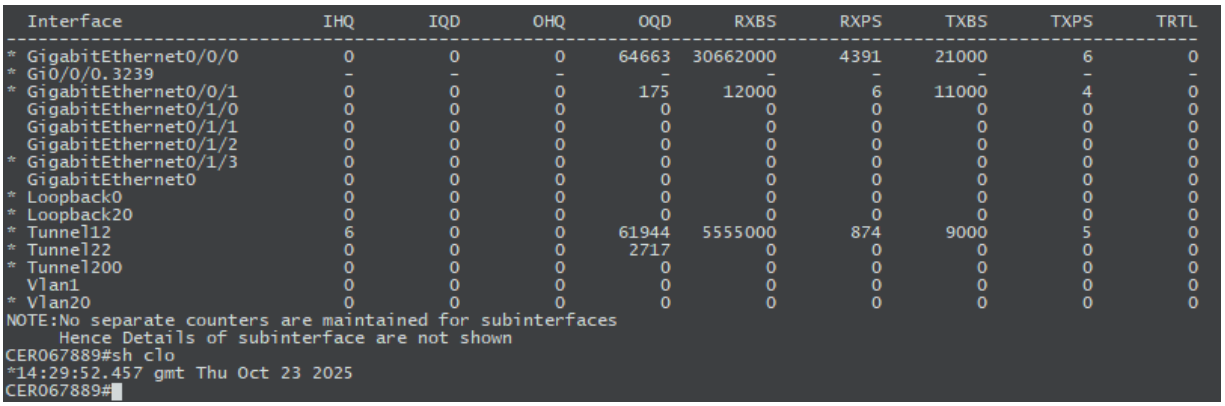


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS     TXBS     TXPS     TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0           0            0       64663   30662000       4391    21000        6        0
* Gi0/0/0.3239                 -           -            -           -          -          -        -        -        -
* GigabitEthernet0/0/1         0           0            0         175      12000          6    11000        4        0
  GigabitEthernet0/1/0         0           0            0           0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/1         0           0            0           0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/2         0           0            0           0          0          0        0        0        0
* GigabitEthernet0/1/3         0           0            0           0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0             0           0            0           0          0          0        0        0        0
* Loopback0                    0           0            0           0          0          0        0        0        0
* Loopback20                   0           0            0           0          0          0        0        0        0
* Tunnel12                     6           0            0       61944    5555000        874     9000        5        0
* Tunnel22                     0           0            0        2717          0          0        0        0        0
* Tunnel200                    0           0            0           0          0          0        0        0        0
  Vlan1                        0           0            0           0          0          0        0        0        0
* Vlan20                       0           0            0           0          0          0        0        0        0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067889#sh clo
*14:29:52.457 gmt Thu Oct 23 2025
CER067889#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1506	1	Antioquia, Copacabana; Carrera 50 # 50-76	32 Mbps	30,7


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0      75176    30719000        5814      603000         127           0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0      925000         178     1235000         193           0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback20                 0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback200                0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel18                   4          0          0      75131     8434000        1726      957000         179           0
* Tunnel28                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel200                  0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Vlan11                     0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan20                     0          0          0          0           0           0           0           0           0
CER080630#sh clo
*13:55:21.888 gmt Thu Oct 23 2025
CER080630#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1383	4	Cundinamarca, Suesca; Carrera 6 # 8-81	40 Mbps	38,3

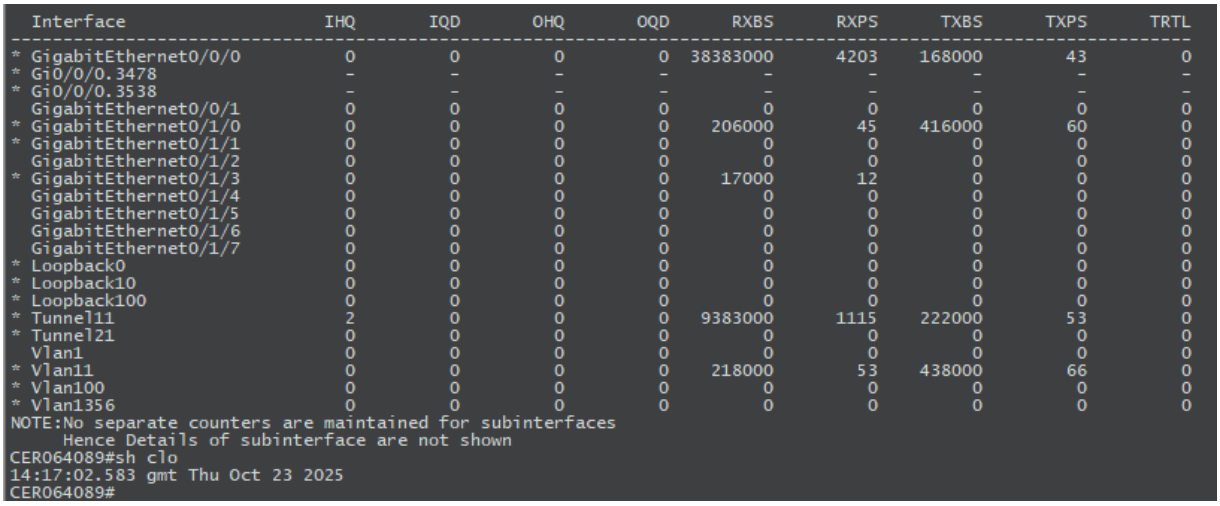

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0   38383000       4203     168000         43          0
* Gi0/0/0.3478               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.3538               -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     206000         45     416000         60          0
* GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0      17000         12          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback100                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                   2          0          0          0    9383000       1115     222000         53          0
* Tunnel21                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     218000         53     438000         66          0
* Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1356                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER064089#sh clo
14:17:02.583 gmt Thu Oct 23 2025
CER064089#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1388	3	Cundinamarca, Guaduas; Carrera 4 # 2-17	40 Mbps	38,4

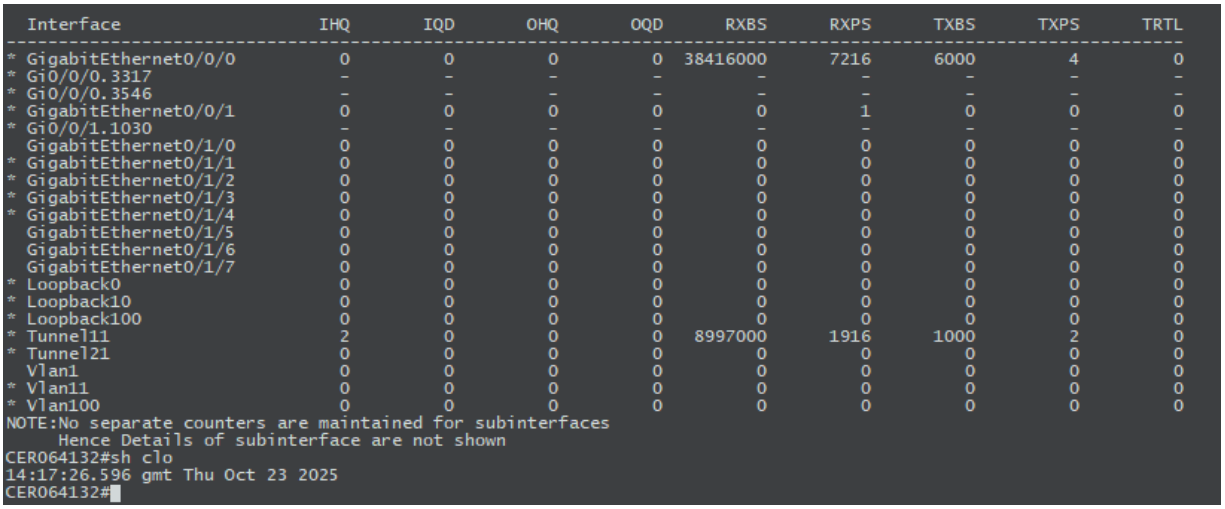

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0   38416000       7216       6000          4          0
* Gi0/0/0.3317                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.3546                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          1          0          0          0
* Gi0/0/1.1030                -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback100                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                    2          0          0          0    8997000       1916       1000          2          0
* Tunnel21                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER064132#sh clo
14:17:26.596 gmt Thu Oct 23 2025
CER064132#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1394	3	Putumayo, Villa Garzon; Carrera 5 # 4-05, Barrio Industrial	25 Mbps	23,5

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   23586000        3382          0          0          0
* Gi0/0/0.2015                  -          -          -          -          -           -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0           0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0      41000           2      19000          4          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0           0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       5000           7      54000          5          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0           0          0          0          0
* Loopback11                    0          0          0          0          0           0          0          0          0
  Tunnel5                       0          0          0          0          0           0          0          0          0
* Tunnel15                      4          0          0          0    4742000         747      53000          4          0
* Tunnel25                      0          0          0          0          0           0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0           0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      52000           3      30000          5          0
* Vlan3160                      0          0          0          0          0           1      62000          5          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER064118#sh clo
14:21:05.372 gmt Thu Oct 23 2025
CER064118#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1396	3	Nariño, Taminango; Parque Principal	32 Mbps	30,3


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS     TXBS     TXPS     TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0            0           3815      30393000   3347     134000   32       0
* Gi0/0/0.2017                -           -            -           -         -          -        -        -        -
* GigabitEthernet0/0/1        0           0            0           0         454000     197      2552000  246      0
  GigabitEthernet0/1/0        0           0            0           0         0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0            0           0         0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0            0           0         0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0            0           0         0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0            0           0         0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0            0           0         0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0            0           0         0          0        0        0        0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0            0           0         1000       1        0        0        0
* Loopback0                   0           0            0           0         0          0        0        0        0
* Loopback200                 0           0            0           0         0          0        0        0        0
  Tunnel11                    0           0            0           0         0          0        0        0        0
* Tunnel14                    1           0            0           3815      12436000   1415     494000   210      0
* Tunnel300                   0           0            0           0         0          0        0        0        0
  Vlan1                       0           0            0           0         0          0        0        0        0
* Vlan30                      0           0            0           0         0          2        0        0        0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO64114#sh clo
*14:26:27.459 gmt Thu Oct 23 2025
CERO64114#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
461	4	Tolima, Cunday; Calle 6 # 2 -05	25 Mbps	23,2

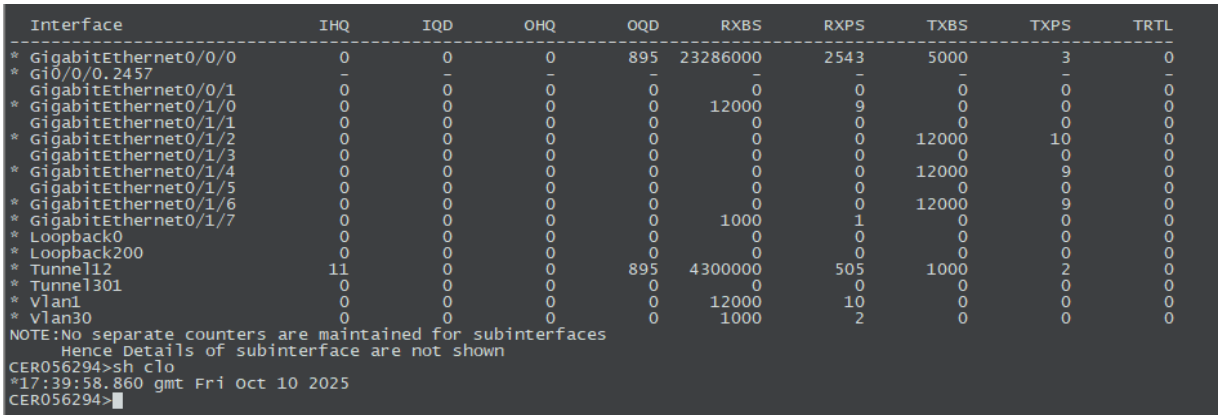


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0        895   23286000       2543       5000          3          0
* Gi0/0/0.2457                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      12000          9          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0      12000         10          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0      12000          9          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0      12000          9          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                     11          0          0        895    4300000        505       1000          2          0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1                         0          0          0          0      12000         10          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056294>sh clo
*17:39:58.860 gmt Fri Oct 10 2025
CER056294>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1403	3	Cundinamarca, Guasca; Calle 6 No 5 - 34	25 Mbps	23,2

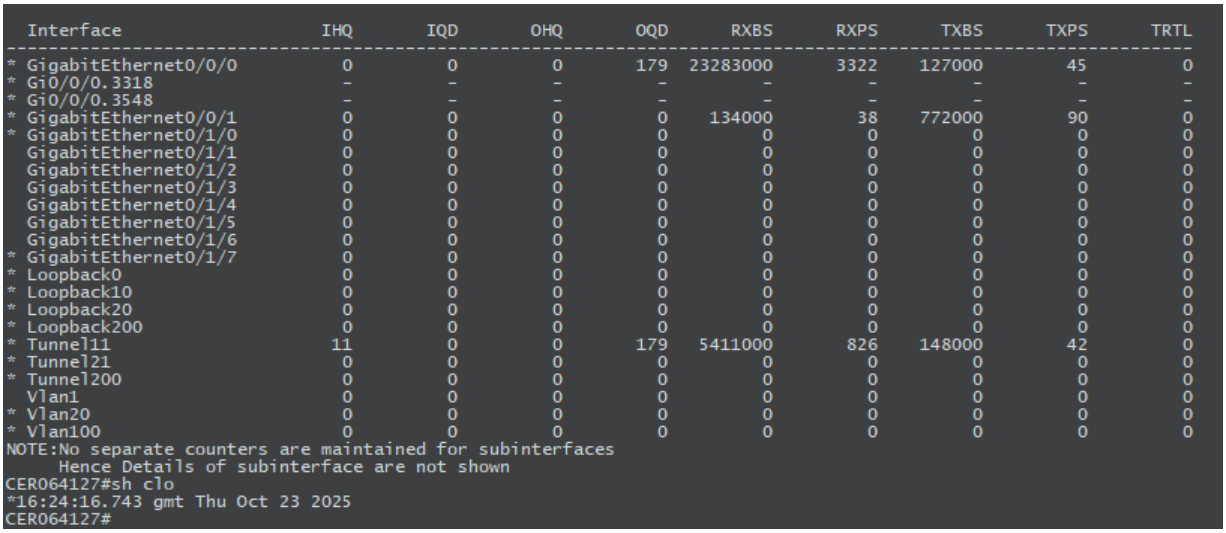


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0        179   23283000       3322     127000         45          0
* Gi0/0/0.3318                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.3548                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0     134000         38     772000         90          0
* GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                    11          0          0        179    5411000        826     148000         42          0
* Tunnel21                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel200                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER064127#sh clo
*16:24:16.743 gmt Thu Oct 23 2025
CER064127#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1404	4	Cundinamarca, La Peña; Carrera 3 # 6-61	25 Mbps	23,9

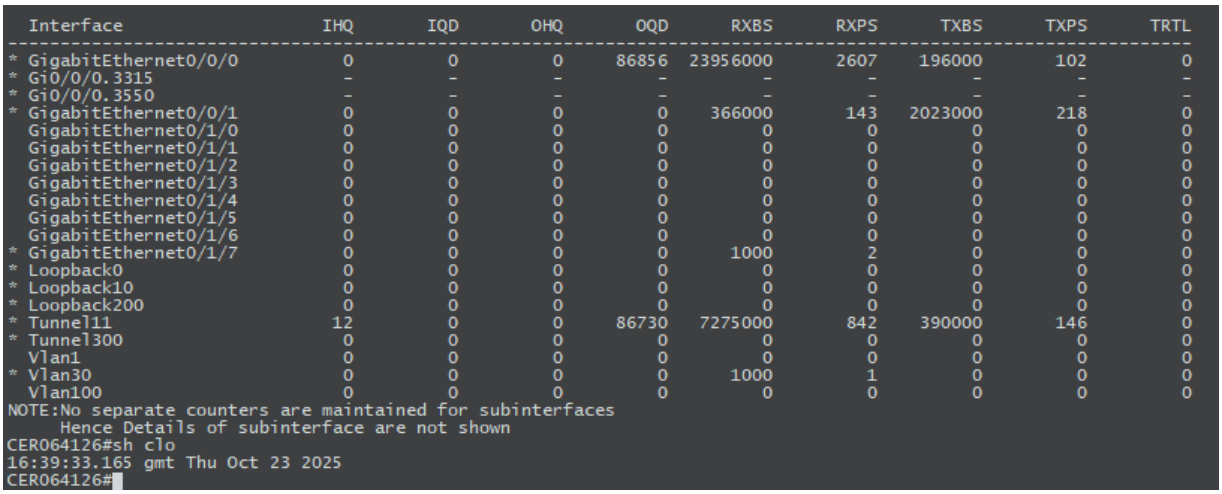

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0       86856    23956000        2607      196000         102           0
* Gi0/0/0.3315                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
* Gi0/0/0.3550                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0      366000         143     2023000         218           0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0        1000           2           0           0           0
* Loopback0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel11                     12           0           0       86730     7275000         842      390000         146           0
* Tunnel300                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan30                        0           0           0           0        1000           1           0           0           0
  Vlan100                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER064126#sh clo
16:39:33.165 gmt Thu Oct 23 2025
CER064126#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1405	4	Cundinamarca, Utica; Carrera 17 # 6B-14	32 Mbps	31,4

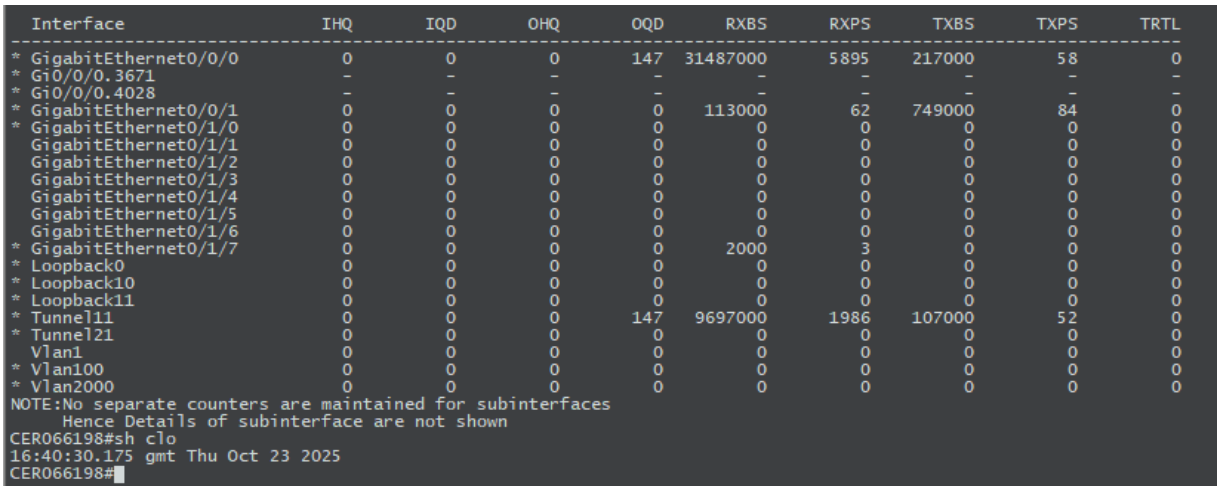


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0        147    31487000        5895      217000          58           0
* Gi0/0/0.3671               -          -          -          -           -           -           -           -           -
* Gi0/0/0.4028               -          -          -          -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0      113000          62      749000          84           0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0        2000           3           0           0           0
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback10                 0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback11                 0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel11                   0          0          0        147     9697000        1986      107000          52           0
* Tunnel21                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan100                    0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan2000                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER066198#sh clo
16:40:30.175 gmt Thu Oct 23 2025
CER066198#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1417	2	Norte de Santander, Cúcuta; Cúcuta AV 21 0-68 DEL BARRIO CÚCUTA 75 MANZANA 13D1 LOTE 1A	25 Mbps	23,8


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     742258    23870000        3406      562000         160           0
* Gi0/0/0.1215                  -          -          -          -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      700000         201     1518000         227           0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0        1000           2           0           0           0
* Loopback0                     0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel13                     11          0          0     740533     7197000        1128      731000         209           0
  Tunnel23                      0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel301                     0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan1                         0          0          0          0      713000         207     1523000         234           0
* Vlan30                        0          0          0          0           0           2           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER117433#sh clo
*17:05:41.539 gmt Thu Oct 23 2025
CER117433#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1500	1	Meta, Villavicencio; Vereda la unión (El Yarí)	40 Mbps	39,4

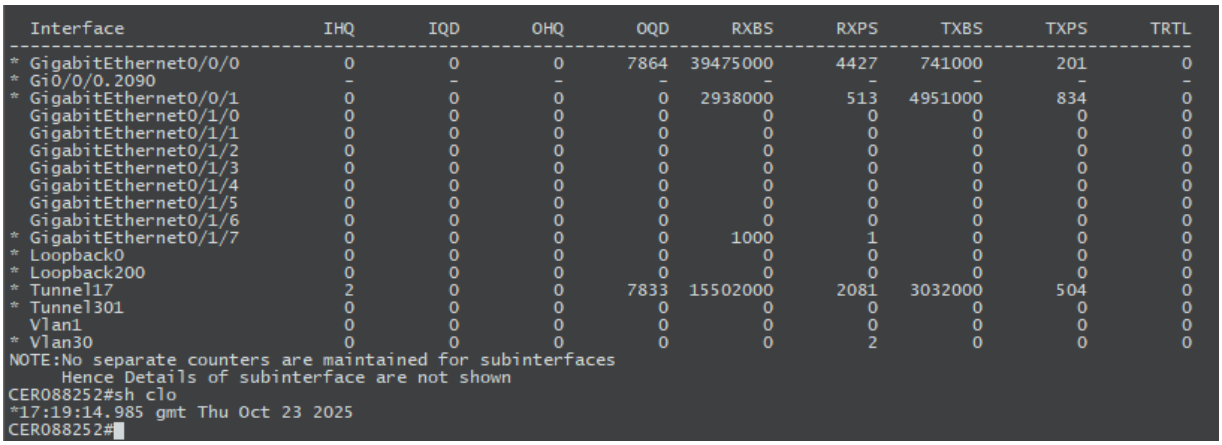


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0       7864   39475000       4427     741000        201          0
* Gi0/0/0.2090                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0    2938000        513    4951000        834          0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                    2          0          0       7833   15502000       2081    3032000        504          0
* Tunnel301                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                      0          0          0          0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER088252#sh clo
*17:19:14.985 gmt Thu Oct 23 2025
CER088252#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1508	1	Antioquia, Envigado; Calle 40 Sur # 24F-106 Barrio El Salado, Casa de Justicia	32 Mbps	32,3

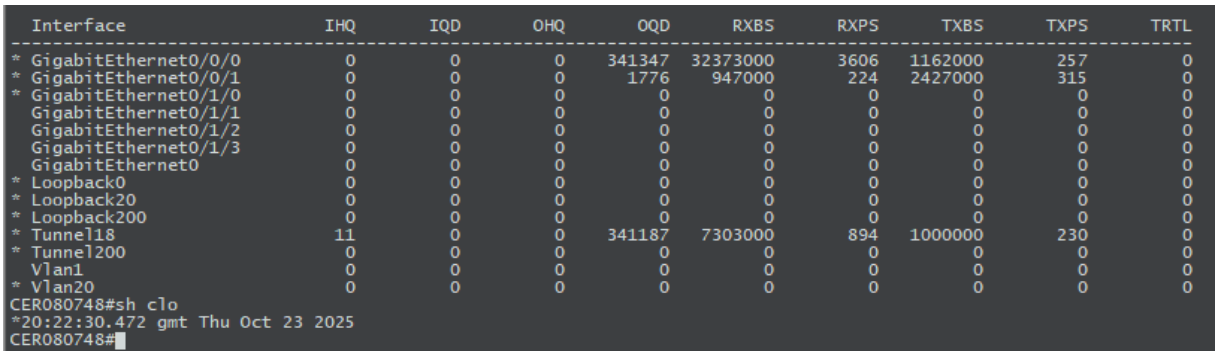


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0     341347   32373000       3606    1162000        257          0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0       1776     947000        224    2427000        315          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                  11          0          0     341187    7303000        894    1000000        230          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER080748#sh clo
*20:22:30.472 gmt Thu Oct 23 2025
CER080748#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1507	1	Antioquia, Envigado; Carrera 41 # 36Sur -67 (Interior 304) Edificio Hurbe	32 Mbps	31,8

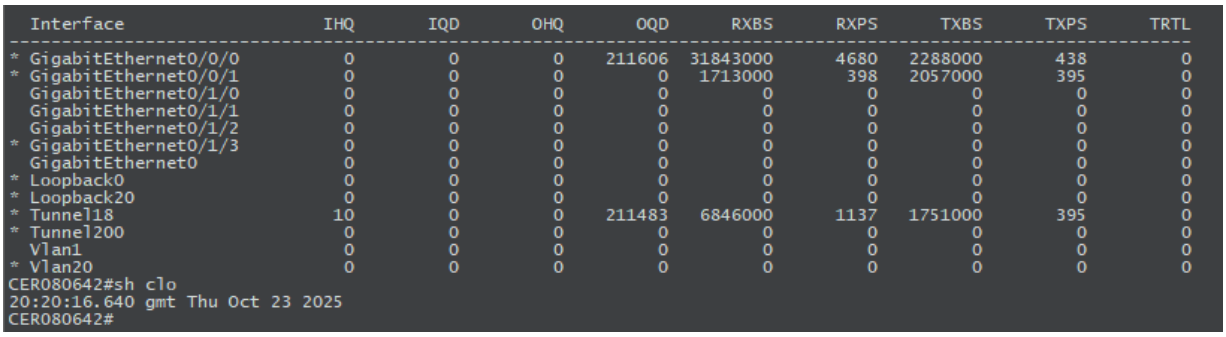

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0     211606   31843000       4680    2288000        438          0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0    1713000        398    2057000        395          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                  10          0          0     211483    6846000       1137    1751000        395          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER080642#sh clo
20:20:16.640 gmt Thu Oct 23 2025
CER080642#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1509	1	Antioquia, Itagüí; Carrera 52A # 74-67, Casa de Justicia	32 Mbps	31,2

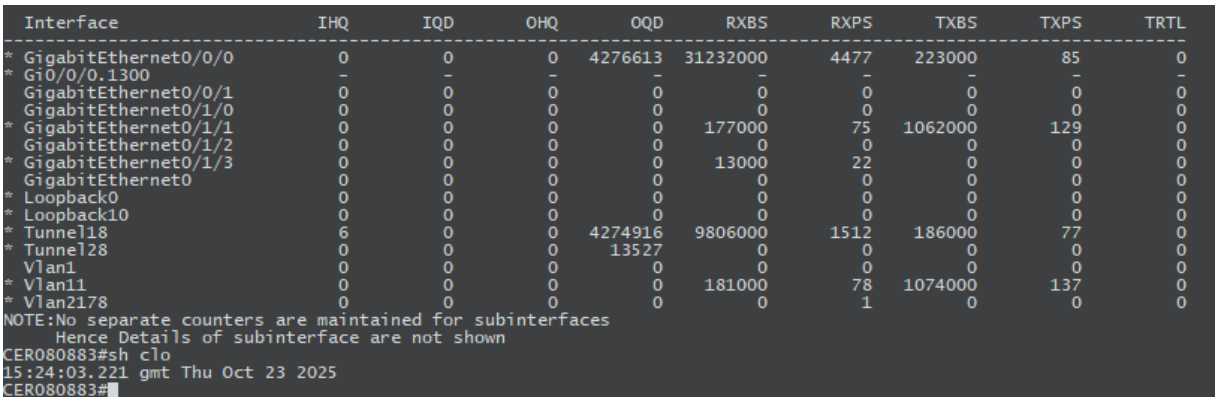


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0        4276613     31232000        4477      223000          85           0
* Gi0/0/0.1300                -           -           -              -            -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0           0              0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/0        0           0           0              0            0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/1        0           0           0              0       177000          75     1062000         129           0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0              0            0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3        0           0           0              0        13000          22           0           0           0
  GigabitEthernet0            0           0           0              0            0           0           0           0           0
* Loopback0                   0           0           0              0            0           0           0           0           0
* Loopback10                  0           0           0              0            0           0           0           0           0
* Tunnel18                    6           0           0        4274916      9806000        1512      186000          77           0
* Tunnel28                    0           0           0          13527            0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0           0              0            0           0           0           0           0
* Vlan11                      0           0           0              0       181000          78     1074000         137           0
* Vlan2178                    0           0           0              0            0           1           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO80883#sh clo
15:24:03.221 gmt Thu Oct 23 2025
CERO80883#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1510	1	Antioquia, Itagüí; Carrera 50 Calle 51-49 (Interior 2)	32 Mbps	31,3

```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0           0            0         132     31342000        3466      374000          80           0
* GigabitEthernet0/0/1         0           0            0           0       286000          80      299000          71           0
  GigabitEthernet0/1/0         0           0            0           0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1         0           0            0           0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2         0           0            0           0            0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3         0           0            0           0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0             0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Loopback0                    0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Loopback20                   0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Tunnel18                     3           0            0         132      8778000        1075      287000          82           0
  Tunnel28                     0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Tunnel200                    0           0            0           0            0           0           0           0           0
  Vlan1                        0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Vlan20                       0           0            0           0            0           0           0           0           0
CER080641#sh clo
*20:16:57.688 gmt Thu Oct 23 2025
CER080641#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1511	2	Antioquia, La Ceja; Carrera 22 #18-39 Local 103 -104	32 Mbps	29,8

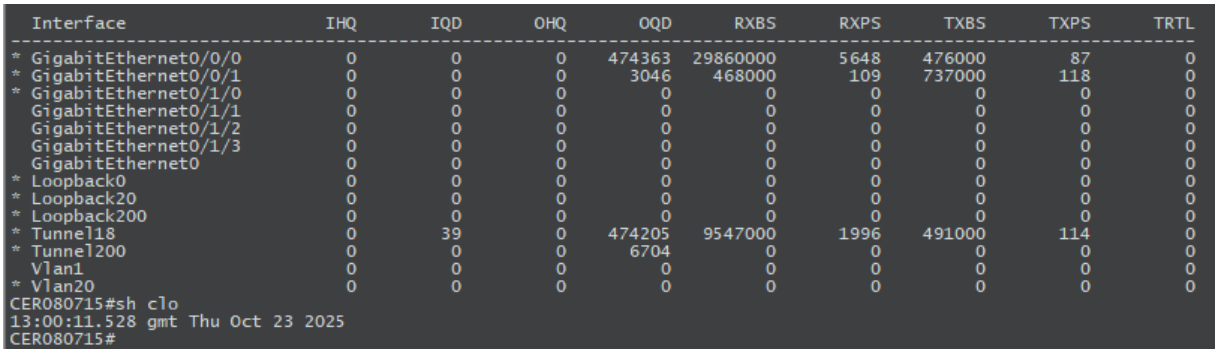


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0     474363   29860000       5648     476000         87          0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0       3046     468000        109     737000        118          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                   0         39          0     474205    9547000       1996     491000        114          0
* Tunnel200                  0          0          0       6704          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER080715#sh clo
13:00:11.528 gmt Thu Oct 23 2025
CER080715#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1517	1	Antioquia, Medellín; Carrera 32 # 101-283 Santo Domingo	32 Mbps	31,3

```
  Interface                   IHQ        IQD          OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0            0     118766    31315000        4507        8000           4           0
* GigabitEthernet0/0/1          0          0            0          0        1000           1           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0            0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Loopback0                     0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel18                      0          0            0     118507     6452000        1016        4000           3           0
* Tunnel200                     0          0            0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Vlan20                        0          0            0          0           0           1           0           0           0
CER080640#sh clo
20:28:49.036 gmt Thu Oct 23 2025
CER080640#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1518	1	Antioquia, Medellín; Calle 104B #48-60 Villa del Socorro	32 Mbps	32,4

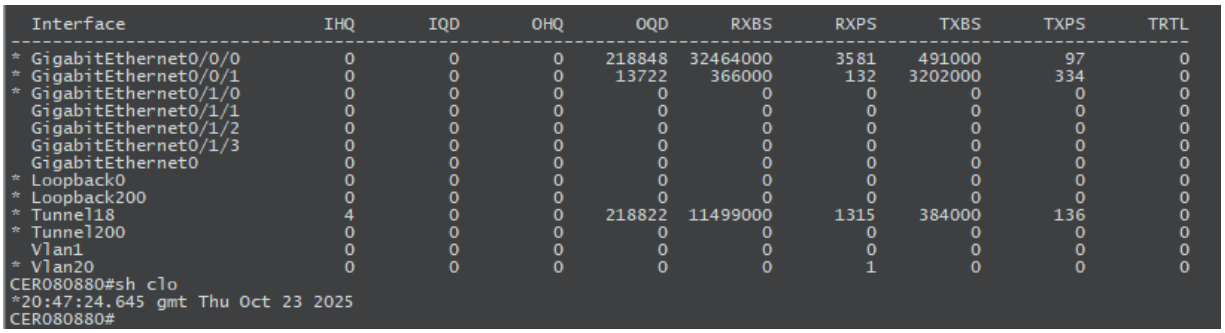

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0     218848   32464000       3581     491000         97          0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0      13722     366000        132    3202000        334          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                   4          0          0     218822   11499000       1315     384000        136          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          1          0          0          0
CER080880#sh clo
*20:47:24.645 gmt Thu Oct 23 2025
CER080880#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1519	1	Antioquia, Medellín; Casa de Justicia Robledo, Diagonal 85 # 79-173 Piso 2	32 Mbps	31,6

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0      92883   31679000       5970     310000         63          0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     252000         78    1206000        130          0
* GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                   0          0          0      92838    8249000       1624     259000         87          0
* Tunnel28                   0          0          0          1          0          0          0          0          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     251000         86    1257000        137          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER080639#sh clo
20:29:53.390 gmt Thu Oct 23 2025
CER080639#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1521	1	Antioquia, Medellín; Carrera 39C # 109-24, Casa de Justicia 20 de Julio	32 Mbps	32,3


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     603726   32375000       4522     791000        242          0
* Gi0/0/0.1629                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     709000        224    2973000        361          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                      0          0          0     603481    8684000       1262     736000        226          0
* Tunnel28                      0          0          0          1          0          0          0          0          0
* Tunnel200                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     715000        224    2954000        363          0
* Vlan20                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER080638#sh clo
*20:32:34.611 gmt Thu Oct 23 2025
CER080638#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1523	1	Antioquia, Medellín; Calle 62 # 128-103	32 Mbps	30,4

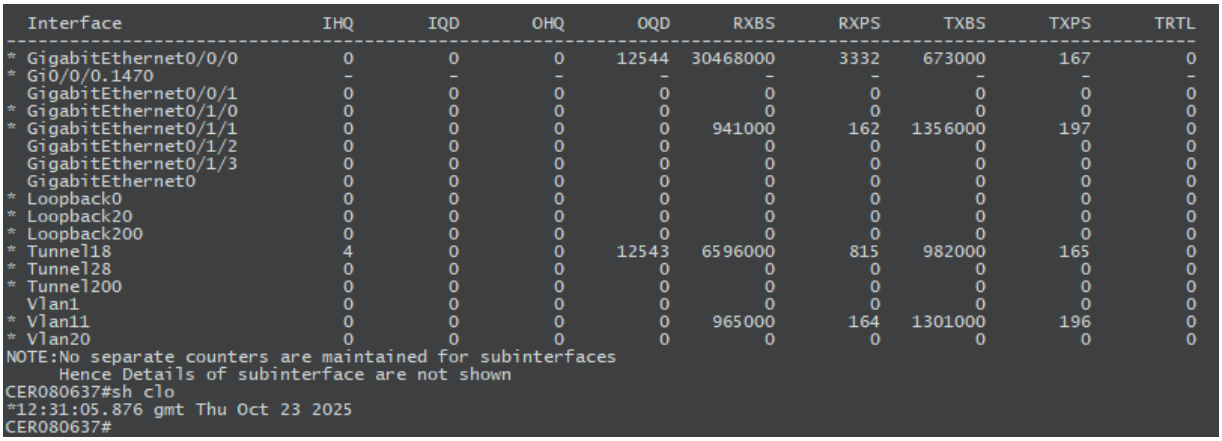


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0      12544   30468000       3332     673000        167          0
* Gi0/0/0.1470               -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0     941000        162    1356000        197          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                   4          0          0      12543    6596000        815     982000        165          0
* Tunnel28                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     965000        164    1301000        196          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER080637#sh clo
*12:31:05.876 gmt Thu Oct 23 2025
CER080637#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1524	1	Antioquia, Medellín; Calle 10 # 40 Este 44 Piso 2, Casa de Justicia Santa Elena	32 Mbps	31,1

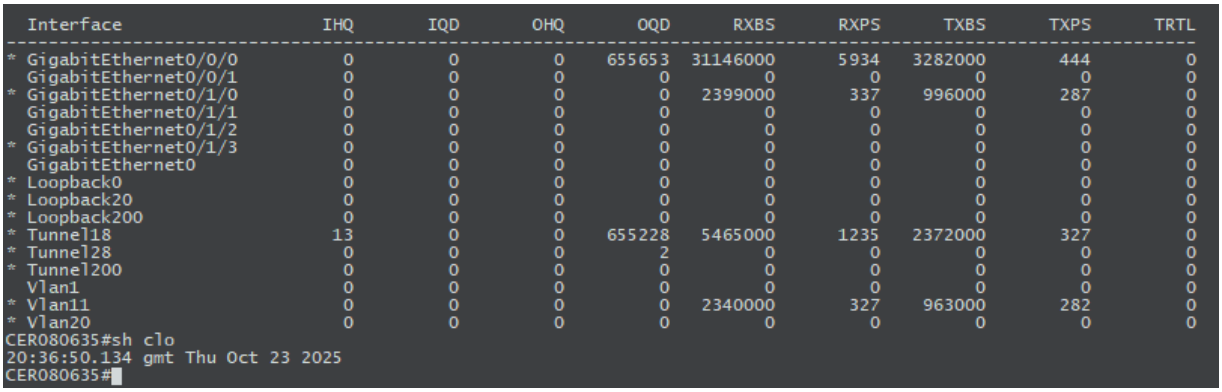

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0     655653   31146000       5934    3282000        444          0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0    2399000        337     996000        287          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                  13          0          0     655228    5465000       1235    2372000        327          0
* Tunnel28                   0          0          0          2          0          0          0          0          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0    2340000        327     963000        282          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
CERO80635#sh clo
20:36:50.134 gmt Thu Oct 23 2025
CERO80635#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1525	1	Antioquia, Medellín; Carrera 79 # 41Sur 36, Casa de Justicia San Antonio de Prado	32 Mbps	30

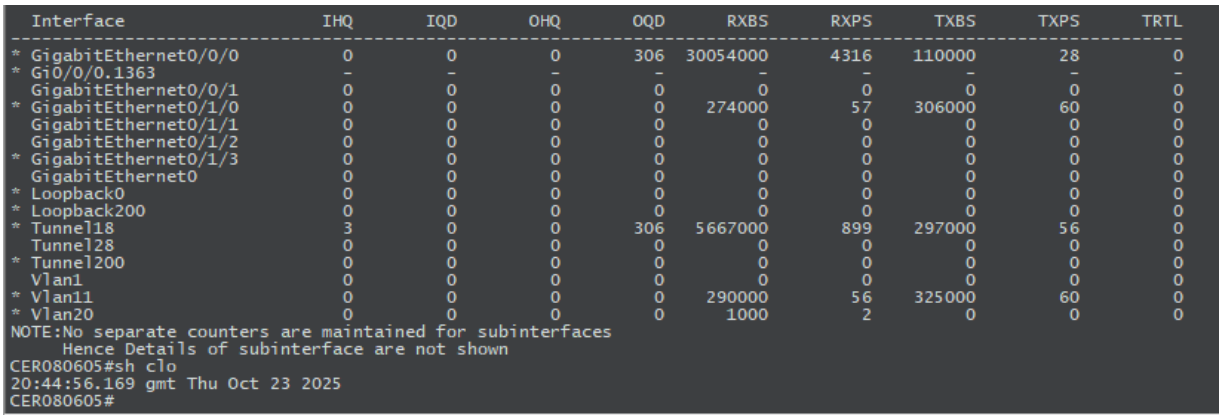

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0        306   30054000       4316     110000         28          0
* Gi0/0/0.1363                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     274000         57     306000         60          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                      3          0          0        306    5667000        899     297000         56          0
  Tunnel28                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel200                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     290000         56     325000         60          0
* Vlan20                        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER080605#sh clo
20:44:56.169 gmt Thu Oct 23 2025
CER080605#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1526	1	Antioquia, Medellín; Carrera 36A # 39-26 Piso 3 Barrio el Salvador	32 Mbps	32,4

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0     272303   32486000       3594     415000         91          0
* Gi0/0/0.2099                -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0     581000        128     787000        146          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          4          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0            0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                    0          0          0     268706    8809000       1096     599000        136          0
* Tunnel28                    0          0          0       3596          0          0          0          0          0
* Tunnel200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0     584000        135     807000        154          0
* Vlan20                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER082319#sh clo
*21:11:56.214 gmt Thu Oct 23 2025
CER082319#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1532	3	Nariño, San Andrés de Tumaco; Carrera 9 # 7a-58 CC Hernandez Locales 1, 2 y 3	25 Mbps	23,2


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0        429   23273000       3349     375000         85          0
* Gi0/0/0.3183                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     286000        108    1086000        129          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                     10          0          0        298    6041000        916     277000        104          0
* Tunnel24                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     281000        115    1091000        138          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER088465#sh clo
*20:49:57.122 gmt Thu Oct 23 2025
CER088465#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1547	4	Cesar, González; Carrera 6 # 2-128 Barrio El Palomar	25 Mbps	23,6

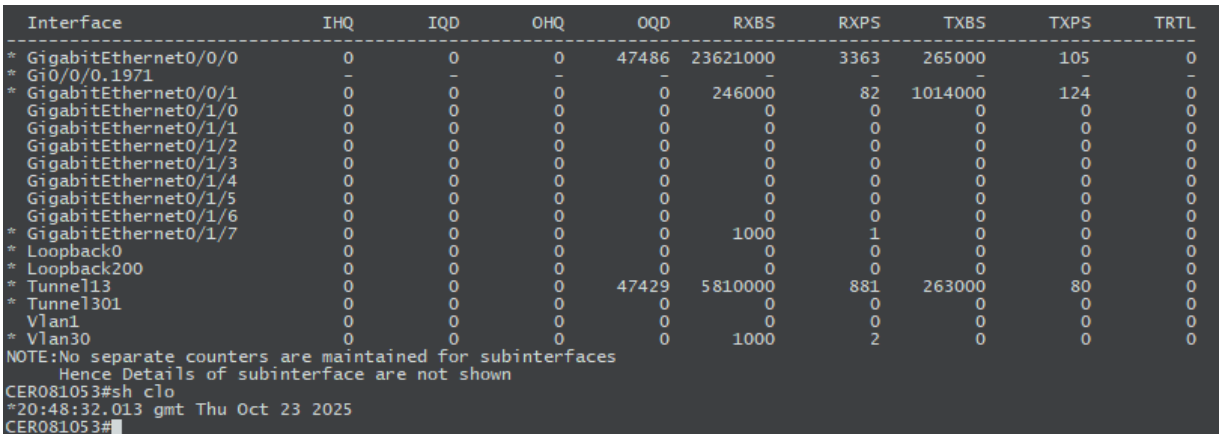


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0      47486   23621000       3363     265000        105         0
* Gi0/0/0.1971                 -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0     246000         82    1014000        124         0
  GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel13                     0          0          0      47429    5810000        881     263000         80         0
* Tunnel301                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan30                       0          0          0          0       1000          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER081053#sh clo
*20:48:32.013 gmt Thu Oct 23 2025
CER081053#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1563	3	Tolima, Saldaña; Calle 14A # 16-16 PISO 2	40 Mbps	37,5

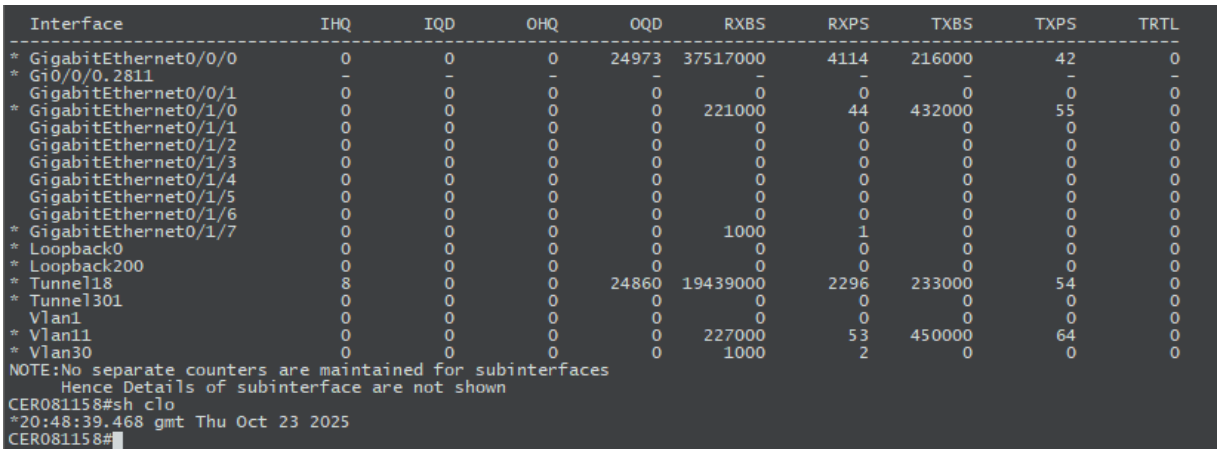


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0      24973   37517000       4114     216000         42         0
* Gi0/0/0.2811                 -          -          -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0     221000         44     432000         55         0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel18                     8          0          0      24860   19439000       2296     233000         54         0
* Tunnel301                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                       0          0          0          0     227000         53     450000         64         0
* Vlan30                       0          0          0          0       1000          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER081158#sh clo
*20:48:39.468 gmt Thu Oct 23 2025
CER081158#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1568	3	Magdalena, Santa Ana; Calle 2 con Carrera 6 esquina	32 Mbps	30,4

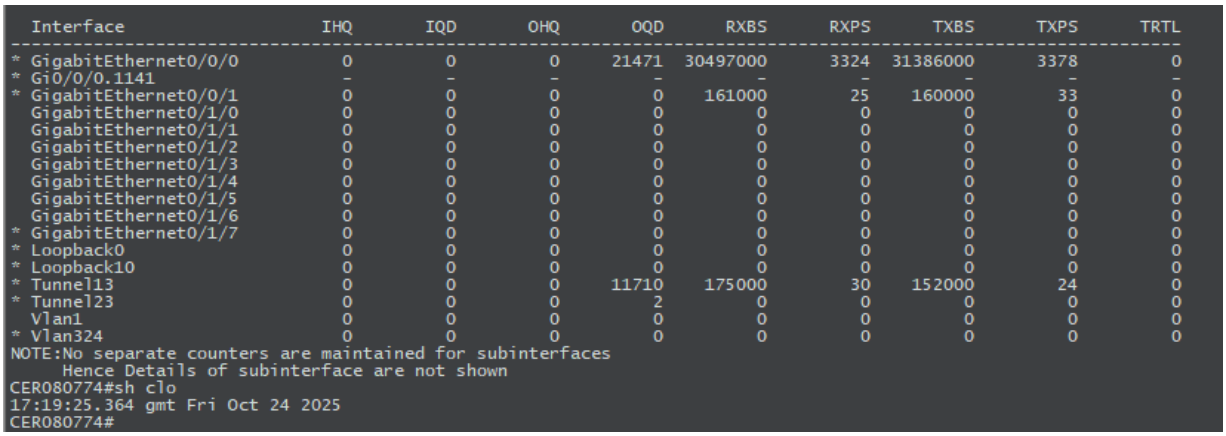


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      21471   30497000       3324   31386000       3378          0
* Gi0/0/0.1141                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     161000         25     160000         33          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                      0          0          0      11710     175000         30     152000         24          0
* Tunnel23                      0          0          0          2          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan324                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER080774#sh clo
17:19:25.364 gmt Fri Oct 24 2025
CER080774#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1573	3	Magdalena, Zona Bananera; Calle 6 # 6-90 Barrio Centro	32 Mbps	31,2

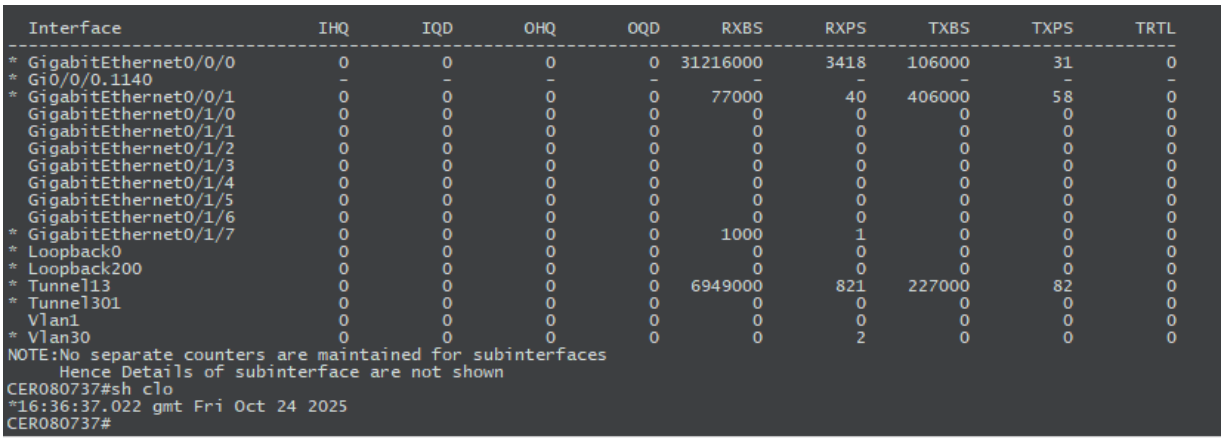


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0   31216000       3418     106000         31          0
* Gi0/0/0.1140                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0      77000         40     406000         58          0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                    0          0          0          0    6949000        821     227000         82          0
* Tunnel301                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                      0          0          0          0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER080737#sh clo
*16:36:37.022 gmt Fri Oct 24 2025
CER080737#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1576	3	Norte de Santander, Ocaña; Carrera 11 # 11-58 Apto 201, Barrio Centro	32 Mbps	30,2

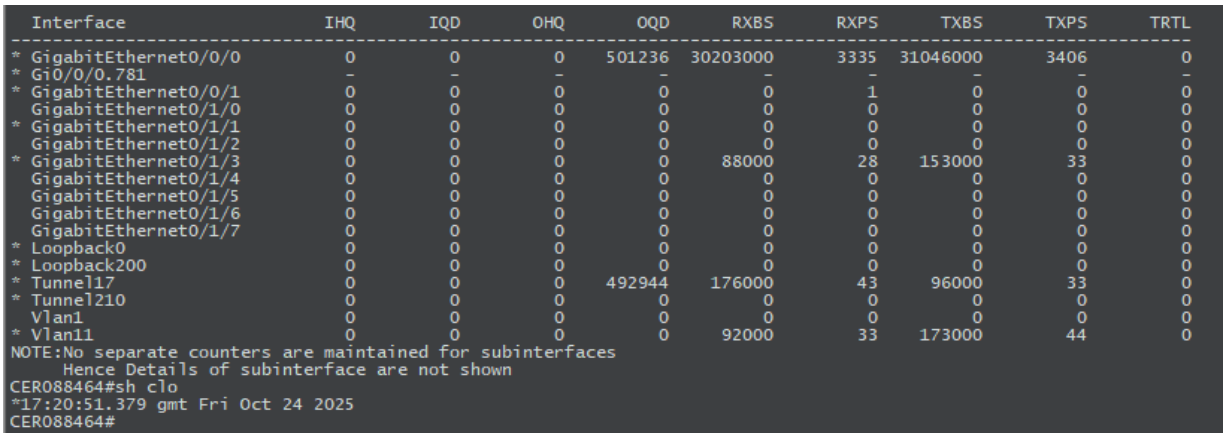

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     501236   30203000       3335   31046000       3406         0
* Gi0/0/0.781                   -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          1          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0      88000         28     153000         33         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel17                      0          0          0     492944     176000         43      96000         33         0
* Tunnel210                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                        0          0          0          0      92000         33     173000         44         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER088464#sh clo
*17:20:51.379 gmt Fri Oct 24 2025
CER088464#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1602	4	Antioquia, Cañasgordas; Calle 25 # 29A-03	32 Mbps	30,5

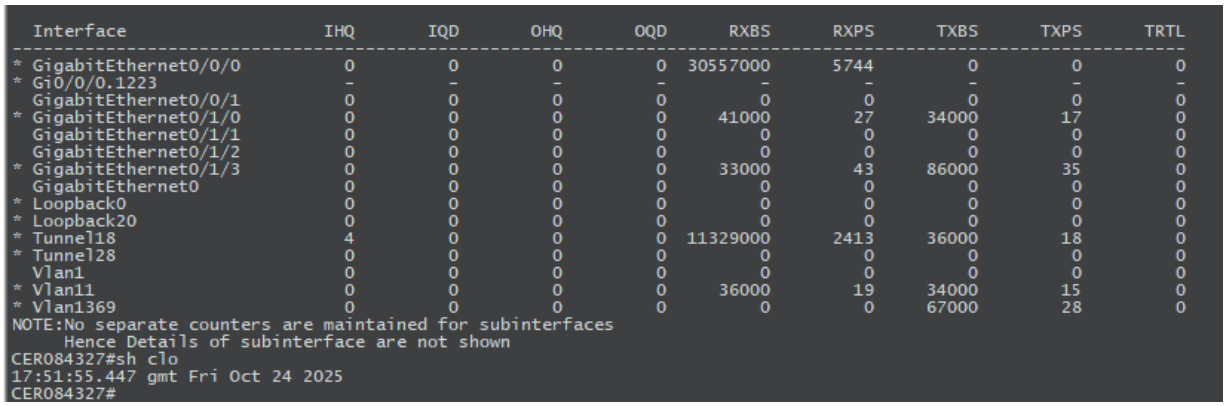

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0       30557000    5744       0          0          0
* Gi0/0/0.1223                -          -          -          -       -           -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0       0           0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0       41000       27         34000      17         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0       0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0       0           0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0       33000       43         86000      35         0
  GigabitEthernet0            0          0          0          0       0           0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0       0           0          0          0          0
* Loopback20                  0          0          0          0       0           0          0          0          0
* Tunnel18                    4          0          0          0       11329000    2413       36000      18         0
* Tunnel28                    0          0          0          0       0           0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0       0           0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0       36000       19         34000      15         0
* Vlan1369                    0          0          0          0       0           0          67000      28         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER084327#sh clo
17:51:55.447 gmt Fri Oct 24 2025
CER084327#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1583	3	Norte de Santander, Bucarasica; Calle 2 # 1-04	25 Mbps	23,4

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   23400000       2556       4000          3          0
* Gi0/0/0.1966                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                      0          0          0          0    4514000        531       1000          2          0
* Tunnel27                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO81045#sh clo
*17:14:13.736 gmt Fri Oct 24 2025
CERO81045#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1584	4	Norte de Santander, Chinácota; Carrera 5 No 7-02/04/10	25 Mbps	23,5

```
  Interface                   IHQ        IQD          OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0            0      35431    23621000        4438        6000           4           0
* Gi0/0/0.2809                  -          -            -          -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0            0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0            0          0       15000          14           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0            0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/5          0          0            0          0        1000           1           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Loopback0                     0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0          0            0          0           0           0           0           0           0
  Tunnel7                       0          0            0          0           0           0           0           0           0
  Tunnel17                      0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel27                      9          0            0      35420     5601000        1192        2000           3           0
* Tunnel301                     0          0            0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Vlan11                        0          0            0          0       13000          12        1000           2           0
* Vlan30                        0          0            0          0           0           1           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER081160#sh clo
*18:10:59.945 gmt Fri Oct 24 2025
CER081160#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1585	4	Norte de Santander, El Tarra; Calle 15 # 7-17, Barrio Pueblo Nuevo, Edificio Colmutar	25 Mbps	23,5

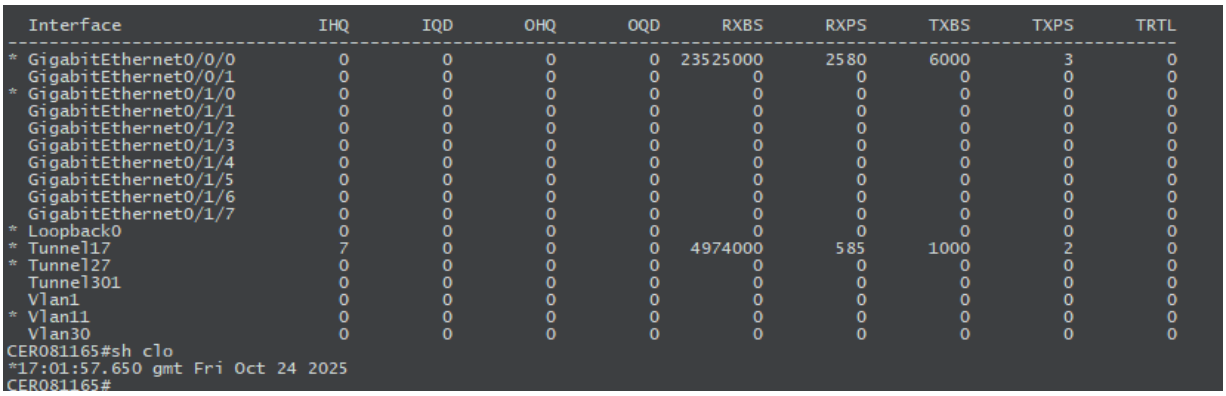

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   23525000       2580       6000          3          0
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                      7          0          0          0    4974000        585       1000          2          0
* Tunnel27                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan30                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER081165#sh clo
*17:01:57.650 gmt Fri Oct 24 2025
CER081165#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1587	4	Norte de Santander, Pamplonita; Carrera 1 # 2-64 Apartamento 102, Edificio Garcia Parada	25 Mbps	23,7

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   23760000       2611      35000         13          0
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      12000          7       4000          6          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                      0          0          0          0    9080000       1071      20000          9          0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      18000          7       8000          6          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
CER081048#sh clo
*17:44:38.916 gmt Fri Oct 24 2025
CER081048#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1588	4	Norte de Santander, Villa caro; Calle 2 # 5-52, Barrio Centro	25 Mbps	24

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0       1000          1       3000          1          0
* Gi0/0/0.1963                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0       1000          3          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   24037000       4489       3000          2          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                      1          0          0          0    6757000       1439       1000          2          0
* Tunnel27                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0          0          0       1000          3          0
* Vlan1296                      0          0          0          0    7599000       1440       3000          2          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER081093#sh clo
17:44:24.702 gmt Fri Oct 24 2025
CER081093#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1592	1	Santander, Floridablanca; Carrera 12 # 4-38	25 Mbps	23,5

```
  Interface                IHQ          IQD          OHQ          OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0            0            0            0     23501000        2685      742000         196           0
* GigabitEthernet0/0/1       0            0            0            0       680000         209     2120000         302           0
  GigabitEthernet0/1/0       0            0            0            0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1       0            0            0            0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2       0            0            0            0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3       0            0            0            0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4       0            0            0            0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5       0            0            0            0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6       0            0            0            0            0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7       0            0            0            0            0           0           0           0           0
* Loopback0                  0            0            0            0            0           0           0           0           0
* Loopback200                0            0            0            0            0           0           0           0           0
* Tunnel17                   5            0            0            0      5614000         721      705000         206           0
* Tunnel27                   0            0            0            0            0           0           0           0           0
* Tunnel210                  0            0            0            0            0           0           0           0           0
  Vlan1                      0            0            0            0            0           0           0           0           0
* Vlan20                     0            0            0            0            0           0           0           0           0
CER081196#sh clo
*17:28:22.695 gmt Fri Oct 24 2025
CER081196#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1590	4	Santander, Barichara; Calle 7 # 6-65	25 Mbps	23

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0       1000          1       1000          1          0
* Gi0/0/0.2821                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     991000        149    1530000        188          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   23009000       4228    1097000        147          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel15                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel17                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel301                     0          0          0          0   20211000       4160    1026000        155          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0    1014000        154    1554000        195          0
* Vlan30                        0          0          0          0   22999000       4243    1130000        154          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER081826#sh clo
*18:15:10.777 gmt Fri Oct 24 2025
CER081826#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1603	3	Cundinamarca, Villeta; Carrera 8 N # 4-13, Edificio Verona	32 Mbps	30,4

```
  Interface                   IHQ        IQD          OHQ        OQD       RXBS       RXPS     TXBS     TXPS     TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0            0        48778   30496000       3333   204000       56        0
* Gi0/0/0.775                 -          -            -            -          -          -        -        -        -
* Gi0/0/0.911                 -          -            -            -          -          -        -        -        -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0            0            0     264000         58  1039000      129        0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0            0            0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0            0            0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0            0            0          0          0        0        0        0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0            0            0          0          1     9000        1        0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0            0            0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0            0            0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0            0            0          0          0        0        0        0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0            0            0          0          0        0        0        0
* Loopback0                   0          0            0            0          0          0        0        0        0
* Loopback10                  0          0            0            0          0          0        0        0        0
* Loopback20                  0          0            0            0          0          0        0        0        0
* Tunnel16                   11          0            0        48758    7332000        871   280000       63        0
* Tunnel26                    0          0            0            0          0          0        0        0        0
  Vlan1                       0          0            0            0          0          0        0        0        0
  Vlan100                     0          0            0            0          0          0        0        0        0
* Vlan640                     0          0            0            0          0          0    12000        1        0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER087837#sh clo
17:57:36.941 gmt Fri Oct 24 2025
CER087837#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1621	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Calle 4C # 19-13	40 Mbps	39,5


```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS     TXBS     TXPS     TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0               0          0         0          0     774000        145  1020000      166        0
  FastEthernet1               0          0         0          0          0          0        0        0        0
  FastEthernet2               0          0         0          0          0          0        0        0        0
* FastEthernet3               0          0         0          0          0          0        0        0        0
* FastEthernet4               0      36986         0    1423742   39550000       4311   517000      150     2854
* FastEthernet4.1308          -          -         -          -          -          -        -        -        -
* FastEthernet4.1314          -          -         -          -          -          -        -        -        -
* Loopback0                   0          0         0          0          0          0        0        0        0
* Loopback10                  0          0         0          0          0          0        0        0        0
* Loopback20                  0          0         0          0          0          0        0        0        0
* Loopback200                 0          0         0          0          0          0        0        0        0
* Tunnel16                   76     519797         0       2294    7454000        932   866000      144        0
* Tunnel26                    0          0         0          3          0          0        0        0        0
* Tunnel200                   0          0         0        770          0          0        0        0        0
  Vlan1                       0          0         0          0          0          0        0        0        0
* Vlan11                      0          0         0          0     767000        147  1012000      171        0
* Vlan20                      0          0         0          0          0          0        0        0        0
* Vlan100                     0          0         0          4          0          0        0        0        0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER092504#sh clo
04:12:58.896 gmt Sat Oct 18 2025
CER092504#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1613	1	Bolívar, Cartagena; Diagonal 21 A No. 53-78 LO-02 Barrio El Bosque	25 Mbps	23

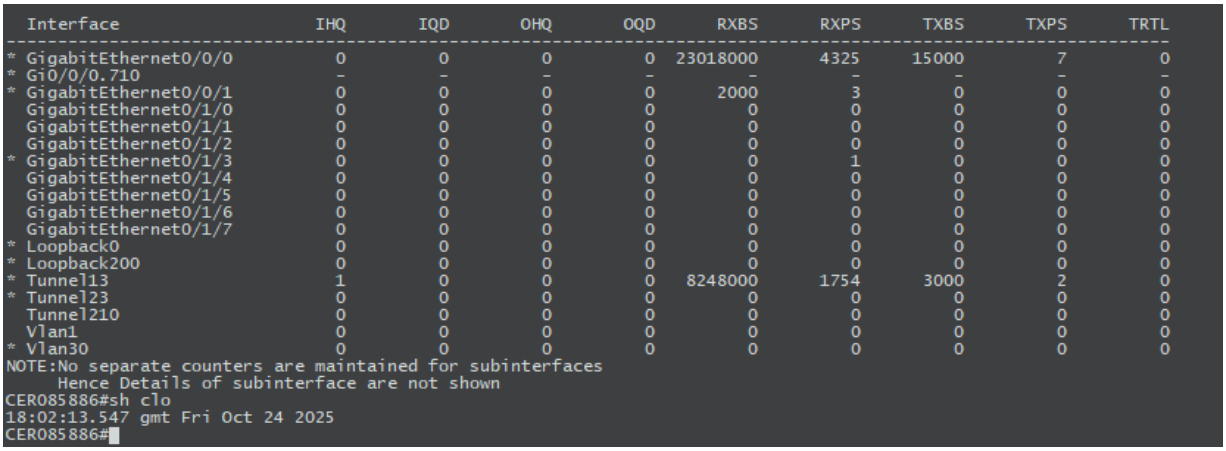


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   23018000       4325      15000          7          0
* Gi0/0/0.710                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0       2000          3          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          1          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                      1          0          0          0    8248000       1754       3000          2          0
* Tunnel23                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel210                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER085886#sh clo
18:02:13.547 gmt Fri Oct 24 2025
CER085886#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1619	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Carrera 17 # 6B-14	40 Mbps	39,6

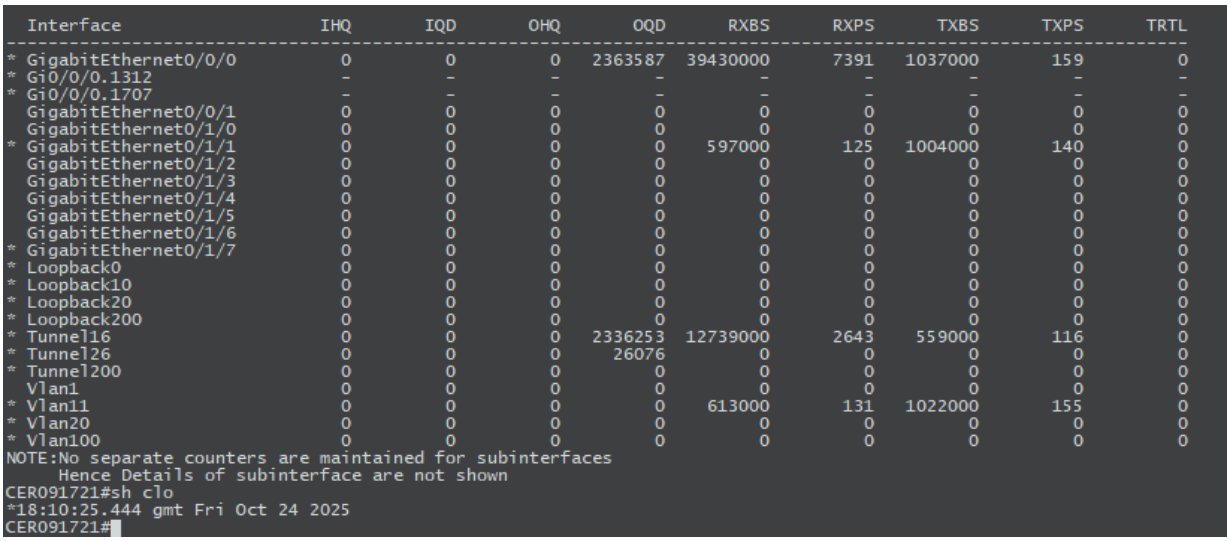


```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0   2363587   39430000       7391    1037000        159          0
* Gi0/0/0.1312                  -         -         -         -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1707                  -         -         -         -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0     597000        125    1004000        140          0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      0         0         0   2336253   12739000       2643     559000        116          0
* Tunnel26                      0         0         0     26076          0          0          0          0          0
* Tunnel200                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0         0         0         0     613000        131    1022000        155          0
* Vlan20                        0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0         0         0         0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER091721#sh clo
*18:10:25.444 gmt Fri Oct 24 2025
CER091721#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1540	3	Boyacá, Cubará; Calle 5 # 5-26 Barrio el Comercio	25 Mbps	24

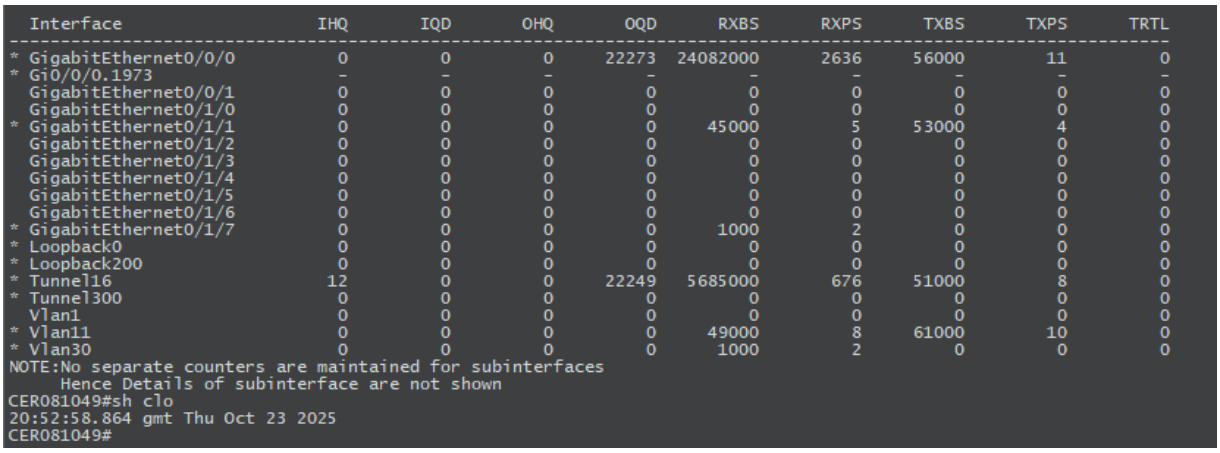


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      22273   24082000       2636      56000         11         0
* Gi0/0/0.1973                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0      45000          5      53000          4         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          2          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                     12          0          0      22249    5685000        676      51000          8         0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                        0          0          0          0      49000          8      61000         10         0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER081049#sh clo
20:52:58.864 gmt Thu Oct 23 2025
CER081049#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1552	4	Magdalena, Aracataca; Calle 7 # 2-33	25 Mbps	24,3

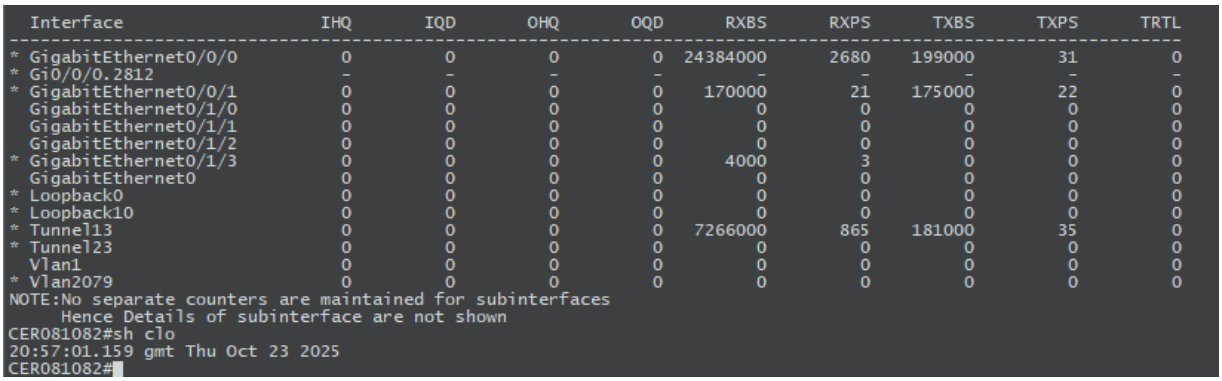


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0           0   24384000       2680     199000         31          0
* Gi0/0/0.2812                  -           -            -           -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0            0           0     170000         21     175000         22          0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0       4000          3          0          0          0
  GigabitEthernet0              0           0            0           0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0           0            0           0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0           0            0           0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                      0           0            0           0    7266000        865     181000         35          0
* Tunnel23                      0           0            0           0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0           0            0           0          0          0          0          0          0
* Vlan2079                      0           0            0           0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER081082#sh clo
20:57:01.159 gmt Thu Oct 23 2025
CER081082#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1708	2	Antioquia, El Santuario; Calle 54 # 45-15	32 Mbps	31,8

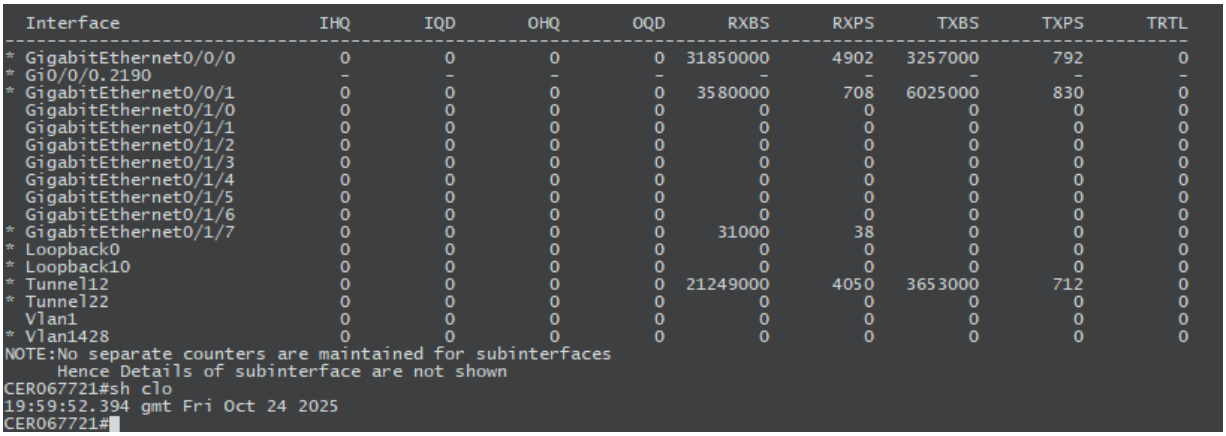

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   31850000        4902    3257000        792         0
* Gi0/0/0.2190                  -          -          -          -          -           -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0    3580000         708    6025000        830         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0           0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0           0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0           0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0           0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0           0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0           0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0           0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0      31000          38          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0           0          0          0         0
* Loopback10                    0          0          0          0          0           0          0          0         0
* Tunnel12                      0          0          0          0   21249000        4050    3653000        712         0
* Tunnel22                      0          0          0          0          0           0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0           0          0          0         0
* Vlan1428                      0          0          0          0          0           0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067721#sh clo
19:59:52.394 gmt Fri Oct 24 2025
CER067721#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1625	3	Cundinamarca, Agua de Dios; Calle 13 # 9-27 Piso 2	32 Mbps	30

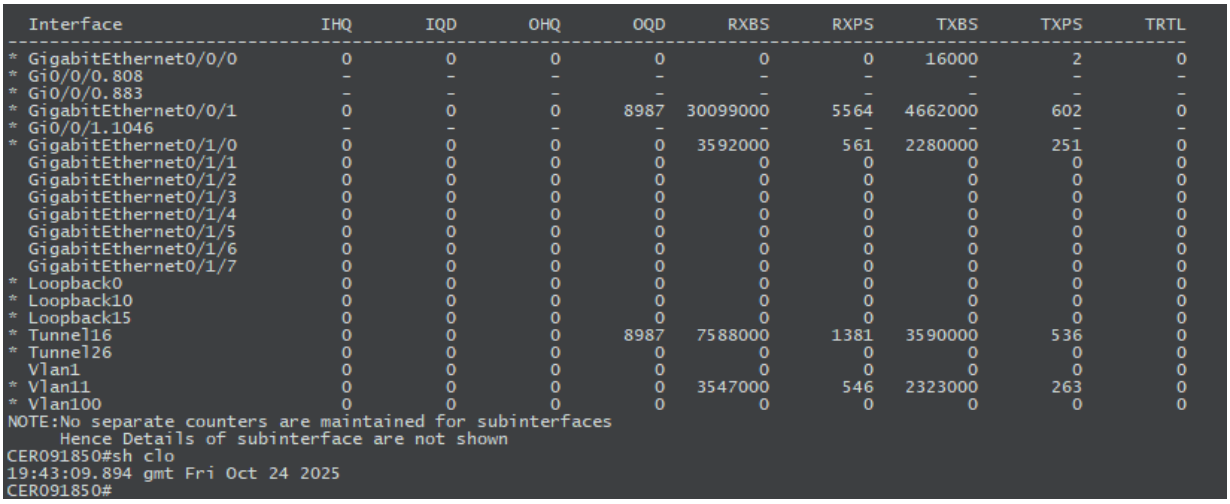


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0          0          0          0      16000          2          0
* Gi0/0/0.808                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.883                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1         0          0          0       8987   30099000       5564    4662000        602          0
* Gi0/0/1.1046                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0    3592000        561    2280000        251          0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback15                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                     0          0          0       8987    7588000       1381    3590000        536          0
* Tunnel26                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                       0          0          0          0    3547000        546    2323000        263          0
* Vlan100                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER091850#sh clo
19:43:09.894 gmt Fri Oct 24 2025
CER091850#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1701	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Carrera 13 # 5-49 Piso 2	40 Mbps	39,1


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0          0   39123000       7343     999000        151          0
* Gi0/0/0.1342                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1702                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0     895000        159     573000        120          0
  GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                     0          0          0          0   11561000       2416     509000        105          0
* Tunnel28                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel200                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER095529#sh clo
19:44:46.653 gmt Fri Oct 24 2025
CER095529#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1704	1	Valle Del Cauca, Palmira; Calle 57 # 44-22	25 Mbps	23,1

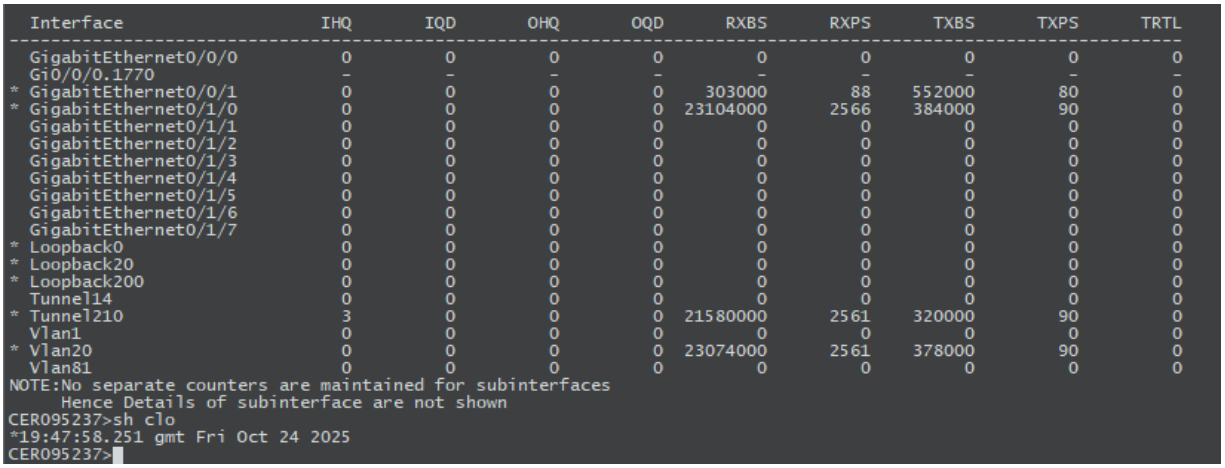


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Gi0/0/0.1770                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     303000         88     552000         80          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0   23104000       2566     384000         90          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel14                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel210                     3          0          0          0   21580000       2561     320000         90          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                        0          0          0          0   23074000       2561     378000         90          0
  Vlan81                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO95237>sh clo
*19:47:58.251 gmt Fri Oct 24 2025
CERO95237>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1706	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Calle Calle 17 # 4B-18	40 Mbps	39,1

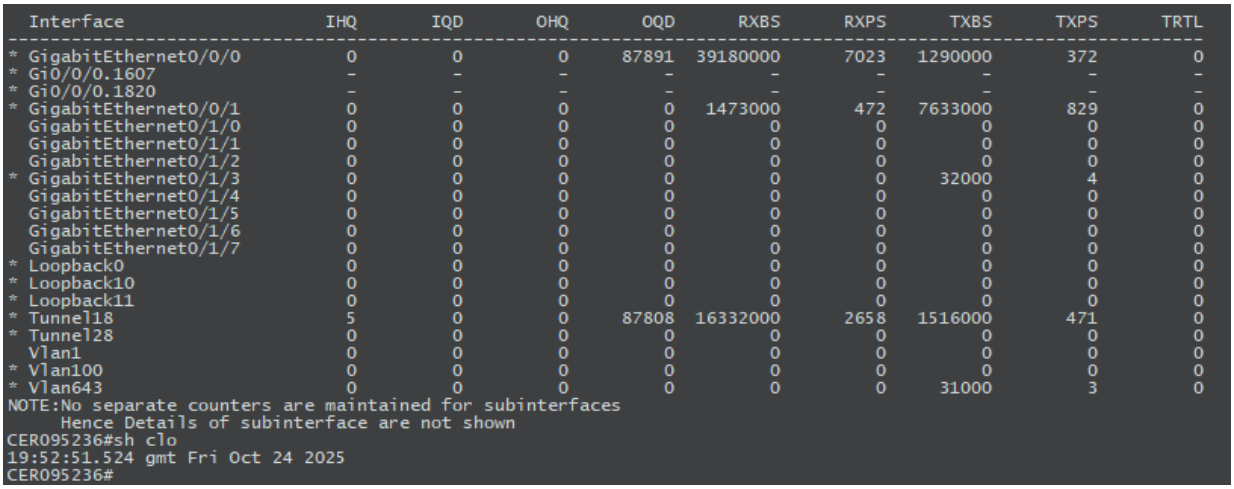


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          87891     39180000   7023       1290000    372        0
* Gi0/0/0.1607                -          -          -          -         -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1820                -          -          -          -         -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         1473000    472        7633000    829        0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         0          0          32000      4          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback11                  0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Tunnel18                    5          0          0          87808     16332000   2658       1516000    471        0
* Tunnel28                    0          0          0          0         0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Vlan100                     0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Vlan643                     0          0          0          0         0          0          31000      3          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER095236#sh clo
19:52:51.524 gmt Fri Oct 24 2025
CER095236#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1736	1	Atlántico, Barranquilla; Calle 76 No. 49C-26 Edificio Gaula Piso 5	32 Mbps	30,5

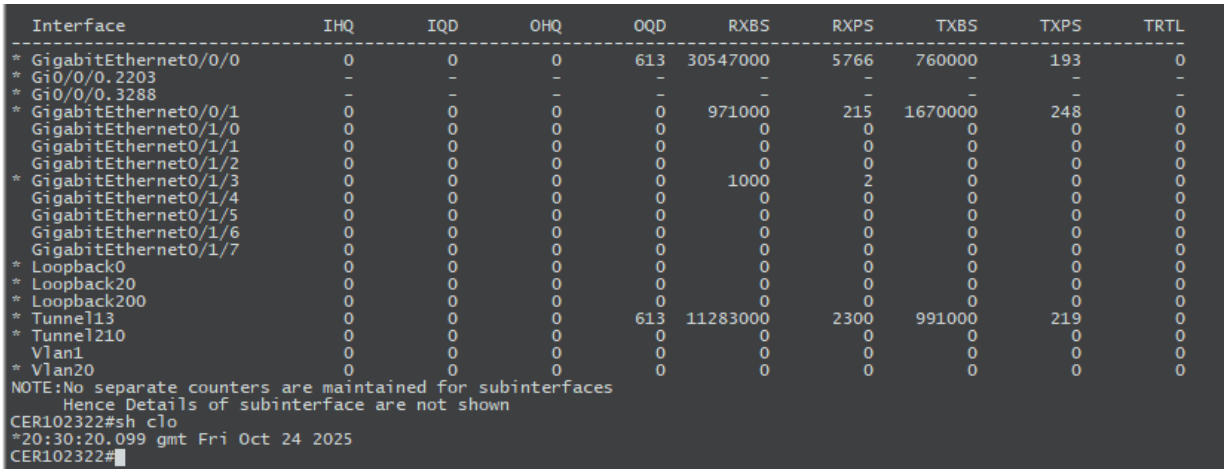


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0        613   30547000       5766     760000        193         0
* Gi0/0/0.2203                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.3288                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     971000        215    1670000        248         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0       1000          2          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel13                      0          0          0        613   11283000       2300     991000        219         0
* Tunnel210                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan20                        0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER102322#sh clo
*20:30:20.099 gmt Fri Oct 24 2025
CER102322#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1709	3	Norte de Santander, San Calixto; Avenida 7 # 7-07	25 Mbps	23,6

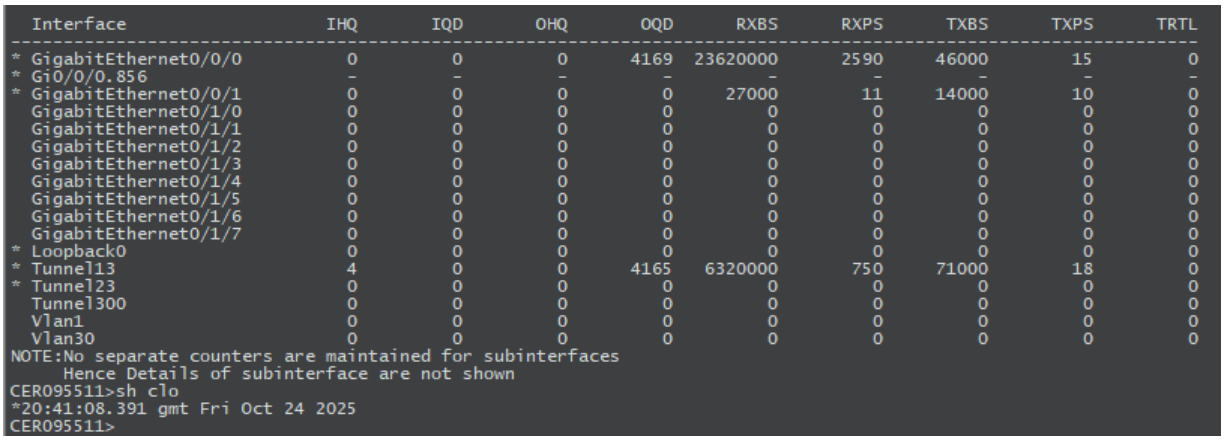


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0       4169   23620000       2590      46000         15         0
* Gi0/0/0.856                 -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0      27000         11      14000         10         0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel13                    4          0          0       4165    6320000        750      71000         18         0
* Tunnel23                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Tunnel300                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan30                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER095511>sh clo
*20:41:08.391 gmt Fri Oct 24 2025
CER095511>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1710	3	Norte de Santander, Toledo; Carrera 5 # 2-14	25 Mbps	23,5

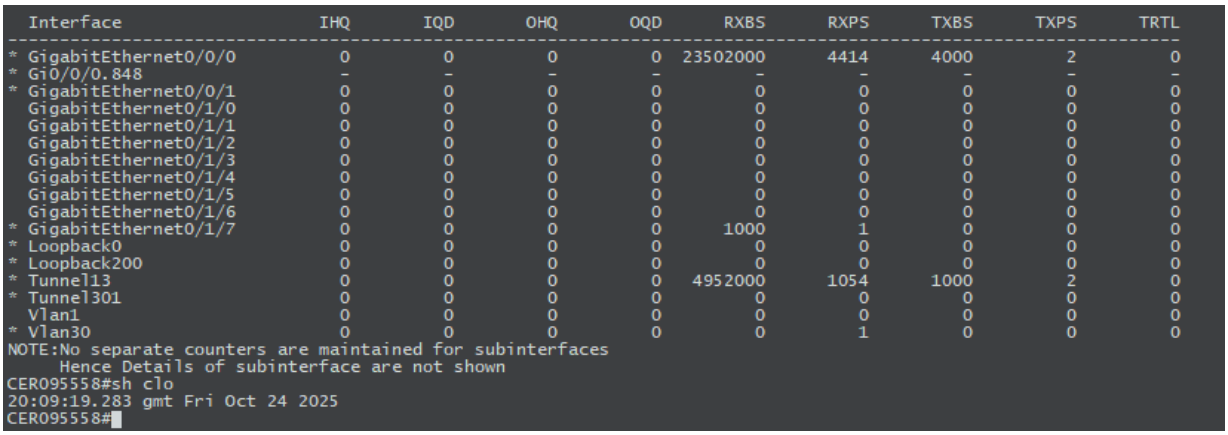

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0           0    23502000        4414        4000           2           0
* Gi0/0/0.848                   -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0        1000           1           0           0           0
* Loopback0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel13                      0           0           0           0     4952000        1054        1000           2           0
* Tunnel301                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan30                        0           0           0           0           0           1           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER095558#sh clo
20:09:19.283 gmt Fri Oct 24 2025
CER095558#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1712	4	Cundinamarca, Jerusalén; Calle 2# 4-72, Palacio Municipal	25 Mbps	23

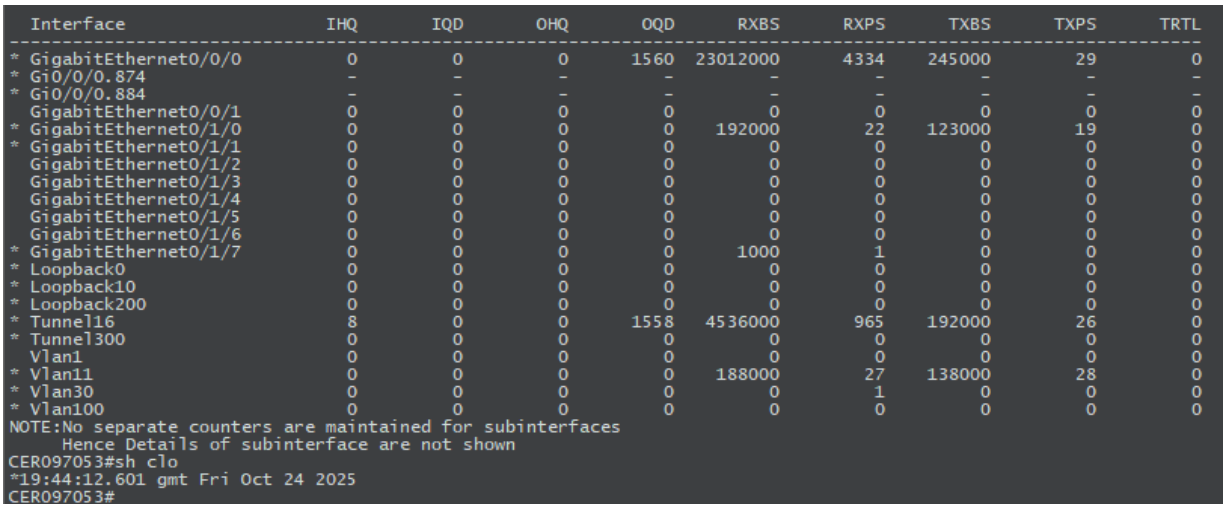


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0       1560   23012000       4334     245000         29         0
* Gi0/0/0.874                 -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.884                 -          -          -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0     192000         22     123000         19         0
* GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                    8          0          0       1558    4536000        965     192000         26         0
* Tunnel300                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                      0          0          0          0     188000         27     138000         28         0
* Vlan30                      0          0          0          0          0          1          0          0         0
* Vlan100                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER097053#sh clo
*19:44:12.601 gmt Fri Oct 24 2025
CER097053#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1713	4	Norte de Santander, Gramalote; Centro Administrativo Municipal Gramalote	25 Mbps	23,1

```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0           0   23105000       2531      46000         16         0
* Gi0/0/0.1300                  -           -            -           -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.2066                  -           -            -           -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0            0           0      44000          9      56000          9         0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0            0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0            0           0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                     0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Tunnel15                      1           0            0           0    6447000        762      49000         11         0
* Tunnel25                      0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Tunnel301                     0           0            0           0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Vlan30                        0           0            0           0       1000          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER121982#sh clo
*20:13:07.190 gmt Fri Oct 24 2025
CER121982#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1724	4	Guaviare, Miraflores; Carrera 4 A # 4-1	20Mbps	21,4

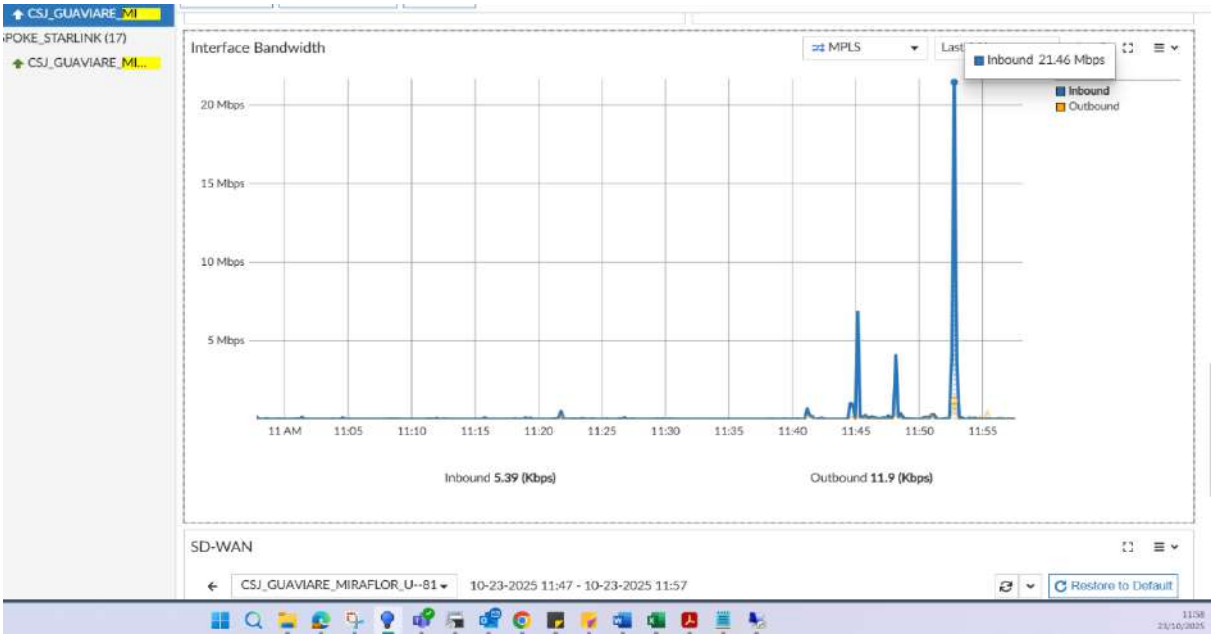

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1728	4	Putumayo, Puerto Leguizamo; Carrera 3A # 6-104	25 Mbps	23,3

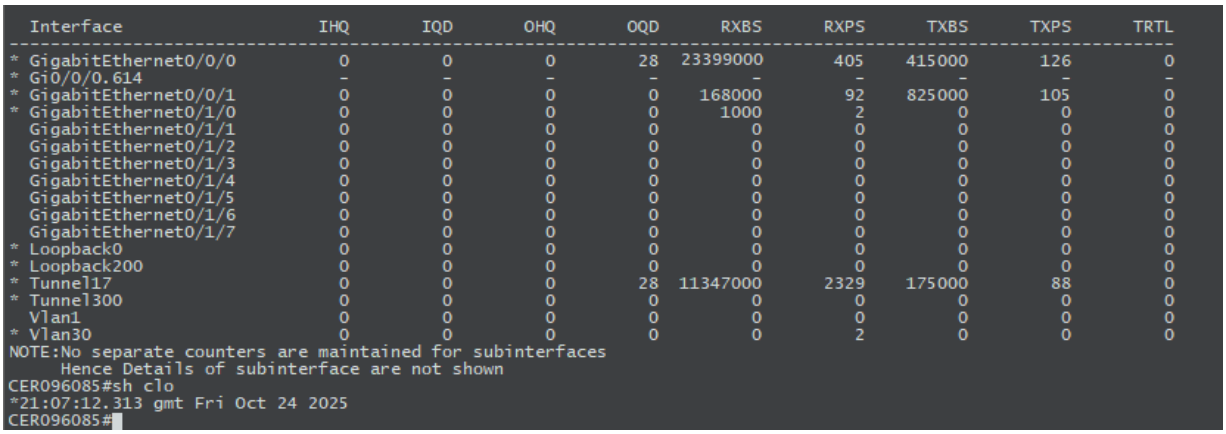


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0         28   23399000        405     415000        126          0
* Gi0/0/0.614                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0     168000         92     825000        105          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                    0          0          0         28   11347000       2329     175000         88          0
* Tunnel300                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                      0          0          0          0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER096085#sh clo
*21:07:12.313 gmt Fri Oct 24 2025
CER096085#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1743	4	Córdoba, Purísima; Carrera 7 # 7A-23, Barrio San Juan	32 Mbps	31

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0      68996   31004000       3386      11000          6          0
* Gi0/0/0.118                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0       4000          4       4000          1          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                   3          0          0      68981    7854000        925       4000          4          0
* Tunnel23                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan3349                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER138357-CER111386#sh clo
20:56:09.443 gmt Fri Oct 24 2025
CER138357-CER111386#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2215	3	Antioquia, Ituango; Carrera Ruiz # 19 - 26	32 Mbps	31

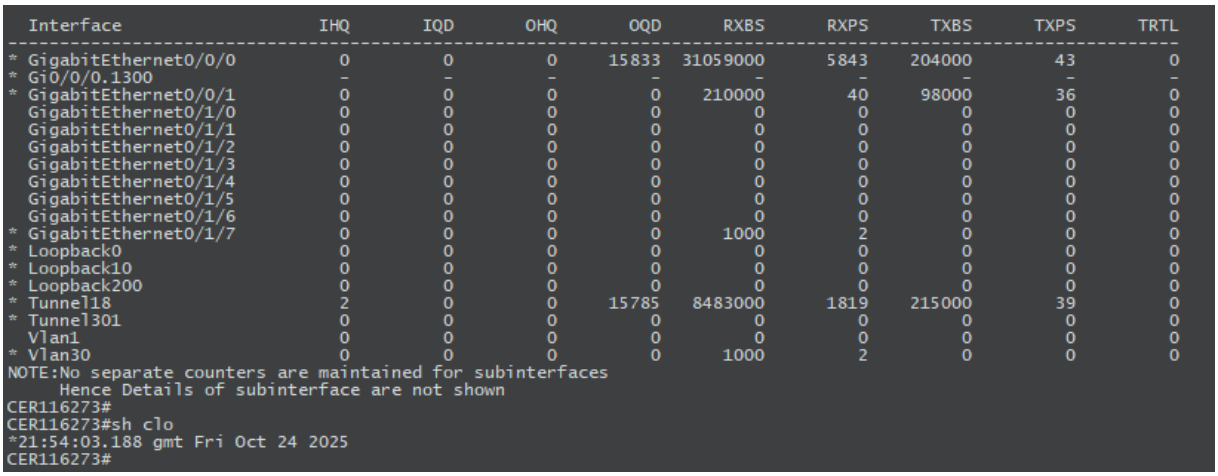


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0      15833   31059000       5843     204000         43          0
* Gi0/0/0.1300                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0     210000         40      98000         36          0
  GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                     2          0          0      15785    8483000       1819     215000         39          0
* Tunnel301                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                       0          0          0          0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER116273#
CER116273#sh clo
*21:54:03.188 gmt Fri Oct 24 2025
CER116273#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1744	4	Meta, Cumaral; Carrera 22 # 12-93	25 Mbps	23,5


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0        3409    23541000        4297      305000         123           0
* Gi0/0/0.622                   -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0        1000           2           0           0           0
* Gi0/0/1.203                   -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0        1000           2           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0        1000           1      117000           3           0
* GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0      372000         118     1235000         174           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel17                      2           0           0        3406     4895000         944      409000         132           0
* Tunnel27                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel210                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                        0           0           0           0      397000         133     1379000         198           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER105383#sh clo
*20:58:42.444 gmt Fri Oct 24 2025
CER105383#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2069	3	CSJ - SARDINATA NORTE DE SANTANDER JUZGADO PROMISCUO CRA 6	25 Mbps	23,5

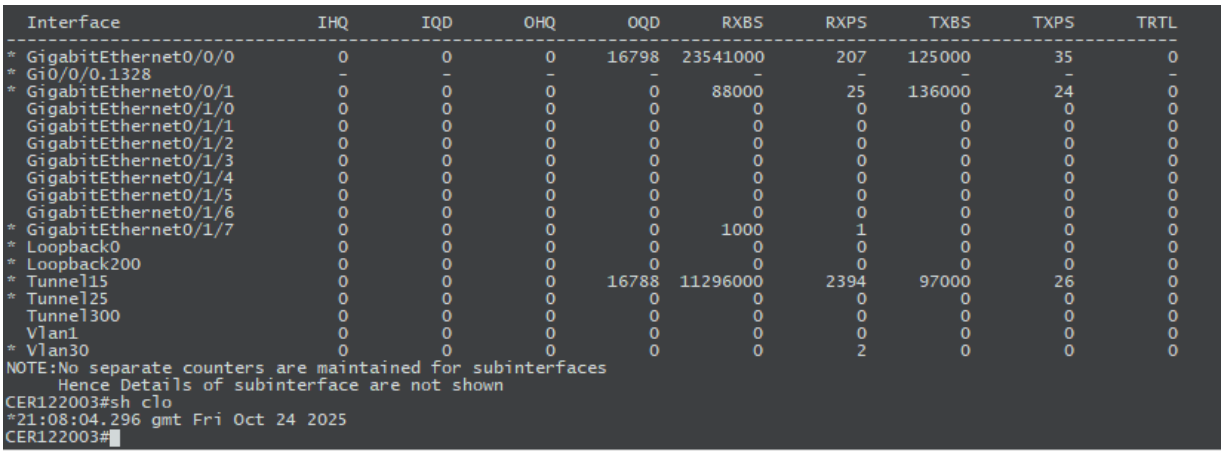


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0       16798   23541000        207     125000         35         0
* Gi0/0/0.1328                  -           -            -           -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0            0           0      88000         25     136000         24         0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0            0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0            0           0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                     0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Tunnel15                      0           0            0       16788   11296000       2394      97000         26         0
* Tunnel25                      0           0            0           0          0          0          0          0         0
  Tunnel300                     0           0            0           0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Vlan30                        0           0            0           0          0          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER122003#sh clo
*21:08:04.296 gmt Fri Oct 24 2025
CER122003#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2229	3	Bolívar, Magangué; Carrera 10a # 15-05	32 Mbps	30,5

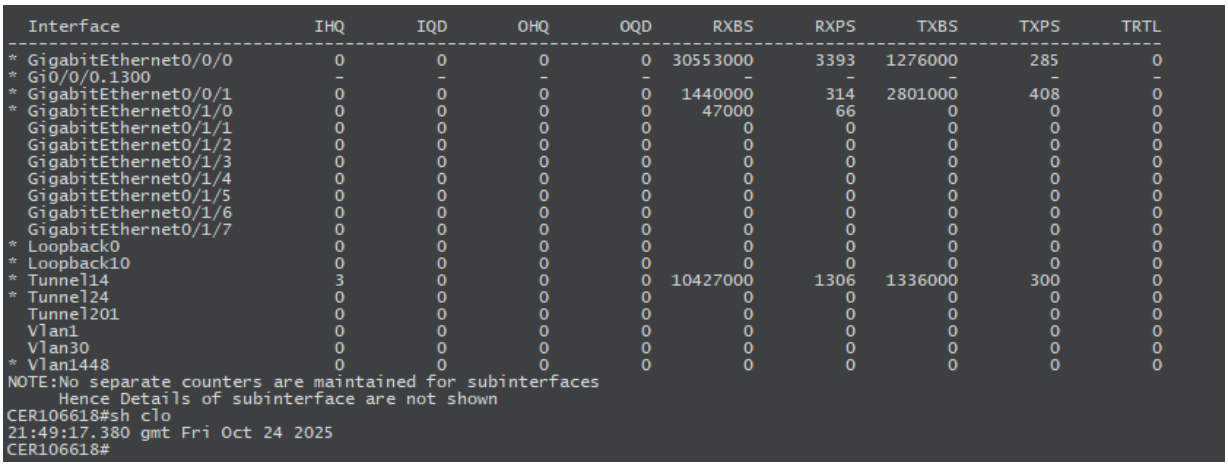


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0    30553000       3393    1276000        285          0
* Gi0/0/0.1300                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0    1440000        314    2801000        408          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0      47000         66          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                    3          0          0          0    10427000       1306    1336000        300          0
* Tunnel24                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel201                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan30                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1448                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER106618#sh clo
21:49:17.380 gmt Fri Oct 24 2025
CER106618#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2227	3	Valle Del Cauca, Cartago; Calle 8 No 8 -24, Bodega de Procesos de los despachos judiciales	25 Mbps	23

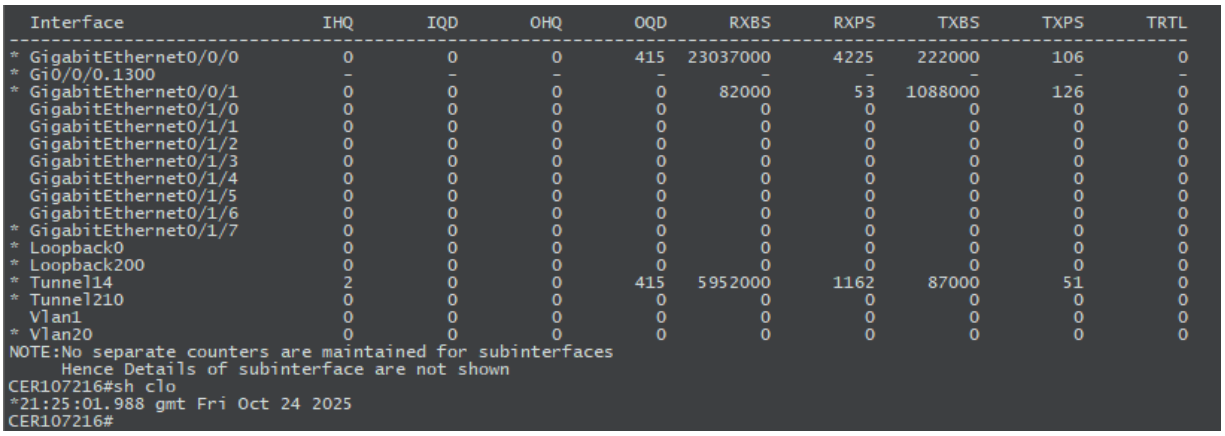


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0         415    23037000        4225      222000         106           0
* Gi0/0/0.1300                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0       82000          53     1088000         126           0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel14                      2           0           0         415     5952000        1162       87000          51           0
* Tunnel210                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan20                        0           0           0           0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER107216#sh clo
*21:25:01.988 gmt Fri Oct 24 2025
CER107216#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2236	1	Antioquia, Bello; Calle 26A # 58D-6 contigua inspección 6ta de Policía	32 Mbps	31,8

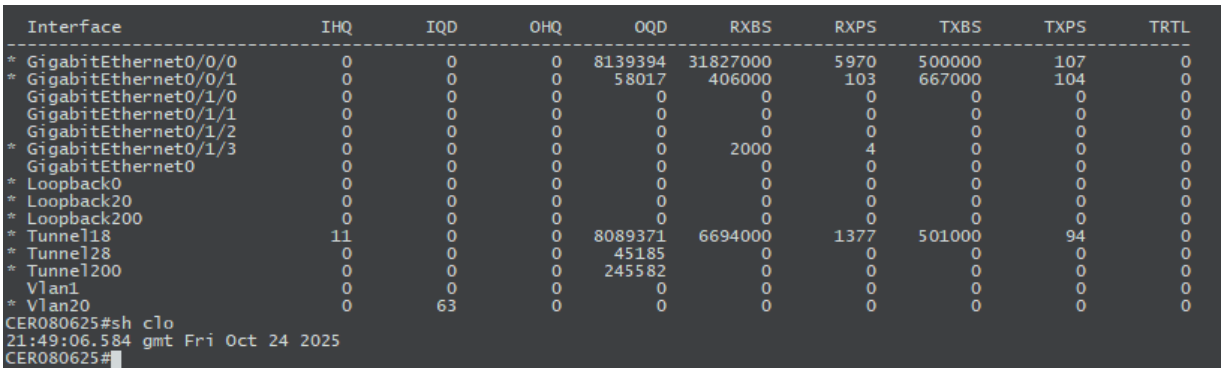


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0            0     8139394     31827000        5970      500000         107           0
* GigabitEthernet0/0/1          0           0            0       58017       406000         103      667000         104           0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0            0           0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0            0           0            0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0            0           0            0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3          0           0            0           0         2000           4           0           0           0
  GigabitEthernet0              0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Loopback0                     0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Loopback20                    0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Loopback200                   0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Tunnel18                     11           0            0     8089371      6694000        1377      501000          94           0
* Tunnel28                      0           0            0       45185            0           0           0           0           0
* Tunnel200                     0           0            0      245582            0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0            0           0            0           0           0           0           0
* Vlan20                        0          63            0           0            0           0           0           0           0
CERO80625#sh clo
21:49:06.584 gmt Fri Oct 24 2025
CERO80625#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2238	4	Cundinamarca, Pasca; CALLE 2 # 2-40 BARRIO ORIENTAL	32 Mbps	30,1

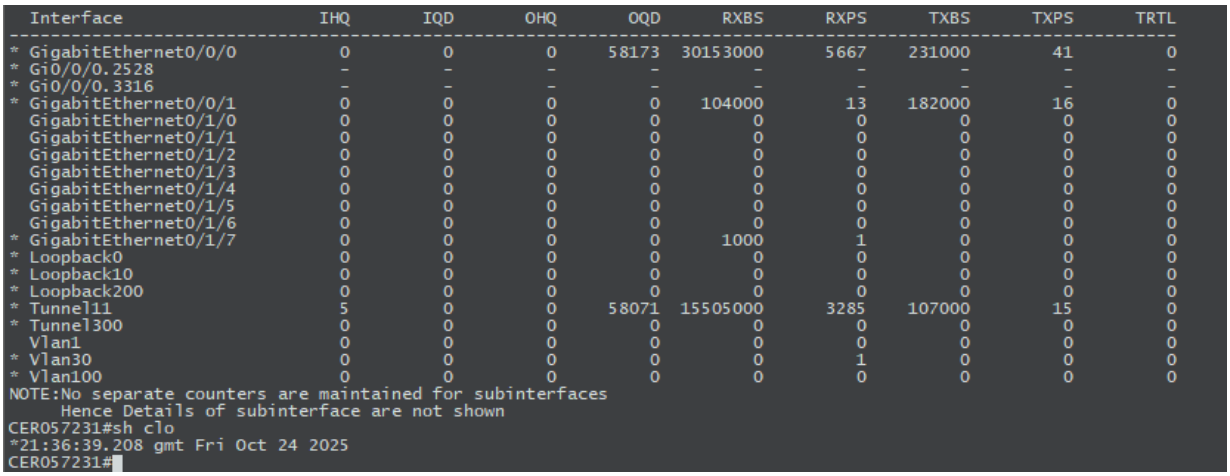


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0       58173   30153000       5667     231000         41         0
* Gi0/0/0.2528                  -           -           -           -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.3316                  -           -           -           -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0     104000         13     182000         16         0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                     0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Tunnel11                      5           0           0       58071   15505000       3285     107000         15         0
* Tunnel300                     0           0           0           0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Vlan30                        0           0           0           0          0          1          0          0         0
* Vlan100                       0           0           0           0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO57231#sh clo
*21:36:39.208 gmt Fri Oct 24 2025
CERO57231#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2210	3	Santander, Cimitarra; Calle 10 # 4-8 Barrio La Fontana	40 Mbps	39,4

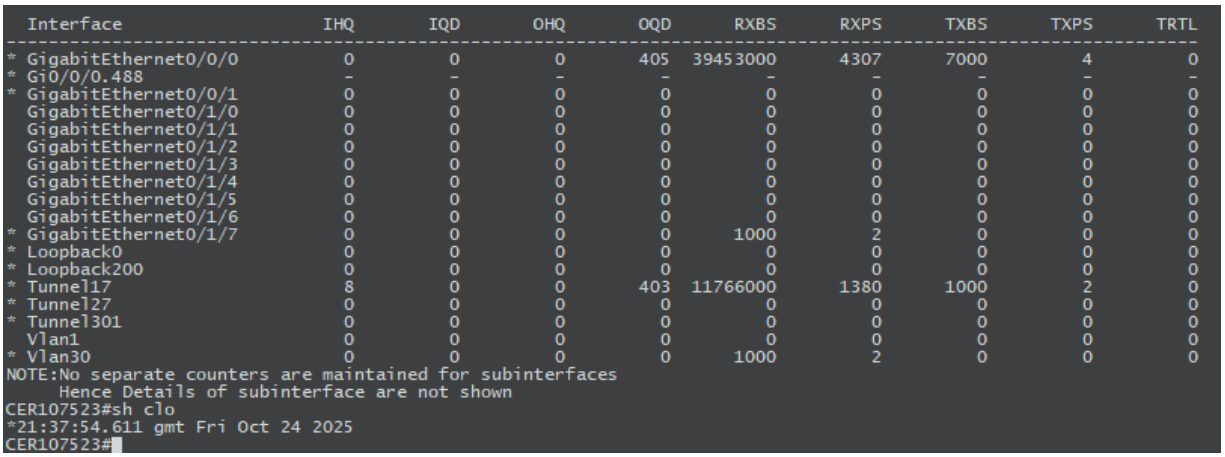


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0            0           405   39453000       4307       7000          4         0
* Gi0/0/0.488                 -           -            -           -           -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0           0            0           0           0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/0        0           0            0           0           0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0            0           0           0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0            0           0           0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0            0           0           0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0            0           0           0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0            0           0           0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0            0           0           0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0            0           0        1000          2          0          0         0
* Loopback0                   0           0            0           0           0          0          0          0         0
* Loopback200                 0           0            0           0           0          0          0          0         0
* Tunnel17                    8           0            0         403    11766000       1380       1000          2         0
* Tunnel27                    0           0            0           0           0          0          0          0         0
* Tunnel301                   0           0            0           0           0          0          0          0         0
  Vlan1                       0           0            0           0           0          0          0          0         0
* Vlan30                      0           0            0           0        1000          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER107523#sh clo
*21:37:54.611 gmt Fri Oct 24 2025
CER107523#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3038	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 14 B # 0 sur 56, Bodega imprenta	32 Mbps	31,2

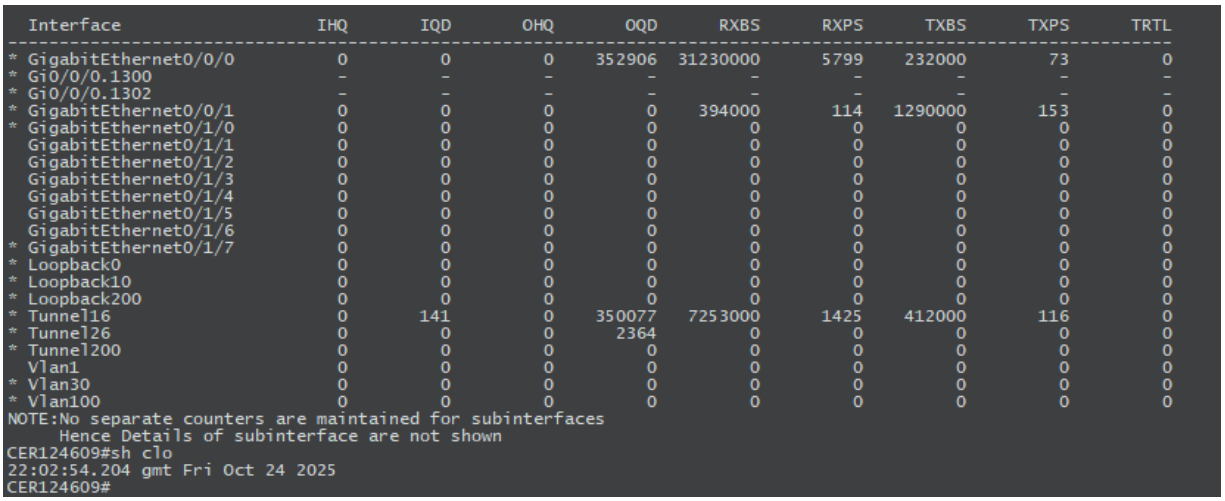


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0     352906   31230000       5799     232000         73         0
* Gi0/0/0.1300                -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.1302                -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0     394000        114    1290000        153         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                    0        141          0     350077    7253000       1425     412000        116         0
* Tunnel26                    0          0          0       2364          0          0          0          0         0
* Tunnel200                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan30                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan100                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER124609#sh clo
22:02:54.204 gmt Fri Oct 24 2025
CER124609#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3034	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 14 B # 0 sur 56, Bodega imprenta	32 Mbps	30,9

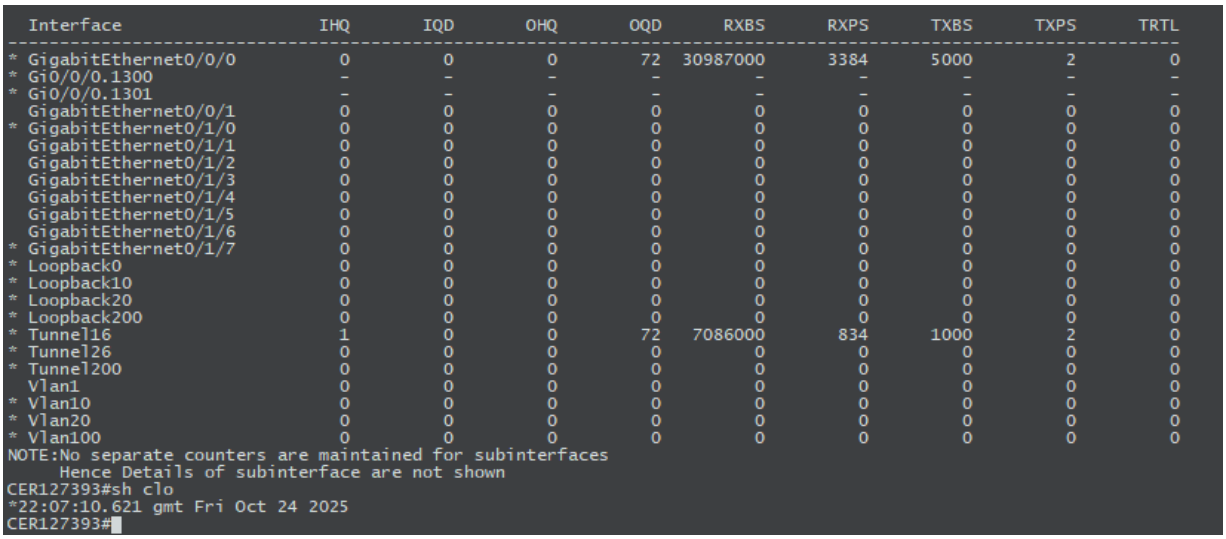


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0         72   30987000       3384       5000          2          0
* Gi0/0/0.1300                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1301                -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                    1          0          0         72    7086000        834       1000          2          0
* Tunnel26                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan10                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER127393#sh clo
*22:07:10.621 gmt Fri Oct 24 2025
CER127393#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3279	1	Cundinamarca, Bogotá; Av. primero de Mayo (Calle 26 sur) #52 A 94	32 Mbps	30,9

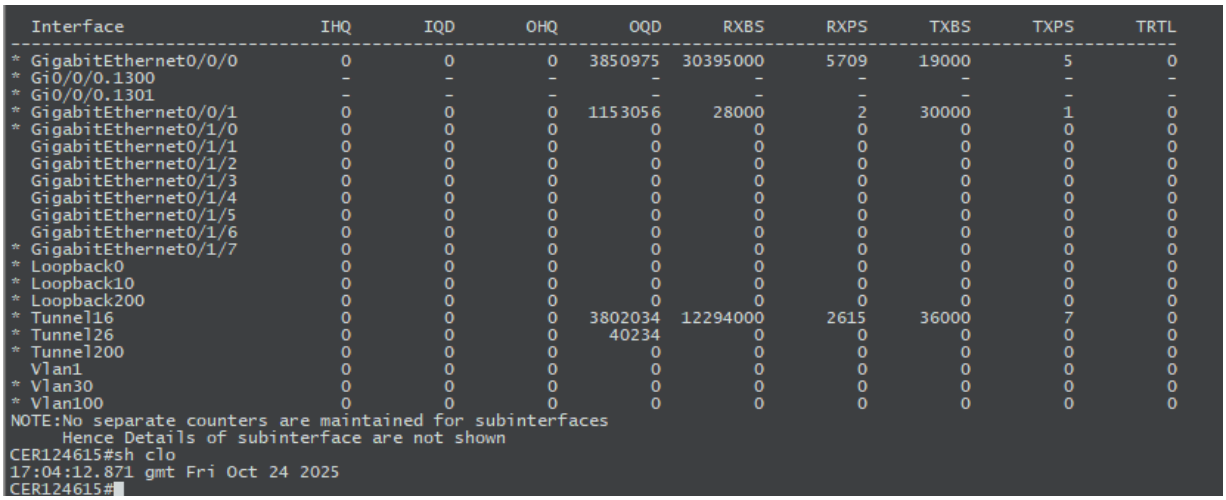


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0    3850975   30395000       5709      19000          5         0
* Gi0/0/0.1300                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.1301                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0    1153056      28000          2      30000          1         0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                      0          0          0    3802034   12294000       2615      36000          7         0
* Tunnel26                      0          0          0      40234          0          0          0          0         0
* Tunnel200                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER124615#sh clo
17:04:12.871 gmt Fri Oct 24 2025
CER124615#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3456	1	Valle Del Cauca, Jamundí; Carrera 12 # 11-21	48 Mbps	45,4

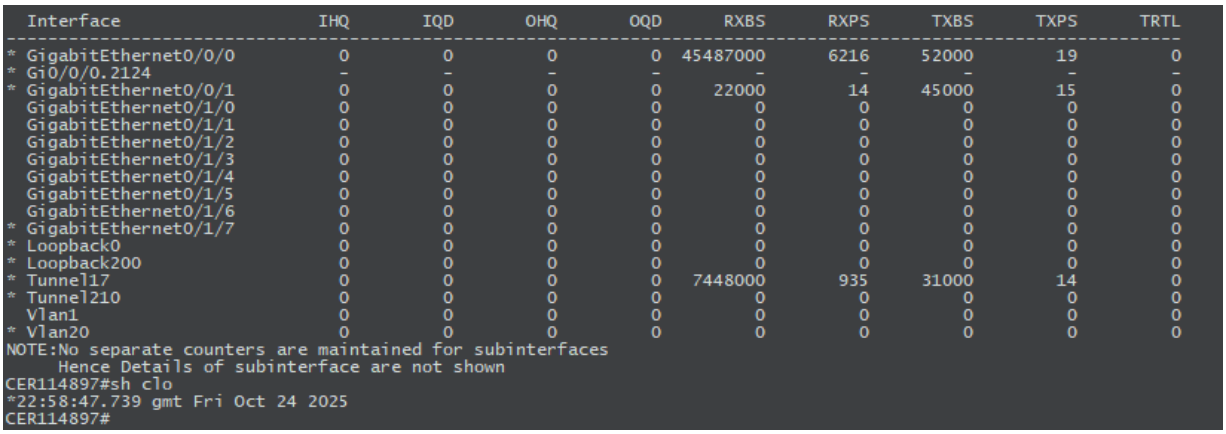


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0           0   45487000       6216      52000         19          0
* Gi0/0/0.2124                  -           -           -           -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0      22000         14      45000         15          0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                      0           0           0           0    7448000        935      31000         14          0
* Tunnel210                     0           0           0           0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Vlan20                        0           0           0           0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER114897#sh clo
*22:58:47.739 gmt Fri Oct 24 2025
CER114897#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3462	3	Antioquia, Caucasia; Carrera 13 # 20B-02	32 Mbps	31,4

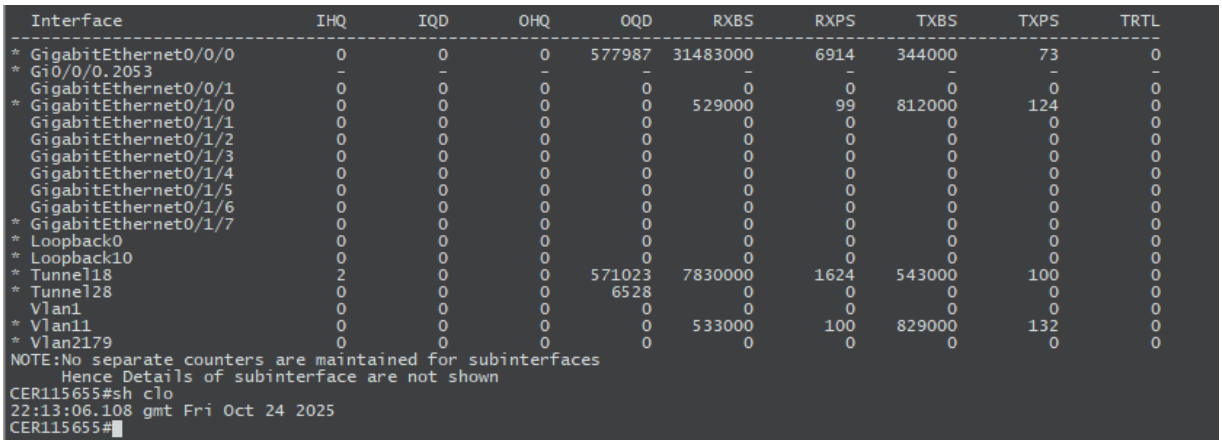


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0        577987   31483000       6914     344000         73         0
* Gi0/0/0.2053                -          -          -             -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0             0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0             0     529000         99     812000        124         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0             0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0             0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0             0          0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0             0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0          0             0          0          0          0          0         0
* Tunnel18                    2          0          0        571023    7830000       1624     543000        100         0
* Tunnel28                    0          0          0          6528          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0             0          0          0          0          0         0
* Vlan11                      0          0          0             0     533000        100     829000        132         0
* Vlan2179                    0          0          0             0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER115655#sh clo
22:13:06.108 gmt Fri Oct 24 2025
CER115655#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3465	3	La Guajira, Riohacha; Cra 12 No 10-33 esquina	32 Mbps	30,4

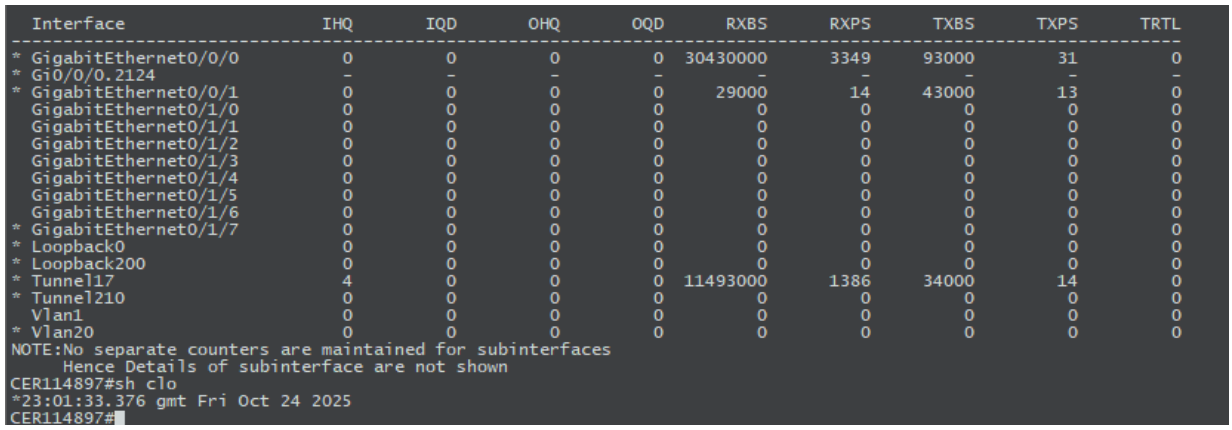

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   30430000       3349      93000         31          0
* Gi0/0/0.2124                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      29000         14      43000         13          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                      4          0          0          0   11493000       1386      34000         14          0
* Tunnel210                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER114897#sh clo
*23:01:33.376 gmt Fri Oct 24 2025
CER114897#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3475	3	Caquetá, San Vicente del Caguan; Calle 2 Bis No. 2-20 Barrio Hernández	25 Mbps	23,8

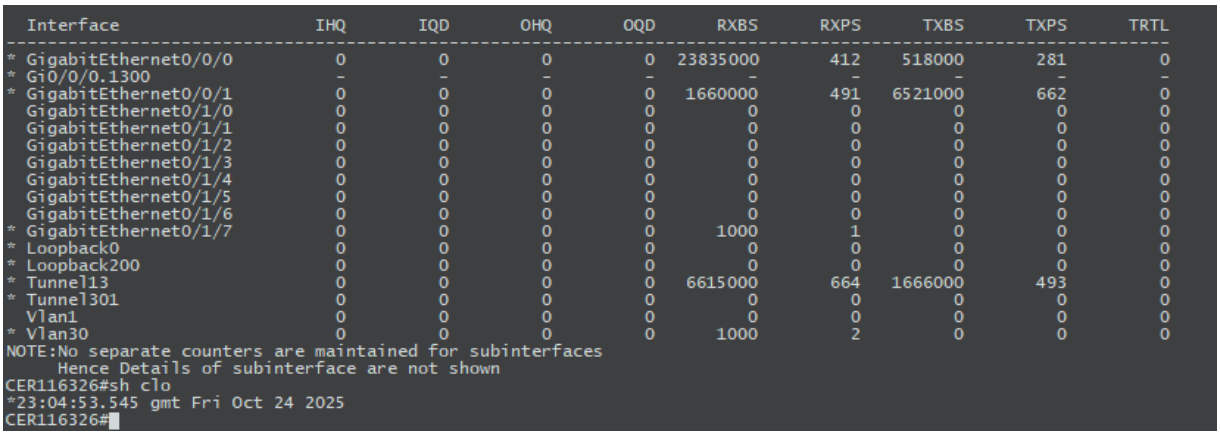


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   23835000        412     518000        281          0
* Gi0/0/0.1300                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0    1660000        491    6521000        662          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                      0          0          0          0    6615000        664    1666000        493          0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER116326#sh clo
*23:04:53.545 gmt Fri Oct 24 2025
CER116326#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3489	1	Antioquia, Itagüí; Carrera 52 N 52 – 63, Barrio Villa Paula, Centro comercial Itagüí Plaza, Local 404	32 Mbps	31,1


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0      72214   31147000       3401       9000          4          0
* Gi0/0/0.1300                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0       3000          2          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                     1          0          0      72061   18040000       2119       4000          3          0
* Tunnel200                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER129284#sh clo
23:26:00.811 gmt Fri Oct 24 2025
CER129284#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3493	3	Cundinamarca, Guaduas; Carrera 2B # 6A – 46 Barrio La Alborada	32 Mbps	30,6

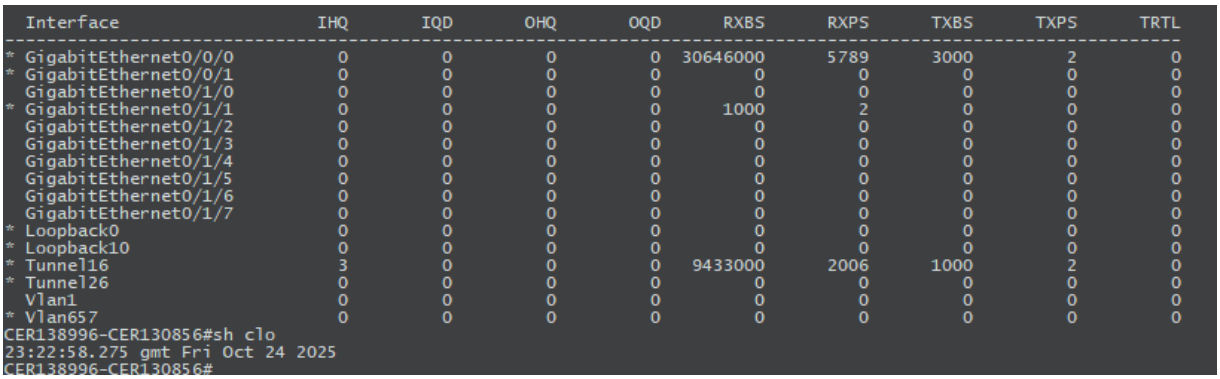


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0    30646000        5789        3000           2           0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0        1000           2           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback10                 0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel16                   3          0          0          0     9433000        2006        1000           2           0
* Tunnel26                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan657                    0          0          0          0           0           0           0           0           0
CER138996-CER130856#sh clo
23:22:58.275 gmt Fri Oct 24 2025
CER138996-CER130856#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3496	1	Cundinamarca, Sibaté; Carrera 7 # 8-66 barrio Centro - Pasaje Comercial Aluha	32 Mbps	31,9

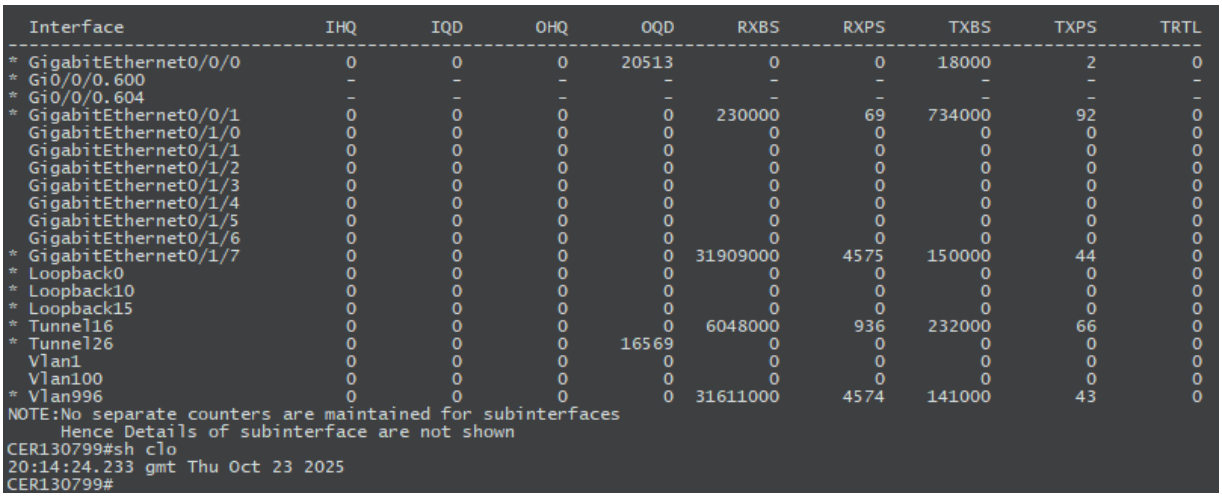


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0      20513          0          0      18000          2         0
* Gi0/0/0.600                 -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.604                 -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0     230000         69     734000         92         0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0   31909000       4575     150000         44         0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback15                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                    0          0          0          0    6048000        936     232000         66         0
* Tunnel26                    0          0          0      16569          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan100                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan996                     0          0          0          0   31611000       4574     141000         43         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER130799#sh clo
20:14:24.233 gmt Thu Oct 23 2025
CER130799#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3495	3	Cundinamarca, Guaduas; Carrera 3 # 5-17	32 Mbps	30,1

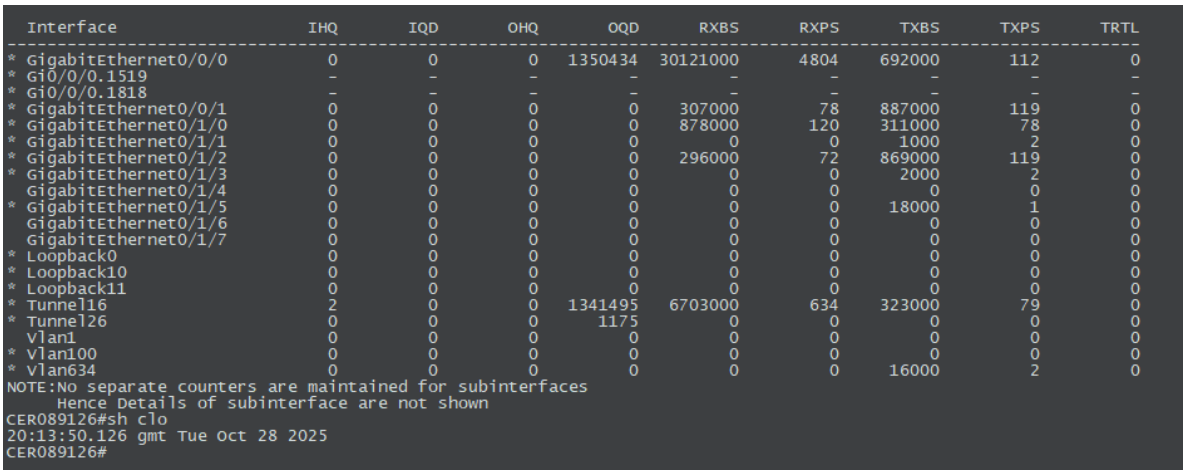


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          1350434   30121000   4804       692000     112        0
* Gi0/0/0.1519                -          -          -          -         -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1818                -          -          -          -         -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         307000     78         887000     119        0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         878000     120        311000     78         0
* GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         0          0          1000       2          0
* GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         296000     72         869000     119        0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         0          0          2000       2          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         0          0          18000      1          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback11                  0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Tunnel16                    2          0          0          1341495   6703000    634        323000     79         0
* Tunnel26                    0          0          0          1175      0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Vlan100                     0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Vlan634                     0          0          0          0         0          0          16000      2          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO89126#sh clo
20:13:50.126 gmt Tue Oct 28 2025
CERO89126#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3507	1	Cundinamarca, Madrid; Carrera 5 # 5 - 21 piso 2	32 Mbps	31

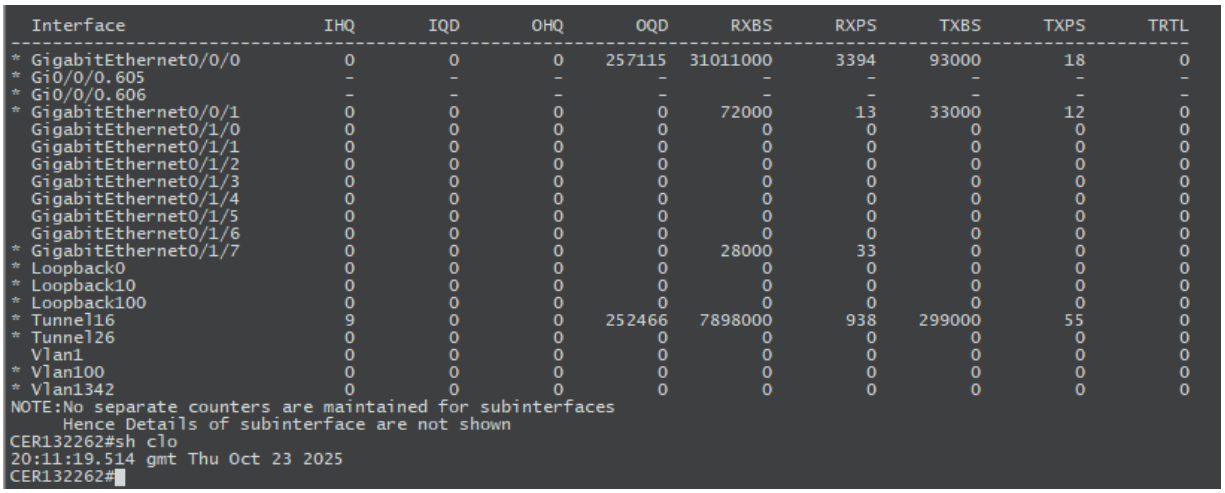


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0          0          0          257115    31011000   3394       93000      18         0
* Gi0/0/0.605              -          -          -          -         -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.606              -          -          -          -         -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1     0          0          0          0         72000      13         33000      12         0
  GigabitEthernet0/1/0     0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1     0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2     0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3     0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4     0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5     0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6     0          0          0          0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7     0          0          0          0         28000      33         0          0          0
* Loopback0                0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback10               0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback100              0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Tunnel16                 9          0          0          252466    7898000    938        299000     55         0
* Tunnel26                 0          0          0          0         0          0          0          0          0
  Vlan1                    0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Vlan100                  0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Vlan1342                 0          0          0          0         0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER132262#sh clo
20:11:19.514 gmt Thu Oct 23 2025
CER132262#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3511	3	Meta, Granada; Carrera 15 # 24-16 barrio Las Delicias	32 Mbps	30,2

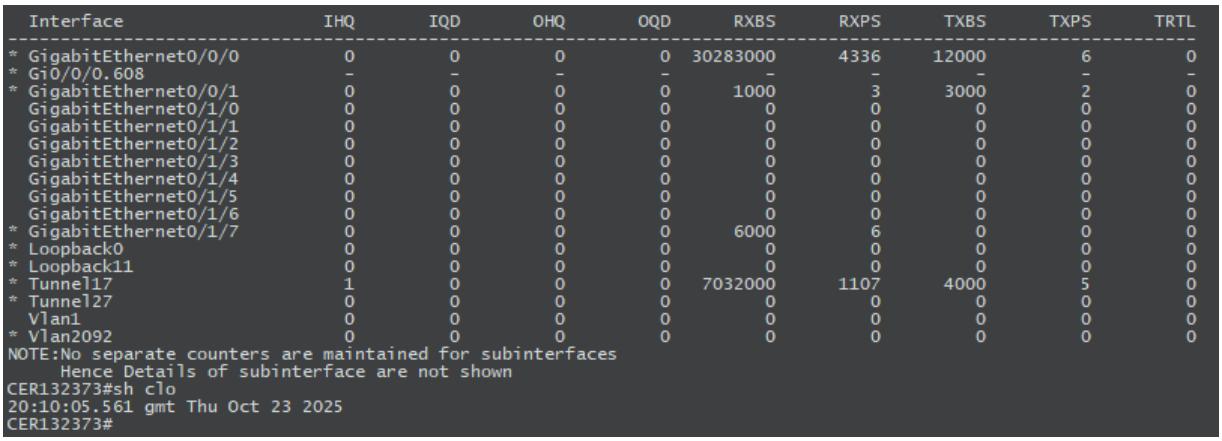


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   30283000       4336      12000          6          0
* Gi0/0/0.608                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0       1000          3       3000          2          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       6000          6          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback11                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                      1          0          0          0    7032000       1107       4000          5          0
* Tunnel27                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan2092                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER132373#sh clo
20:10:05.561 gmt Thu Oct 23 2025
CER132373#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1212	3	Cundinamarca, Une; Calle 6 # 4-44	40 Mbps	38

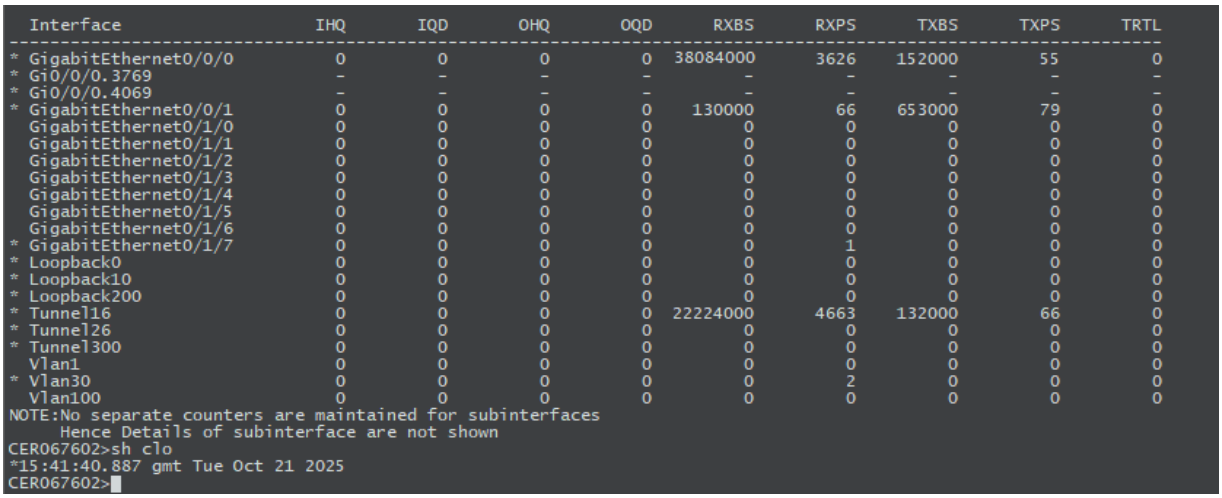


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   38084000       3626     152000         55          0
* Gi0/0/0.3769                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4069                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     130000         66     653000         79          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      0          0          0          0   22224000       4663     132000         66          0
* Tunnel26                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          2          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067602>sh clo
*15:41:40.887 gmt Tue Oct 21 2025
CER067602>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5037	1	Meta, Villavicencio; Carrera 36 No. 33 B - 55	64 Mbps	63,6

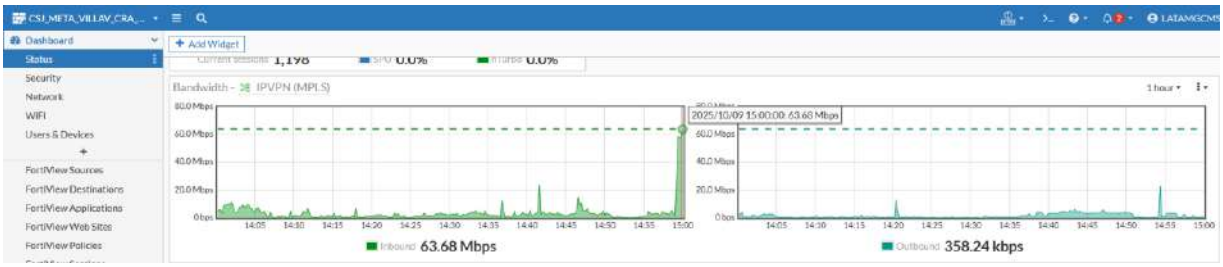


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1537	1	Cesar, Valledupar; Carrera 15 # 13C -35 Barrio Alfonso López	32 Mbps	31,5

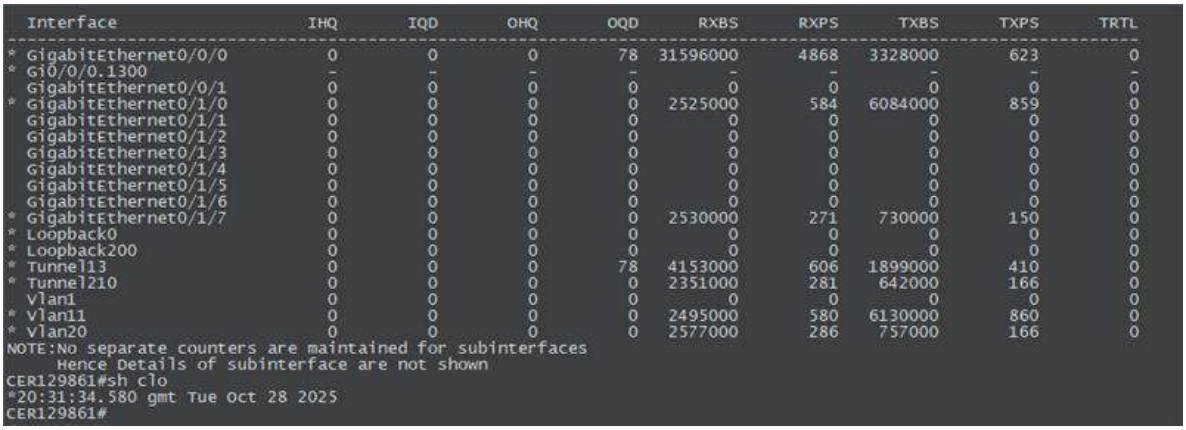


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          78    31596000       4868    3328000        623          0
* GI0/0/0.1300                -          -          -          -           -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0           0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0     2525000        584    6084000        859          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0           0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0           0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0           0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0           0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0           0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0           0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0     2530000        271     730000        150          0
* Loopback0                   0          0          0          0           0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0           0          0          0          0          0
* Tunnel13                    0          0          0          78    4153000        606    1899000        410          0
* Tunnel210                   0          0          0          0     2351000        281     642000        166          0
  Vlan1                       0          0          0          0           0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0     2495000        580    6130000        860          0
* Vlan20                      0          0          0          0     2577000        286     757000        166          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER129861#sh clo
*20:31:34.580 gmt Tue Oct 28 2025
CER129861#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3494	1	La Guajira, Riohacha; Carrera 10 No 14-77	32 Mbps	30,4

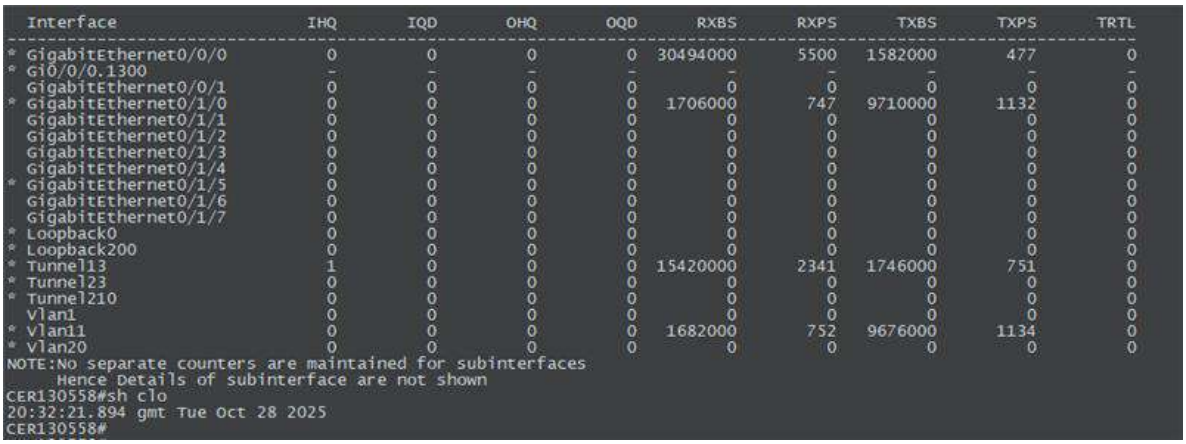


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           0         30494000   5500       1582000    477        0
* GI0/0/0.1300                -           -           -           -         -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0         1706000    747        9710000    1132       0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0           0           0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/5        0           0           0           0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0           0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7        0           0           0           0         0          0          0          0          0
* Loopback0                   0           0           0           0         0          0          0          0          0
* Loopback200                 0           0           0           0         0          0          0          0          0
* Tunnel13                    1           0           0           0         15420000   2341       1746000    751        0
* Tunnel23                    0           0           0           0         0          0          0          0          0
* Tunnel210                   0           0           0           0         0          0          0          0          0
  Vlan1                       0           0           0           0         0          0          0          0          0
* Vlan11                      0           0           0           0         1682000    752        9676000    1134       0
* Vlan20                      0           0           0           0         0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER130558#sh clo
20:32:21.894 gmt Tue Oct 28 2025
CER130558#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3466	3	La Guajira, Maicao; calle 15 N 10 05 esquina oficinas	32 Mbps	60,5

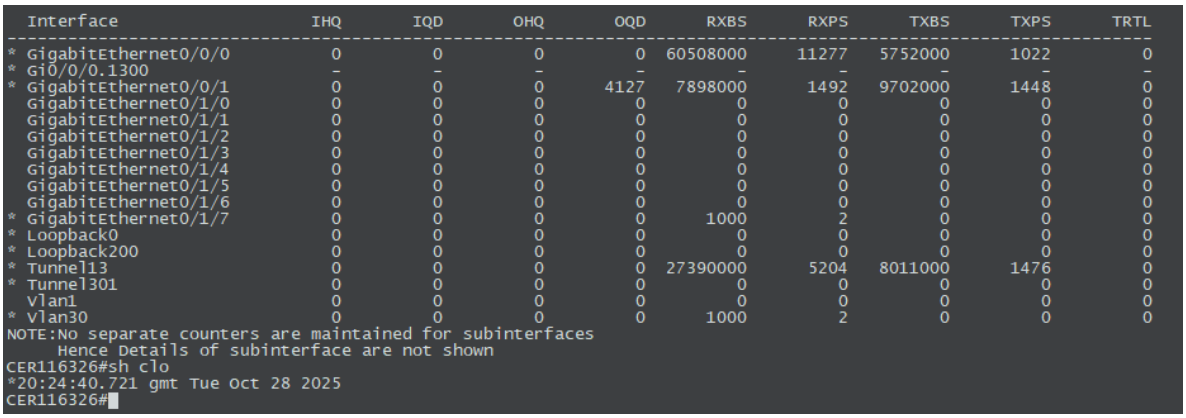


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           0      60508000      11277    5752000       1022         0
* GiO/0/0.1300                -           -           -           -             -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0           0           0        4127       7898000       1492    9702000       1448         0
  GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0           0           0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0           0           0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0           0             0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0           0           0          1000          2          0          0         0
* Loopback0                   0           0           0           0             0          0          0          0         0
* Loopback200                 0           0           0           0             0          0          0          0         0
* Tunnel13                    0           0           0           0      27390000       5204    8011000       1476         0
* Tunnel301                   0           0           0           0             0          0          0          0         0
  Vlan1                       0           0           0           0             0          0          0          0         0
* Vlan30                      0           0           0           0          1000          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER116326#sh clo
*20:24:40.721 gmt Tue Oct 28 2025
CER116326#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2051	3	Nariño, San Andrés de Tumaco; Calle Mosquera con Calle Caldas Esquina	40 Mbps	39,3

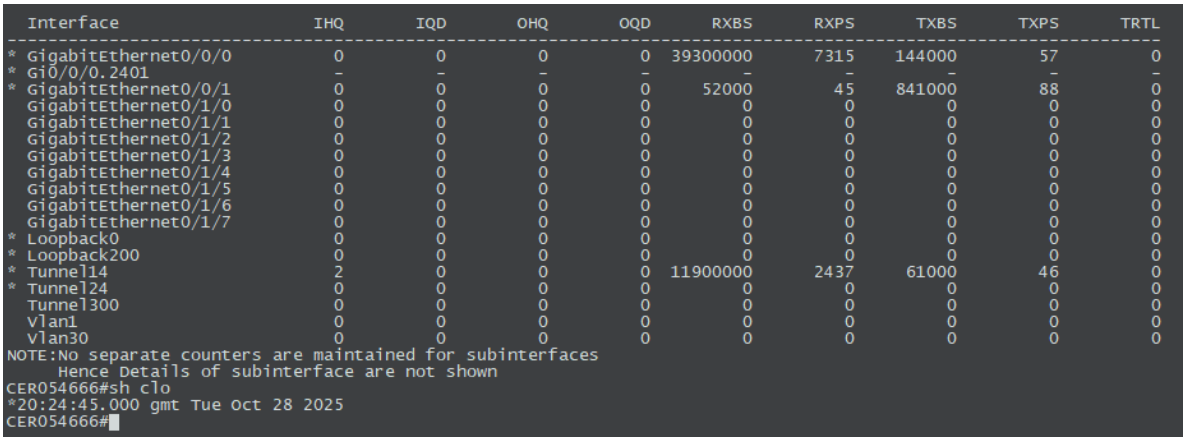


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0  39300000      7315    144000        57         0
* Gi0/0/0.2401                  -          -          -          -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     52000        45    841000        88         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0          0          0          0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0          0          0          0         0         0         0         0         0
* Tunnel14                      2          0          0          0  11900000      2437     61000        46         0
* Tunnel24                      0          0          0          0         0         0         0         0         0
  Tunnel300                     0          0          0          0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0          0          0          0         0         0         0         0         0
  Vlan30                        0          0          0          0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054666#sh clo
*20:24:45.000 gmt Tue Oct 28 2025
CER054666#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1794	3	Arauca, Arauca; Calle 21 # 21-07 Palacio de Justicia	112 Mbps	112,32

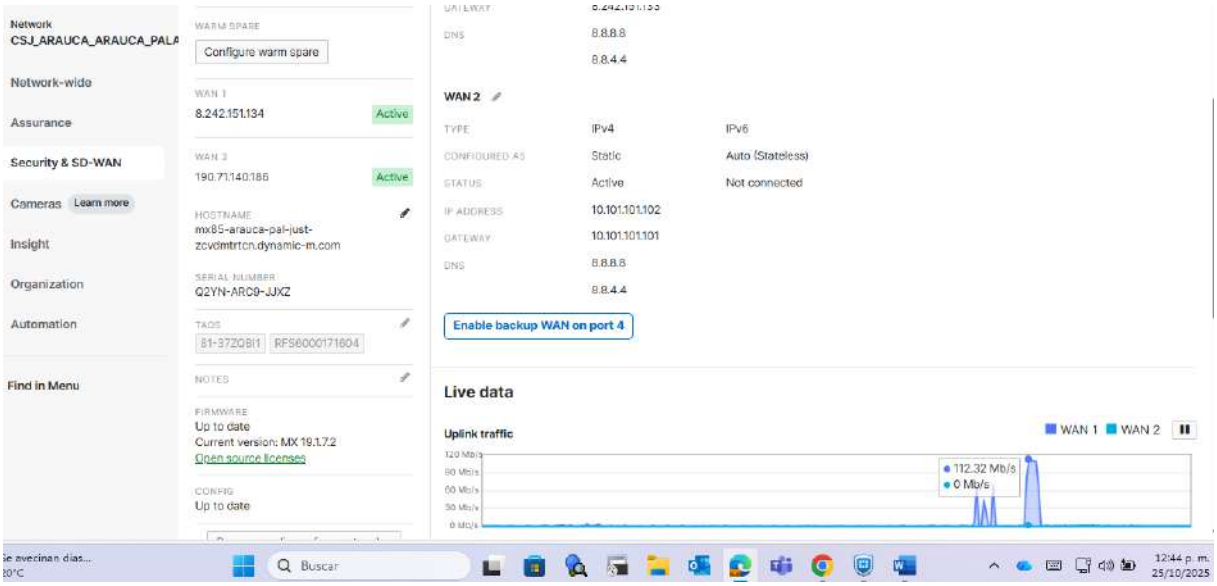


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1806	1	Boyacá, Tunja; Carrera 9 # 20-62 Palacio de Justicia	300 Mbps	296,31

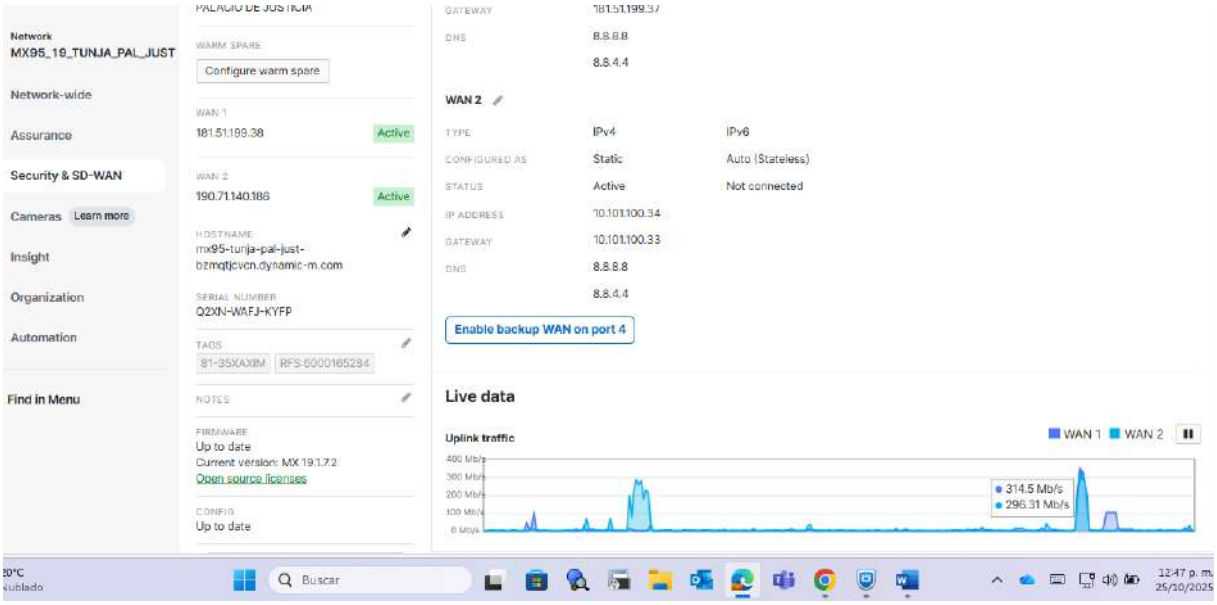


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1814	1	Córdoba, Montería; Calle 27 # 2-06, Palacio Justicia	96 Mbps	96,71

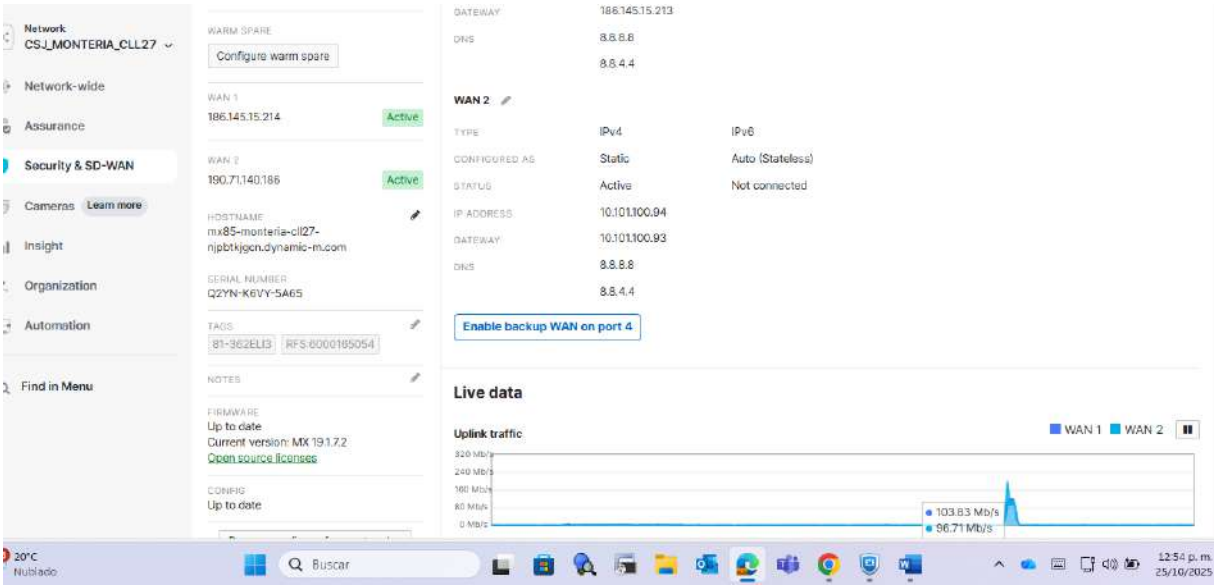


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1824	1	Valle Del Cauca, Buga; Calle 7 # 14-32, Palacio J	225 Mbps	225,05

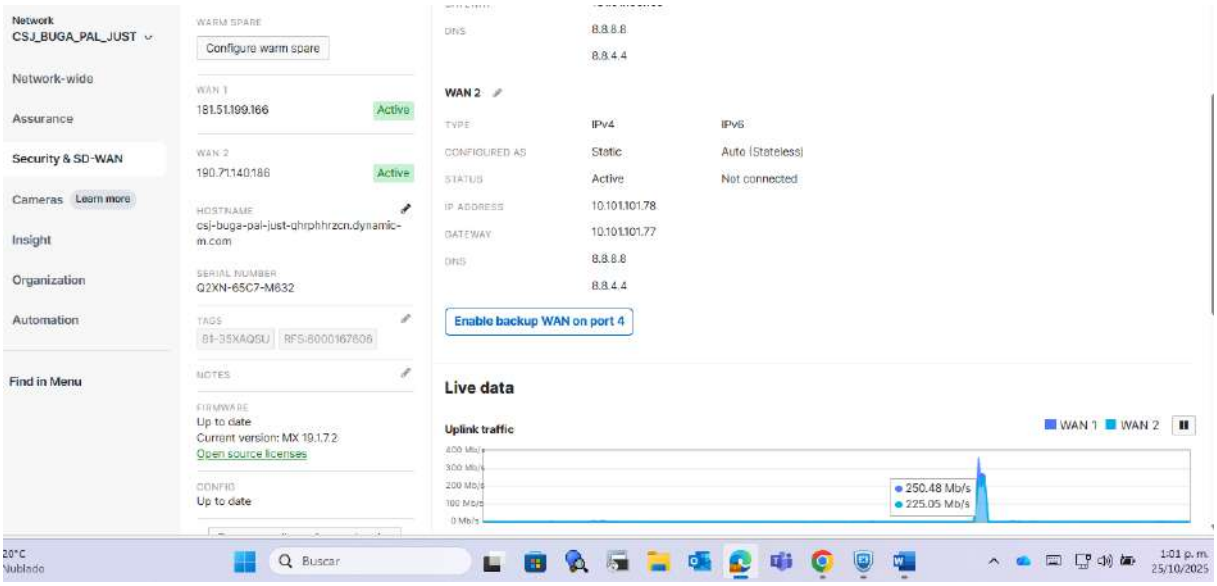


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1829	1	Santander, Bucaramanga; Carrera 12 # 31-08	64 Mbps	66,22

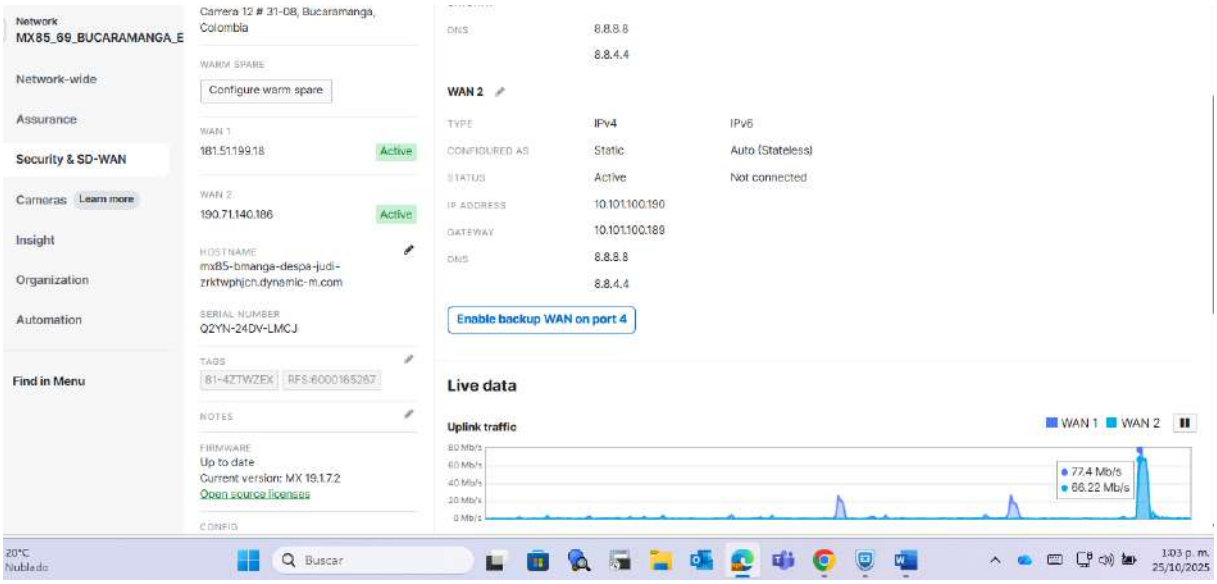


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1833	3	Arauca, Arauca; Calle 21 # 21-07 Palacio de Justicia	112 Mbps	107,52

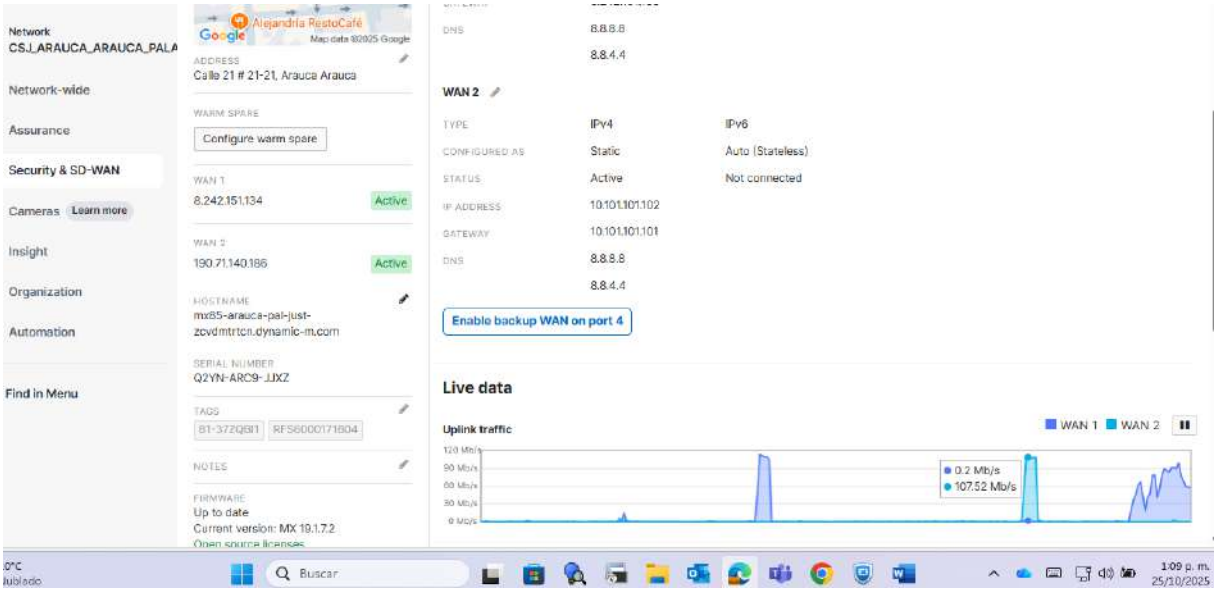


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1935	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 8 # 12A-19, Anexa	300 Mbps	296,19

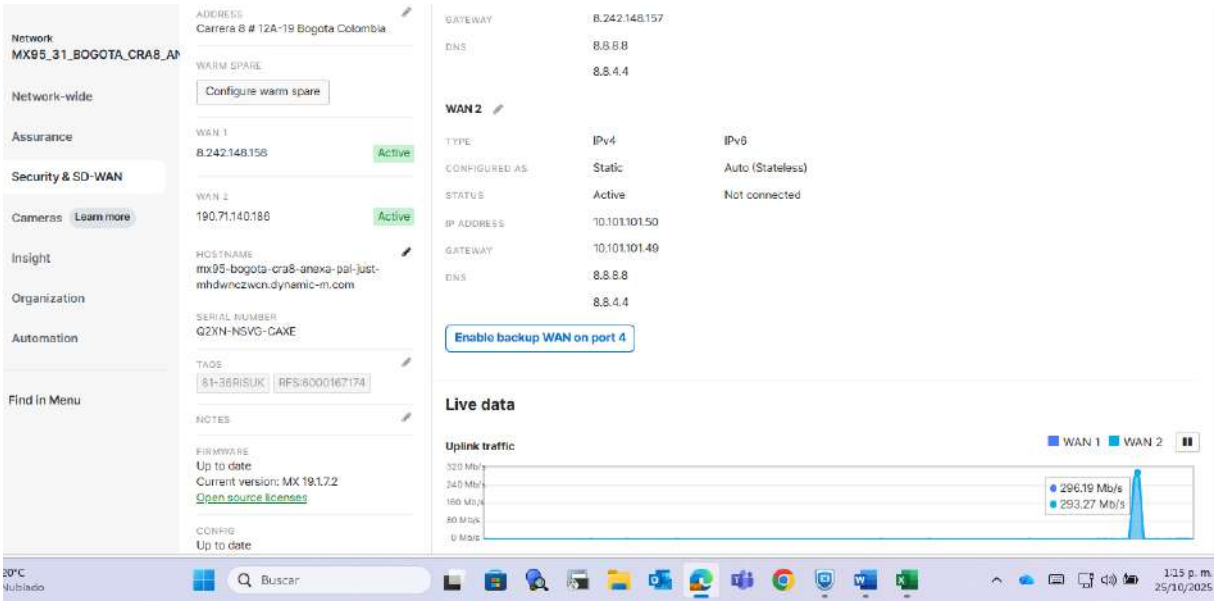


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1940	1	Valle Del Cauca, Palmira; Calle 23 # 29 - 09	192 Mbps	241,51

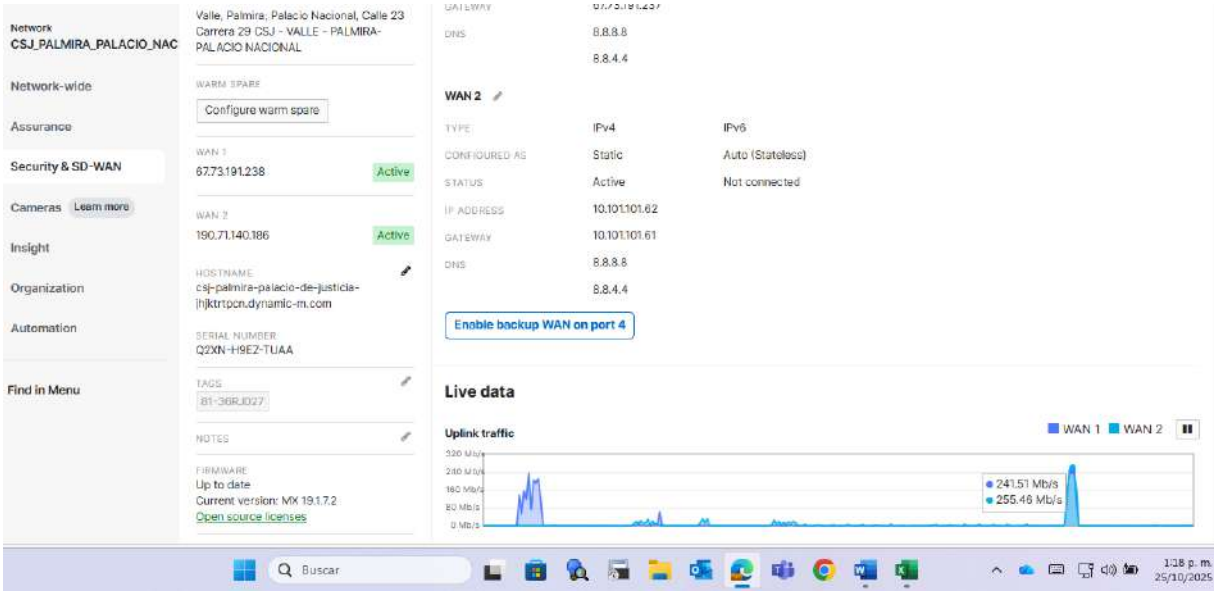


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1941	1	Antioquia, Bello; Calle 47 # 48-51	64 Mbps	67,48

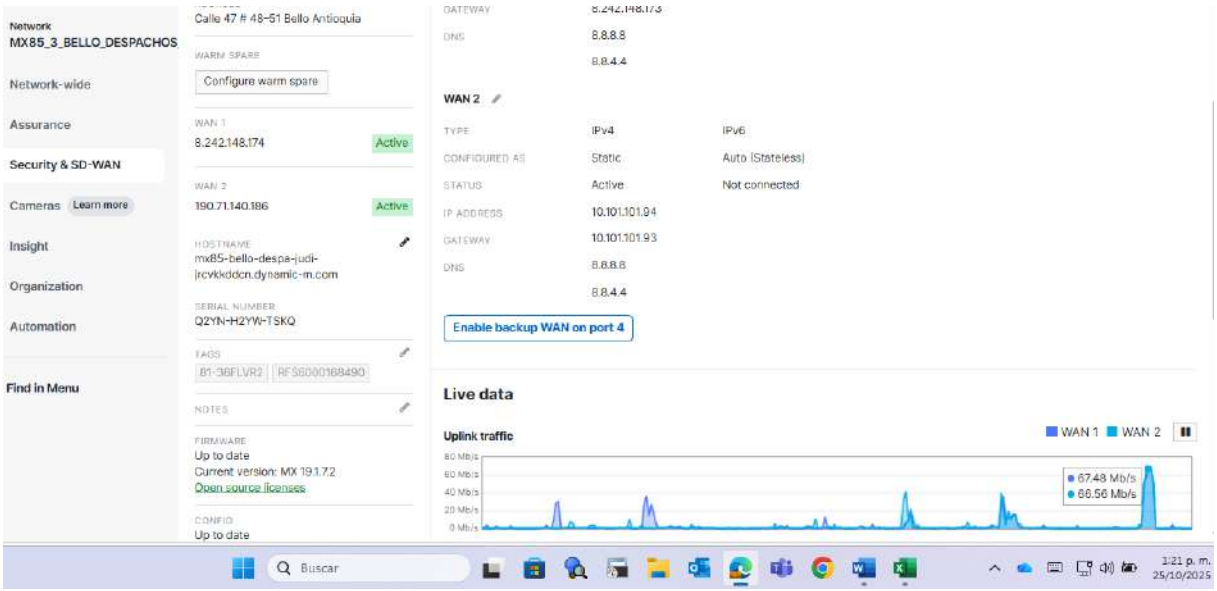


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1942	1	Antioquia, Envigado; Carrera 43 # 38- 42 Sur, PJ	100 Mbps	102,41

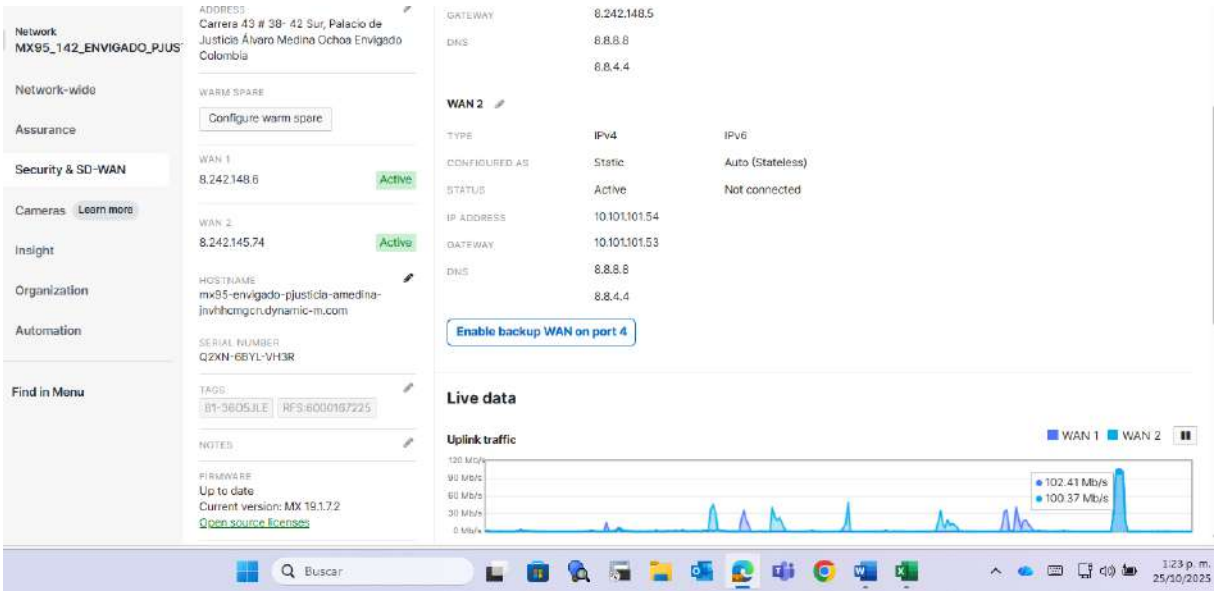


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1947	1	Córdoba, Montería; Calle 30 Carrera 3 esquina	64 Mbps	67,78

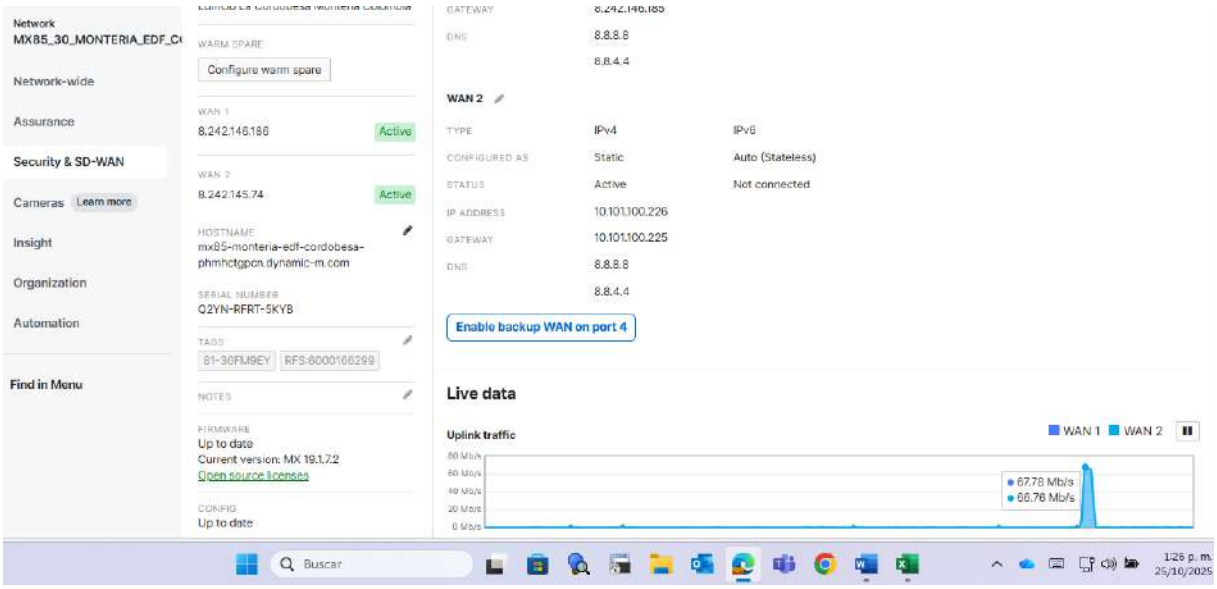


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1952	1	Risaralda, Pereira; Calle 39 # 5-37	128 Mbps	128,69

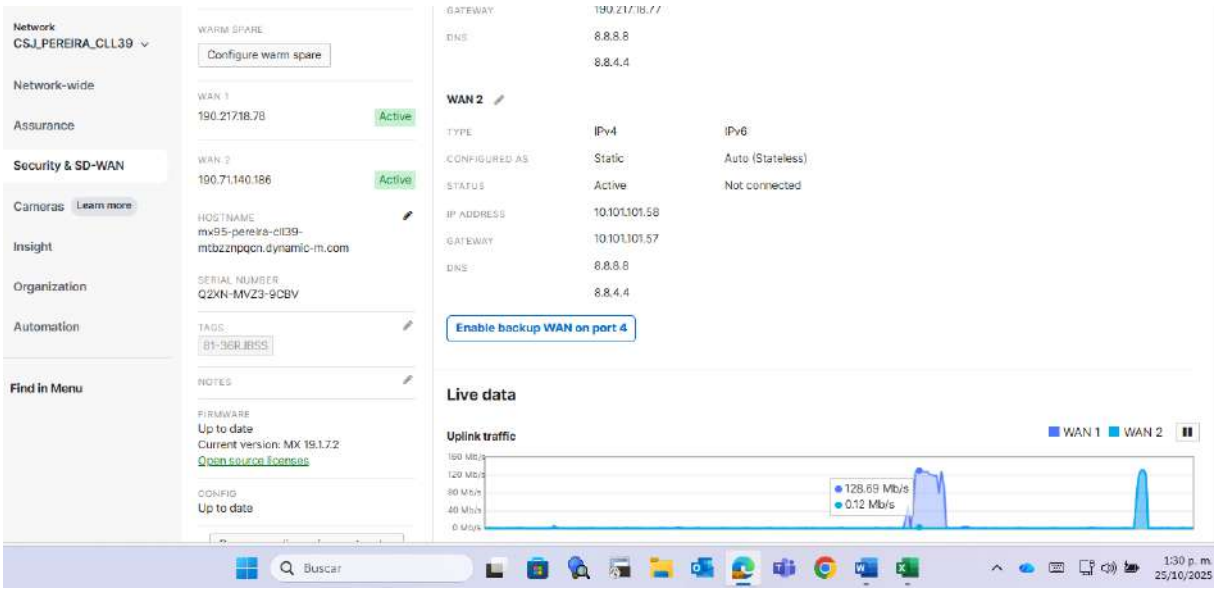


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1954	1	Tolima, Ibagué; Calle 69 # 19 - 109 Avenida Ambalá	64 Mbps	67,27

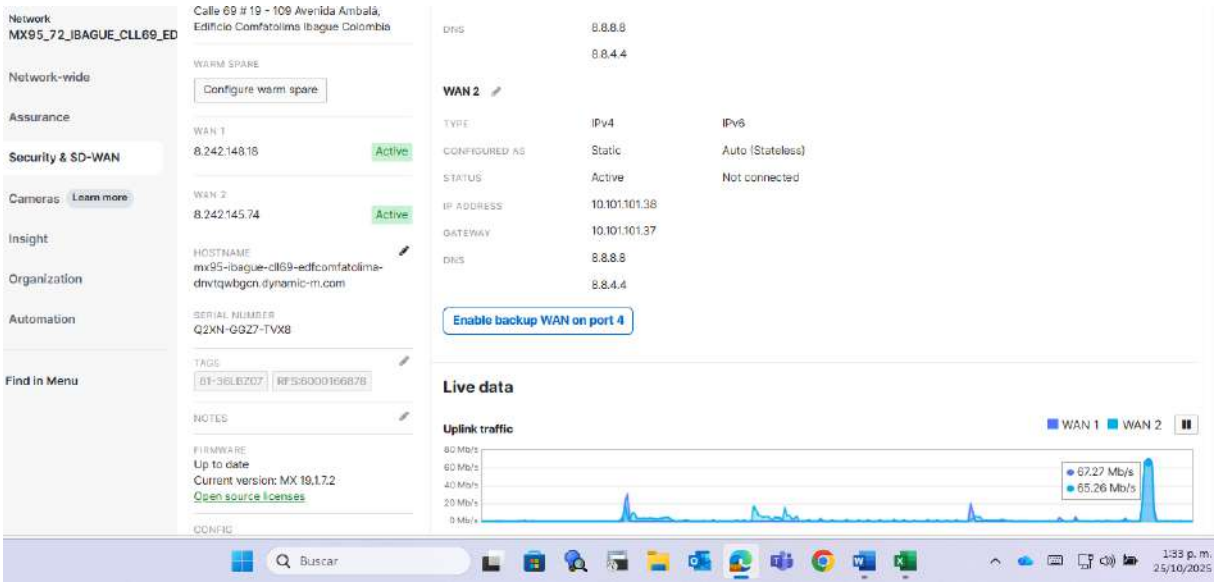


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1955	1	Tolima, Ibague; Carrera 5 # 41-20, Edificio F25	128 Mbps	129,62

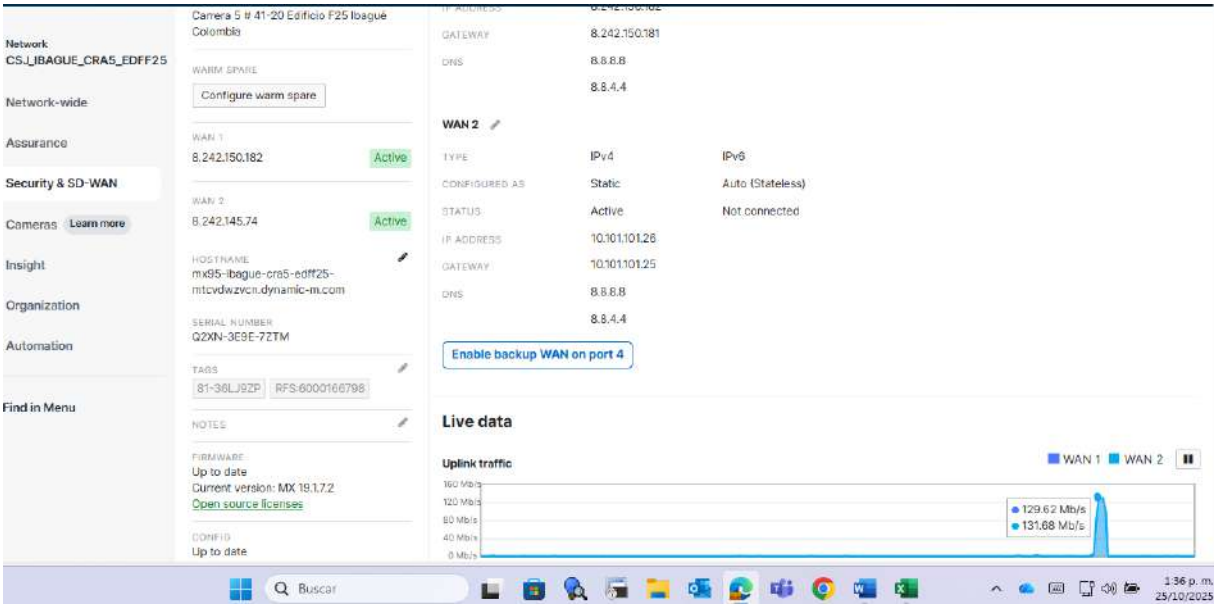


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1956	1	Valle Del Cauca, Cali; Avenida 5 CN # 24N-36	64 Mbps	65,58

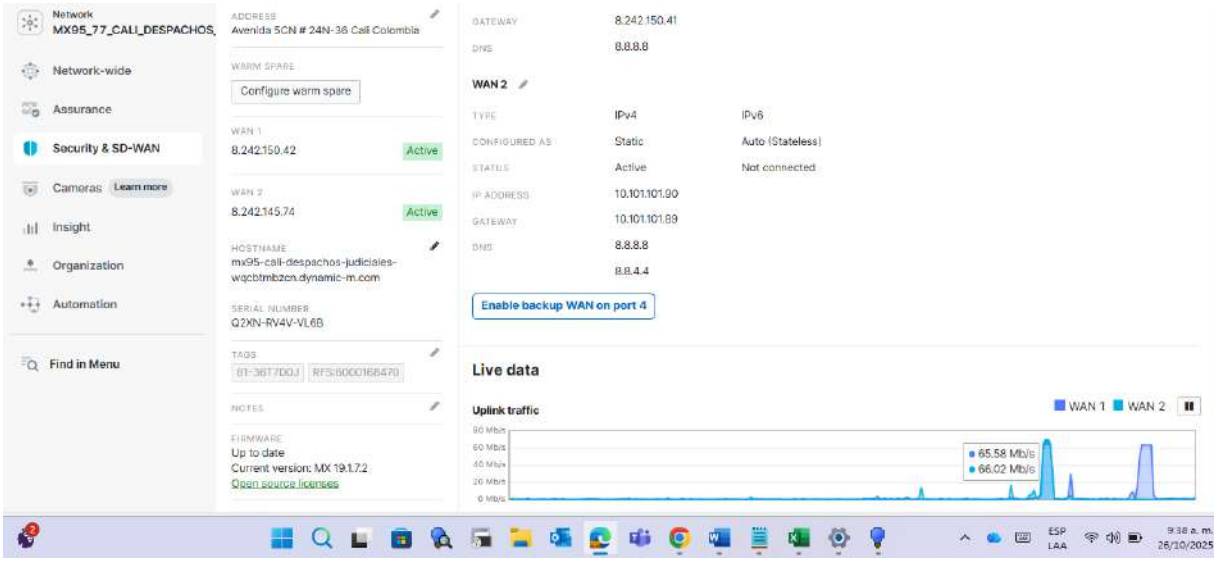


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1957	1	Valle Del Cauca, Cali; Avenida 6 Norte 28N-23/24	256 Mbps	250,08

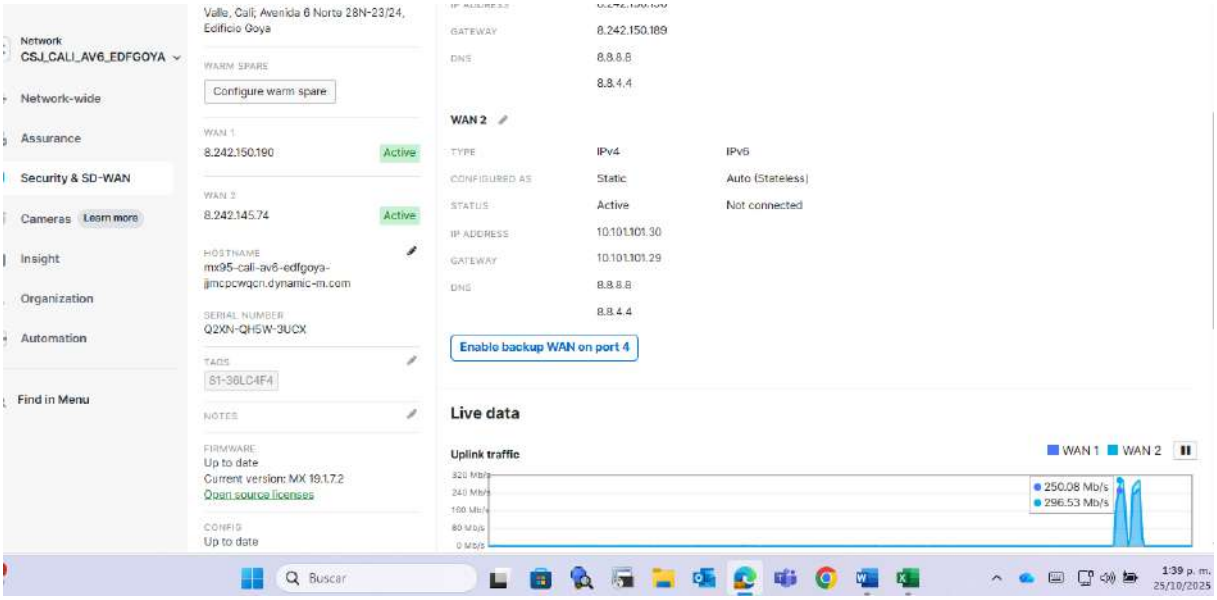


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1961	3	Huila, Garzón; Carrera 8 # 7-73 piso 1,PJ	64 Mbps	64,51

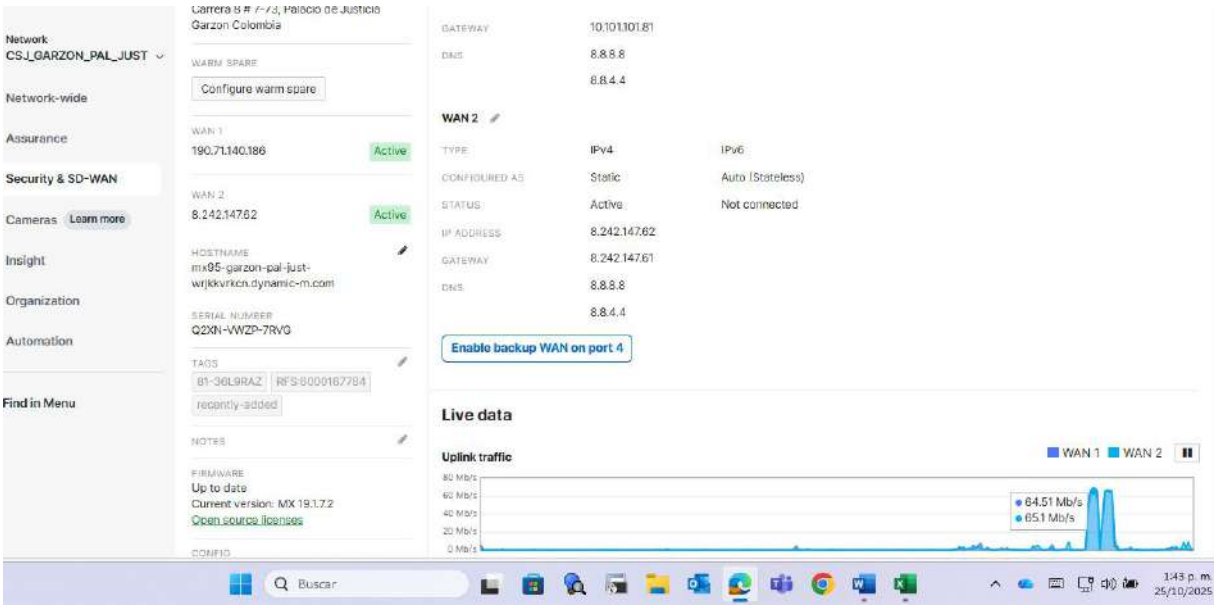


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1966	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 8 # 12A-19, Anexa	300 Mbps	295,36

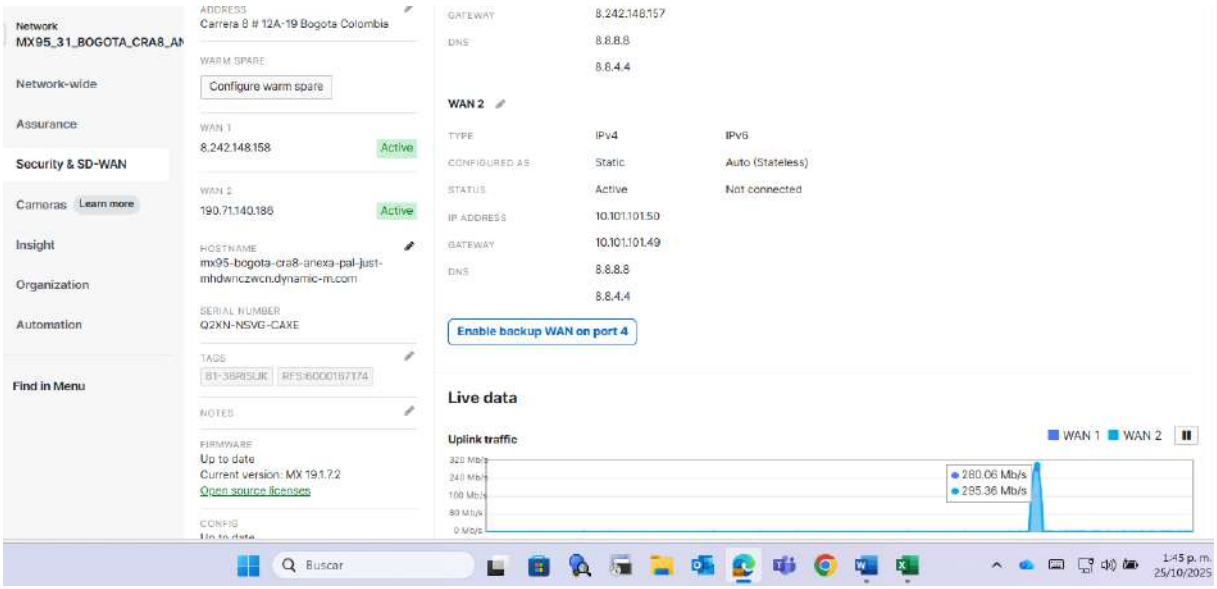


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1969	1	Antioquia, Bello; Calle 47 # 48-51	64 Mbps	66,56

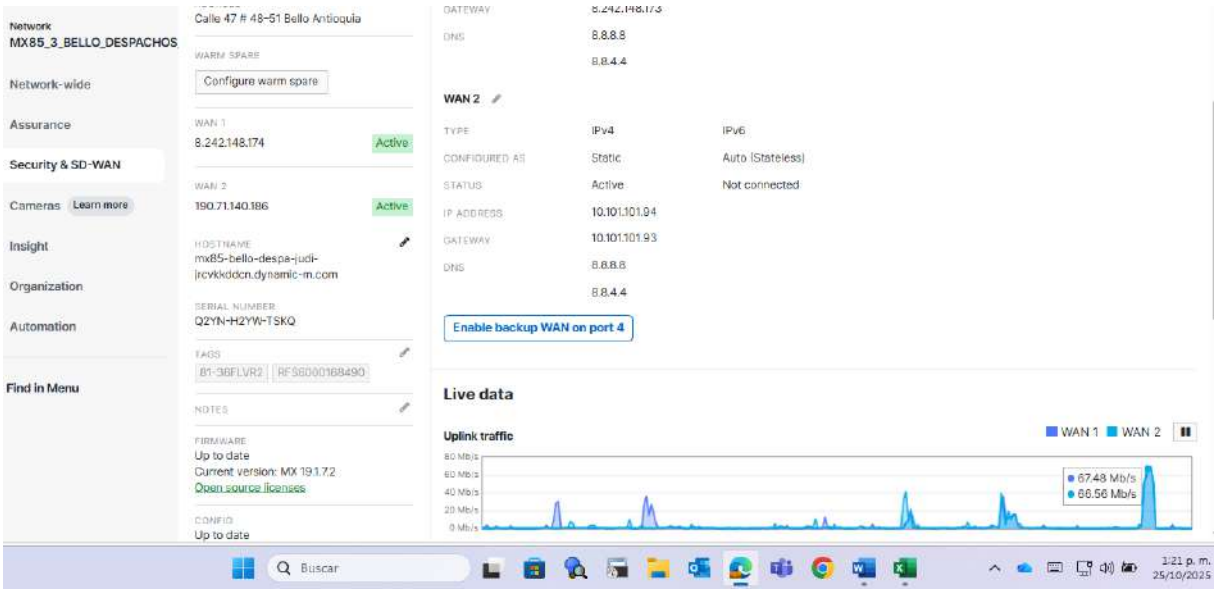


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1970	1	Antioquia, Envigado; Carrera 43 # 38- 42 Sur, PJ	96 Mbps	100,37

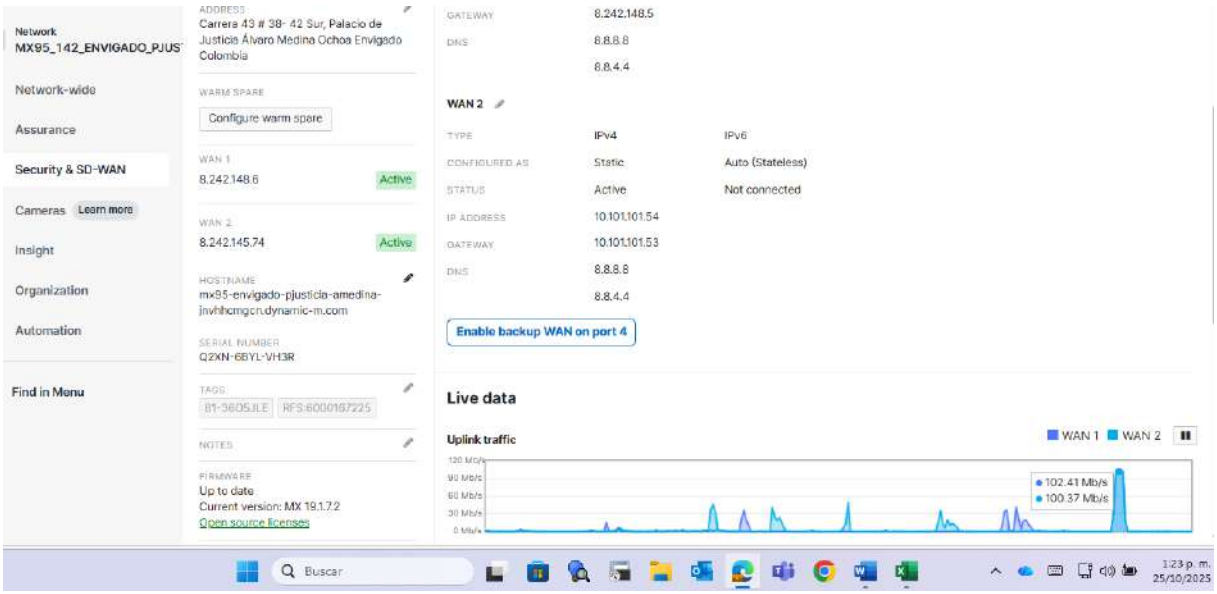


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1975	1	Córdoba, Montería; Calle 30 Carrera 3 esquina	64 Mbps	66,76

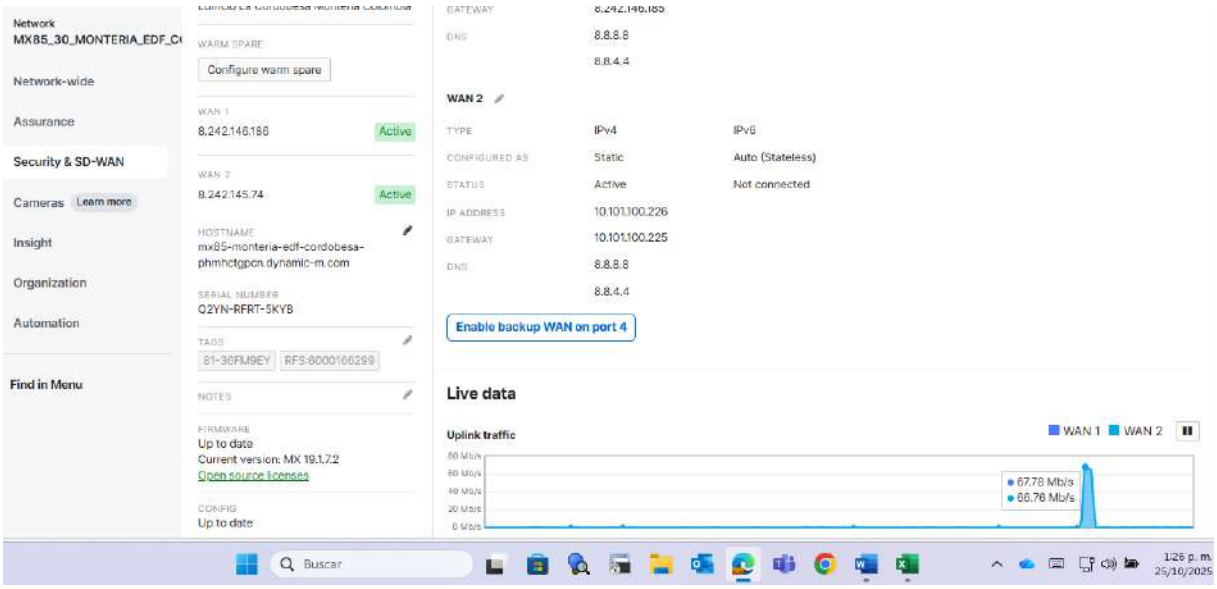


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1979	1	Risaralda, Pereira; Calle 39 # 5-37	128 Mbps	121,15

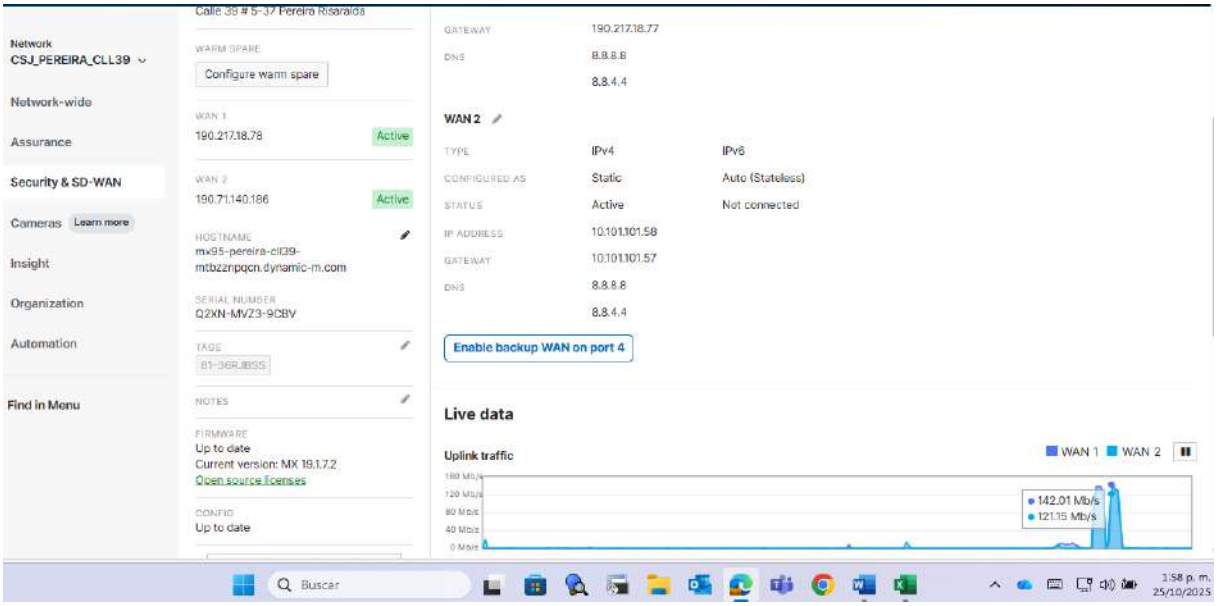


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1980	1	Santander, Barrancabermeja; Calle 50 # 8B-48, PJ	128 Mbps	137,27

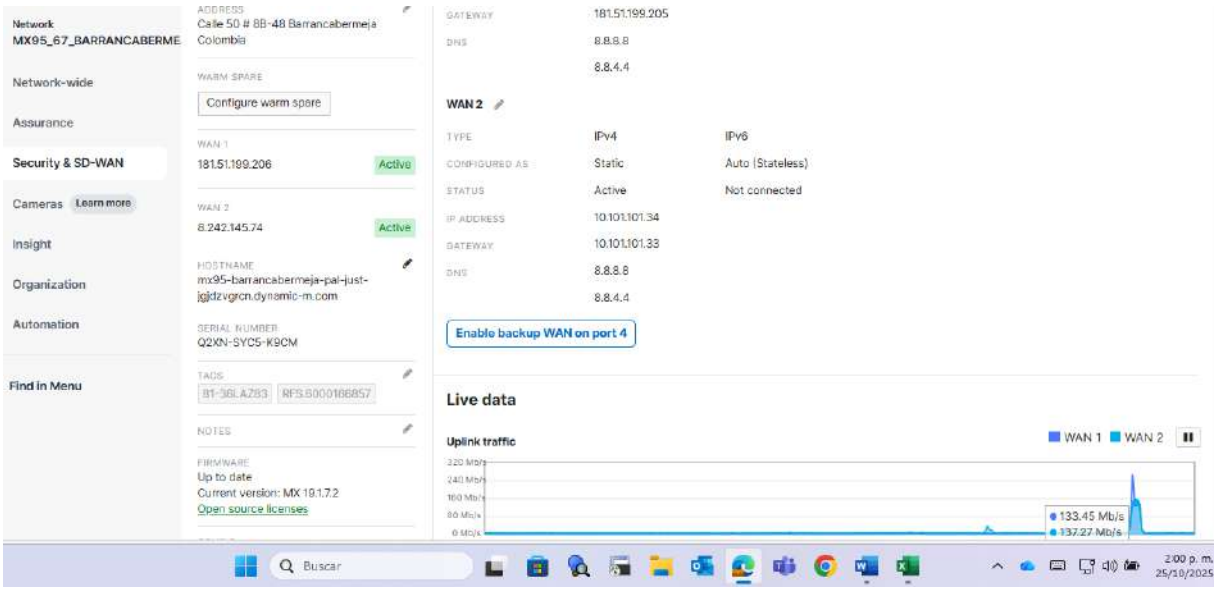


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1981	1	Tolima, Ibagué; Calle 69 # 19 - 109 Avenida Ambalá	64 Mbps	66,27

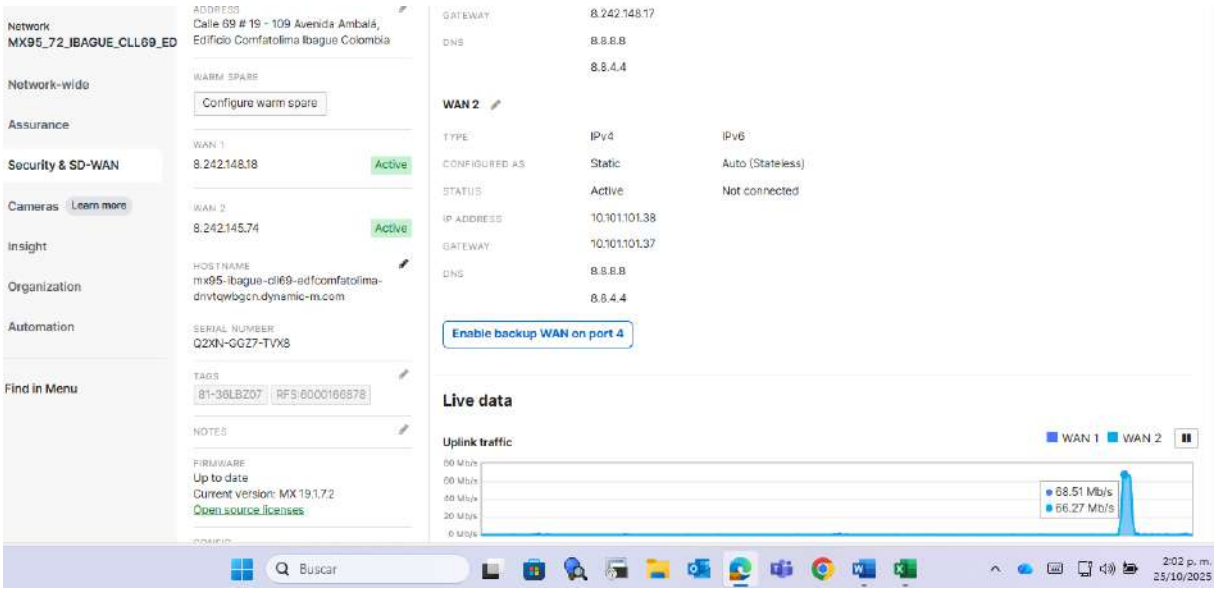


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1982	1	Tolima, Ibague; Carrera 5 # 41-20, Edificio F25	128 Mbps	128,44

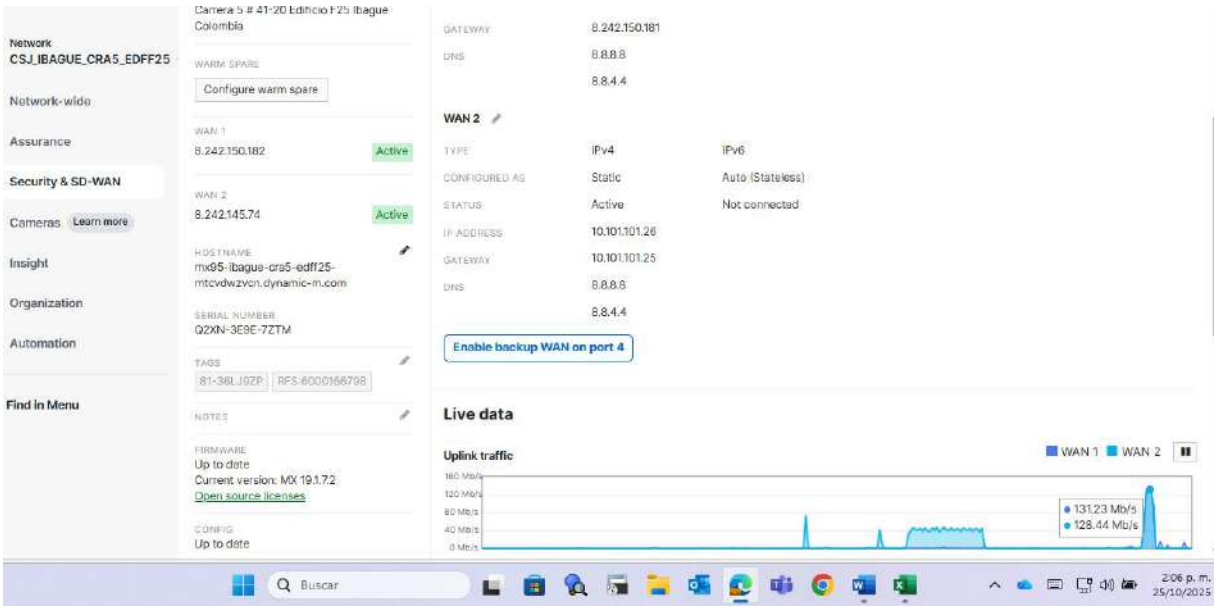


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1983	1	Valle Del Cauca, Cali; Avenida 5 CN # 24N-36	64 Mbps	65,02

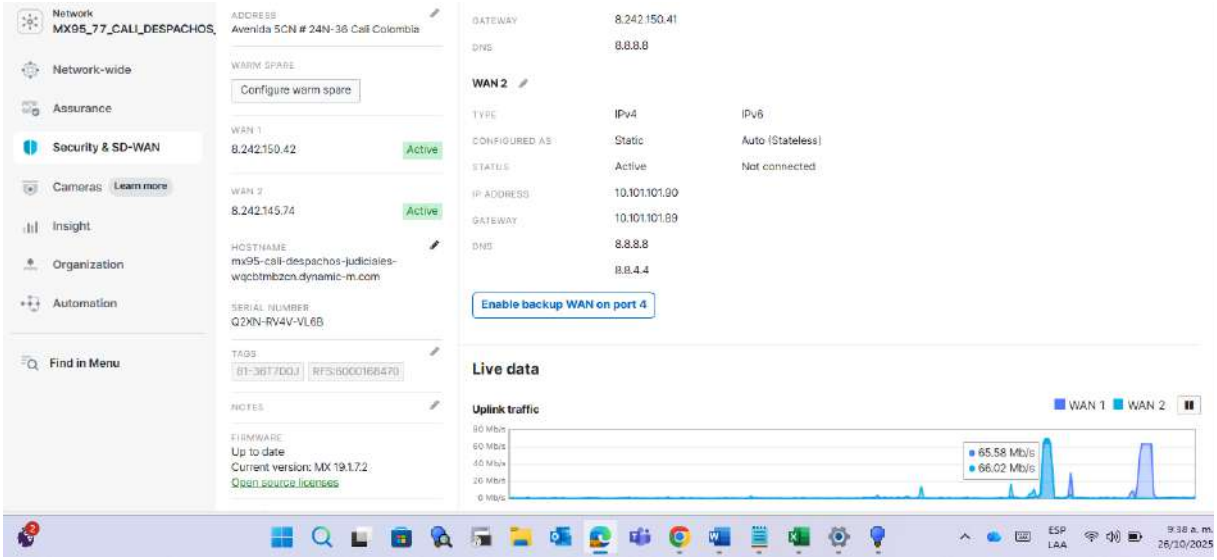


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1984	1	Valle Del Cauca, Cali; Avenida 6 Norte 28N-23/24	256 Mbps	296,53

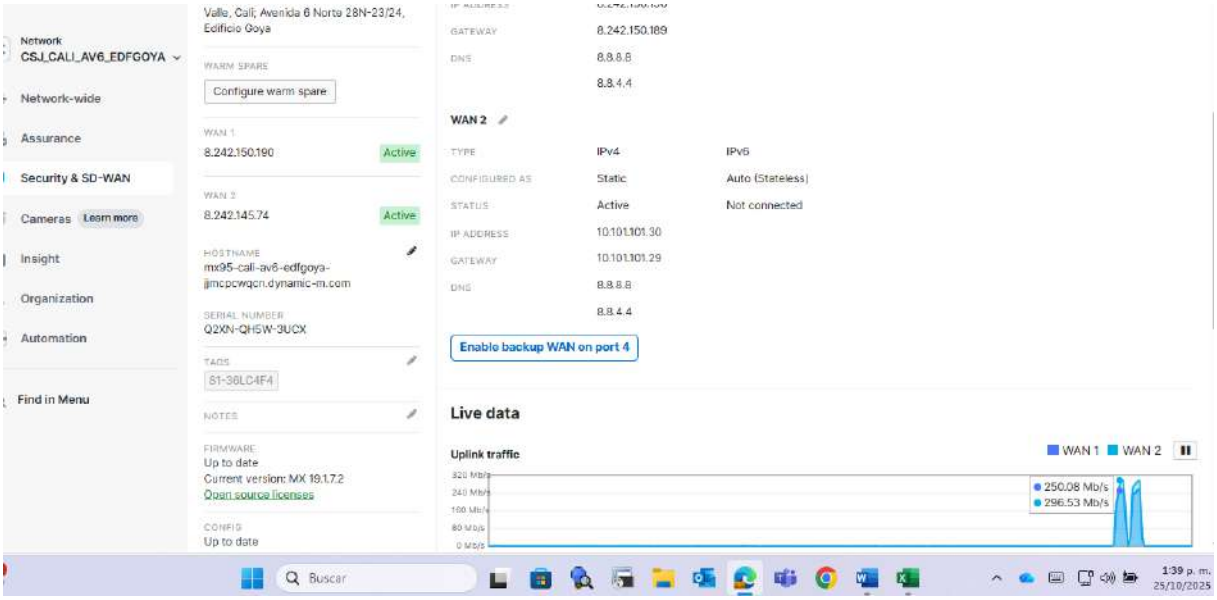


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1985	1	Valle Del Cauca, Palmira; Calle 23 # 29 - 09	192 Mbps	255,06

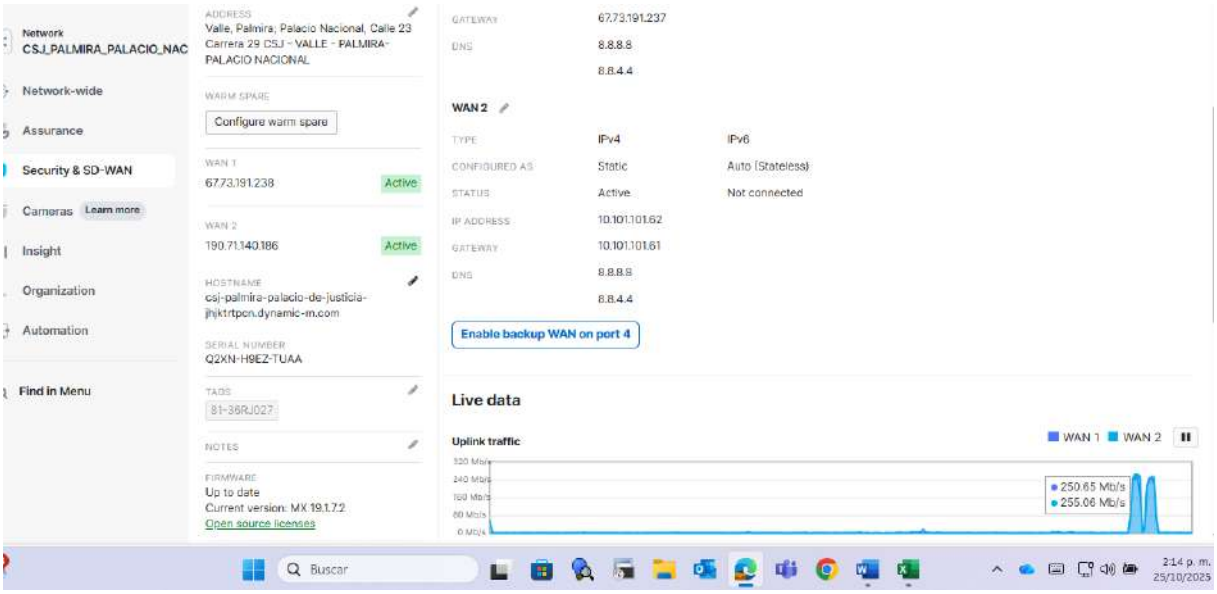


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1987	3	Antioquia, Apartadó; Calle 108 # 98-48, PJ	112 Mbps	143,33

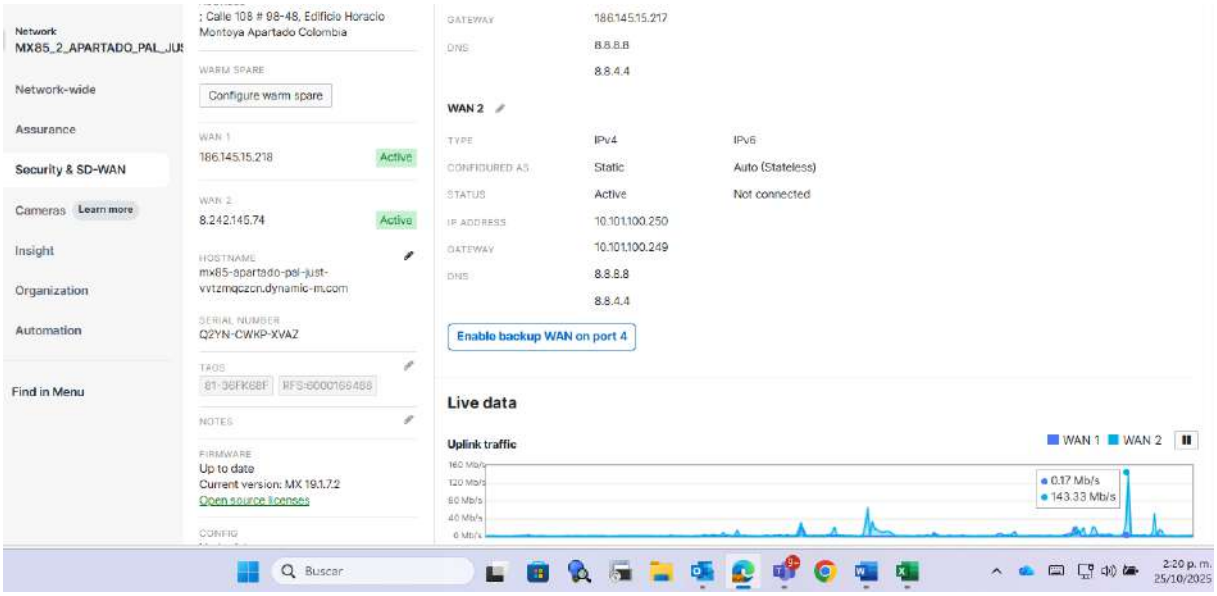


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1989	3	Huila, Garzón; Carrera 8 # 7-73 piso 1,PJ	64 Mbps	65,63

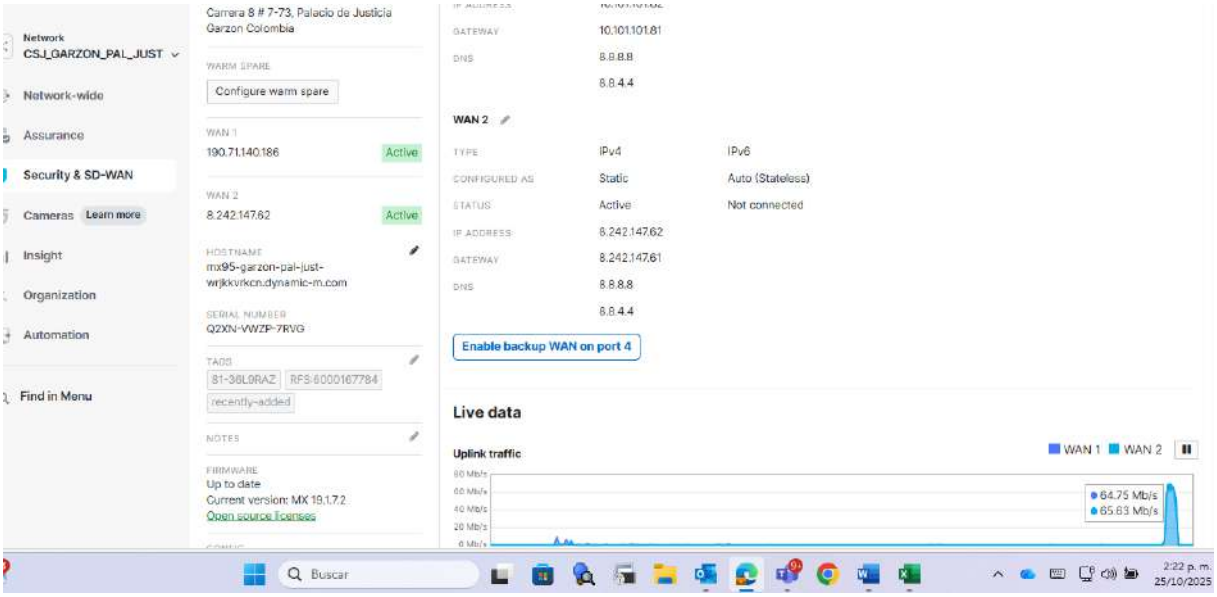


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2103	1	Atlántico, Barranquilla; Carrera 44 # 38-11	128 Mbps	128,38

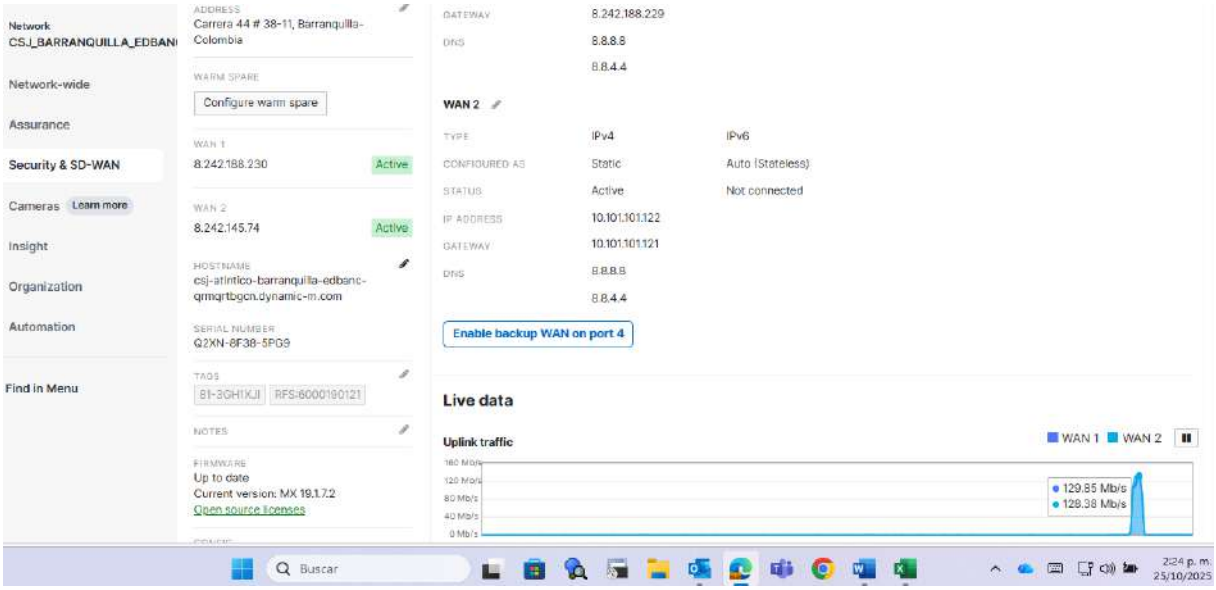


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2106	1	Bolívar, Cartagena; Calle 32 #10-129	100 Mbps	102,72

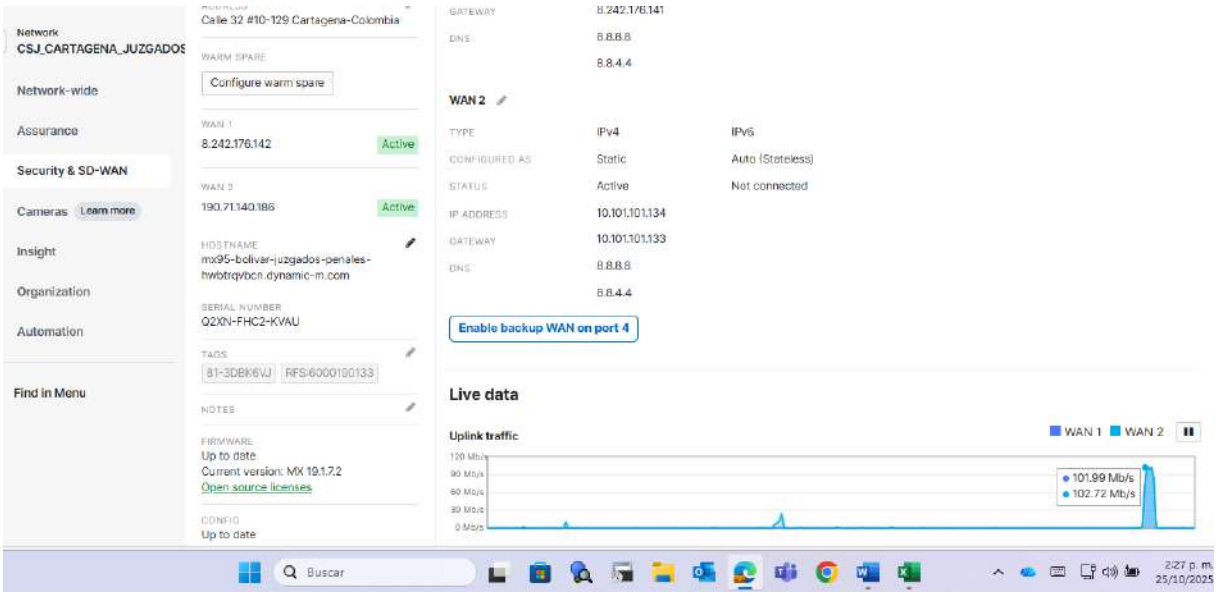


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2107	1	Bolívar, Cartagena; Calle 33 # 8-25	100 Mbps	93,24

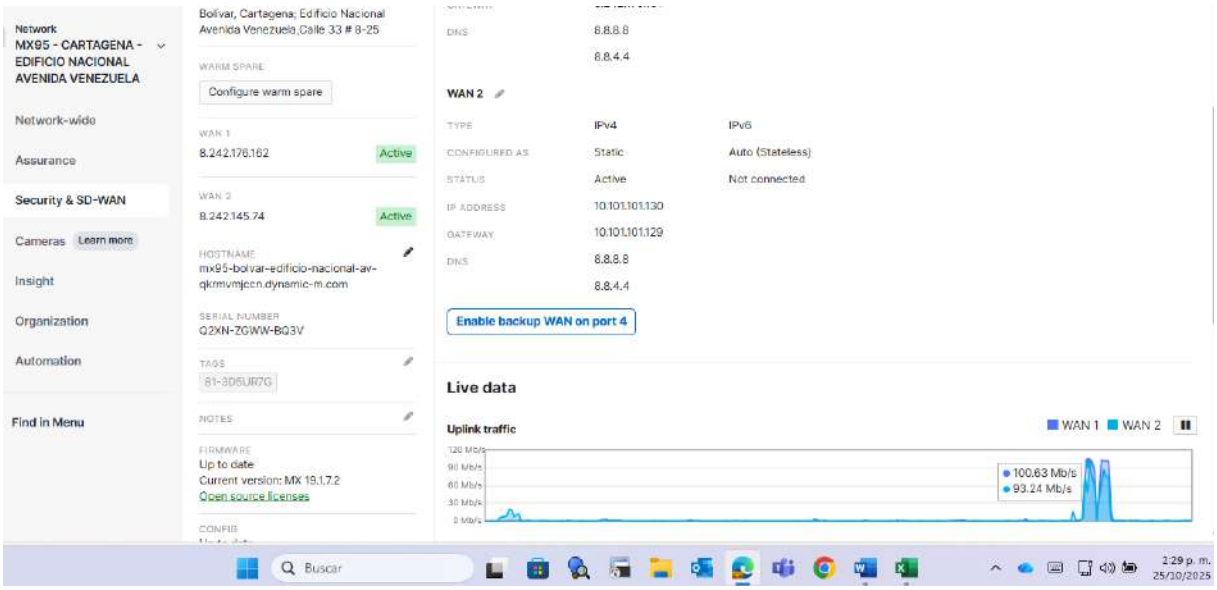


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2109	2	Boyacá, Duitama; Carrera 15 # 14-23, P Justicia	100 Mbps	100,67

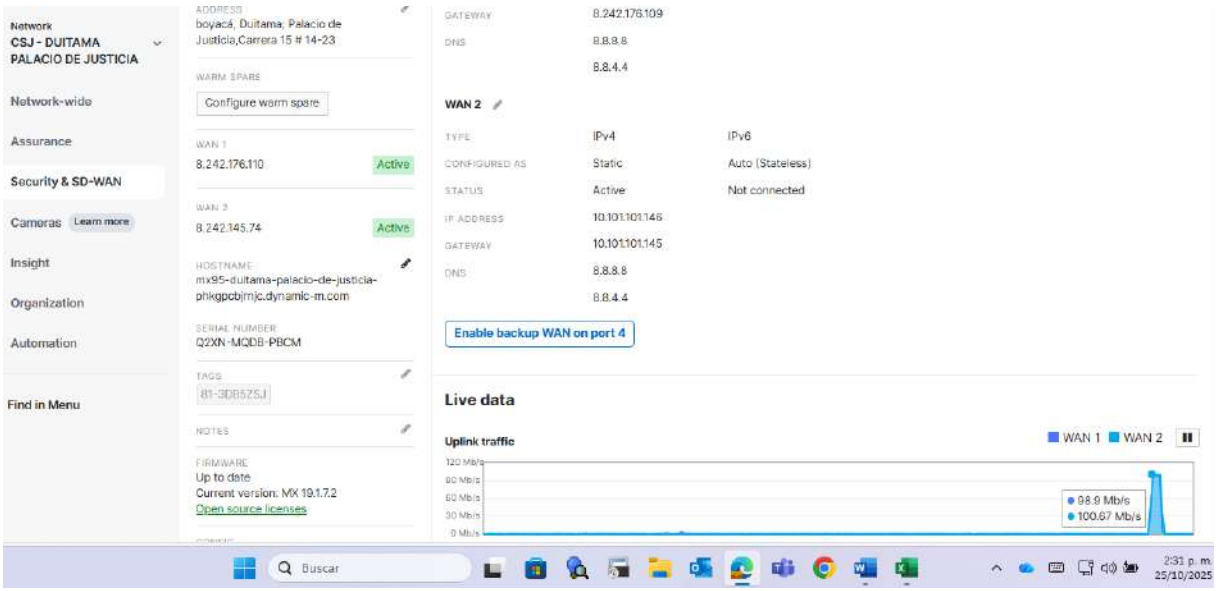


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2110	1	Boyacá, Tunja; Calle 32 N° 1 A -15 Torre	64 Mbps	65,44

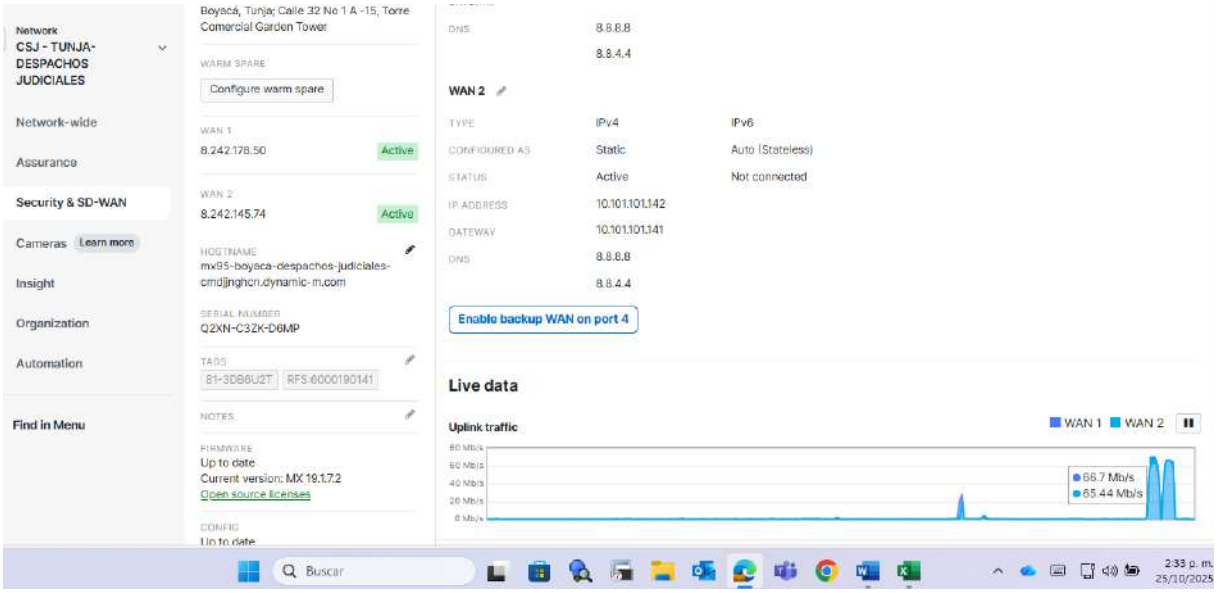


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2111	3	Caldas, La Dorada; Carrera 2 # 16-04, PJ	64 Mbps	111,87

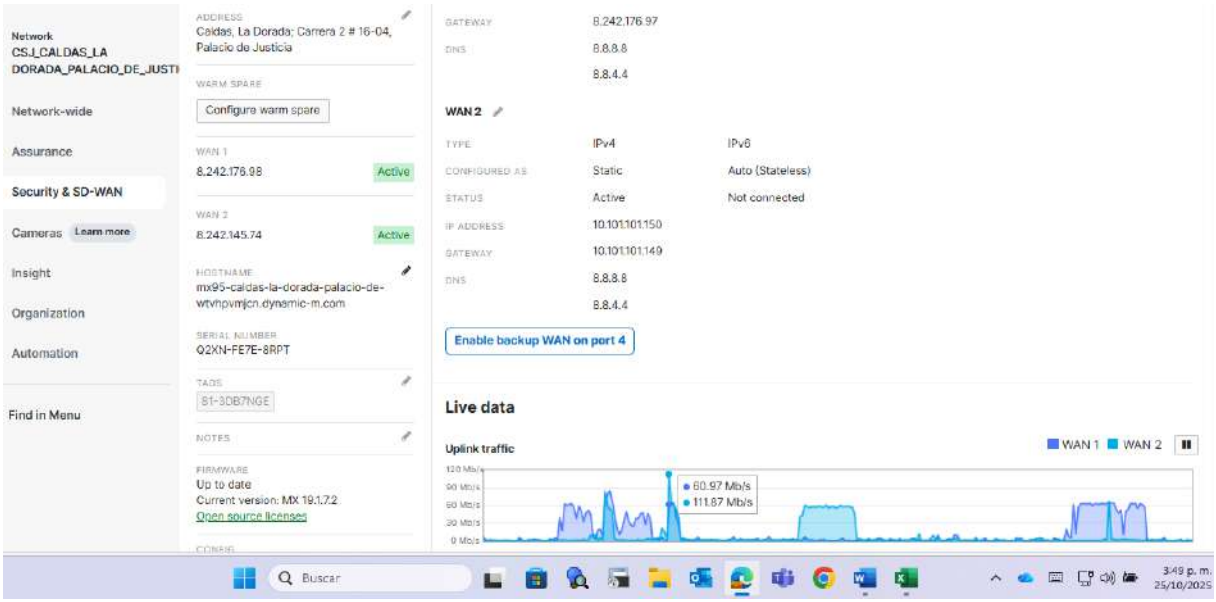


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2112	2	Cauca, Popayán; Carrera 4 # 2-30,Edificio Canencio	100 Mbps	95,43

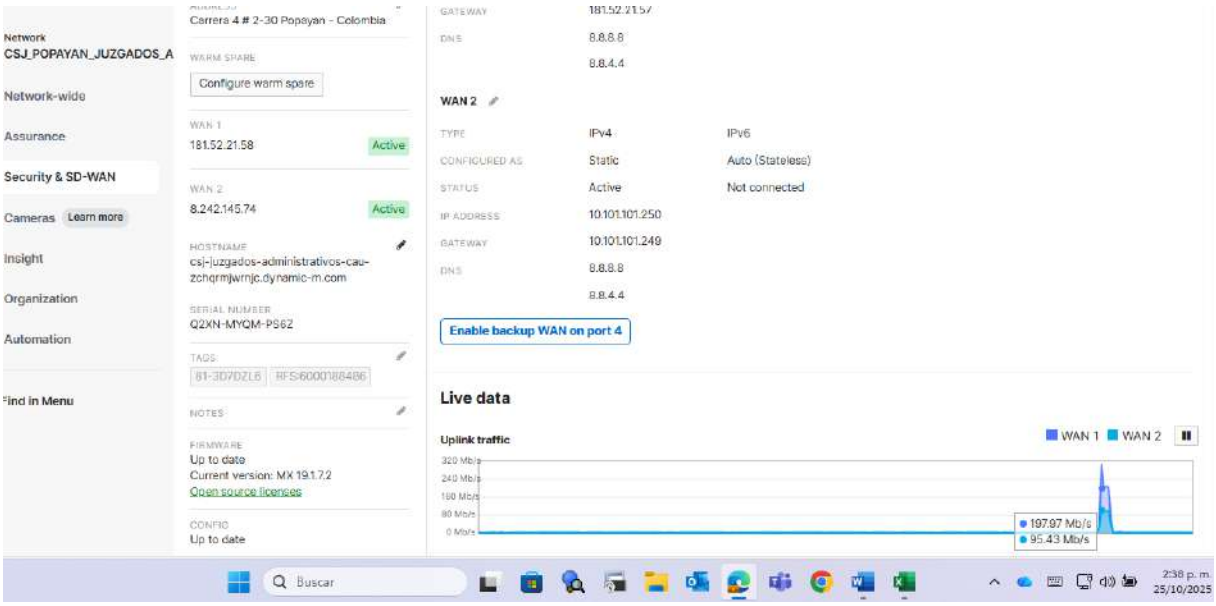


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2113	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 15 # 10-61	200 Mbps	202,21

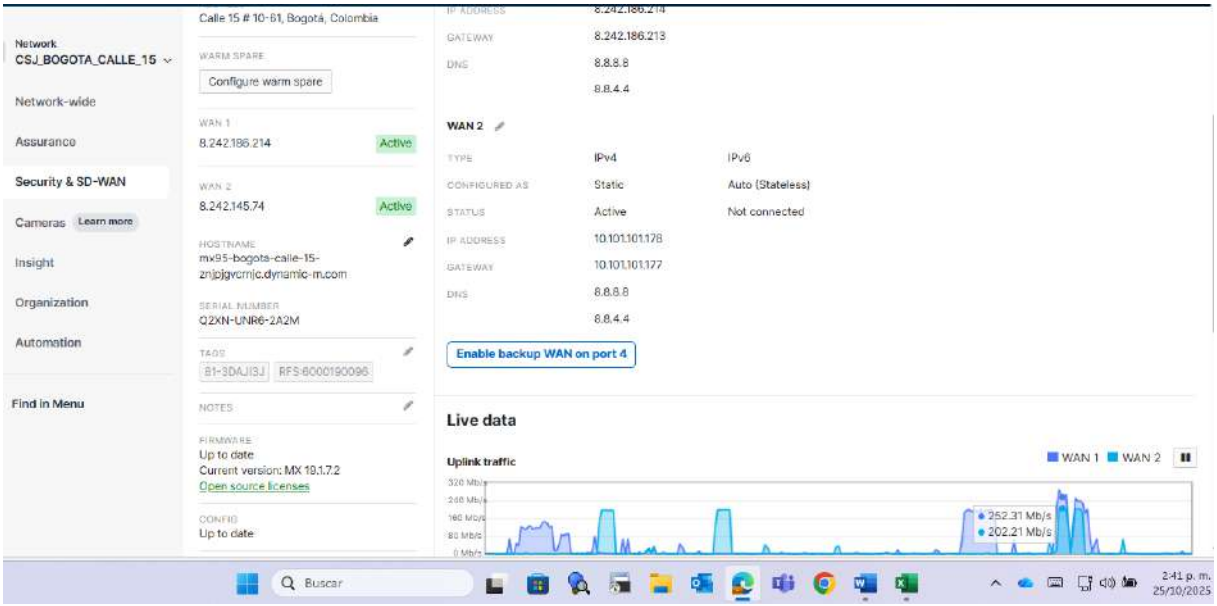


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2114	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 10 # 19-65	150 Mbps	149,23

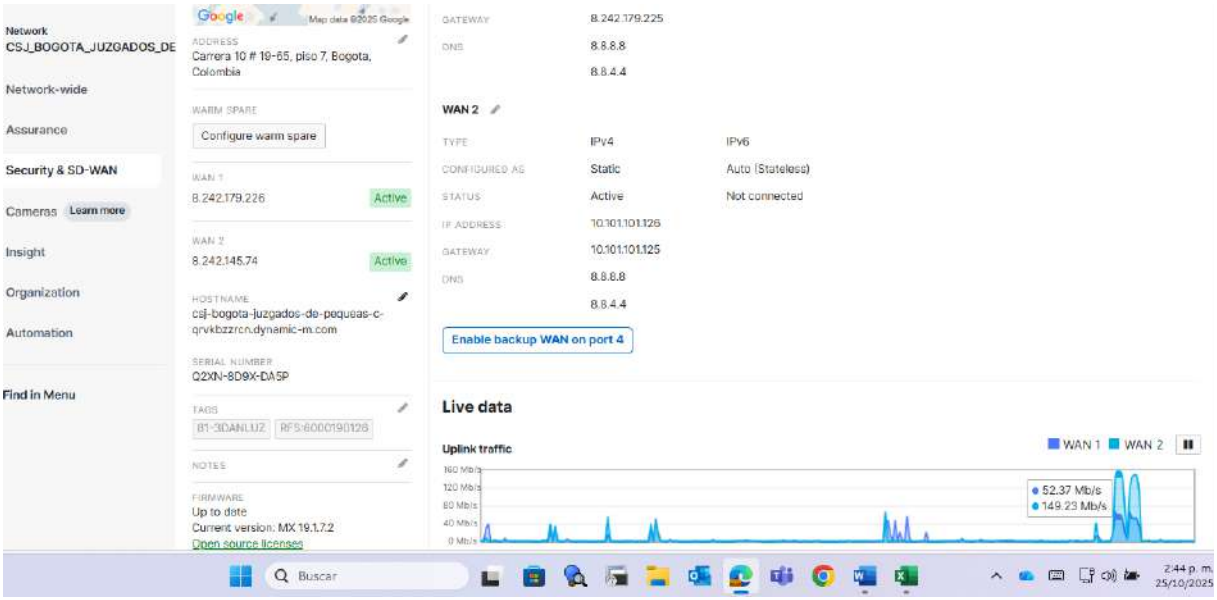


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2116	3	Cundinamarca, Cáqueza; Avenida 4 # 2-39	64 Mbps	65,7

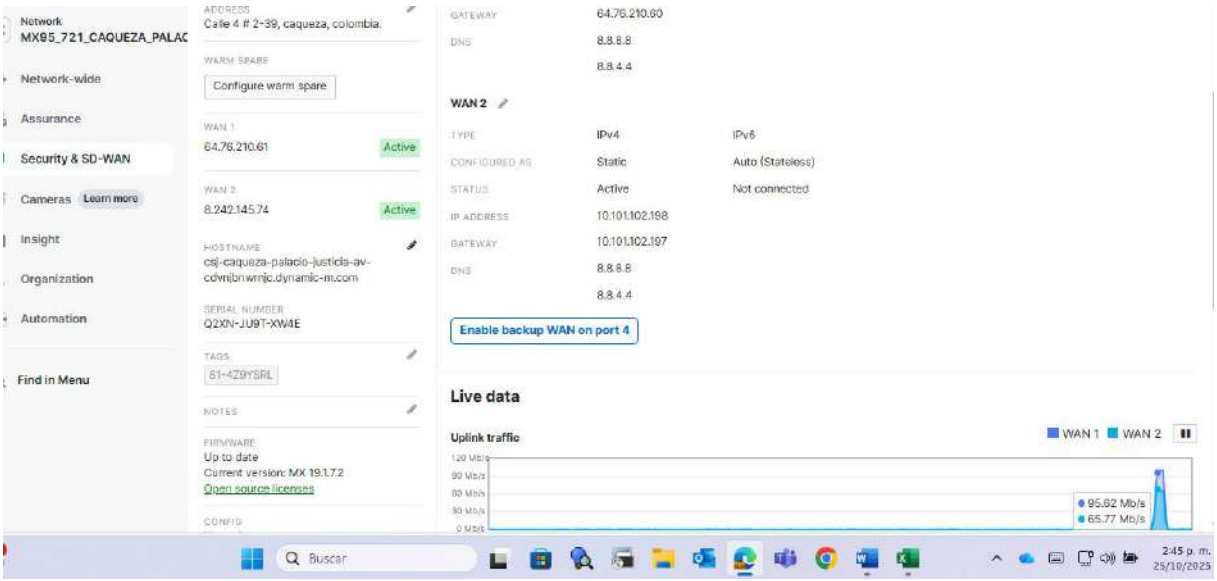


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2118	2	Cundinamarca,Fusagasugá; Transversal 16 # 11-85	96 Mbps	101,82

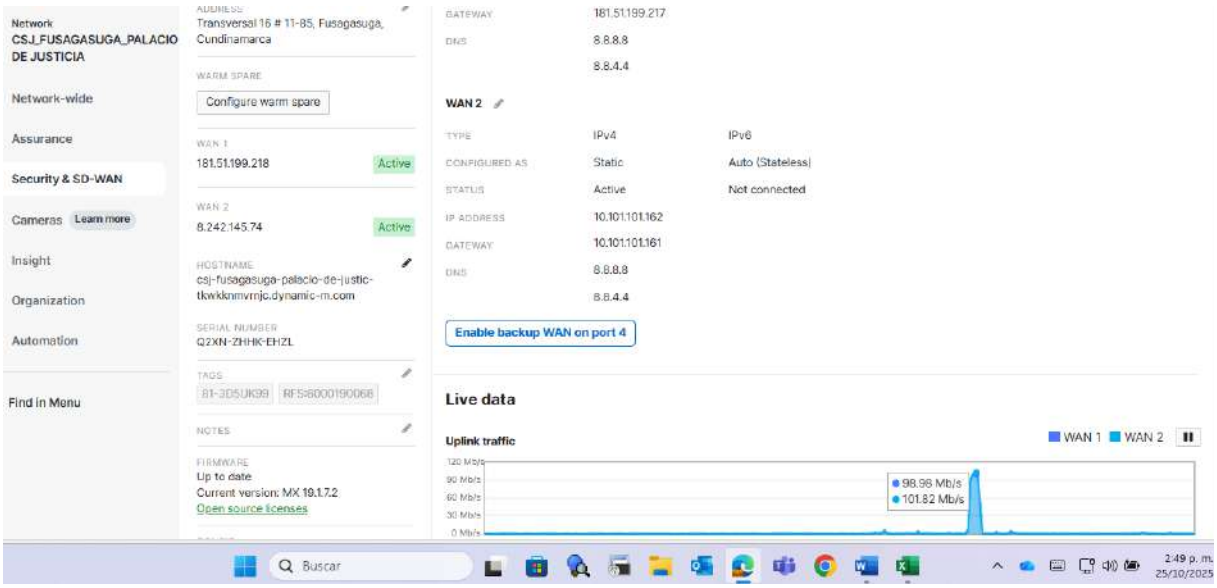


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2119	2	Cundinamarca, Girardot; Carrera 10 # 37-39, PJ	100 Mbps	100,49

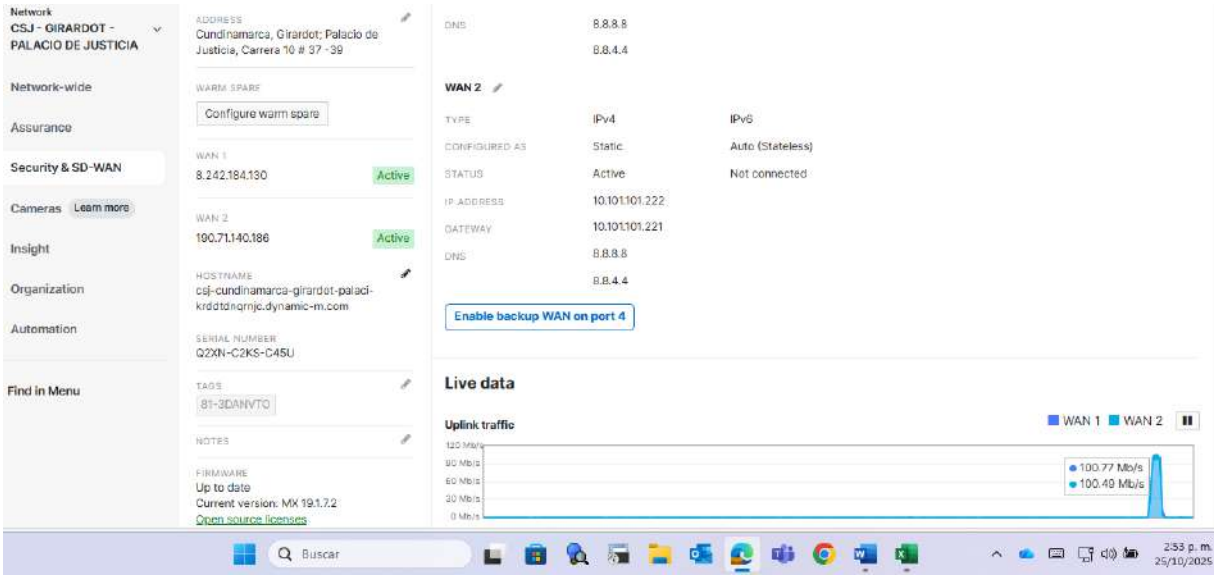


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2121	1	Quindío, Calarca; Carrera 23 # 39-22, PJ	64 Mbps	66,65

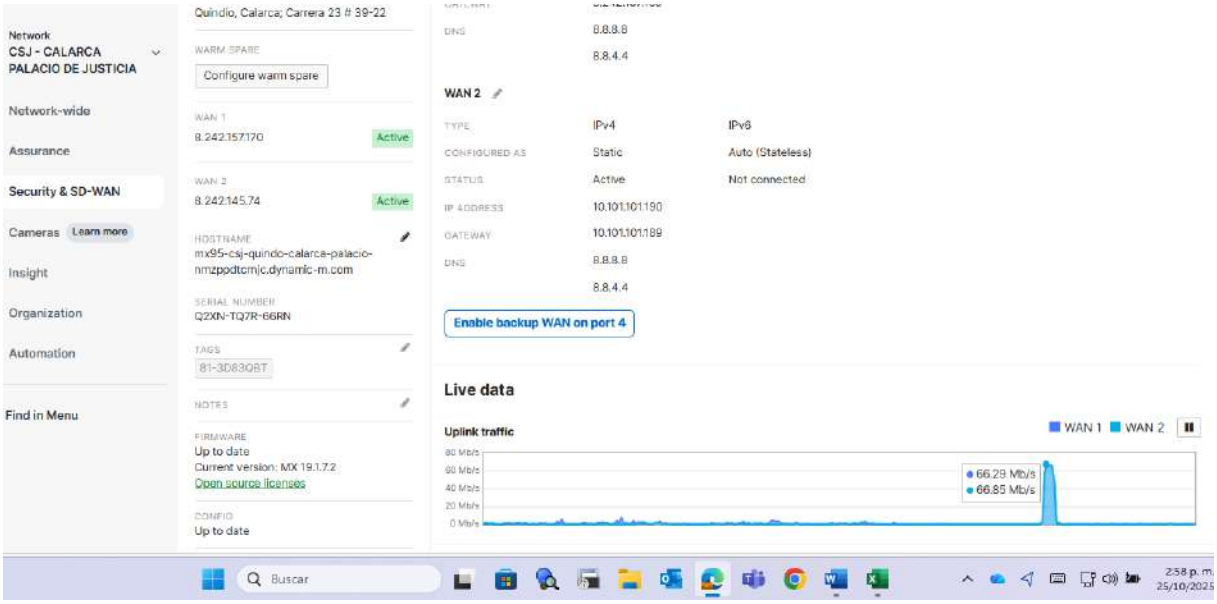


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2122	1	Avenida Simón Bolívar Carrera 16 # 36-44, CAM	64 Mbps	65,36

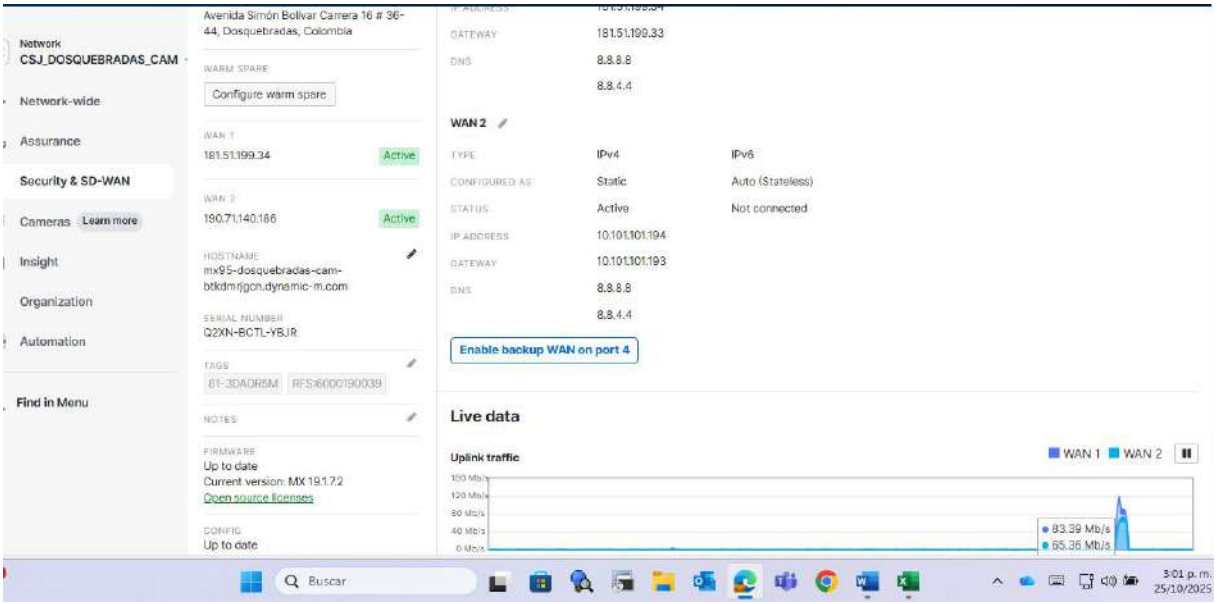


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2123	1	Risaralda, Pereira; Carrera 7 # 30-20	64 Mbps	66,18

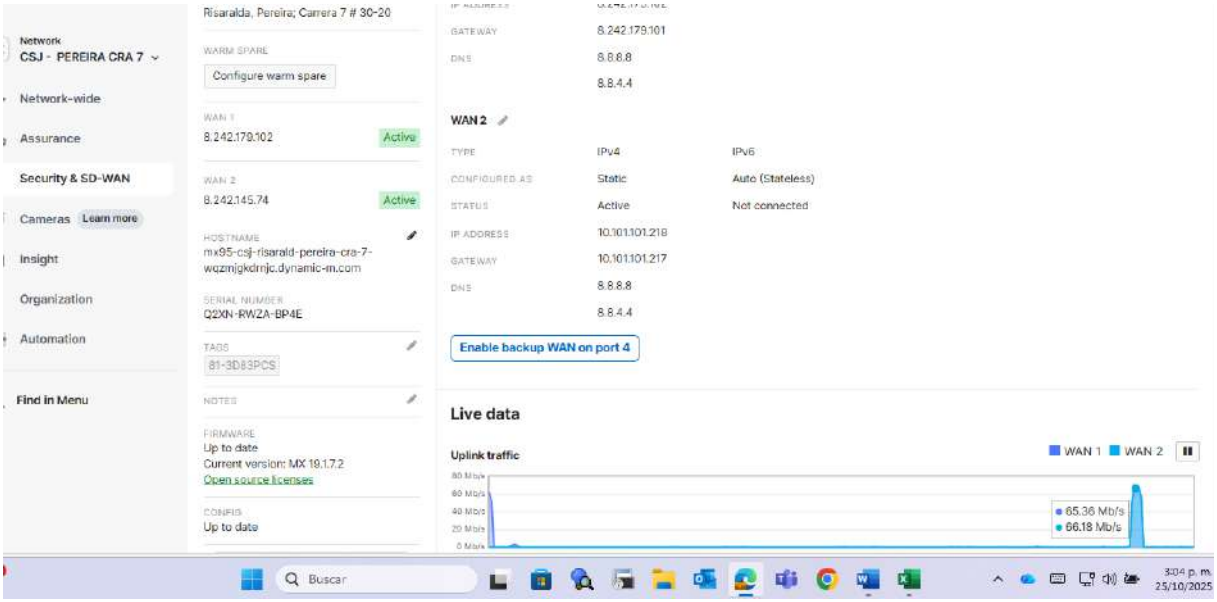


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2124	1	Santander, Bucaramanga; Calle 35 # 16-24	150 Mbps	147,98

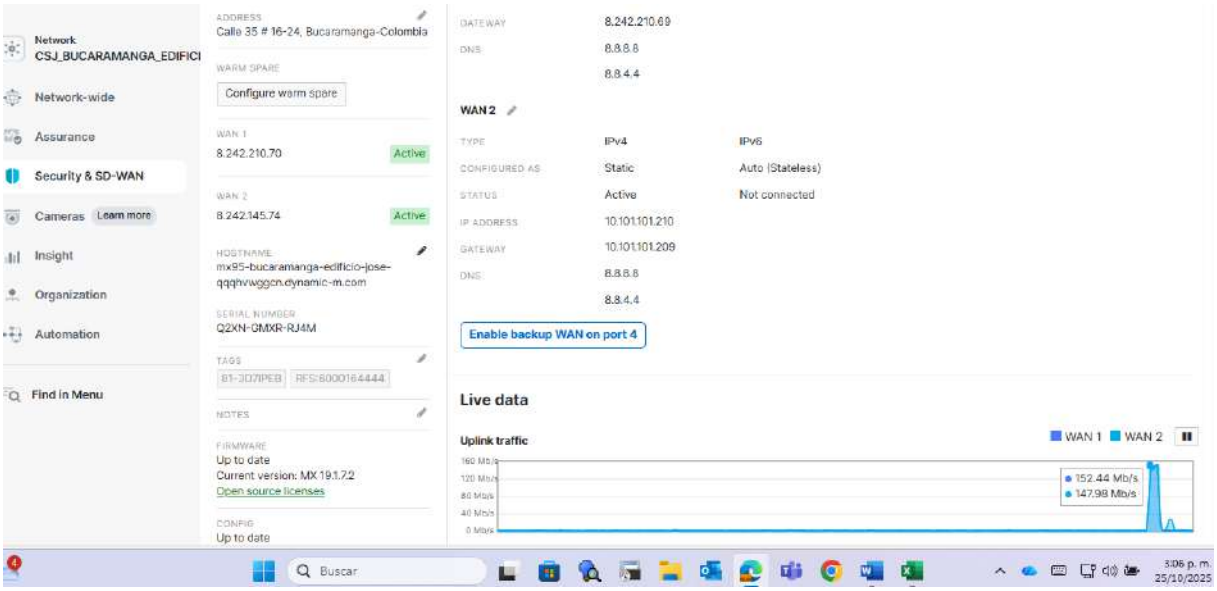


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2125	2	Sucre, Sincelejo; Carrera 16 No. 22 - 51	64 Mbps	57,6

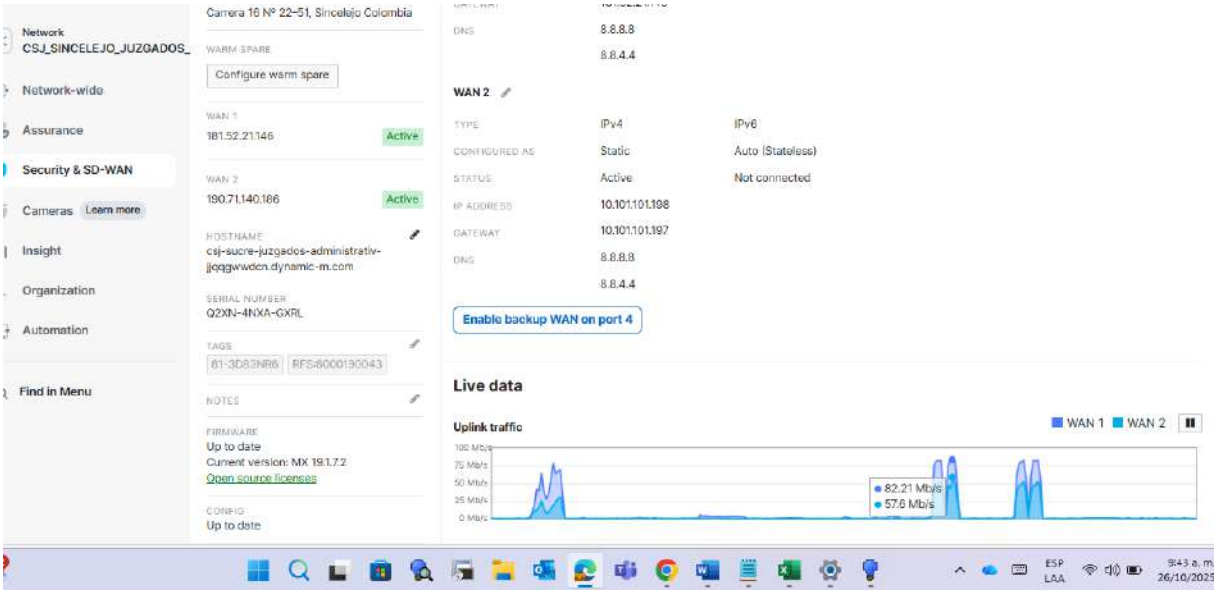


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2126	2	Sincelejo Juzgado de Restitución de Tierras	64 Mbps	65,64

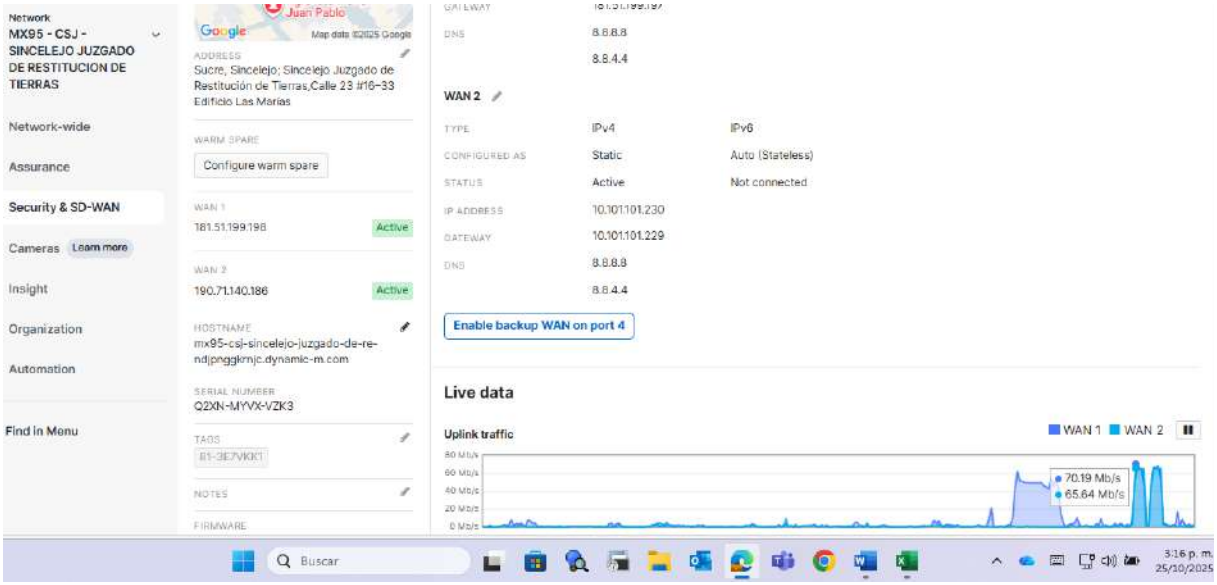


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2128	1	Valle Del Cauca, Buga; Calle 7 # 13-56	128 Mbps	133,16

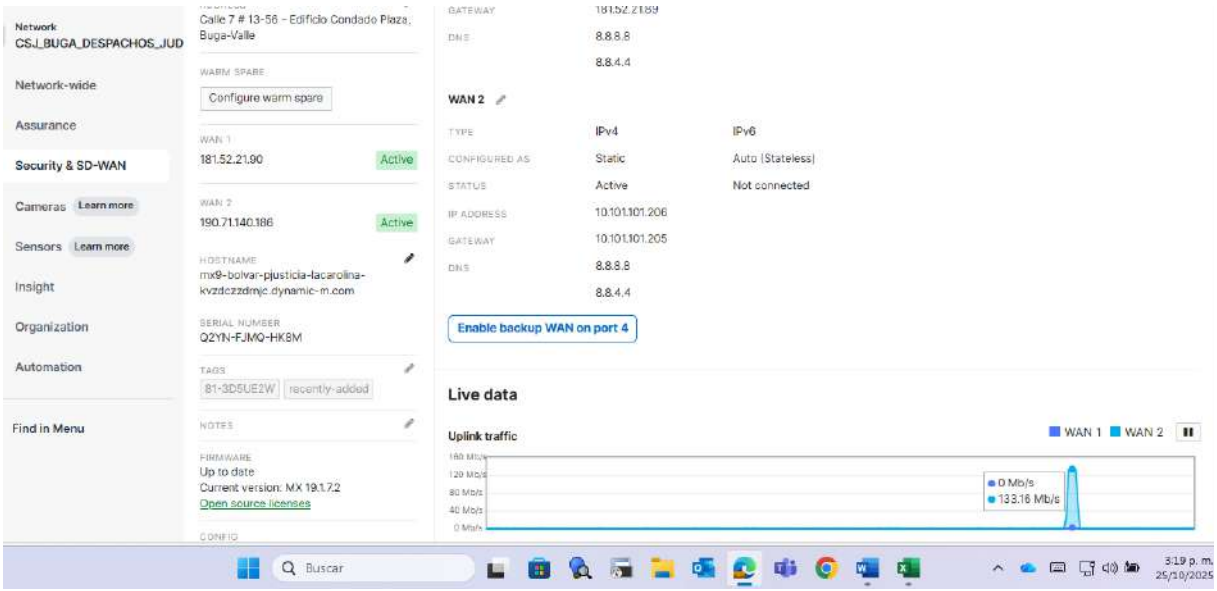


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2129	3	Valle Del Cauca, Cartago; Calle 11 # 5-67	64 Mbps	66,36

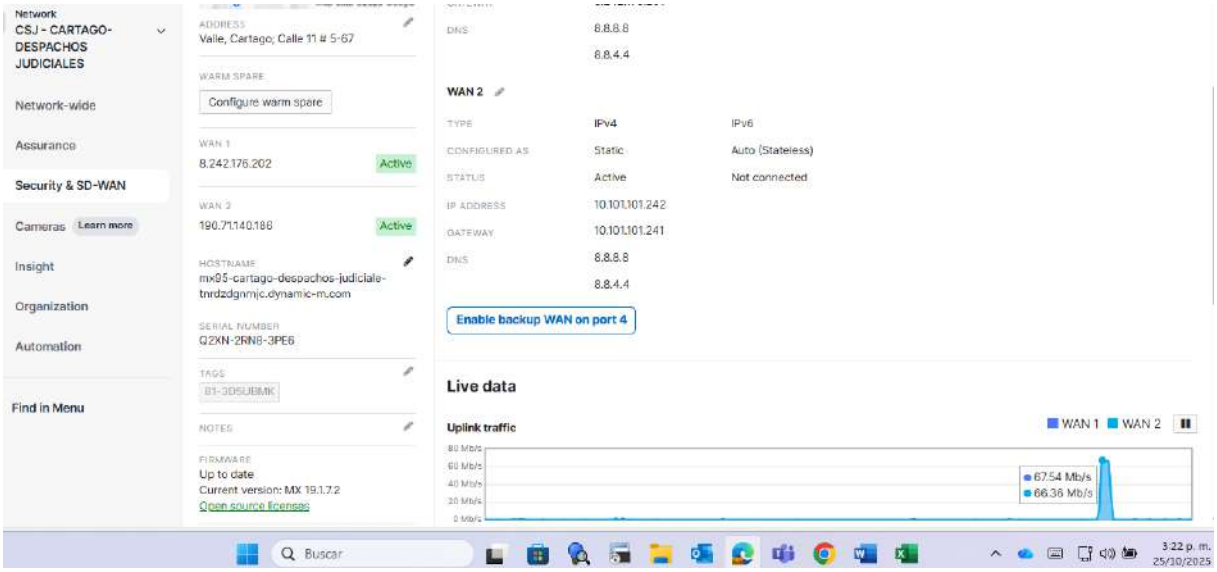


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2134	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 73 # 10 - 83	64 Mbps	67,99

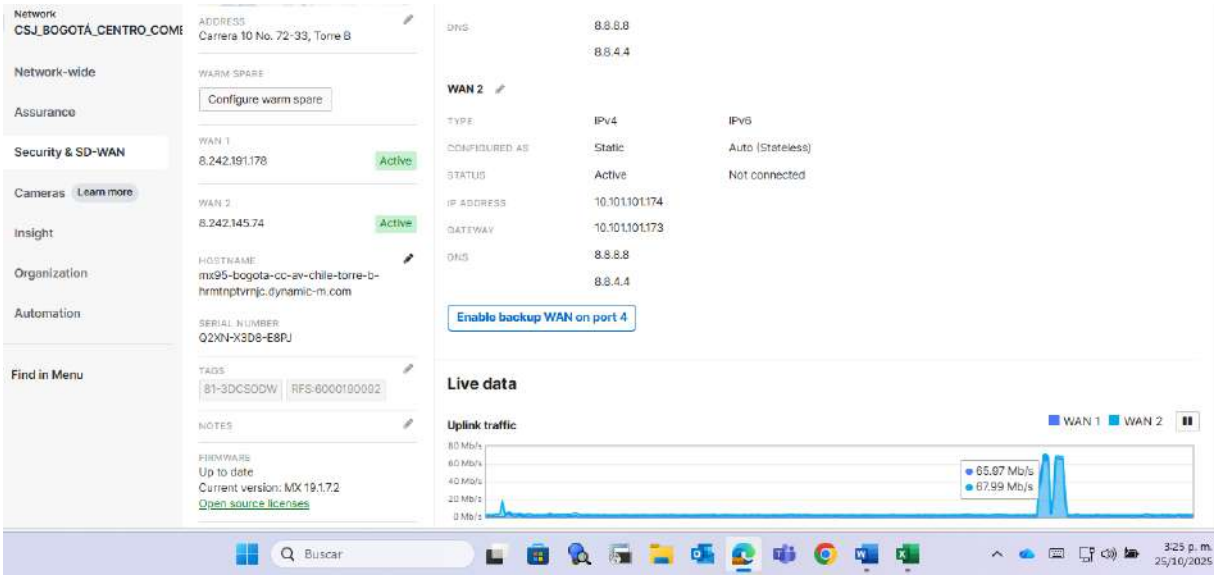


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2138	1	Atlántico, Barranquilla; Carrera 44 # 38-11	128 Mbps	130,68

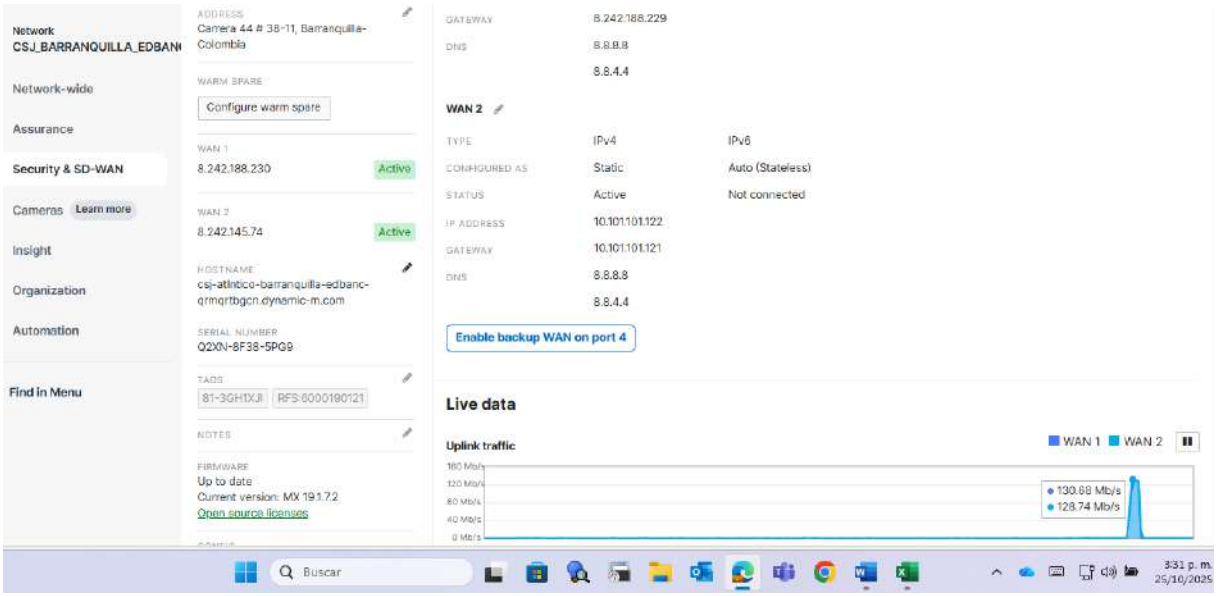


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2141	1	Bolívar, Cartagena; Calle 32 #10-129	100 Mbps	100,67

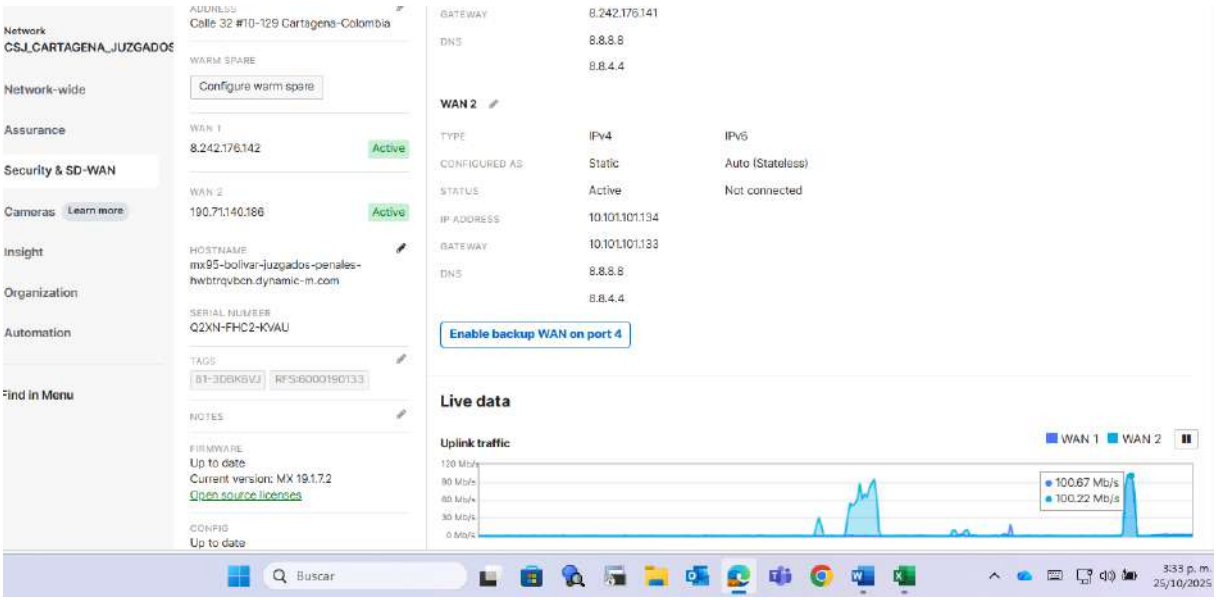


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2142	1	Bolívar, Cartagena; Calle 33 # 8-25 Avenida Vzla	100 Mbps	101,34

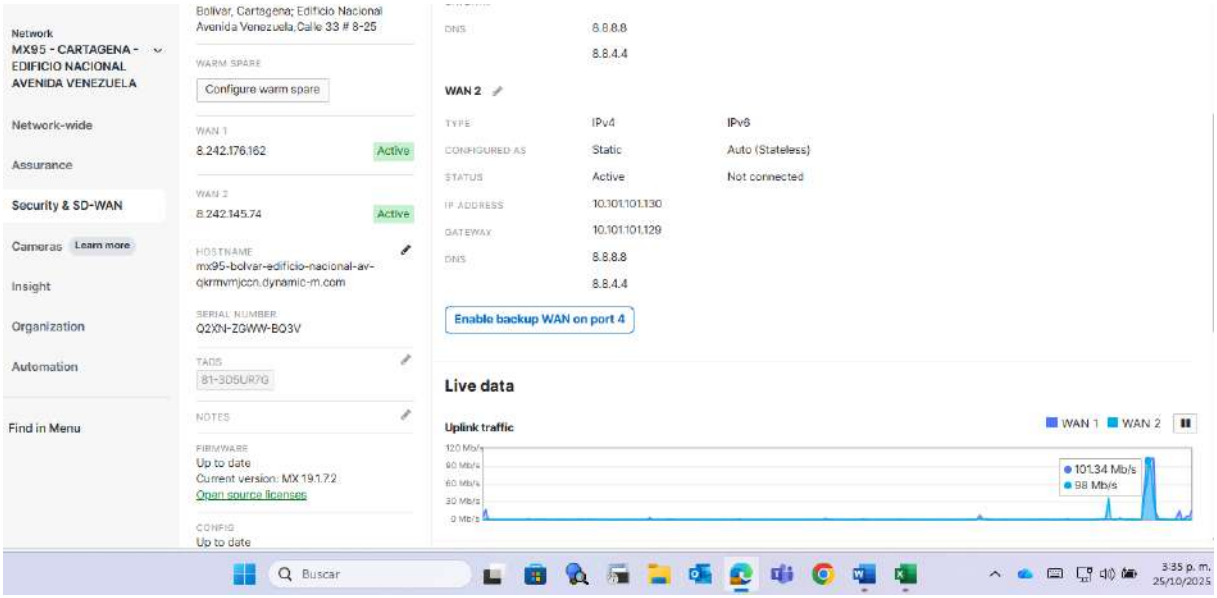


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2144	2	Boyacá, Duitama; Carrera 15 # 14-23, P Justicia	100 Mbps	101,56

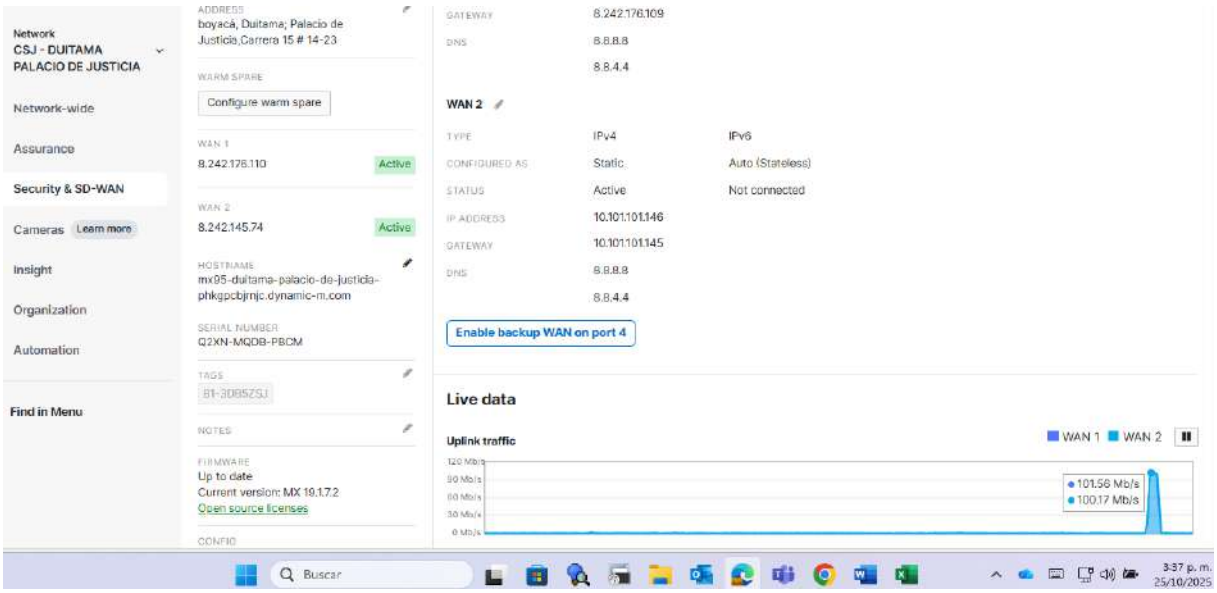


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2145	1	Boyacá, Tunja; Calle 32 N° 1 A -15 T. Comercial G	64 Mbps	65,42

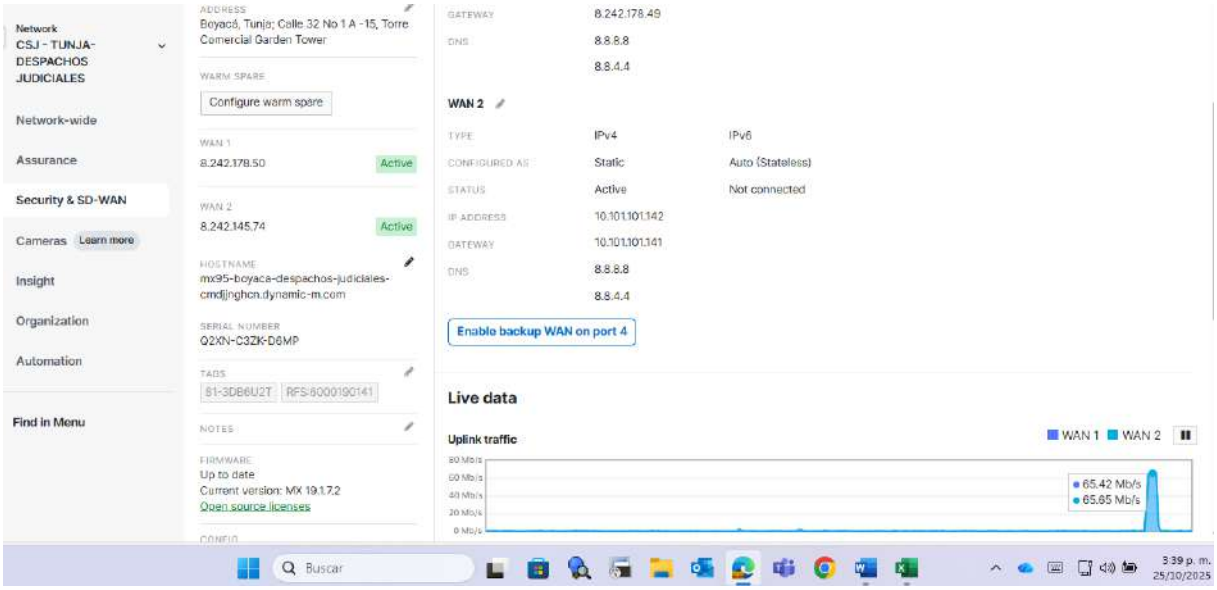


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2146	3	Caldas, La Dorada; Carrera 2 # 16-04, P Justicia	64 Mbps	63,67

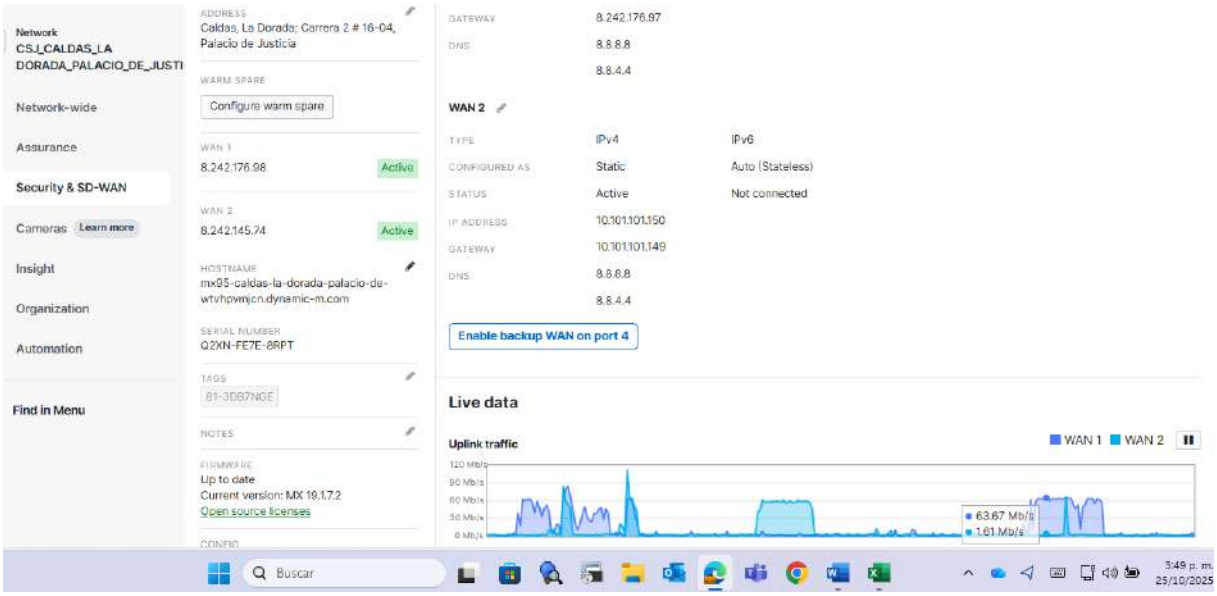


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2148	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 15 # 10-61	200 Mbps	282,59

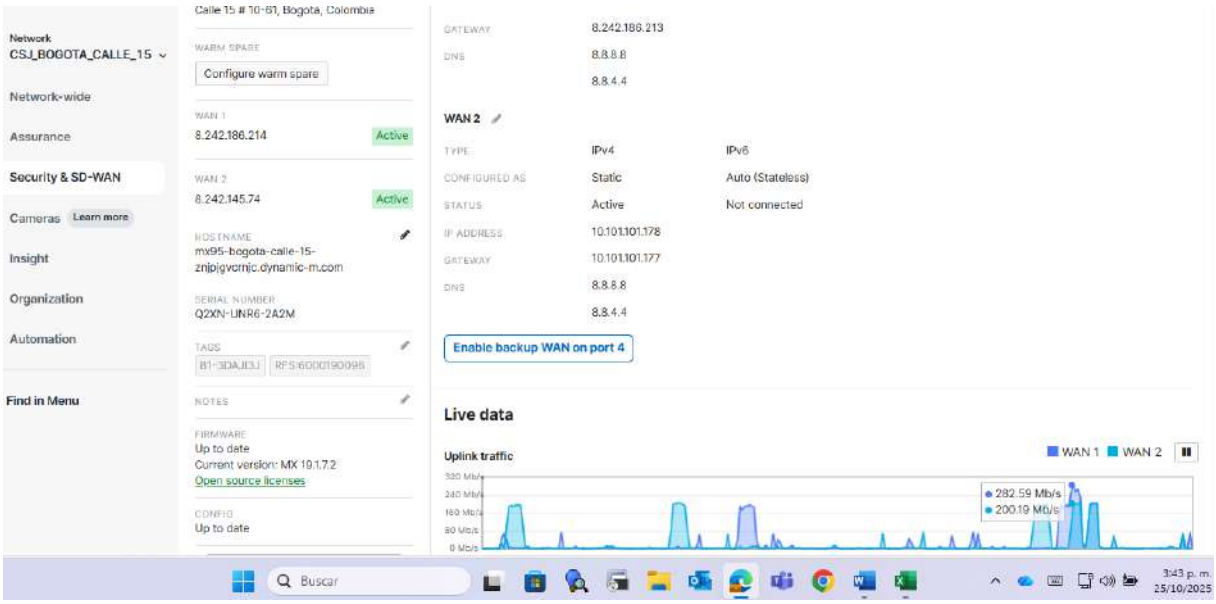


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2149	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 10 # 19-65	150 Mbps	152,77

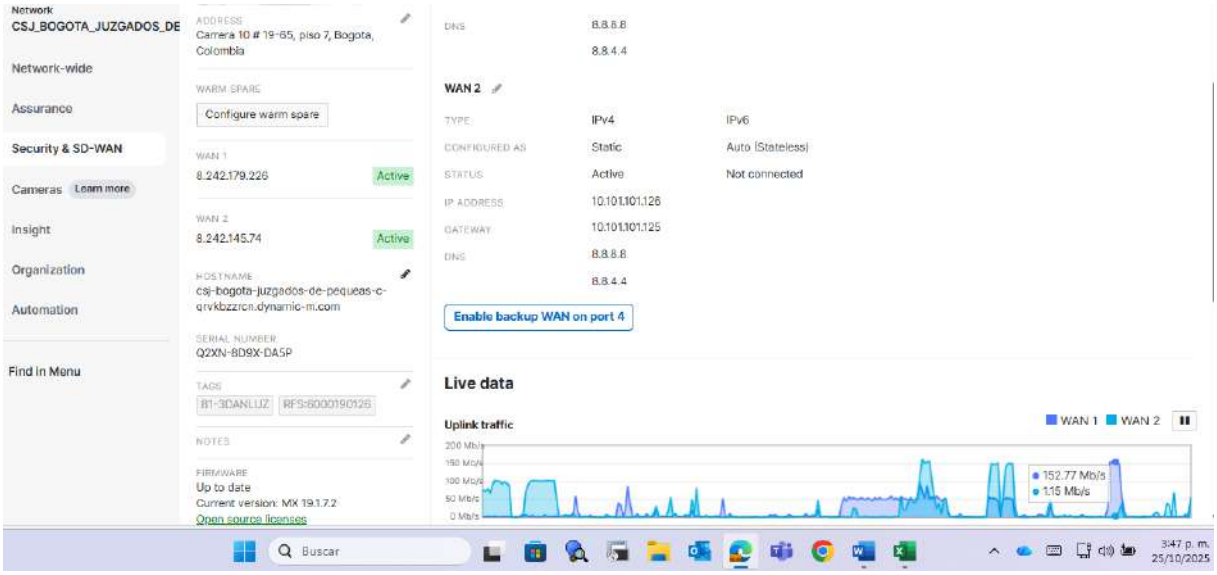


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2151	3	Cundinamarca, Cáqueza; Avenida 4 # 2-39	64 Mbps	98,51

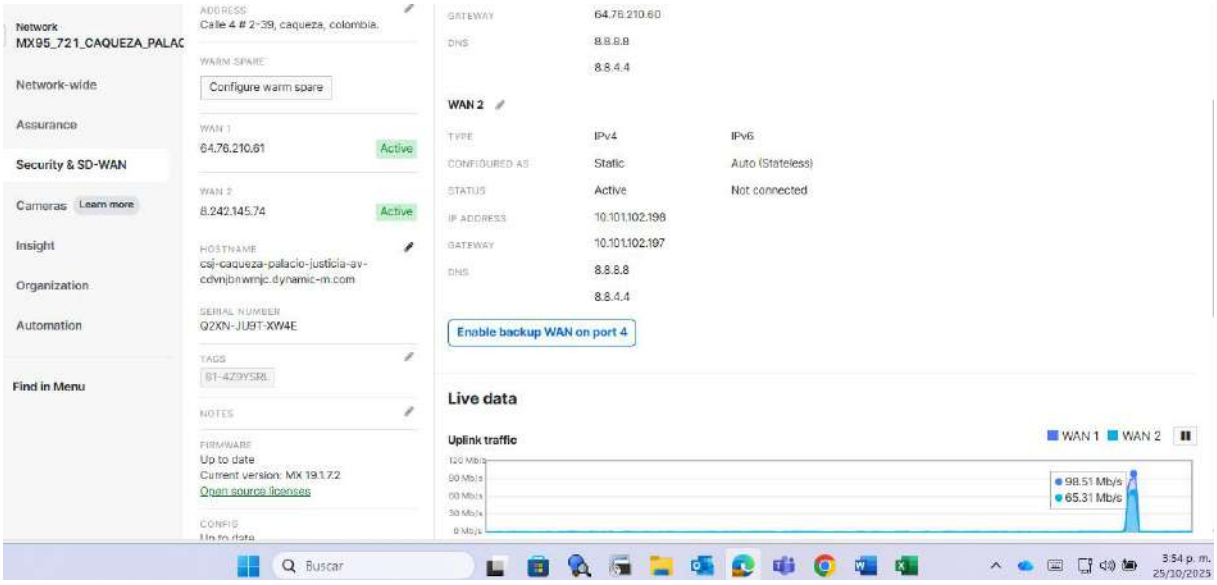


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1820	1	Atlántico, Barranquilla; Carrera 44 # 38-26,	256 Mbps	249,03

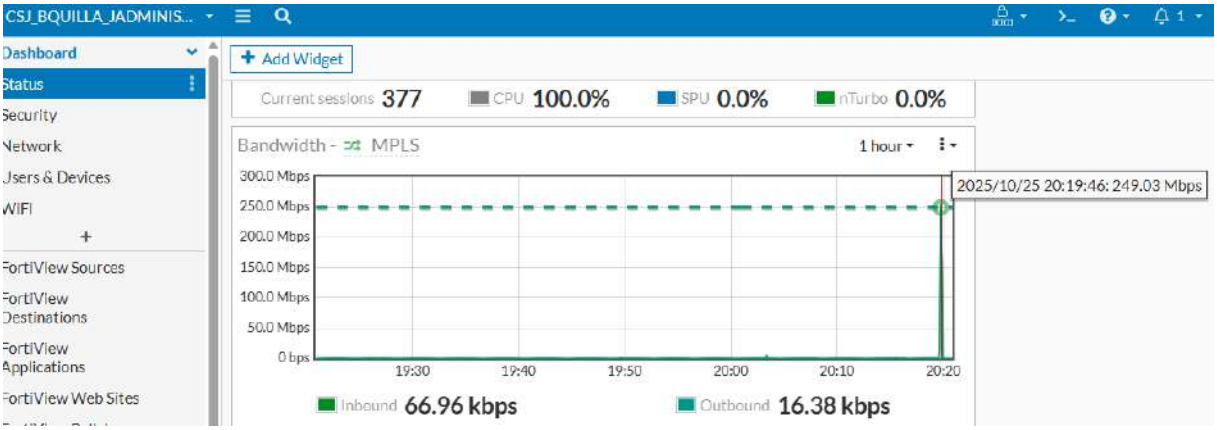


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1766	1	Santander, Bucaramanga; Calle 35 entre Cra 11 y 12,	576 Mbps	566

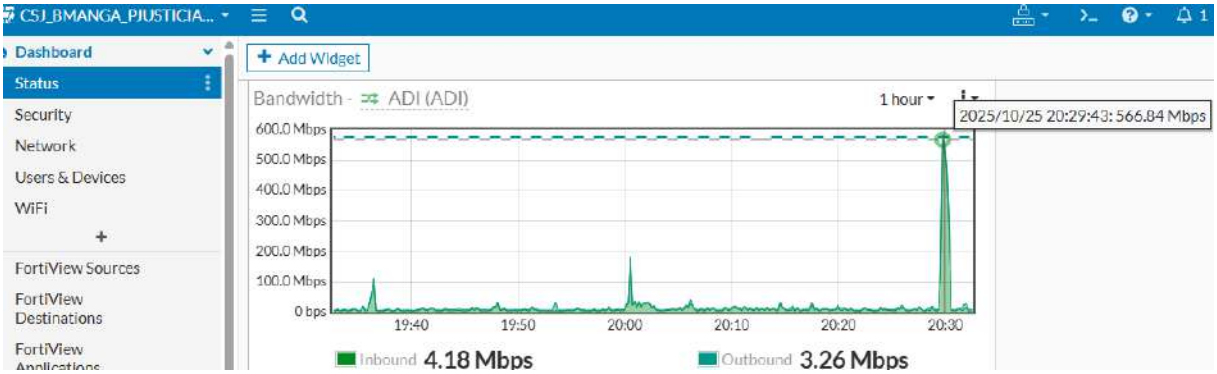


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1809	1	Tolima, Ibague; Carrera 2 # 9 Esquina, P Justicia	384 Mbps	369

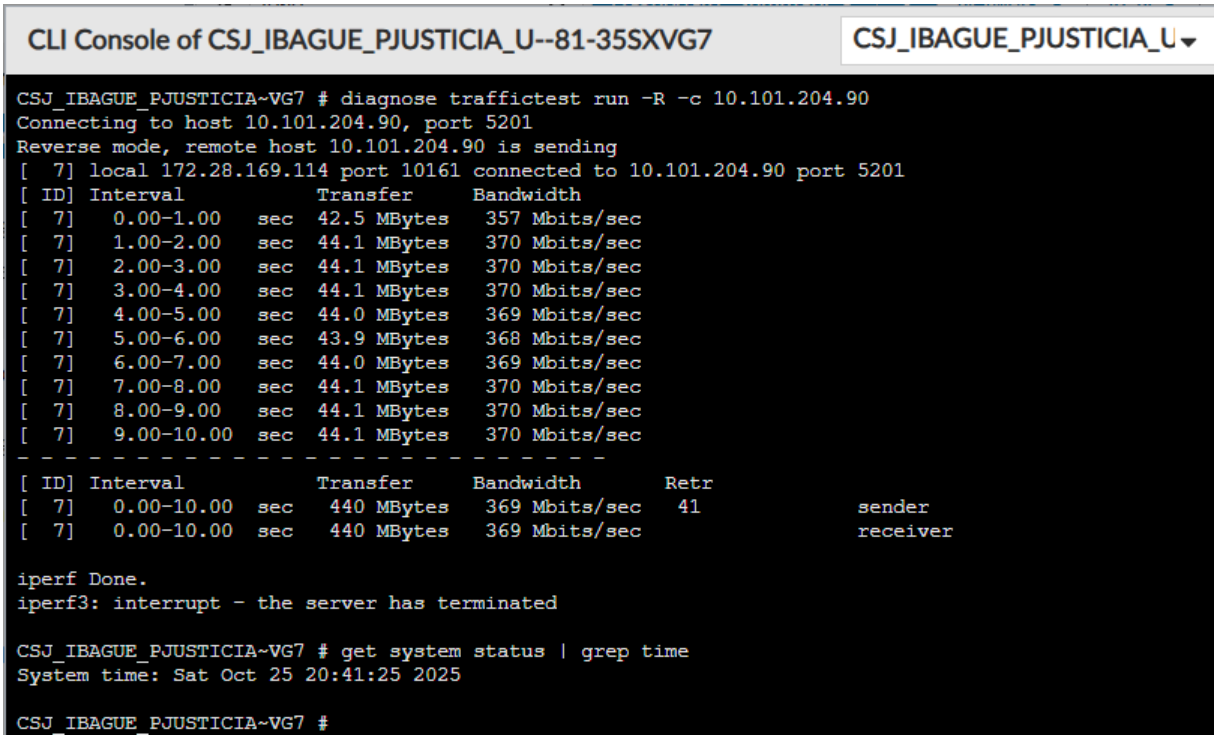


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3307	1	Bolívar, Cartagena; Juzgados Laborales	100 Mbps	94,38

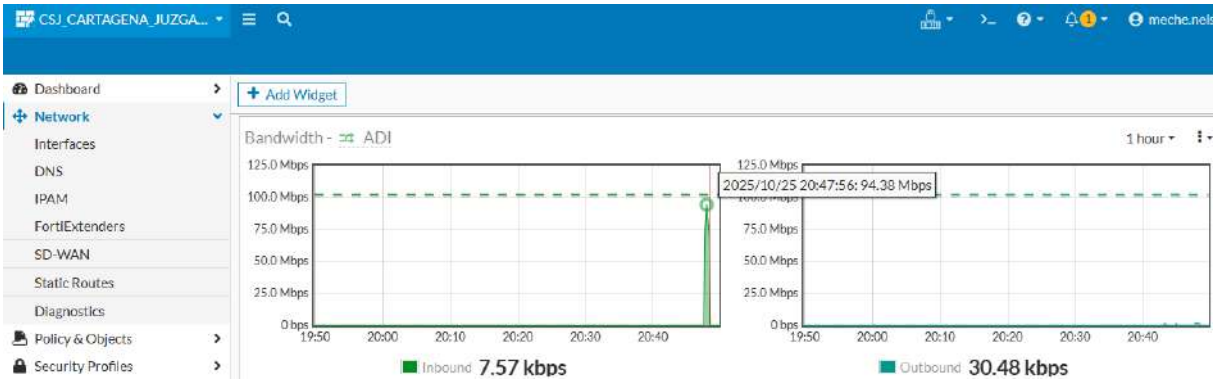


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3358	1	Bolívar, Cartagena; Juzgados Laborales	100 Mbps	102,99

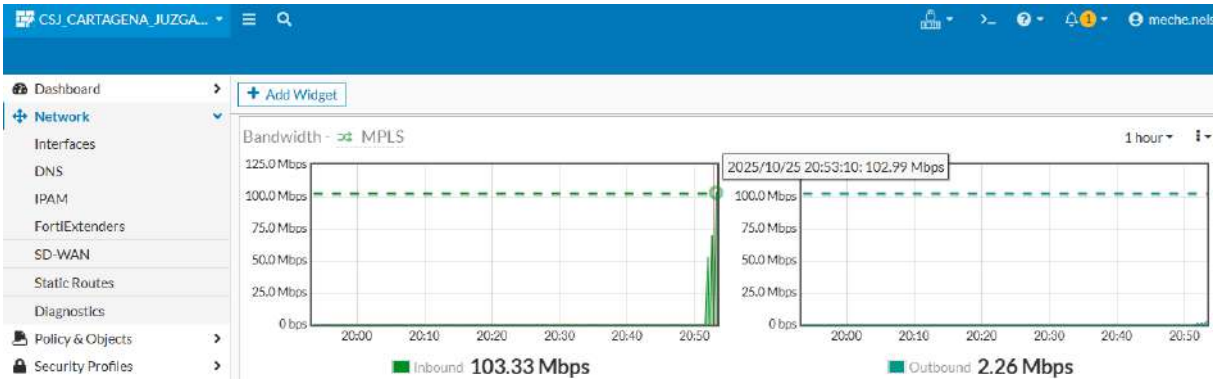


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3339	1	Santander, Bucaramanga; Carrera 12 # 31-08	64 Mbps	63,12

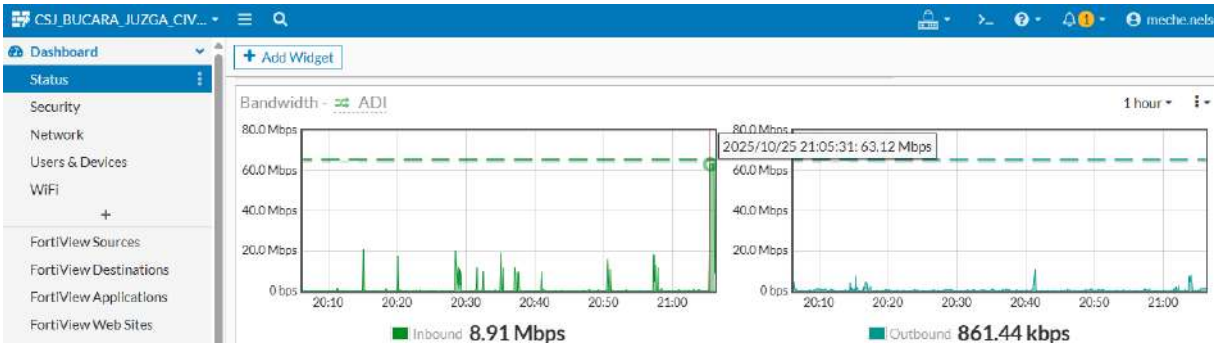


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3390	1	Santander, Bucaramanga; Carrera 12 # 31-08	64 Mbps	63,84

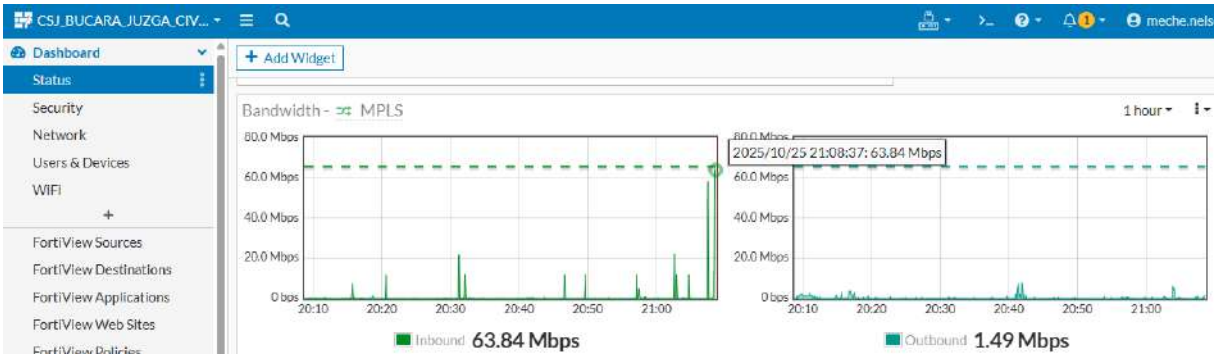


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1908	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 73 # 10 - 83	256 Mbps	263,78

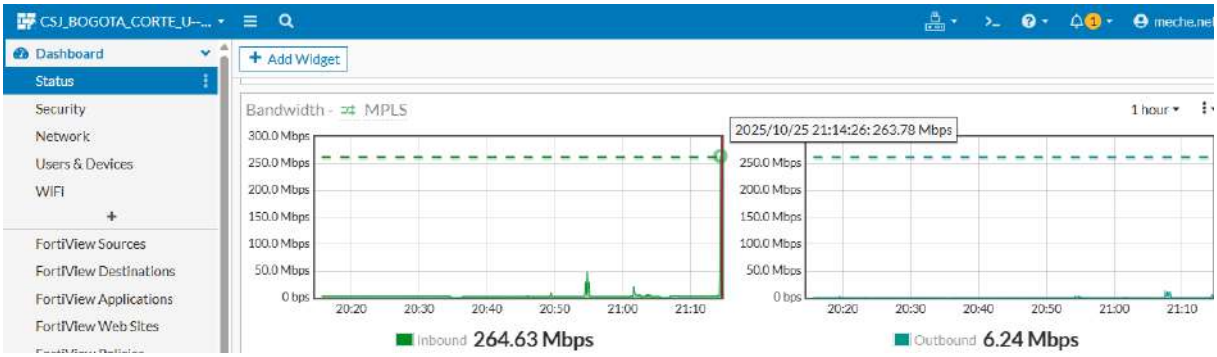


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2061	1	Carrera 7# 32-12, Sede Edificio San Martín, Torre Sur	150 Mbps	156,43

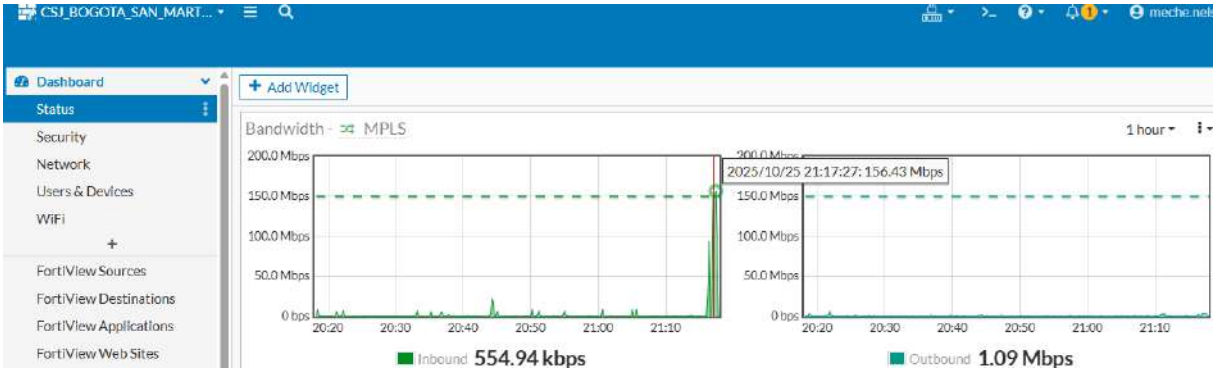


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1932	1	Carrera 7# 32-12, Sede Edificio San Martín, Torre Sur	150 Mbps	300,12

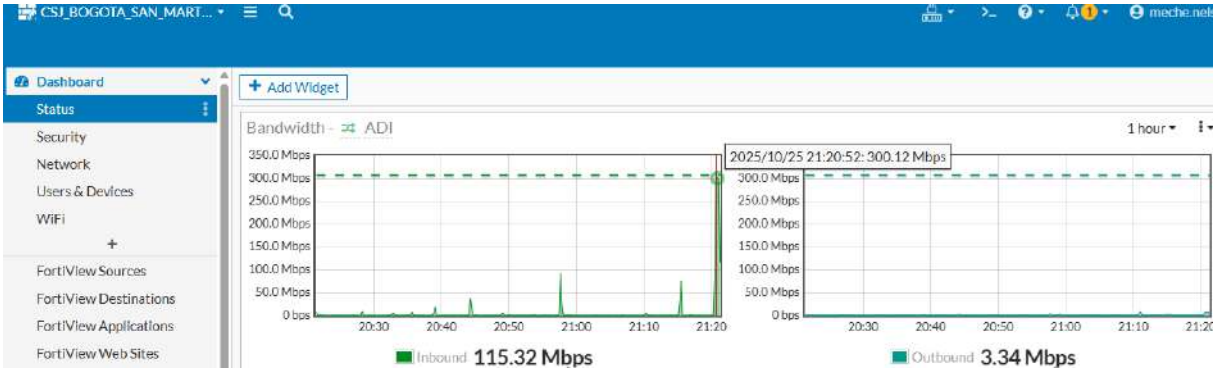


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2133	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 7 #17-64	300 Mbps	294,4

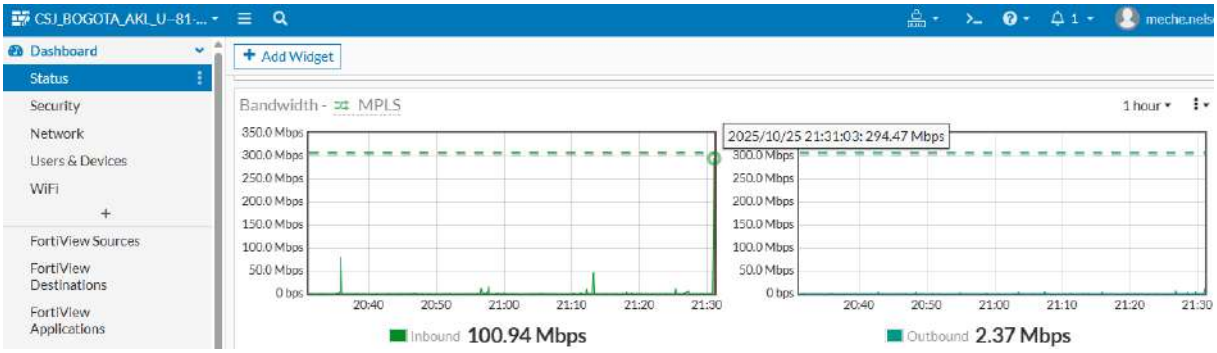


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2168	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 7 #17-64	300 Mbps	299,21

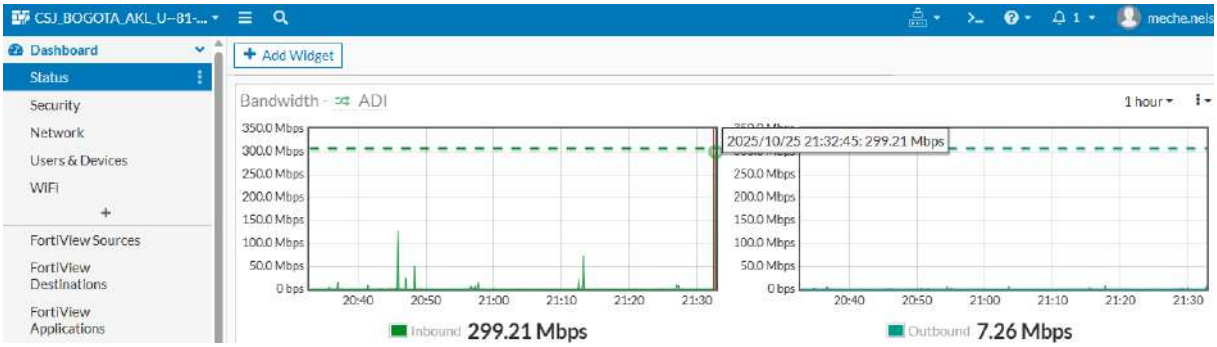


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1931	1	Antioquia, Medellín; Calle 41 # 52-28 edificio Edatel	512 Mbps	496,71

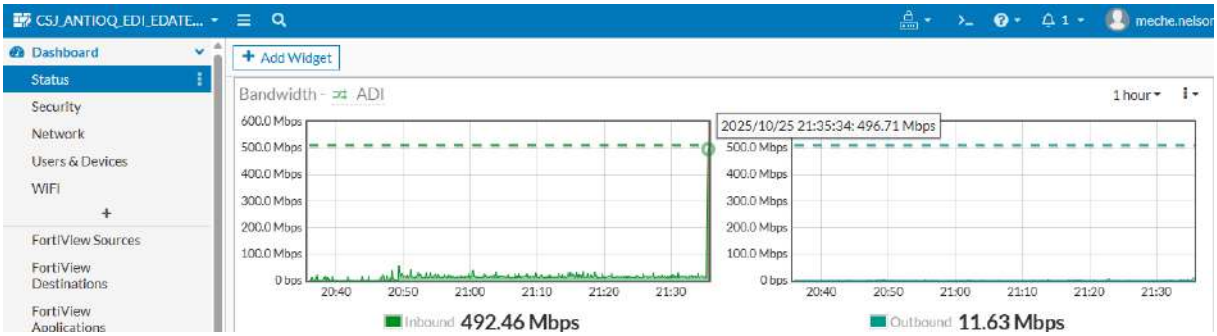


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1964	1	Antioquia, Medellín; Calle 41 # 52-28 edificio Edatel	512 Mbps	503,03

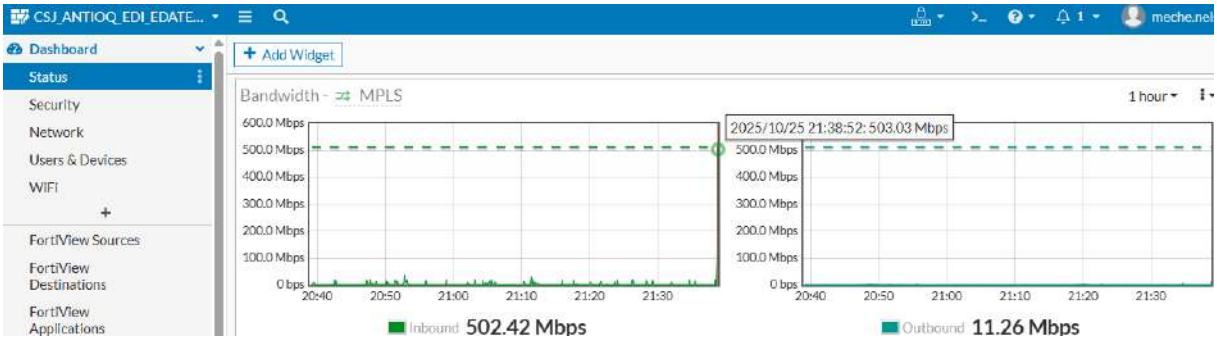


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1944	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 11 # 9-24	200 Mbps	197,56

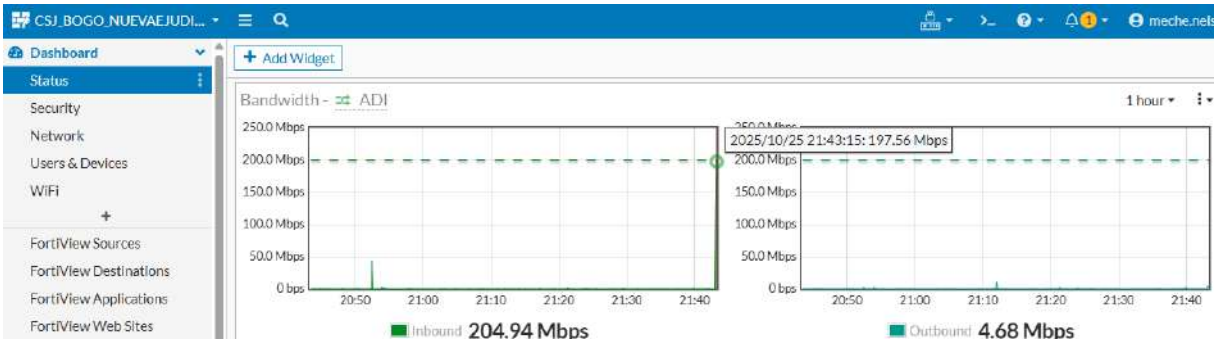


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1972	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 11 # 9-24	200 Mbps	198,23

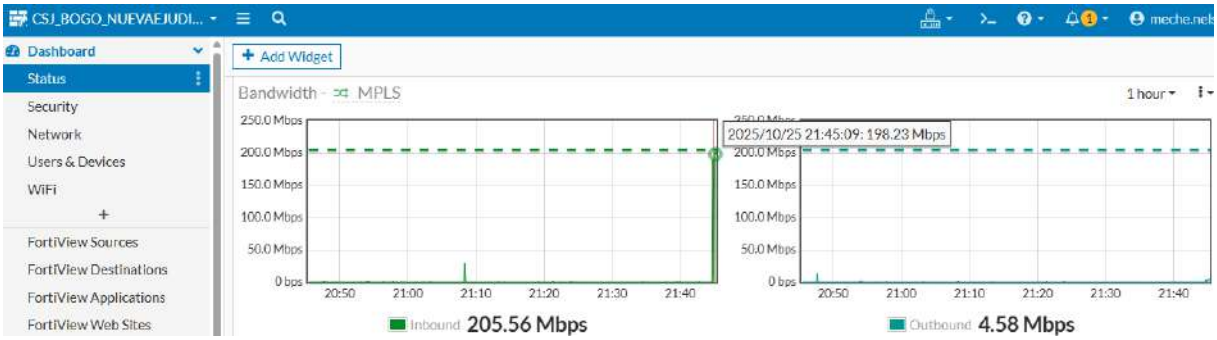


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
4001	1	Cundinamarca, Bogotá; Cra. 7 # 27-18 Piso 10	800 Mbps	735,93

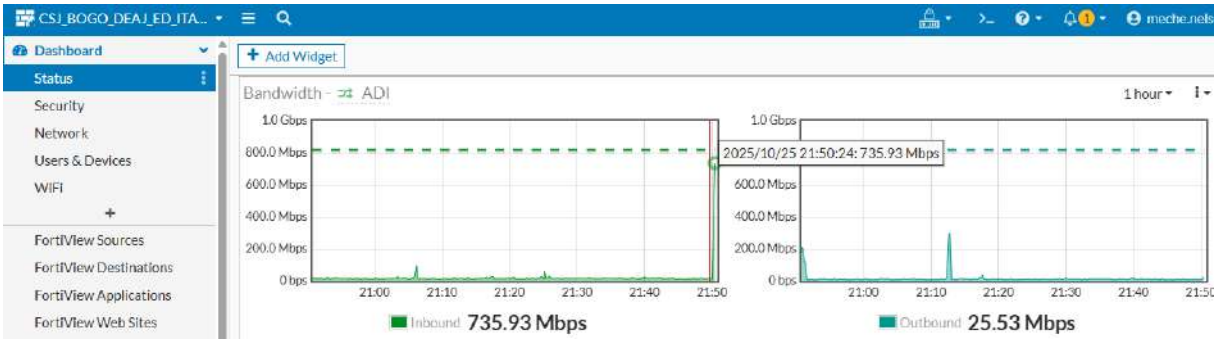


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
4000	1	Cundinamarca, Bogotá; Cra. 7 # 27-18 Piso 10	800 Mbps	750

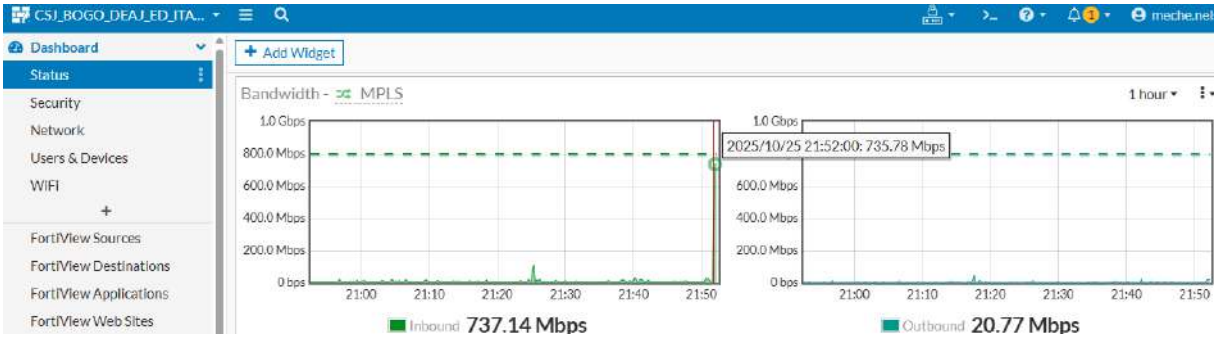


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1938	1	Caldas, Manizales; Calle 27 # 17-19,	256 Mbps	243,28

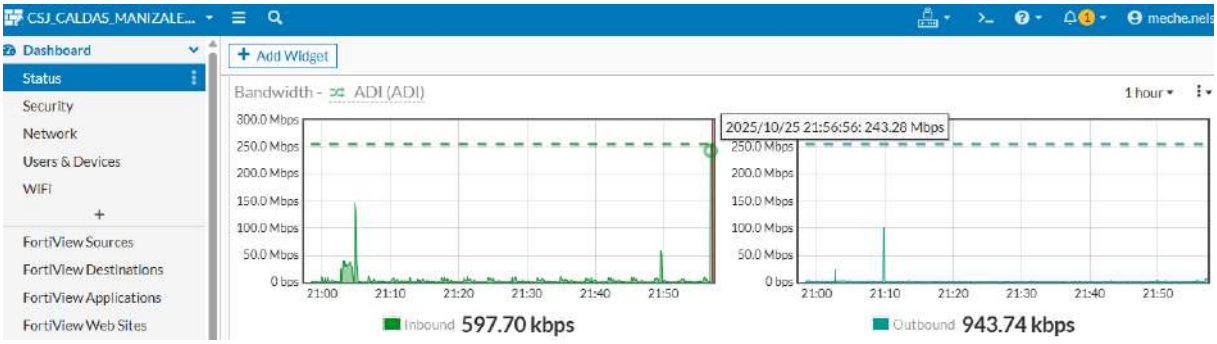


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1965	1	Caldas, Manizales; Calle 27 # 17-19,	256 Mbps	253,10

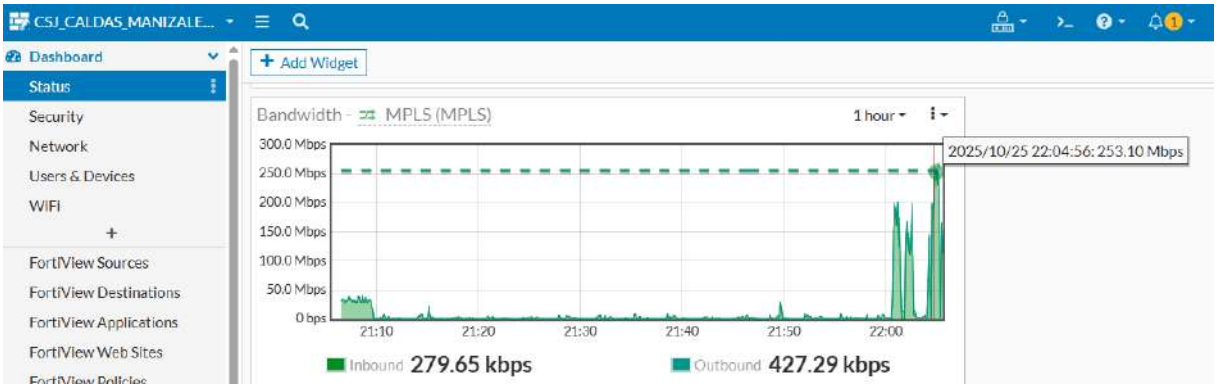

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1945	2	Boyacá, Sogamoso; Cra. 9 # 12 -12	128 Mbps	127,5

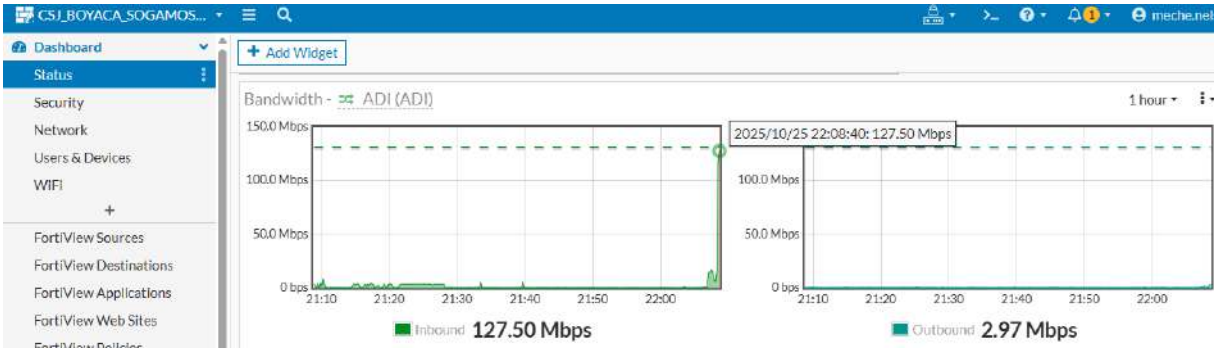


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1973	2	Boyacá, Sogamoso; Cra. 9 # 12 -12	128 Mbps	125,79

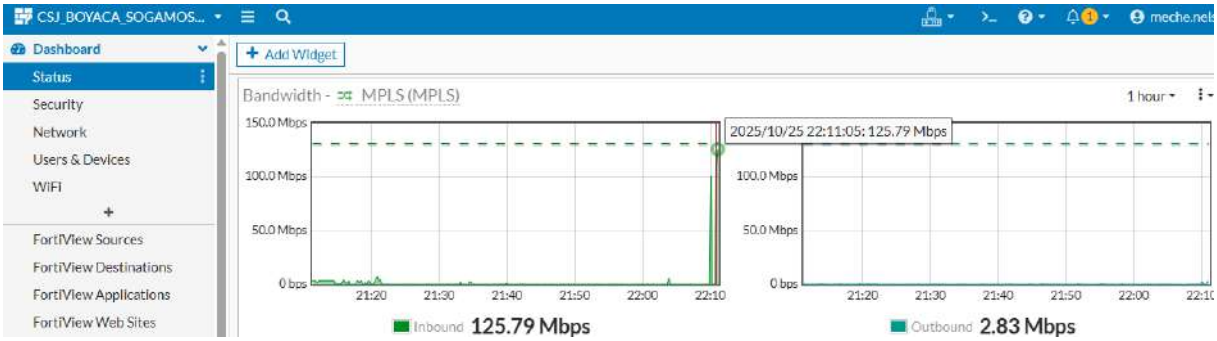


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5033	3	Magdalena, Fundación; Carrera 10 # 5 B-52, PJ	50 Mbps	51,83




PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5174	3	Magdalena, Fundación; Carrera 10 # 5 B-52, PJ	50 Mbps	53,68

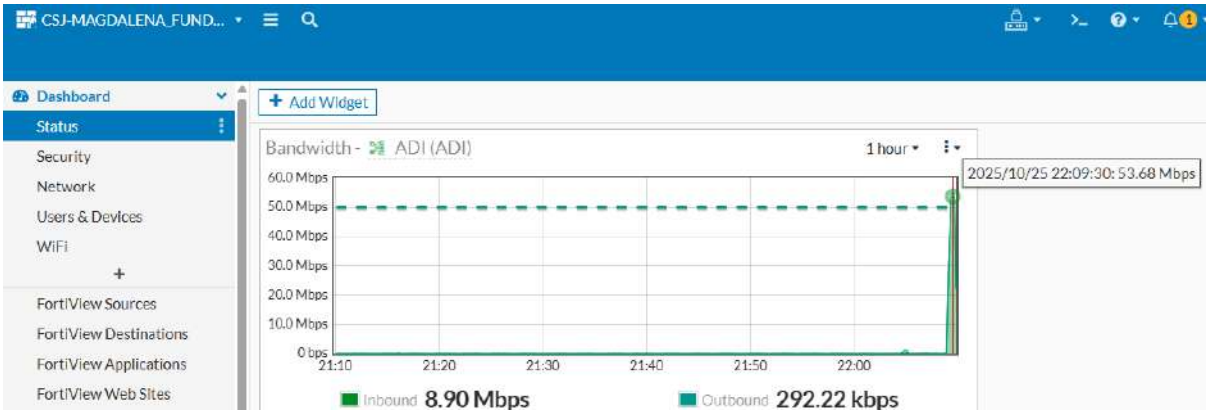


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5041	3	Nariño, San Andrés de Tumaco; Calle 11 # 9-2	50 Mbps	49,33

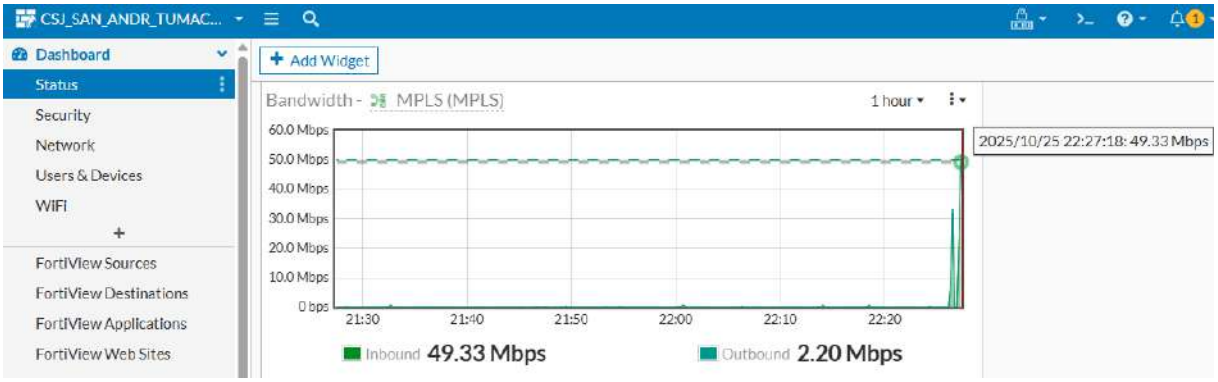


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1797	1	Valle Del Cauca, Cali; Carrera 10 # 12-15, P	750 Mbps	694,26

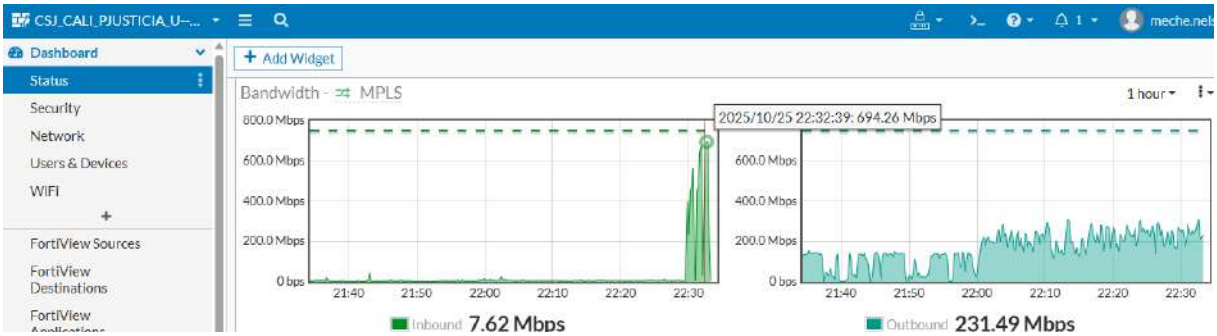


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5064	2	Valle Del Cauca, Tuluá; Calle 26 carrera 27 esquina	128 Mbps	122,28

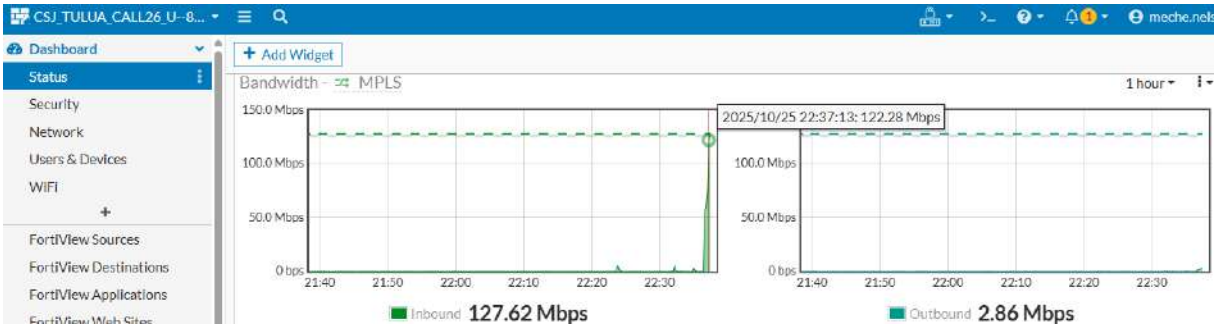


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5065	1	Cundinamarca, Facatativá; Carrera 1 # 1e 27	64 Mbps	65,02

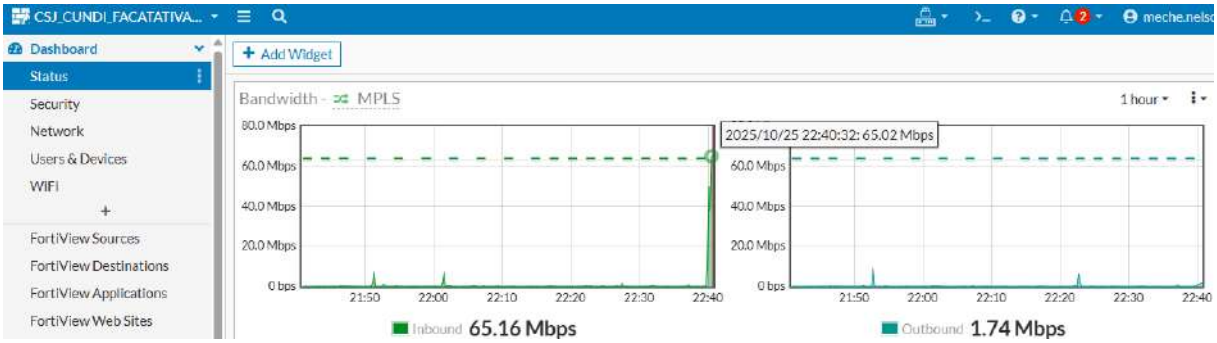


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5066	1	Boyacá, Tunja; Carrera 1a N° 46-08	64 Mbps	62,85

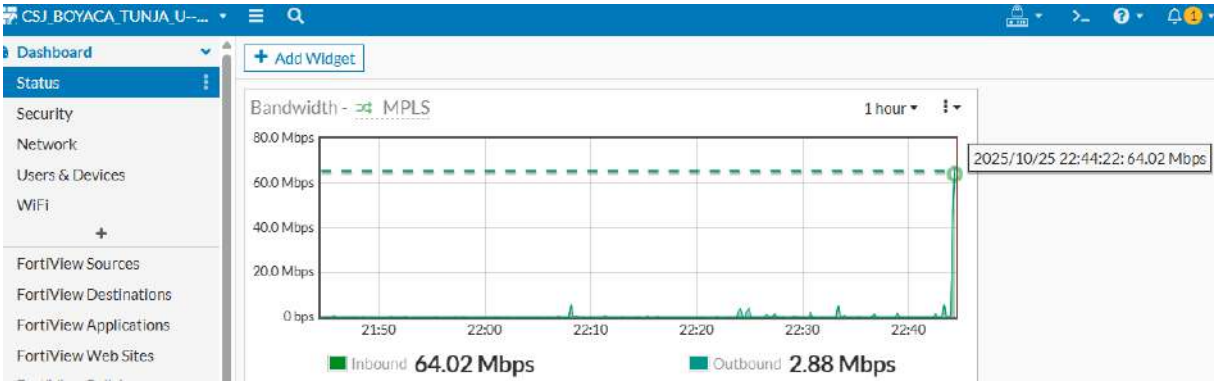


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5071	2	Cauca, Popayán; Calle 2da con carrera 8va	64 Mbps	66,39

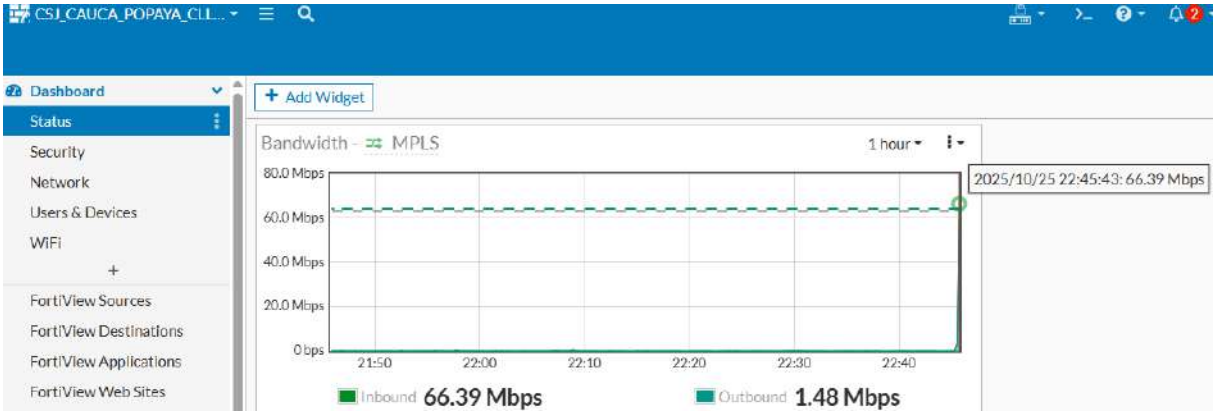


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5067	1	Meta, Villavicencio; Calle 5 # 22-75 Dir Seccional	50 Mbps	53,19

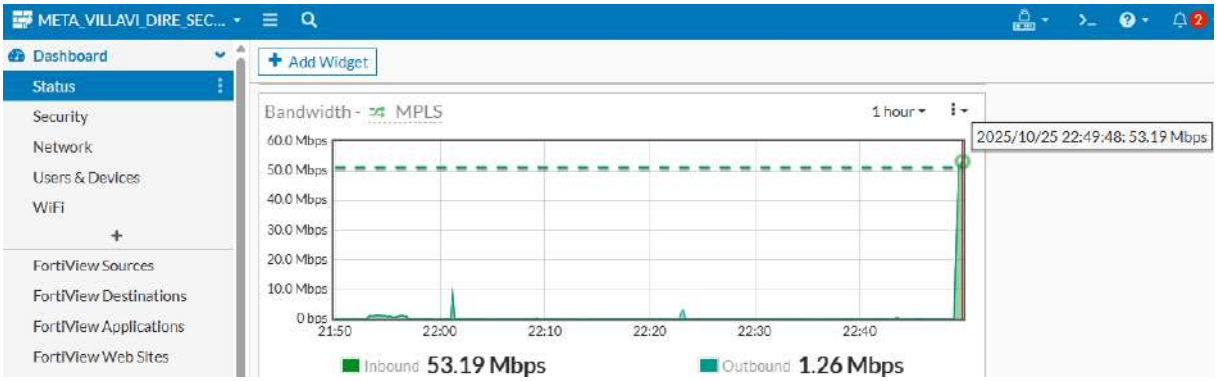


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5068	1	Cundinamarca, Bogotá; Av. Carrera 7 # 73-55	50 Mbps	49,65

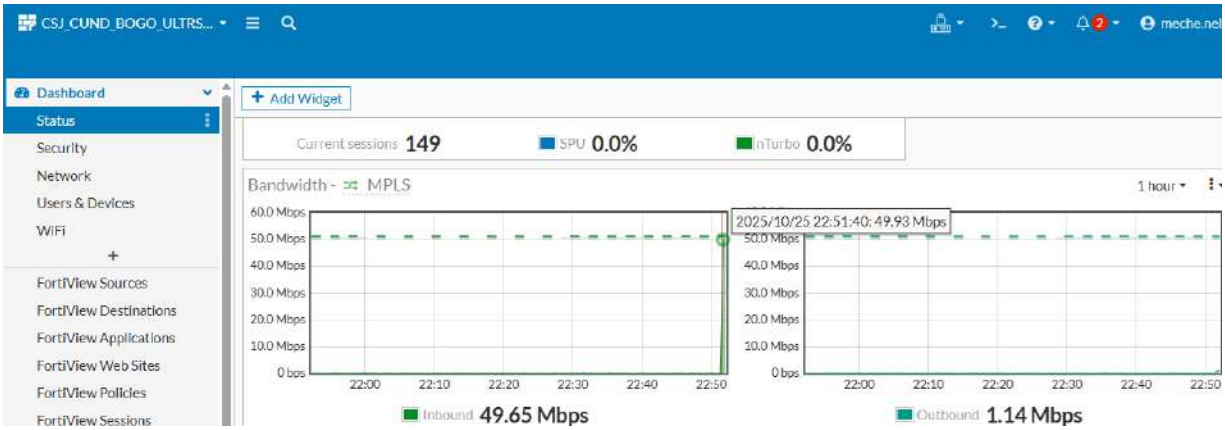


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2104	1	Atlántico, Barranquilla; Via 40 # 73-50	240 Mbps	253,64

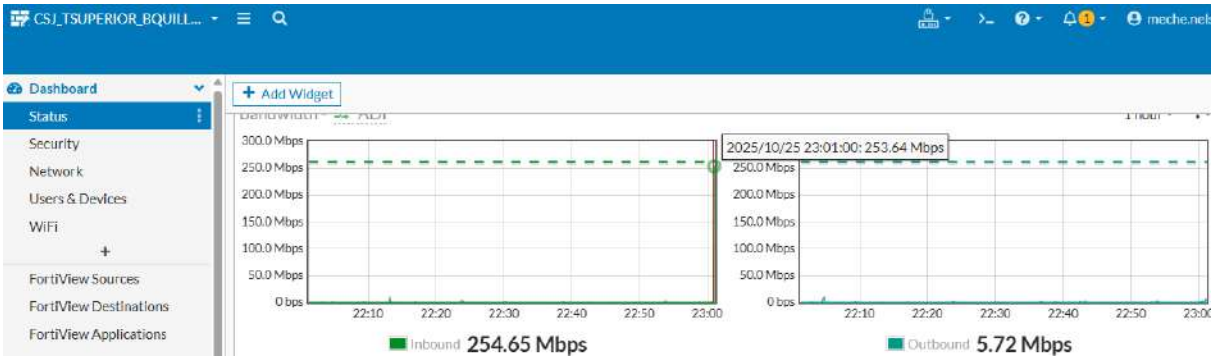


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2139	1	Atlántico, Barranquilla; Via 40 # 73-50	240 Mbps	252,8

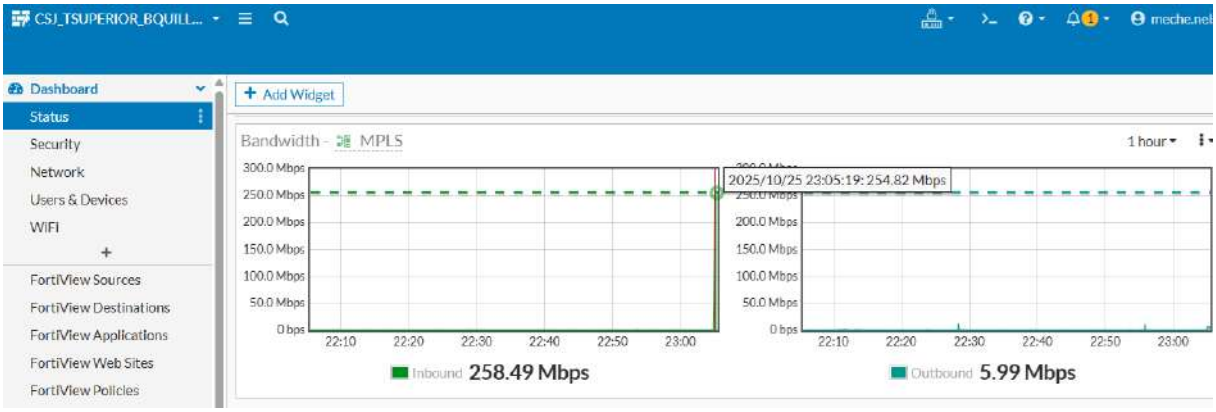


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5061	1	Valle, Buga; Calle 8 # 14 - 47 - Sede Tribunales	256 Mbps	311,27

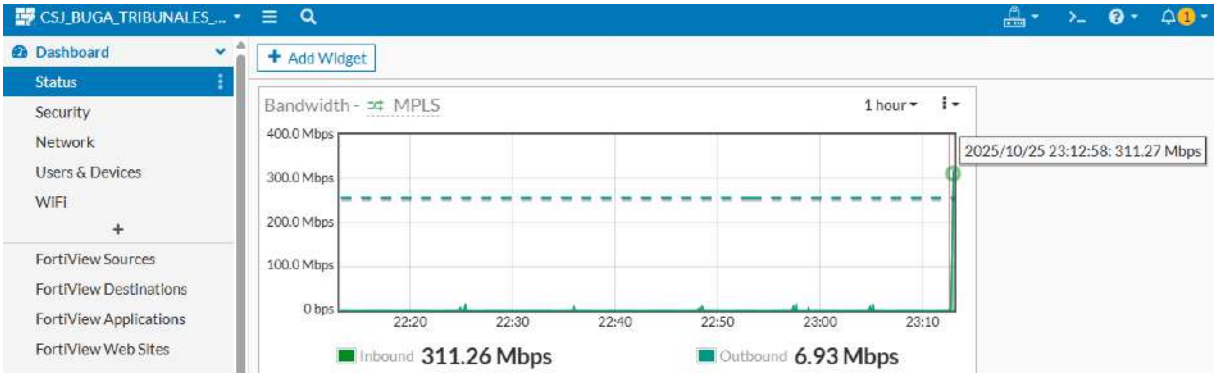


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5060	2	Casanare, Yopal; Calle 7 # 19- 71 Piso 2	50 Mbps	48,74

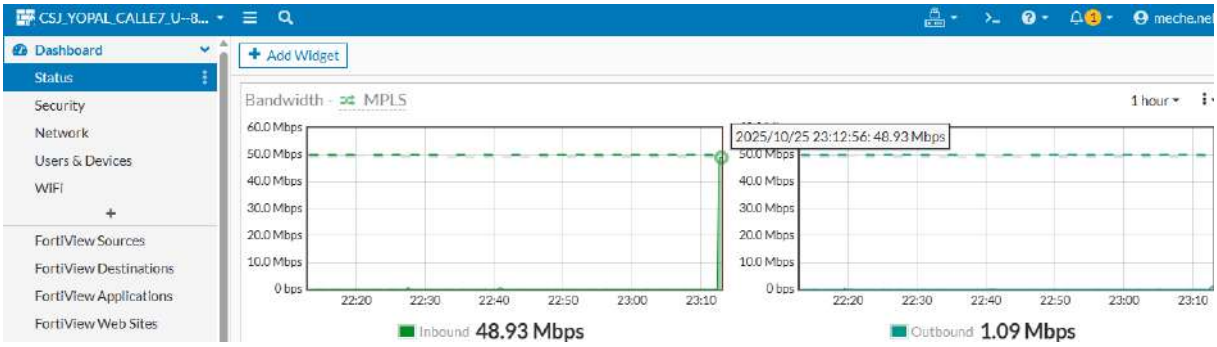


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5154	3	Bolívar, Magangué; Carrera 3B No. 6-09	50 Mbps	46,38

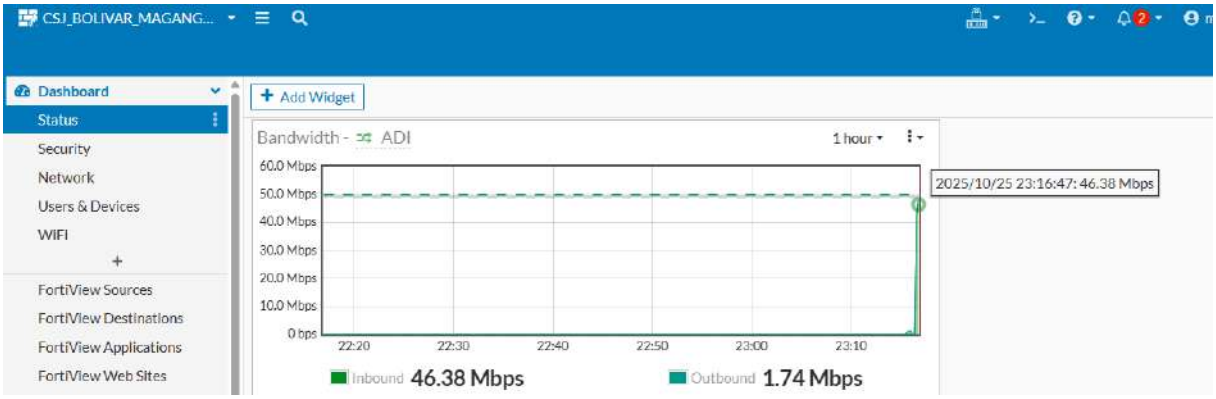


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5013	3	Bolívar, Magangué; Carrera 3B No. 6-09	50 Mbps	51,3

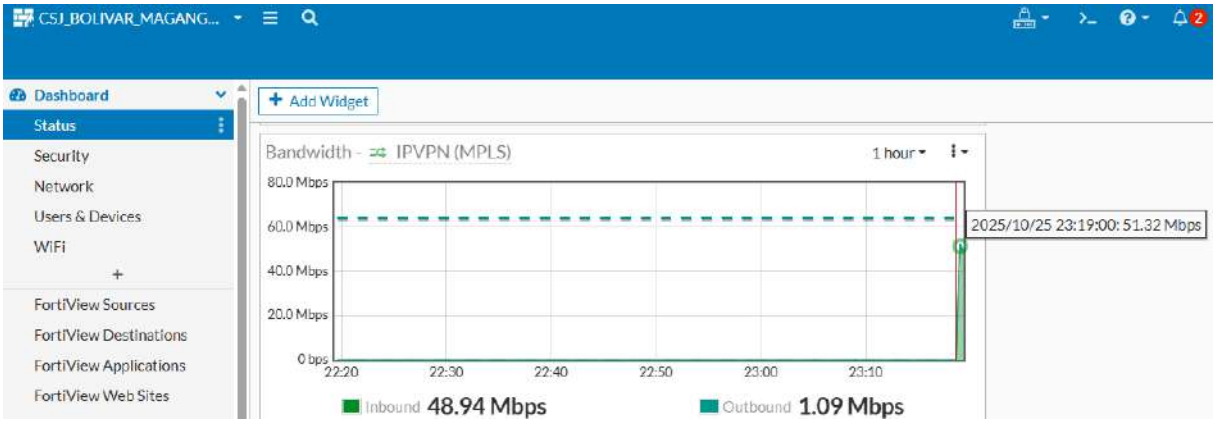


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5170	3	La Guajira, Maicao; Calle 14 No 11-68	64 Mbps	66,18

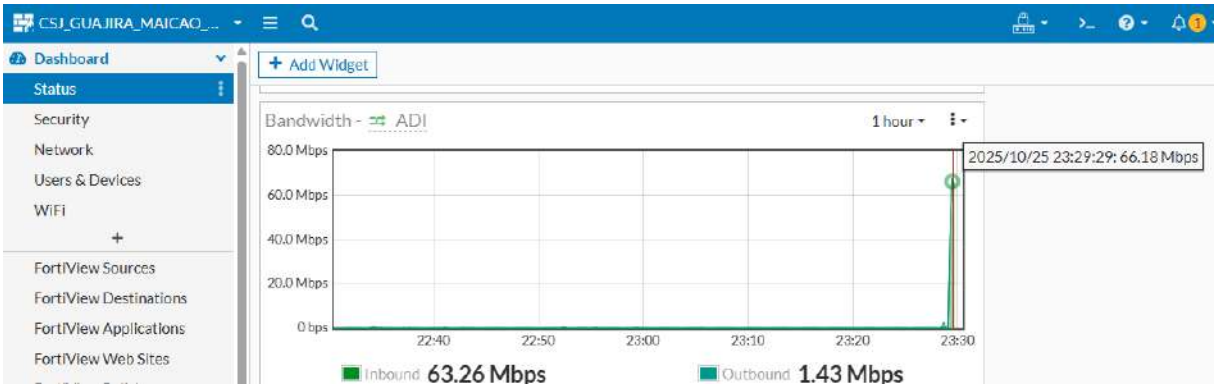


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5029	3	La Guajira, Maicao; Calle 14 No 11-68	64 Mbps	66,37

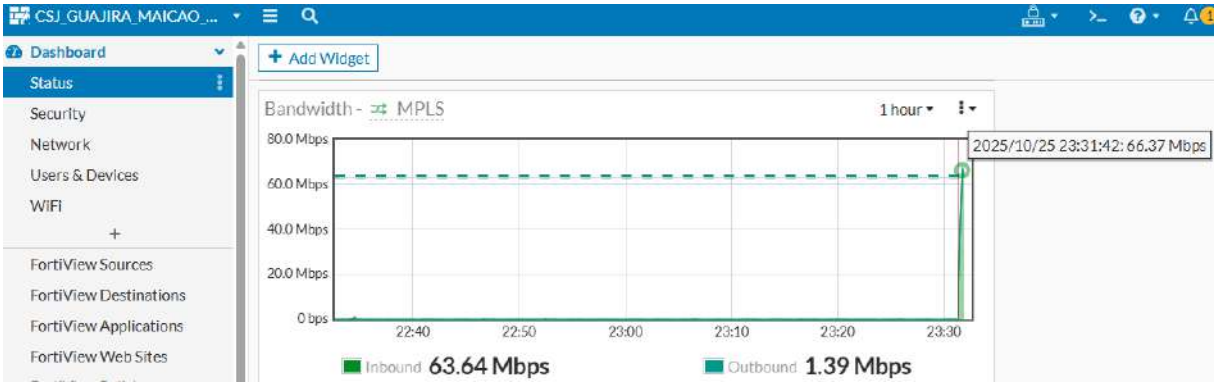


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5059	1	Santander, Piedecuesta; CRA 15 No. 3AN - 10	50 Mbps	49,65

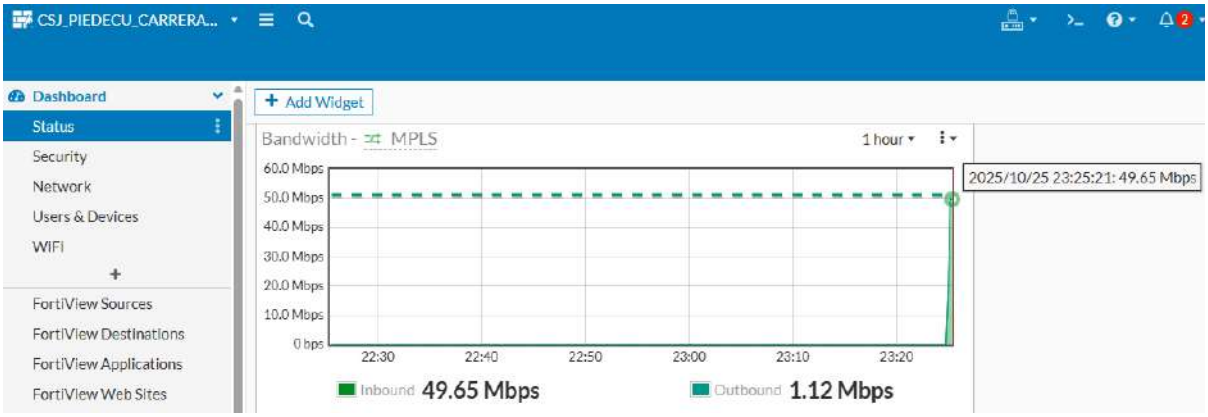


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5043	2	Norte de Santander, Los Patios; Calle 36 # 0-28	64 Mbps	63,47

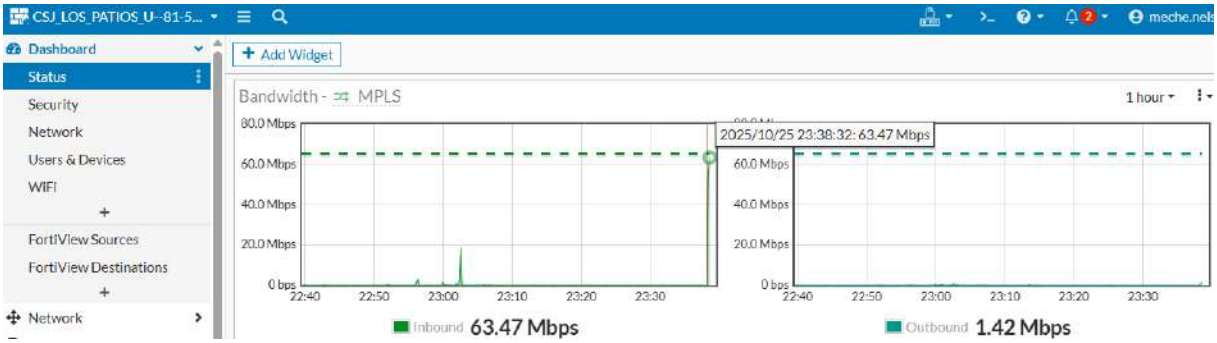


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1805	1	Magdalena, Santa Marta; Carrera 5 # 22-25 Piso 5	128 Mbps	131,92

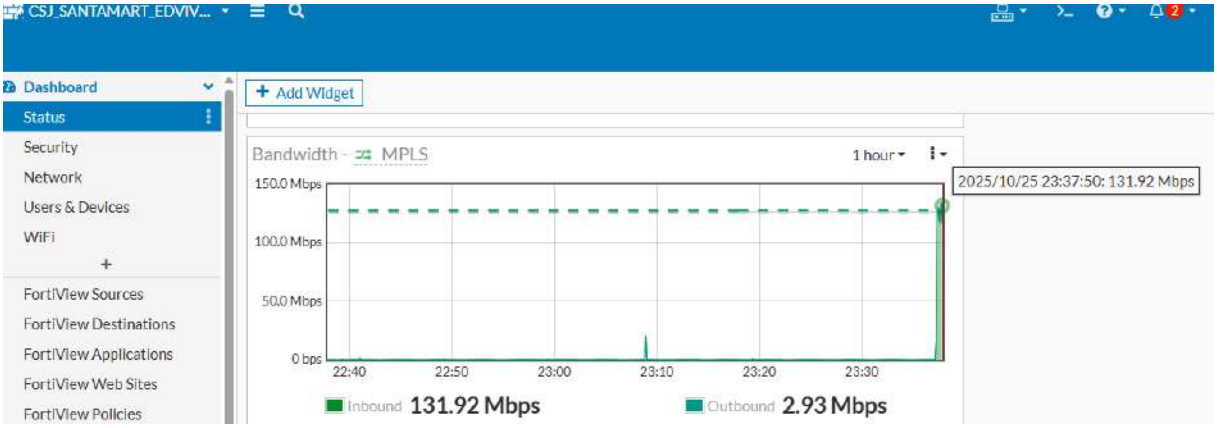


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5051	1	Santander, Piedecuesta; Carrera 6 # 9-82	50 Mbps	49,02

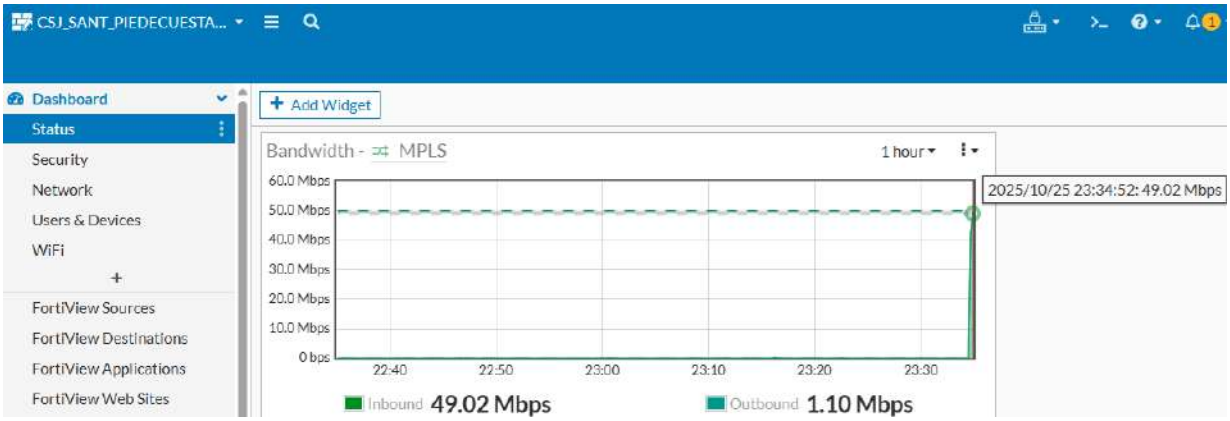


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5017	4	Caldas, Salamina; Carrera 7 # 4-73	50 Mbps	49,30

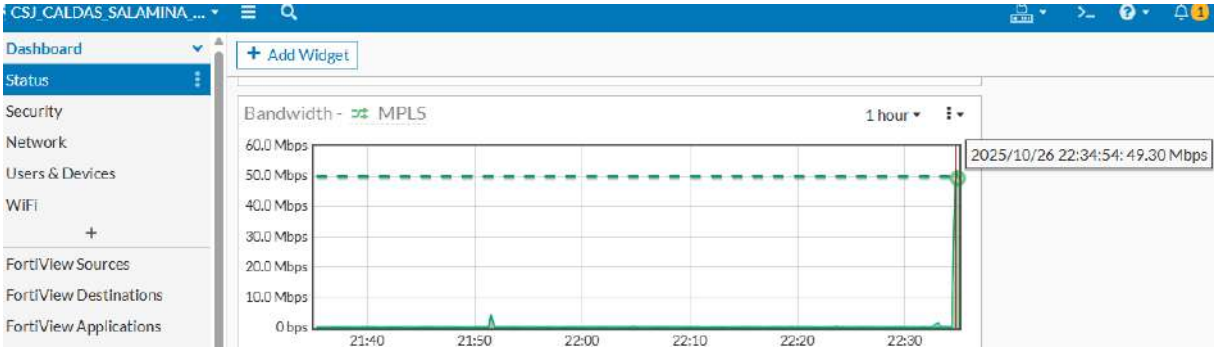


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5158	4	Caldas, Salamina; Carrera 7 # 4-73	50 Mbps	49,30

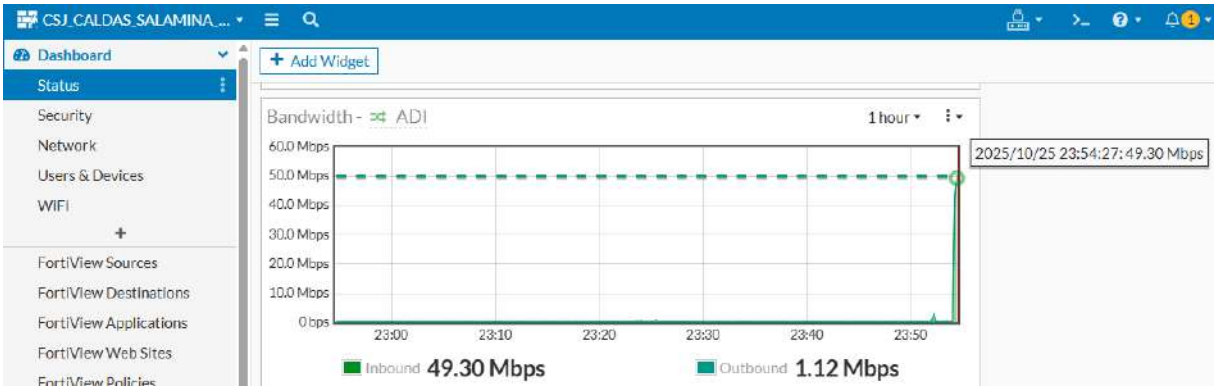


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5050	4	Santander, Malaga; Carrera 8 # 13-13	50 Mbps	50,58

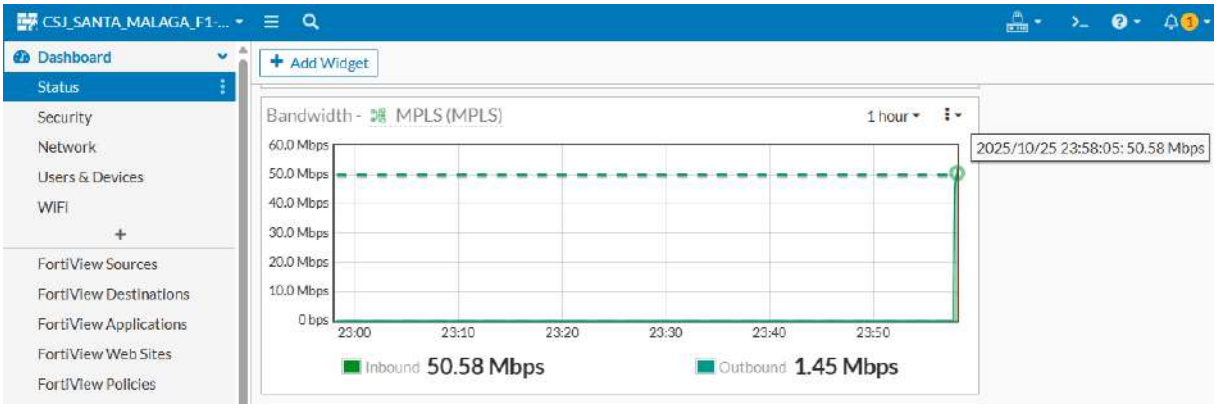


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5191	4	Santander, Malaga; Carrera 8 # 13-13	50 Mbps	50,80

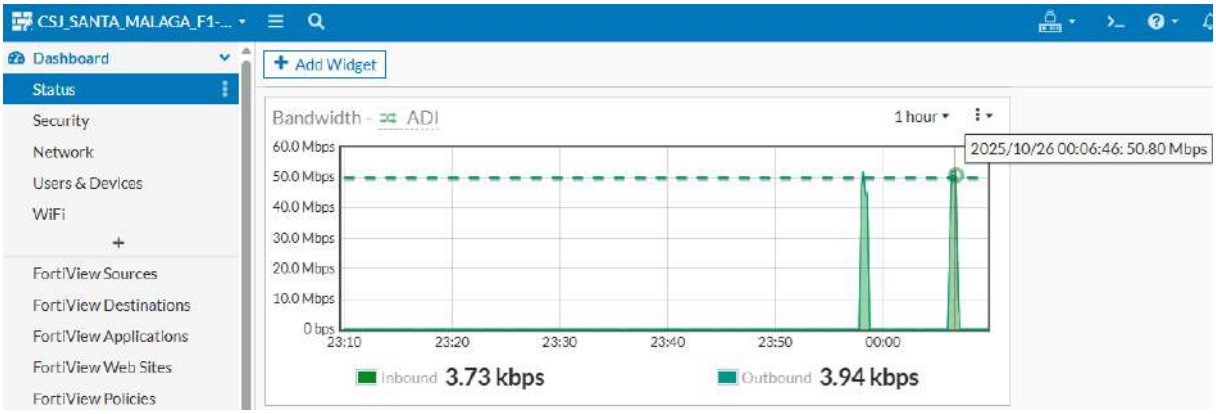


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1832	3	La Guajira, Riohacha; Calle 8 # 12-89	128 Mbps	126,57

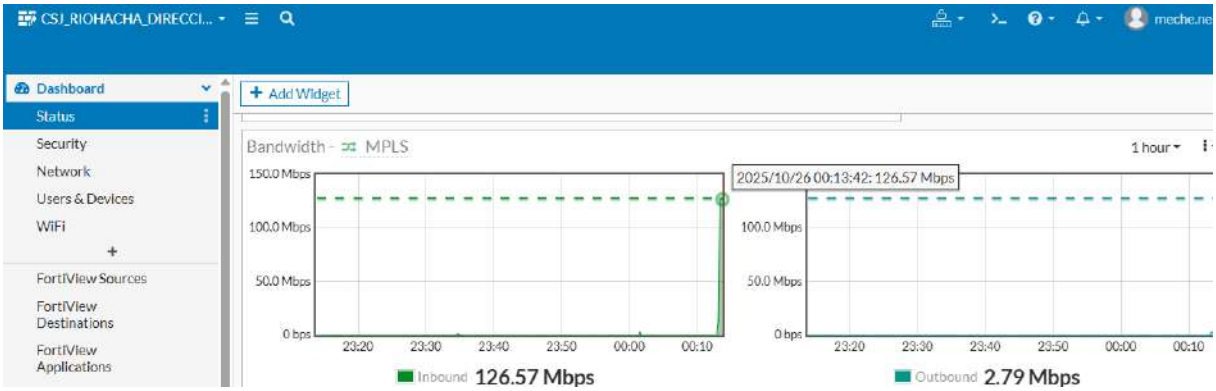


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5055	3	Sucre, San Marcos; Calle 18 # 24-72, Pal. justicia	50 Mbps	49,72

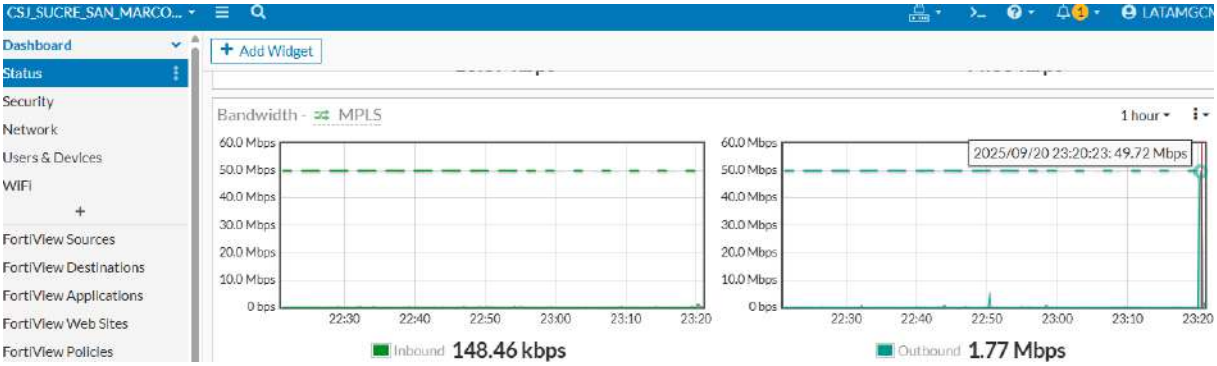


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5196	3	Sucre, San Marcos; Calle 18 # 24-72, Pal. justicia	50 Mbps	52,18

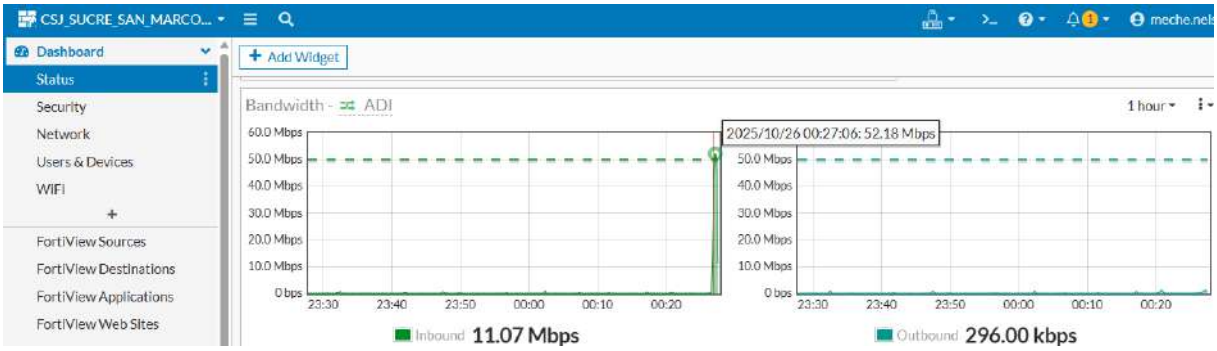


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5058	2	Valle Del Cauca, Buenaventura; Calle 3 # 5-41	64 Mbps	63,27

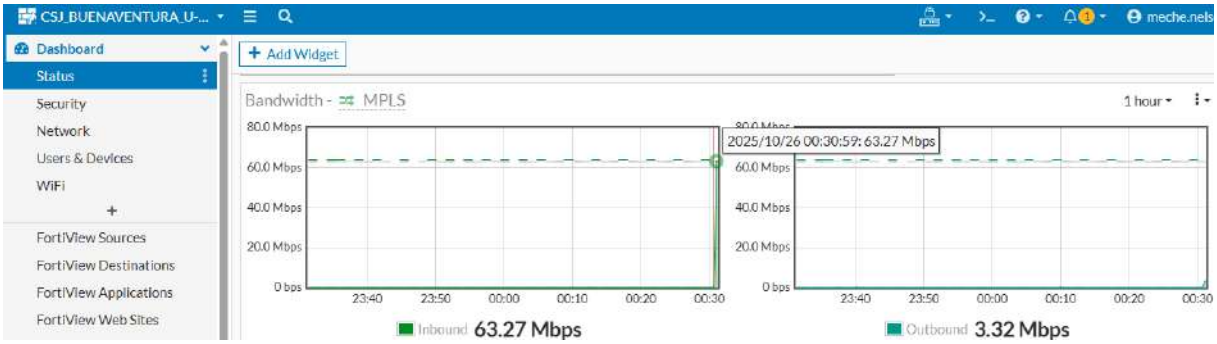


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5049	1	Santander, Floridablanca; Carrera 10 # 04-48/ 4-54	50 Mbps	49,21

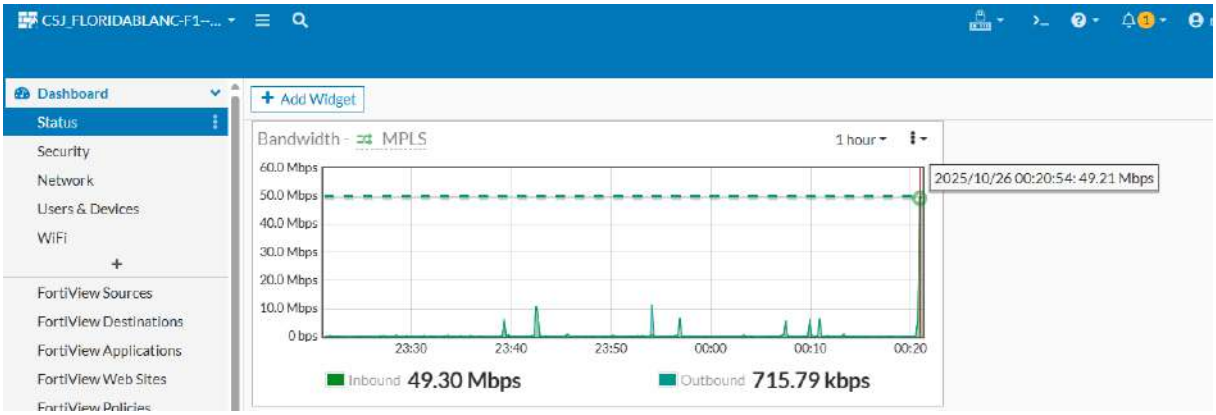

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5048	1	Santander, Bucaramanga; Carrera 11 # 34-52 CAM	64 Mbps	63,48

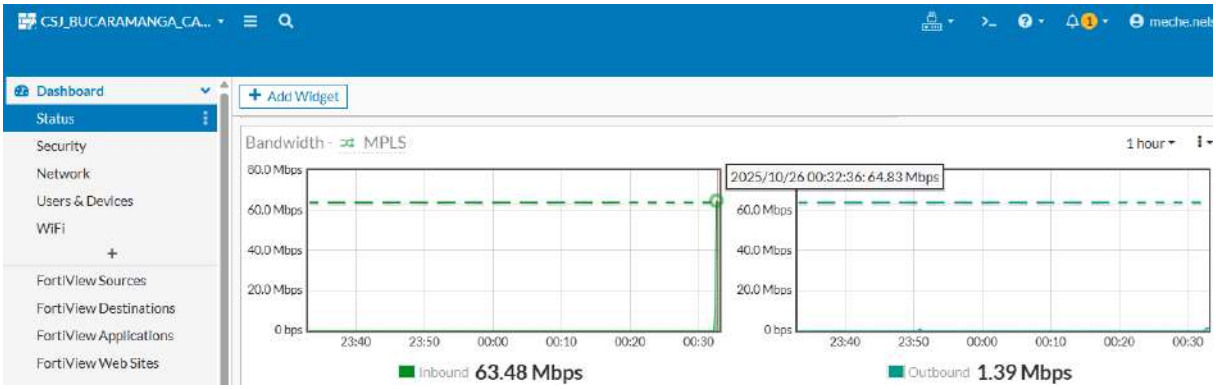

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5203	3	Guaviare, San José del Guaviare; Calle 10 Nro 22-51	50 Mbps	49,5

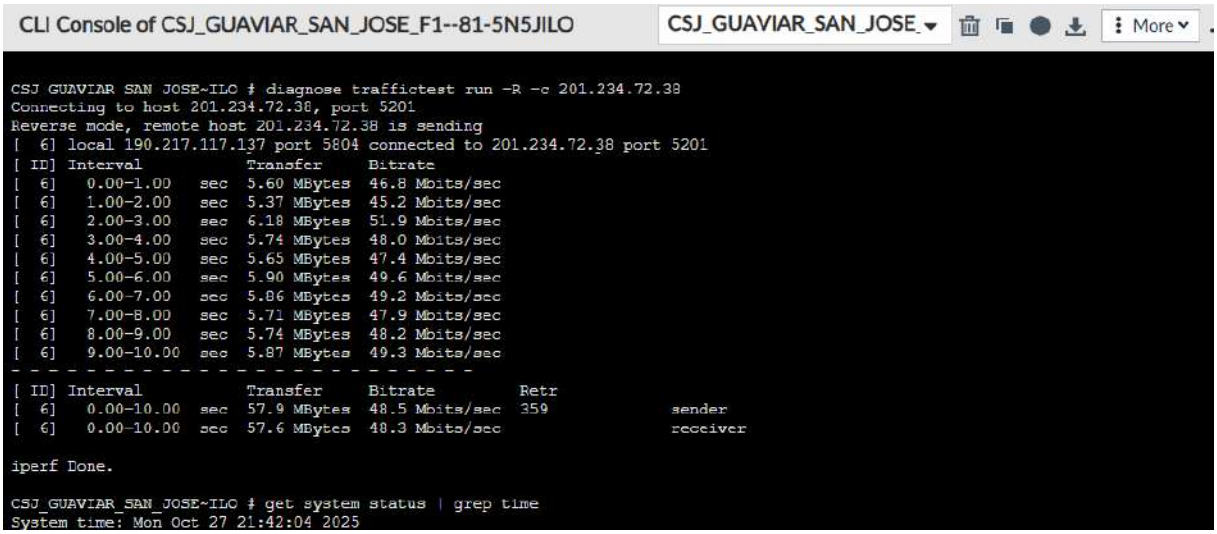

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5062	3	Guaviare, San José del Guaviare; Calle 10 Nro 22-51	50 Mbps	53,7

CLI Console of CSJ_GUAVI_SAN_JOSE_F1_--81-5N5J2EU — CSJ_GUAVI_SAN_JOSE_F1

```
server-intf:    MPLS

CSJ_GUAVI_SAN_JOSE_F~2EU # diagnose traffictest client-intf MPLS
client-intf:    MPLS

CSJ_GUAVI_SAN_JOSE_F~2EU # diagnose traffictest port 5201
port:   5201


CSJ_GUAVI_SAN_JOSE_F~2EU # diagnose traffictest run -R -c 10.101.204.90
Connecting to host 10.101.204.90, port 5201
Reverse mode, remote host 10.101.204.90 is sending
[  6] local 10.101.200.122 port 11837 connected to 10.101.204.90 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  6]   0.00-1.00   sec  7.33 MBytes  61.5 Mbits/sec
[  6]   1.00-2.00   sec  7.29 MBytes  61.0 Mbits/sec
[  6]   2.00-3.00   sec  7.28 MBytes  61.2 Mbits/sec
[  6]   3.00-4.00   sec  7.31 MBytes  61.2 Mbits/sec
[  6]   4.00-5.00   sec  7.31 MBytes  61.3 Mbits/sec
[  6]   5.00-6.00   sec  4.73 MBytes  39.7 Mbits/sec
[  6]   6.00-7.00   sec  5.55 MBytes  46.5 Mbits/sec
[  6]   7.00-8.00   sec  5.47 MBytes  45.8 Mbits/sec
[  6]   8.00-9.01   sec  5.84 MBytes  48.5 Mbits/sec
[  6]   9.01-10.02  sec  5.85 MBytes  48.6 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-10.00  sec  64.1 MBytes  53.7 Mbits/sec  371             sender
[  6]   0.00-10.02  sec  64.0 MBytes  53.5 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.


CSJ_GUAVI_SAN_JOSE_F~2EU # get system status | grep time
System time: Sun Oct 26 10:05:09 2025

CSJ_GUAVI_SAN_JOSE_F~2EU #
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5044	3	Putumayo, Puerto Asis; Calle 12 # 19-35	50 Mbps	49,27

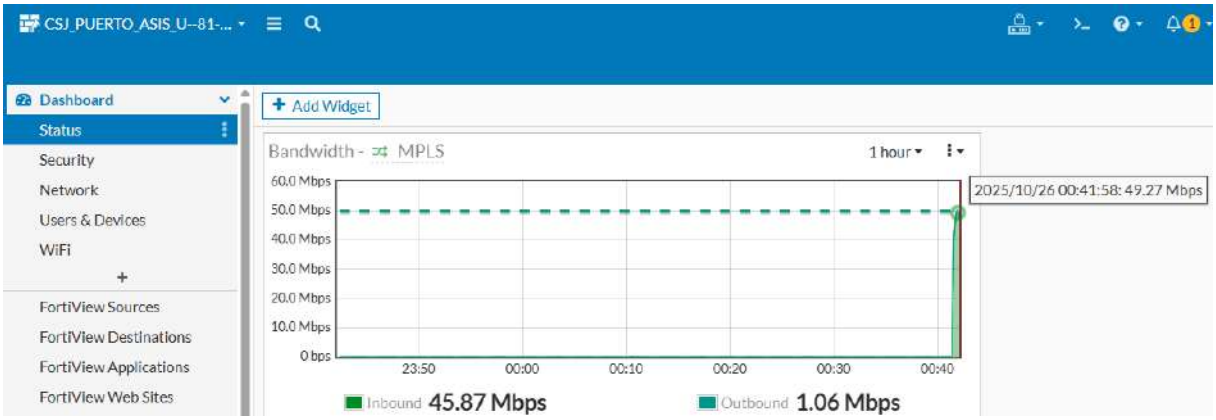


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5022	2	Cesar, Aguachica; Calle 5A # 10-92, Palacio Justicia	60 Mbps	61,53

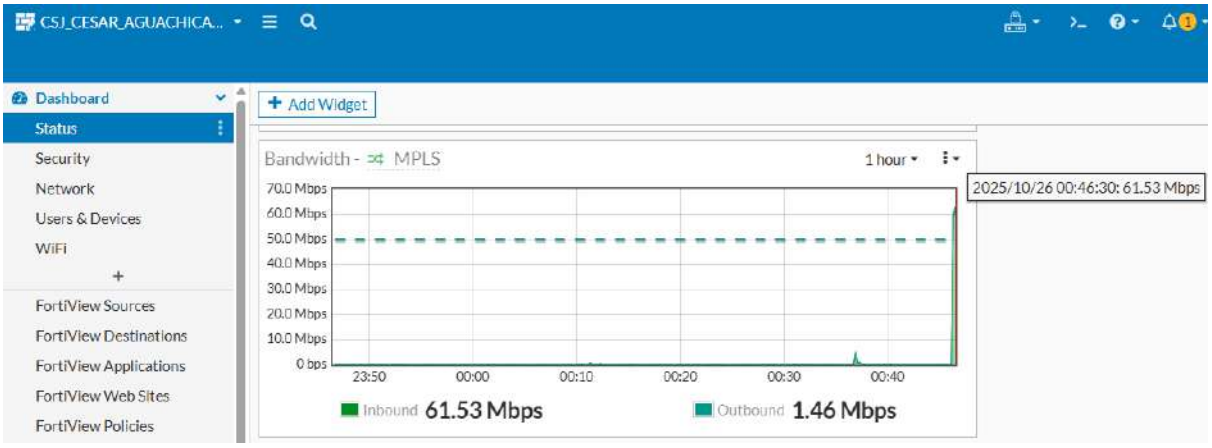


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTAD BW
5007	1	Antioquia, La Estrella; Calle 80 Sur # 60-38	50 Mbps	49,20

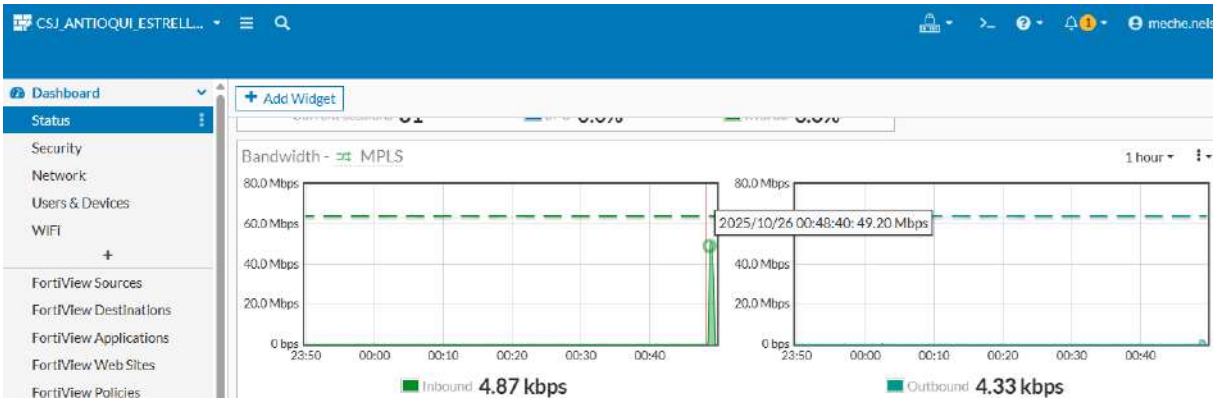

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5010	1	Antioquia, Sabaneta; Carrera 45 # 68Sur-61	50 Mbps	47,77

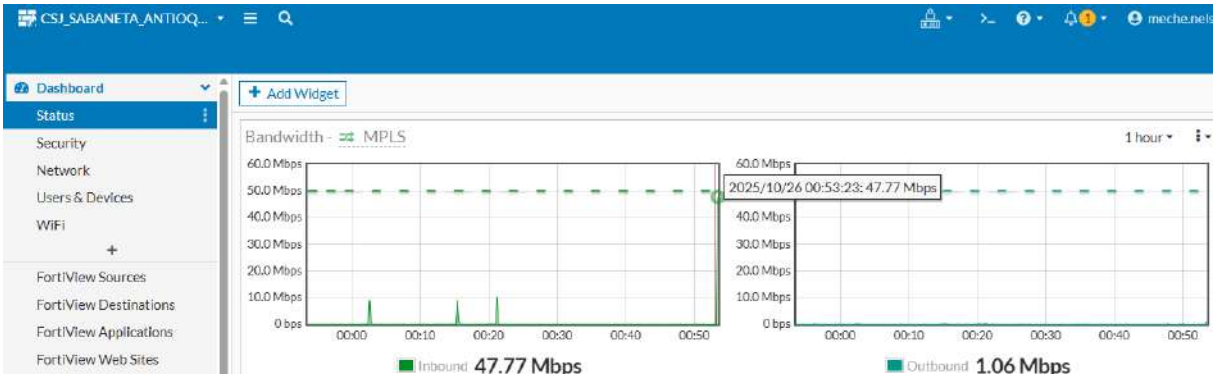

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5039	2	Nariño, Pasto; Calle 19 # 22-16, Edificio Ril	50 Mbps	60,08

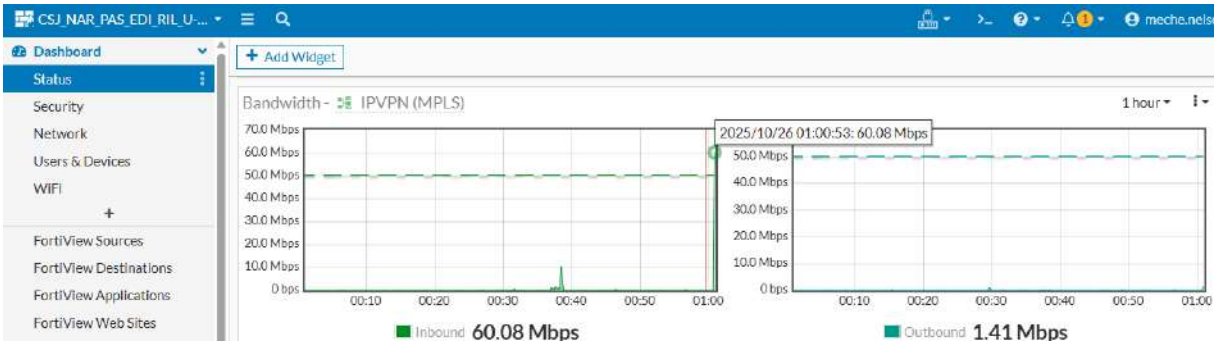

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5004	4	Antioquia, Cisneros; Calle 19 # 17-37 Piso 2	50 Mbps	45,7

CLI Console of CSJ_ANTIOQ_CISNEROS_U--81-5N5IGG5 — CSJ_ANTIOQ_CISNEROS_I

```
CSJ_ANTIOQ_CISNEROS_~GG5 # diagnose traffictest server-intf MPLS
server-intf:    MPLS

CSJ_ANTIOQ_CISNEROS_~GG5 # diagnose traffictest client-intf MPLS
client-intf:    MPLS


CSJ_ANTIOQ_CISNEROS_~GG5 # diagnose traffictest port 5201
port:   5201

CSJ_ANTIOQ_CISNEROS_~GG5 # diagnose traffictest run -R -c 10.101.204.90
Connecting to host 10.101.204.90, port 5201
Reverse mode, remote host 10.101.204.90 is sending
[  6] local 10.101.200.114 port 2070 connected to 10.101.204.90 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  6]   0.00-1.00   sec  5.21 MBytes  43.7 Mbits/sec
[  6]   1.00-2.01   sec  5.18 MBytes  42.9 Mbits/sec
[  6]   2.01-3.00   sec  5.58 MBytes  47.3 Mbits/sec
[  6]   3.00-4.00   sec  5.66 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  6]   4.00-5.00   sec  5.64 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  6]   5.00-6.00   sec  4.37 MBytes  36.5 Mbits/sec
[  6]   6.00-7.00   sec  5.58 MBytes  47.0 Mbits/sec
[  6]   7.00-8.00   sec  5.67 MBytes  47.5 Mbits/sec
[  6]   8.00-9.00   sec  5.65 MBytes  47.4 Mbits/sec
[  6]   9.00-10.00  sec  5.62 MBytes  47.1 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  6]   0.00-10.00  sec  54.4 MBytes  45.7 Mbits/sec   11             sender
[  6]   0.00-10.00  sec  54.2 MBytes  45.4 Mbits/sec                  receiver


iperf Done.

CSJ_ANTIOQ_CISNEROS_~GG5 # get system status | grep time
System time: Sun Oct 26 09:42:35 2025
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5145	4	Antioquia, Cisneros; Calle 19 # 17-37 Piso 2	50 Mbps	46,5

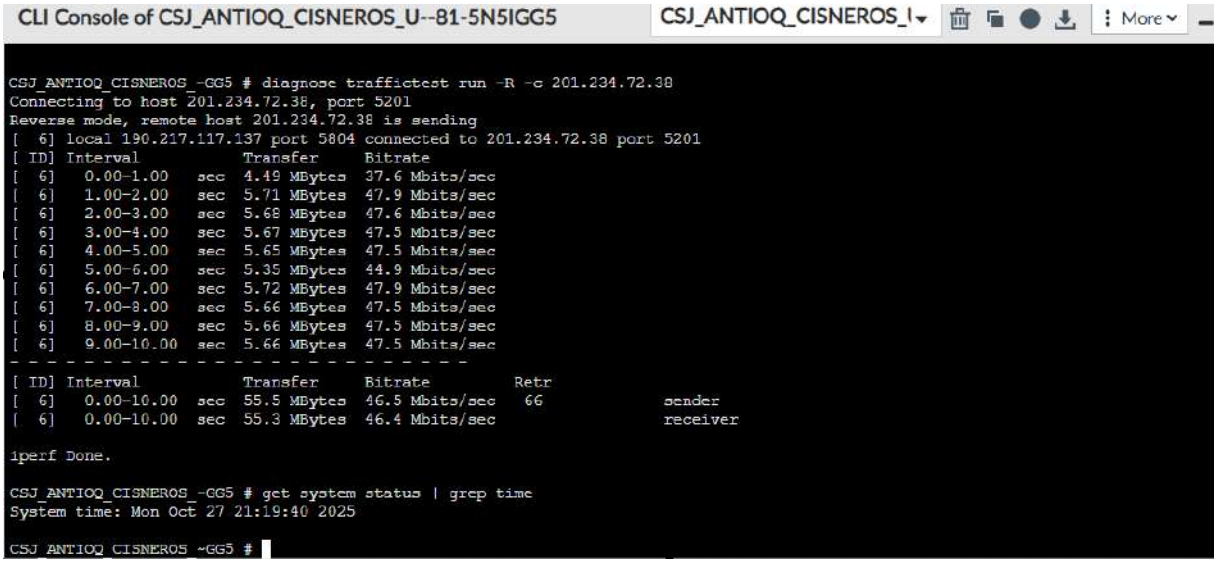


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5213	3	Antioquia, Andes; Carrera 51 # 48-72	50 Mbps	45,77

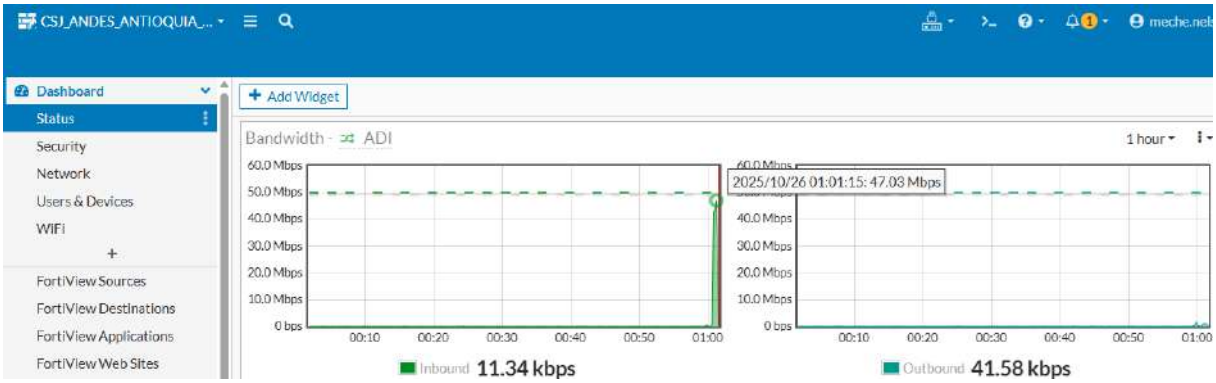


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5001	3	Antioquia, Andes; Carrera 51 # 48-72	50 Mbps	50,96

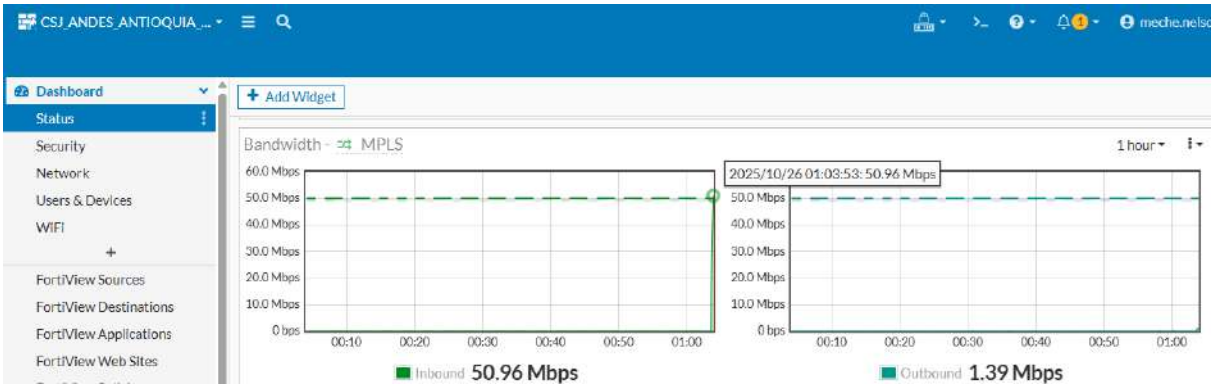


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5011	3	Antioquia, Yarumal; Calle 20 # 20-05	50 Mbps	49,94

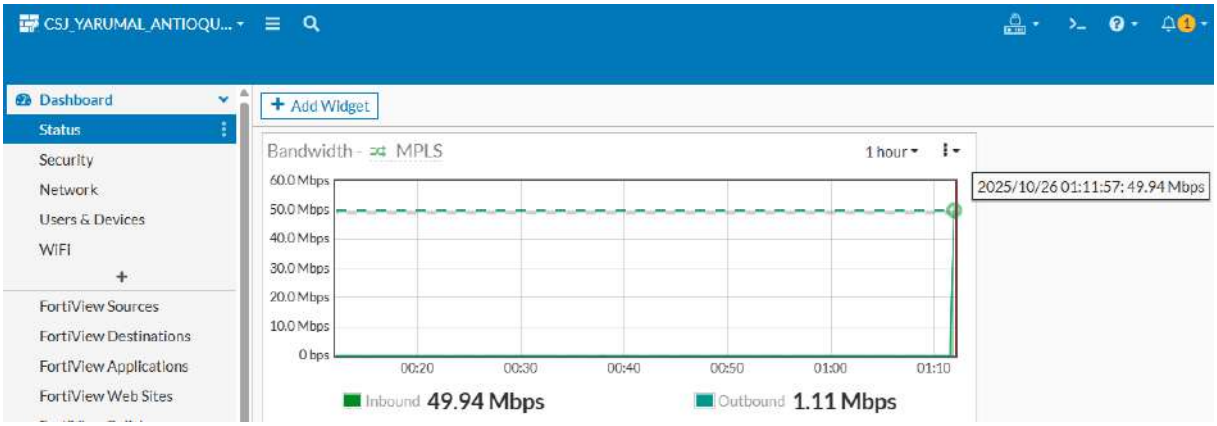


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5003	3	Antioquia, Caucasia; Calle 20 # 10-160	50 Mbps	51,31

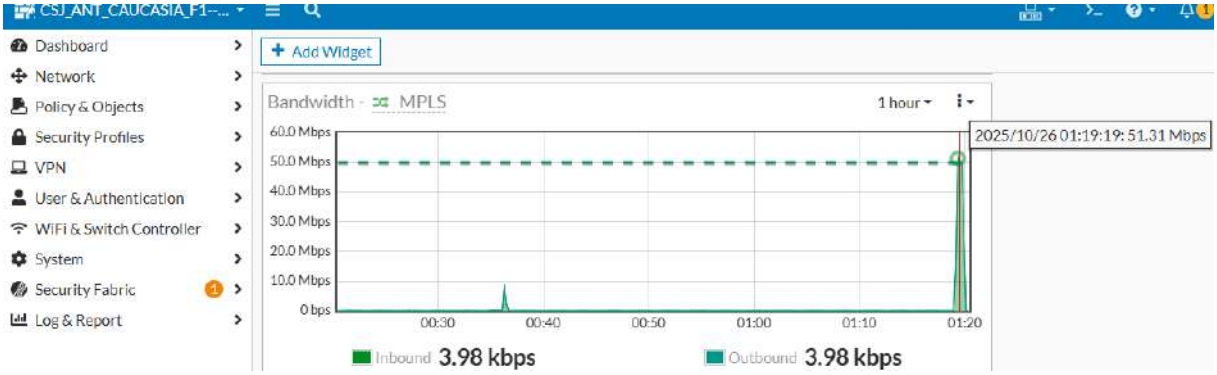


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1810	1	Santander, Bucaramanga; Calle 35 entre Carrera 11	576 Mbps	568,42

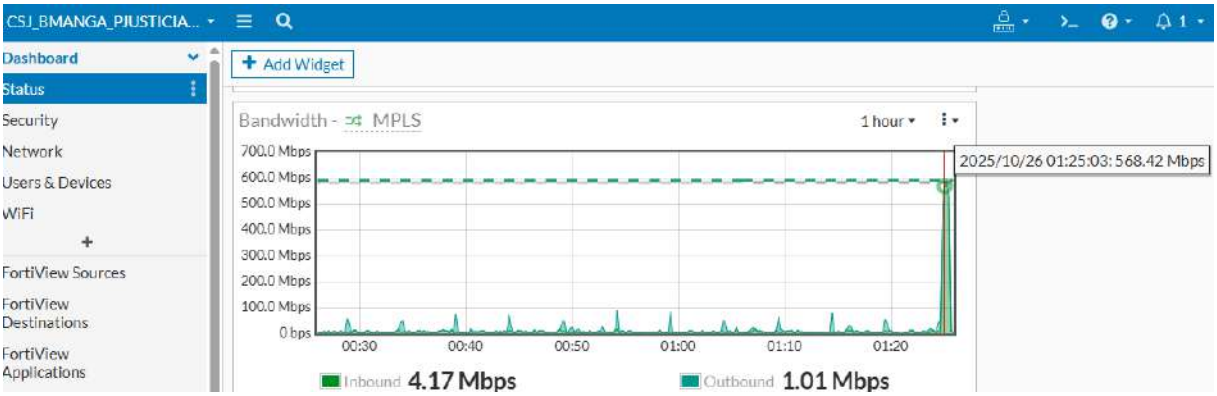

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3300	4	Amazonas, Leticia; Avenida Internacional Carrera 6	64 Mbps	63,46

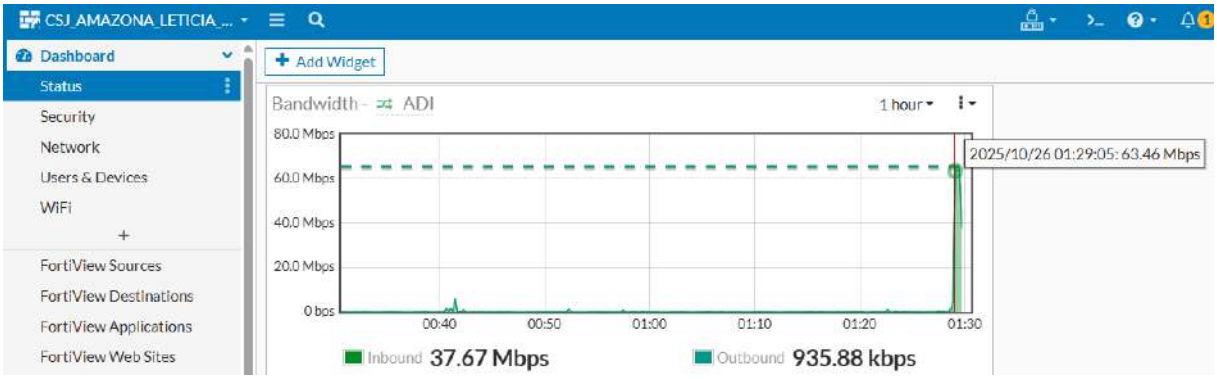

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
554	4	Sucre, San Pedro; Carrera 9 # 18-77	25 Mbps	22,63

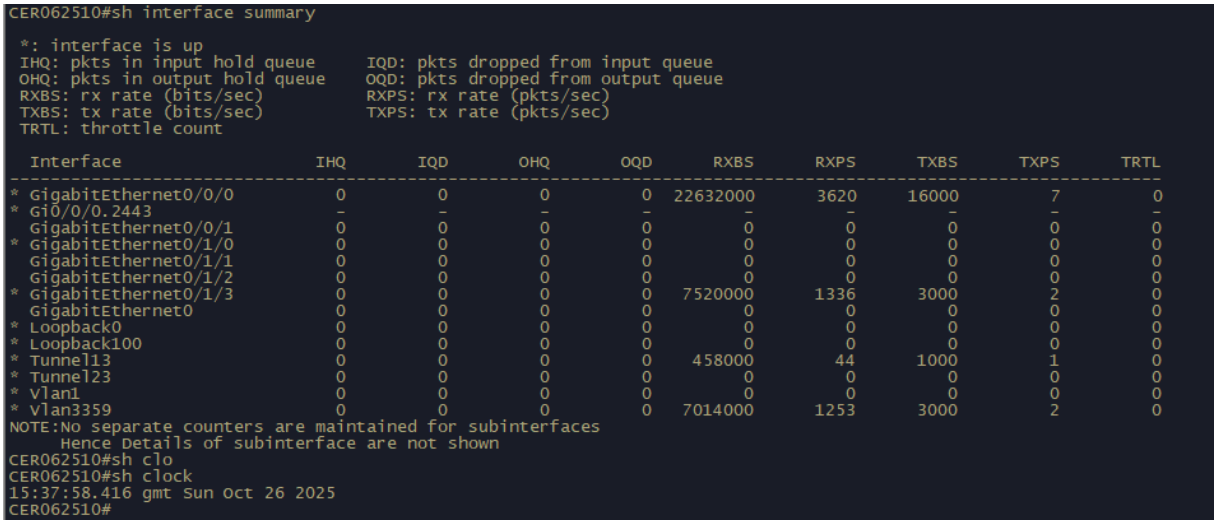


```
CER062510#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0  22632000      3620     16000         7         0
* Gi0/0/0.2443                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0   7520000      1336      3000         2         0
  GigabitEthernet0              0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback100                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel13                      0         0         0         0    458000        44      1000         1         0
* Tunnel23                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan3359                      0         0         0         0   7014000      1253      3000         2         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062510#sh clo
CER062510#sh clock
15:37:58.416 gmt Sun Oct 26 2025
CER062510#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
607	3	Caquetá, La Montañita; Calle 5 # 4 -02	25 Mbps	23,5

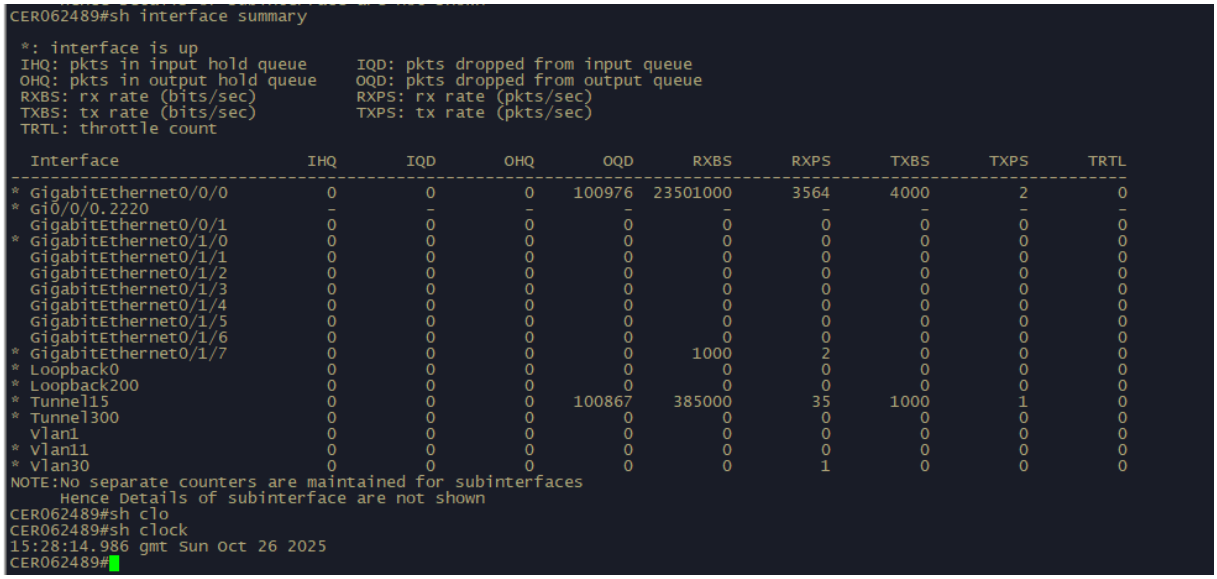


```
CER062489#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0    100976  23501000      3564      4000         2         0
* Gi0/0/0.2220                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0      1000         2         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel15                      0         0         0    100867    385000        35      1000         1         0
* Tunnel300                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan30                        0         0         0         0         0         1         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062489#sh clo
CER062489#sh clock
15:28:14.986 gmt Sun Oct 26 2025
CER062489#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
608	3	Caquetá, Morelia; Carrera 4 # 3-11	25 Mbps	23,43

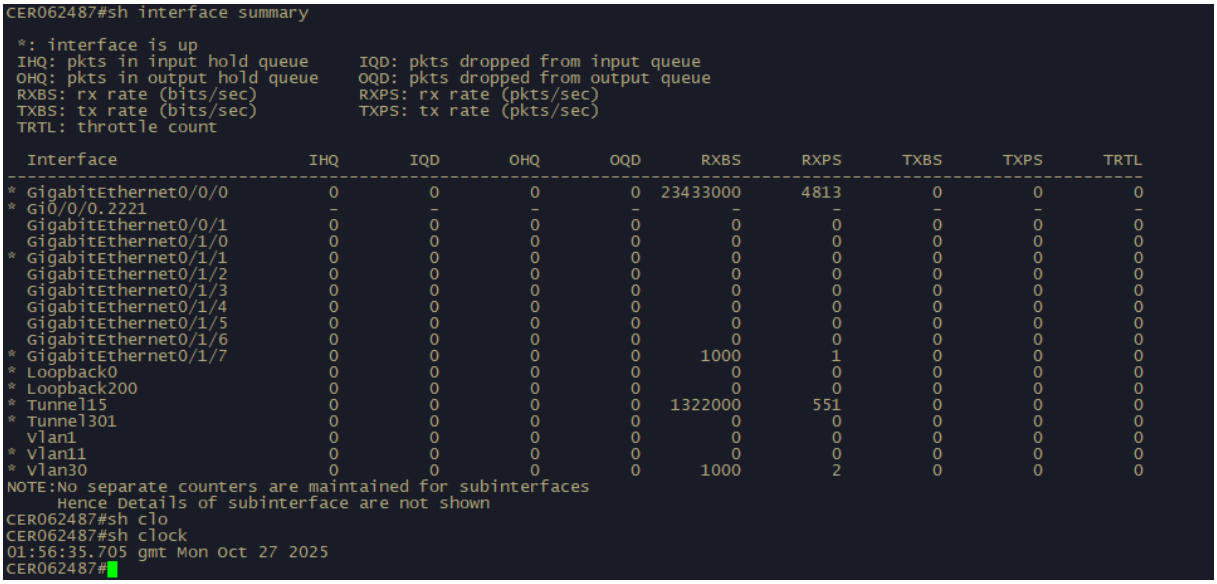


```
CER062487#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0  23433000      4813         0         0         0
* Gi0/0/0.2221                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0      1000         1         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel15                      0         0         0         0   1322000       551         0         0         0
* Tunnel301                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan30                        0         0         0         0      1000         2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062487#sh clo
CER062487#sh clock
01:56:35.705 gmt Mon Oct 27 2025
CER062487#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
646	4	Cundinamarca, Guatavita; Calle 6 # 2-09	25 Mbps	23,58

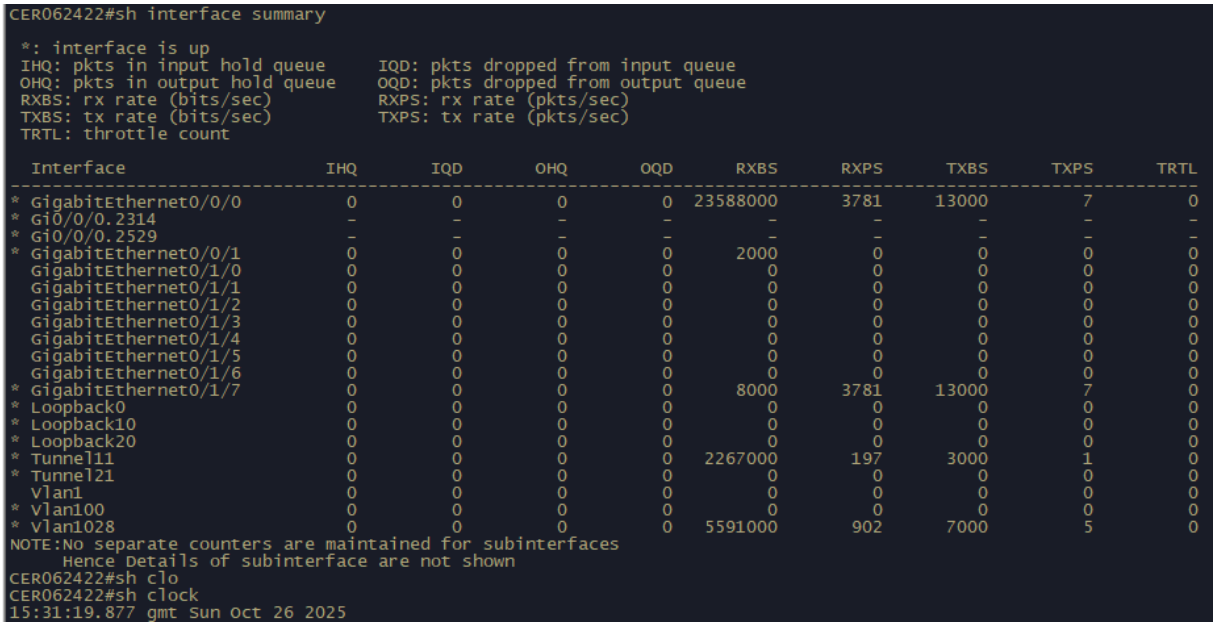


```
CER062422#sh interface summary


 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0         0  23588000      3781     13000         7         0
* Gi0/0/0.2314                 -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2529                 -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0      2000         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0      8000      3781     13000         7         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                     0         0         0         0   2267000       197      3000         1         0
* Tunnel21                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan100                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1028                     0         0         0         0   5591000       902      7000         5         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062422#sh clo
CER062422#sh clock
15:31:19.877 gmt Sun Oct 26 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
655	3	Cundinamarca, Supatá; Carrera 7 # 3-44	25 Mbps	23,71

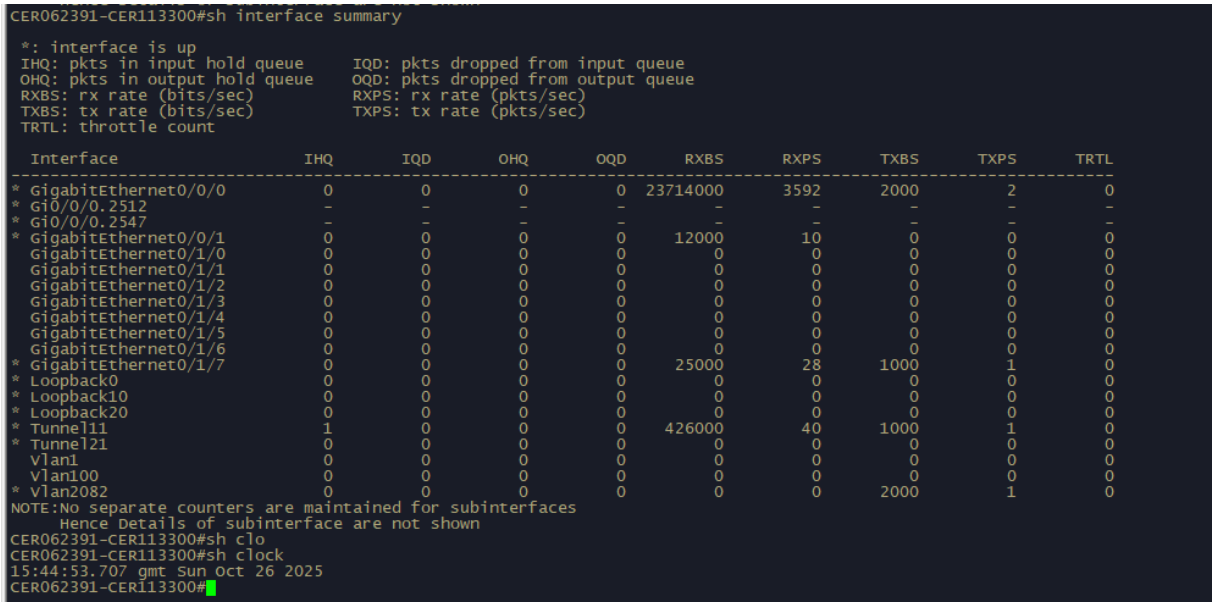

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
683	4	Risaralda, Guatica; Carrera 6 # 10-35	25 Mbps	24,48

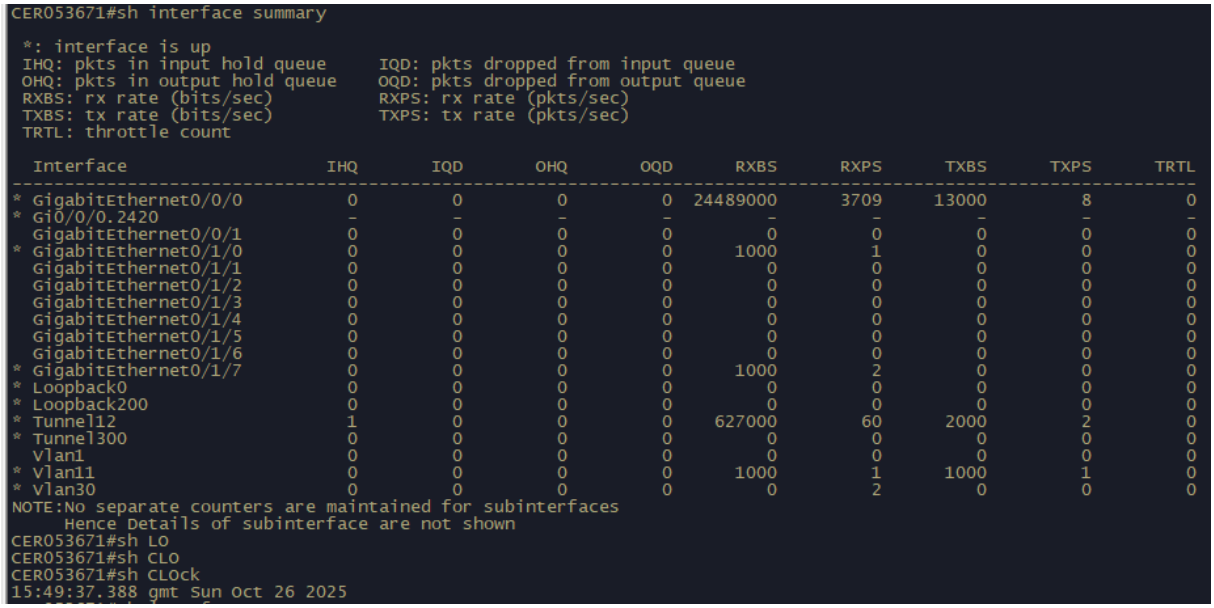

```
CER053671#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0   24489000       3709      13000          8          0
* Gi0/0/0.2420                  -         -         -         -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0       1000          1          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0       1000          2          0          0          0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                      1         0         0         0     627000         60       2000          2          0
* Tunnel300                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0         0         0         0       1000          1       1000          1          0
* Vlan30                        0         0         0         0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER053671#sh LO
CER053671#sh CLO
CER053671#sh CLOck
15:49:37.388 gmt Sun Oct 26 2025
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
684	4	Risaralda, La Celia; Carrera 3 # 3-16	25 Mbps	23,52

```
CER053722#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0  23525000      3105      6000         4         0
* Gi0/0/0.2421                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0      1000         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0      1000         2         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel12                      0         0         0         0   1487000       128         0         0         0
* Tunnel22                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel300                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan30                        0         0         0         0      1000         2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER053722#SH clo
CER053722#SH clock
15:54:34.087 gmt Sun Oct 26 2025
CER053722#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
685	4	Risaralda, Mistrató; Carrera 6 entre Calles 4 y 5,	25 Mbps	23,26

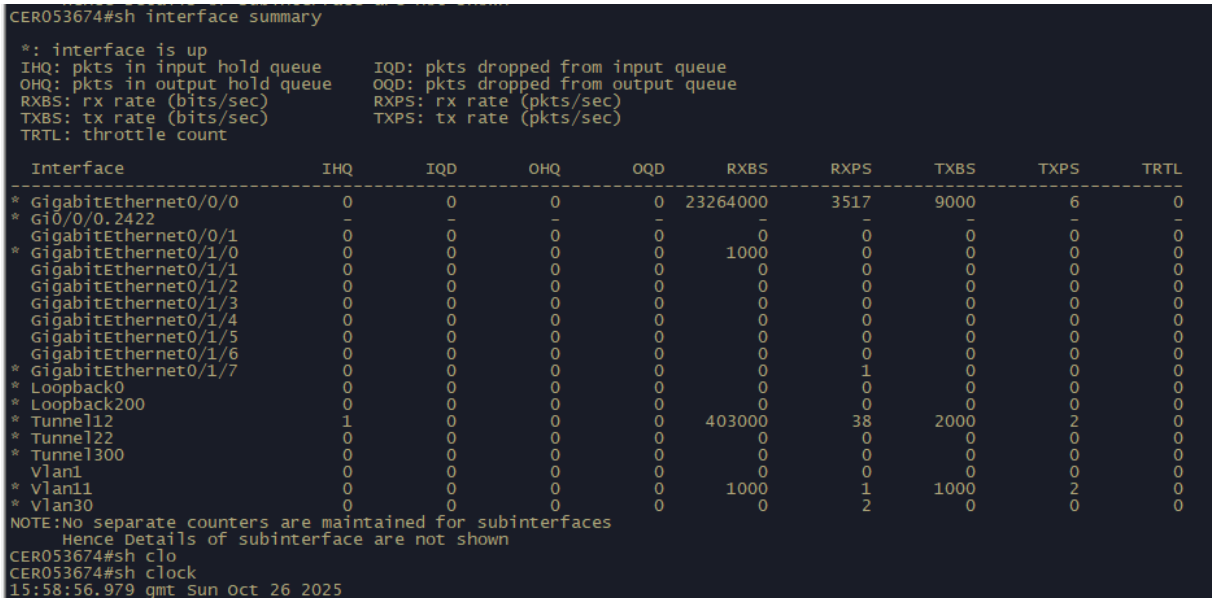


```
CER053674#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0  23264000      3517      9000         6         0
* Gi0/0/0.2422                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0      1000         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         1         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel12                      1         0         0         0    403000        38      2000         2         0
* Tunnel22                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel300                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0      1000         1      1000         2         0
* Vlan30                        0         0         0         0         0         2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER053674#sh clo
CER053674#sh clock
15:58:56.979 gmt Sun Oct 26 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
690	4	Sucre, El Roble; Calle 6 # 10-79	25 Mbps	24,46

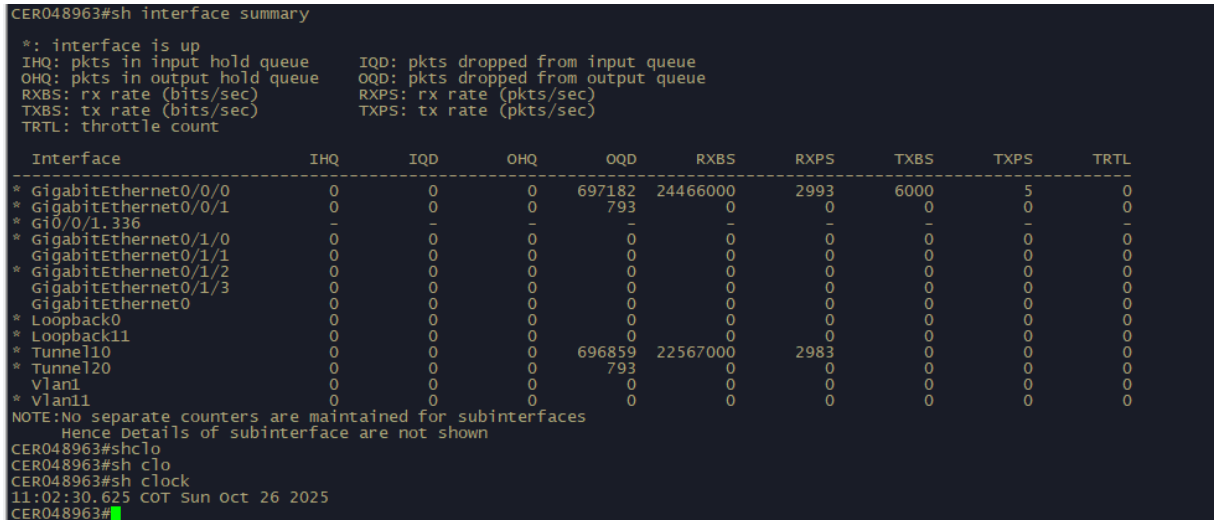


```
CER048963#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0    697182   24466000       2993       6000          5          0
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0       793          0          0          0          0          0
* Gi0/0/1.336                   -         -         -         -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0              0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback11                    0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel10                      0         0         0    696859   22567000       2983          0          0          0
* Tunnel20                      0         0         0       793          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0         0         0         0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER048963#shclo
CER048963#sh clo
CER048963#sh clock
11:02:30.625 COT Sun Oct 26 2025
CER048963#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1339	4	Norte de Santander, Labateca; Carrera 2 # 4-38	25 Mbps	24,64

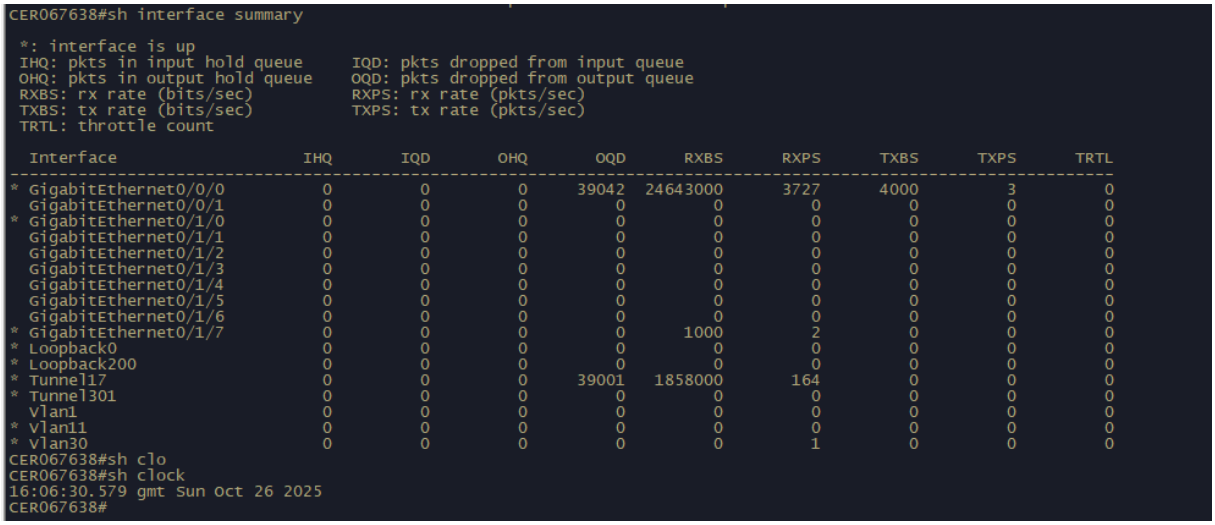


```
CER067638#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0     39042   24643000       3727       4000          3          0
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0       1000          2          0          0          0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                      0         0         0     39001    1858000        164          0          0          0
* Tunnel301                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0         0         0         0          0          1          0          0          0
CER067638#sh clo
CER067638#sh clock
16:06:30.579 gmt Sun Oct 26 2025
CER067638#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
694	3	Tolima, Falan; Calle 6 # 3-60	25 Mbps	23,05

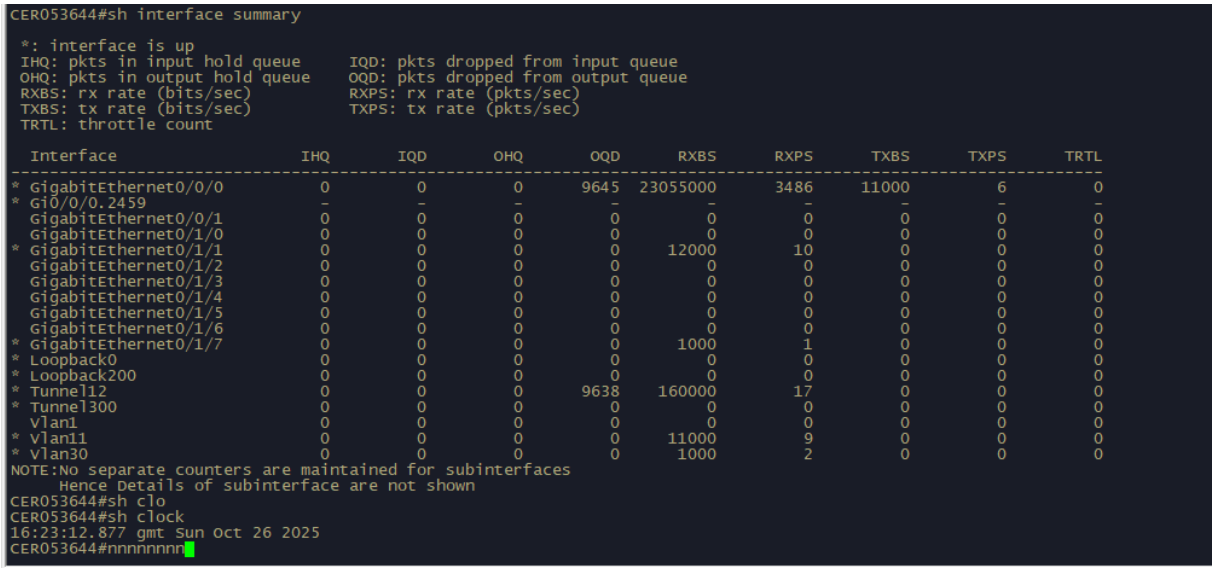


```
CER053644#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0      9645   23055000      3486     11000         6         0
* Gi0/0/0.2459                -         -         -         -          -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0          0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0      12000        10         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0          0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0       1000         1         0         0         0
* Loopback0                    0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Loopback200                  0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Tunnel12                     0         0         0      9638     160000        17         0         0         0
* Tunnel300                    0         0         0         0          0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Vlan11                       0         0         0         0      11000         9         0         0         0
* Vlan30                       0         0         0         0       1000         2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER053644#sh clo
CER053644#sh clock
16:23:12.877 gmt Sun Oct 26 2025
CER053644#nnnnnnnn
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
695	4	Tolima, Herveo; Calle 4 # 7-36	25 Mbps	23,11

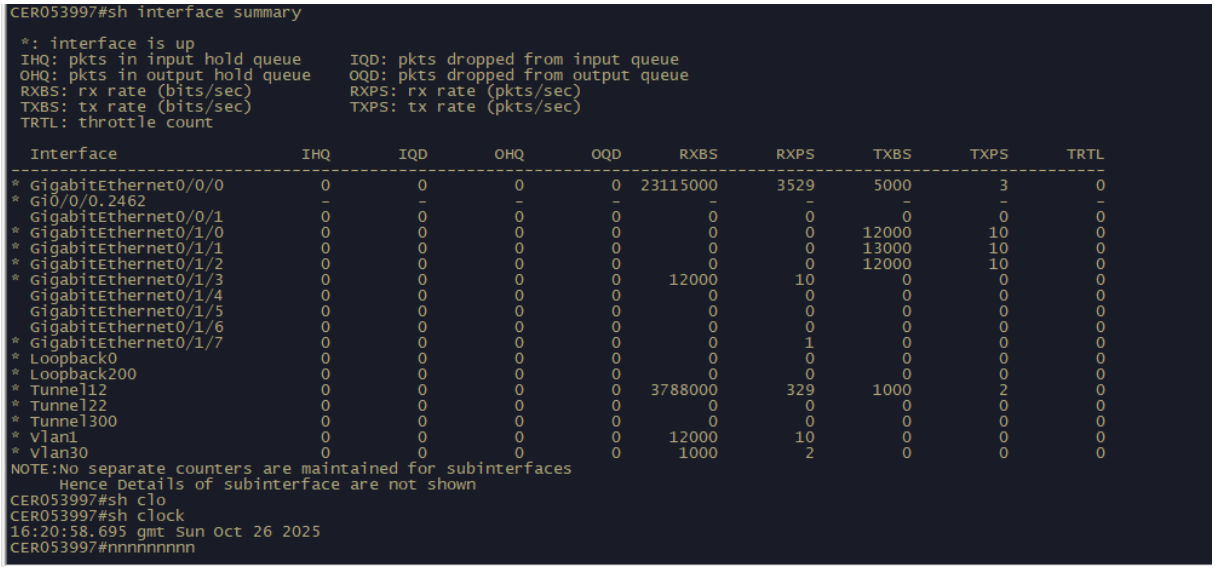


```
CER053997#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0         0   23115000      3529      5000         3         0
* Gi0/0/0.2462                -         -         -         -          -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0          0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0          0         0     12000        10         0
* GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0          0         0     13000        10         0
* GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0          0         0     12000        10         0
* GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0      12000        10         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0          0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0          0         1         0         0         0
* Loopback0                    0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Loopback200                  0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Tunnel12                     0         0         0         0    3788000       329      1000         2         0
* Tunnel22                     0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Tunnel300                    0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Vlan1                        0         0         0         0      12000        10         0         0         0
* Vlan30                       0         0         0         0       1000         2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER053997#sh clo
CER053997#sh clock
16:20:58.695 gmt Sun Oct 26 2025
CER053997#nnnnnnnnn
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
696	4	Tolima, Palocabildo; Carrera 9 # 3 -09 Barrio centro	25 Mbps	23,44

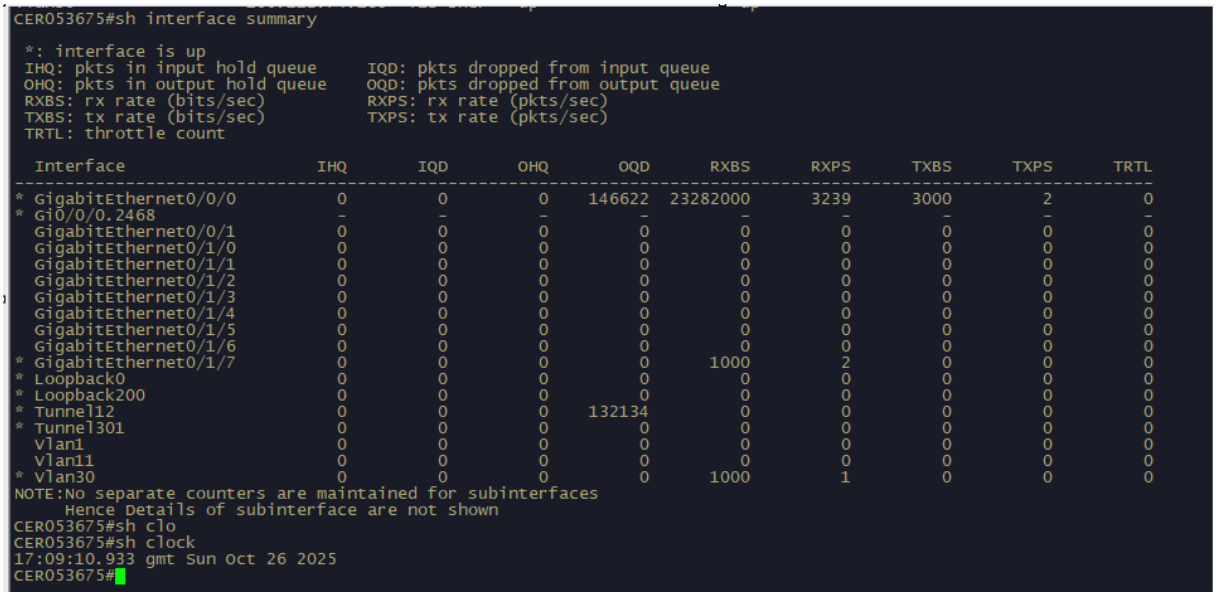


```
CER053675#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0    146622  23282000      3239      3000         2         0
* GiO/0/0.2468                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0      1000         2         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel12                      0         0         0    132134         0         0         0         0         0
* Tunnel301                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan11                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan30                        0         0         0         0      1000         1         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER053675#sh clo
CER053675#sh clock
17:09:10.933 gmt Sun Oct 26 2025
CER053675#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
698	4	Tolima, Villa hermosa; Carrera 3 # 10,	25 Mbps	23,82

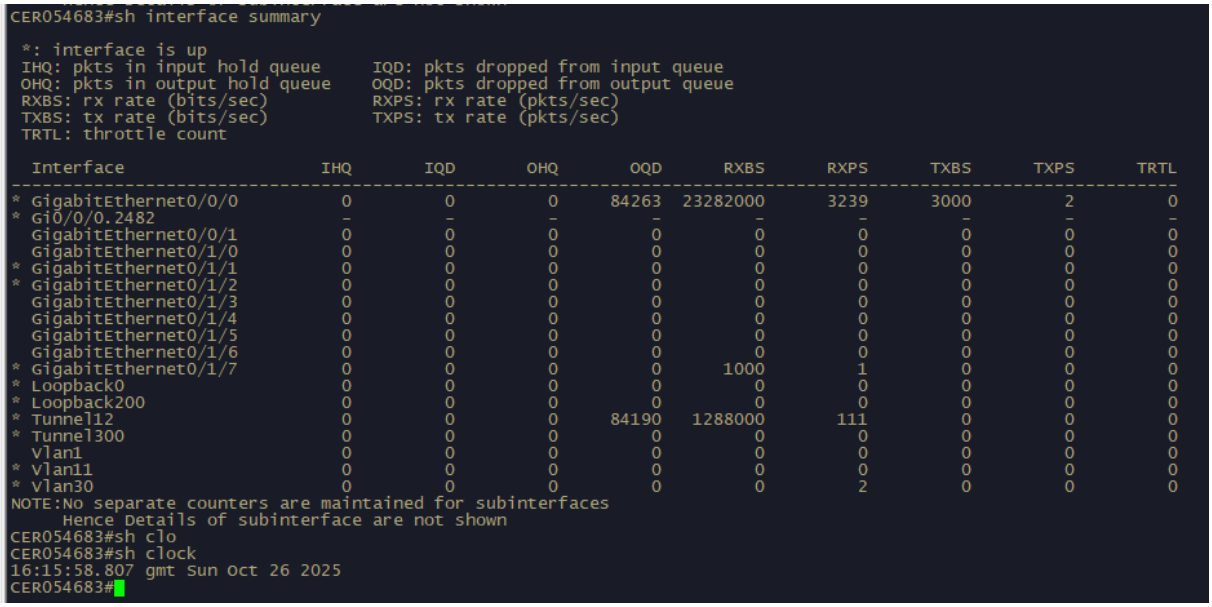


```
CER054683#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0     84263  23282000      3239      3000         2         0
* GI0/0/0.2482                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0      1000         1         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel12                      0         0         0     84190   1288000       111         0         0         0
* Tunnel300                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan30                        0         0         0         0         0         2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054683#sh clo
CER054683#sh clock
16:15:58.807 gmt Sun Oct 26 2025
CER054683#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1258	4	Santander, Páramo; Calle 5TA # 4A-04	25 Mbps	23,92

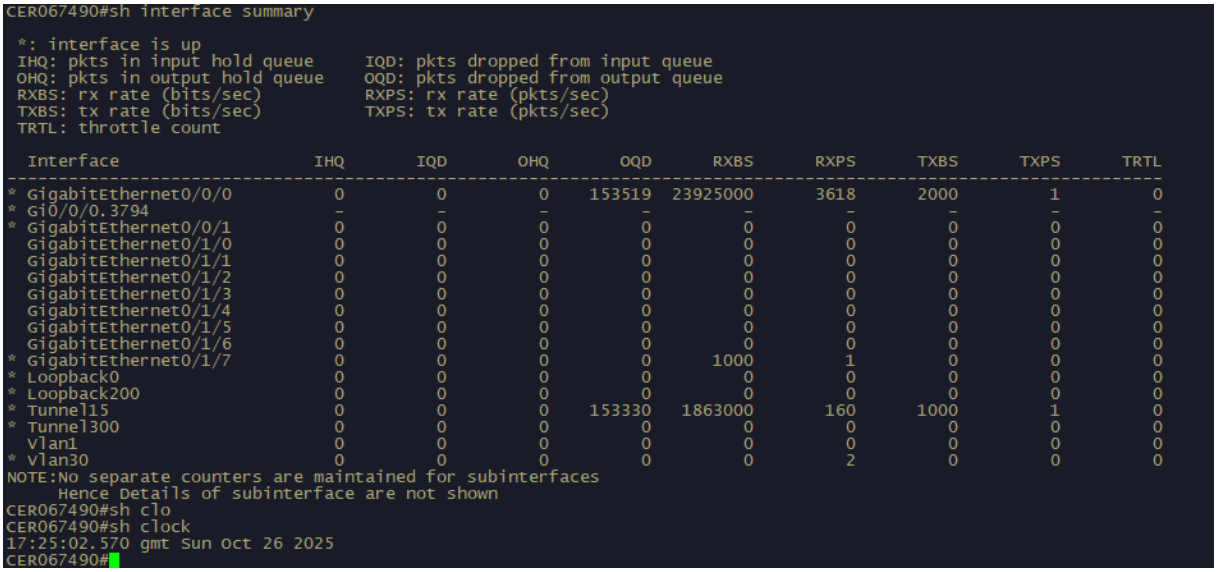


```
CER067490#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0    153519  23925000      3618      2000         1         0
* Gi0/0/0.3794                 -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0      1000         1         0         0         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                  0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel15                     0         0         0    153330   1863000       160      1000         1         0
* Tunnel300                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan30                       0         0         0         0         0         2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067490#sh clo
CER067490#sh clock
17:25:02.570 gmt Sun Oct 26 2025
CER067490#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
700	4	Valle Del Cauca, El Cairo; Carrera 4 # 9-17	25 Mbps	23,02

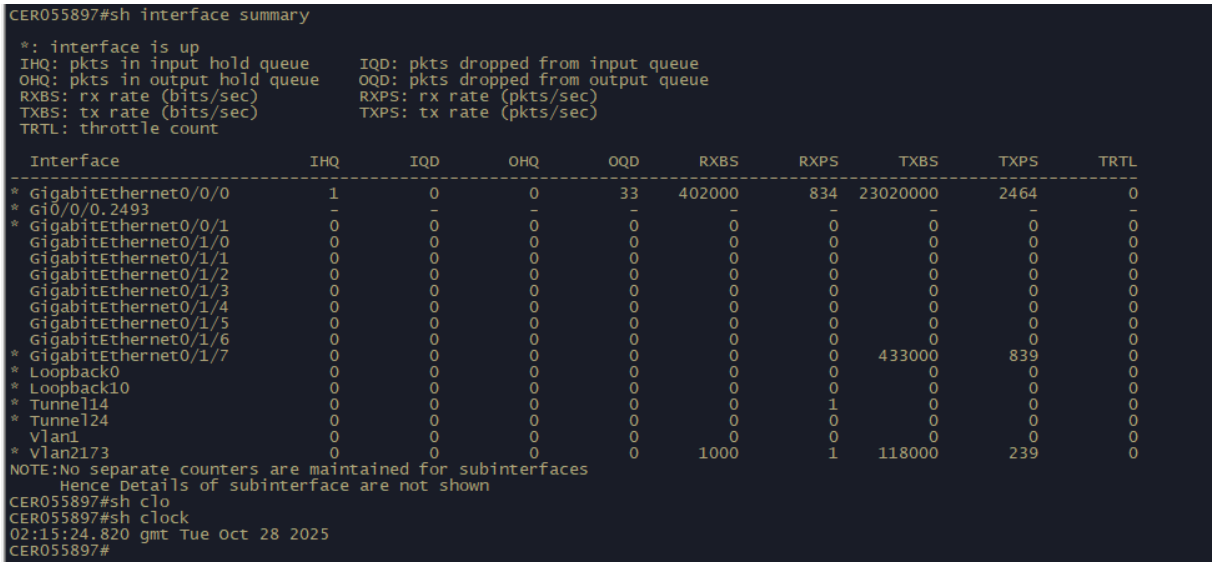


```
CER055897#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          1         0         0        33    402000       834  23020000      2464         0
* Gi0/0/0.2493                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         0    433000       839         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel14                      0         0         0         0         0         1         0         0         0
* Tunnel24                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan2173                      0         0         0         0      1000         1    118000       239         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055897#sh clo
CER055897#sh clock
02:15:24.820 gmt Tue Oct 28 2025
CER055897#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
902	1	Valle Del Cauca, Cali; Carrera 52 # 2-00	25 Mbps	23,38

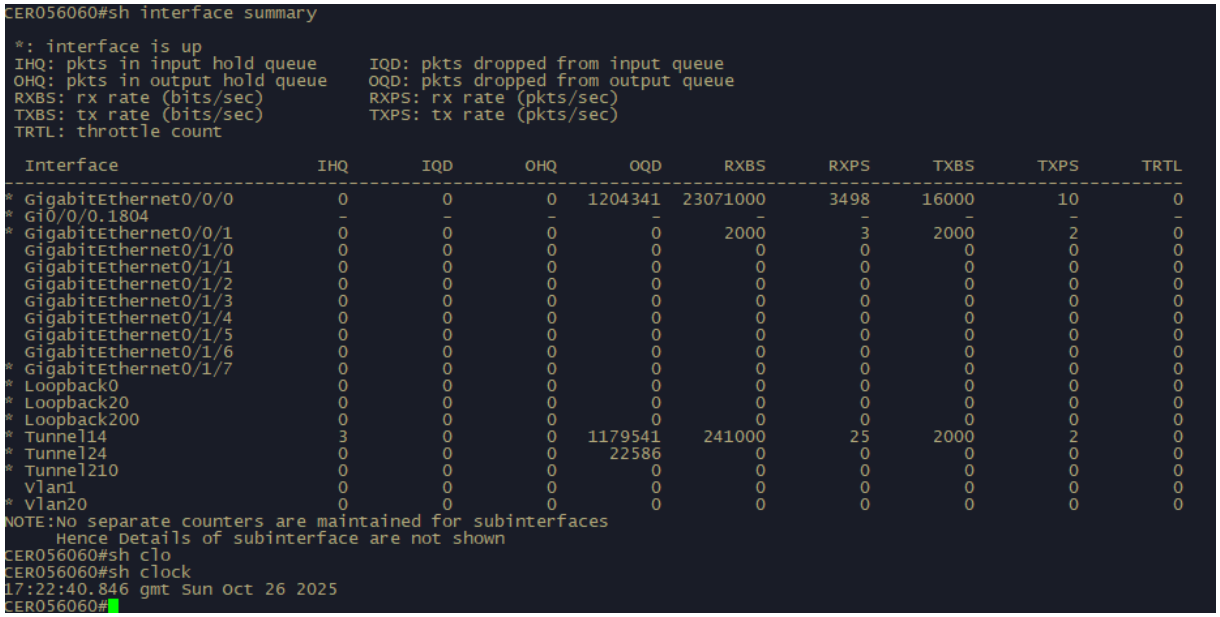


```
CER056060#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0   1204341  23071000      3498     16000        10         0
* GI0/0/0.1804                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0      2000         3      2000         2         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel14                      3         0         0   1179541    241000        25      2000         2         0
* Tunnel24                      0         0         0     22586         0         0         0         0         0
* Tunnel210                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan20                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056060#sh clo
CER056060#sh clock
17:22:40.846 gmt Sun Oct 26 2025
CER056060#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
780	3	Cundinamarca, Gutierrez; Carrera 5 # 5-40	25 Mbps	23,42

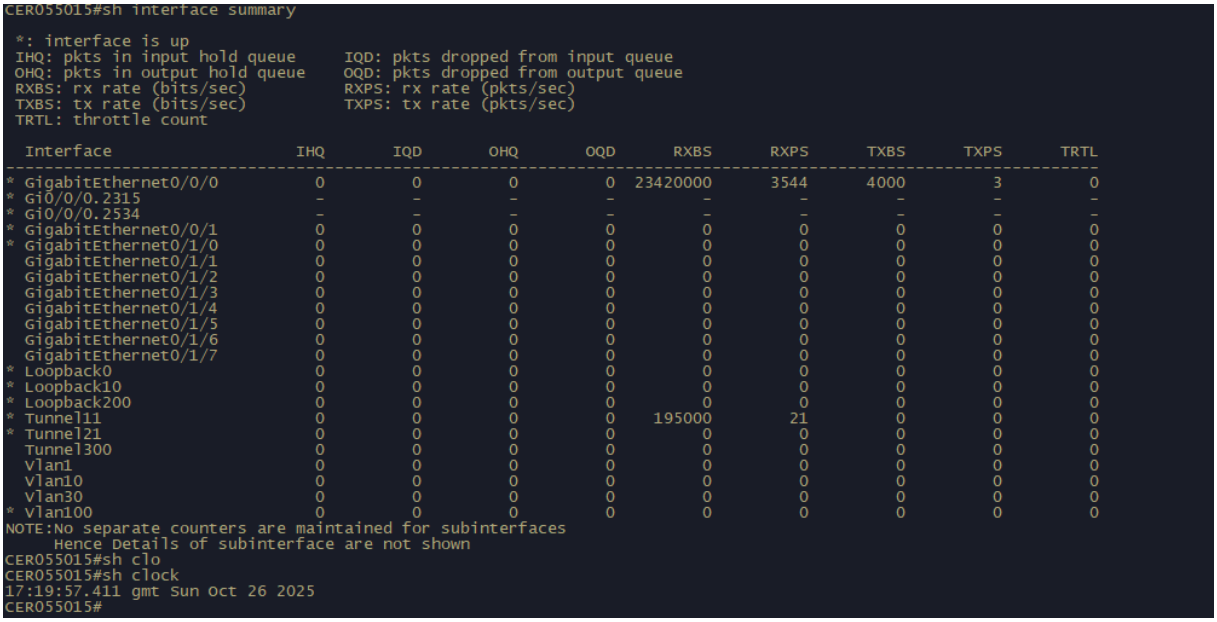

```
CER055015#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0  23420000      3544      4000         3         0
* Gi0/0/0.2315                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2534                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                      0         0         0         0    195000        21         0         0         0
* Tunnel21                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Tunnel300                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan10                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan30                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan100                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055015#sh clo
CER055015#sh clock
17:19:57.411 gmt Sun Oct 26 2025
CER055015#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
884	3	Tolima, Natagaima; Calle 5 # 4-83	25 Mbps	23,79

```
CER064868#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0       326  23793000      3857      6000         3         0
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0     12000         9         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0     12000         9         0
* GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0     12000         9         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0      1000         1         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel12                      0         0         0       326   1671000       148      1000         2         0
* Tunnel300                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0     12000        10         0         0         0
* Vlan30                        0         0         0         0         0         2         0         0         0
CER064868#sh clo
CER064868#sh clock
17:39:16.431 gmt Sun Oct 26 2025
CER064868#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
892	2	Norte de Santander, Cúcuta; Calle 16 # 12-06	25 Mbps	23,34

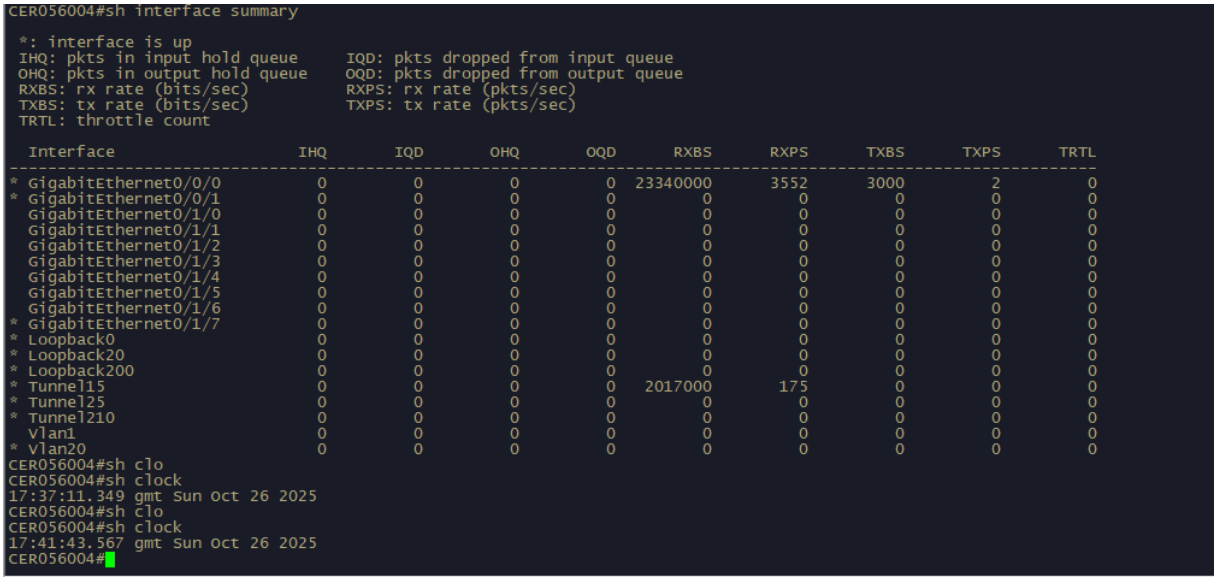


```
CER056004#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0         0  23340000      3552      3000         2         0
* GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                  0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel15                     0         0         0         0   2017000       175         0         0         0
* Tunnel25                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel210                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan20                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
CER056004#sh clo
CER056004#sh clock
17:37:11.349 gmt Sun Oct 26 2025
CER056004#sh clo
CER056004#sh clock
17:41:43.567 gmt Sun Oct 26 2025
CER056004#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
893	2	Norte de Santander, Cúcuta; Calle 4BN # 18-27	25 Mbps	23,13

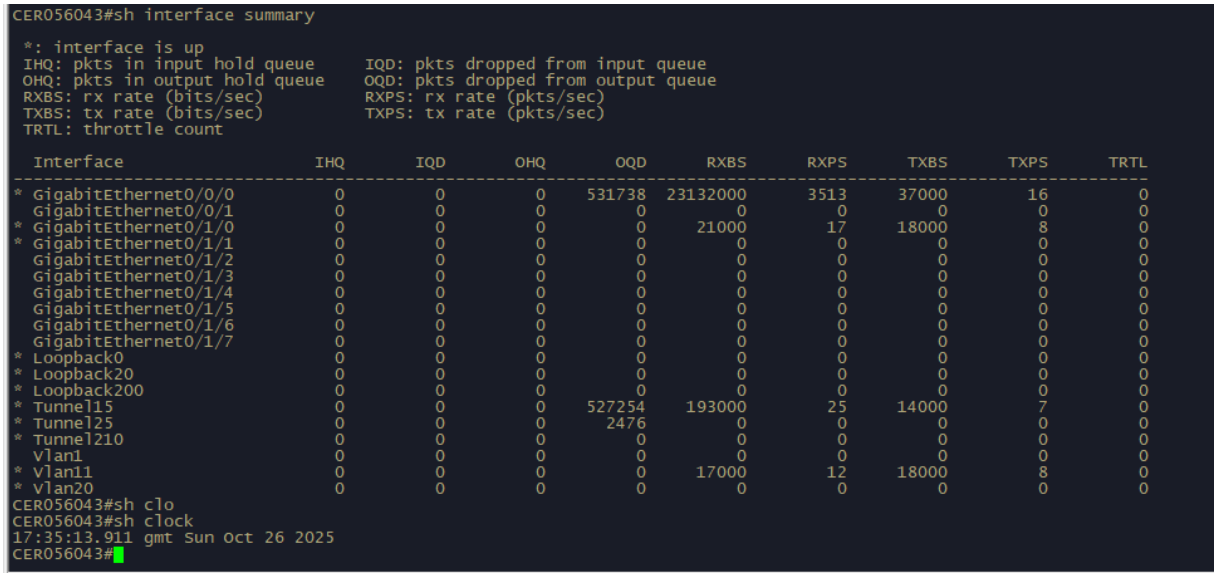


```
CER056043#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0    531738  23132000      3513     37000        16         0
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0     21000        17     18000         8         0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel15                      0         0         0    527254    193000        25     14000         7         0
* Tunnel25                      0         0         0      2476         0         0         0         0         0
* Tunnel210                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0     17000        12     18000         8         0
* Vlan20                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
CER056043#sh clo
CER056043#sh clock
17:35:13.911 gmt Sun Oct 26 2025
CER056043#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
905	4	Santander, Albania; CALLE 5 No. 4-10	25 Mbps	22,90

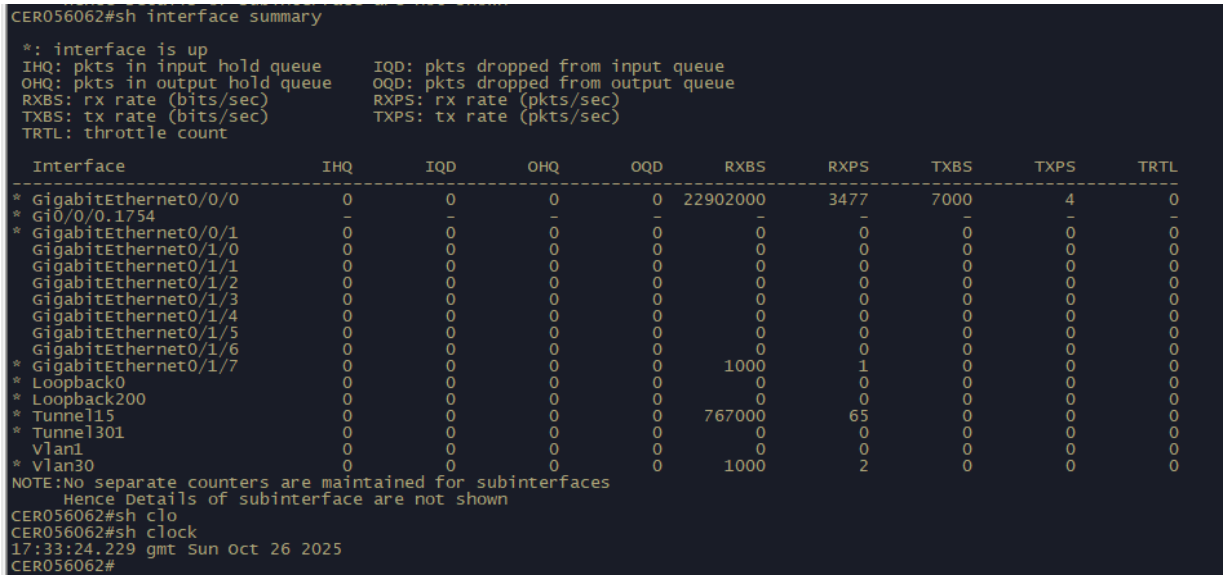


```
CER056062#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0  22902000      3477      7000         4         0
* GiO/0/0.1754                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0      1000         1         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel15                      0         0         0         0    767000        65         0         0         0
* Tunnel301                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan30                        0         0         0         0      1000         2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056062#sh clo
CER056062#sh clock
17:33:24.229 gmt Sun Oct 26 2025
CER056062#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
906	1	Santander, Bucaramanga; Calle 7 # 19-19	25 Mbps	23,14

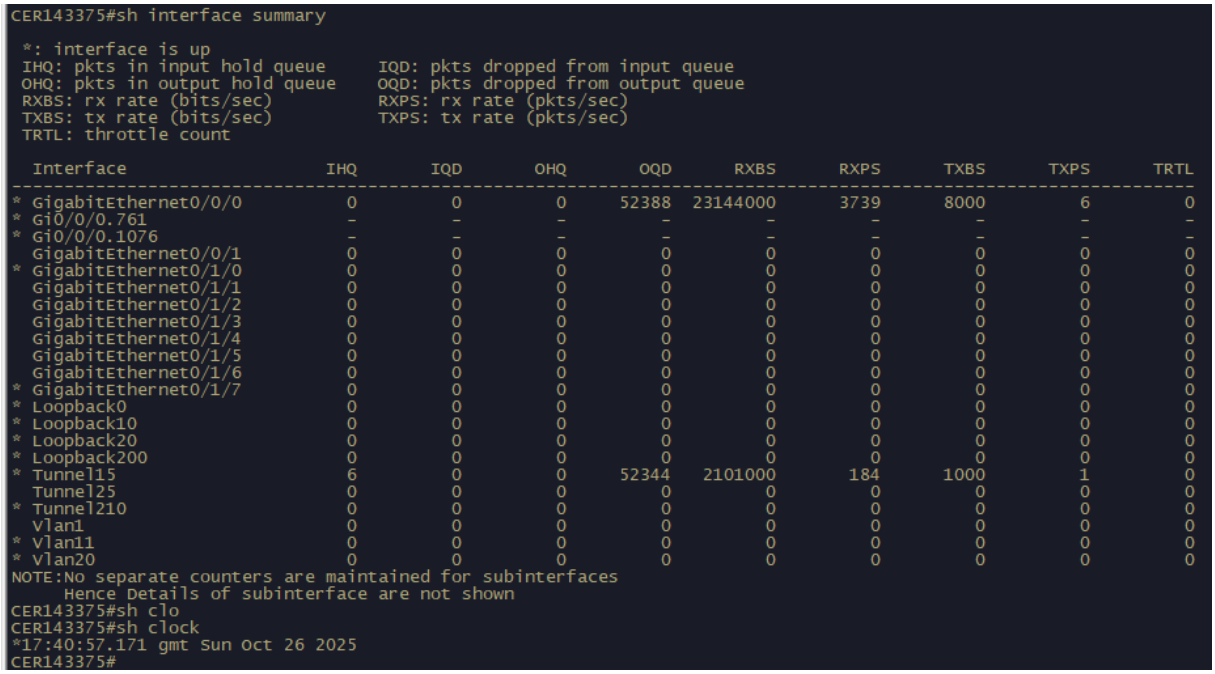


```
CER143375#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0     52388  23144000      3739      8000         6         0
* Gi0/0/0.761                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.1076                 -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                  0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel15                     6         0         0     52344   2101000       184      1000         1         0
  Tunnel25                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel210                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan20                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER143375#sh clo
CER143375#sh clock
*17:40:57.171 gmt Sun Oct 26 2025
CER143375#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
908	1	Valle Del Cauca, Cali; Calle 38 # 41H	25 Mbps	23,34

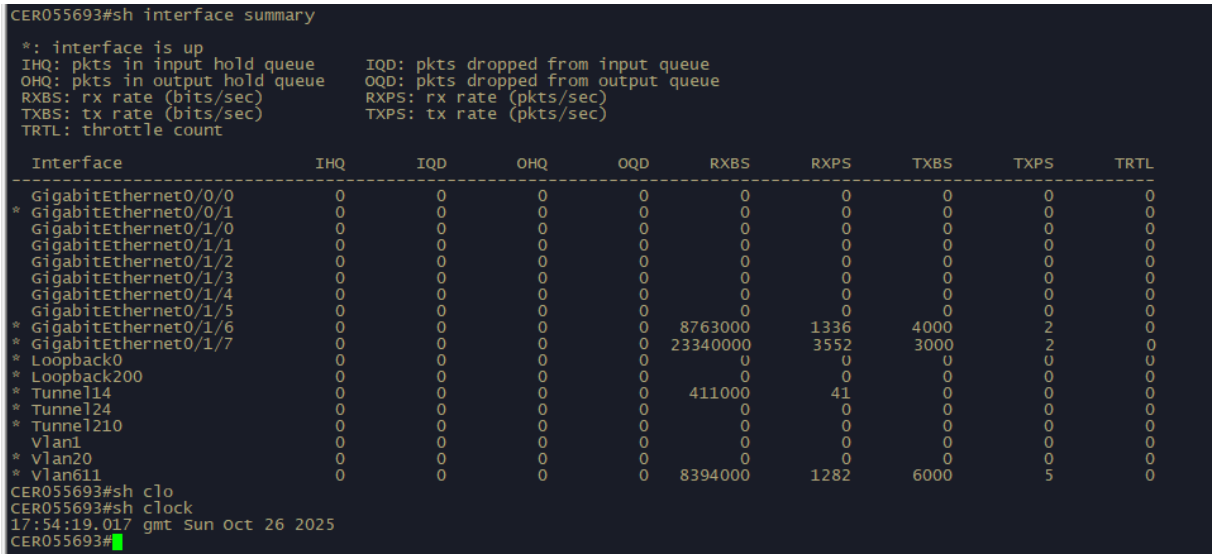


```
CER055693#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  GigabitEthernet0/0/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0   8763000      1336      4000         2         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0  23340000      3552      3000         2         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                  0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel14                     0         0         0         0    411000        41         0         0         0
* Tunnel24                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel210                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan20                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan611                      0         0         0         0   8394000      1282      6000         5         0
CER055693#sh clo
CER055693#sh clock
17:54:19.017 gmt Sun Oct 26 2025
CER055693#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
912	1	Valle Del Cauca, Cali; Calle 39 nro 2N -12	25 Mbps	23,2

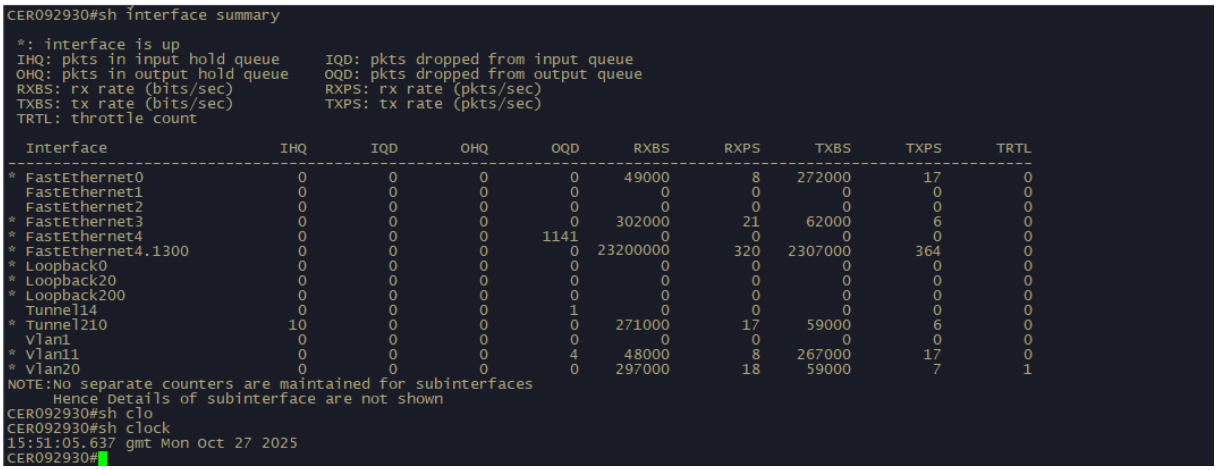


```
CER092930#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0                0         0         0         0     49000         8    272000        17         0
  FastEthernet1                0         0         0         0         0         0         0         0         0
  FastEthernet2                0         0         0         0         0         0         0         0         0
* FastEthernet3                0         0         0         0    302000        21     62000         6         0
* FastEthernet4                0         0         0      1141         0         0         0         0         0
* FastEthernet4.1300           0         0         0         0  23200000       320   2307000       364         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                  0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Tunnel14                     0         0         0         1         0         0         0         0         0
* Tunnel210                   10         0         0         0    271000        17     59000         6         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                       0         0         0         4     48000         8    267000        17         0
* Vlan20                       0         0         0         0    297000        18     59000         7         1
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER092930#sh clo
CER092930#sh clock
15:51:05.637 gmt Mon Oct 27 2025
CER092930#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
913	1	Valle Del Cauca, Cali; Carrera 41B #50	25 Mbps	23,32

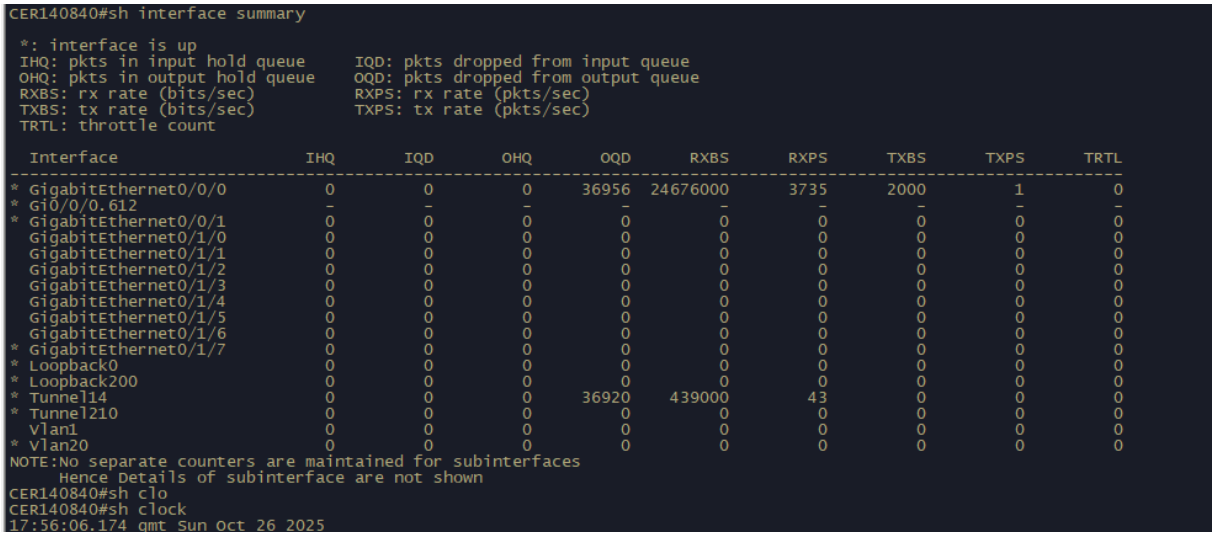


```
CER140840#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0     36956  24676000      3735      2000         1         0
* Gi0/0/0.612                   -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel14                      0         0         0     36920    439000        43         0         0         0
* Tunnel210                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan20                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER140840#sh clo
CER140840#sh clock
17:56:06.174 gmt Sun Oct 26 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3507-B	1	Cundinamarca, Madrid; Carrera 5 # 5 - 21 piso 2	32 Mbps	29,98

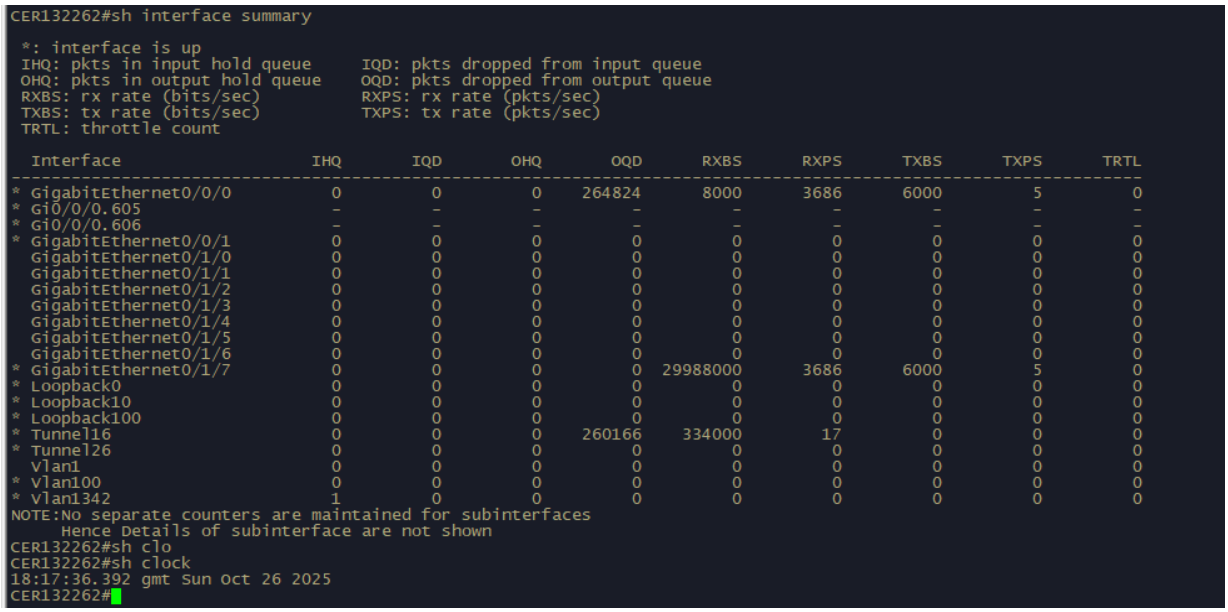


```
CER132262#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0    264824      8000      3686      6000         5         0
* Gi0/0/0.605                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.606                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0  29988000      3686      6000         5         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback100                  0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel16                     0         0         0    260166    334000        17         0         0         0
* Tunnel26                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan100                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1342                     1         0         0         0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER132262#sh clo
CER132262#sh clock
18:17:36.392 gmt Sun Oct 26 2025
CER132262#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
360-B	4	Cauca, Timbío; Carrera 17 # 18-18	32 Mbps	29,76

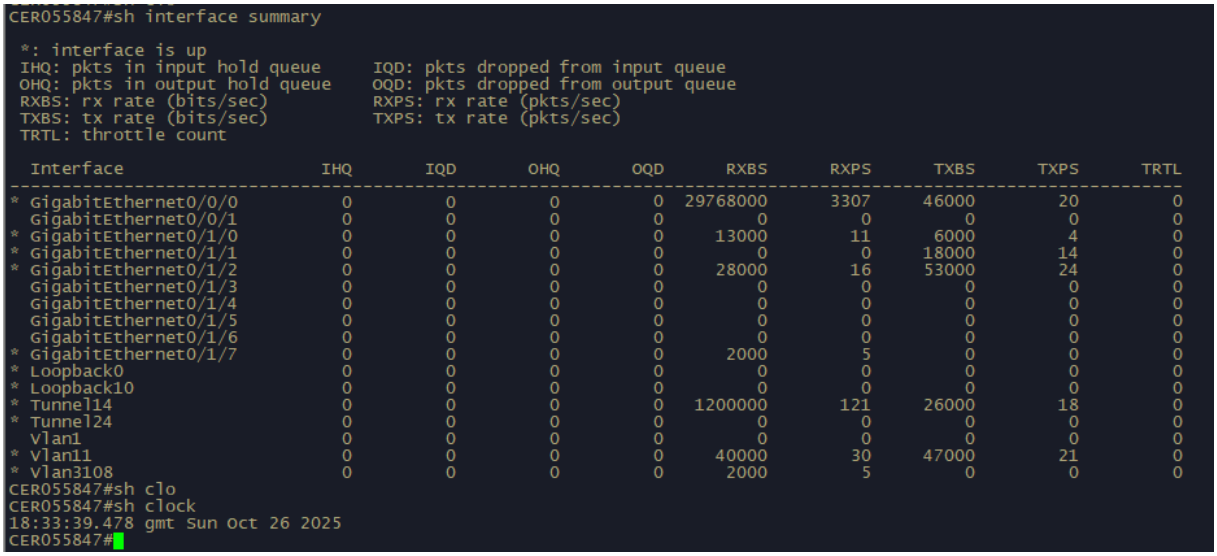


```
CER055847#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0         0  29768000      3307     46000        20         0
  GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0     13000        11      6000         4         0
* GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0     18000        14         0
* GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0     28000        16     53000        24         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0      2000         5         0         0         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel14                     0         0         0         0   1200000       121     26000        18         0
* Tunnel24                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                       0         0         0         0     40000        30     47000        21         0
* Vlan3108                     0         0         0         0      2000         5         0         0         0
CER055847#sh clo
CER055847#sh clock
18:33:39.478 gmt Sun Oct 26 2025
CER055847#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
384-B	3	Cundinamarca, Ricaurte; Carrera 15 # 4-99	32 Mbps	29,22

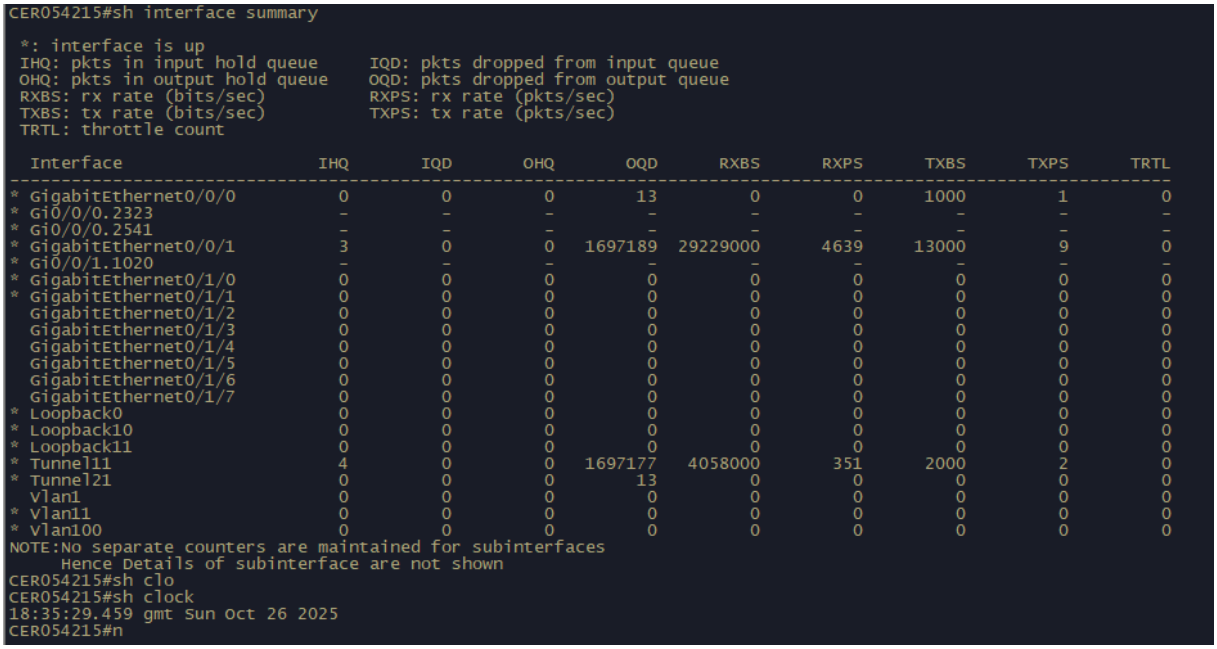

```
CER054215#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0        13         0         0      1000         1         0
* Gi0/0/0.2323                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2541                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          3         0         0   1697189  29229000      4639     13000         9         0
* Gi0/0/1.1020                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback11                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                      4         0         0   1697177   4058000       351      2000         2         0
* Tunnel21                      0         0         0        13         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan100                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054215#sh clo
CER054215#sh clock
18:35:29.459 gmt Sun Oct 26 2025
CER054215#n
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
413-B	3	Magdalena, Plato; Calle 3 # 12-02	32 Mbps	30,42

```
CER062318#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0     37000        47         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0      6000         5      5000         3         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0     18701  29432000      4534     31000        16         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback11                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel13                      0         0         0     18638   1523000       134      4000         3         0
* Tunnel23                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan314                       0         0         0         0      3000         3         0         0         0
CER062318#sh clo
CER062318#sh clock
18:45:35.049 gmt Sun Oct 26 2025
CER062318#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
451-B	4	Sucre, Sucre; Calle 10 # 2-21 Edificio Cure	32 Mbps	36,74

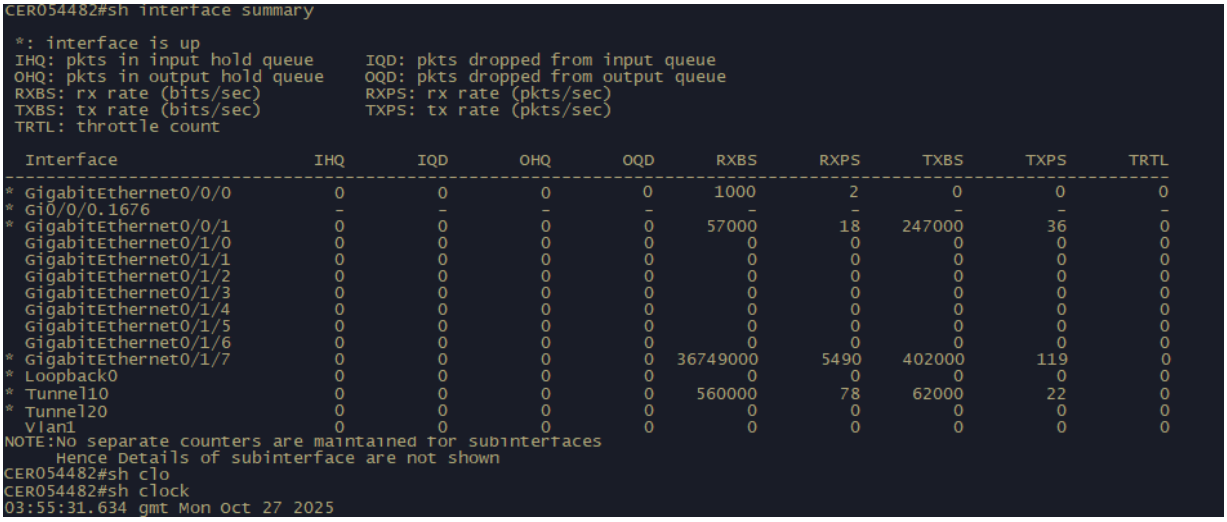


```
CER054482#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0      1000         2         0         0         0
* Gi0/0/0.1676                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0     57000        18    247000        36         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0  36749000      5490    402000       119         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel10                      0         0         0         0    560000        78     62000        22         0
* Tunnel20                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054482#sh clo
CER054482#sh clock
03:55:31.634 gmt Mon Oct 27 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
541-B	3	Córdoba, Planeta Rica; 18 # 9-50, Palacio de Justicia	32 Mbps	31,68

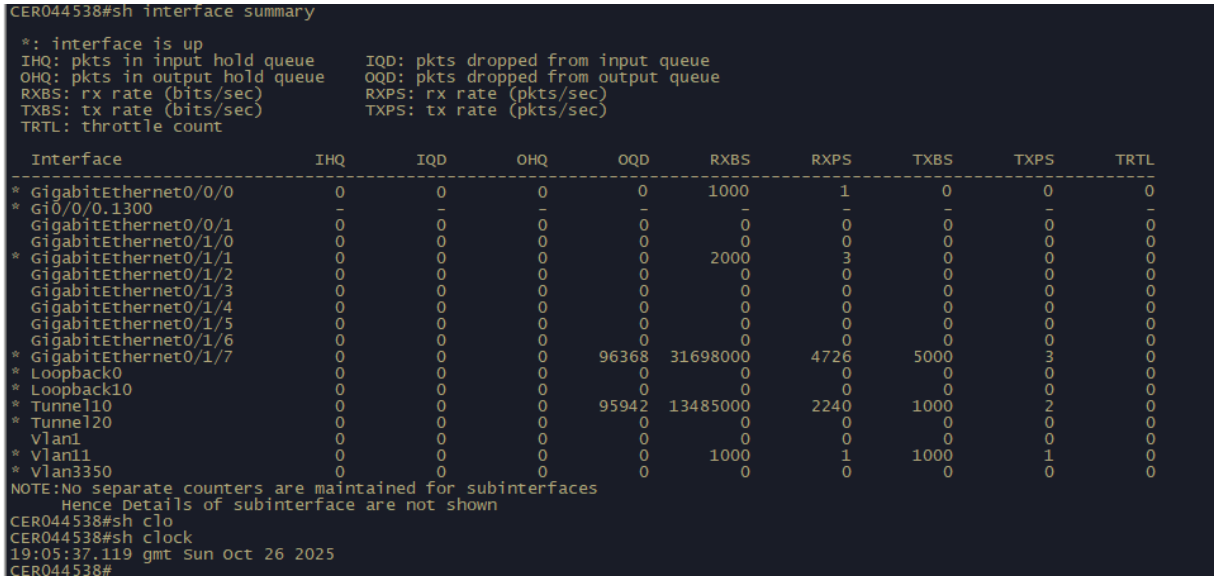

```
CER044538#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0       1000         1         0         0         0
* Gi0/0/0.1300                  -         -         -         -          -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0       2000         3         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0          0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0     96368   31698000      4726      5000         3         0
* Loopback0                     0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Tunnel10                      0         0         0     95942   13485000      2240      1000         2         0
* Tunnel20                      0         0         0         0          0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0       1000         1      1000         1         0
* Vlan3350                      0         0         0         0          0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER044538#sh clo
CER044538#sh clock
19:05:37.119 gmt Sun Oct 26 2025
CER044538#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
544-B	3	La Guajira, Fonseca; Calle 11 # 17-48	32 Mbps	30,10

```
CER043843#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0    120261  30103000      4360      9000         7         0
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0    120261  30103000      4360      9000         7         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback100                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel10                      0         0         0    120160   6424000      1046         0         0         0
* Tunnel20                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan286                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
CER043843#sh clo
CER043843#sh clock
19:29:04.412 gmt Sun Oct 26 2025
CER043843#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
546-B	3	La Guajira, Uribia; Calle 12 # 5-03 Plaza Principal	32 Mbps	30,13

```
CER062517#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0      4000         5      1000         1         0
* GiO/0/0.2340                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0  30132000      4784      4000         3         0
  GigabitEthernet0              0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel13                      0         0         0         0   2285000       200      1000         1         0
* Tunnel23                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan3354                      0         0         0         0  30150000      4835      2000         1         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062517#sh clo
19:40:08.341 gmt Sun Oct 26 2025
CER062517#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
644-B	4	Cundinamarca, El Peñón; Carrera 3 # 3-44	32 Mbps	30,28

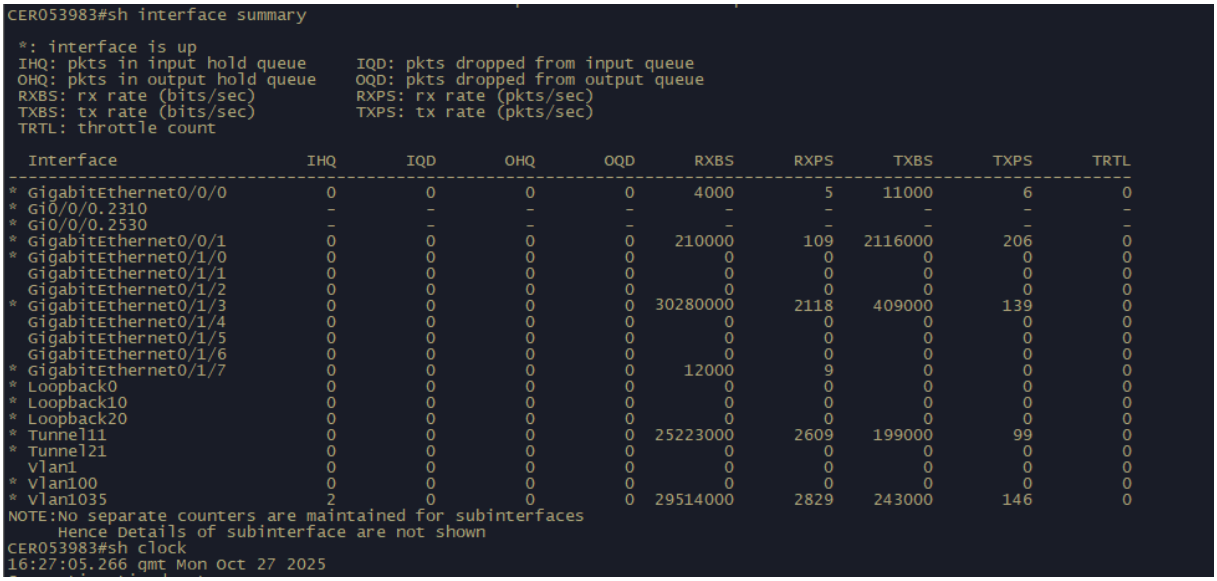


```
CER053983#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0      4000         5     11000         6         0
* Gi0/0/0.2310                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2530                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0    210000       109   2116000       206         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0  30280000      2118    409000       139         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0     12000         9         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                      0         0         0         0  25223000      2609    199000        99         0
* Tunnel21                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan100                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1035                      2         0         0         0  29514000      2829    243000       146         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER053983#sh clock
16:27:05.266 gmt Mon Oct 27 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
652-B	3	Cundinamarca, Quetame; Calle 2 # 4-18	32 Mbps	30,23

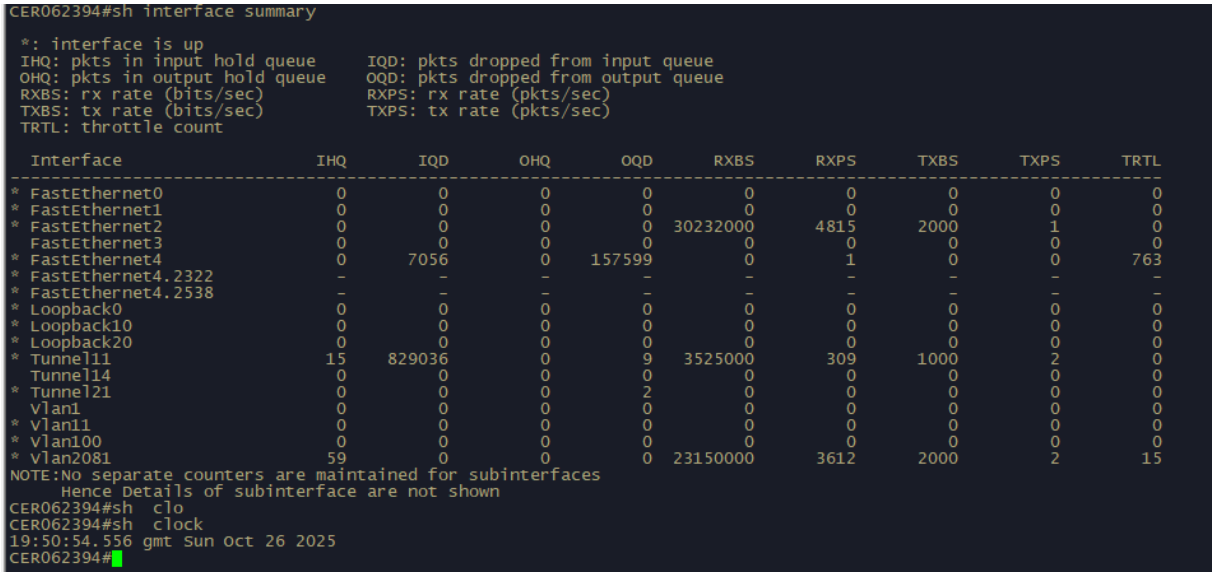

```
CER062394#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0              0         0         0         0         0         0         0         0         0
* FastEthernet1              0         0         0         0         0         0         0         0         0
* FastEthernet2              0         0         0         0  30232000      4815      2000         1         0
  FastEthernet3              0         0         0         0         0         0         0         0         0
* FastEthernet4              0      7056         0    157599         0         1         0         0       763
* FastEthernet4.2322         -         -         -         -         -         -         -         -         -
* FastEthernet4.2538         -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Loopback0                  0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                 0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                 0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                  15    829036         0         9   3525000       309      1000         2         0
  Tunnel14                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel21                   0         0         0         2         0         0         0         0         0
  Vlan1                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan100                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan2081                  59         0         0         0  23150000      3612      2000         2        15
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062394#sh  clo
CER062394#sh  clock
19:50:54.556 gmt Sun Oct 26 2025
CER062394#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
677-B	3	Magdalena, Pivijay; Carrera 15 # 4-23	32 Mbps	30,09

```
CER062373#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0         309        1000           2           0           1           0
  GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0        3000           5        3000           3           0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7          0           0           0       27082    30090000        4548        4000           1           0
* Loopback0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel13                      0           0           0       27028      890000          75           0           0           0
* Tunnel23                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan356                       0           0           0           0        1000           1        1000           1           0
CER062373#sh clo
CER062373#sh clock
19:53:11.445 gmt Sun Oct 26 2025
CER062373#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
882-B	4	Cundinamarca, El Rosal; Calle 9 # 5-12	32 Mbps	29,69

```
CER057617#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0      3000         5         0         0         0
* Gi0/0/0.2520                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2555                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0     12000        10         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0     27082  29691000      4495      5000         1         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback200                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                      0         0         0         0   4794000       411      1000         1         0
* Tunnel21                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0     12000        10         0         0         0
  Vlan30                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan100                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1047                      0         0         0         0  14627000      2206      3000         3         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER057617#sh clo
CER057617#sh clock
20:10:18.082 gmt Sun Oct 26 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
907-B	4	Cundinamarca, Albán; Carrera 1 # 3-08	32 Mbps	30,09

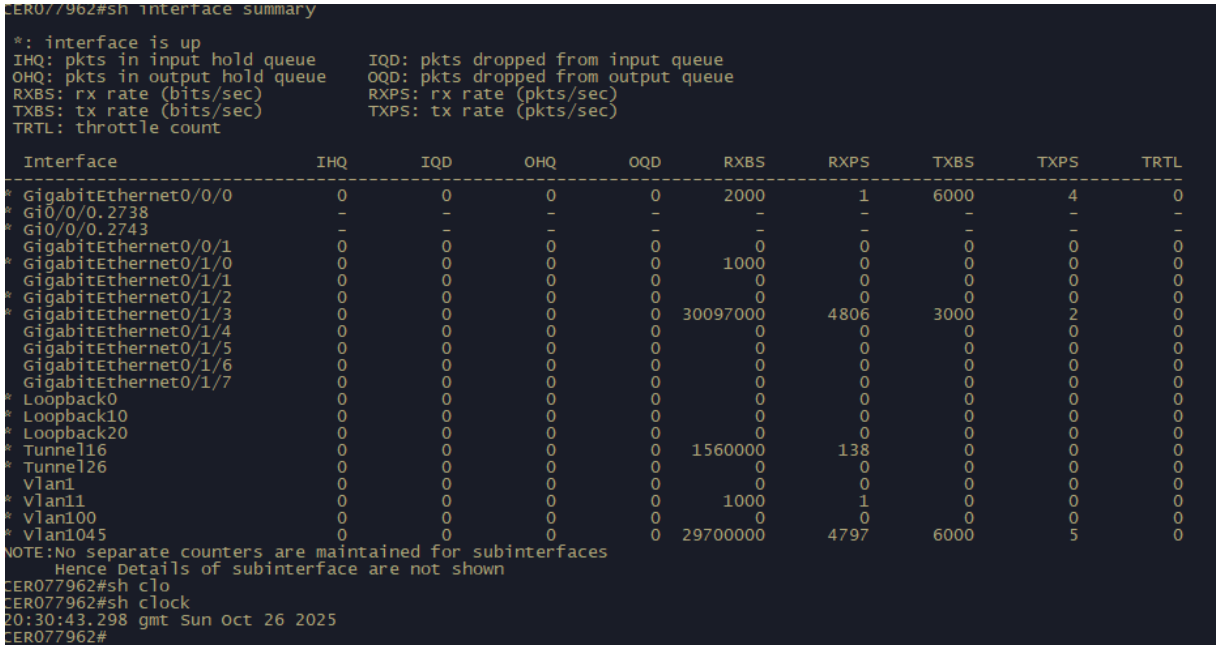


```
CER077962#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0      2000         1      6000         4         0
* Gi0/0/0.2738                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2743                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0      1000         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0  30097000      4806      3000         2         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel16                      0         0         0         0   1560000       138         0         0         0
* Tunnel26                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0      1000         1         0         0         0
* Vlan100                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1045                      0         0         0         0  29700000      4797      6000         5         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER077962#sh clo
CER077962#sh clock
20:30:43.298 gmt Sun Oct 26 2025
CER077962#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
981-B	4	Cundinamarca, Nariño; Carrera 16 # 6-68 piso 2	32 Mbps	29,02

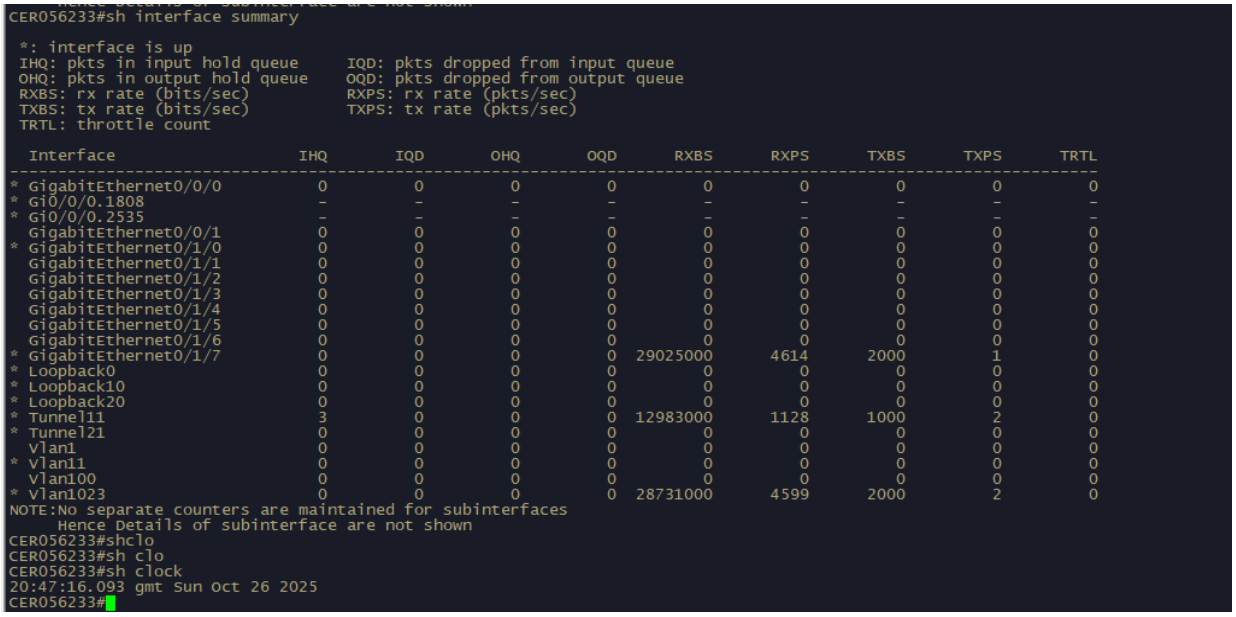


```
CER056233#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Gi0/0/0.1808                 -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2535                 -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0  29025000      4614      2000         1         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                     3         0         0         0  12983000      1128      1000         2         0
* Tunnel21                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan100                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1023                     0         0         0         0  28731000      4599      2000         2         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056233#shclo
CER056233#sh clo
CER056233#sh clock
20:47:16.093 gmt Sun Oct 26 2025
CER056233#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
982-B	1	Cundinamarca, Pandi; Carrera 3A # 3-39	32 Mbps	29,38

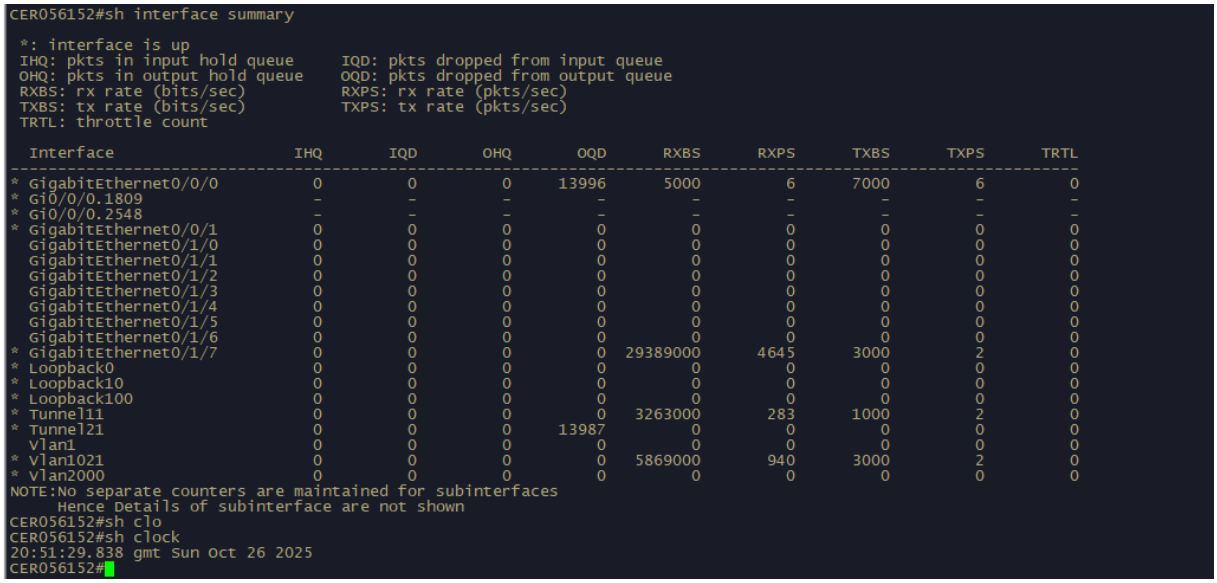


```
CER056152#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0     13996      5000         6      7000         6         0
* Gi0/0/0.1809                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2548                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0  29389000      4645      3000         2         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback100                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                      0         0         0         0   3263000       283      1000         2         0
* Tunnel21                      0         0         0     13987         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1021                      0         0         0         0   5869000       940      3000         2         0
* Vlan2000                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056152#sh clo
CER056152#sh clock
20:51:29.838 gmt Sun Oct 26 2025
CER056152#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
379-B	3	Cundinamarca, Arbeláez; Calle 5 # 8-12	40 Mbps	39,14

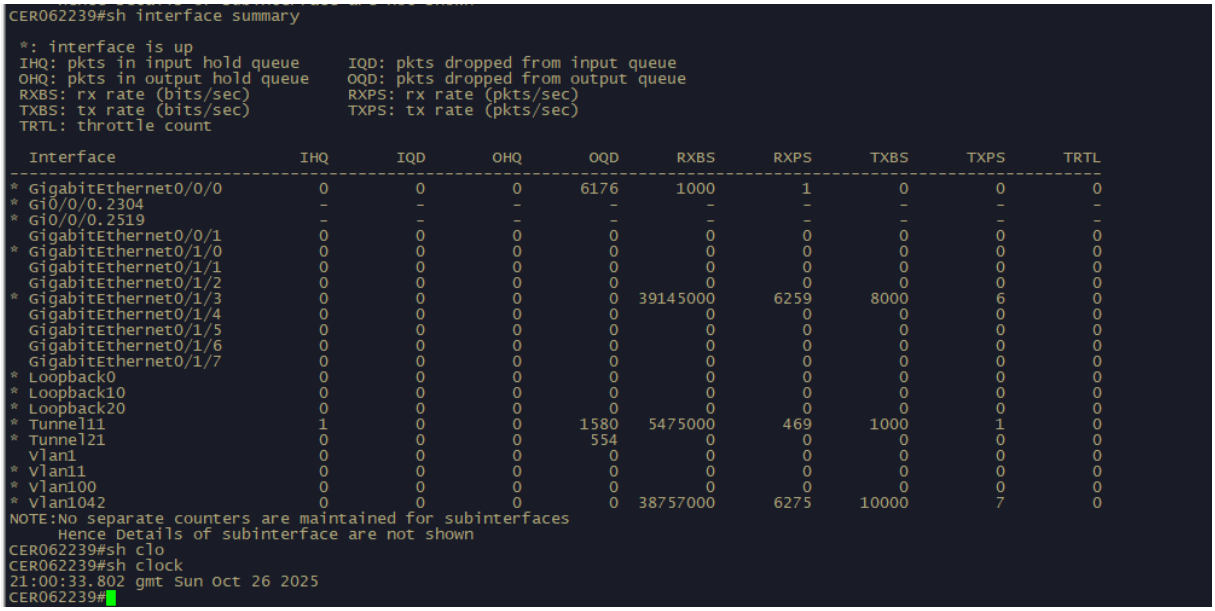

```
CER062239#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0      6176      1000         1         0         0         0
* Gi0/0/0.2304                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2519                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0  39145000      6259      8000         6         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                      1         0         0      1580   5475000       469      1000         1         0
* Tunnel21                      0         0         0       554         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan100                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1042                      0         0         0         0  38757000      6275     10000         7         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062239#sh clo
CER062239#sh clock
21:00:33.802 gmt Sun Oct 26 2025
CER062239#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
381-B	3	Cundinamarca, Cabrera; Antiguo Colegio Dptal	40 Mbps	39,55

```
CER054668#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0         0         0      1000         1         0
* Gi0/0/0.2307                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2522                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0     14000        11     32000         7         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0  39551000      6493      8000         4         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                      0         0         0         0   1522000       133     10000         6         0
* Tunnel21                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan100                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1041                      0         0         0         0  14659000      2425     17000         8         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054668#sh clo
CER054668#sh clock
21:17:35.354 gmt Sun Oct 26 2025
CER054668#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
385-B	4	Cundinamarca, San Juan de Rioseco; Carrera 7	40 Mbps	37,31

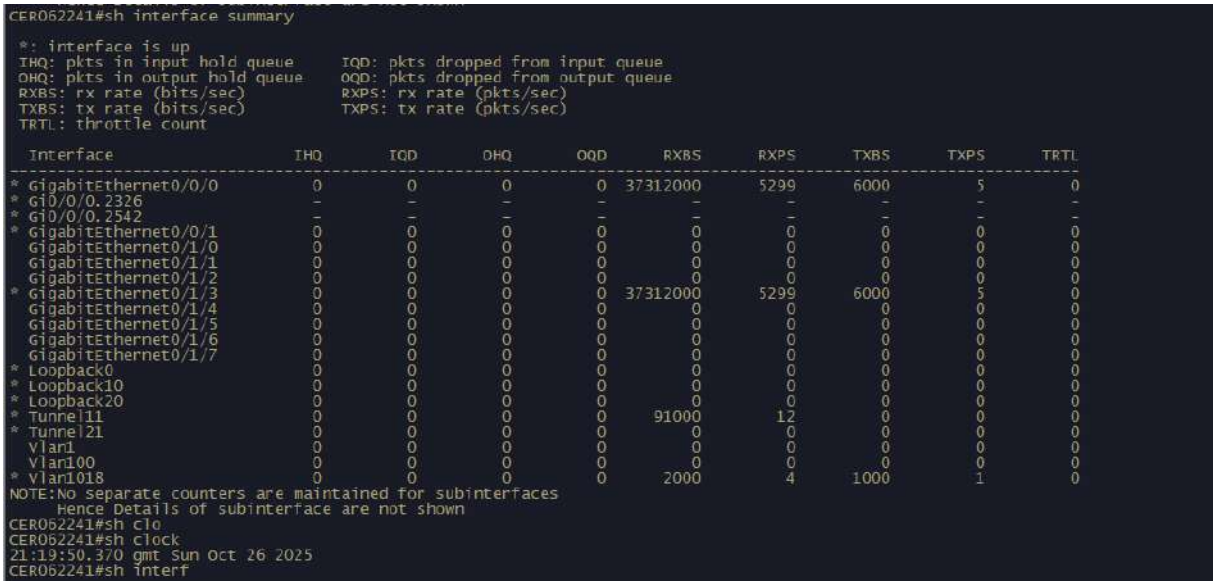


```
CERO62241#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0         0  37312000      5299      6000         5         0
* Gi0/0/0.2326                 -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2542                 -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0  37312000      5299      6000         5         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                     0         0         0         0     91000        12         0         0         0
* Tunnel21                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan100                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1018                     0         0         0         0      2000         4      1000         1         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO62241#sh clo
CERO62241#sh clock
21:19:50.370 gmt Sun Oct 26 2025
CERO62241#sh interf
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
389-B	3	Cundinamarca, Subachoque; Calle 3 # 1-15	40 Mbps	38,15

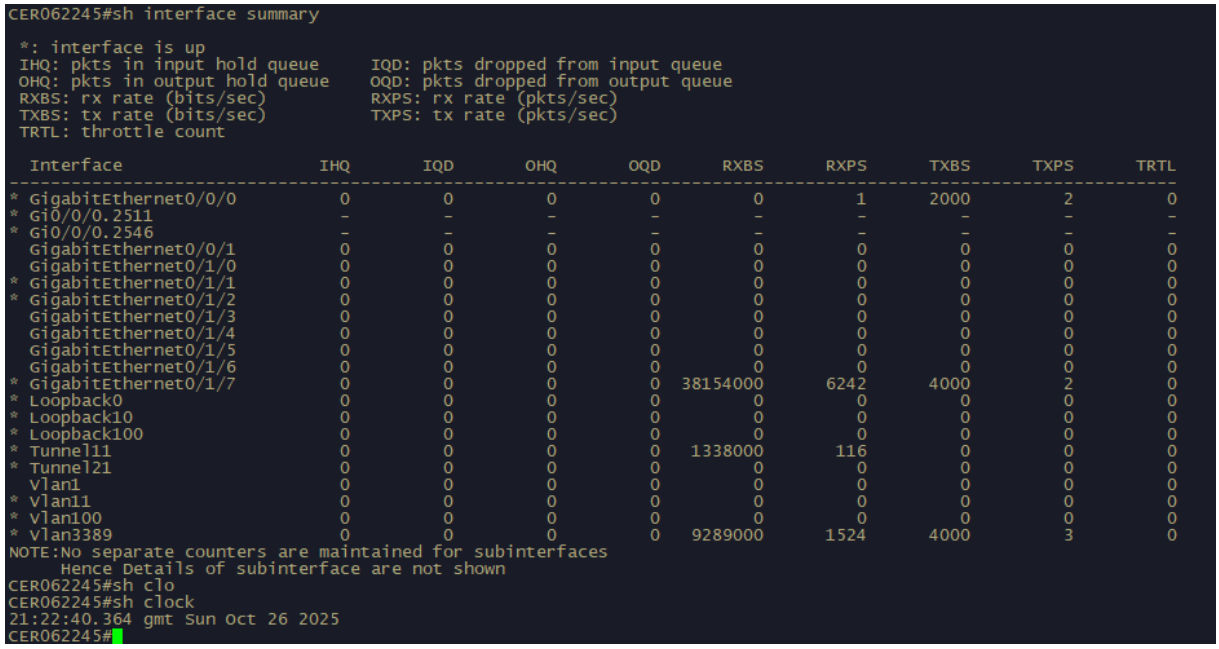

```
CER062245#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0         0         1      2000         2         0
* Gi0/0/0.2511                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2546                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0  38154000      6242      4000         2         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback100                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                      0         0         0         0   1338000       116         0         0         0
* Tunnel21                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan100                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan3389                      0         0         0         0   9289000      1524      4000         3         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062245#sh clo
CER062245#sh clock
21:22:40.364 gmt Sun Oct 26 2025
CER062245#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
392-B	3	Cundinamarca, Villeta; Calle 6 # 8-90	40 Mbps	37,47

```
CER062291#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0   9289000      4611         0         0         0
* Gi0/0/0.2187                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2270                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0      2000         1         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0  39067000      4611         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                      0         0         0         0   2500000       214         0         0         0
* Tunnel21                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan100                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan637                       0         0         0         0      1000         1      3000         2         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062291#sh clo
CER062291#sh clock
22:00:50.153 gmt Sun Oct 26 2025
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
441-B	2	Santander, Barbosa; Carrera 9 # 7-21	40 Mbps	38,74

```
CER053160#sh interface summary


 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0     85416       9000          6       7000          6          0
* Gi0/0/0.661                   -         -         -         -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0       1000          1          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0  36749000       5490     402000        119          0          0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                      0         0         0     84914       1000          2          0          0          0
* Tunnel25                      0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0         0         0         0          0          0       1000          2          0
* Vlan1277                      0         0         0         0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER053160#SH CLO
CER053160#SH CLOck
03:27:33.203 gmt Mon Oct 27 2025
CER053160#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
463-B	3	Tolima, Flandes; Calle 10 # 4-50	40 Mbps	38,32

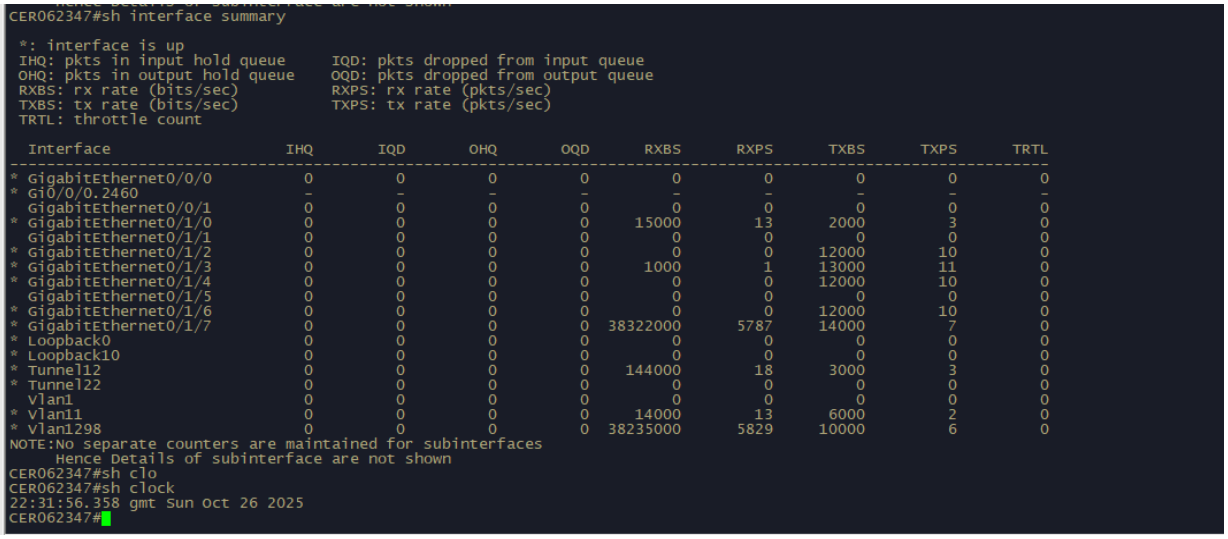

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
925-B	3	Cundinamarca, Tabio; Carrera 2 # 4-26 Piso 1	40 Mbps	38,12

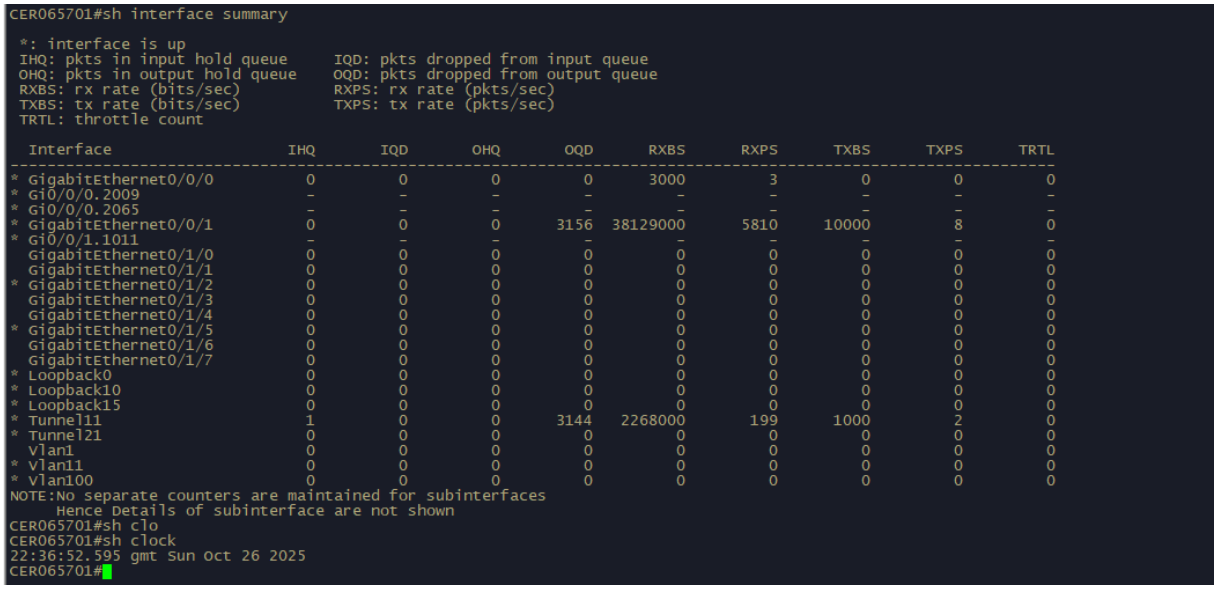


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
390-B	1	Cundinamarca, Tenjo; Carrera 6 # 2-46	50 Mbps	49,22

```
CER054297#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0         0         2         0         0         0
* Gi0/0/0.311                   -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.312                   -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0      1000         1      1000         1         0
* Gi0/0/1.1009                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/1.1090                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0  50014000      7533         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback1                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                      0         0         0         0    151000        17         0         0         0
* Tunnel21                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan100                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan1007                      0         0         0         0  27395000      4174      1000         1         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054297#sh clo
CER054297#sh clock
22:54:04.171 gmt Sun Oct 26 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
514-B	3	Valle Del Cauca, Vijes; Carrera 4 # 3-95	50 Mbps	45,06

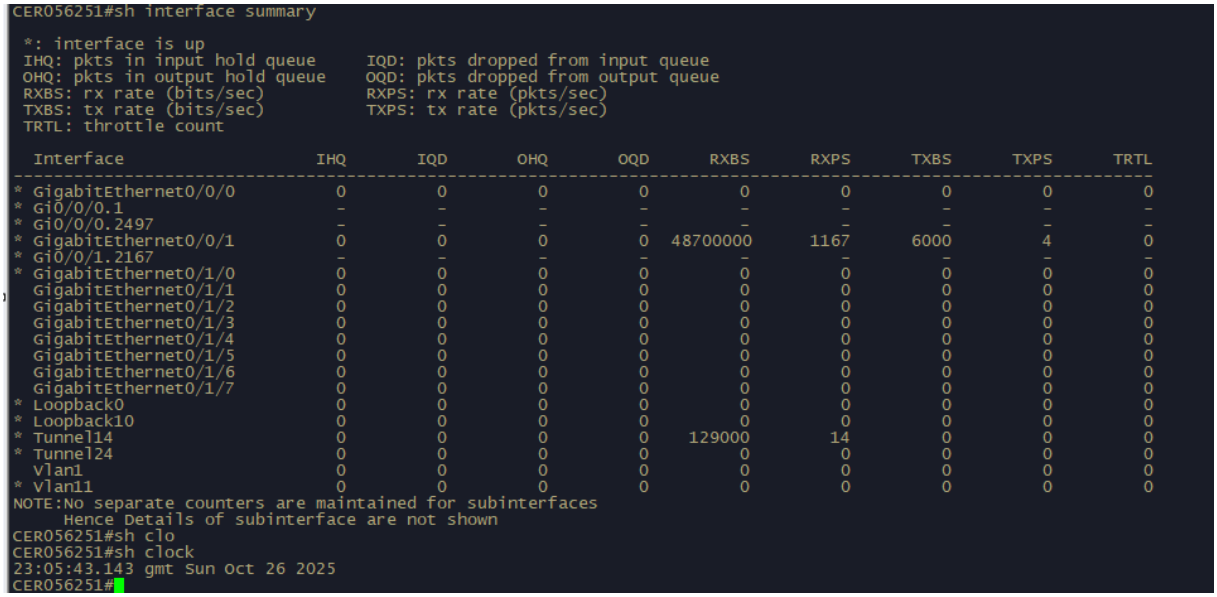


```
CER056251#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Gi0/0/0.1                     -         -         -         -          -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2497                  -         -         -         -          -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0   48700000      1167      6000         4         0
* Gi0/0/1.2167                  -         -         -         -          -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Tunnel14                      0         0         0         0     129000        14         0         0         0
* Tunnel24                      0         0         0         0          0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Vlan11                        0         0         0         0          0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056251#sh clo
CER056251#sh clock
23:05:43.143 gmt Sun Oct 26 2025
CER056251#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3523-B	1	Quindío, Quimbaya; Carrera 5	50 Mbps	47,16

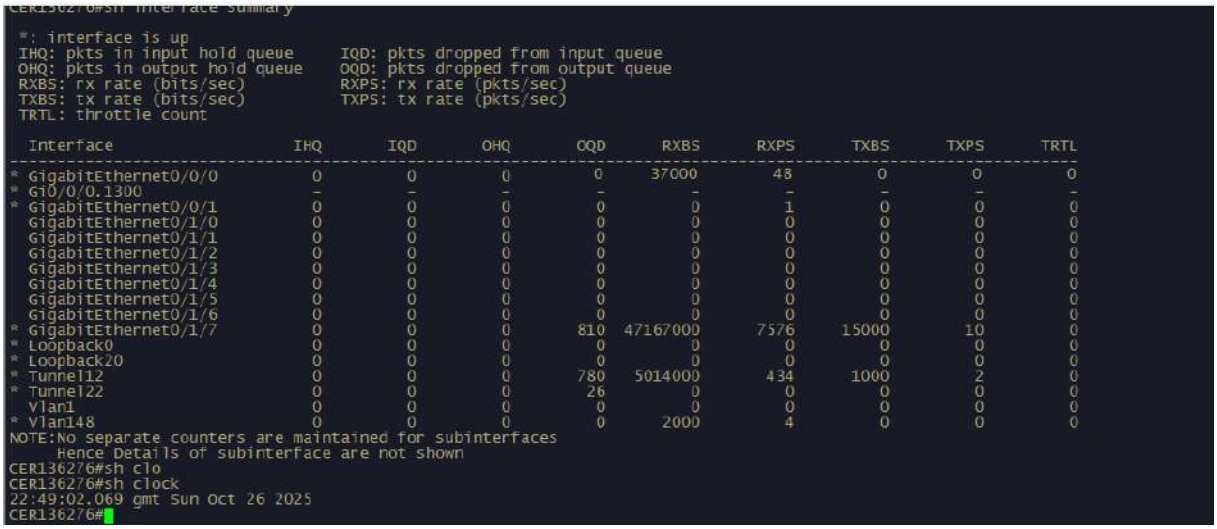


```
CER136276#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0      37000        48         0         0         0
* Gi0/0/0.1300                  -         -         -         -          -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0          0         1         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0          0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0       810   47167000      7576     15000        10         0
* Loopback0                     0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Loopback20                    0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Tunnel12                      0         0         0       780    5014000       434      1000         2         0
* Tunnel22                      0         0         0        26          0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Vlan148                       0         0         0         0       2000         4         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER136276#sh clo
CER136276#sh clock
22:49:02.069 gmt Sun Oct 26 2025
CER136276#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
643-B	4	Cundinamarca, Cucunuba; Carrera 3 # 2-30	50 Mbps	47,40

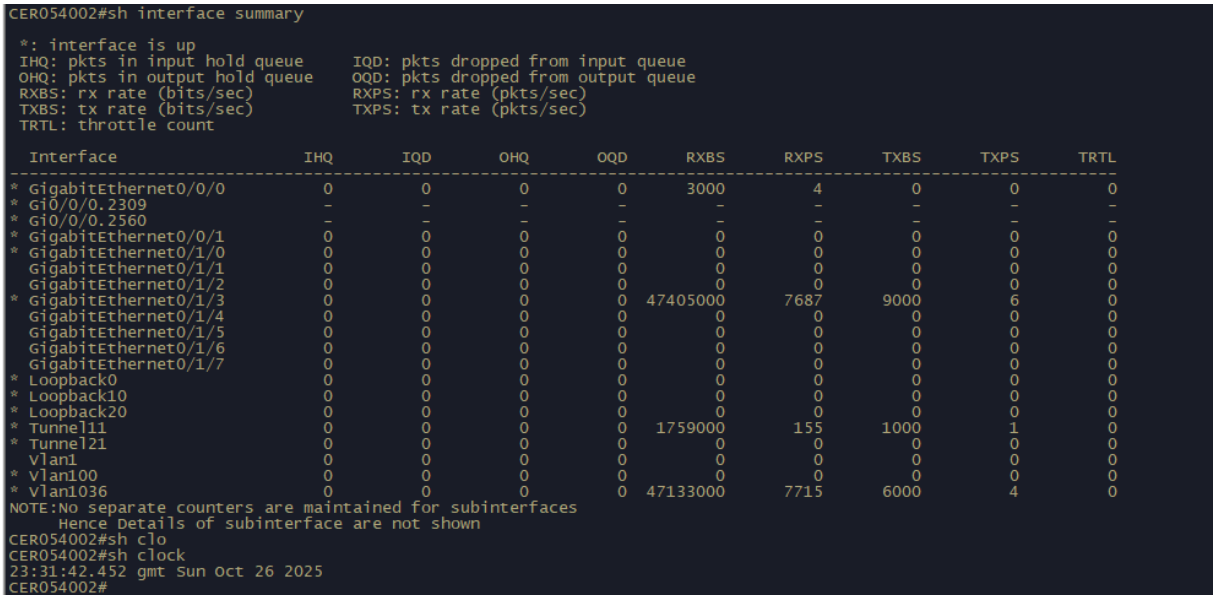


```
CER054002#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0           0        3000           4           0           0           0
* GiO/0/0.2309                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GiO/0/0.2560                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0    47405000        7687        9000           6           0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0           0           0           0           0           0
* LoopBack0                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* LoopBack10                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* LoopBack20                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel11                      0           0           0           0     1759000         155        1000           1           0
* Tunnel21                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan100                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan1036                      0           0           0           0    47133000        7715        6000           4           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054002#sh clo
CER054002#sh clock
23:31:42.452 gmt Sun Oct 26 2025
CER054002#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
516-B	3	Valle Del Cauca, Zarzal; Calle 10 No. 8-56	50 Mbps	46,94

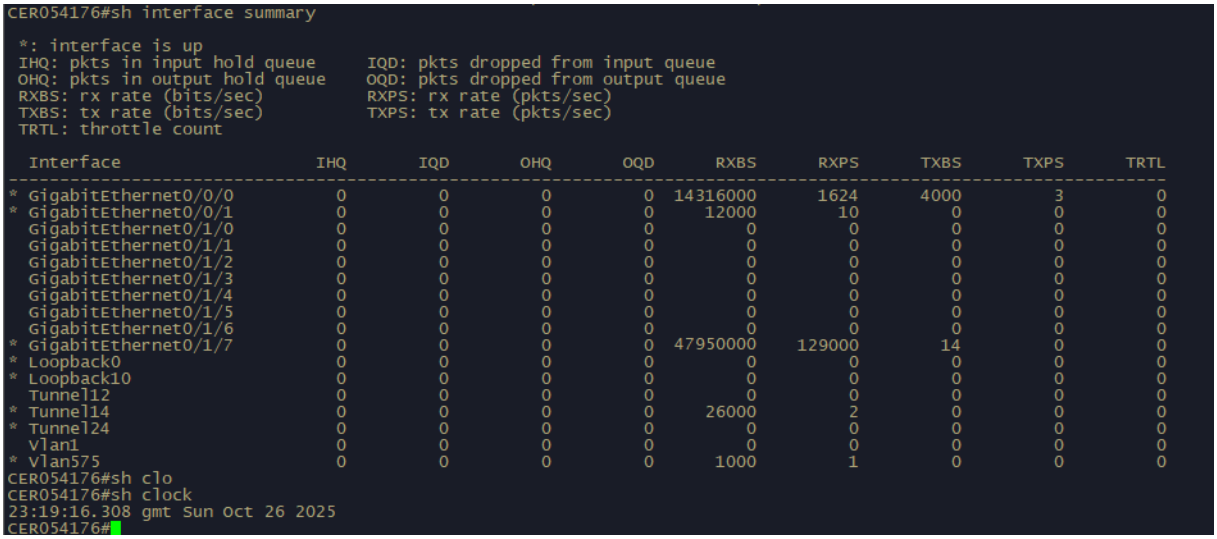


```
CER054176#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0  14316000      1624      4000         3         0
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0     12000        10         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0  47950000    129000        14         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Tunnel12                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel14                      0         0         0         0     26000         2         0         0         0
* Tunnel24                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan575                       0         0         0         0      1000         1         0         0         0
CER054176#sh clo
CER054176#sh clock
23:19:16.308 gmt Sun Oct 26 2025
CER054176#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
985-B	3	Cundinamarca, Gachala; Palacio de Justicia	50 Mbps	47,52

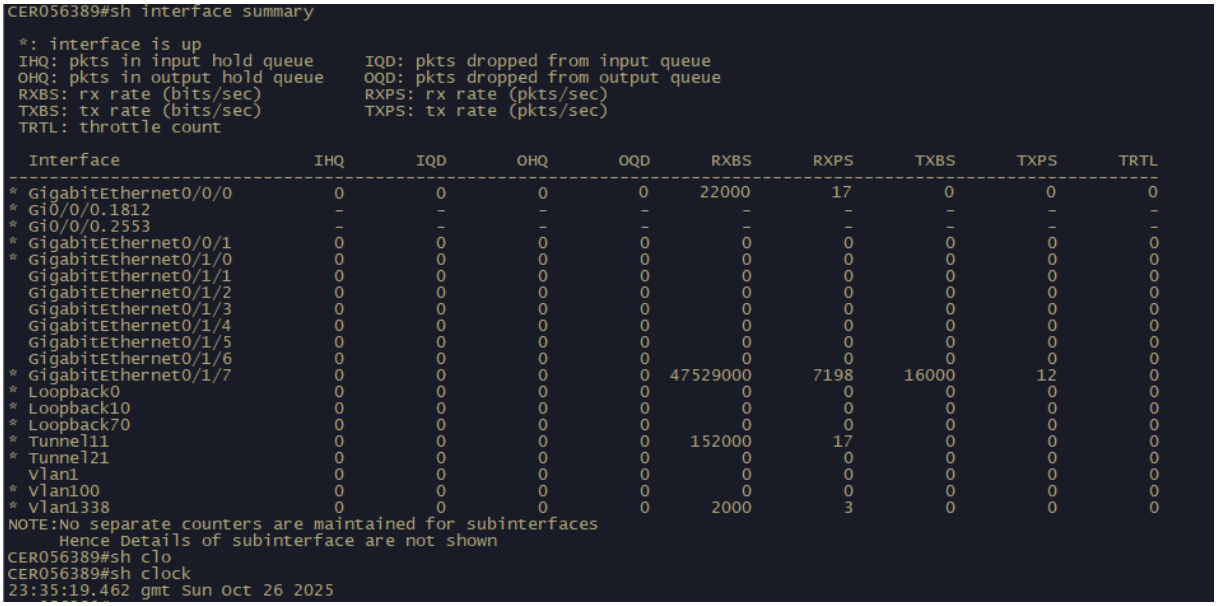


```
CER056389#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0      22000        17         0         0         0
* Gi0/0/0.1812                  -         -         -         -          -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2553                  -         -         -         -          -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0          0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0          0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0          0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0   47529000      7198     16000        12         0
* Loopback0                     0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Loopback70                    0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Tunnel11                      0         0         0         0     152000        17         0         0         0
* Tunnel21                      0         0         0         0          0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Vlan100                       0         0         0         0          0         0         0         0         0
* Vlan1338                      0         0         0         0       2000         3         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056389#sh clo
CER056389#sh clock
23:35:19.462 gmt Sun Oct 26 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3514-B	1	Santander, Barrancabermeja; Calle 51	64 Mbps	60

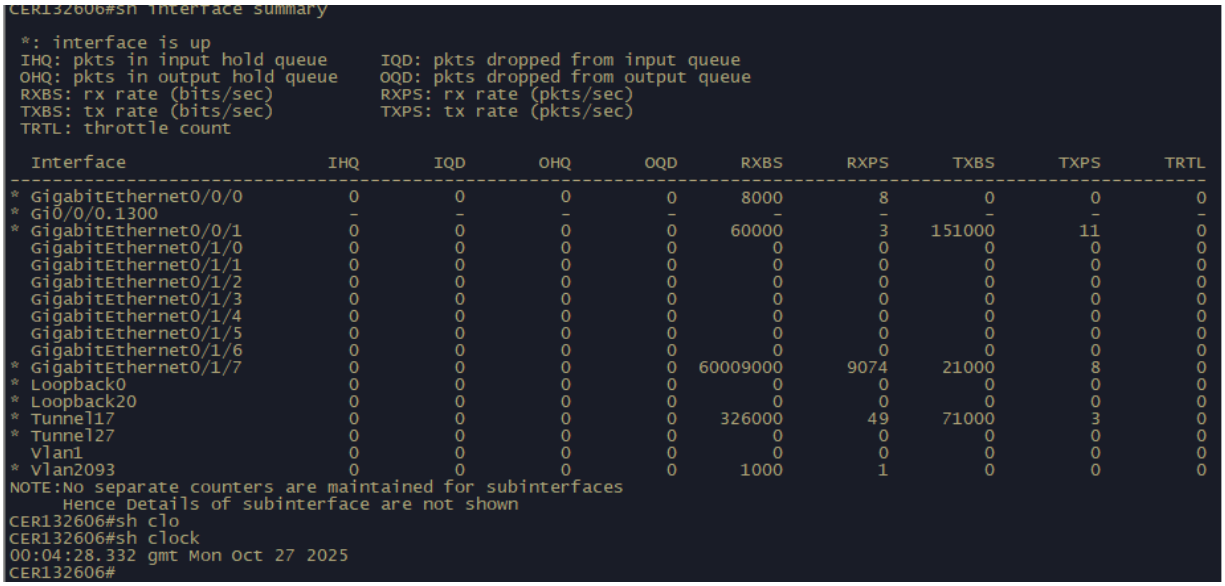


```
CER132606#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0         0      8000         8         0         0         0
* Gi0/0/0.1300                 -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0     60000         3    151000        11         0
  GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0  60009000      9074     21000         8         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel17                     0         0         0         0    326000        49     71000         3         0
* Tunnel27                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan2093                     0         0         0         0      1000         1         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER132606#sh clo
CER132606#sh clock
00:04:28.332 gmt Mon Oct 27 2025
CER132606#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
57-B	1	Atlántico, Barranquilla; Calle 40 # 44-39	64 Mbps	59,2

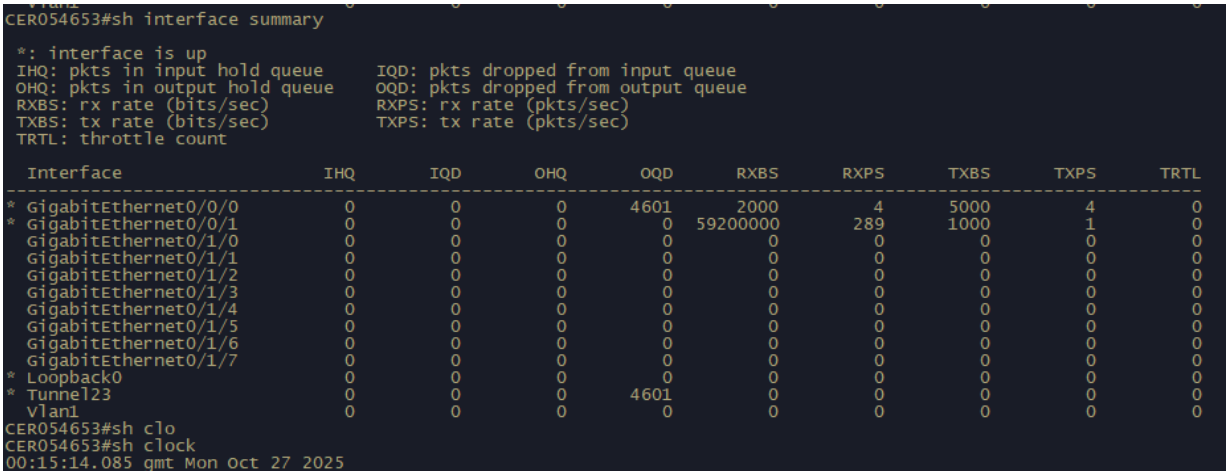

```
CER054653#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0         0         0      4601      2000         4      5000         4         0
* GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0  59200000       289      1000         1         0
  GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel23                     0         0         0      4601         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
CER054653#sh clo
CER054653#sh clock
00:15:14.085 gmt Mon Oct 27 2025
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
659-B	2	Cundinamarca, Ubaté; Carrera 6 # 6-64	64 Mbps	58,10

```
CER062385#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0      1000         2         0         0         0
* Gi0/0/0.2335                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* Gi0/0/0.2550                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0     16000        15    137000        17         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0  58108000      8741     26000        16         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback10                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel11                      0         0         0         0   7761000       680     13000        11         0
* Tunnel21                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan100                       0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan2000                      0         0         0         0  57835000      8727     31000        14         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062385#sh clo
CER062385#sh clock
00:36:01.047 gmt Mon Oct 27 2025
CER062385#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
87-B	1	Bolívar, Cartagena; Calle de la Inquisicion	64 Mbps	58,70

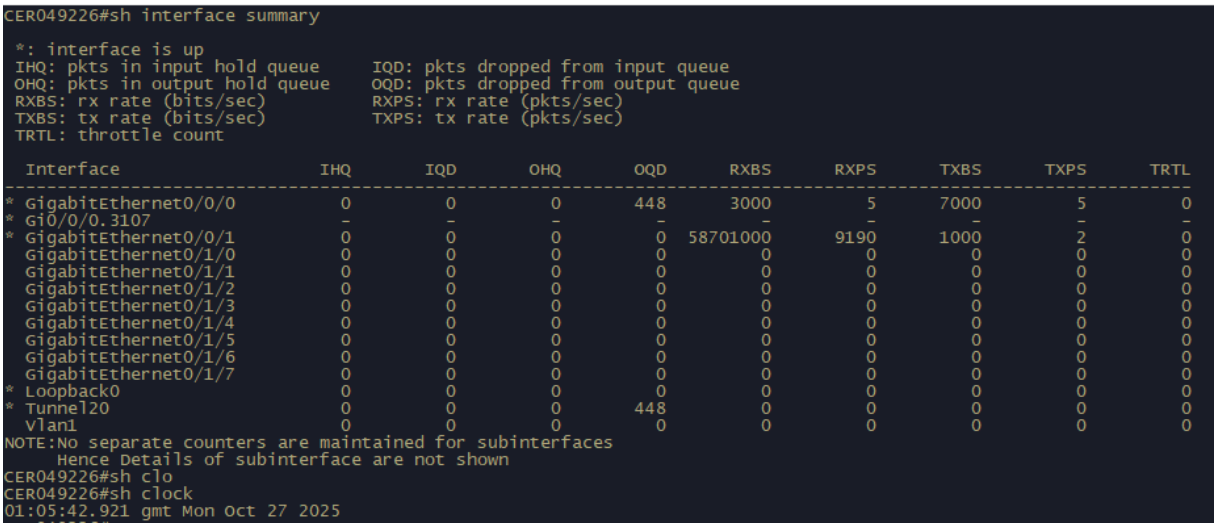


```
CER049226#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0       448      3000         5      7000         5         0
* Gi0/0/0.3107                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0  58701000      9190      1000         2         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel20                      0         0         0       448         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER049226#sh clo
CER049226#sh clock
01:05:42.921 gmt Mon Oct 27 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
307-B	4	Bolívar, Mompós; Carrera 2 # 17A-01	64 Mbps	60,39

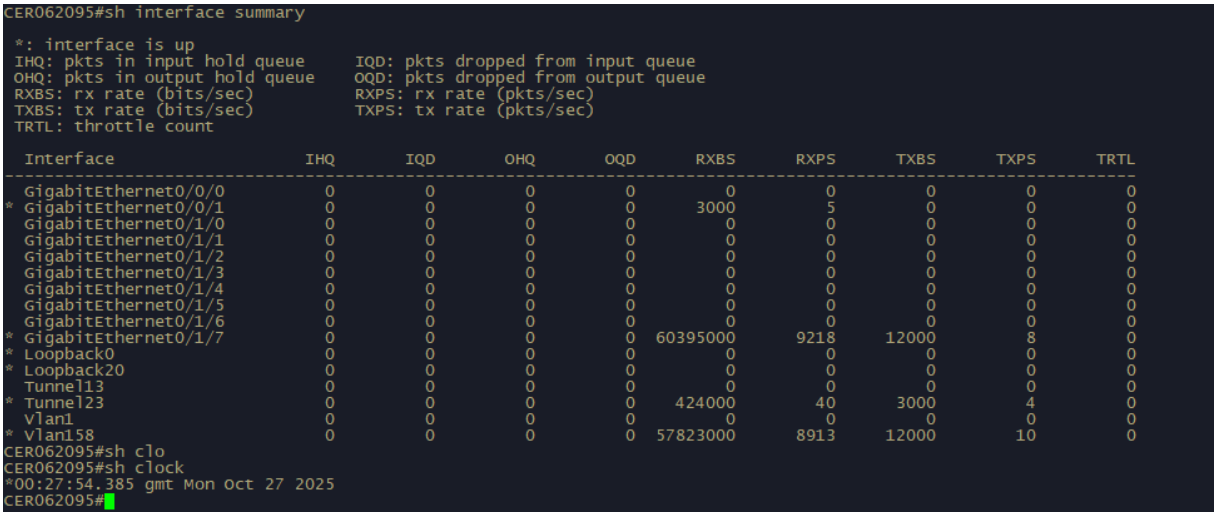

```
CER062095#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0      3000         5         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0  60395000      9218     12000         8         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback20                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Tunnel13                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel23                      0         0         0         0    424000        40      3000         4         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan158                       0         0         0         0  57823000      8913     12000        10         0
CER062095#sh clo
CER062095#sh clock
*00:27:54.385 gmt Mon Oct 27 2025
CER062095#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
86-B	1	Bolívar, Cartagena; Calle 32 # 9-45	112 Mbps	109,5

```
CER048315#sh interface summary

 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          1         0         0         0 109500000     16213      1000         2         0
* GiÔ/0/0.1310                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0         0     16213      1000         2         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel20                      0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan11                        2         0         0         0  97104000     16200      2000         4         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER048315#sh cl
CER048315#sh clo
CER048315#sh clock
01:35:12.102 gmt Mon Oct 27 2025
CER048315#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3511-B	3	Meta, Granada; Carrera 15 # 24-16	32 Mbps	29,94

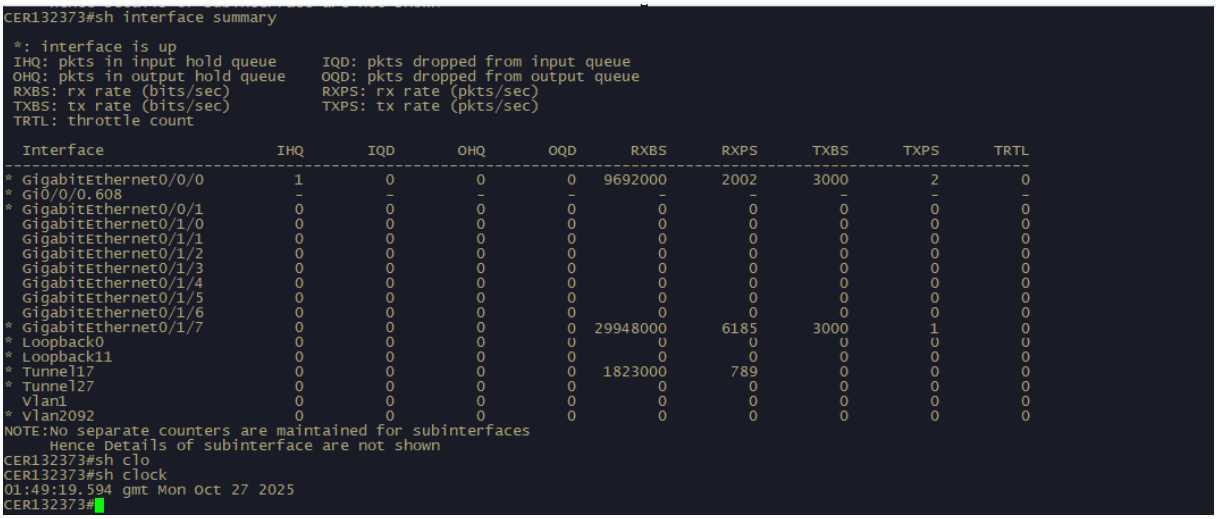


```
CER132373#sh interface summary


 *: interface is up
 IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue
 OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue
 RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)
 TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)
 TRTL: throttle count

  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         1         0         0         0   9692000      2002      3000         2         0
* Gi0/0/0.608                  -         -         -         -         -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0         0         0         0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0         0         0         0         0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0         0         0         0  29948000      6185      3000         1         0
* Loopback0                    0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Loopback11                   0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Tunnel17                     0         0         0         0   1823000       789         0         0         0
* Tunnel27                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
  Vlan1                        0         0         0         0         0         0         0         0         0
* Vlan2092                     0         0         0         0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER132373#sh clo
CER132373#sh clock
01:49:19.594 gmt Mon Oct 27 2025
CER132373#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5171	3	Guaviare, San José del Guaviare	50 Mbps	49,82

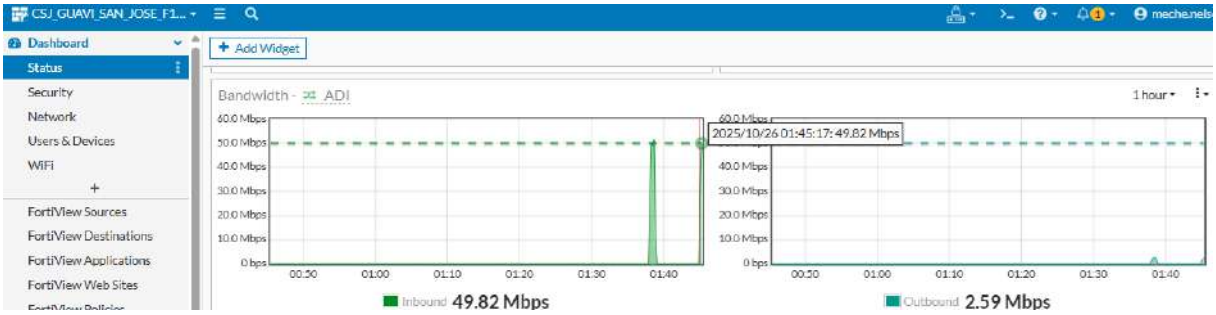


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5069	1	Córdoba, Montería; Calle 43 No 14-43	100 Mbps	99,47

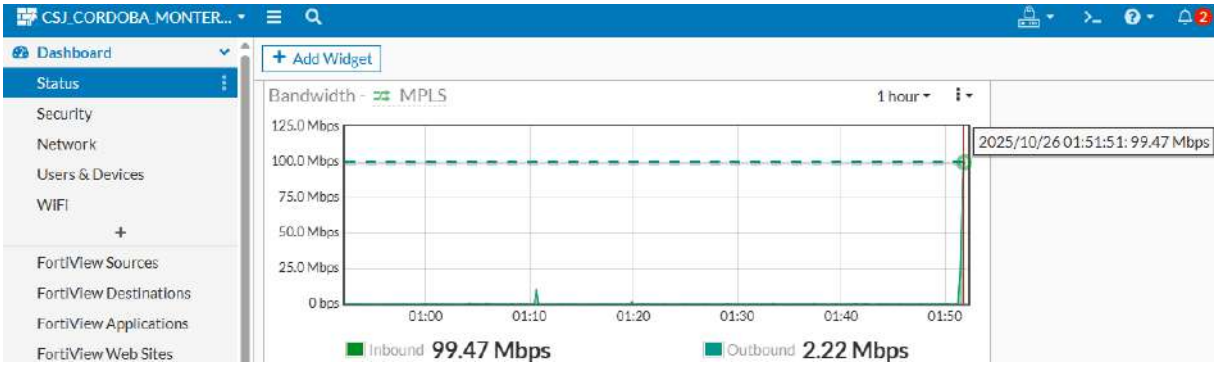


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5005	4	Antioquia, Fredonia; Calle 49 # 51-20	50 Mbps	50,74

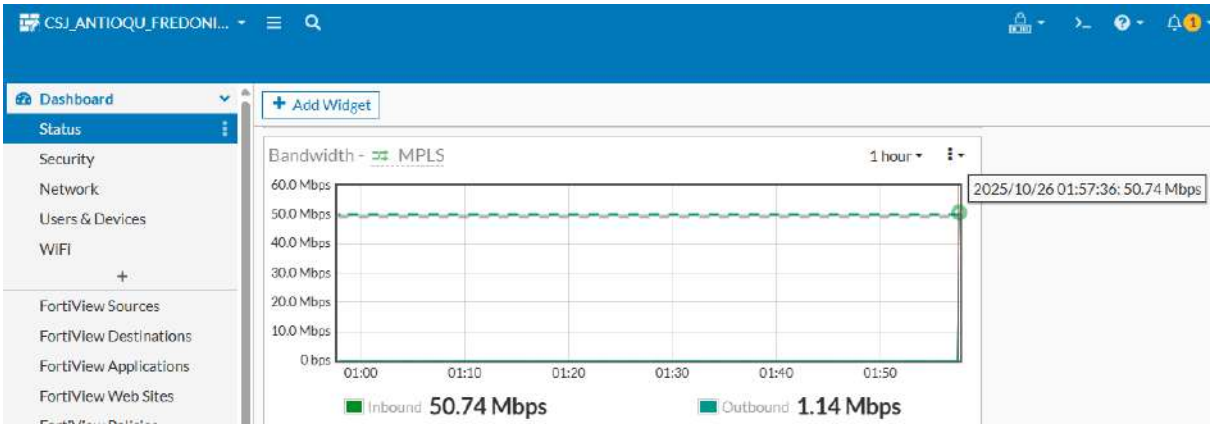


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5030	3	Guaviare, San José del Guaviare	50 Mbps	51,36

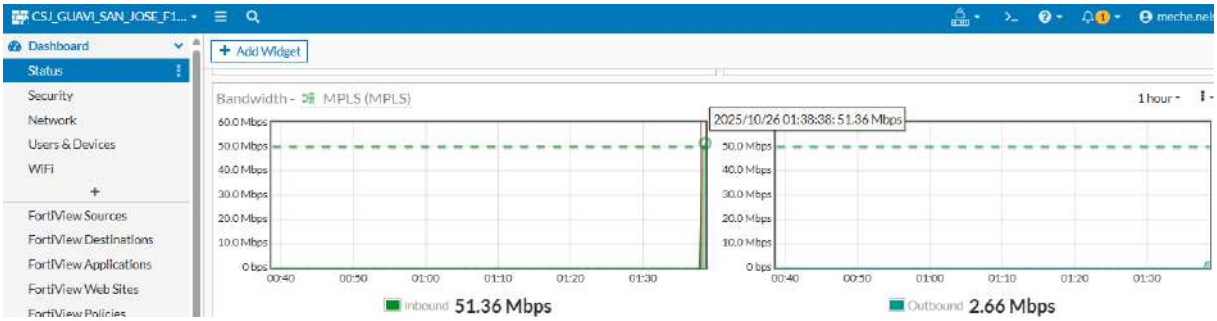


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5034	1	Magdalena, Santa Marta; Carrera 2 A 19-30	64 Mbps	62,70

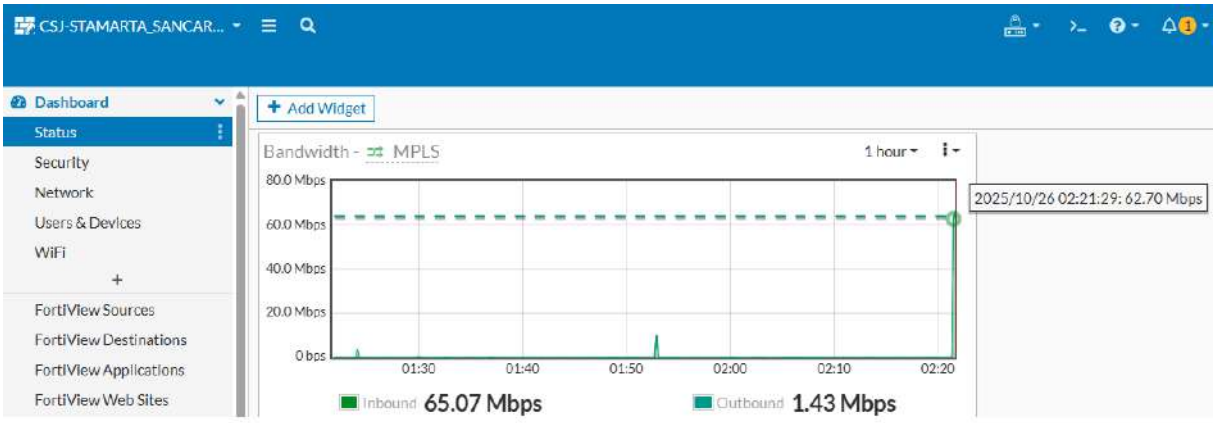


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5015	3	Boyacá, Puerto Boyaca; Carrera 3 # 7-154	50 Mbps	63,53

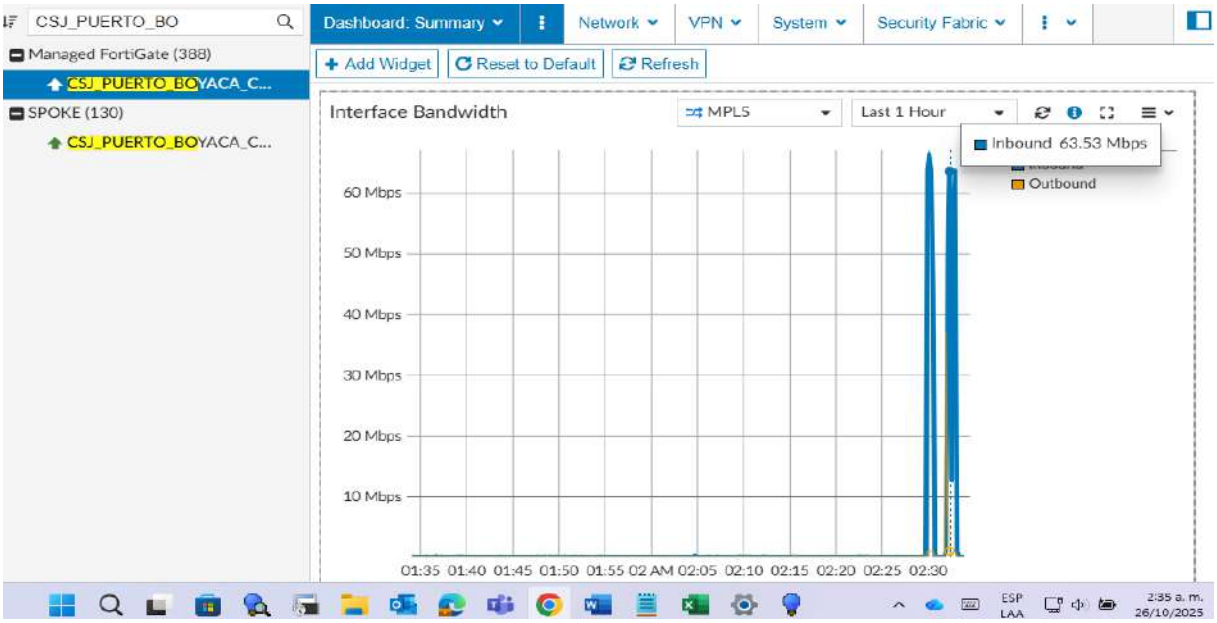


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5146	4	Antioquia, Fredonia; Calle 49 # 51-20	50 Mbps	51,31

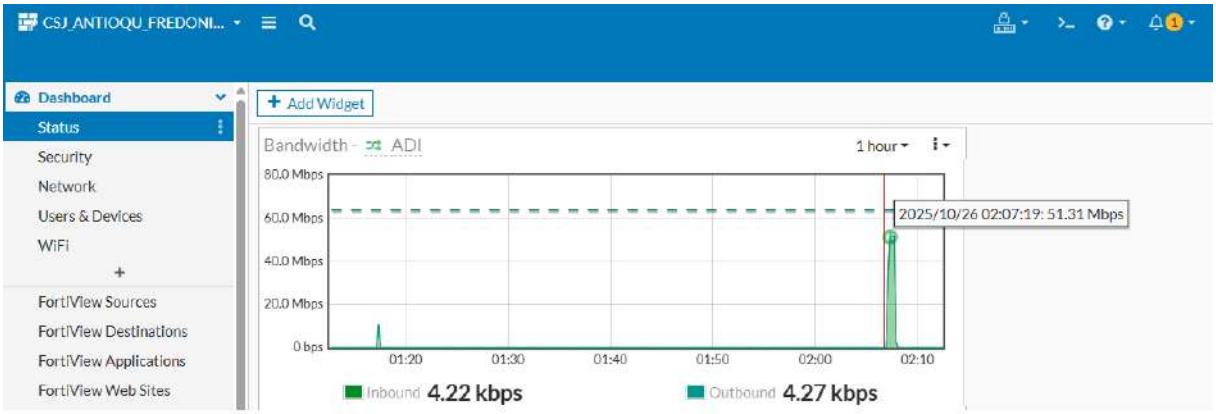


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5185	3	Putumayo, Puerto Asis; Calle 12 # 19-35	50 Mbps	50,32

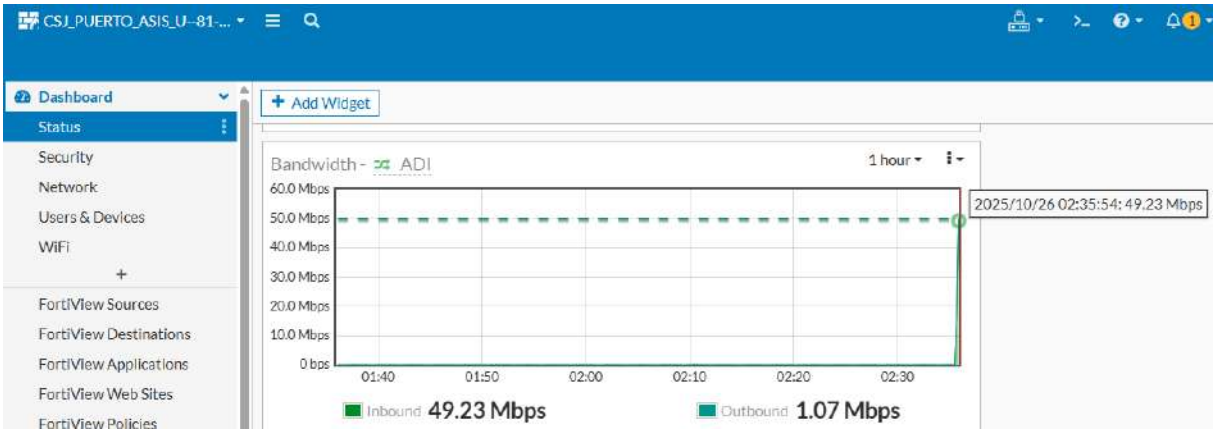


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5018	3	Caquetá, Belén de los Andaquies; Carrera 4 # 5-57	50 Mbps	52,17

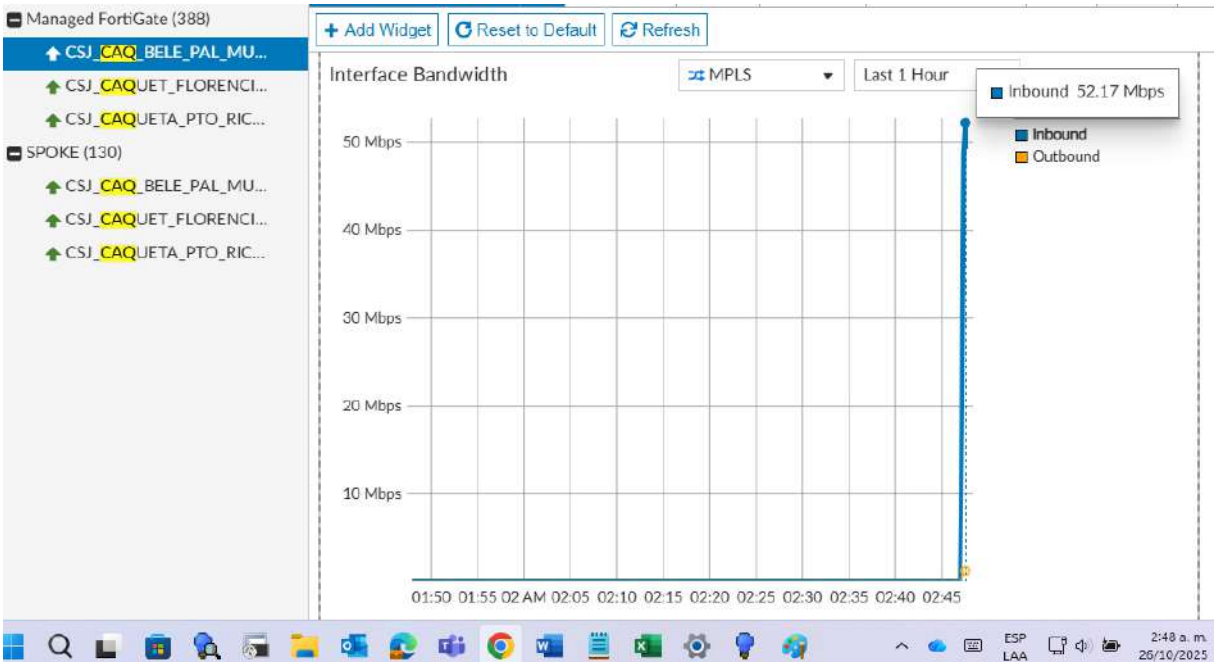

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5063	1	Meta, Villavicencio; Calle 34 Nro 36-43	64 Mbps	65,39

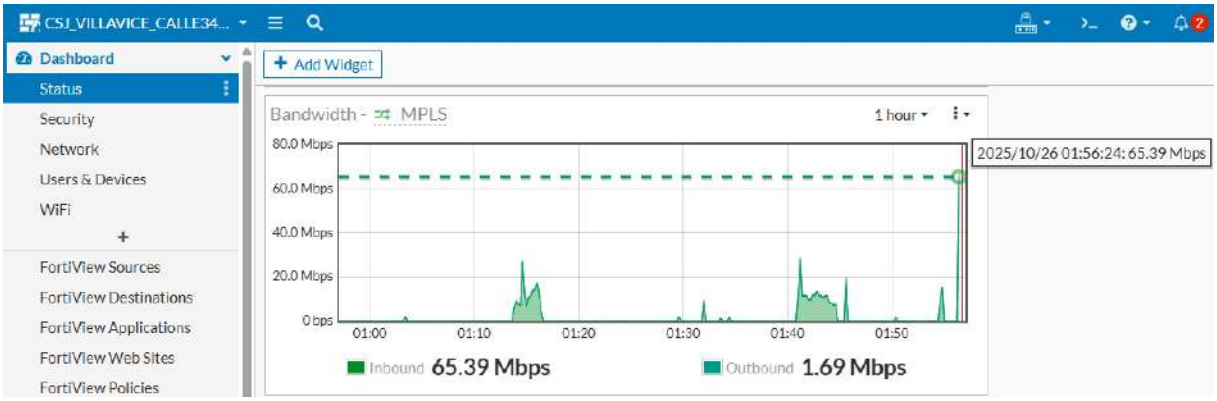


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1283	4	Atlántico, Suan; Carrera 3 # 14-08, Alcaldia Municipal	10 Mbps	9,8

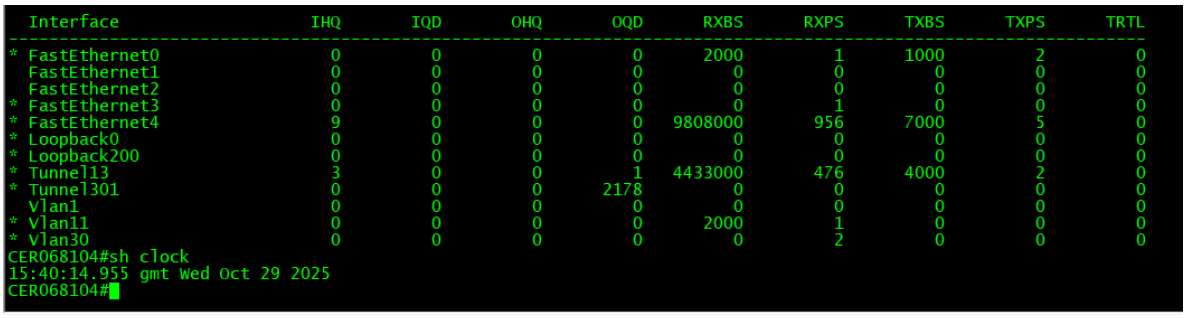


```
  Interface                 IHQ        IQD        OHQ        OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0             0          0          0          0        2000         1      1000         2         0
  FastEthernet1             0          0          0          0           0         0         0         0         0
  FastEthernet2             0          0          0          0           0         0         0         0         0
* FastEthernet3             0          0          0          0           0         1         0         0         0
* FastEthernet4             9          0          0          0     9808000       956      7000         5         0
* Loopback0                 0          0          0          0           0         0         0         0         0
* Loopback200               0          0          0          0           0         0         0         0         0
* Tunnel13                  3          0          0          1     4433000       476      4000         2         0
* Tunnel301                 0          0          0       2178           0         0         0         0         0
  Vlan1                     0          0          0          0           0         0         0         0         0
* Vlan11                    0          0          0          0        2000         1         0         0         0
* Vlan30                    0          0          0          0           0         2         0         0         0
CER068104#sh clock
15:40:14.955 gmt Wed Oct 29 2025
CER068104#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1347	4	Atlántico, Santa Lucía; Calle 6 # 5 -34	10 Mbps	10,1

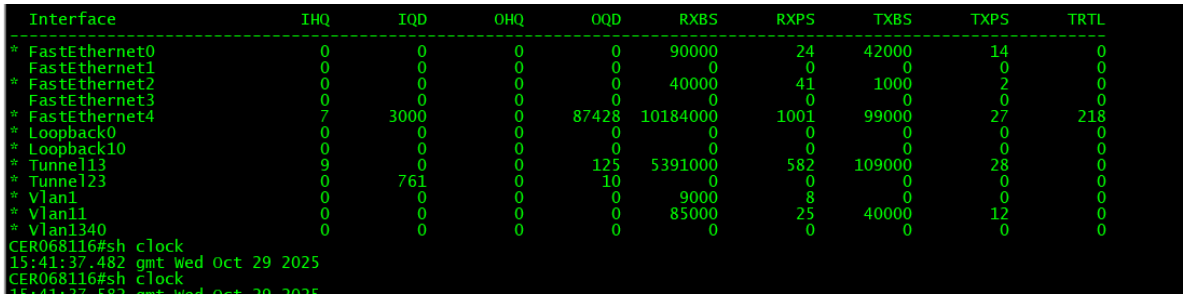


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0             0          0          0          0      90000         24      42000         14          0
  FastEthernet1             0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet2             0          0          0          0      40000         41       1000          2          0
  FastEthernet3             0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet4             7       3000          0      87428   10184000       1001      99000         27        218
* Loopback0                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                  9          0          0        125    5391000        582     109000         28          0
* Tunnel23                  0        761          0         10          0          0          0          0          0
* Vlan1                     0          0          0          0       9000          8          0          0          0
* Vlan11                    0          0          0          0      85000         25      40000         12          0
* Vlan1340                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER068116#sh clock
15:41:37.482 gmt Wed Oct 29 2025
CER068116#sh clock
15:41:37.582 gmt Wed Oct 29 2025
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1600	3	Atlántico, Candelaria; 14 # 16-99 Barrio Buenos Aires	10 Mbps	10,1

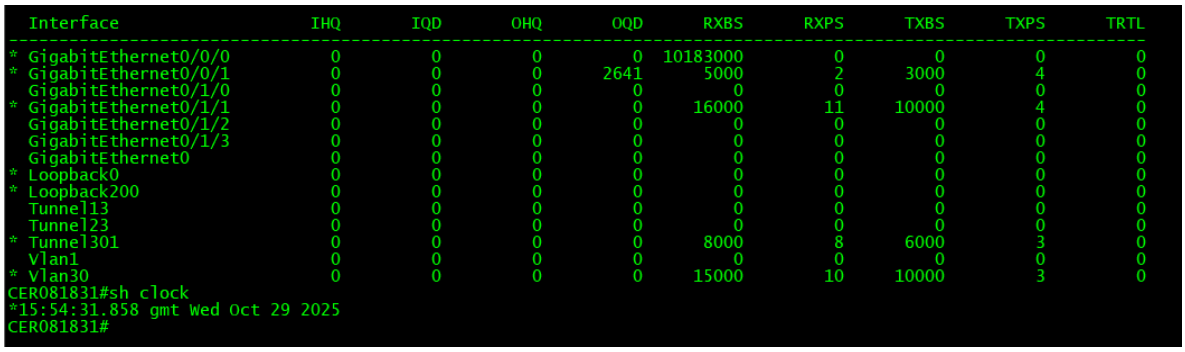


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0          0          0          0         10183000   0          0          0          0
* GigabitEthernet0/0/1     0          0          0          2641      5000       2          3000       4          0
  GigabitEthernet0/1/0     0          0          0          0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1     0          0          0          0         16000      11         10000      4          0
  GigabitEthernet0/1/2     0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3     0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0         0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback0                0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback200              0          0          0          0         0          0          0          0          0
  Tunnel13                 0          0          0          0         0          0          0          0          0
  Tunnel23                 0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Tunnel301                0          0          0          0         8000       8          6000       3          0
  Vlan1                    0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Vlan30                   0          0          0          0         15000      10         10000      3          0
CER081831#sh clock
*15:54:31.858 gmt Wed Oct 29 2025
CER081831#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
374	3	Chocó, Condotó; Carrera 3 # 8-05, Palacio de Justicia	12 Mbps	11,9

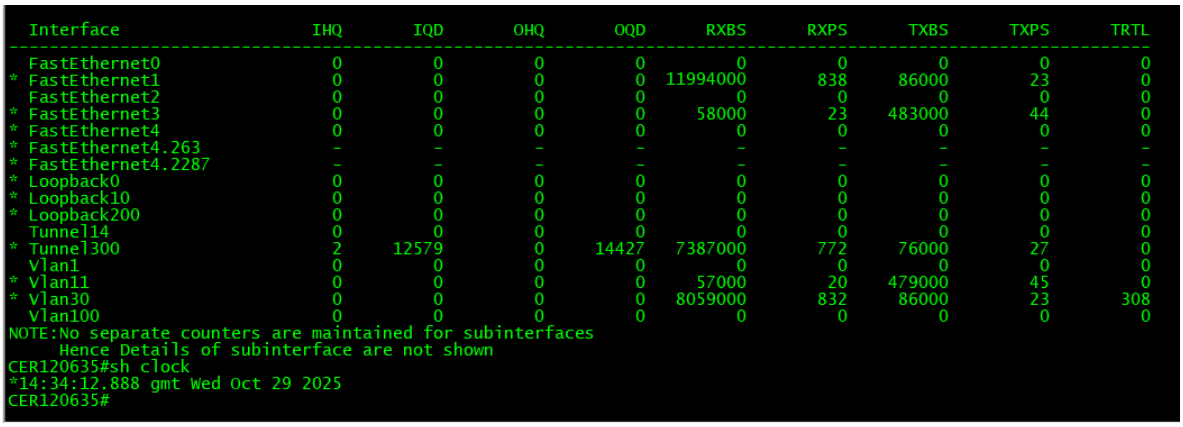

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet1              0          0          0          0   11994000        838      86000         23          0
  FastEthernet2              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet3              0          0          0          0      58000         23     483000         44          0
* FastEthernet4              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet4.263          -          -          -          -          -          -          -          -          -
* FastEthernet4.2287         -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel14                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                  2      12579          0      14427    7387000        772      76000         27          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0      57000         20     479000         45          0
* Vlan30                     0          0          0          0    8059000        832      86000         23        308
  Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER120635#sh clock
*14:34:12.888 gmt Wed Oct 29 2025
CER120635#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
773	4	Chocó, Bagadó; Cabecera Municipal, Palacio	12 Mbps	11,9

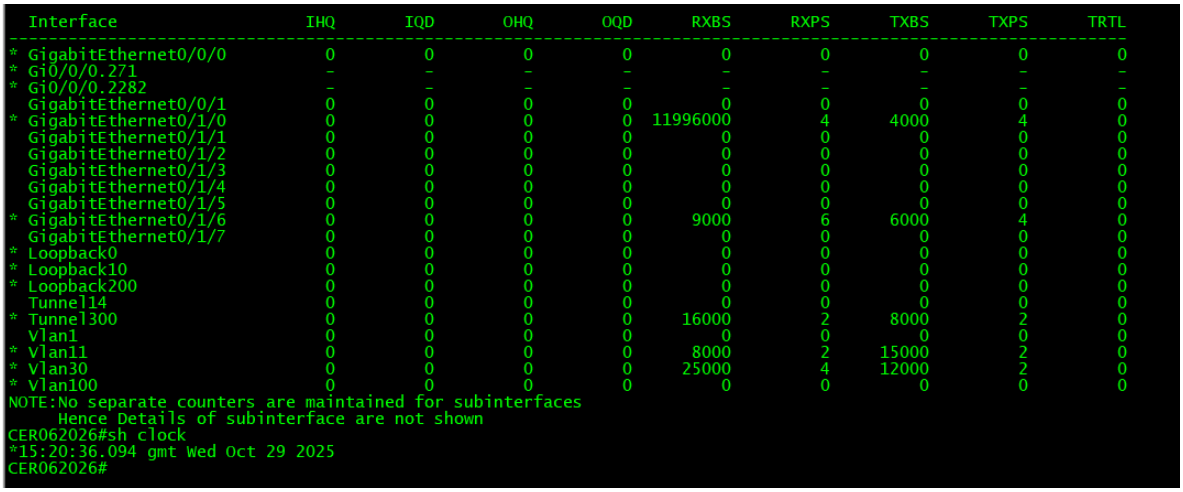


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/0.271                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2282                -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0   11996000          4       4000          4          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0       9000          6       6000          4          0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel14                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                   0          0          0          0      16000          2       8000          2          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0       8000          2      15000          2          0
* Vlan30                      0          0          0          0      25000          4      12000          2          0
* Vlan100                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062026#sh clock
*15:20:36.094 gmt Wed Oct 29 2025
CER062026#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
774	3	Chocó, Canton de San Pablo; Cabecera Municipal	12 Mbps	11,9

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0       1403   11995000       1206      22000          9          0
* Gi0/0/0.261                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2283                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      75000          7      12000          2          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      1          0          0       1393    9941000       1041      90000         11          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      85000          9      17000          4          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          2          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062027#sh clock
15:49:03.324 gmt Wed Oct 29 2025
CER062027#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
776	3	Chocó, Lloró; Barrio Las Carrerauces, Palacio	12 Mbps	12

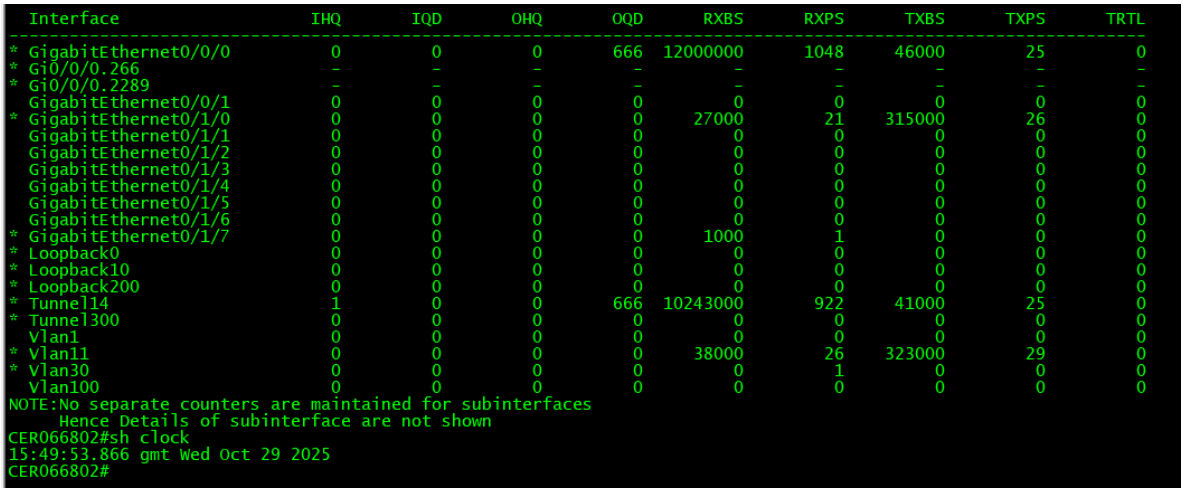


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0        666   12000000       1048      46000         25          0
* Gi0/0/0.266                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2289                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      27000         21     315000         26          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      1          0          0        666   10243000        922      41000         25          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      38000         26     323000         29          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          1          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER066802#sh clock
15:49:53.866 gmt Wed Oct 29 2025
CER066802#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
777	4	Chocó, Medio Baudó; Calle Principal	12 Mbps	11,9


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0         818   11933000       3088      10000          6         0
* Gi0/0/0.270                   -           -           -           -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.2290                  -           -           -           -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0       6000          7          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                     0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Tunnel14                      0           0           0         816    1843000       1536       1000          1         0
* Tunnel24                      0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Tunnel300                     0           0           0           0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0           0           0           0          0          0          0          0         0
* Vlan11                        0           0           0           0       4000          6       1000          1         0
* Vlan30                        0           0           0           0       1000          2          0          0         0
* Vlan100                       0           0           0           0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062031#sh clock
15:50:40.517 gmt Wed Oct 29 2025
CER062031#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
779	3	Chocó, Rio Iro; Barrio la Candelaria, Calle 20 de Julio, Palacio de Justicia	12 Mbps	11,9

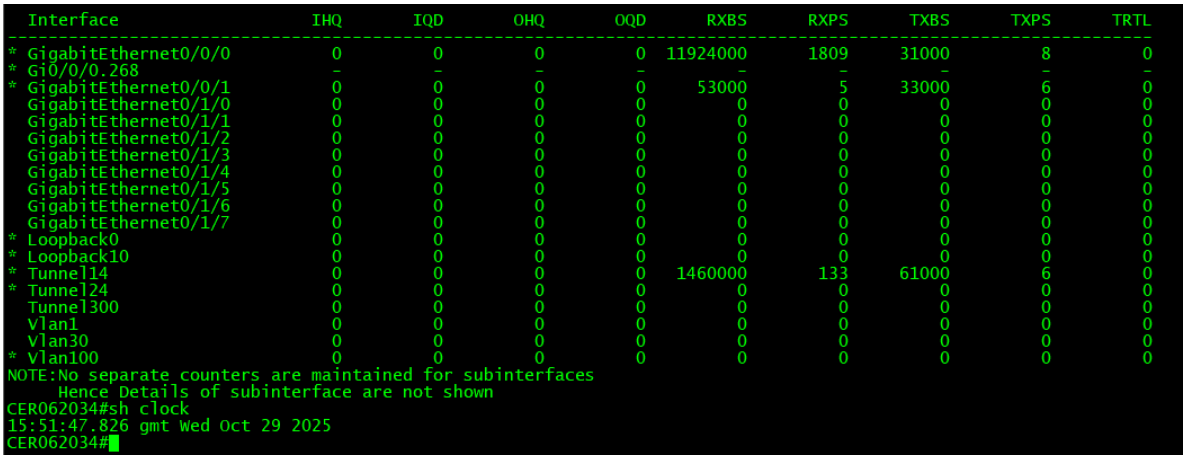


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0         0         0         0   11924000       1809      31000          8         0
* Gi0/0/0.268                -         -         -         -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1       0         0         0         0      53000          5      33000          6         0
  GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7       0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback10                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel14                   0         0         0         0    1460000        133      61000          6         0
* Tunnel24                   0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Tunnel300                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan30                     0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan100                    0         0         0         0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062034#sh clock
15:51:47.826 gmt Wed Oct 29 2025
CER062034#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
415	4	Meta, Lejanias; Calle 6 # 15-17-21-25 Centro	15 Mbps	14,9

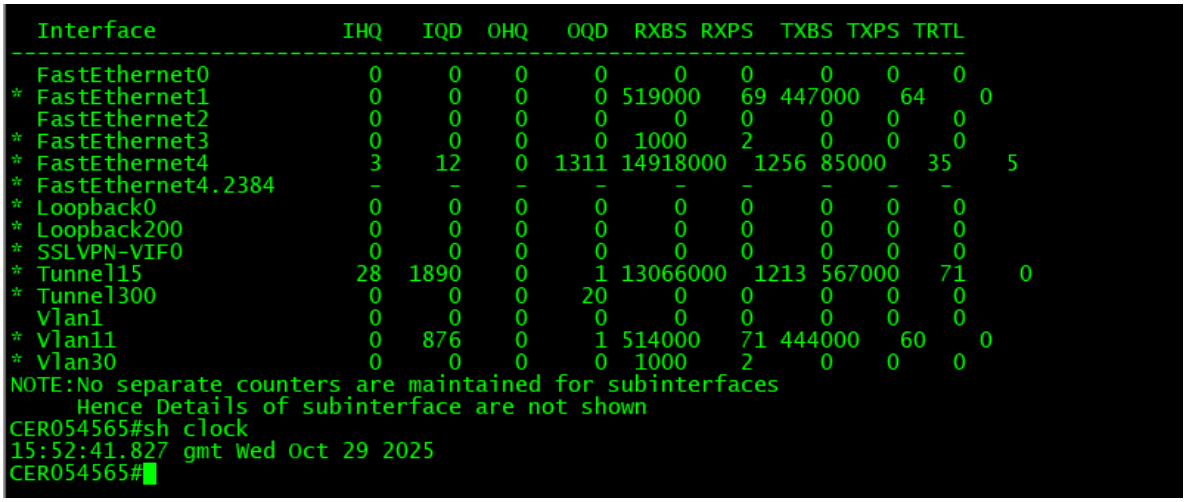


```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0            0      0    0      0     0    0     0    0    0
* FastEthernet1            0      0    0      0 519000   69 447000   64    0
  FastEthernet2            0      0    0      0     0    0     0    0    0
* FastEthernet3            0      0    0      0  1000    2     0    0    0
* FastEthernet4            3     12    0   1311 14918000  1256 85000   35    5
* FastEthernet4.2384       -      -    -      -     -    -     -    -    -
* Loopback0                0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Loopback200              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* SSLVPN-VIF0              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Tunnel15                28   1890    0      1 13066000  1213 567000   71    0
* Tunnel300                0      0    0     20     0    0     0    0    0
  Vlan1                    0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Vlan11                   0    876    0      1 514000   71 444000   60    0
* Vlan30                   0      0    0      0  1000    2     0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054565#sh clock
15:52:41.827 gmt Wed Oct 29 2025
CER054565#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
570	4	Boyacá, La Capilla; Calle 3 # 2-47	15 Mbps	15,2

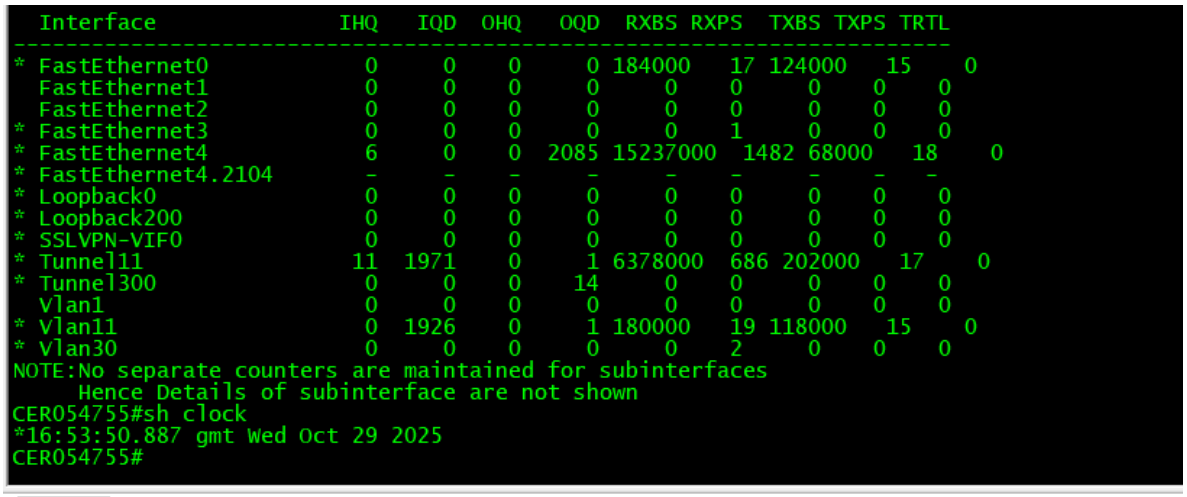


```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0      0    0      0 184000   17 124000   15    0
  FastEthernet1            0      0    0      0      0    0      0    0    0
  FastEthernet2            0      0    0      0      0    0      0    0    0
* FastEthernet3            0      0    0      0      0    1      0    0    0
* FastEthernet4            6      0    0   2085 15237000  1482 68000   18    0
* FastEthernet4.2104       -      -    -      -      -    -      -    -    -
* Loopback0                0      0    0      0      0    0      0    0    0
* Loopback200              0      0    0      0      0    0      0    0    0
* SSLVPN-VIF0              0      0    0      0      0    0      0    0    0
* Tunnel11                11   1971    0      1 6378000  686 202000   17    0
* Tunnel300                0      0    0     14      0    0      0    0    0
  Vlan1                    0      0    0      0      0    0      0    0    0
* Vlan11                   0   1926    0      1 180000   19 118000   15    0
* Vlan30                   0      0    0      0      0    2      0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO54755#sh clock
*16:53:50.887 gmt Wed Oct 29 2025
CERO54755#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
579	4	Casanare, Trinidad; Carrera 4 # 6-48	15 Mbps	15

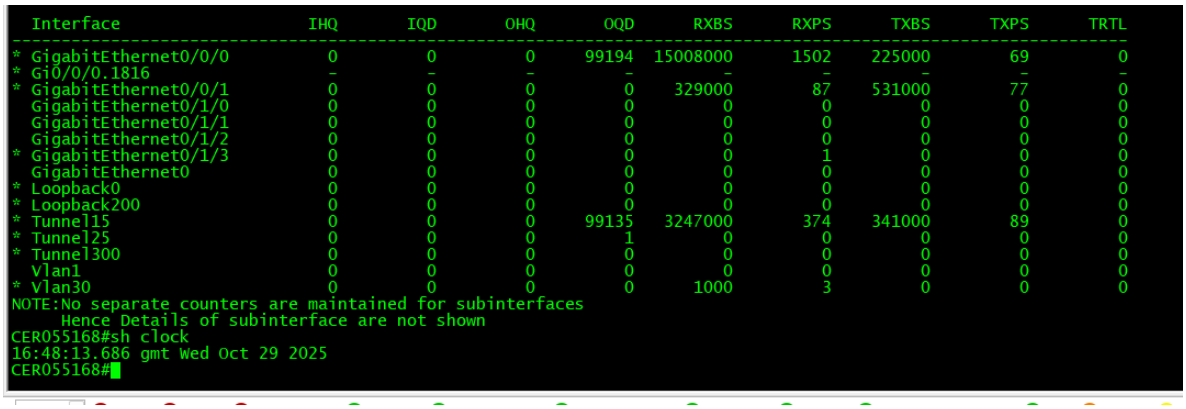


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      99194   15008000       1502     225000         69          0
* Gi0/0/0.1816                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     329000         87     531000         77          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          1          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                      0          0          0      99135    3247000        374     341000         89          0
* Tunnel25                      0          0          0          1          0          0          0          0          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          3          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055168#sh clock
16:48:13.686 gmt Wed Oct 29 2025
CER055168#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
594	4	Boyacá, Toca; calle 6 # 6-92	15 Mbps	14,8

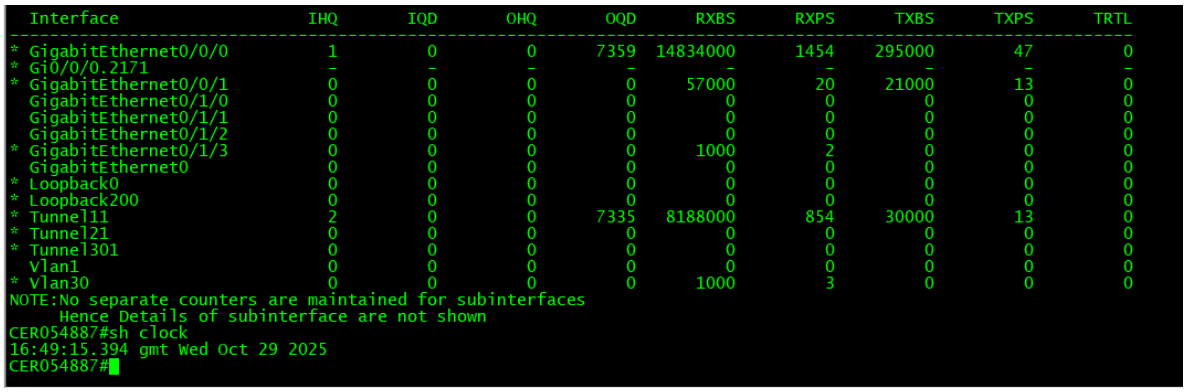

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          1          0          0       7359   14834000       1454     295000         47         0
* Gi0/0/0.2171                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      57000         20      21000         13         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0       1000          2          0          0         0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel11                      2          0          0       7335    8188000        854      30000         13         0
* Tunnel21                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          3          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO54887#sh clock
16:49:15.394 gmt Wed Oct 29 2025
CERO54887#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
631	3	Chocó, Atrató; Calle Principal	15 Mbps	14,8

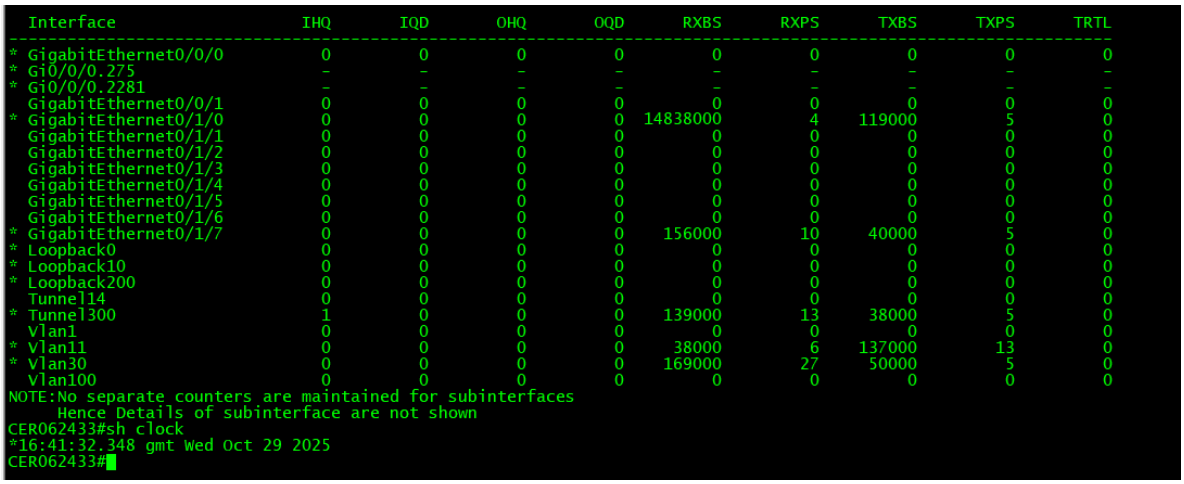


```
  Interface                IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Gi0/0/0.275              -           -           -           -           -           -           -           -           -
* Gi0/0/0.2281             -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0     0           0           0           0    14838000           4      119000           5           0
  GigabitEthernet0/1/1     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5     0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6     0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7     0           0           0           0      156000          10       40000           5           0
* Loopback0                0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10               0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200              0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Tunnel14                 0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel300                1           0           0           0      139000          13       38000           5           0
  Vlan1                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                   0           0           0           0       38000           6      137000          13           0
* Vlan30                   0           0           0           0      169000          27       50000           5           0
  Vlan100                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062433#sh clock
*16:41:32.348 gmt Wed Oct 29 2025
CER062433#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
679	3	Meta, El Calvario; Calle 6 # 5-12	15 Mbps	14,9

```
  Interface                IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0              0          0         0          0     114000         55    285000        43         0
  FastEthernet1              0          0         0          0          0          0         0         0         0
  FastEthernet2              0          0         0          0          0          0         0         0         0
* FastEthernet3              0          0         0          0          0          1         0         0         0
* FastEthernet4              4      11397         0      41771   14917000       1466    231000        59       801
* FastEthernet4.2382         -          -         -          -          -          -         -         -         -
* Loopback0                  0          0         0          0          0          0         0         0         0
* Loopback200                0          0         0          0          0          0         0         0         0
* Tunnel15                  17        205         0          0   10789000       1150    141000        53         0
* Tunnel25                   0          0         0          0          0          0         0         0         0
* Tunnel301                  0          0         0          1          0          0         0         0         0
  Vlan1                      0          0         0          0          0          0         0         0         0
* Vlan11                     0          0         0          0     107000         57    279000        40         0
* Vlan30                     0          0         0          1          0          2         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054533#sh clock
16:52:23.178 gmt Wed Oct 29 2025
CER054533#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
680	3	Meta, Puerto Rico; Carrera 3 # 1	15 Mbps	14,9

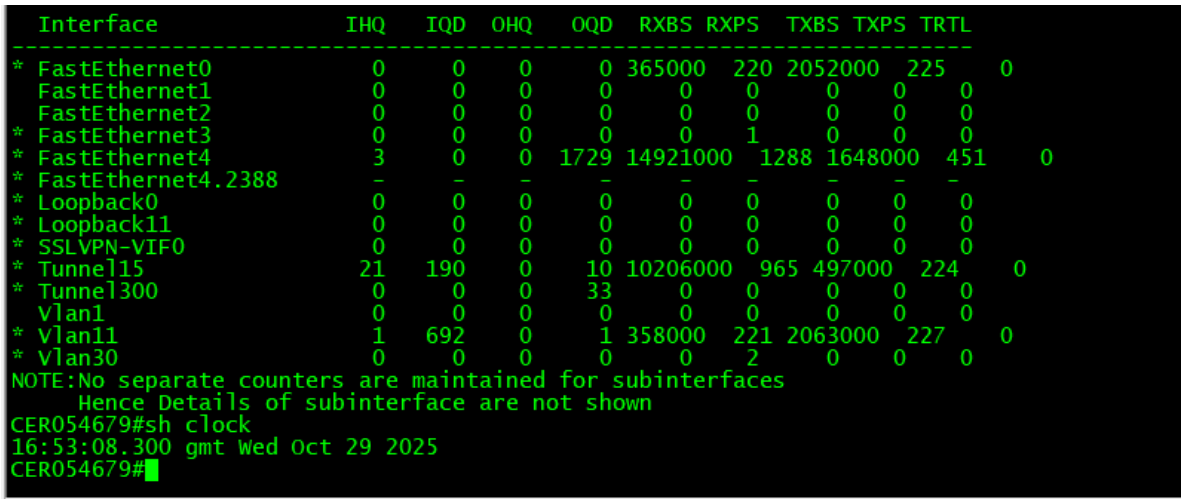


```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0      0    0      0 365000  220 2052000  225    0
  FastEthernet1            0      0    0      0      0    0       0    0    0
  FastEthernet2            0      0    0      0      0    0       0    0    0
* FastEthernet3            0      0    0      0      0    1       0    0    0
* FastEthernet4            3      0    0   1729 14921000  1288 1648000  451    0
* FastEthernet4.2388       -      -    -      -      -    -       -    -    -
* Loopback0                0      0    0      0      0    0       0    0    0
* Loopback11               0      0    0      0      0    0       0    0    0
* SSLVPN-VIF0              0      0    0      0      0    0       0    0    0
* Tunnel15                21    190    0     10 10206000  965 497000  224    0
* Tunnel300                0      0    0     33      0    0       0    0    0
  Vlan1                    0      0    0      0      0    0       0    0    0
* Vlan11                   1    692    0      1 358000  221 2063000  227    0
* Vlan30                   0      0    0      0      0    2       0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054679#sh clock
16:53:08.300 gmt Wed Oct 29 2025
CER054679#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
681	4	Meta, San Juan De Arama; Carrera 9 # 8-26/29 Barrio la Libertad	15 Mbps	14,7


```
  Interface                IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0          0         0          0          0          0          0          0         0
  FastEthernet1              0          0         0          0          0          0          0          0         0
* FastEthernet2              0          0         0          0       1000          2          0          0         0
* FastEthernet3              0          0         0          0      71000         38     171000         36         0
* FastEthernet4             13      19829         0     127798   14799000       3725     100000         44      1542
* FastEthernet4.2505         -          -         -          -          -          -          -          -         -
* Loopback0                  0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel15                  12       4818         0         51    5367000       1804      89000         40         0
* Tunnel301                  0          0         0          1          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                     0          0         0          0      70000         37     168000         37         0
* Vlan30                     0          0         0          0          0          1          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER050224#sh clock
16:54:05.294 gmt Wed Oct 29 2025
CER050224#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
682	3	Meta, San Juanito; Carrera 3 # 6	15 Mbps	14,2

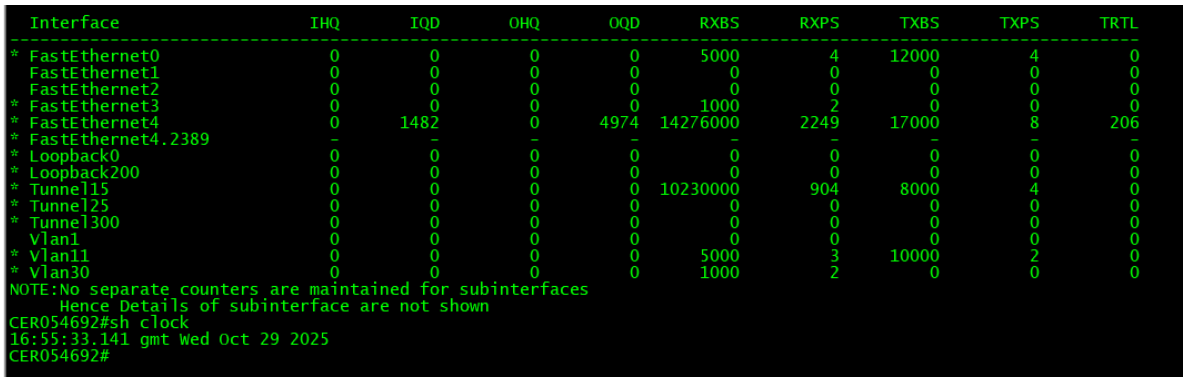


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0              0          0          0          0       5000          4      12000          4          0
  FastEthernet1              0          0          0          0          0          0          0          0          0
  FastEthernet2              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet3              0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* FastEthernet4              0       1482          0       4974   14276000       2249      17000          8        206
* FastEthernet4.2389         -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                   0          0          0          0   10230000        904       8000          4          0
* Tunnel25                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0       5000          3      10000          2          0
* Vlan30                     0          0          0          0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO54692#sh clock
16:55:33.141 gmt Wed Oct 29 2025
CERO54692#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
702	4	Boyacá, Almeida; Carrera 4 # 3-23	15 Mbps	15,2

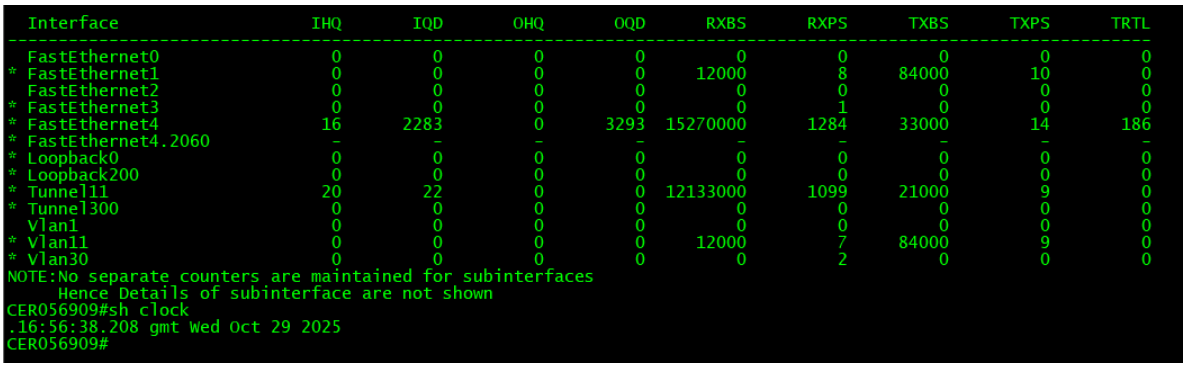


```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0                 0          0         0          0          0          0          0          0         0
* FastEthernet1                 0          0         0          0      12000          8      84000         10         0
  FastEthernet2                 0          0         0          0          0          0          0          0         0
* FastEthernet3                 0          0         0          0          0          1          0          0         0
* FastEthernet4                16       2283         0       3293   15270000       1284      33000         14       186
* FastEthernet4.2060            -          -         -          -          -          -          -          -         -
* Loopback0                     0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel11                     20         22         0          0   12133000       1099      21000          9         0
* Tunnel300                     0          0         0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                        0          0         0          0      12000          7      84000          9         0
* Vlan30                        0          0         0          0          0          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO56909#sh clock
.16:56:38.208 gmt Wed Oct 29 2025
CERO56909#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
703	4	Boyacá, Belén; Calle 7 # 6-40	15 Mbps	14,8

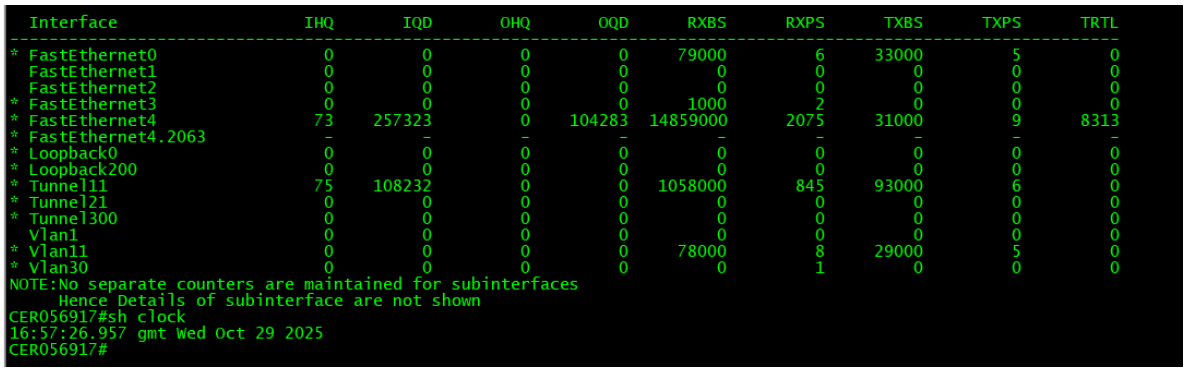


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0              0          0          0          0      79000          6      33000          5         0
  FastEthernet1              0          0          0          0          0          0          0          0         0
  FastEthernet2              0          0          0          0          0          0          0          0         0
* FastEthernet3              0          0          0          0       1000          2          0          0         0
* FastEthernet4             73     257323          0     104283   14859000       2075      31000          9      8313
* FastEthernet4.2063         -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel11                  75     108232          0          0    1058000        845      93000          6         0
* Tunnel21                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel300                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                     0          0          0          0      78000          8      29000          5         0
* Vlan30                     0          0          0          0          0          1          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056917#sh clock
16:57:26.957 gmt Wed Oct 29 2025
CER056917#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
704	4	Boyacá, Berbeo; Calle 5 #2-37	15 Mbps	15,2

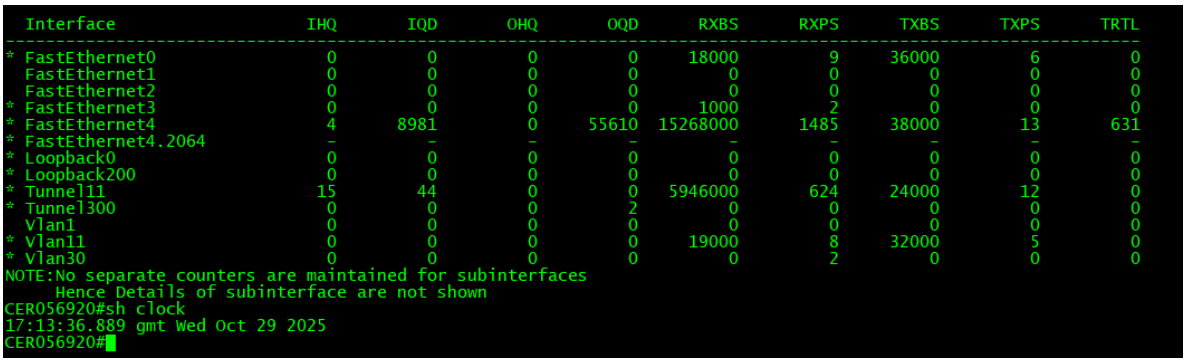


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0             0         0         0         0      18000          9      36000          6          0
  FastEthernet1             0         0         0         0          0          0          0          0          0
  FastEthernet2             0         0         0         0          0          0          0          0          0
* FastEthernet3             0         0         0         0       1000          2          0          0          0
* FastEthernet4             4      8981         0     55610   15268000       1485      38000         13        631
* FastEthernet4.2064        -         -         -         -          -          -          -          -          -
* Loopback0                 0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback200               0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                 15        44         0         0    5946000        624      24000         12          0
* Tunnel300                 0         0         0         2          0          0          0          0          0
  Vlan1                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan11                    0         0         0         0      19000          8      32000          5          0
* Vlan30                    0         0         0         0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056920#sh clock
17:13:36.889 gmt Wed Oct 29 2025
CER056920#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
706	4	Boyacá, Campohermoso; Calle 3 # 7-105	15 Mbps	15,3

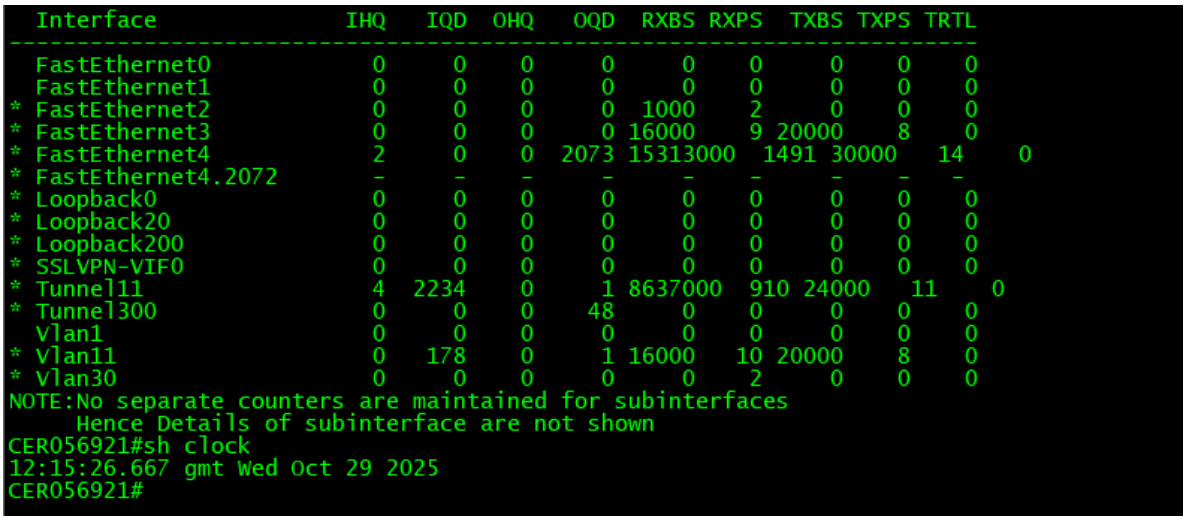


```
  Interface              IHQ   IQD  OHQ   OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0            0     0    0     0     0    0     0    0    0
  FastEthernet1            0     0    0     0     0    0     0    0    0
* FastEthernet2            0     0    0     0  1000    2     0    0    0
* FastEthernet3            0     0    0     0 16000    9 20000    8    0
* FastEthernet4            2     0    0  2073 15313000  1491 30000   14    0
* FastEthernet4.2072       -     -    -     -     -    -     -    -    -
* Loopback0                0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Loopback20               0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Loopback200              0     0    0     0     0    0     0    0    0
* SSLVPN-VIF0              0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Tunnel11                 4  2234    0     1 8637000  910 24000   11    0
* Tunnel300                0     0    0    48     0    0     0    0    0
  Vlan1                    0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Vlan11                   0   178    0     1 16000   10 20000    8    0
* Vlan30                   0     0    0     0     0    2     0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056921#sh clock
12:15:26.667 gmt Wed Oct 29 2025
CER056921#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
707	4	Boyacá, Cerinza; Palacio Municipal Calle Principal	15 Mbps	15,2

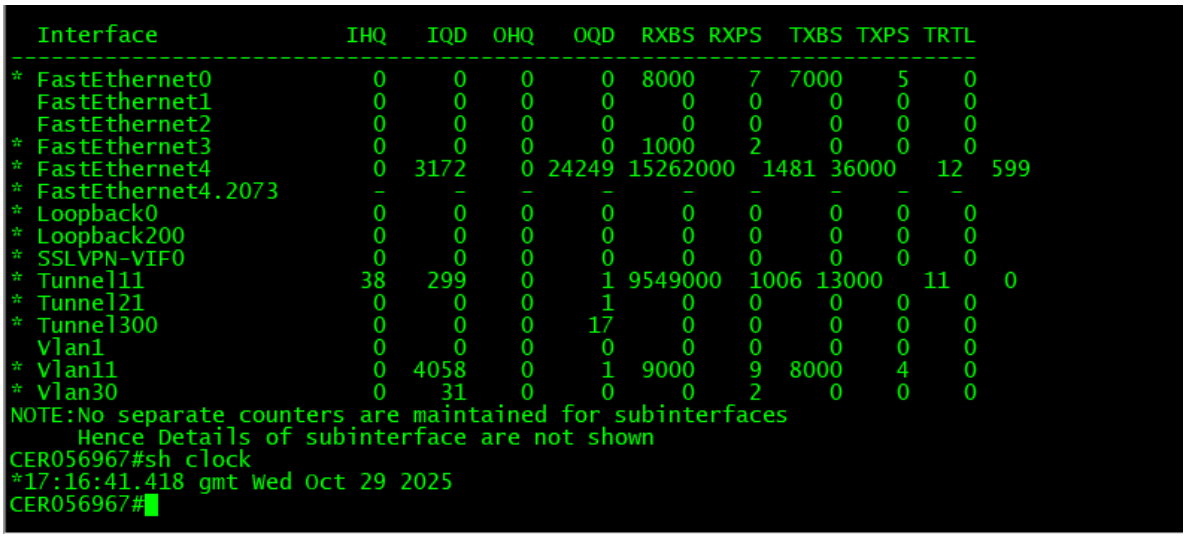


```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0      0    0      0  8000    7  7000    5    0
  FastEthernet1            0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet2            0      0    0      0     0    0     0    0    0
* FastEthernet3            0      0    0      0  1000    2     0    0    0
* FastEthernet4            0   3172    0  24249 15262000  1481 36000   12  599
* FastEthernet4.2073       -      -    -      -     -    -     -    -    -
* Loopback0                0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Loopback200              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* SSLVPN-VIF0              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Tunnel11                38    299    0      1 9549000  1006 13000   11    0
* Tunnel21                 0      0    0      1     0    0     0    0    0
* Tunnel300                0      0    0     17     0    0     0    0    0
  Vlan1                    0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Vlan11                   0   4058    0      1  9000    9  8000    4    0
* Vlan30                   0     31    0      0     0    2     0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056967#sh clock
*17:16:41.418 gmt Wed Oct 29 2025
CER056967#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
708	4	Boyacá, Chinavita; Carrera 3 # 3-56	15 Mbps	14,9

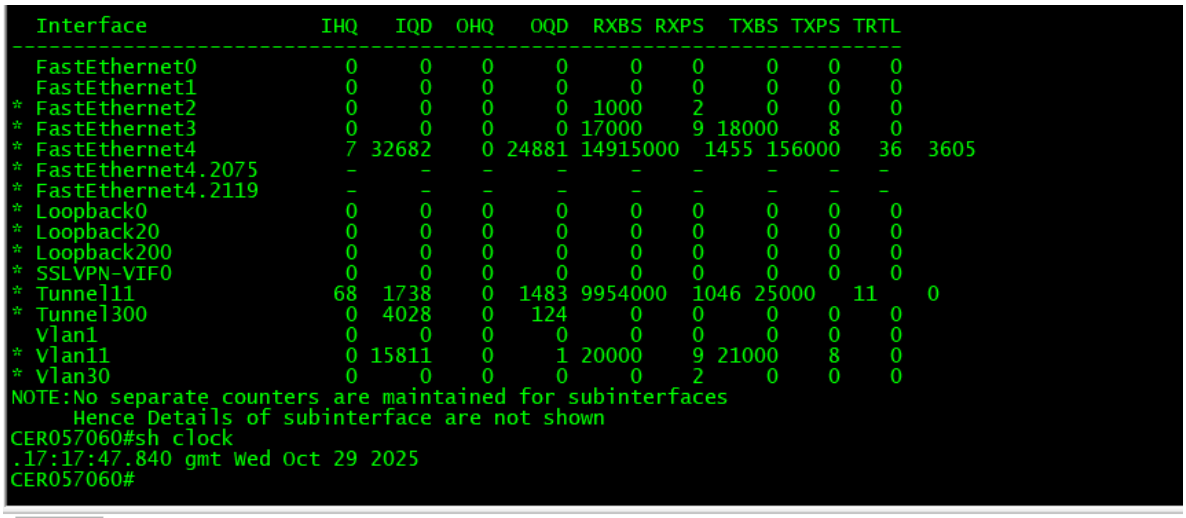


```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0            0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet1            0      0    0      0     0    0     0    0    0
* FastEthernet2            0      0    0      0  1000    2     0    0    0
* FastEthernet3            0      0    0      0 17000    9 18000    8    0
* FastEthernet4            7  32682    0  24881 14915000  1455 156000   36  3605
* FastEthernet4.2075       -      -    -      -     -    -     -    -    -
* FastEthernet4.2119       -      -    -      -     -    -     -    -    -
* Loopback0                0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Loopback20               0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Loopback200              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* SSLVPN-VIF0              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Tunnel11                68   1738    0   1483 9954000  1046 25000   11    0
* Tunnel300                0   4028    0    124     0    0     0    0    0
  Vlan1                    0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Vlan11                   0  15811    0      1 20000    9 21000    8    0
* Vlan30                   0      0    0      0     0    2     0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO57060#sh clock
.17:17:47.840 gmt Wed Oct 29 2025
CERO57060#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
709	3	Boyacá, Chiscas; Calle 4 # 4-26	15 Mbps	15,2

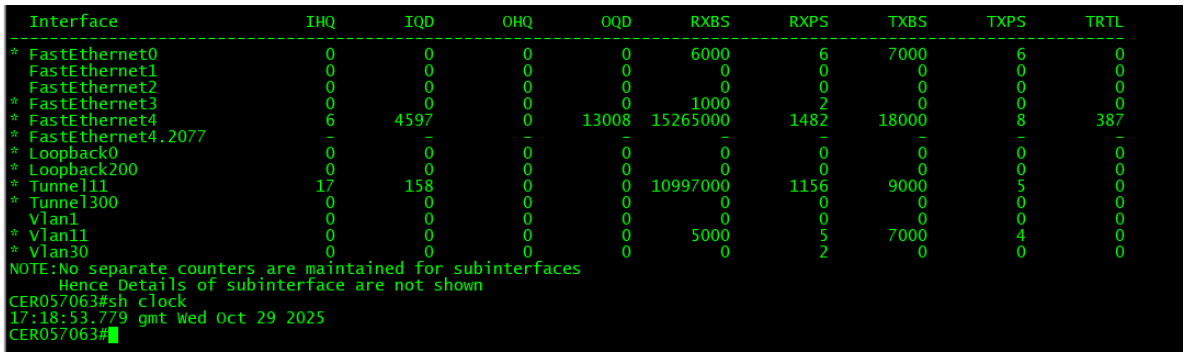

```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0             0         0         0         0       6000          6       7000          6         0
  FastEthernet1             0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet2             0         0         0         0          0          0          0          0         0
* FastEthernet3             0         0         0         0       1000          2          0          0         0
* FastEthernet4             6      4597         0     13008   15265000       1482      18000          8       387
* FastEthernet4.2077        -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Loopback0                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback200               0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel11                 17       158         0         0   10997000       1156       9000          5         0
* Tunnel300                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                     0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan11                    0         0         0         0       5000          5       7000          4         0
* Vlan30                    0         0         0         0          0          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER057063#sh clock
17:18:53.779 gmt Wed Oct 29 2025
CER057063#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
710	3	Boyacá, Chita; Calle 2 # 5-02	15 Mbps	14,9

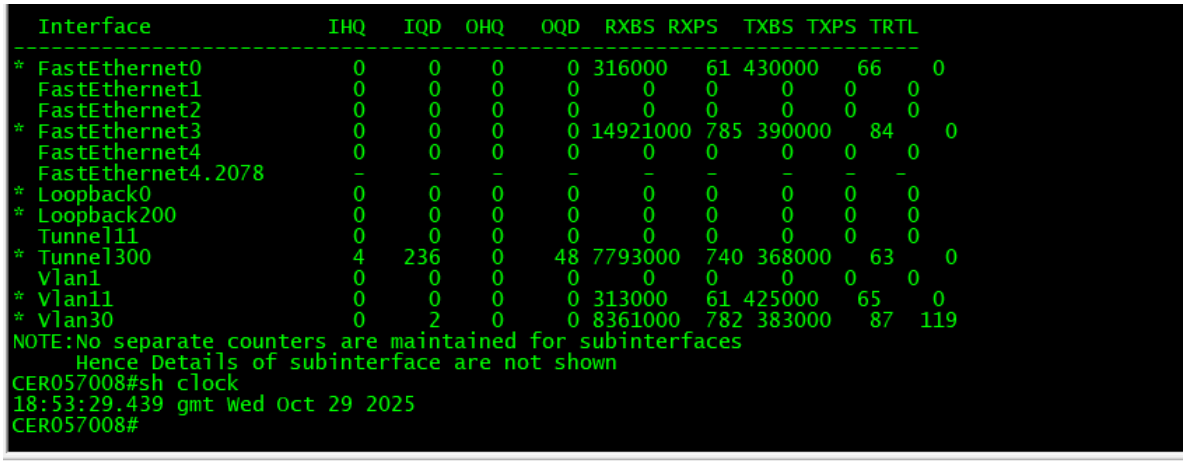

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
711	3	Boyacá, Chitaraque; Carrera 5 # 2-26	15 Mbps	14,7


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*FastEthernet0               0         0         0         0   14799000         13          0          0         0
 FastEthernet1               0         0         0         0          0          0          0          0         0
 FastEthernet2               0         0         0         0          0          0          0          0         0
*FastEthernet3               0         0         0         0       1000          2          0          0         0
*FastEthernet4               0     30229         0     23925     162000         41          0          0      1180
*FastEthernet4.2079          -         -         -         -          -          -          -          -         -
*Loopback0                   0         0         0         0          0          0          0          0         0
*Loopback200                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
*Tunnel11                    0     77984         0        26     447000        625          0          0         0
*Tunnel300                   0         0         0        82          0          0          0          0         0
*Vlan1                       0         0         0         0       7000         13          0          0         0
*Vlan30                      0         0         0         0          0          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER057065#sh clock
17:21:54.217 gmt Wed Oct 29 2025
CER057065#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
712	3	Boyacá, Chivata; Carrera 4 # 5-42	15 Mbps	14,8

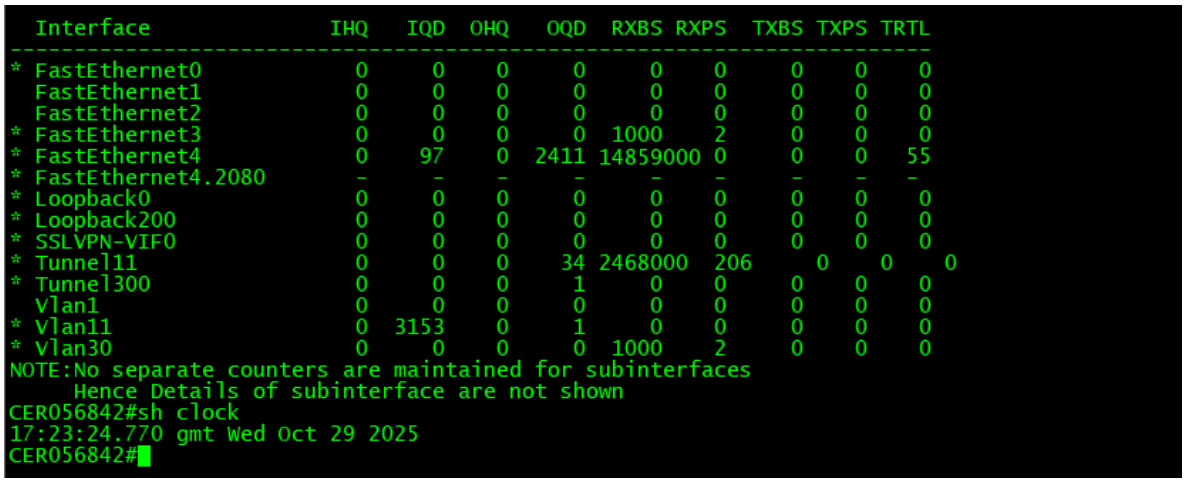


```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet1            0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet2            0      0    0      0     0    0     0    0    0
* FastEthernet3            0      0    0      0  1000    2     0    0    0
* FastEthernet4            0     97    0   2411 14859000 0     0    0   55
* FastEthernet4.2080       -      -    -      -     -    -     -    -    -
* Loopback0                0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Loopback200              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* SSLVPN-VIF0              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Tunnel11                 0      0    0     34 2468000  206      0    0     0
* Tunnel300                0      0    0      1     0    0     0    0    0
  Vlan1                    0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Vlan11                   0   3153    0      1     0    0     0    0    0
* Vlan30                   0      0    0      0  1000    2     0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO56842#sh clock
17:23:24.770 gmt Wed Oct 29 2025
CERO56842#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
713	4	Boyacá, Chivor; Carrera 5 # 5-29	15 Mbps	15,2

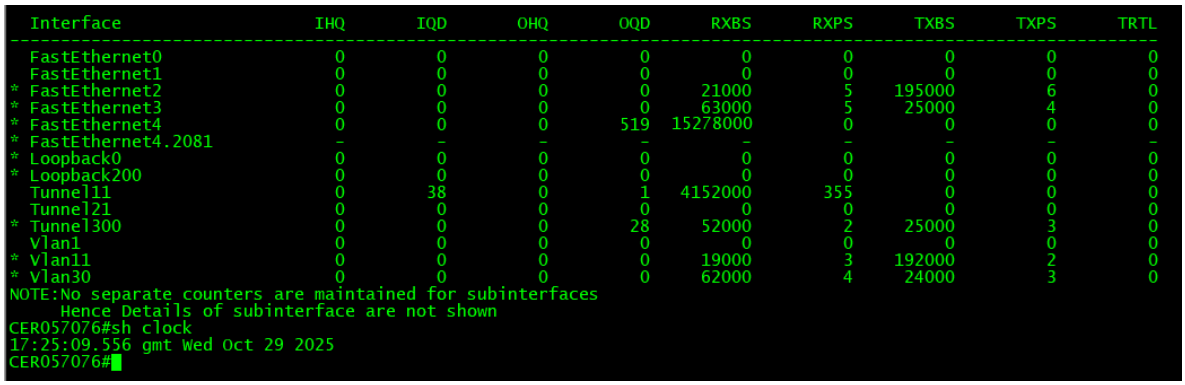


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0           0
  FastEthernet1              0          0          0          0           0           0           0           0           0
* FastEthernet2              0          0          0          0       21000           5      195000           6           0
* FastEthernet3              0          0          0          0       63000           5       25000           4           0
* FastEthernet4              0          0          0        519    15278000           0           0           0           0
* FastEthernet4.2081         -          -          -          -           -           -           -           -           -
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback200                0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Tunnel11                   0         38          0          1     4152000         355           0           0           0
  Tunnel21                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel300                  0          0          0         28       52000           2       25000           3           0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan11                     0          0          0          0       19000           3      192000           2           0
* Vlan30                     0          0          0          0       62000           4       24000           3           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER057076#sh clock
17:25:09.556 gmt Wed Oct 29 2025
CER057076#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
714	4	Boyacá, Ciénega; Calle 4 # 6-52	15 Mbps	14,9

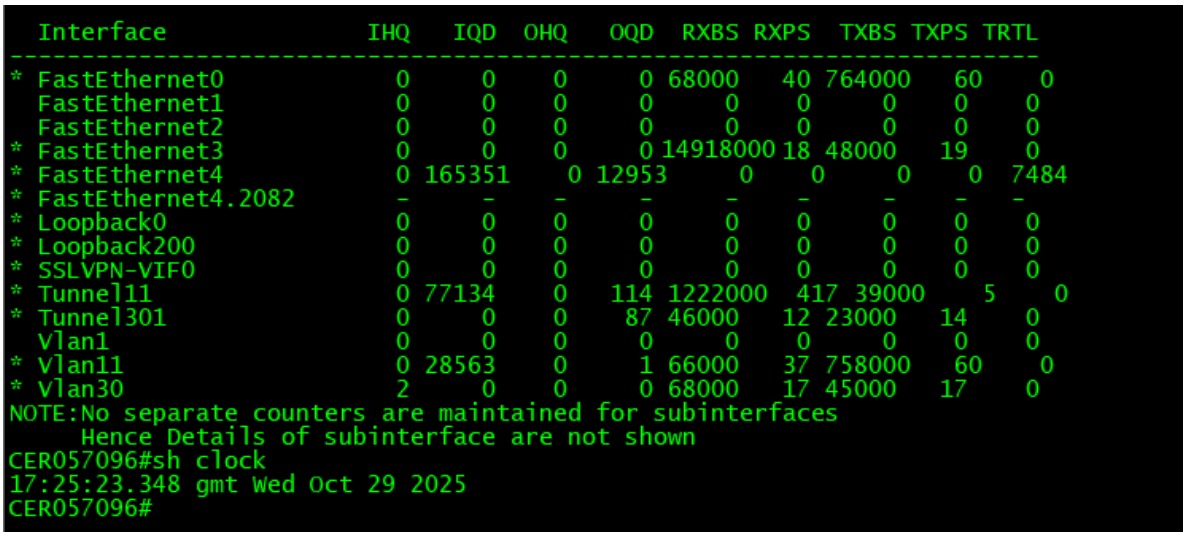


```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0      0    0      0 68000    40 764000    60     0
  FastEthernet1            0      0    0      0     0     0      0    0     0
  FastEthernet2            0      0    0      0     0     0      0    0     0
* FastEthernet3            0      0    0      0 14918000 18 48000    19     0
* FastEthernet4            0 165351     0 12953      0     0      0    0  7484
* FastEthernet4.2082       -      -    -      -      -     -      -    -     -
* Loopback0                0      0    0      0     0     0      0    0     0
* Loopback200              0      0    0      0     0     0      0    0     0
* SSLVPN-VIF0              0      0    0      0     0     0      0    0     0
* Tunnel11                 0 77134    0    114 1222000   417 39000     5     0
* Tunnel301                0      0    0     87 46000    12 23000    14     0
  Vlan1                    0      0    0      0     0     0      0    0     0
* Vlan11                   0 28563    0      1 66000    37 758000    60     0
* Vlan30                   2      0    0      0 68000    17 45000    17     0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER057096#sh clock
17:25:23.348 gmt Wed Oct 29 2025
CER057096#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
481-B	3	Tolima, Suarez; Carrera 3 # 1-07, Altos de la Cruz	25 Mbps	22,8

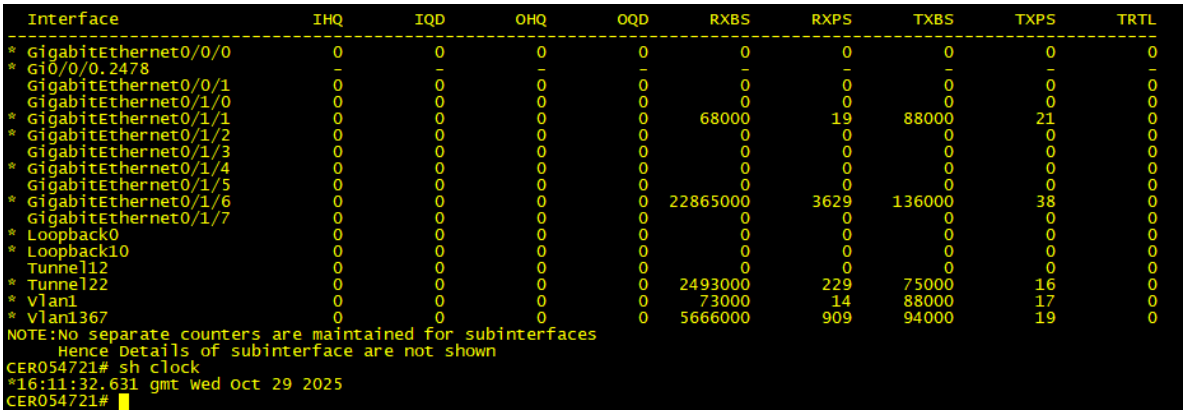


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GI0/0/0.2478                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0      68000         19      88000         21          0
* GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0   22865000       3629     136000         38          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel12                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel22                      0          0          0          0    2493000        229      75000         16          0
* Vlan1                         0          0          0          0      73000         14      88000         17          0
* Vlan1367                      0          0          0          0    5666000        909      94000         19          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054721# sh clock
*16:11:32.631 gmt Wed Oct 29 2025
CER054721#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
145	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 11 # 9-24, Escuela Judicial (Juzgados de Ejecución de Penas)	10 Mbps	9,8

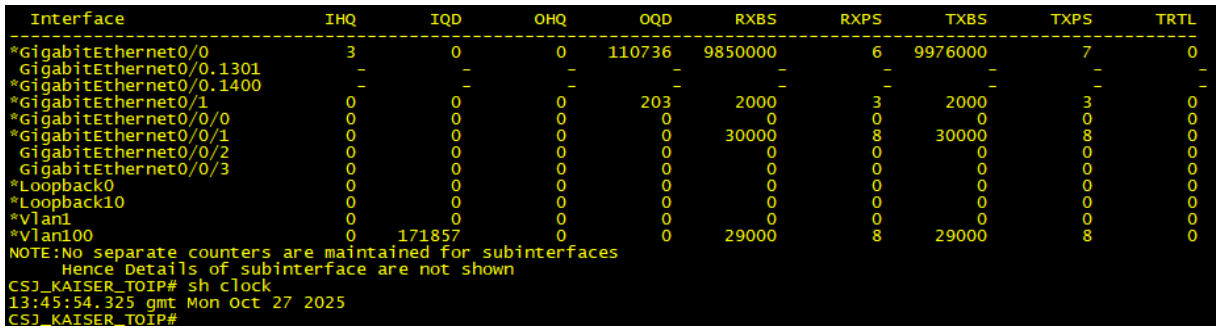


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*GigabitEthernet0/0           3          0          0     110736     9850000           6     9976000           7          0
 GigabitEthernet0/0.1301      -          -          -          -           -           -           -           -          -
*GigabitEthernet0/0.1400      -          -          -          -           -           -           -           -          -
*GigabitEthernet0/1           0          0          0        203        2000           3        2000           3          0
*GigabitEthernet0/0/0         0          0          0          0           0           0           0           0          0
*GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0       30000           8       30000           8          0
 GigabitEthernet0/0/2         0          0          0          0           0           0           0           0          0
 GigabitEthernet0/0/3         0          0          0          0           0           0           0           0          0
*Loopback0                    0          0          0          0           0           0           0           0          0
*Loopback10                   0          0          0          0           0           0           0           0          0
*Vlan1                        0          0          0          0           0           0           0           0          0
*Vlan100                      0     171857          0          0       29000           8       29000           8          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CSJ_KAISER_TOIP# sh clock
13:45:54.325 gmt Mon Oct 27 2025
CSJ_KAISER_TOIP#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
147	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 8 # 13-82, Edificio Antigua Bolsa de Valores	10 Mbps	9,2

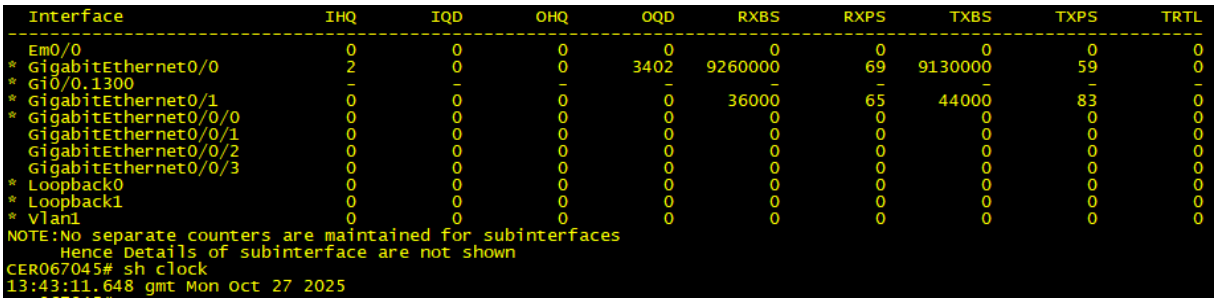


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Em0/0                         0          0          0          0           0           0           0           0          0
* GigabitEthernet0/0            2          0          0       3402     9260000          69     9130000          59          0
* Gi0/0.1300                    -          -          -          -           -           -           -           -          -
* GigabitEthernet0/1            0          0          0          0       36000          65       44000          83          0
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/0/2          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/0/3          0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback0                     0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback1                     0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Vlan1                         0          0          0          0           0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067045# sh clock
13:43:11.648 gmt Mon Oct 27 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
150	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 72 # 7-96 (Mezanine)	10 Mbps	9,5

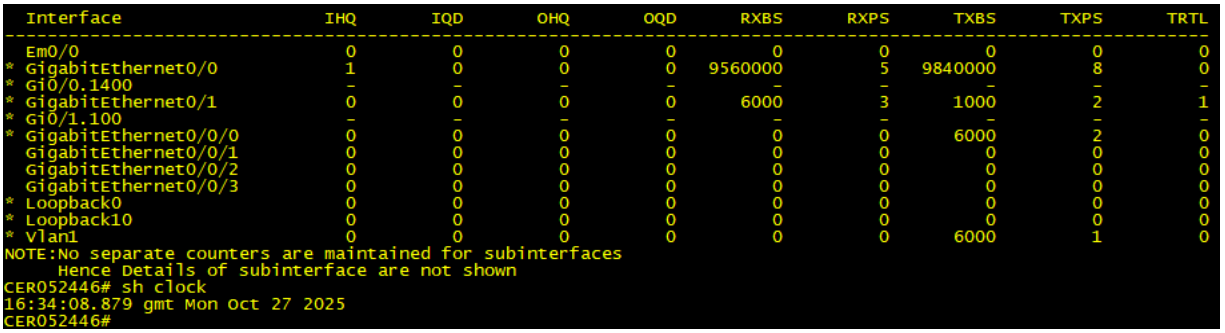


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Em0/0                    0          0          0          0          0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/0       1          0          0          0          9560000     5           9840000     8           0
* Gi0/0.1400               -          -          -          -          -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/1       0          0          0          0          6000        3           1000        2           1
* Gi0/1.100                -          -          -          -          -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/0     0          0          0          0          0           0           6000        2           0
  GigabitEthernet0/0/1     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/0/2     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/0/3     0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Loopback0                0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Loopback10               0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Vlan1                    0          0          0          0          0           0           6000        1           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER052446# sh clock
16:34:08.879 gmt Mon Oct 27 2025
CER052446#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
154	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 12 # 7-65, Palacio de Justicia	20Mbps	18,7

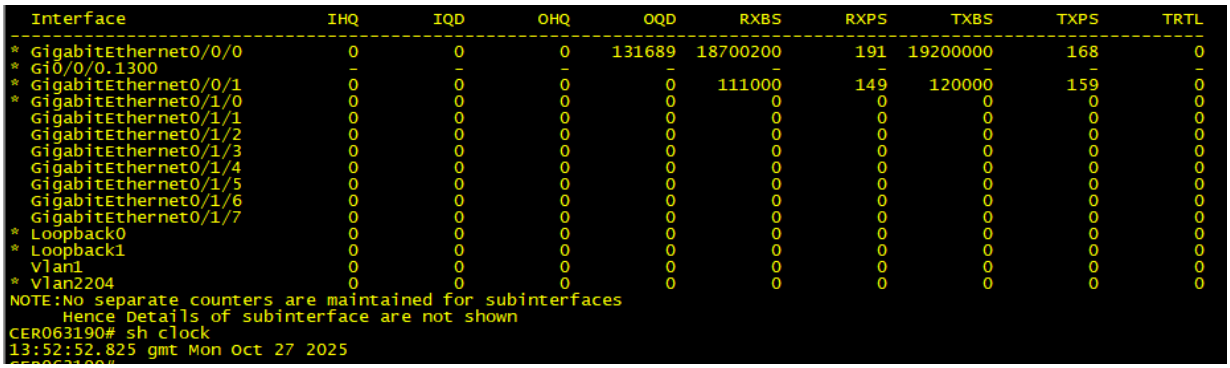

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     131689   18700200        191   19200000        168         0
* Gi0/0/0.1300                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     111000        149     120000        159         0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback1                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan2204                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER063190# sh clock
13:52:52.825 gmt Mon Oct 27 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
155	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 8 # 12A-19, Sede Anexa del Palacio de Justicia	10 Mbps	9,1

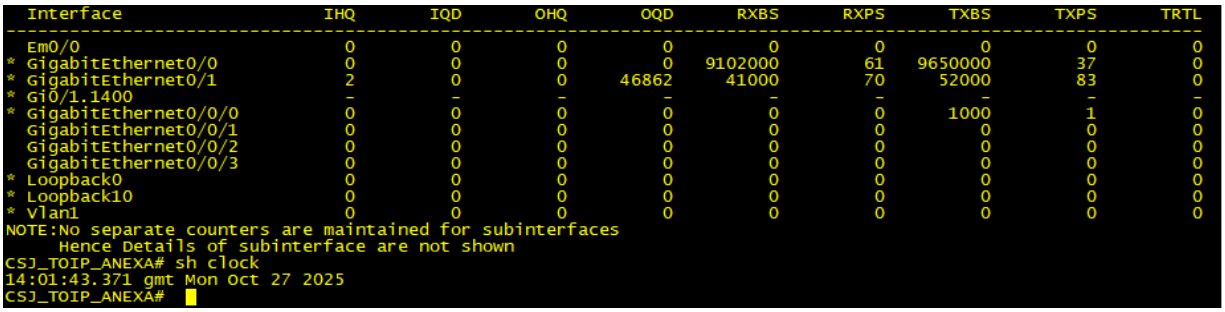


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Em0/0                         0          0          0          0           0           0           0           0          0
* GigabitEthernet0/0            0          0          0          0     9102000          61     9650000          37          0
* GigabitEthernet0/1            2          0          0      46862       41000          70       52000          83          0
* Gi0/1.1400                    -          -          -          -           -           -           -           -          -
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0           0           0        1000           1          0
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/0/2          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/0/3          0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback0                     0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback10                    0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Vlan1                         0          0          0          0           0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CSJ_TOIP_ANEXA# sh clock
14:01:43.371 gmt Mon Oct 27 2025
CSJ_TOIP_ANEXA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2222	1	Cundinamarca, Bogotá; Cra. 7 # 27-18 Piso 10, Nueva DEAJ	10 Mbps	9,4


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0               0          0          0          0     42000        65     36000        55         0
  FastEthernet1               0          0          0          0         0         0         0         0         0
  FastEthernet2               0          0          0          0         0         0         0         0         0
* FastEthernet3               0          0          0          0    449000       266    442000       263         0
* FastEthernet4               4          0          0          0   9449000       301   9442000       315         0
* FastEthernet4.1400          -          -          -          -         -         -         -         -         -
* Loopback0                   0          0          0          0         0         0         0         0         0
  Vlan1                       0          0          0          0         0         0         0         0         0
* Vlan2                       0          0          0          0    423000       256    417000       254         0
* Vlan100                     0          0          0          0     36000        62     32000        52         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER116102# sh clock
14:19:01.458 gmt Mon Oct 27 2025
CER116102#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2223	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 73 # 10 - 83, Centro Comercial Avenidad Ciudad de Chile Torre D	10 Mbps	9,8

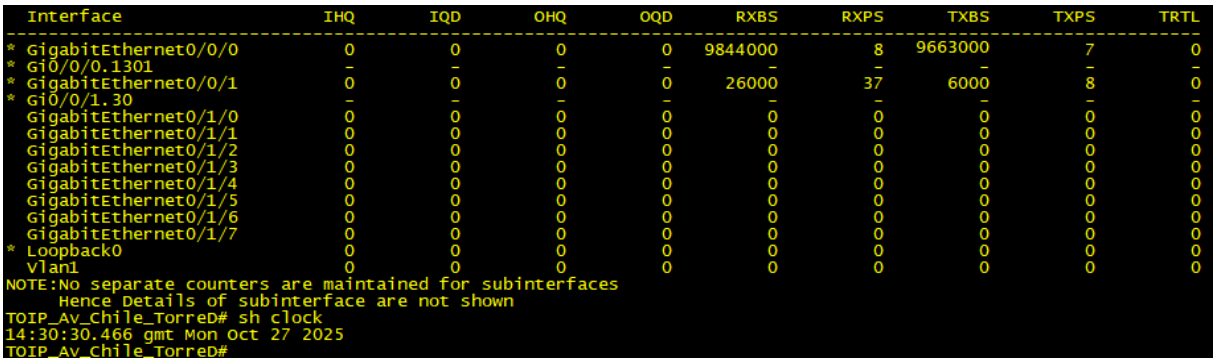

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           0           9844000     8           9663000     7           0
* Gi0/0/0.1301                -           -           -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           0           26000       37          6000        8           0
* Gi0/0/1.30                  -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
TOIP_Av_Chile_TorreD# sh clock
14:30:30.466 gmt Mon Oct 27 2025
TOIP_Av_Chile_TorreD#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2224	1	Cundinamarca, Bogotá; Sede Judicial del CAN, Carrera 57 # 43-91 Av. La Esmeralda	10 Mbps	9,5

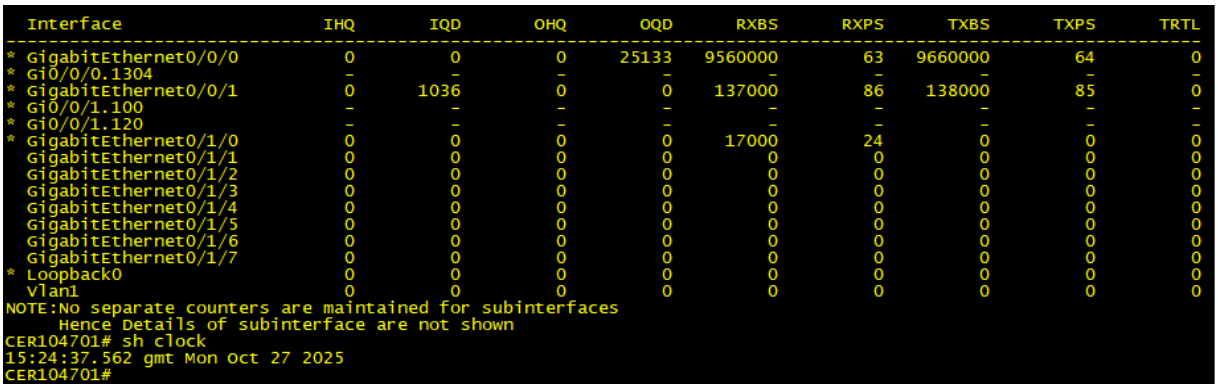


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      25133    9560000         63    9660000         64          0
* Gi0/0/0.1304                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0       1036          0          0     137000         86     138000         85          0
* Gi0/0/1.100                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/1.120                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      17000         24          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER104701# sh clock
15:24:37.562 gmt Mon Oct 27 2025
CER104701#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2225	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 7 #17-64, La Candelaria, Edificio AKL	10 Mbps	9,5

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0    9540000          17    9750000          16          0
* Gi0/0/0.1301                  -          -          -          -          -           -          -           -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      43000          51       9000          13          0
* Gi0/0/1.100                   -          -          -          -          -           -          -           -          -
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0           0          0           0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0           0          0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER103800# sh clock
15:51:21.565 gmt Mon Oct 27 2025
CER103800#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3013	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 9 # 11-45, Edificio Kaysser 3 (El Virrey Torre Central)	10 Mbps	9,6

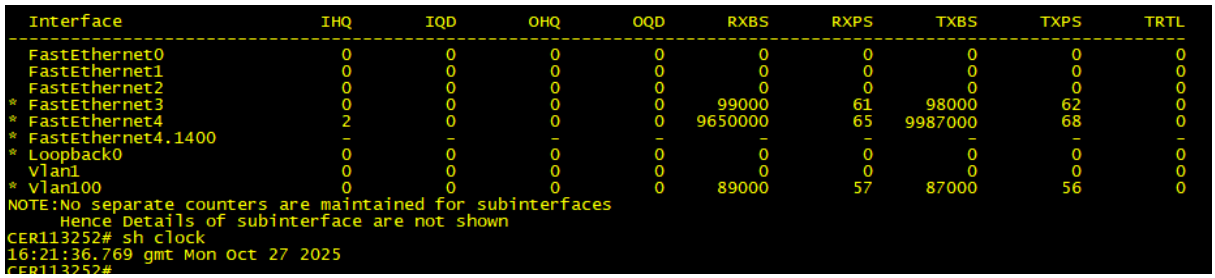


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0           0
  FastEthernet1              0          0          0          0           0           0           0           0           0
  FastEthernet2              0          0          0          0           0           0           0           0           0
* FastEthernet3              0          0          0          0       99000          61       98000          62           0
* FastEthernet4              2          0          0          0     9650000          65     9987000          68           0
* FastEthernet4.1400         -          -          -          -           -           -           -           -           -
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan100                    0          0          0          0       89000          57       87000          56           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER113252# sh clock
16:21:36.769 gmt Mon Oct 27 2025
CER113252#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3124	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 10 # 14-30, Edificio Jaramillo	10 Mbps	9,8


```
  Interface                  IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0              0          0          0          0          0           1           0           0          0
  FastEthernet1              0          0          0          0          0           0           0           0          0
  FastEthernet2              0          0          0          0          0           0           0           0          0
  FastEthernet3              0          0          0          0          0           0           0           0          0
* FastEthernet4              4          0          0    9860000          0           1     9972000           1          0
* FastEthernet4.1400         -          -          -          -          -           -           -           -          -
* Loopback0                  0          0          0          0          0           0           0           0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0           0           0           0          0
* Vlan100                    0          0          0          0          0           1           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER113253# sh clock
17:37:04.680 gmt Mon Oct 27 2025
CER113253#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3125	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 10 # 19-65, Edificio Camacol	10 Mbps	9,3

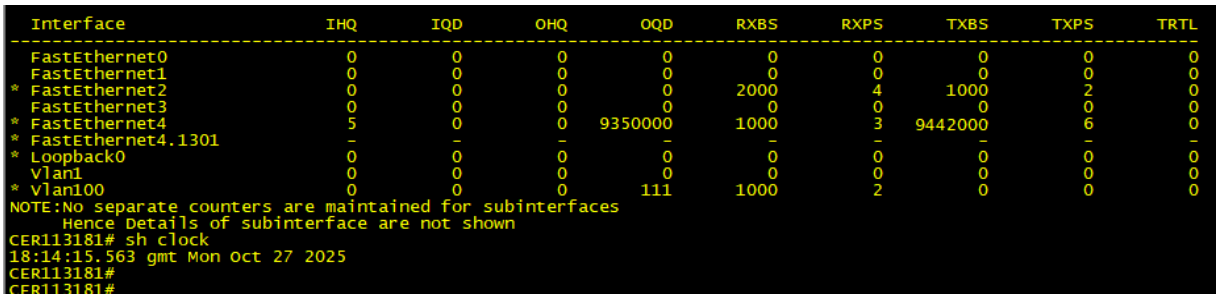


```
  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0                0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet1                0         0         0         0          0          0          0          0         0
* FastEthernet2                0         0         0         0       2000          4       1000          2         0
  FastEthernet3                0         0         0         0          0          0          0          0         0
* FastEthernet4                5         0         0   9350000       1000          3    9442000          6         0
* FastEthernet4.1301           -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Loopback0                    0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                        0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan100                      0         0         0       111       1000          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER113181# sh clock
18:14:15.563 gmt Mon Oct 27 2025
CER113181#
CER113181#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3166	2	Cundinamarca, Girardot; Carrera 10 # 37-39, Palacio de Justicia	10 Mbps	9,7

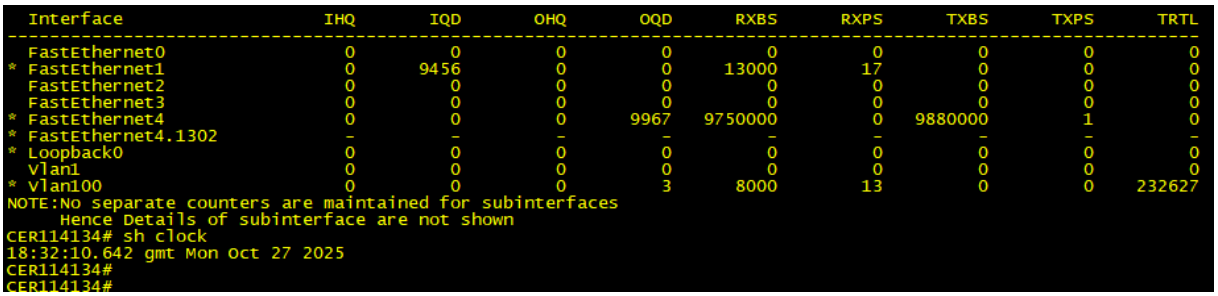


```
  Interface                  IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet1              0          9456       0          0          13000      17         0          0          0
  FastEthernet2              0          0          0          0          0          0          0          0          0
  FastEthernet3              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet4              0          0          0          9967       9750000    0          9880000    1          0
* FastEthernet4.1302         -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                    0          0          0          3          8000       13         0          0          232627
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER114134# sh clock
18:32:10.642 gmt Mon Oct 27 2025
CER114134#
CER114134#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3215	1	Cundinamarca, Soacha; Carrera 4 # 38-66	10 Mbps	9,3

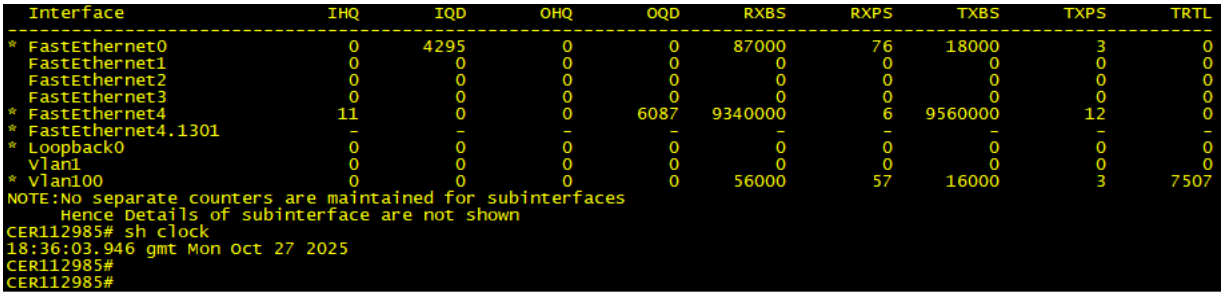


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0             0       4295          0          0       87000          76       18000           3          0
  FastEthernet1             0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet2             0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet3             0          0          0          0           0           0           0           0          0
* FastEthernet4            11          0          0       6087     9340000           6     9560000          12          0
* FastEthernet4.1301        -          -          -          -           -           -           -           -          -
* Loopback0                 0          0          0          0           0           0           0           0          0
  Vlan1                     0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Vlan100                   0          0          0          0       56000          57       16000           3       7507
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER112985# sh clock
18:36:03.946 gmt Mon Oct 27 2025
CER112985#
CER112985#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3524	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 11 # 9-24, Nueva Escuela Judicial	10 Mbps	9,7

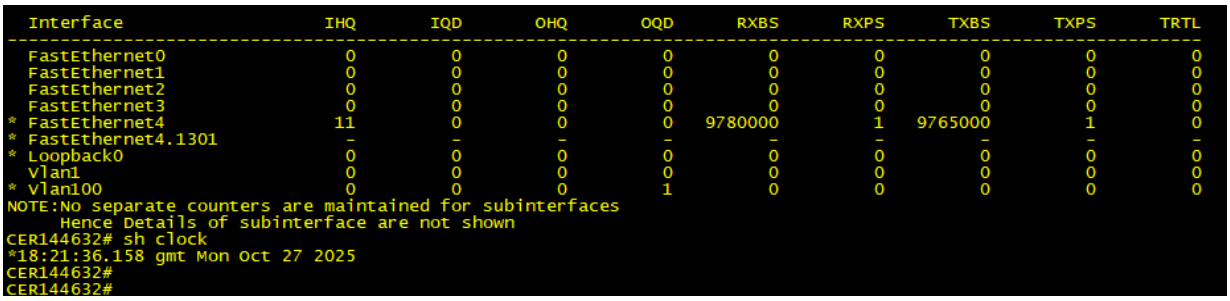


```
  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0                0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet1                0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet2                0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet3                0         0         0         0          0          0          0          0         0
* FastEthernet4               11         0         0         0    9780000          1    9765000          1         0
* FastEthernet4.1301           -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Loopback0                    0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                        0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan100                      0         0         0         1          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER144632# sh clock
*18:21:36.158 gmt Mon Oct 27 2025
CER144632#
CER144632#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
146	1	Cundinamarca, Bogotá; Av. Carrera 7 # 73-55 piso 9 Ultraserfinco	6 Mbps	5,6

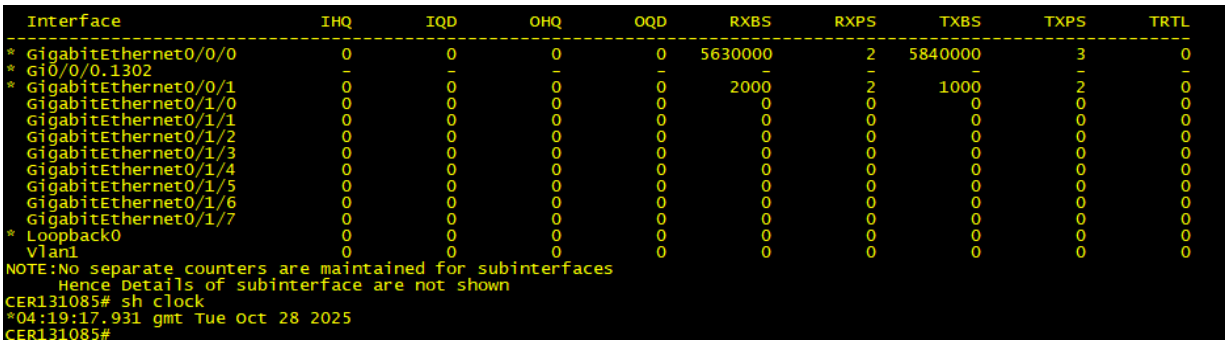


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0    5630000           2    5840000           3          0
* Gi0/0/0.1302                  -          -          -          -          -           -          -           -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0       2000           2       1000           2          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0           0          0           0          0
  vlan1                         0          0          0          0          0           0          0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER131085# sh clock
*04:19:17.931 gmt Tue Oct 28 2025
CER131085#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
148	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 29 # 18-45, Complejo Judicial de Paloquemao	6 Mbps	5,7

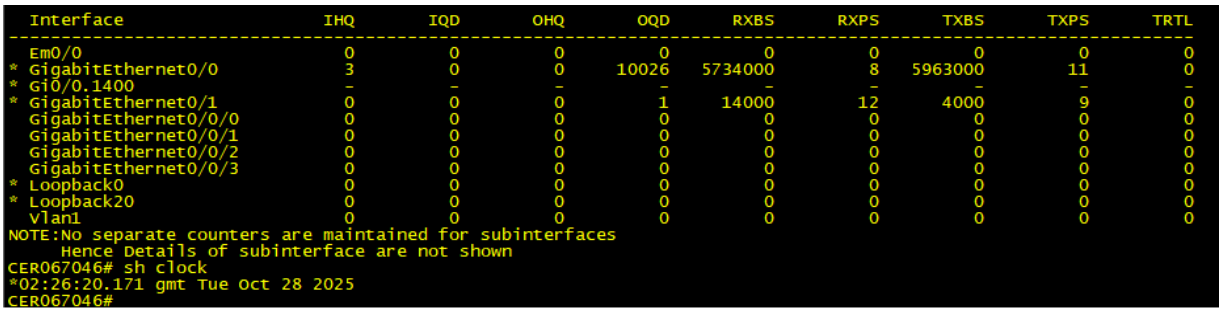

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Em0/0                         0          0          0          0           0           0           0           0          0
* GigabitEthernet0/0            3          0          0      10026     5734000           8     5963000          11          0
* Gi0/0.1400                    -          -          -          -           -           -           -           -          -
* GigabitEthernet0/1            0          0          0          1       14000          12        4000           9          0
  GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/0/2          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/0/3          0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback0                     0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback20                    0          0          0          0           0           0           0           0          0
  Vlan1                         0          0          0          0           0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067046# sh clock
*02:26:20.171 gmt Tue Oct 28 2025
CER067046#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
156	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 10 # 14-33 Sede Judicial Hernando Morales Molina	6 Mbps	5,5

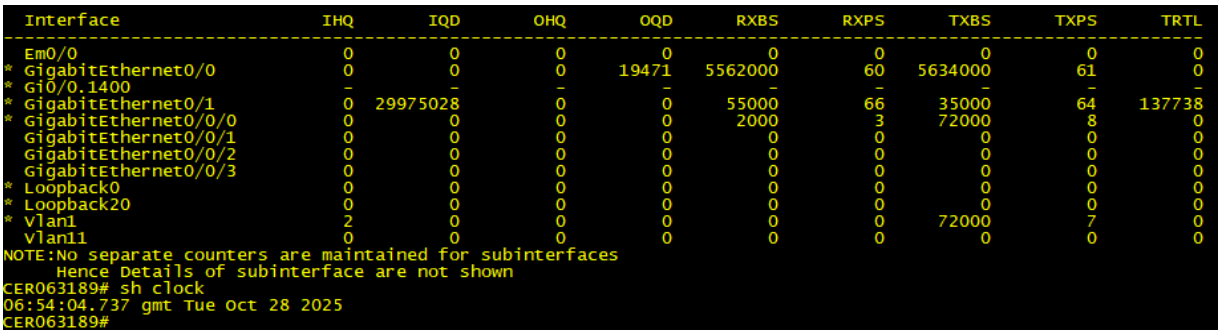


```
  Interface                   IHQ        IQD          OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Em0/0                         0          0            0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/0            0          0            0      19471    5562000         60    5634000         61         0
* Gi0/0.1400                    -          -            -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/1            0   29975028            0          0      55000         66      35000         64    137738
* GigabitEthernet0/0/0          0          0            0          0       2000          3      72000          8         0
  GigabitEthernet0/0/1          0          0            0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/2          0          0            0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/3          0          0            0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0            0          0          0          0          0          0         0
* Loopback20                    0          0            0          0          0          0          0          0         0
* Vlan1                         2          0            0          0          0          0      72000          7         0
  Vlan11                        0          0            0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER063189# sh clock
06:54:04.737 gmt Tue Oct 28 2025
CER063189#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
157	1	Cundinamarca, Bogotá; Avenida Calle 24 (La Esperanza) # 53-28 Tribunales Salitre	6 Mbps	5,4


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Em0/0                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/0            1          0          0         25    5421000         77    5320000         20          1
* GigabitEthernet0/0.3          -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0.100                     -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1           11          0          0          0      10000         15      24000         17          0
* Gi0/1.1400                    -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067053# sh clock
06:50:26.639 gmt Tue Oct 28 2025
CER067053#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3010	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 23 # 7-36	6 Mbps	5,8

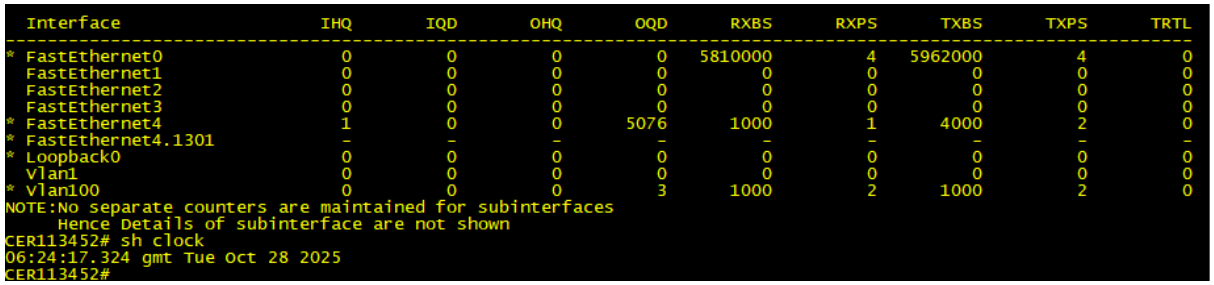


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0          0          0          0       5810000        4       5962000        4          0
  FastEthernet1            0          0          0          0             0        0             0        0          0
  FastEthernet2            0          0          0          0             0        0             0        0          0
  FastEthernet3            0          0          0          0             0        0             0        0          0
* FastEthernet4            1          0          0       5076          1000        1          4000        2          0
* FastEthernet4.1301       -          -          -          -             -        -             -        -          -
* Loopback0                0          0          0          0             0        0             0        0          0
  Vlan1                    0          0          0          0             0        0             0        0          0
* Vlan100                  0          0          0          3          1000        2          1000        2          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER113452# sh clock
06:24:17.324 gmt Tue Oct 28 2025
CER113452#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3012	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 85 # 11-96	8 Mbps	7,8

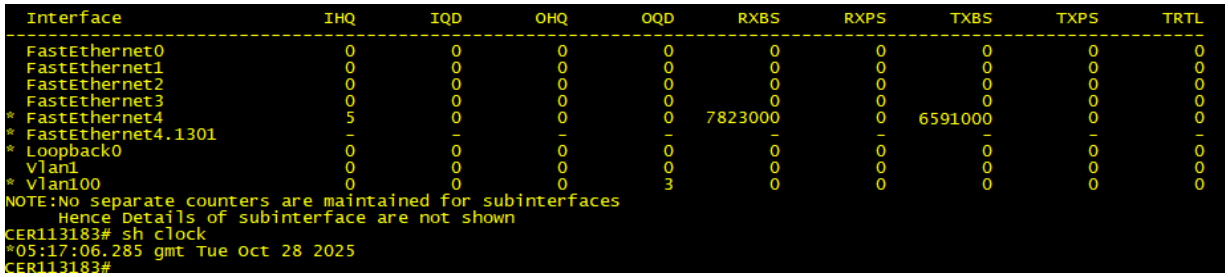


```
  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0                0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet1                0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet2                0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet3                0         0         0         0          0          0          0          0         0
* FastEthernet4                5         0         0         0    7823000          0    6591000          0         0
* FastEthernet4.1301           -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Loopback0                    0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                        0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan100                      0         0         0         3          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER113183# sh clock
*05:17:06.285 gmt Tue Oct 28 2025
CER113183#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3078	2	Chocó, Quibdó; Calle 24 # 1-30, Palacio de Justicia	6 Mbps	5,9

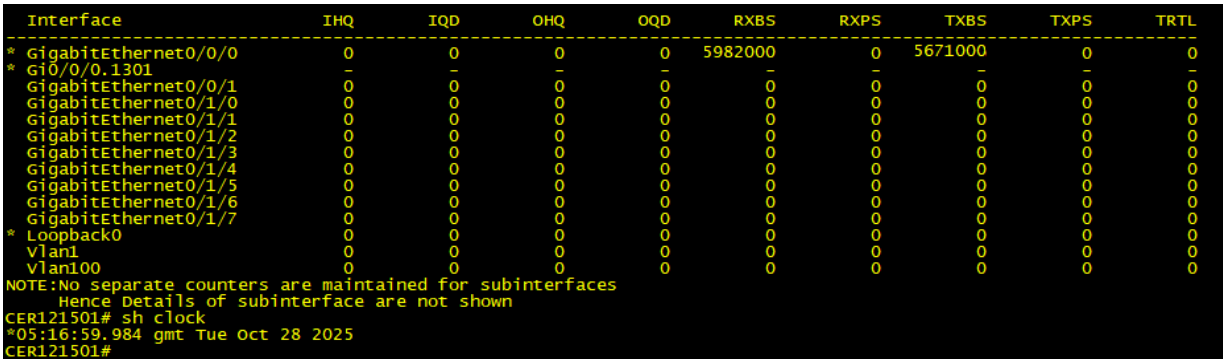


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0    5982000           0    5671000           0          0
* Gi0/0/0.1301                  -          -          -          -          -           -          -           -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0           0          0           0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0           0          0           0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0           0          0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER121501# sh clock
*05:16:59.984 gmt Tue Oct 28 2025
CER121501#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3080	3	Chocó, Istmina; Calle 23 # 8-6, Palacio de Justicia	6 Mbps	5,9

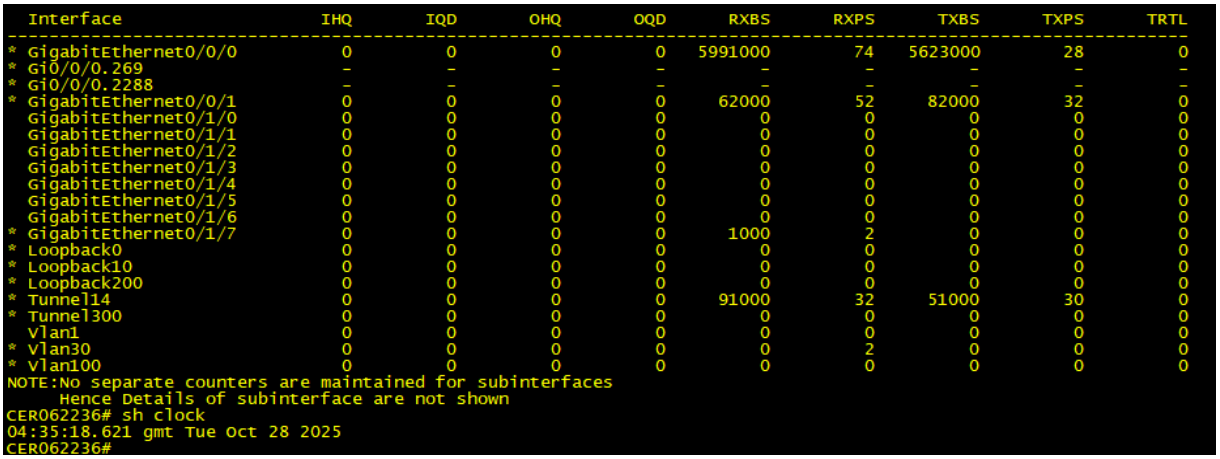


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0    5991000          74    5623000          28          0
* Gi0/0/0.269                   -          -          -          -          -           -          -           -          -
* Gi0/0/0.2288                  -          -          -          -          -           -          -           -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      62000          52      82000          32          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0           0          0           0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000           2          0           0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Tunnel14                      0          0          0          0      91000          32      51000          30          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0           0          0           0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0           2          0           0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0           0          0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062236# sh clock
04:35:18.621 gmt Tue Oct 28 2025
CER062236#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3120	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 12 # 9-55 (Torre Interna) Virrey o Kaysser	6 Mbps	5,6

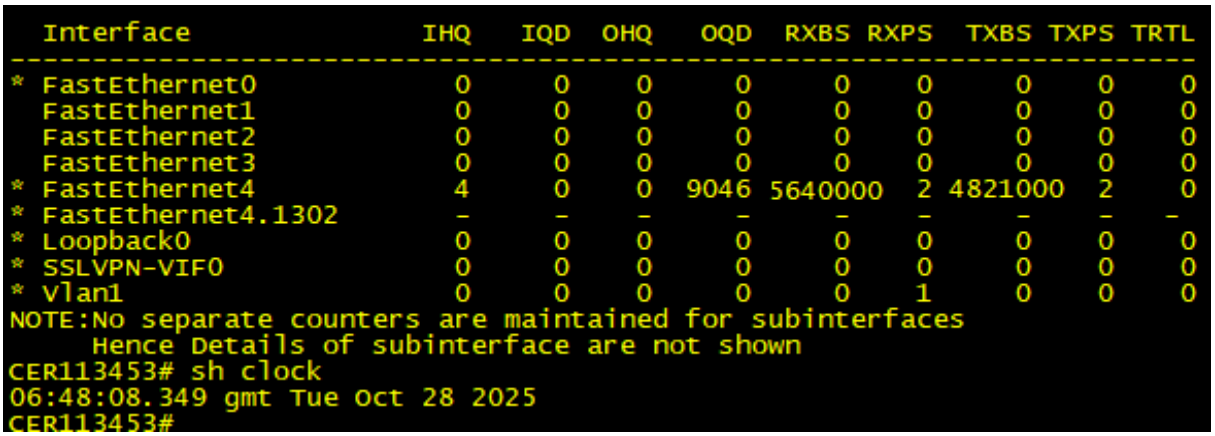


```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0          0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet1          0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet2          0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet3          0      0    0      0     0    0     0    0    0
* FastEthernet4          4      0    0   9046 5640000   2 4821000   2    0
* FastEthernet4.1302     -      -    -      -     -    -     -    -    -
* Loopback0              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* SSLVPN-VIF0            0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Vlan1                  0      0    0      0     0    1     0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER113453# sh clock
06:48:08.349 gmt Tue Oct 28 2025
CER113453#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3122	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 31 # 6-24	6 Mbps	5,8

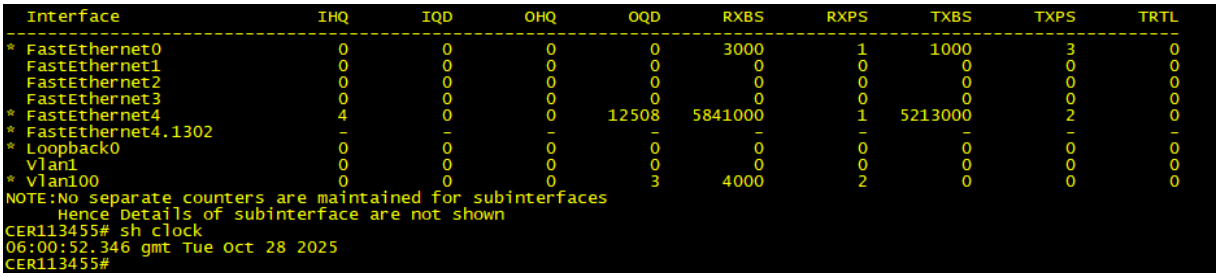


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0          0          0          0          3000        1           1000        3           0
  FastEthernet1            0          0          0          0          0           0           0           0           0
  FastEthernet2            0          0          0          0          0           0           0           0           0
  FastEthernet3            0          0          0          0          0           0           0           0           0
* FastEthernet4            4          0          0          12508      5841000     1           5213000     2           0
* FastEthernet4.1302       -          -          -          -          -           -           -           -           -
* Loopback0                0          0          0          0          0           0           0           0           0
  Vlan1                    0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Vlan100                  0          0          0          3          4000        2           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER113455# sh clock
06:00:52.346 gmt Tue Oct 28 2025
CER113455#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3127	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 41 # 17-81	8 Mbps	7,9

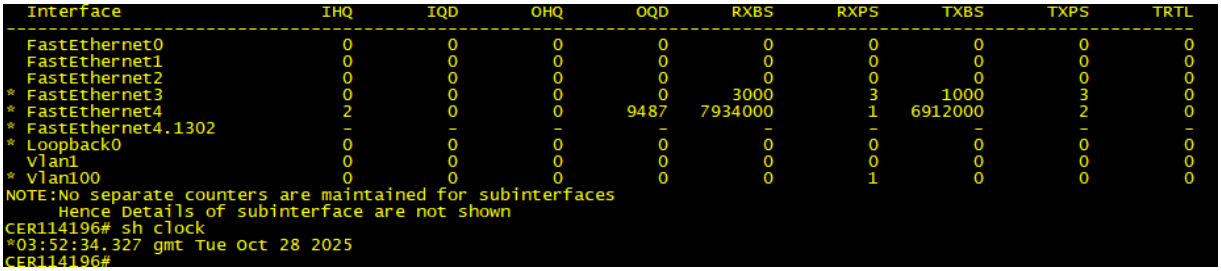


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet1              0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet2              0          0          0          0           0           0           0           0          0
* FastEthernet3              0          0          0          0        3000           3        1000           3          0
* FastEthernet4              2          0          0       9487     7934000           1     6912000           2          0
* FastEthernet4.1302         -          -          -          -           -           -           -           -          -
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0          0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Vlan100                    0          0          0          0           0           1           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER114196# sh clock
*03:52:34.327 gmt Tue Oct 28 2025
CER114196#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3014	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 7# 32-12, Sede Edificio San Martín, Torre Sur	3 Mbps	2,9

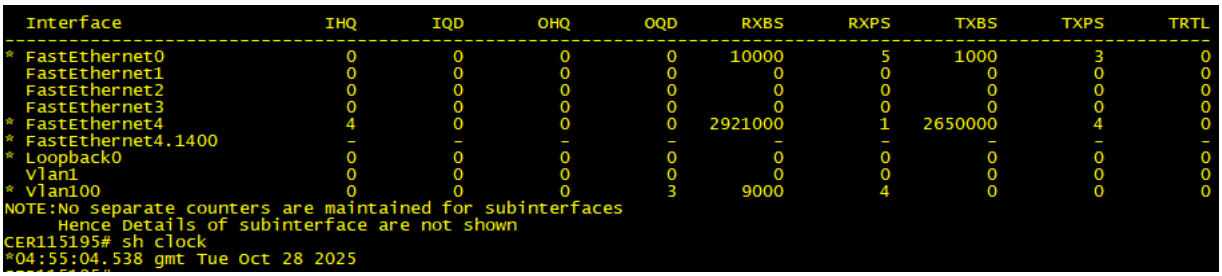


```
  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0              0         0         0         0         10000      5          1000       3         0
  FastEthernet1              0         0         0         0         0          0          0          0         0
  FastEthernet2              0         0         0         0         0          0          0          0         0
  FastEthernet3              0         0         0         0         0          0          0          0         0
* FastEthernet4              4         0         0         0         2921000    1          2650000    4         0
* FastEthernet4.1400         -         -         -         -         -          -          -          -         -
* Loopback0                  0         0         0         0         0          0          0          0         0
  Vlan1                      0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Vlan100                    0         0         0         3         9000       4          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER115195# sh clock
*04:55:04.538 gmt Tue Oct 28 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3035	1	Cundinamarca, Facatativá; Carrera 1 # 1e 27	3 Mbps	2,7

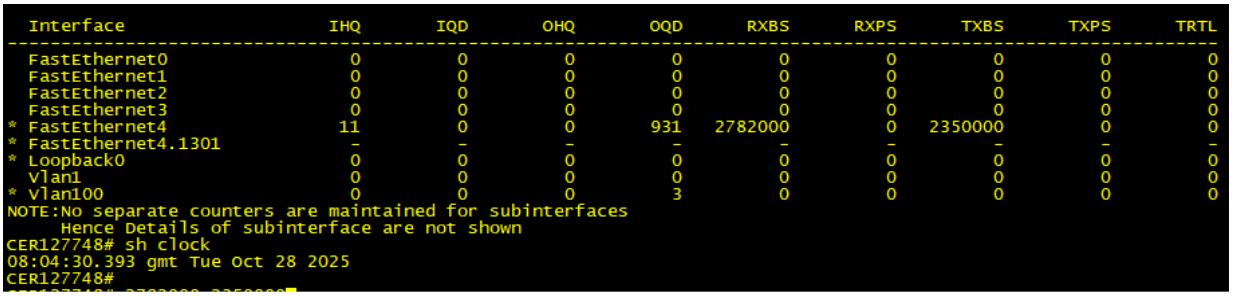


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet1              0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet2              0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet3              0         0         0         0          0          0          0          0         0
* FastEthernet4             11         0         0       931    2782000          0    2350000          0         0
* FastEthernet4.1301         -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan100                    0         0         0         3          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER127748# sh clock
08:04:30.393 gmt Tue Oct 28 2025
CER127748#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3071	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 14 # 7-36, Edificio Nemqueteba	4 Mbps	3,8

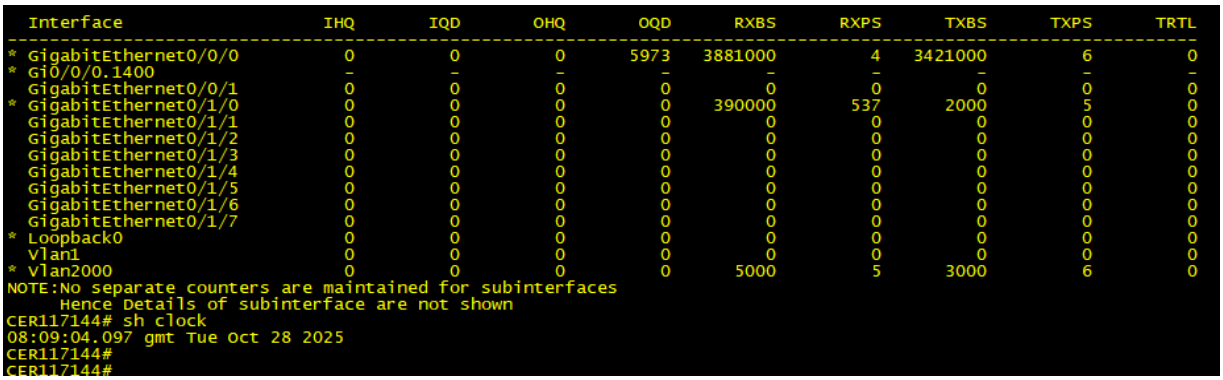


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0       5973    3881000          4    3421000          6         0
* Gi0/0/0.1400                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     390000        537       2000          5         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan2000                      0          0          0          0       5000          5       3000          6         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER117144# sh clock
08:09:04.097 gmt Tue Oct 28 2025
CER117144#
CER117144#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3095	4	Chocó, Riosucio; Cabecera Municipal, Palacio de Justicia	3 Mbps	2,8

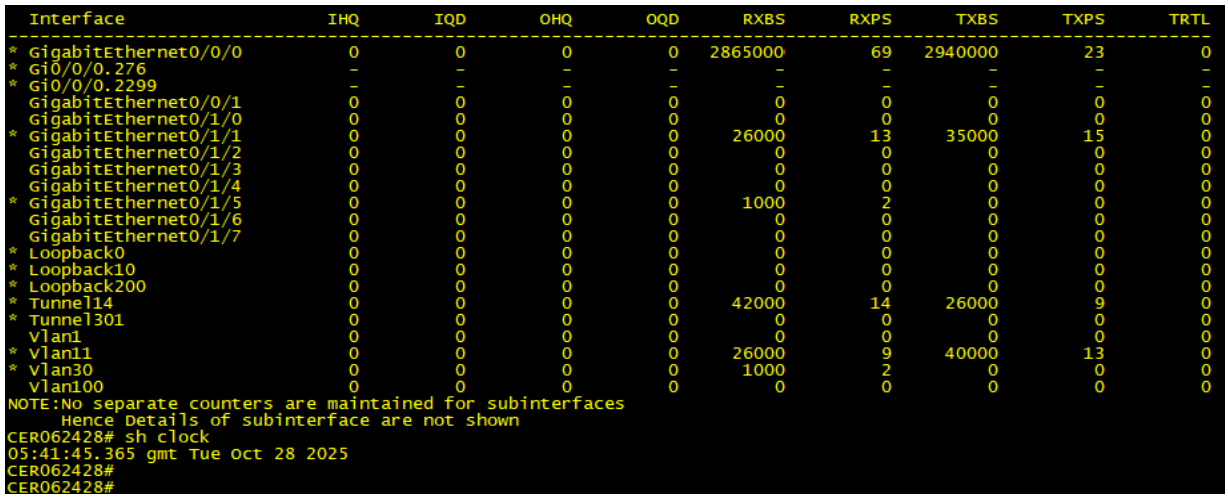

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0    2865000         69    2940000         23          0
* GiO/0/0.276                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GiO/0/0.2299                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0      26000         13      35000         15          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0       1000          2          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      0          0          0          0      42000         14      26000          9          0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      26000          9      40000         13          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO62428# sh clock
05:41:45.365 gmt Tue Oct 28 2025
CERO62428#
CERO62428#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3099	2	Chocó, Quibdó; Carrera 1 # 26-119	3 Mbps	2,9

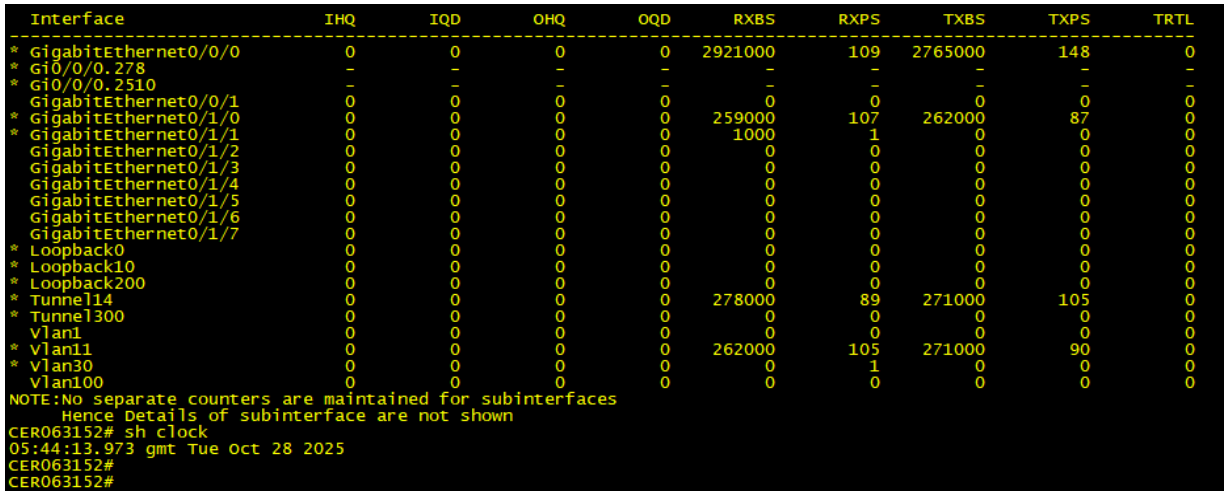


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0    2921000        109    2765000        148          0
* Gi0/0/0.278                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2510               -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     259000        107     262000         87          0
* GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0       1000          1          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                   0          0          0          0     278000         89     271000        105          0
* Tunnel300                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     262000        105     271000         90          0
* Vlan30                     0          0          0          0          0          1          0          0          0
  Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER063152# sh clock
05:44:13.973 gmt Tue Oct 28 2025
CER063152#
CER063152#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3100	2	Chocó, Quibdó; Carrera 9 # 28-84 Piso 2, barrio El Silencio	3 Mbps	2,8


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0        465    2854000         77    2341000         18          0
* Gi0/0/0.118                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.346                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0      41000         19      53000         27          0
  GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                     0          0          0        395      65000         35      45000         16          0
* Tunnel24                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan205                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER136921# sh clock
05:46:03.950 gmt Tue Oct 28 2025
CER136921#
CER136921#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3118	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 15 # 10-61	3 Mbps	2,7

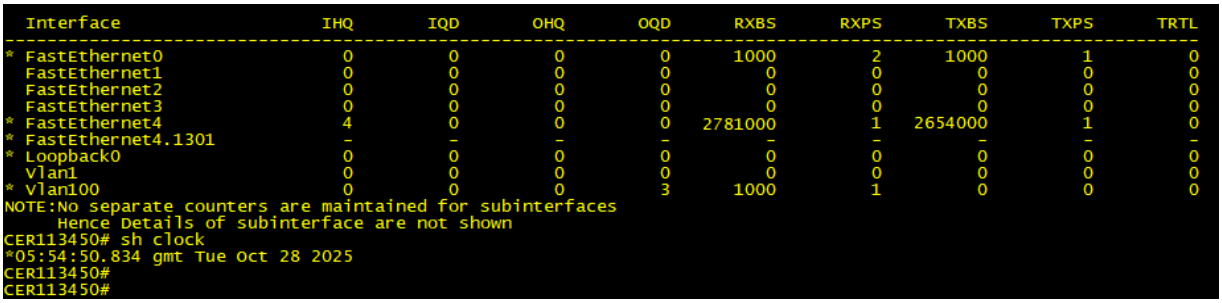


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0         0         0         0          1000          2       1000          1          0
  FastEthernet1            0         0         0         0             0          0          0          0          0
  FastEthernet2            0         0         0         0             0          0          0          0          0
  FastEthernet3            0         0         0         0             0          0          0          0          0
* FastEthernet4            4         0         0         0       2781000          1    2654000          1          0
* FastEthernet4.1301       -         -         -         -             -          -          -          -          -
* Loopback0                0         0         0         0             0          0          0          0          0
  Vlan1                    0         0         0         0             0          0          0          0          0
* Vlan100                  0         0         0         3          1000          1          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER113450# sh clock
*05:54:50.834 gmt Tue Oct 28 2025
CER113450#
CER113450#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3159	2	Cundinamarca, Fusagasugá; Transversal 16 # 11-85, Palacio de Justicia	3 Mbps	2,9

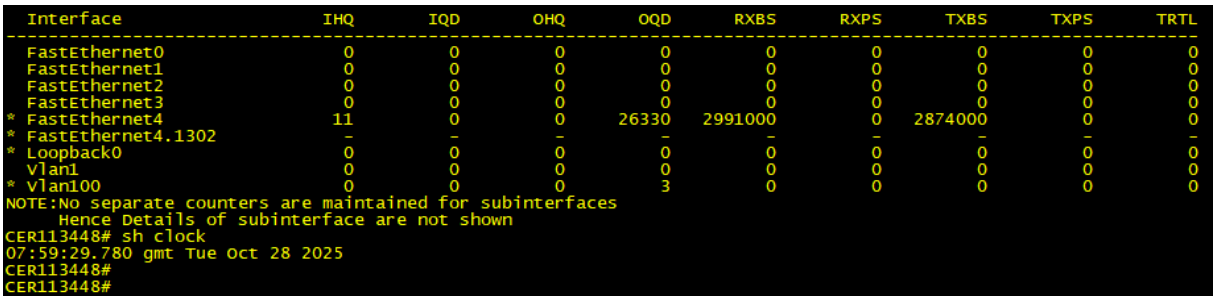


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet1              0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet2              0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet3              0          0          0          0           0           0           0           0          0
* FastEthernet4             11          0          0      26330     2991000           0     2874000           0          0
* FastEthernet4.1302         -          -          -          -           -           -           -           -          -
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0          0
  vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0          0
* vlan100                    0          0          0          3           0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER113448# sh clock
07:59:29.780 gmt Tue Oct 28 2025
CER113448#
CER113448#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3214	1	Cundinamarca, Soacha; Transversal 12 # 38 A - 18 Plazoleta Terreros Soacha	3 Mbps	2,8

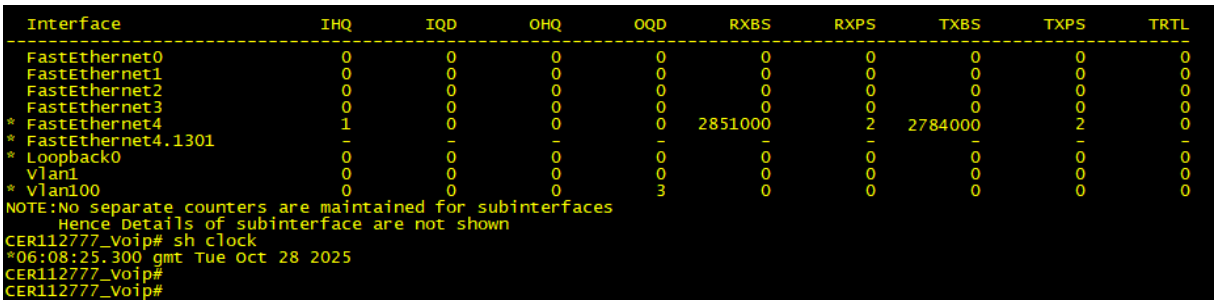

```
  Interface                  IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0         0         0         0         0          0          0          0         0
  FastEthernet1              0         0         0         0         0          0          0          0         0
  FastEthernet2              0         0         0         0         0          0          0          0         0
  FastEthernet3              0         0         0         0         0          0          0          0         0
* FastEthernet4              1         0         0         0         2851000    2          2784000    2         0
* FastEthernet4.1301         -         -         -         -         -          -          -          -         -
* Loopback0                  0         0         0         0         0          0          0          0         0
  Vlan1                      0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Vlan100                    0         0         0         3         0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER112777_Voip# sh clock
*06:08:25.300 gmt Tue Oct 28 2025
CER112777_Voip#
CER112777_Voip#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3098	4	Chocó, Nuqui; Barrio La Unión al lado de la Alcaldía Municipal	1 Mbps	0,98

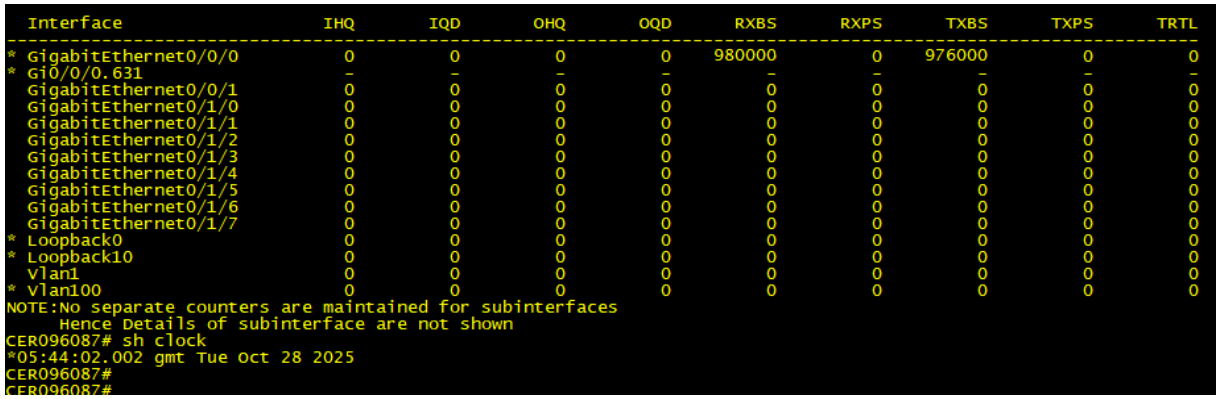


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0     980000          0     976000          0          0
* Gi0/0/0.631                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER096087# sh clock
*05:44:02.002 gmt Tue Oct 28 2025
CER096087#
CER096087#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3123	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 63 # 9-76, Casa de Justicia de Chapinero	1 Mbps	0,92

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0     920000         11     913000         13         0
* Gi0/0/0.1300                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.1301                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      10000          9      12000          6         0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                      0          0          0          0      16000          7      10000          8         0
* Tunnel26                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel200                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                        0          0          0          0      10000          9      15000          7         0
* Vlan20                        0         95          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER079970# sh clock
05:56:56.407 gmt Tue Oct 28 2025
CER079970#
CER079970#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3259	3	Chocó, Río Quito; Diagonal a la Casa de la Cultura en Paimado Barrio Juan Pablo Segundo	1 Mbps	0,98

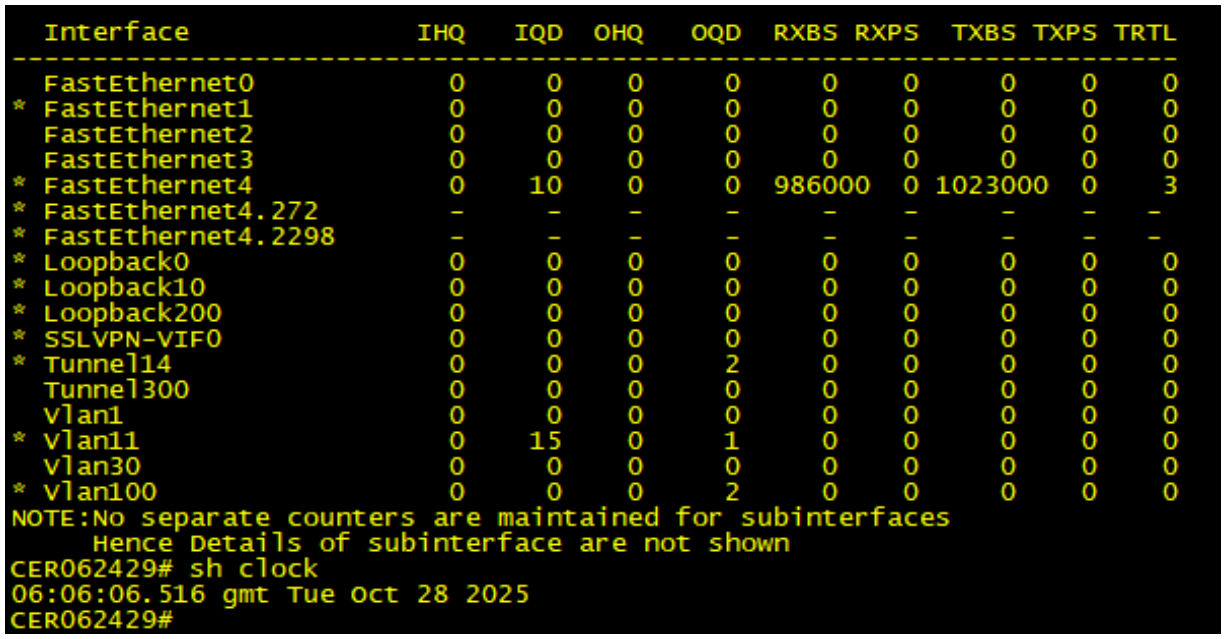

```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0            0      0    0      0     0    0     0    0    0
* FastEthernet1            0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet2            0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet3            0      0    0      0     0    0     0    0    0
* FastEthernet4            0     10    0      0 986000    0 1023000    0    3
* FastEthernet4.272        -      -    -      -     -    -     -    -    -
* FastEthernet4.2298       -      -    -      -     -    -     -    -    -
* Loopback0                0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Loopback10               0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Loopback200              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* SSLVPN-VIF0              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Tunnel14                 0      0    0      2     0    0     0    0    0
  Tunnel300                0      0    0      0     0    0     0    0    0
  Vlan1                    0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Vlan11                   0     15    0      1     0    0     0    0    0
  Vlan30                   0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Vlan100                  0      0    0      2     0    0     0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062429# sh clock
06:06:06.516 gmt Tue Oct 28 2025
CER062429#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3260	3	Chocó, Tadó; Calle 6A # 15-62 BarrioPopular, Palacio de Justicia	1 Mbps	0,91

```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD      RXBS    RXPS    TXBS    TXPS   TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0               0          0         0          0        0       0       0       0      0
* FastEthernet1               0          0         0          0        7000    7       1000    2      0
  FastEthernet2               0          0         0          0        0       0       0       0      0
* FastEthernet3               0          0         0          0        0       1       0       0      0
* FastEthernet4               0       1202         0      14436   912000       4  876000       5    116
* FastEthernet4.274           -          -         -          -        -       -       -       -      -
* FastEthernet4.2301          -          -         -          -        -       -       -       -      -
* Loopback0                   0          0         0          0        0       0       0       0      0
* Loopback10                  0          0         0          0        0       0       0       0      0
* Loopback200                 0          0         0          0        0       0       0       0      0
* Tunnel14                    0          0         0          9        0       1    2000       1      0
* Tunnel300                   0          0         0         71        0       0       0       0      0
  Vlan1                       0          0         0          0        0       0       0       0      0
* Vlan11                      0          0         0          0     4000       5       0       0      0
* Vlan30                      0          0         0          0        0       2       0       0      0
  Vlan100                     0          0         0          0        0       0       0       0      0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062237# sh clock
06:08:25.052 gmt Tue Oct 28 2025
CER062237#
CER062237#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3261	3	Chocó, Unión Panamericana; Calle 5 # 9-40 Barrio Santander Las Ánimas	1 Mbps	0,93

```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0            0      0    0      0     0    0     0    0    0
* FastEthernet1            0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet2            0      0    0      0     0    0     0    0    0
* FastEthernet3            0      0    0      0  1000    2     0    0    0
* FastEthernet4           11    683    0    281 932000    0781000    0   94
* FastEthernet4.273        -      -    -      -     -    -     -    -    -
* FastEthernet4.2302       -      -    -      -     -    -     -    -    -
* Loopback0                0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Loopback10               0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Loopback200              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* SSLVPN-VIF0              0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Tunnel14                 0      0    0     10     0    0     0    0    0
* Tunnel24                 0      0    0      1     0    0     0    0    0
* Tunnel300                0      0    0     73     0    0     0    0    0
  Vlan1                    0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Vlan11                   0    423    0      1     0    0     0    0    0
* Vlan30                   0      0    0      0     0    2     0    0    0
* Vlan100                  0      0    0      2     0    0     0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062427# sh clock
06:11:34.703 gmt Tue Oct 28 2025
CER062427#
CER062427#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3267	4	Chocó, Unguia; Calle 2 # 4-45 Barrio Andalucía	1 Mbps	0,98

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0     982000          0     764000          0         0
* GiO/0/0.629                 -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan100                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER105259# sh clock
*06:41:19.094 gmt Tue Oct 28 2025
CER105259#
CER105259#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3268	4	Chocó, Medio San Juan; calle principal	1 Mbps	1

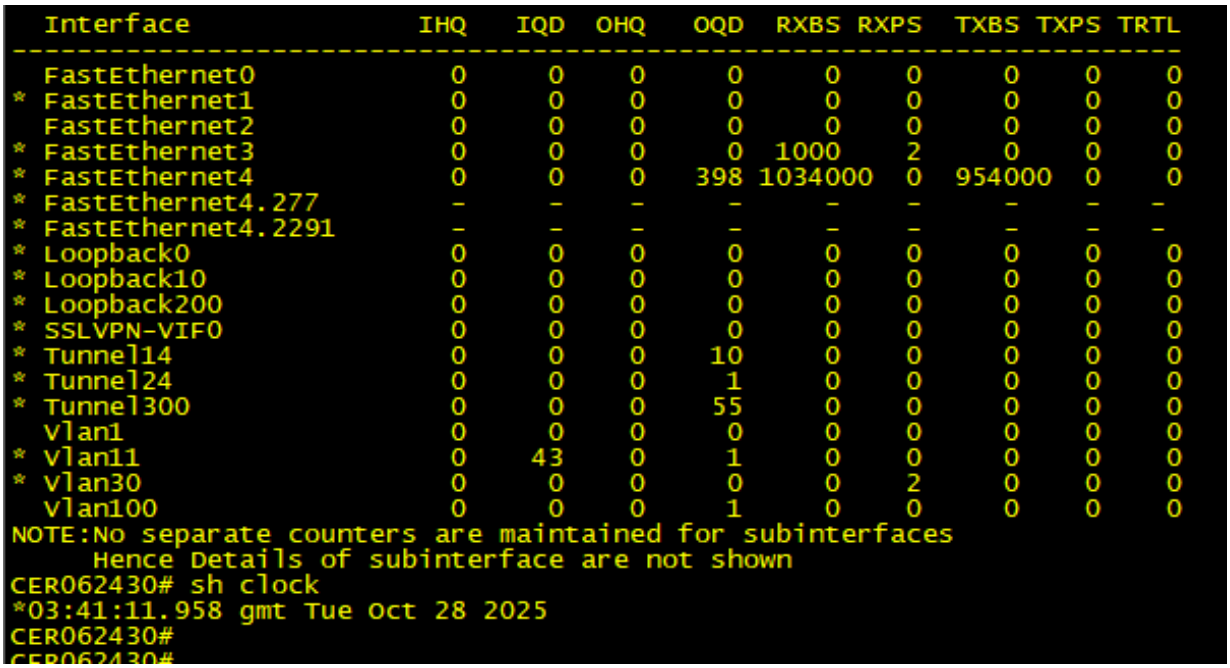

```
  Interface                IHQ    IQD   OHQ    OQD   RXBS RXPS   TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0      0     0      0      0    0      0    0    0
* FastEthernet1              0      0     0      0      0    0      0    0    0
  FastEthernet2              0      0     0      0      0    0      0    0    0
* FastEthernet3              0      0     0      0   1000    2      0    0    0
* FastEthernet4              0      0     0    398 1034000    0 954000    0    0
* FastEthernet4.277          -      -     -      -      -    -      -    -    -
* FastEthernet4.2291         -      -     -      -      -    -      -    -    -
* Loopback0                  0      0     0      0      0    0      0    0    0
* Loopback10                 0      0     0      0      0    0      0    0    0
* Loopback200                0      0     0      0      0    0      0    0    0
* SSLVPN-VIF0                0      0     0      0      0    0      0    0    0
* Tunnel14                   0      0     0     10      0    0      0    0    0
* Tunnel24                   0      0     0      1      0    0      0    0    0
* Tunnel300                  0      0     0     55      0    0      0    0    0
  Vlan1                      0      0     0      0      0    0      0    0    0
* Vlan11                     0     43     0      1      0    0      0    0    0
* Vlan30                     0      0     0      0      0    2      0    0    0
  Vlan100                    0      0     0      1      0    0      0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062430# sh clock
*03:41:11.958 gmt Tue Oct 28 2025
CER062430#
CER062430#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
2226	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 73 # 10 - 83, Centro Comercial Avenidad Ciudad de Chile Torre B	2 Mbps	1,82

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0       5295    1824000          1    1756000          3         0
* Gi0/0/0.25                   -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.1301                 -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0       1000          2       1000          1         0
* Gi0/0/1.25                   -          -          -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER103808# sh clock
15:42:37.855 gmt Tue Oct 28 2025
CER103808#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3001	4	Amazonas, Leticia; Avenida Internacional Carrera 6 # 8-31, Palacio de Justicia	2 Mbps	1,87

```
  Interface                 IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0               0           0           0           0           0           0           0           0           0
  FastEthernet1               0           0           0           0           0           0           0           0           0
  FastEthernet2               0           0           0           0           0           0           0           0           0
  FastEthernet3               0           0           0           0           0           0           0           0           0
* FastEthernet4               0           0           0           0     1874000           0     1965000           0           0
* Loopback0                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan100                     0           0           0           3           0           0           0           0           0
CER114205# sh clock
15:42:41.425 gmt Tue Oct 28 2025
CER114205#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3011	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 64 # 9-10	2 Mbps	1,93

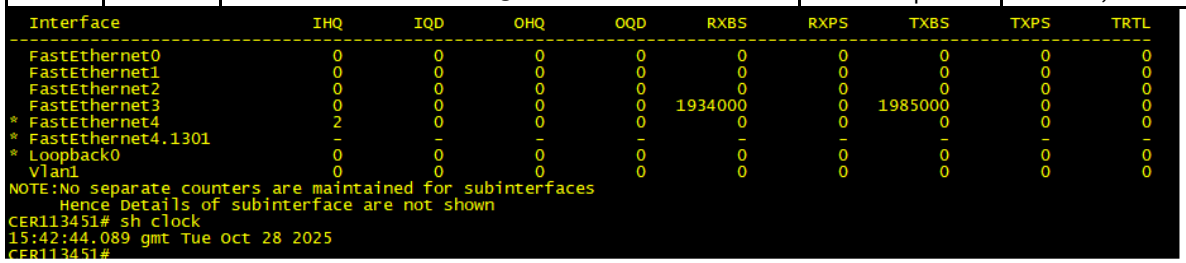


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet1              0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet2              0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet3              0          0          0          0     1934000           0     1985000           0          0
* FastEthernet4              2          0          0          0           0           0           0           0          0
* FastEthernet4.1301         -          -          -          -           -           -           -           -          -
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0          0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER113451# sh clock
15:42:44.089 gmt Tue Oct 28 2025
CER113451#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3032	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 85 Sur # 94 – 35 (Casa de Justicia)	2 Mbps	1,89


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0       2324    1899000        260     911000        162          0
* Gi0/0/0.1300                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1301                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0     954000        188    2527000        325          0
* GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel16                      0          0          0        127          0          0          0          0          0
* Tunnel26                      0          0          0          0    2608000        341     961000        195          0
* Tunnel200                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     941000        196    2583000        341          0
* Vlan20                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER112130# sh clock
15:42:46.717 gmt Tue Oct 28 2025
CER112130#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3039	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 85 Sur # 94 – 35 (URI Fiscalía)	2 Mbps	1,91

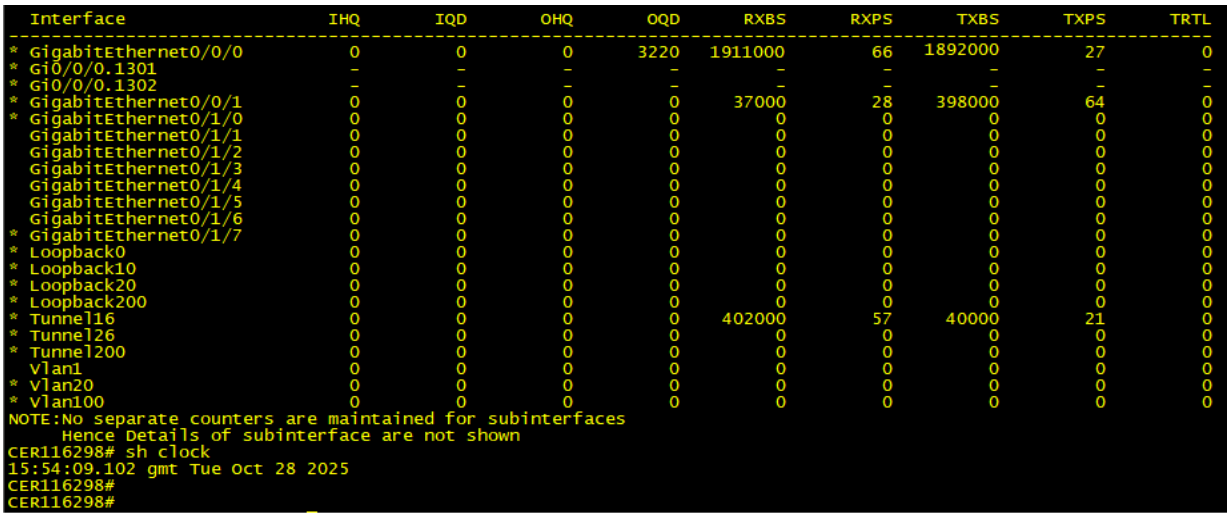


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0          0          0          3220      1911000    66         1892000    27        0
* Gi0/0/0.1301             -          -          -          -         -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.1302             -          -          -          -         -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1     0          0          0          0         37000      28         398000     64        0
* GigabitEthernet0/1/0     0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1     0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2     0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3     0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4     0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5     0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6     0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7     0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback0                0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback10               0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback20               0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback200              0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Tunnel16                 0          0          0          0         402000     57         40000      21        0
* Tunnel26                 0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Tunnel200                0          0          0          0         0          0          0          0         0
  Vlan1                    0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Vlan20                   0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Vlan100                  0          0          0          0         0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER116298# sh clock
15:54:09.102 gmt Tue Oct 28 2025
CER116298#
CER116298#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3082	3	Chocó, Bahía Solano; Barrio Panquiaco, Palacio de Justicia	2 Mbps	2,1

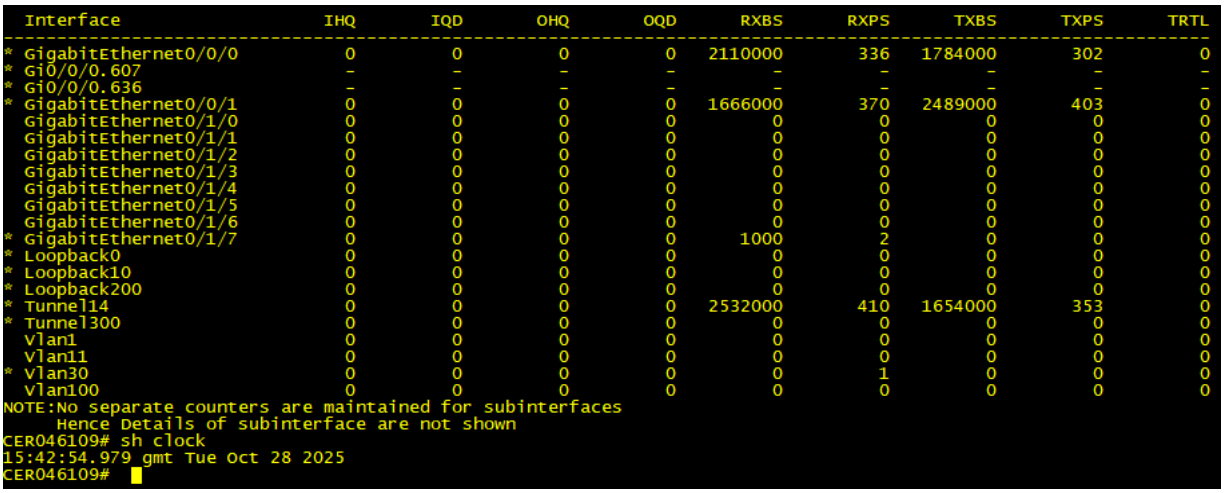

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0    2110000        336    1784000        302          0
* Gi0/0/0.607                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.636                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0    1666000        370    2489000        403          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                   0          0          0          0    2532000        410    1654000        353          0
* Tunnel300                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan11                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                     0          0          0          0          0          1          0          0          0
  Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER046109# sh clock
15:42:54.979 gmt Tue Oct 28 2025
CER046109#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3083	3	Chocó, Canton de San Pablo; Cabecera Municipal	2 Mbps	1,92

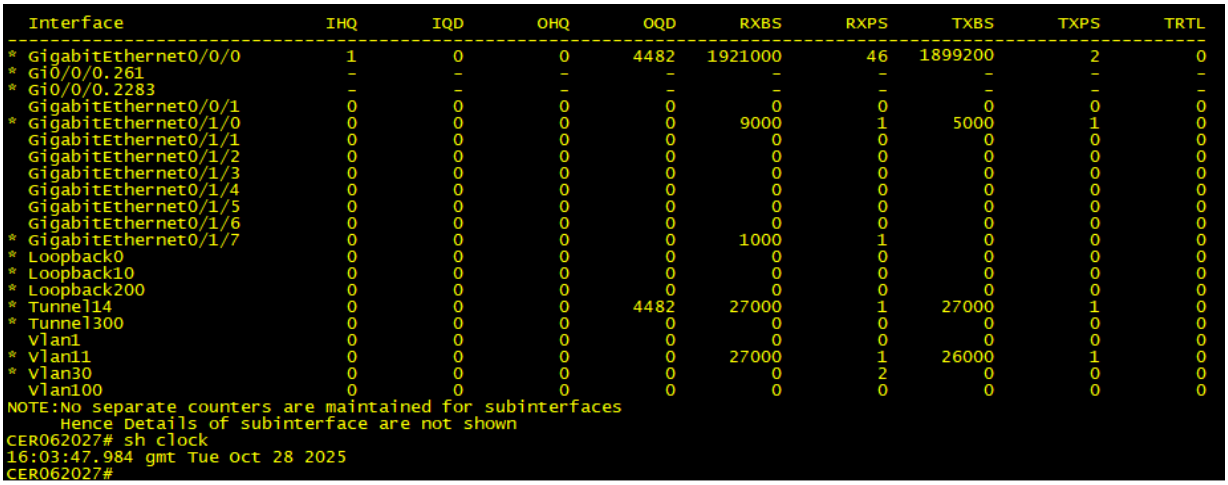


```
  Interface                  IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         1          0          0       4482    1921000         46    1899200          2          0
* Gi0/0/0.261                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2283                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0       9000          1       5000          1          0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                     0          0          0       4482      27000          1      27000          1          0
* Tunnel300                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                       0          0          0          0      27000          1      26000          1          0
* Vlan30                       0          0          0          0          0          2          0          0          0
  Vlan100                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062027# sh clock
16:03:47.984 gmt Tue Oct 28 2025
CER062027#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3085	3	Chocó, Carmen de Atrato; Carrera 5B # 5-65 BarrioSanta Teresita	2 Mbps	1,87


```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0            0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet1            0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet2            0      0    0      0     0    0     0    0    0
  FastEthernet3            0      0    0      0     0    0     0    0    0
* FastEthernet4            0      0    0      0 1876000    0 1893200    0    0
* FastEthernet4.262        -      -    -      -     -    -     -    -    -
* FastEthernet4.2284       -      -    -      -     -    -     -    -    -
* Loopback0                0      0    0      0     0    0     0    0    0
* Loopback10               0      0    0      0     0    0     0    0    0
  Tunnel14                 0      0    0      0     0    0     0    0    0
  Tunnel24                 0      0    0      0     0    0     0    0    0
  Vlan1                    0      0    0      0     0    0     0    0    0
  Vlan11                   0      0    0      0     0    0     0    0    0
  Vlan30                   0      0    0      0     0    0     0    0    0
  Vlan100                  0      0    0      0     0    0     0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062432# sh clock
15:36:09.980 gmt Tue Oct 28 2025
CER062432#
CER062432#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3086	4	Chocó, Carmen del Darien; Barrio Mosquera Ledezma, Palacio de Justicia	2 Mbps	1,93

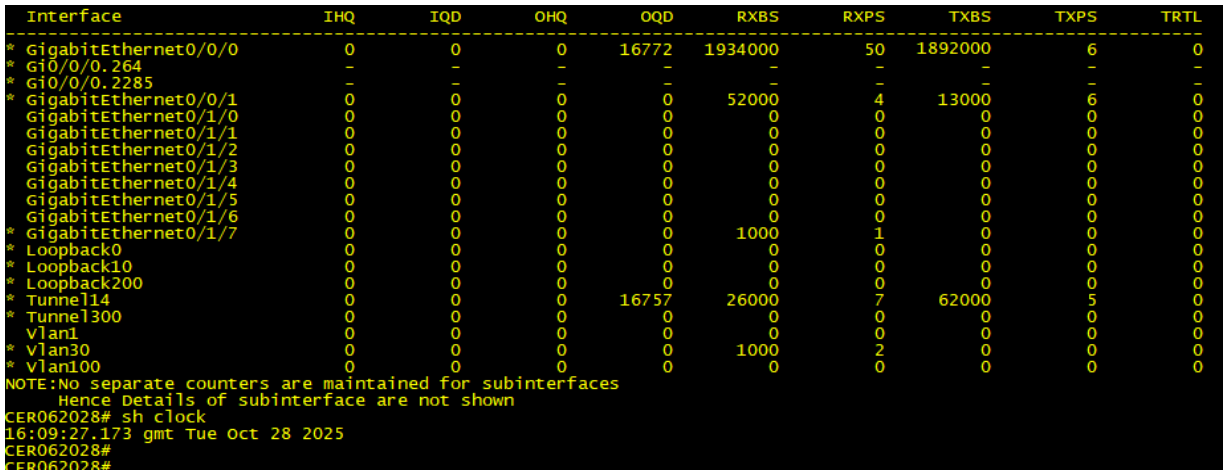


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0      16772    1934000         50    1892000          6         0
* GI0/0/0.264                -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GI0/0/0.2285               -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0      52000          4      13000          6         0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel14                   0          0          0      16757      26000          7      62000          5         0
* Tunnel300                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan30                     0          0          0          0       1000          2          0          0         0
* Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062028# sh clock
16:09:27.173 gmt Tue Oct 28 2025
CER062028#
CER062028#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3102	3	Chocó, Certegui; Calle Principal	2 Mbps	1,86

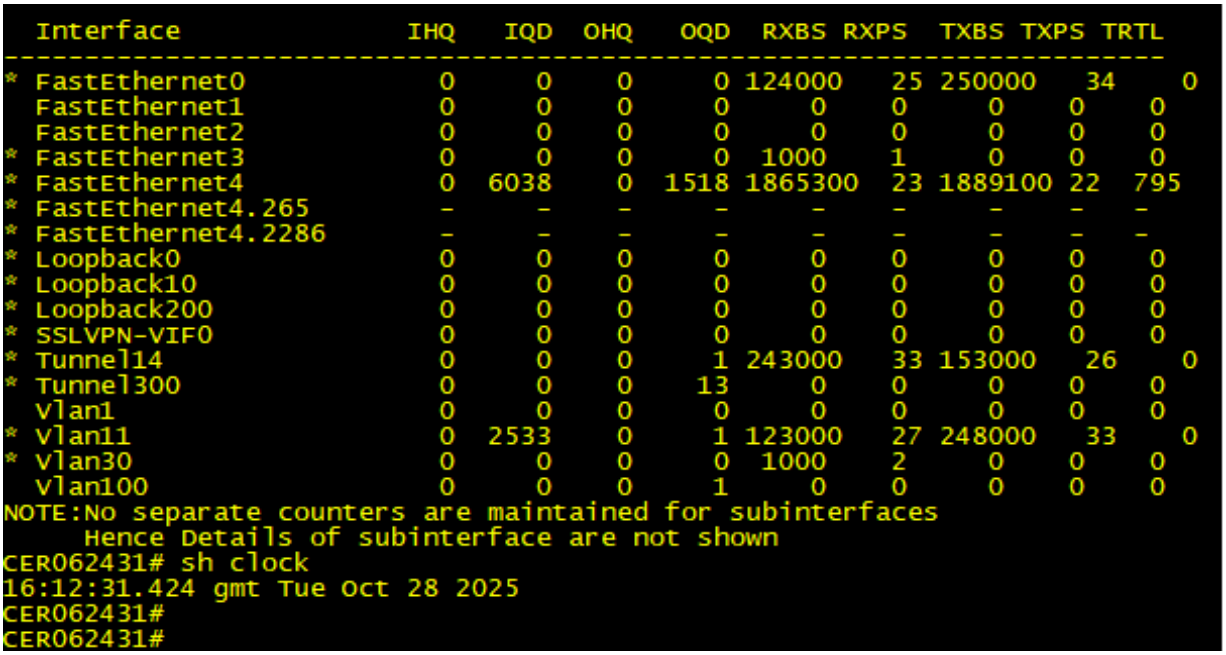


```
  Interface              IHQ    IQD  OHQ    OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0      0    0      0 124000   25 250000   34    0
  FastEthernet1            0      0    0      0      0    0      0    0    0
  FastEthernet2            0      0    0      0      0    0      0    0    0
* FastEthernet3            0      0    0      0   1000    1      0    0    0
* FastEthernet4            0   6038    0   1518 1865300   23 1889100 22  795
* FastEthernet4.265        -      -    -      -      -    -      -    -    -
* FastEthernet4.2286       -      -    -      -      -    -      -    -    -
* Loopback0                0      0    0      0      0    0      0    0    0
* Loopback10               0      0    0      0      0    0      0    0    0
* Loopback200              0      0    0      0      0    0      0    0    0
* SSLVPN-VIF0              0      0    0      0      0    0      0    0    0
* Tunnel14                 0      0    0      1 243000   33 153000   26    0
* Tunnel300                0      0    0     13      0    0      0    0    0
  Vlan1                    0      0    0      0      0    0      0    0    0
* Vlan11                   0   2533    0      1 123000   27 248000   33    0
* Vlan30                   0      0    0      0   1000    2      0    0    0
  Vlan100                  0      0    0      1      0    0      0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062431# sh clock
16:12:31.424 gmt Tue Oct 28 2025
CER062431#
CER062431#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3104	4	Chocó, Jurado; Barrio Pueblo Nuevo	2 Mbps	1,98

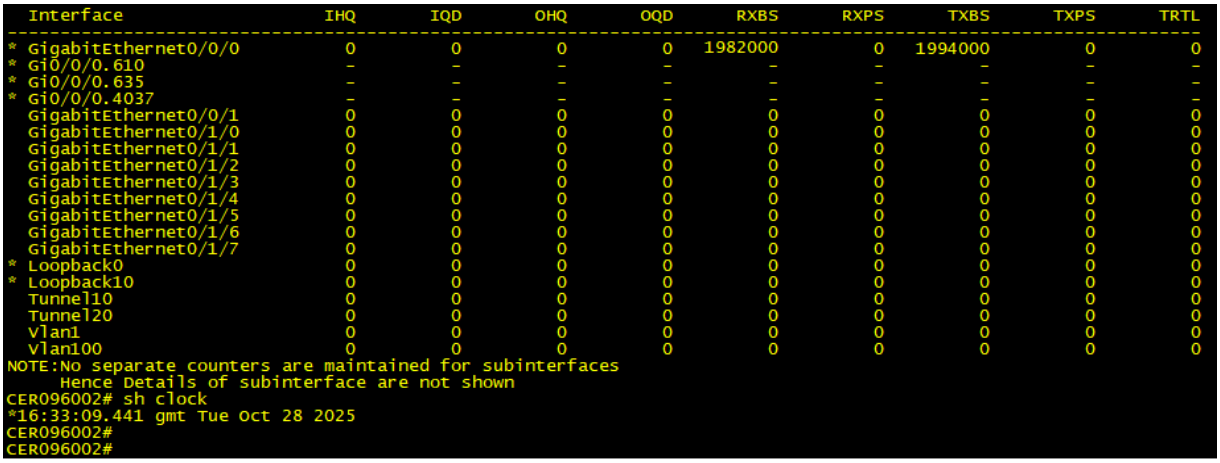

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0          0    1982000           0    1994000           0          0
* Gi0/0/0.610                  -          -          -          -          -           -          -           -          -
* Gi0/0/0.635                  -          -          -          -          -           -          -           -          -
* Gi0/0/0.4037                 -          -          -          -          -           -          -           -          -
  GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0           0          0           0          0
  Tunnel10                     0          0          0          0          0           0          0           0          0
  Tunnel20                     0          0          0          0          0           0          0           0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0           0          0           0          0
  Vlan100                      0          0          0          0          0           0          0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER096002# sh clock
*16:33:09.441 gmt Tue Oct 28 2025
CER096002#
CER096002#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3105	3	Chocó, Lloró; Barrio Las Carrerauces, Palacio de Justicia	2 Mbps	1,87

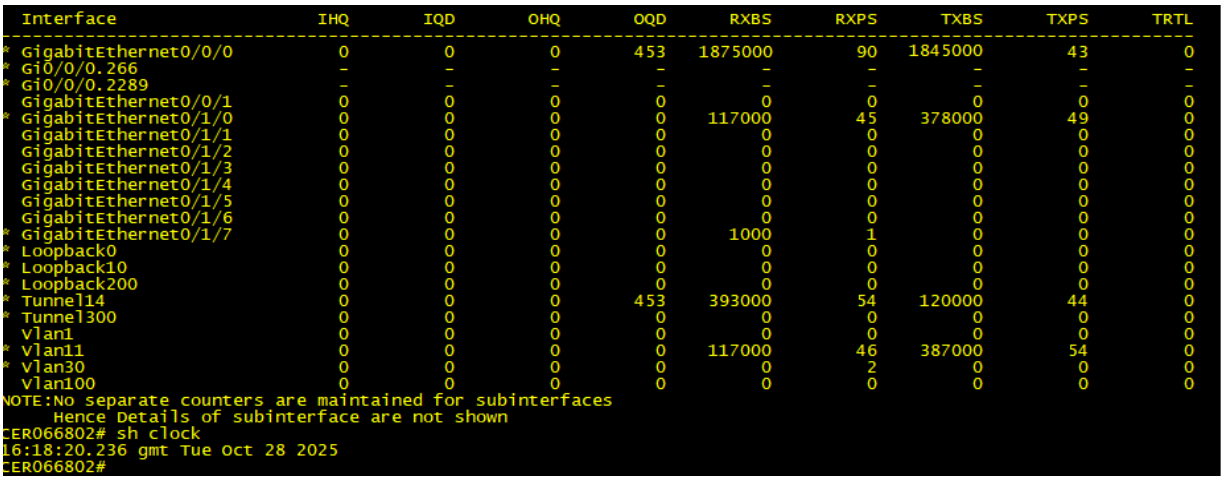


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           453         1875000     90          1845000     43          0
* Gi0/0/0.266                 -           -           -           -           -           -           -           -           -
* Gi0/0/0.2289                -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0           117000      45          378000      49          0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0           0           0           1000        1           0           0           0
* Loopback0                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200                 0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel14                    0           0           0           453         393000      54          120000      44          0
* Tunnel300                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                      0           0           0           0           117000      46          387000      54          0
* Vlan30                      0           0           0           0           0           2           0           0           0
  Vlan100                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER066802# sh clock
16:18:20.236 gmt Tue Oct 28 2025
CER066802#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3107	3	Chocó, Novita; Calle Central, Palacio de Justicia	2 Mbps	1,93


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      28612    1930000        158    1891000        112          0
* Gi0/0/0.267                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2292                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     225000         43     261000         45          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      0          0          0      28578     248000         46     204000         40          0
  Tunnel17                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel24                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel27                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     202000         40     242000         46          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          1          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062032# sh clock
16:25:27.660 gmt Tue Oct 28 2025
CER062032#
CER062032#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3109	3	Chocó, Rio Iro; Barrio la Candelaria, Calle 20 de Julio, Palacio de Justicia	2 Mbps	1,89

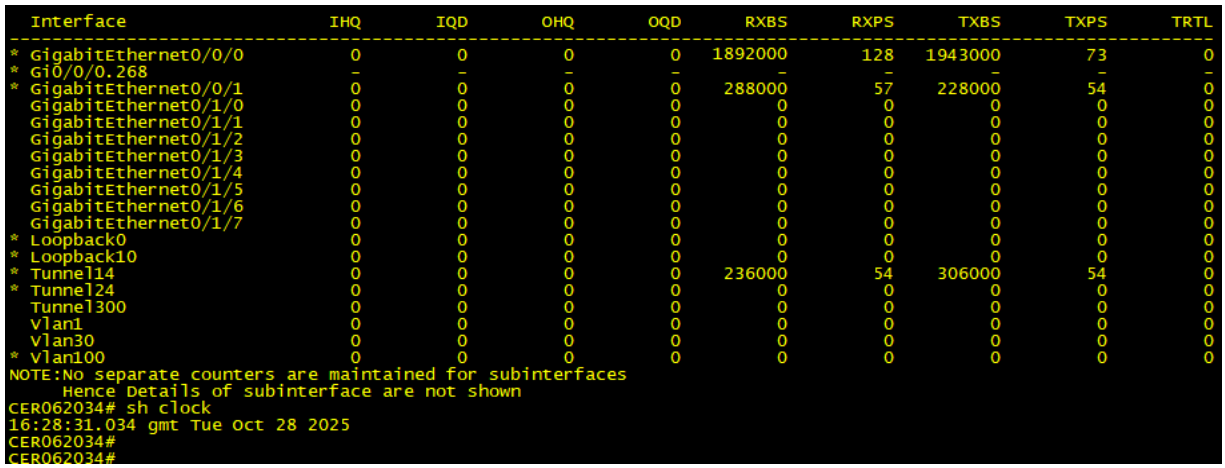

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0    1892000        128    1943000         73         0
* Gi0/0/0.268                   -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     288000         57     228000         54         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel14                      0          0          0          0     236000         54     306000         54         0
* Tunnel24                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan30                        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062034# sh clock
16:28:31.034 gmt Tue Oct 28 2025
CER062034#
CER062034#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3160	2	Cundinamarca, Fusagasugá; Calle 7 # 7-60	2 Mbps	1,87

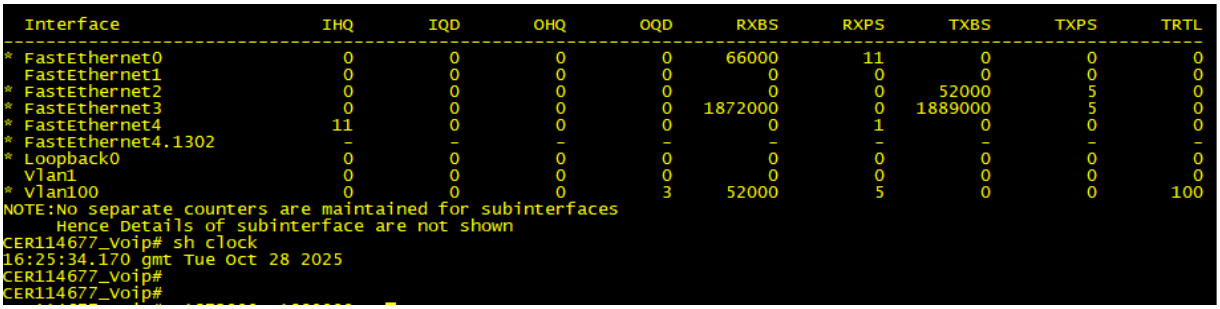


```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0               0         0         0         0         66000      11         0          0         0
  FastEthernet1               0         0         0         0         0          0          0          0         0
* FastEthernet2               0         0         0         0         0          0          52000      5         0
* FastEthernet3               0         0         0         0         1872000    0          1889000    5         0
* FastEthernet4               11        0         0         0         0          1          0          0         0
* FastEthernet4.1302          -         -         -         -         -          -          -          -         -
* Loopback0                   0         0         0         0         0          0          0          0         0
  Vlan1                       0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Vlan100                     0         0         0         3         52000      5          0          0         100
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER114677_Voip# sh clock
16:25:34.170 gmt Tue Oct 28 2025
CER114677_Voip#
CER114677_Voip#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3500	2	Cundinamarca, Sibaté; Carrera 7 # 8-66 barrio Centro - Pasaje Comercial Aluha	2 Mbps	1,89


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      20513    1891000          0    1923000          4          0
* Gi0/0/0.600                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.604                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0    1083000        226    2330000        323          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0    1179000        178     505000        127          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback15                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      0          0          0          0    2394000        327    1107000        214          0
* Tunnel26                      0          0          0      16569          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan996                       0          0          0          0    1059000        170     496000        126          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER130799# sh clock
16:25:36.570 gmt Tue Oct 28 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3501	1	Cundinamarca, Funza; Calle 15 # 14-19 piso 3 y 4, barrio Centro	2 Mbps	6,5

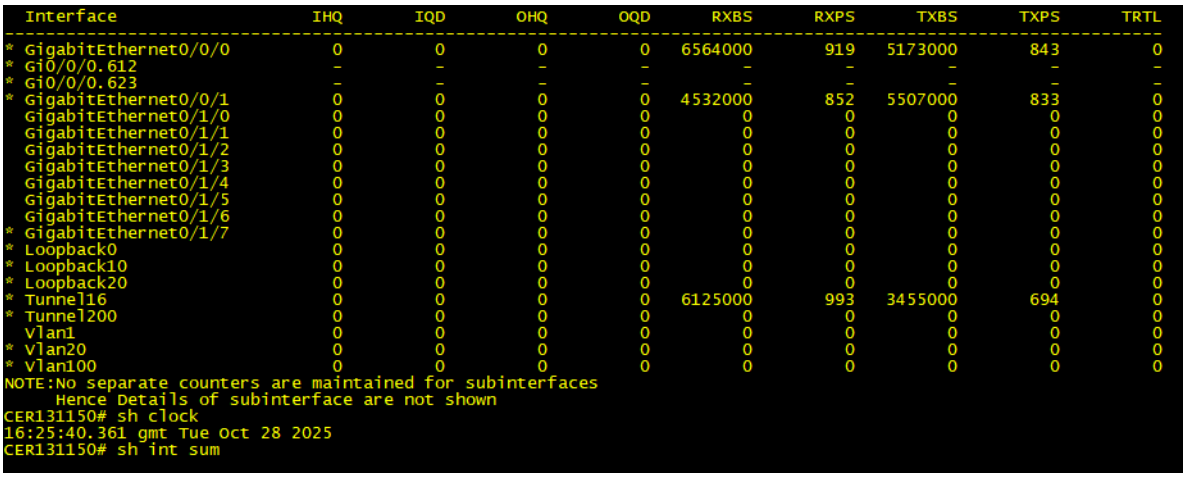


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0       6564000        919    5173000        843         0
* Gi0/0/0.612                 -          -          -          -             -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.623                 -          -          -          -             -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0       4532000        852    5507000        833         0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0             0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0             0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0             0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0             0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0          0          0             0          0          0          0         0
* Loopback20                  0          0          0          0             0          0          0          0         0
* Tunnel16                    0          0          0          0       6125000        993    3455000        694         0
* Tunnel200                   0          0          0          0             0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0             0          0          0          0         0
* Vlan20                      0          0          0          0             0          0          0          0         0
* Vlan100                     0          0          0          0             0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER131150# sh clock
16:25:40.361 gmt Tue Oct 28 2025
CER131150# sh int sum
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3502	2	Cundinamarca, Fusagasugá; Calle 11 No 8-34	2 Mbps	3,8

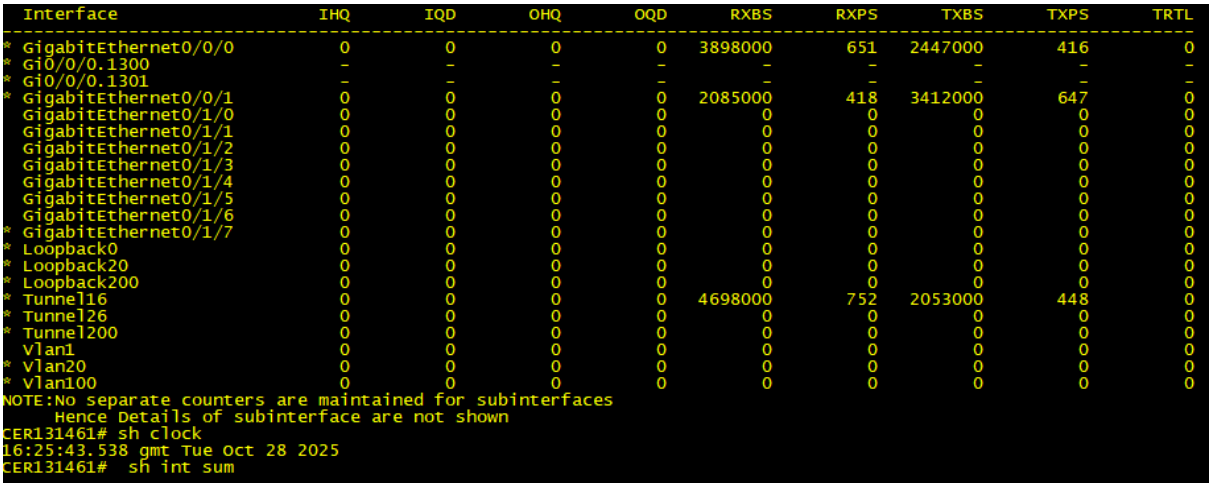


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0          0          0          0         3898000     651        2447000     416        0
* GiO/0/0.1300             -          -          -          -         -           -          -           -          -
* GiO/0/0.1301             -          -          -          -         -           -          -           -          -
* GigabitEthernet0/0/1     0          0          0          0         2085000     418        3412000     647        0
  GigabitEthernet0/1/0     0          0          0          0         0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1     0          0          0          0         0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2     0          0          0          0         0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/3     0          0          0          0         0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/4     0          0          0          0         0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5     0          0          0          0         0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6     0          0          0          0         0           0          0           0          0
* GigabitEthernet0/1/7     0          0          0          0         0           0          0           0          0
* Loopback0                0          0          0          0         0           0          0           0          0
* Loopback20               0          0          0          0         0           0          0           0          0
* Loopback200              0          0          0          0         0           0          0           0          0
* Tunnel16                 0          0          0          0         4698000     752        2053000     448        0
* Tunnel26                 0          0          0          0         0           0          0           0          0
* Tunnel200                0          0          0          0         0           0          0           0          0
  Vlan1                    0          0          0          0         0           0          0           0          0
* Vlan20                   0          0          0          0         0           0          0           0          0
* Vlan100                  0          0          0          0         0           0          0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER131461# sh clock
16:25:43.538 gmt Tue Oct 28 2025
CER131461#  sh int sum
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3513	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 18 # 32-90 Bodega DELCOP	2 Mbps	9,7

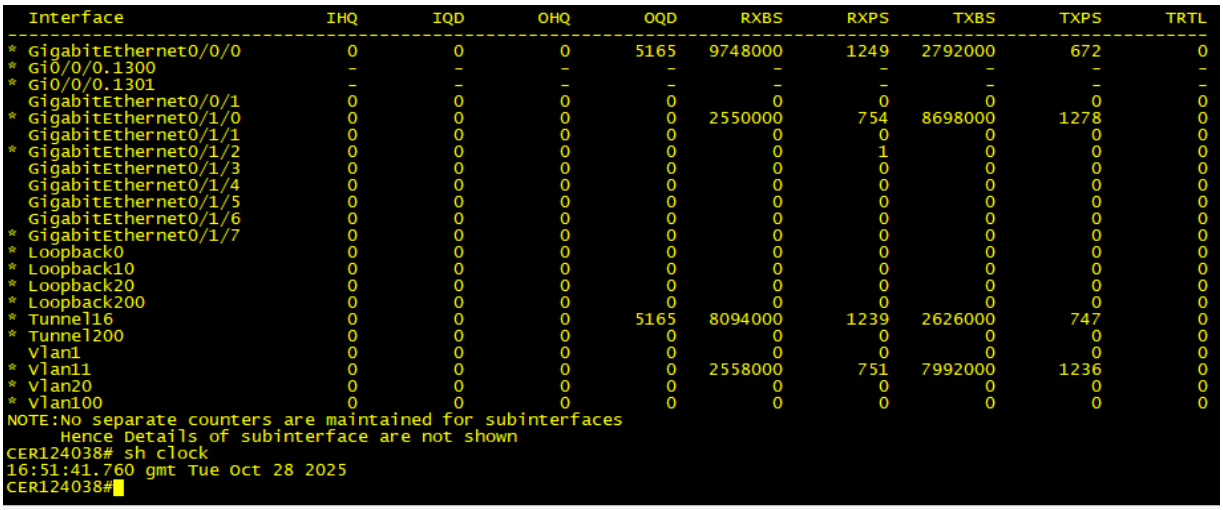


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          5165      9748000    1249       2792000    672       0
* Gi0/0/0.1300                -          -          -          -         -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.1301                -          -          -          -         -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         2550000    754        8698000    1278      0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         0          1          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback20                  0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback200                 0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Tunnel16                    0          0          0          5165      8094000    1239       2626000    747       0
* Tunnel200                   0          0          0          0         0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Vlan11                      0          0          0          0         2558000    751        7992000    1236      0
* Vlan20                      0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Vlan100                     0          0          0          0         0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER124038# sh clock
16:51:41.760 gmt Tue Oct 28 2025
CER124038#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3517	3	Cundinamarca, Cáqueza; Calle 2 # 3-20	2 Mbps	1,89

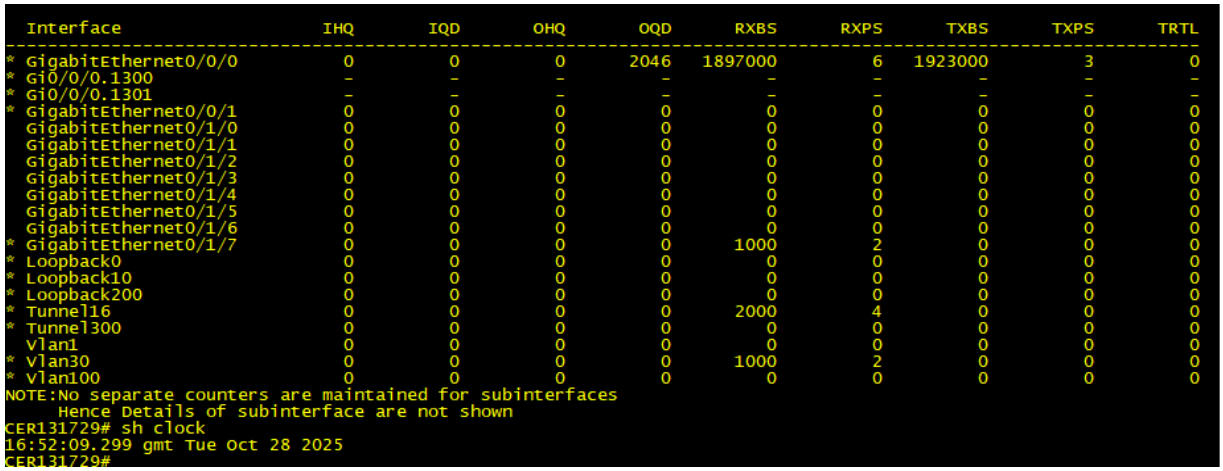


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0       2046    1897000          6    1923000          3          0
* Gi0/0/0.1300                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1301                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                    0          0          0          0       2000          4          0          0          0
* Tunnel300                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                      0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Vlan100                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER131729# sh clock
16:52:09.299 gmt Tue Oct 28 2025
CER131729#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3582	1	Cundinamarca, Bogotá; Carrera 8 # 11-73	2 Mbps	1,88

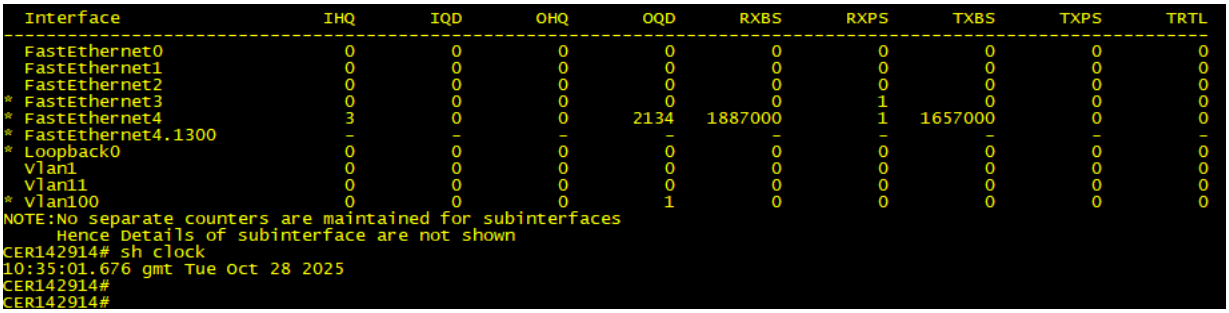

```
  Interface                  IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    FastEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0          0
    FastEthernet1              0          0          0          0           0           0           0           0          0
    FastEthernet2              0          0          0          0           0           0           0           0          0
*   FastEthernet3              0          0          0          0           0           1           0           0          0
*   FastEthernet4              3          0          0       2134     1887000           1     1657000           0          0
*   FastEthernet4.1300         -          -          -          -           -           -           -           -          -
*   Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0          0
    Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0          0
    Vlan11                     0          0          0          0           0           0           0           0          0
*   Vlan100                    0          0          0          1           0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER142914# sh clock
10:35:01.676 gmt Tue Oct 28 2025
CER142914#
CER142914#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3508	1	Cundinamarca, Madrid; Carrera 5 # 5 - 21 piso 2	2 Mbps	1,98

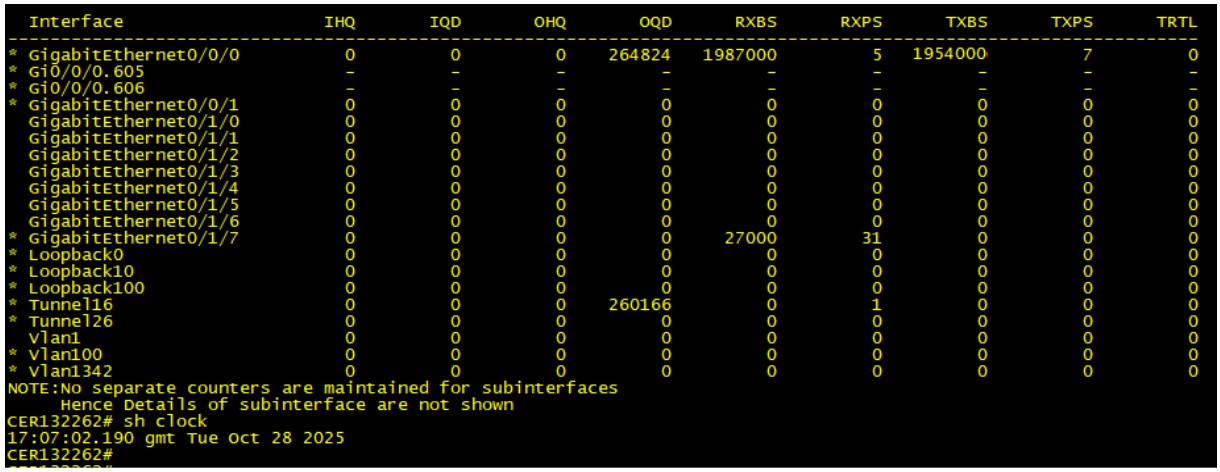

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     264824    1987000          5    1954000          7         0
* Gi0/0/0.605                   -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.606                   -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0      27000         31          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback100                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                      0          0          0     260166          0          1          0          0         0
* Tunnel26                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan1342                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER132262# sh clock
17:07:02.190 gmt Tue Oct 28 2025
CER132262#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3256	4	Chocó, Medio Baudó; Calle Principal	1 Mbps	0,9

```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0         0         0       320     998000         47     876000          5         0
* Gi0/0/0.270                -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.2290               -         -         -         -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1       0         0         0         0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0       3000          4          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6       0         0         0         0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7       0         0         0         0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback10                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback200                0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel14                   0         0         0       320       1000          1          0          0         0
* Tunnel24                   0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel300                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan11                     0         0         0         0       4000          5       1000          1         0
* Vlan30                     0         0         0         0       1000          2          0          0         0
* Vlan100                    0         0         0         0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062031# sh clock
17:13:03.122 gmt Tue Oct 28 2025
CER062031#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3258	4	Chocó, Bajo Baudó; Parque Principal	1 Mbps	0,97

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0     974000          3     912000          2          0
* Gi0/0/0.606                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.633                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0       3000          3          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0       1000          1          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0            0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel10                    0          0          0          0          0          0       1000          1          0
* Tunnel20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel301                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                      0          0          0          0       1000          1          0          0          0
  Vlan100                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER095994# sh clock
17:18:37.570 gmt Tue Oct 28 2025
CER095994#
CER095994#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3265	4	Chocó, Litoral de San Juan; Calle Principal	1 Mbps	0,93

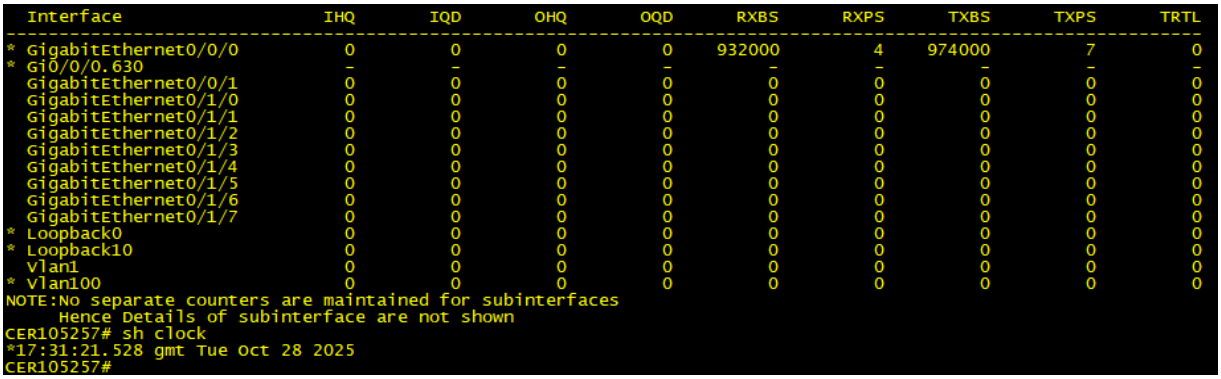


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0     932000           4     974000           7          0
* Gi0/0/0.630                -          -          -          -          -           -          -           -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0           0          0           0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0           0          0           0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0           0          0           0          0
* Vlan100                    0          0          0          0          0           0          0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER105257# sh clock
*17:31:21.528 gmt Tue Oct 28 2025
CER105257#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3558	4	Chocó, Alto Baudó; Pie de Pato, Calle Primera, Segundo Piso	1 Mbps	0,95


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0       1722     951000         12     870000          9          0
* Gi0/0/0.609                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.642                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0      99000         10      59000          4          0
  GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          1          0          0          0
  GigabitEthernet0             0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                     0          0          0       1720      72000         15     112000         14          0
* Tunnel24                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel301                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                       0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Vlan100                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER096000# sh clock
17:23:44.478 gmt Tue Oct 28 2025
CER096000#
CER096000#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3562	1	Cundinamarca, Funza; Carrera 14 # 12-54	1 Mbps	1,5

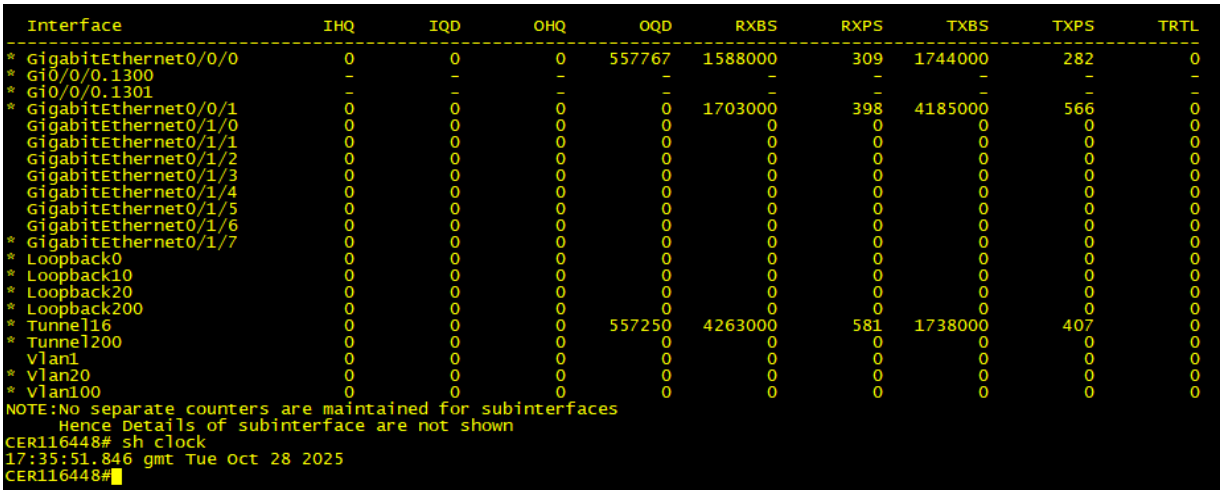

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0     557767    1588000        309    1744000        282          0
* Gi0/0/0.1300               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1301               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0    1703000        398    4185000        566          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                   0          0          0     557250    4263000        581    1738000        407          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER116448# sh clock
17:35:51.846 gmt Tue Oct 28 2025
CER116448#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3564	2	Chocó, Quibdó; Carrera 6 # 32-109 piso 2 barrio Huapango	1 Mbps	8,8

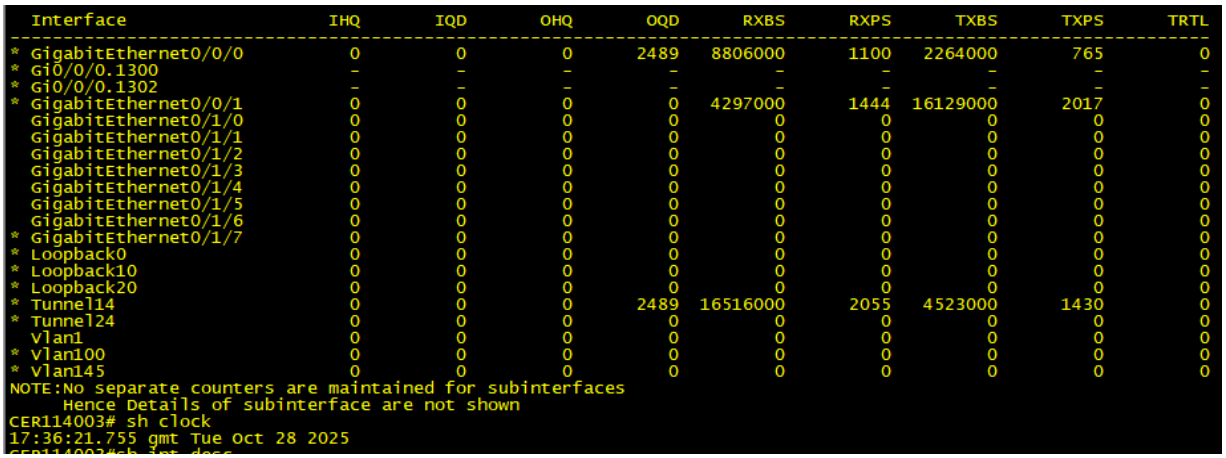


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0       2489    8806000       1100    2264000        765         0
* Gi0/0/0.1300                -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.1302                -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0    4297000       1444   16129000       2017         0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback20                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel14                    0          0          0       2489   16516000       2055    4523000       1430         0
* Tunnel24                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan100                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan145                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER114003# sh clock
17:36:21.755 gmt Tue Oct 28 2025
CER114003#sh int desc
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3565	2	Chocó, Quibdó; Cra 2 # 24-05 segundo piso	1 Mbps	0,98


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0    1270199     998000         36     876000         41         0
* Gi0/0/0.574                -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.663                -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0     339000        485    5693000        574         0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel14                   0          0          0    1259763    5935000        597     387000        494         0
* Tunnel24                   0          0          0       8037          0          0          0          0         0
* Tunnel301                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan30                     0          0          0          0       1000          2          0          0         0
* Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER122506# sh clock
17:37:49.181 gmt Tue Oct 28 2025
CER122506#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3031	1	Cundinamarca, Cota; Carrera 5 # 1-97 Centro Comercial Cedro Mall	0,512 Mbps	0,489

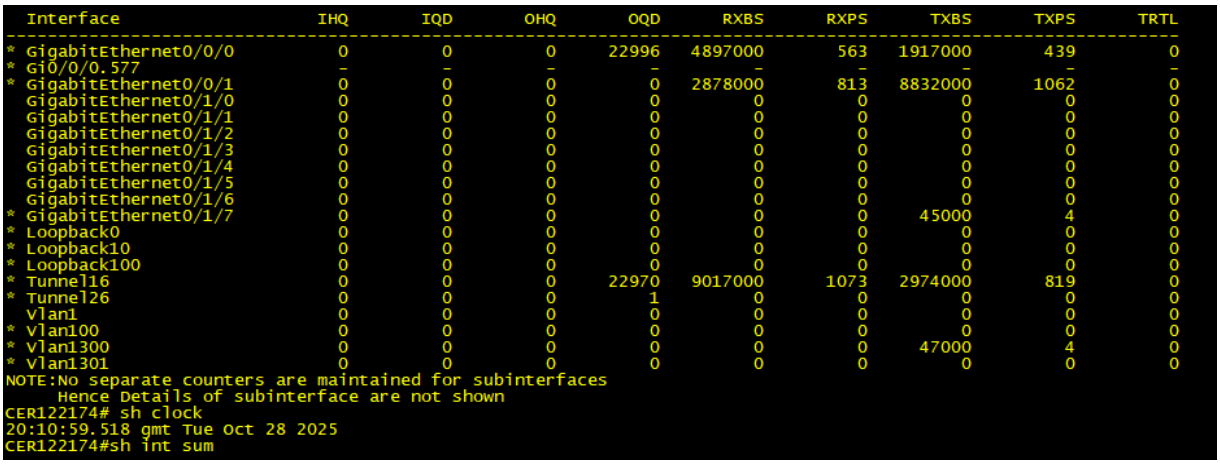

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          22996      4897000     563         1917000     439        0
* GI0/0/0.577                 -          -          -          -          -           -           -           -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          2878000     813         8832000     1062       0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0           0           0           0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0           0           45000       4          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0           0           0           0          0
* Loopback10                  0          0          0          0          0           0           0           0          0
* Loopback100                 0          0          0          0          0           0           0           0          0
* Tunnel16                    0          0          0          22970      9017000     1073        2974000     819        0
* Tunnel26                    0          0          0          1          0           0           0           0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0           0           0           0          0
* Vlan100                     0          0          0          0          0           0           0           0          0
* Vlan1300                    0          0          0          0          0           0           47000       4          0
* Vlan1301                    0          0          0          0          0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER122174# sh clock
20:10:59.518 gmt Tue Oct 28 2025
CER122174#sh int sum
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3036	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Calle 6 # 17 -45/47 Barrio Algarra III	0,512 Mbps	1,984

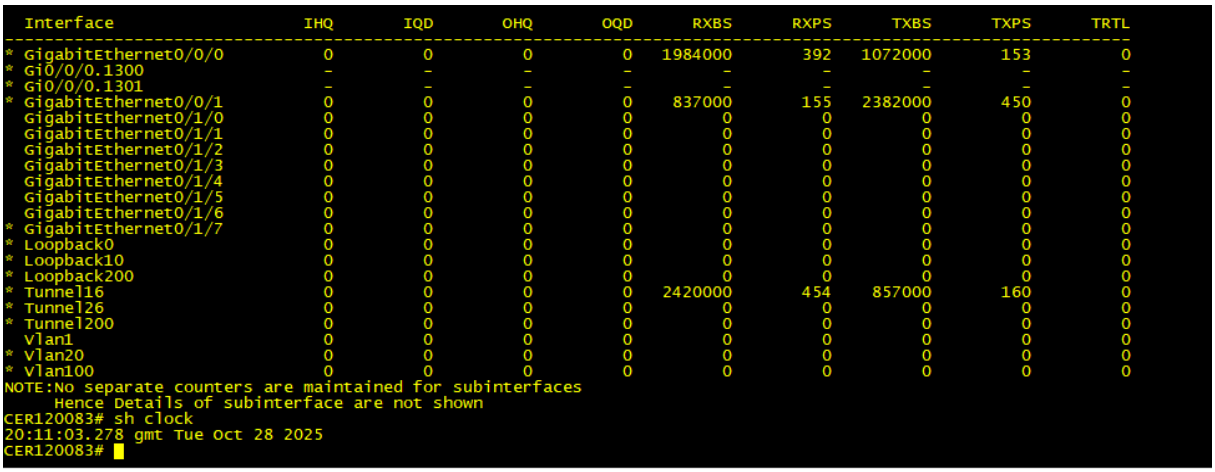


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0    1984000        392    1072000        153          0
* GiO/0/0.1300               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GiO/0/0.1301               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0     837000        155    2382000        450          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                   0          0          0          0    2420000        454     857000        160          0
* Tunnel26                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER120083# sh clock
20:11:03.278 gmt Tue Oct 28 2025
CER120083#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3110	4	CSJ - CUNDINAMARCA EL ROSAL JUZGADO PROMISCUO CLL 7	0,512 Mbps	0,529

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0          0     529000          4      12000          1          0
* Gi0/0/0.2520                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2555                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0     179000         83    1573000        183          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0    1730000        188     575000         71          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                     0          0          0          0    1567000        186     535000         82          0
* Tunnel21                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                       0          0          0          0     539000         93    1552000        186          0
  Vlan30                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1047                     0          0          0          0    1703000        193     584000         83          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER057617# sh clock
20:18:31.797 gmt Tue Oct 28 2025
CER057617#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3236	4	Cundinamarca, Utica; Carrera 17 # 6B-14	0,512 Mbps	0,779

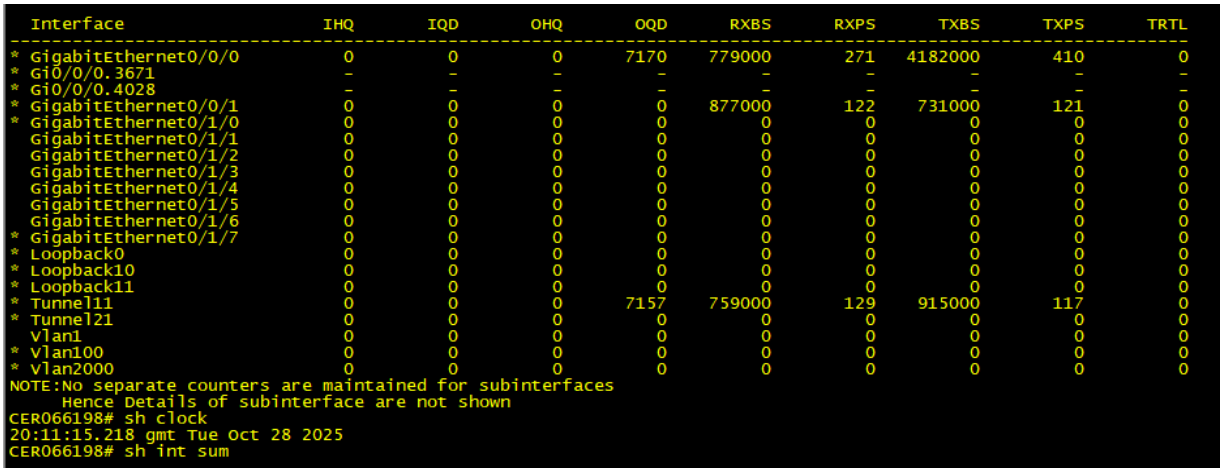


```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0         0         0         7170      779000     271        4182000    410       0
* Gi0/0/0.3671                -         -         -         -         -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.4028                -         -         -         -         -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0         0         0         0         877000     122        731000     121       0
* GigabitEthernet0/1/0        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0         0         0         0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Loopback0                   0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Loopback10                  0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Loopback11                  0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Tunnel11                    0         0         0         7157      759000     129        915000     117       0
* Tunnel21                    0         0         0         0         0          0          0          0         0
  Vlan1                       0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Vlan100                     0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Vlan2000                    0         0         0         0         0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER066198# sh clock
20:11:15.218 gmt Tue Oct 28 2025
CER066198# sh int sum
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3237	4	Cundinamarca, Venecia; Calle 2 No 3- 64/74 Segundo Piso	0,512 Mbps	1,97


```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0         0       8436    1970000        372    2082000        295         0
* Gi0/0/0.3770                -          -         -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.4071                -          -         -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0         0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0         0          0    1471000        271    1900000        404         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0         0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0         0          0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                   0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                 0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                    0          0         0       8422    1942000        403    1482000        269         0
  Tunnel100                   0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel300                   0          0         0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                      0          0         0          0    1455000        268    1909000        403         0
* Vlan30                      0          0         0          0       1000          2          0          0         0
  Vlan100                     0          0         0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067603# sh clock
20:11:18.213 gmt Tue Oct 28 2025
CER067603#  sh int sum
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3238	4	Cundinamarca, Vergara; Calle 4 # 5-52	0,512 Mbps	0,539

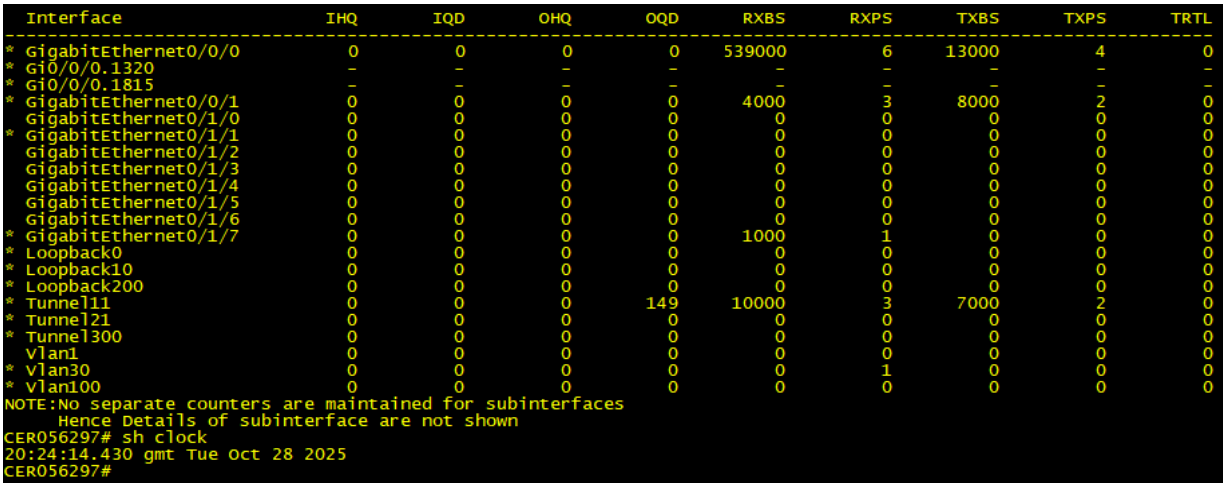


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0     539000          6      13000          4          0
* Gi0/0/0.1320               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1815               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0       4000          3       8000          2          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                   0          0          0        149      10000          3       7000          2          0
* Tunnel21                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                     0          0          0          0          0          1          0          0          0
* Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056297# sh clock
20:24:14.430 gmt Tue Oct 28 2025
CER056297#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3239	3	Cundinamarca, Vianí; Carrera 5 # 3-24 Piso 2	0,512 Mbps	0,554

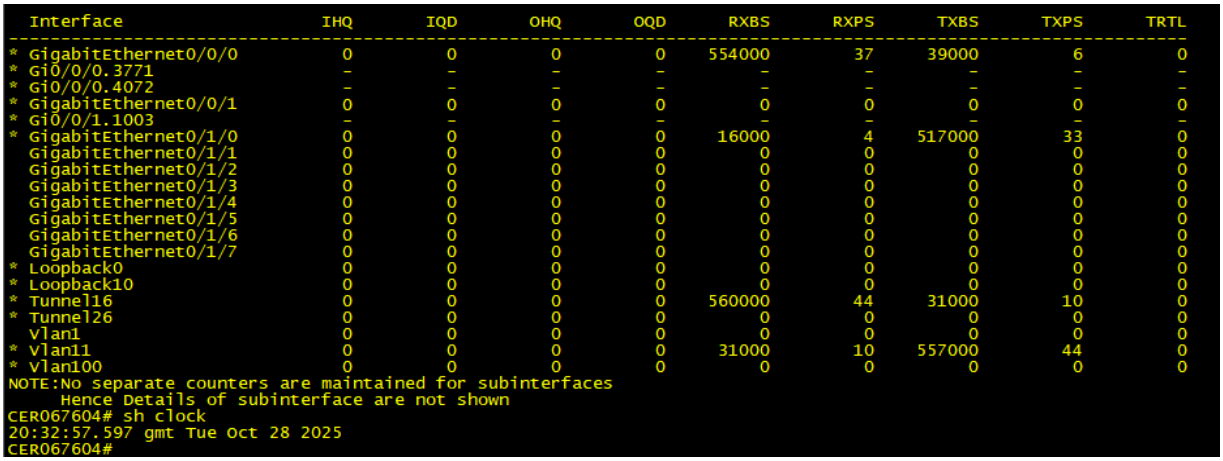

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0     554000         37      39000          6          0
* Gi0/0/0.3771                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4072                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/1.1003                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      16000          4     517000         33          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      0          0          0          0     560000         44      31000         10          0
* Tunnel26                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      31000         10     557000         44          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067604# sh clock
20:32:57.597 gmt Tue Oct 28 2025
CER067604#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3240	4	Cundinamarca, Villagomez; Carrera 3 # 4-22	0,512 Mbps	0,578

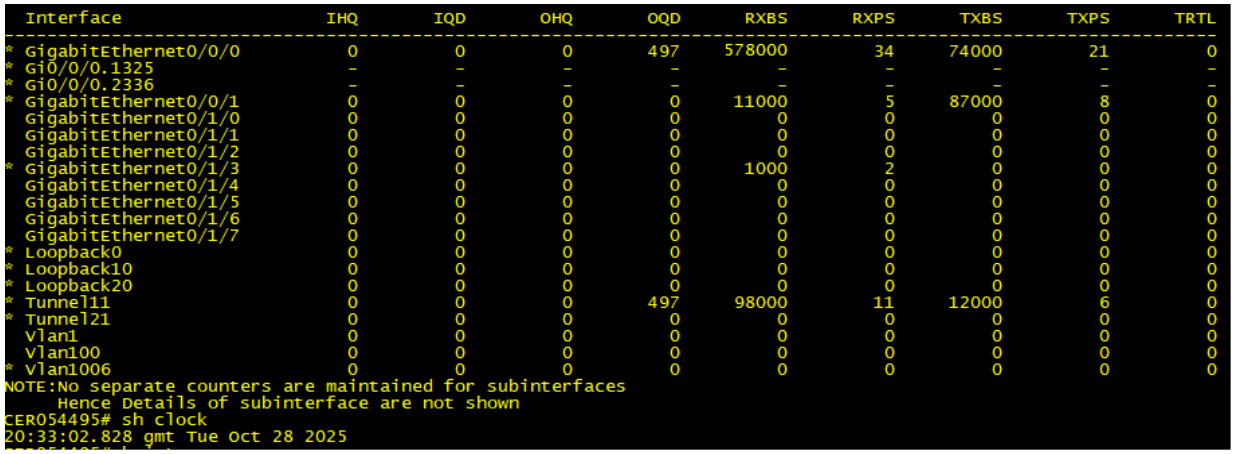

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0        497     578000         34      74000         21          0
* Gi0/0/0.1325                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2336                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      11000          5      87000          8          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0       1000          2          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      0          0          0        497      98000         11      12000          6          0
* Tunnel21                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1006                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054495# sh clock
20:33:02.828 gmt Tue Oct 28 2025
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3242	3	Cundinamarca, Villeta; Calle 6 # 8-90	0,512 Mbps	3,856

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0        1071    3856000        626    1535000        307          0
* Gi0/0/0.2187                  -           -           -           -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2270                  -           -           -           -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0          0          0     554000         47          0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0     439000        136    3154000        500          0
* GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0     724000        122     725000        102          0
* GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0          0          0      37000          4          0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0     373000         92    1579000        186          0
* Loopback0                     0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      0           0           0        1071    4412000        699    1008000        320          0
* Tunnel21                      0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Vlan1                         0           0           0           0    1555000        383    4356000        699          0
* Vlan100                       0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Vlan637                       0           0           0           0          0          0      34000          5          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062291# sh clock
20:31:43.404 gmt Tue Oct 28 2025
CER062291# sh int desc
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3243	3	Cundinamarca, Villeta; Carrera 8 N # 4-13, Edificio Verona	0,512 Mbps	0,601


```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0     94057    6018000        690    1485000        348         0
* Gi0/0/0.775                   -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.911                   -         -         -         -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0     760000        170    2578000        328         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0          0      26000          2         0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback20                    0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                      0         0         0     94015    2473000        315     775000        164         0
* Tunnel26                      0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan100                       0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan640                       0         0         0         0          0          0      25000          2         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER087837# sh clock
20:31:46.077 gmt Tue Oct 28 2025
CER087837#  sh int desc
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3244	4	Cundinamarca, Viota; Calle 19 # 11 – 25	0,512 Mbps	0,517

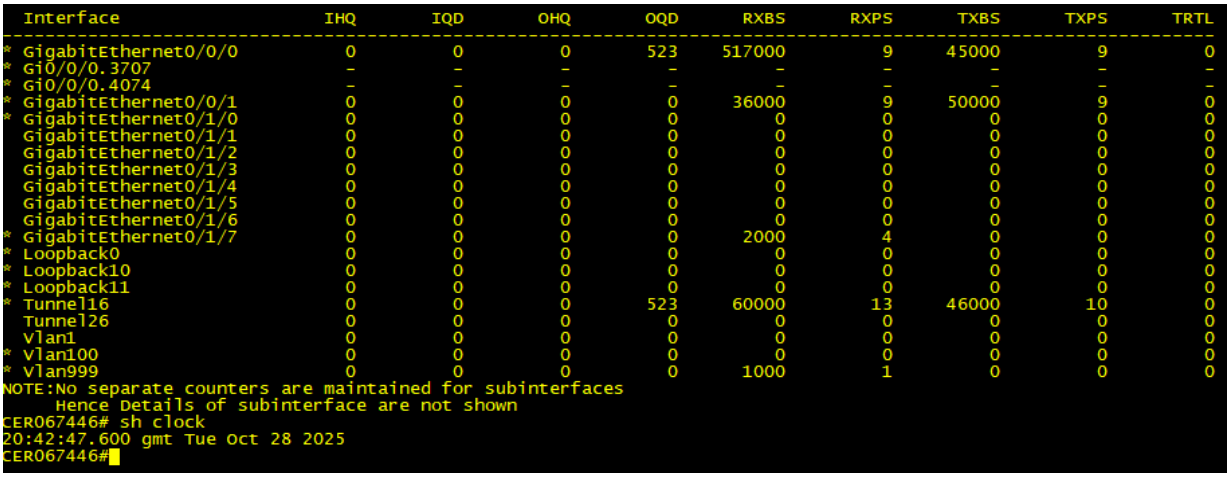


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0        523     517000          9      45000          9          0
* Gi0/0/0.3707               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4074               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0      36000          9      50000          9          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0       2000          4          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback11                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                   0          0          0        523      60000         13      46000         10          0
  Tunnel26                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan999                    0          0          0          0       1000          1          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067446# sh clock
20:42:47.600 gmt Tue Oct 28 2025
CER067446#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3245	4	Cundinamarca, Yacopi; Carrera 4 # 4-23	0,512 Mbps	0,557

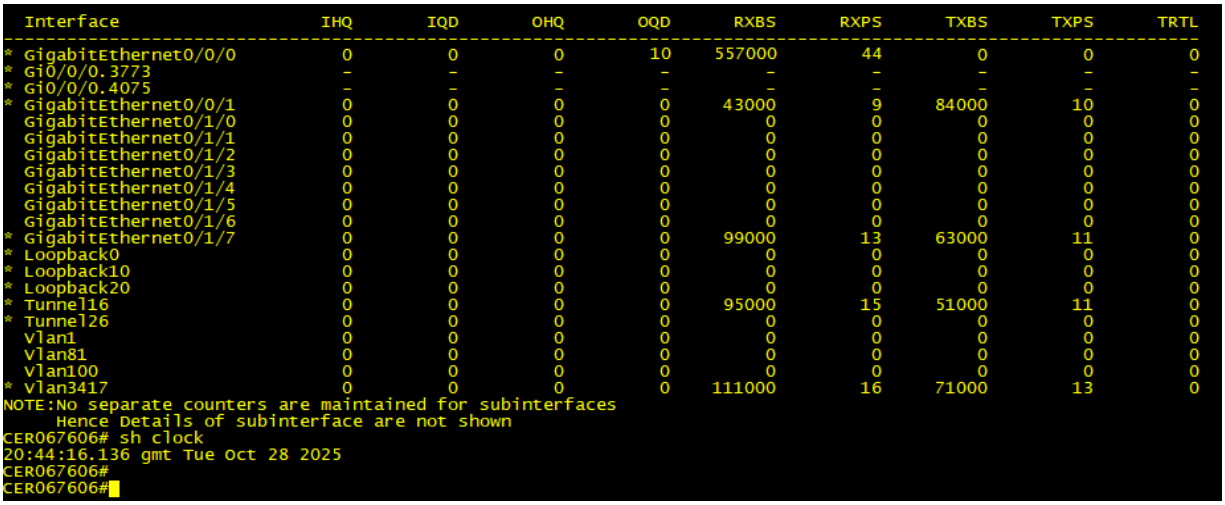


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0         10     557000         44          0          0          0
* Gi0/0/0.3773               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4075               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0      43000          9      84000         10          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0      99000         13      63000         11          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                   0          0          0          0      95000         15      51000         11          0
* Tunnel26                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan81                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan3417                   0          0          0          0     111000         16      71000         13          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067606# sh clock
20:44:16.136 gmt Tue Oct 28 2025
CER067606#
CER067606#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3246	4	Cundinamarca, Zipacón; Calle 6 # 4-44	0,512 Mbps	0,523

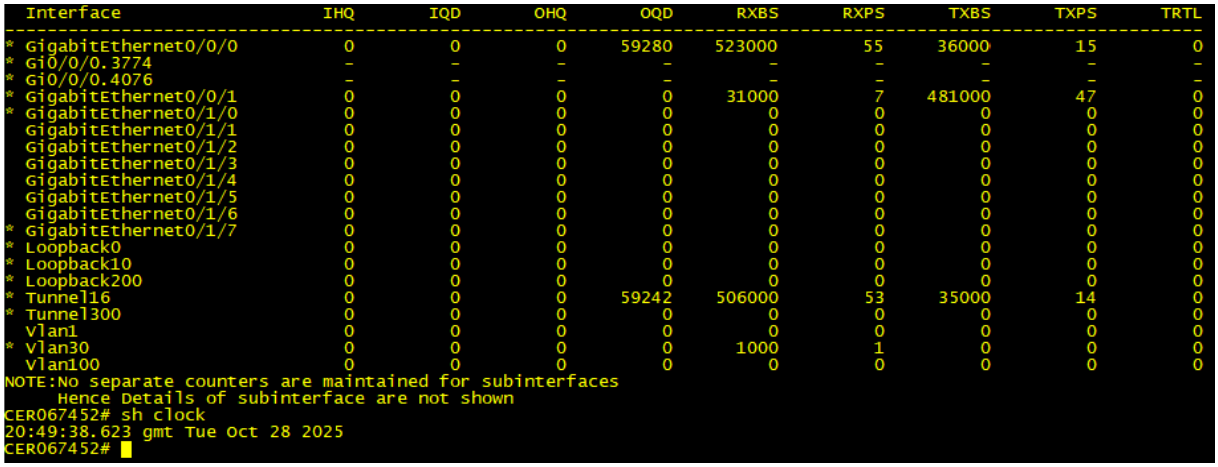


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0          0          0          59280      523000     55         36000      15         0
* Gi0/0/0.3774             -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4076             -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1     0          0          0          0          31000      7          481000     47         0
* GigabitEthernet0/1/0     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10               0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                 0          0          0          59242      506000     53         35000      14         0
* Tunnel300                0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                   0          0          0          0          1000       1          0          0          0
  Vlan100                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067452# sh clock
20:49:38.623 gmt Tue Oct 28 2025
CER067452#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3247	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Calle 10 # 3-38	0,512 Mbps	1,034

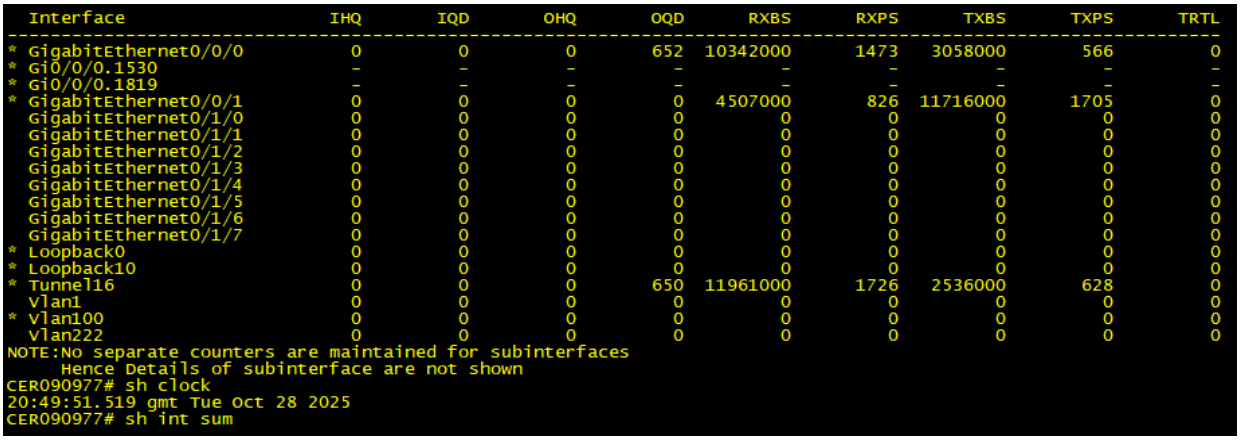


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0        652   10342000       1473    3058000        566          0
* Gi0/0/0.1530                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1819                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0    4507000        826   11716000       1705          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      0          0          0        650   11961000       1726    2536000        628          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan222                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER090977# sh clock
20:49:51.519 gmt Tue Oct 28 2025
CER090977# sh int sum
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3248	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Calle 4C # 19-13	0,512 Mbps	0,735

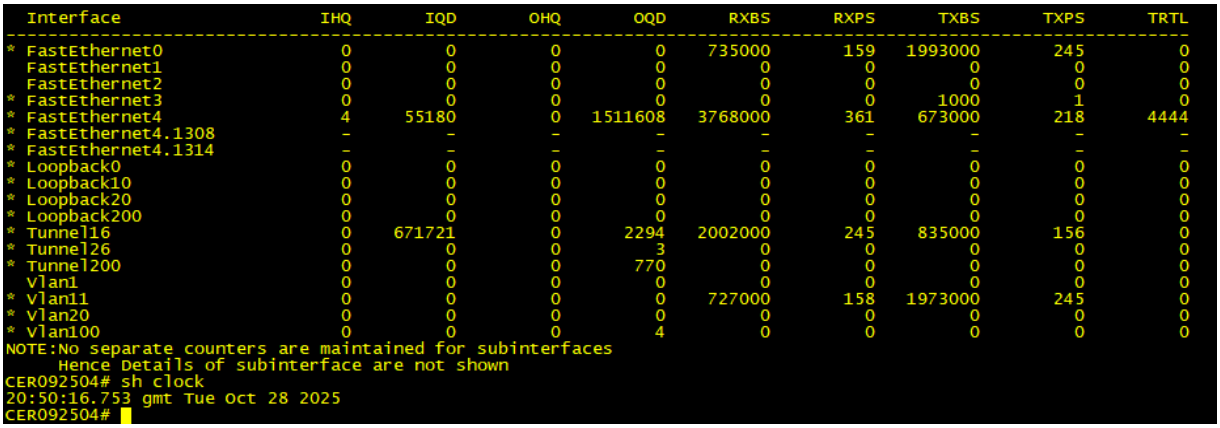

```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS     RXPS     TXBS     TXPS     TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0         0         0         0         735000   159      1993000  245      0
  FastEthernet1            0         0         0         0         0        0        0        0        0
  FastEthernet2            0         0         0         0         0        0        0        0        0
* FastEthernet3            0         0         0         0         0        0        1000     1        0
* FastEthernet4            4         55180     0         1511608   3768000  361      673000   218      4444
* FastEthernet4.1308       -         -         -         -         -        -        -        -        -
* FastEthernet4.1314       -         -         -         -         -        -        -        -        -
* Loopback0                0         0         0         0         0        0        0        0        0
* Loopback10               0         0         0         0         0        0        0        0        0
* Loopback20               0         0         0         0         0        0        0        0        0
* Loopback200              0         0         0         0         0        0        0        0        0
* Tunnel16                 0         671721    0         2294      2002000  245      835000   156      0
* Tunnel26                 0         0         0         3         0        0        0        0        0
* Tunnel200                0         0         0         770       0        0        0        0        0
  Vlan1                    0         0         0         0         0        0        0        0        0
* Vlan11                   0         0         0         0         727000   158      1973000  245      0
* Vlan20                   0         0         0         0         0        0        0        0        0
* Vlan100                  0         0         0         4         0        0        0        0        0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER092504# sh clock
20:50:16.753 gmt Tue Oct 28 2025
CER092504#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3250	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Calle 6 # 17-60	0,512 Mbps	0,721

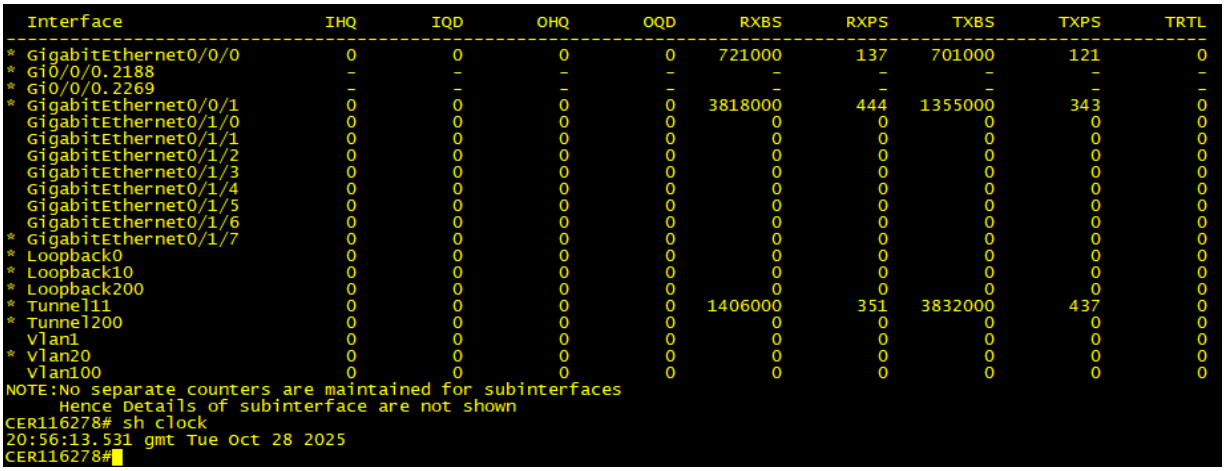


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0     721000        137     701000        121          0
* Gi0/0/0.2188               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2269               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0    3818000        444    1355000        343          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                   0          0          0          0    1406000        351    3832000        437          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER116278# sh clock
20:56:13.531 gmt Tue Oct 28 2025
CER116278#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3251	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Calle Calle 17 # 4B-18	0,512 Mbps	0,58


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0      93459    5808000        700    2513000        392          0
* Gi0/0/0.1607                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1820                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0    1629000        329    5442000        653          0
  GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0      30000          3          0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback11                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                     0          0          0      93373    5407000        649    1650000        327          0
* Tunnel28                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan643                      0          0          0          0          0          0      30000          3          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER095236# sh clock
20:56:23.988 gmt Tue Oct 28 2025
CER095236#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3254	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Carrera 17 # 6B-14	0,512 Mbps	1,678

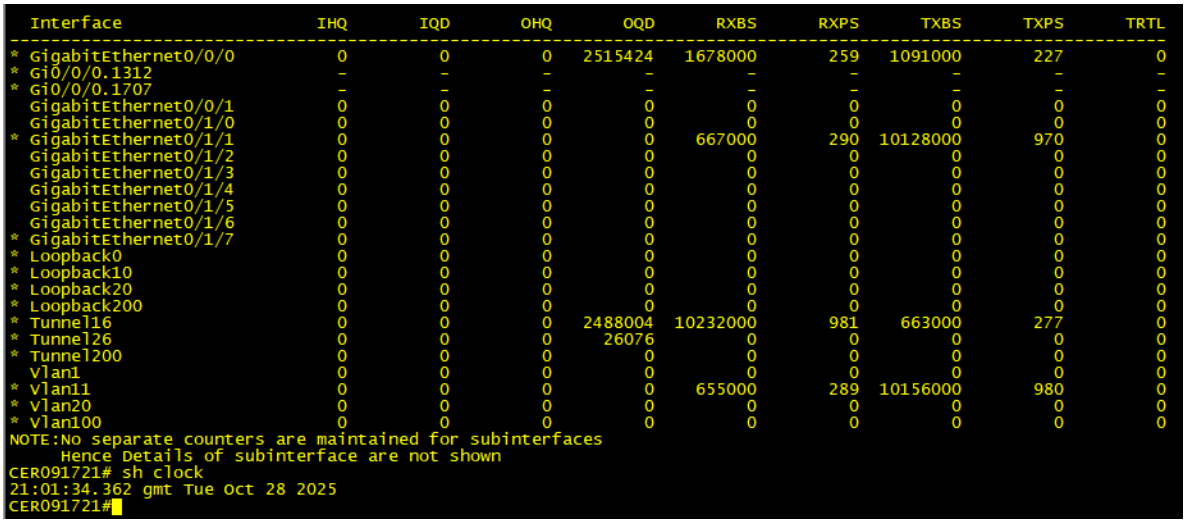

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0    2515424    1678000        259    1091000        227          0
* Gi0/0/0.1312                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1707                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0     667000        290   10128000        970          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      0          0          0    2488004   10232000        981     663000        277          0
* Tunnel26                      0          0          0      26076          0          0          0          0          0
* Tunnel200                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     655000        289   10156000        980          0
* Vlan20                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER091721# sh clock
21:01:34.362 gmt Tue Oct 28 2025
CER091721#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3275	1	Cundinamarca, Bogotá; Av. primero de Mayo (Calle 26 sur) #52 A 94	0,512 Mbps	0,474

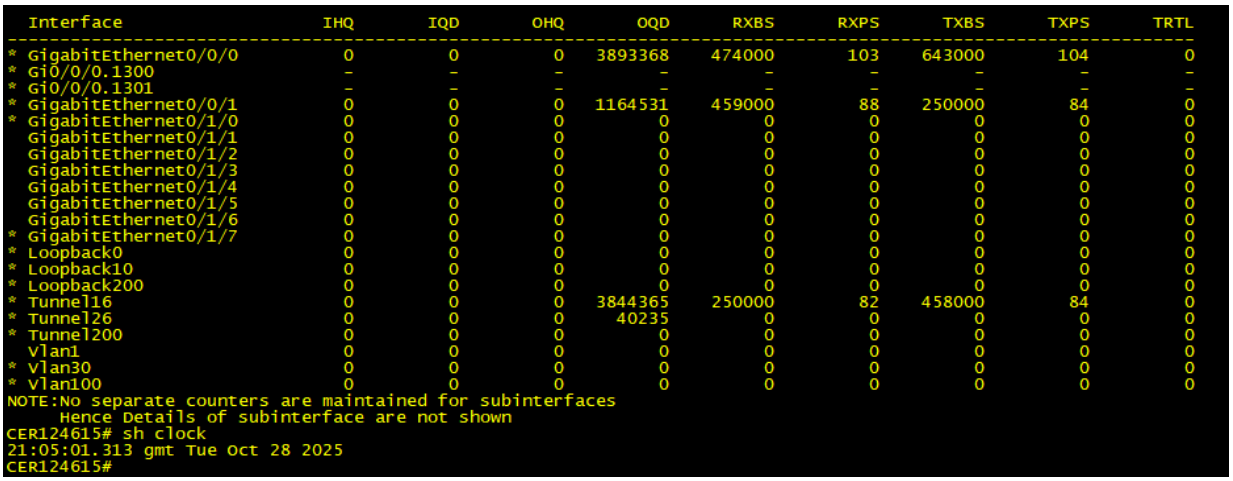


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0    3893368     474000        103     643000        104         0
* Gi0/0/0.1300               -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.1301               -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0    1164531     459000         88     250000         84         0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                   0          0          0    3844365     250000         82     458000         84         0
* Tunnel26                   0          0          0      40235          0          0          0          0         0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan30                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER124615# sh clock
21:05:01.313 gmt Tue Oct 28 2025
CER124615#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3283	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 68 #53-34/50, Casa de Justicia Barrios Unidos	0,512 Mbps	1,762


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0     252105    1762000        210     414000        104         0
* Gi0/0/0.1300                -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.1400                -          -          -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0     458000        119    2171000        261         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback20                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                    0          0          0       7418    2234000        274     488000        131         0
* Tunnel26                    0          0          0          3          0          0          0          0         0
* Tunnel200                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                      0          0          0          0     277000        102    1692000        217         0
* Vlan20                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan100                     0          0          0          0       1000          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER093749# sh clock
21:04:40.862 gmt Tue Oct 28 2025
CER093749#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3284	4	Cundinamarca, Pasca; CALLE 2 # 2-40 BARRIO ORIENTAL	0,512 Mbps	0,55

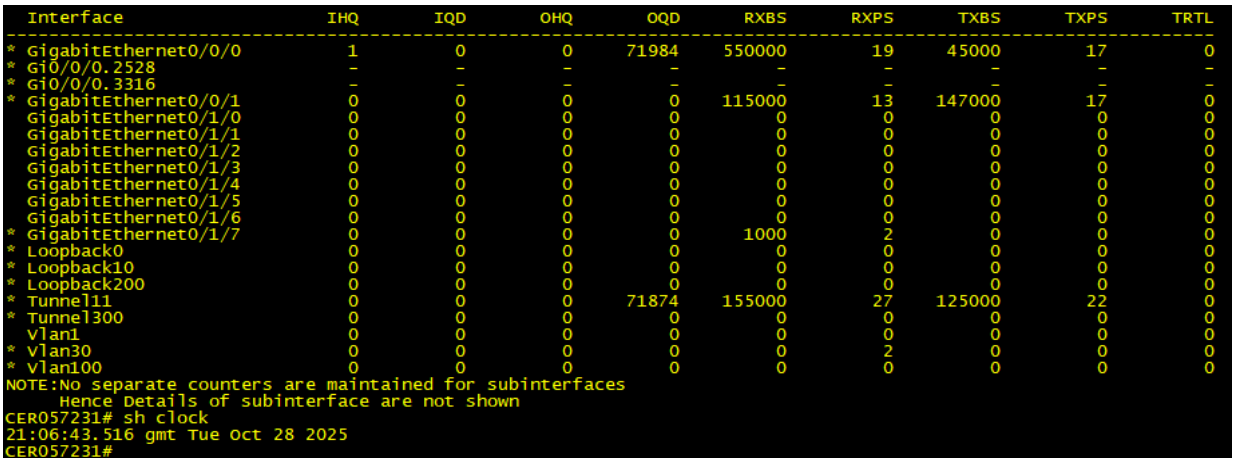


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          1          0          0      71984      550000          19       45000          17           0
* Gi0/0/0.2528                  -          -          -          -           -           -           -           -           -
* Gi0/0/0.3316                  -          -          -          -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      115000          13      147000          17           0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0        1000           2           0           0           0
* Loopback0                     0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback10                    0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel11                      0          0          0      71874      155000          27      125000          22           0
* Tunnel300                     0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan30                        0          0          0          0           0           2           0           0           0
* Vlan100                       0          0          0          0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO57231# sh clock
21:06:43.516 gmt Tue Oct 28 2025
CERO57231#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3285	4	Cundinamarca, Ubaque; Calle 2 # 3-67	0,512 Mbps	0,512

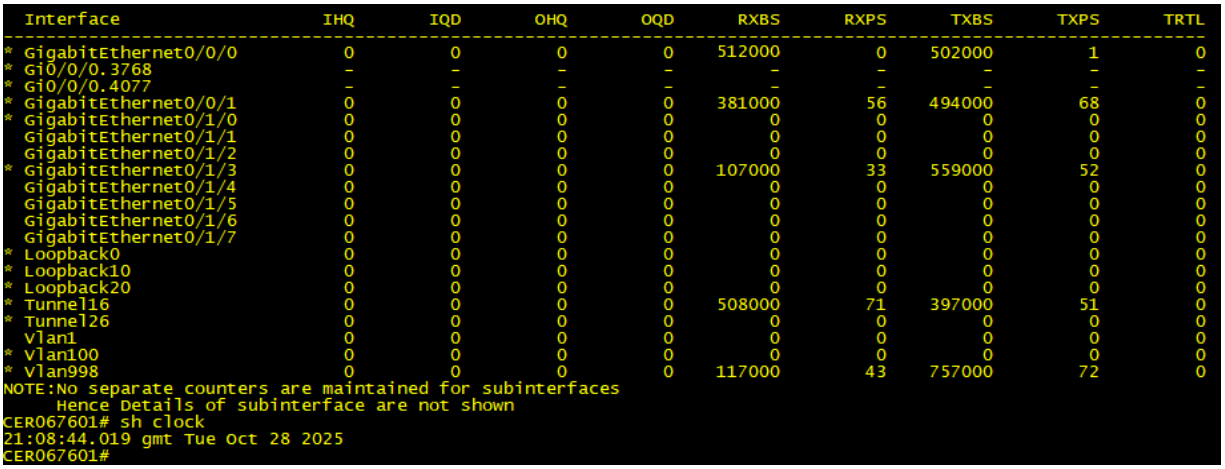

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0         512000      0          502000     1          0
* Gi0/0/0.3768                -          -          -          -         -           -          -          -          -
* Gi0/0/0.4077                -          -          -          -         -           -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         381000      56         494000     68         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         0           0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         107000      33         559000     52         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         0           0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0         0           0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0         0           0          0          0          0
* Loopback20                  0          0          0          0         0           0          0          0          0
* Tunnel16                    0          0          0          0         508000      71         397000     51         0
* Tunnel26                    0          0          0          0         0           0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0         0           0          0          0          0
* Vlan100                     0          0          0          0         0           0          0          0          0
* Vlan998                     0          0          0          0         117000      43         757000     72         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067601# sh clock
21:08:44.019 gmt Tue Oct 28 2025
CER067601#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3286	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 137 C sur # 13-33	0,512 Mbps	0,606

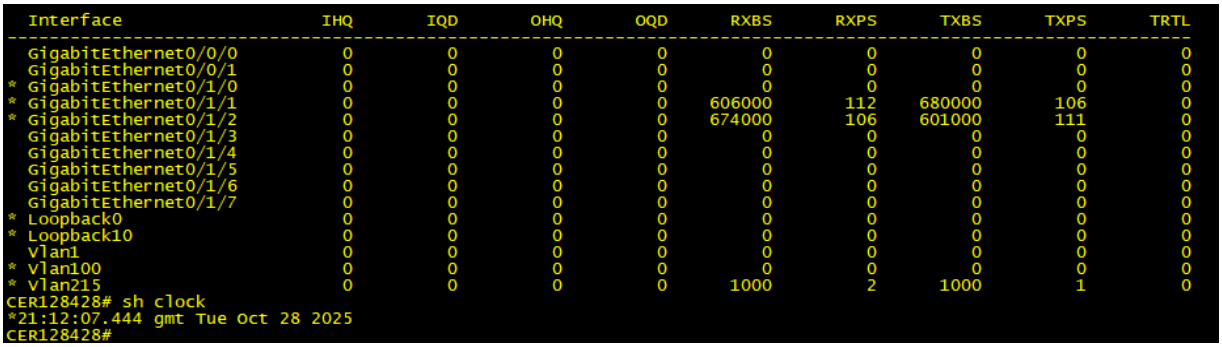


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0     606000        112     680000        106          0
* GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0     674000        106     601000        111          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan215                    0          0          0          0       1000          2       1000          1          0
CER128428# sh clock
*21:12:07.444 gmt Tue Oct 28 2025
CER128428#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3287	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Carrera 17 # 4A-25, Edificio Adrián	0,512 Mbps	0,512


```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0                 0         0         0         0     512000          0     498000          0         0
  FastEthernet1                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet2                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
  FastEthernet3                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
* FastEthernet4                10         0         0         0          0          0          0          0         0
* FastEthernet4.1302            -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan100                       0         0         0         2          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER113998_VOIP# sh clock
21:17:35.644 gmt Tue Oct 28 2025
CER113998_VOIP#sh int desc
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3288	1	Cundinamarca, Funza; Calle 15 # 11-15 Piso 2	0,512 Mbps	4,314

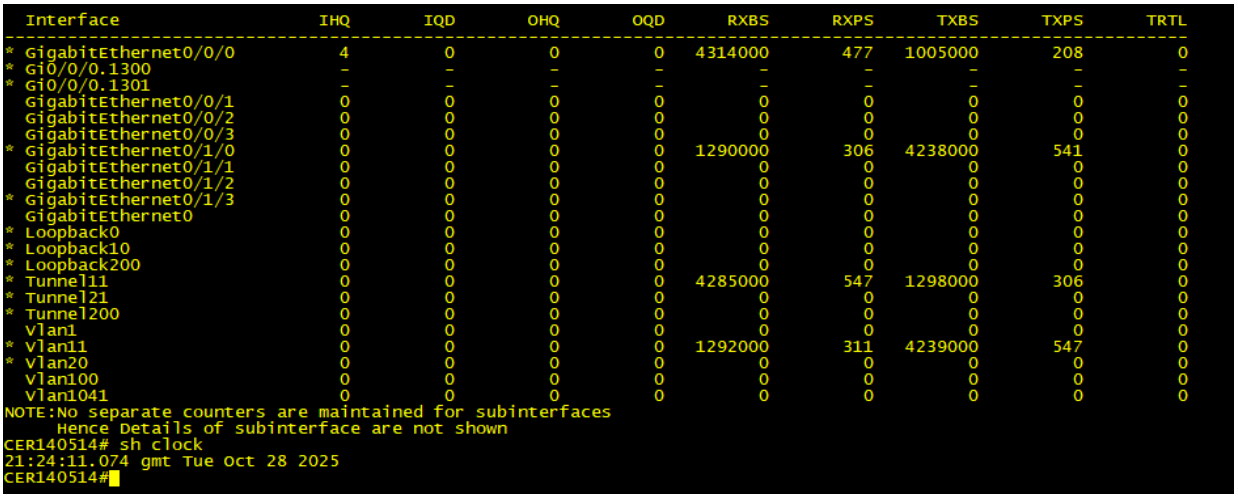


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          4          0          0          0    4314000        477    1005000        208          0
* Gi0/0/0.1300                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1301                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0    1290000        306    4238000        541          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      0          0          0          0    4285000        547    1298000        306          0
* Tunnel21                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel200                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0    1292000        311    4239000        547          0
* Vlan20                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1041                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER140514# sh clock
21:24:11.074 gmt Tue Oct 28 2025
CER140514#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3527	4	Amazonas, Puerto Nariño; Casa de Juzgado Parque Poincipal	0,512 Mbps	0,489




```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet1              0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet2              0          0          0          0           0           0           0           0          0
  FastEthernet3              0          0          0          0           0           0           0           0          0
* FastEthernet4              0          0          0          0      489000           1      497000           2          0
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0          0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0          0
CER144623# sh clock
*18:56:06.285 gmt Tue Oct 28 2025
CER144623#
CER144623#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3108	4	Chocó, Acandi; Parque Principal	2 Mbps	1,97

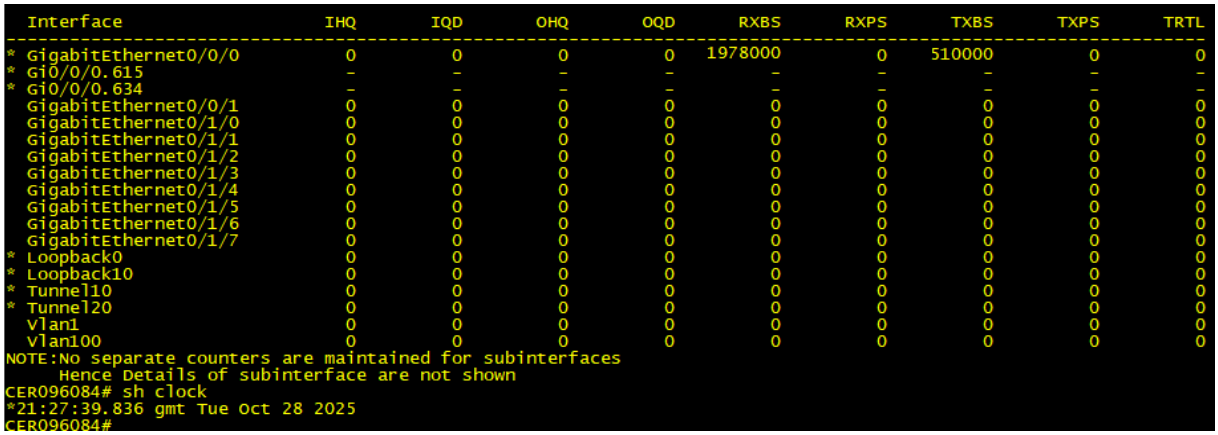


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0    1978000          0     510000          0          0
* Gi0/0/0.615                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.634                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel10                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel20                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER096084# sh clock
*21:27:39.836 gmt Tue Oct 28 2025
CER096084#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3103	3	Chocó, Condotó; Carrera 3 # 8-05, Palacio de Justicia	2 Mbps	1,97

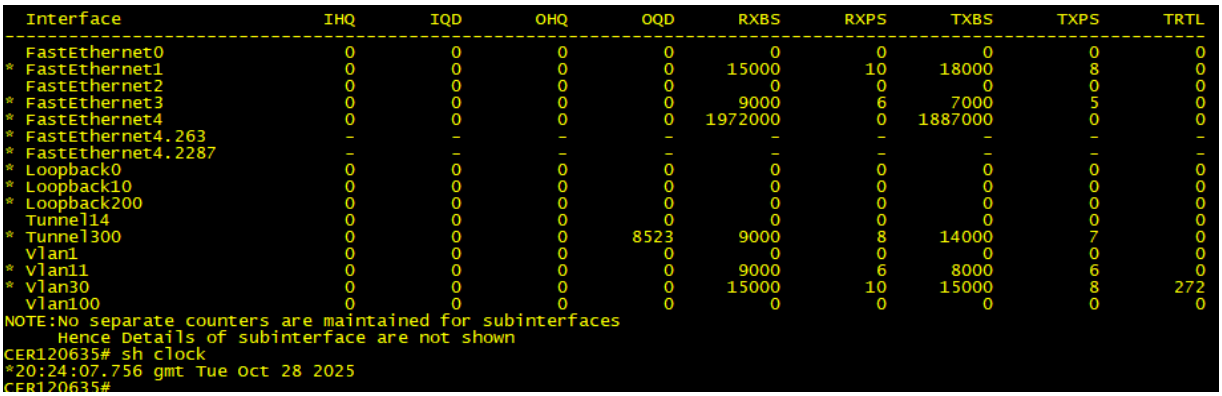


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0          0
* FastEthernet1              0          0          0          0       15000          10       18000           8          0
  FastEthernet2              0          0          0          0           0           0           0           0          0
* FastEthernet3              0          0          0          0        9000           6        7000           5          0
* FastEthernet4              0          0          0          0     1972000           0     1887000           0          0
* FastEthernet4.263          -          -          -          -           -           -           -           -          -
* FastEthernet4.2287         -          -          -          -           -           -           -           -          -
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback10                 0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback200                0          0          0          0           0           0           0           0          0
  Tunnel14                   0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Tunnel300                  0          0          0       8523        9000           8       14000           7          0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Vlan11                     0          0          0          0        9000           6        8000           6          0
* Vlan30                     0          0          0          0       15000          10       15000           8        272
  Vlan100                    0          0          0          0           0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER120635# sh clock
*20:24:07.756 gmt Tue Oct 28 2025
CER120635#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3136	1	Cundinamarca, Cajica; Cr 14 # 12-54 Oficina 512 Centro Empresarial NOU	0,512 Mbps	0,998

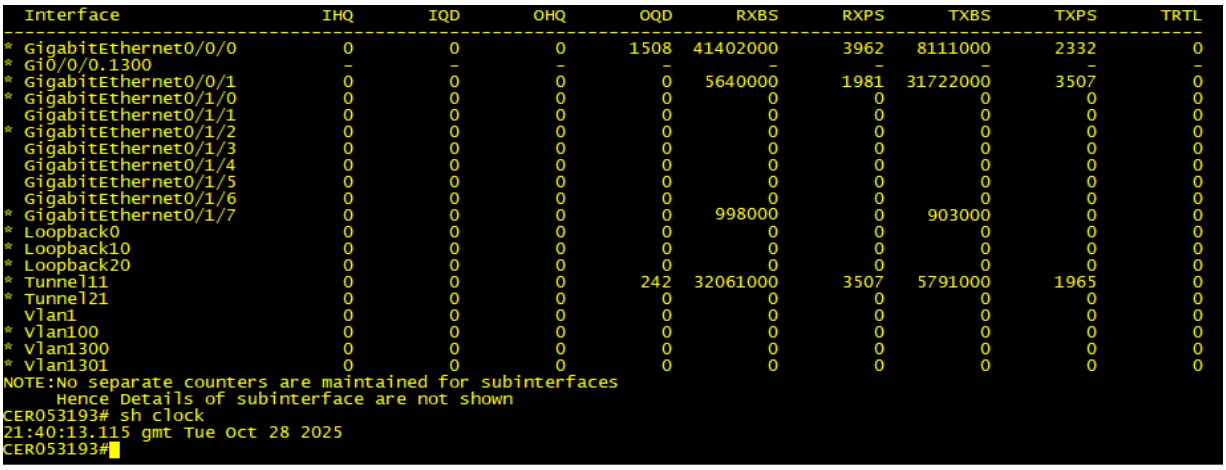

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0       1508    41402000        3962     8111000        2332          0
* Gi0/0/0.1300                -          -          -          -           -           -           -           -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0     5640000        1981    31722000        3507          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0           0           0           0           0          0
* GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0           0           0           0           0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0      998000           0      903000           0          0
* Loopback0                   0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback10                  0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback20                  0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Tunnel11                    0          0          0        242    32061000        3507     5791000        1965          0
* Tunnel21                    0          0          0          0           0           0           0           0          0
  Vlan1                       0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Vlan100                     0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Vlan1300                    0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Vlan1301                    0          0          0          0           0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER053193# sh clock
21:40:13.115 gmt Tue Oct 28 2025
CER053193#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
553-B	4	Sucre, San Benito Abad; Carrera 13 # 12-57	25 Mbps	23

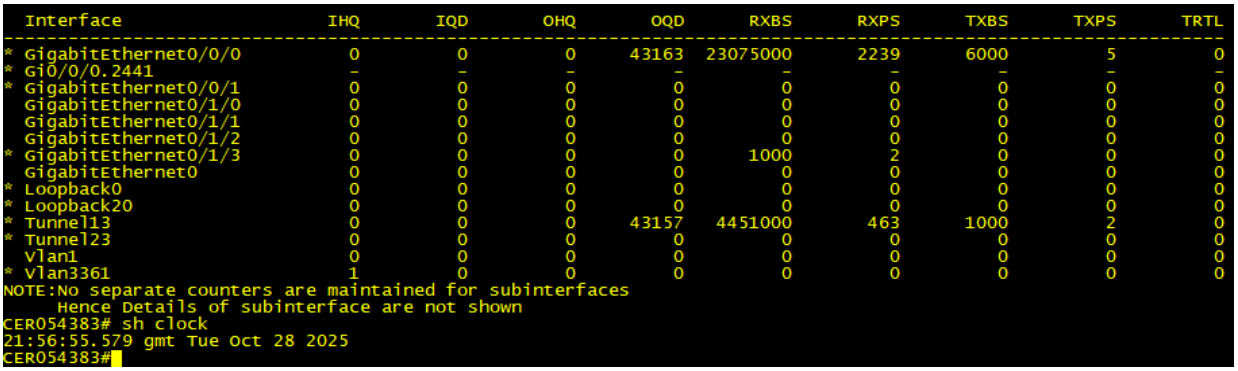

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      43163   23075000       2239       6000          5          0
* Gi0/0/0.2441                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0       1000          2          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                      0          0          0      43157    4451000        463       1000          2          0
* Tunnel23                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan3361                      1          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054383# sh clock
21:56:55.579 gmt Tue Oct 28 2025
CER054383#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3262	3	Chocó, Atrató; Calle Principal	2 Mbps	1,97

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           0           1972000     0           1890000     0           0
* Gi0/0/0.275                 -           -           -           -           -           -           -           -           -
* Gi0/0/0.2281                -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0           0           0           3000        4           4000        4           0
* Loopback0                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback200                 0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Tunnel14                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel300                   0           0           0           0           12000       2           1000        1           0
  Vlan1                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan30                      0           0           0           0           17000       4           2000        1           0
  Vlan100                     0           0           0           0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062433# sh clock
*21:50:15.559 gmt Tue Oct 28 2025
CER062433#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
128	1	Magdalena, Santa Marta; Calle 24 # 4-95	32 Mbps	29,2


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       2          0          0       2975   29230000       4417       7000          7          0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* LoopBack0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                   0          0          0       2975     113000         14          0          0          0
CER053006# sh clock
12:39:07.173 gmt Tue Oct 21 2025
CER053006#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
177	4	Boyacá, Garagoa; Carrera 10 # 8A-43, Palacio de Justicia	32 Mbps	29,3

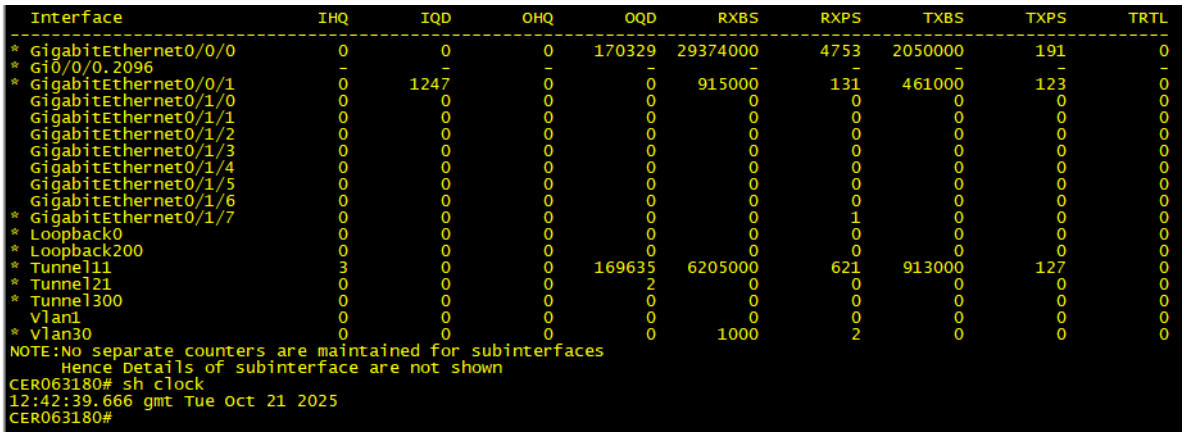

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0     170329   29374000       4753    2050000        191         0
* Gi0/0/0.2096                -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0       1247          0          0     915000        131     461000        123         0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          1          0          0         0
* LoopBack0                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* LoopBack200                 0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel11                    3          0          0     169635    6205000        621     913000        127         0
* Tunnel21                    0          0          0          2          0          0          0          0         0
* Tunnel300                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan30                      0          0          0          0       1000          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER063180# sh clock
12:42:39.666 gmt Tue Oct 21 2025
CER063180#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
225	3	La Guajira, Villanueva; Calle 12A # 8-27 piso 2	32 Mbps	29,7

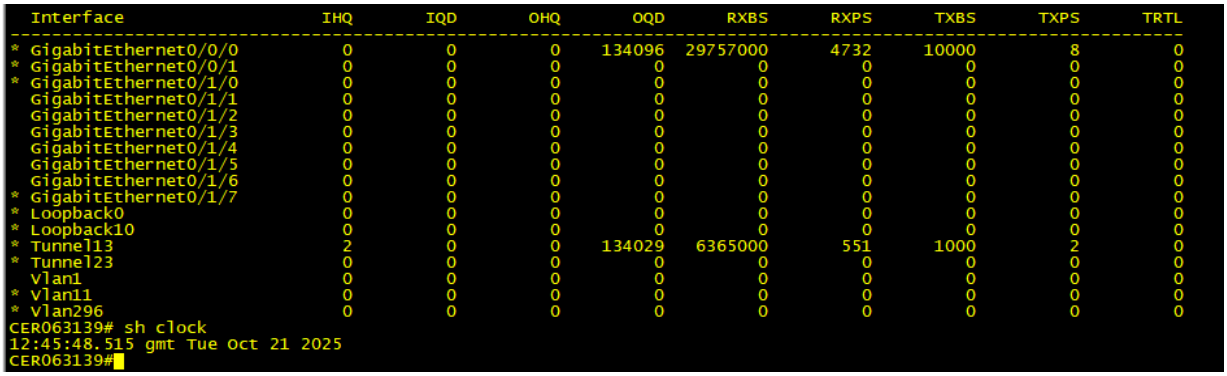

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0     134096   29757000       4732      10000          8          0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                   2          0          0     134029    6365000        551       1000          2          0
* Tunnel23                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan296                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER063139# sh clock
12:45:48.515 gmt Tue Oct 21 2025
CER063139#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
289	4	Cundinamarca, Cogua; Calle 4 # 4-37 Consejo Municipal	32 Mbps	30,8

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0         63   30829000       4887      13000          7          0
  Gi0/0/0.1591                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1945                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.3505                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0       2000          3       2000          3          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0       2000          4          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback11                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      0          0          0         63    8639000        748       8000          6          0
* Tunnel26                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0       5000          4      10000          4          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1037                      0          0          0          0          0          1          0          0          0
  Vlan3505                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER077946# sh clock
12:49:43.774 gmt Tue Oct 21 2025
CER077946#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
336	3	Casanare, Aguazul; Calle 9 # 17-49	32 Mbps	29,8

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           80795       29837000    4777        704000      131         0
  GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0           320000      56          324000      62          0
* GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0           1094000     174         1277000     196         0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback20                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback210                 0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel15                    0           0           0           80200       4339000     512         1462000     250         0
* Tunnel210                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan1                       0           0           0           0           1436000     250         1643000     276         0
* Vlan20                      0           0           0           0           0           0           0           0           0
CSJ_AGUAZUL-CASANARE# sh clock
13:01:34.740 gmt Tue Oct 21 2025
CSJ_AGUAZUL-CASANARE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
345	4	Cauca, Cajibío; Carrera 3 # 4-05	32 Mbps	29,2

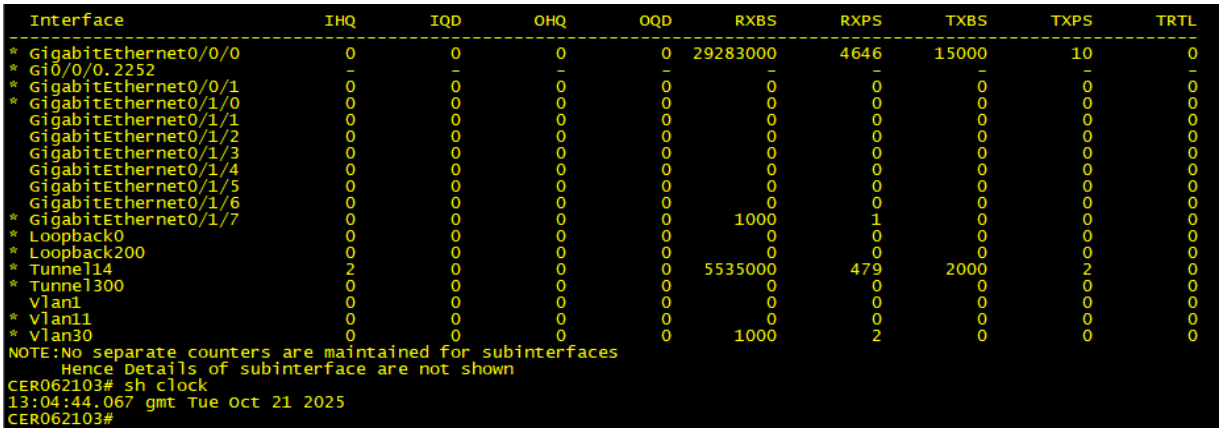

```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS        RXPS      TXBS        TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0         0          0   29283000        4646     15000          10         0
* Gi0/0/0.2252                  -          -         -          -          -           -         -           -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0         0          0          0           0         0           0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0         0          0          0           0         0           0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0         0          0          0           0         0           0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0         0          0          0           0         0           0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0         0          0          0           0         0           0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0         0          0          0           0         0           0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0         0          0          0           0         0           0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0         0          0          0           0         0           0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0         0          0       1000           1         0           0         0
* Loopback0                     0          0         0          0          0           0         0           0         0
* Loopback200                   0          0         0          0          0           0         0           0         0
* Tunnel14                      2          0         0          0    5535000         479      2000           2         0
* Tunnel300                     0          0         0          0          0           0         0           0         0
  Vlan1                         0          0         0          0          0           0         0           0         0
* Vlan11                        0          0         0          0          0           0         0           0         0
* Vlan30                        0          0         0          0       1000           2         0           0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062103# sh clock
13:04:44.067 gmt Tue Oct 21 2025
CER062103#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
354	3	Cauca, Piendamo; Carrera 7 # 9-30	32 Mbps	29,4

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0   29495000       3841    1953000        459          0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0        830    1535000        463    3488000        503          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0       1000          2          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel10                   0          0          0          0   10775000       1427     978000        405          0
* Tunnel20                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel301                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                     0          0          0          0       1000          2          0          0          0
CER045050# sh clock
13:07:31.023 gmt Tue Oct 21 2025
CER045050#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
360	4	Cauca, Timbío; Carrera 17 # 18-18	32 Mbps	29,8


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0   29828000       4762     149000         64          0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0      54000         18     250000         29          0
* GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0      19000         15          0
* GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0      39000         31     100000         38          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                   1          0          0          0    6684000        613      84000         50          0
* Tunnel24                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0      95000         62     344000         64          0
* Vlan3108                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER055847# sh clock
13:14:15.821 gmt Tue Oct 21 2025
CER055847#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
384	3	Cundinamarca, Ricaurte; Carrera 15 # 4-99	32 Mbps	29,6

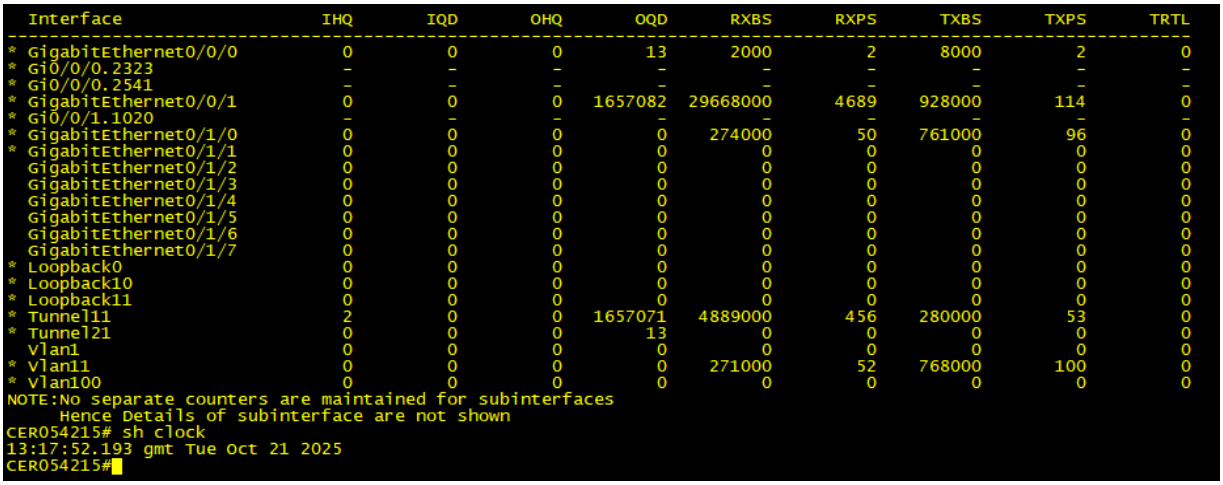


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0         13       2000           2       8000          2          0
* Gi0/0/0.2323               -          -          -          -          -           -          -          -          -
* Gi0/0/0.2541               -          -          -          -          -           -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0    1657082   29668000        4689     928000        114          0
* Gi0/0/1.1020               -          -          -          -          -           -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     274000          50     761000         96          0
* GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0           0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0           0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0           0          0          0          0
* Loopback11                 0          0          0          0          0           0          0          0          0
* Tunnel11                   2          0          0    1657071    4889000         456     280000         53          0
* Tunnel21                   0          0          0         13          0           0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0           0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     271000          52     768000        100          0
* Vlan100                    0          0          0          0          0           0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054215# sh clock
13:17:52.193 gmt Tue Oct 21 2025
CER054215#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
413	3	Magdalena, Plato; Calle 3 # 12-02, Palacio de Justicia Hugo Escobar Sierra	32 Mbps	29,5

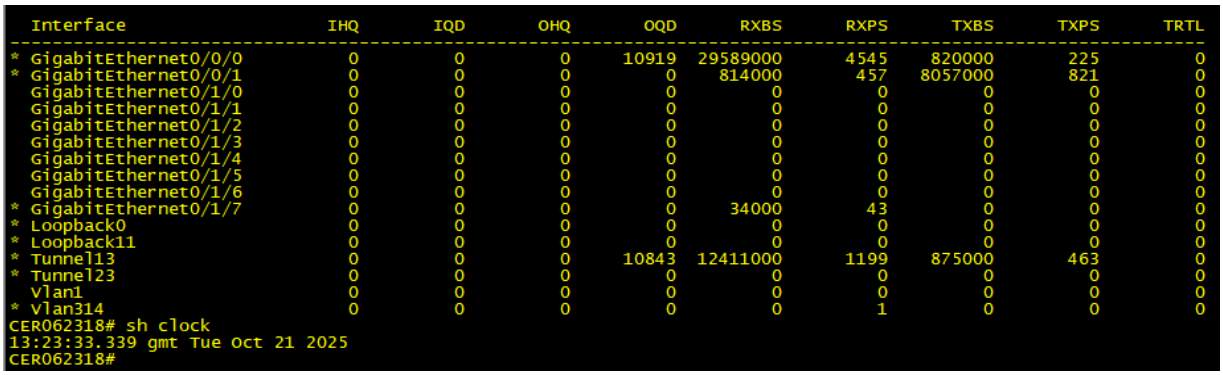

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0      10919   29589000       4545     820000        225          0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0     814000        457    8057000        821          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0      34000         43          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback11                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                   0          0          0      10843   12411000       1199     875000        463          0
* Tunnel23                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan314                    0          0          0          0          0          1          0          0          0
CER062318# sh clock
13:23:33.339 gmt Tue Oct 21 2025
CER062318#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
417	4	Meta, Puerto Gaitán; Cra 12 # 13-23 Barrio Manacacias	32 Mbps	29,5

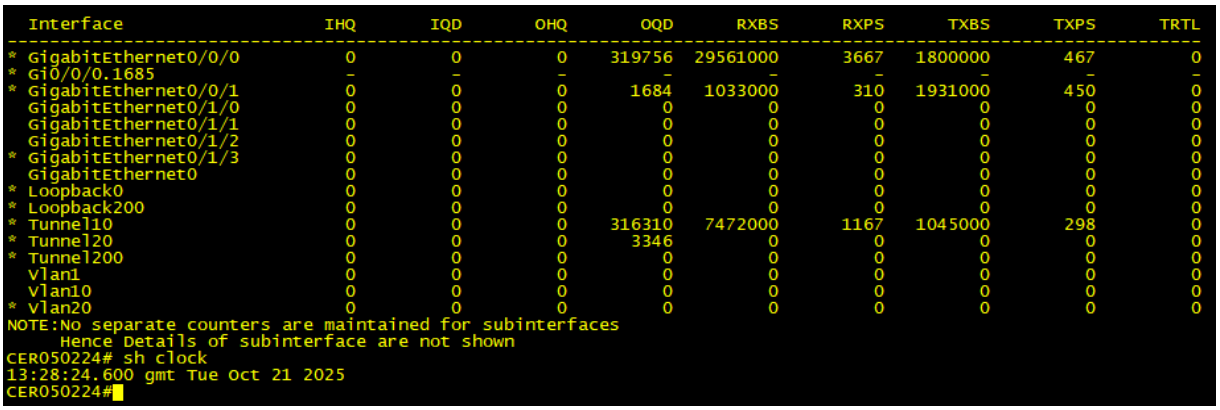


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     319756    29561000        3667     1800000         467          0
* GiO/O/O.1685                  -          -          -          -           -           -           -           -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0       1684     1033000         310     1931000         450          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0           0           0           0           0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback0                     0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback200                   0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Tunnel10                      0          0          0     316310     7472000        1167     1045000         298          0
* Tunnel20                      0          0          0       3346           0           0           0           0          0
* Tunnel200                     0          0          0          0           0           0           0           0          0
  Vlan1                         0          0          0          0           0           0           0           0          0
  Vlan10                        0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Vlan20                        0          0          0          0           0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER050224# sh clock
13:28:24.600 gmt Tue Oct 21 2025
CER050224#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
427	3	Nariño, Samaniego; Carrera 3A # 2-06 - el progreso	32 Mbps	29,9


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0         0         0         125213    29911000   4687       749000     150       0
* Gi0/0/0.2400             -         -         -         -         -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1     0         0         0         0         876000     237        4311000    520       0
  GigabitEthernet0/1/0     0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1     0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2     0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3     0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4     0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5     0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6     0         0         0         0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7     0         0         0         0         1000       2          0          0         0
* Loopback0                0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Loopback200              0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Tunnel14                 3         0         0         124962    9278000    965        916000     243       0
* Tunnel300                0         0         0         0         0          0          0          0         0
  Vlan1                    0         0         0         0         0          0          0          0         0
* Vlan30                   0         0         0         0         0          2          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062249# sh clock
13:42:29.638 gmt Tue Oct 21 2025
CER062249#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
431	4	Risaralda, Apía; Calle 9 # 9-42, Palacio de Justicia	32 Mbps	30,6

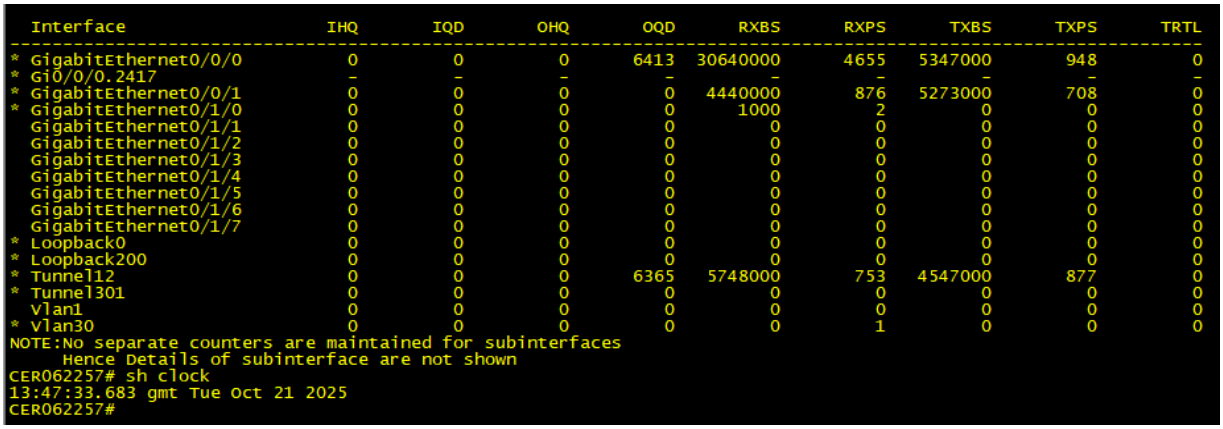


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0       6413   30640000       4655    5347000        948          0
* Gi0/0/0.2417                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0    4440000        876    5273000        708          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                    0          0          0       6365    5748000        753    4547000        877          0
* Tunnel301                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                      0          0          0          0          0          1          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062257# sh clock
13:47:33.683 gmt Tue Oct 21 2025
CER062257#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
455	4	Tolima, Anzoátegui; Carrera 2 # 13-42	32 Mbps	30,2

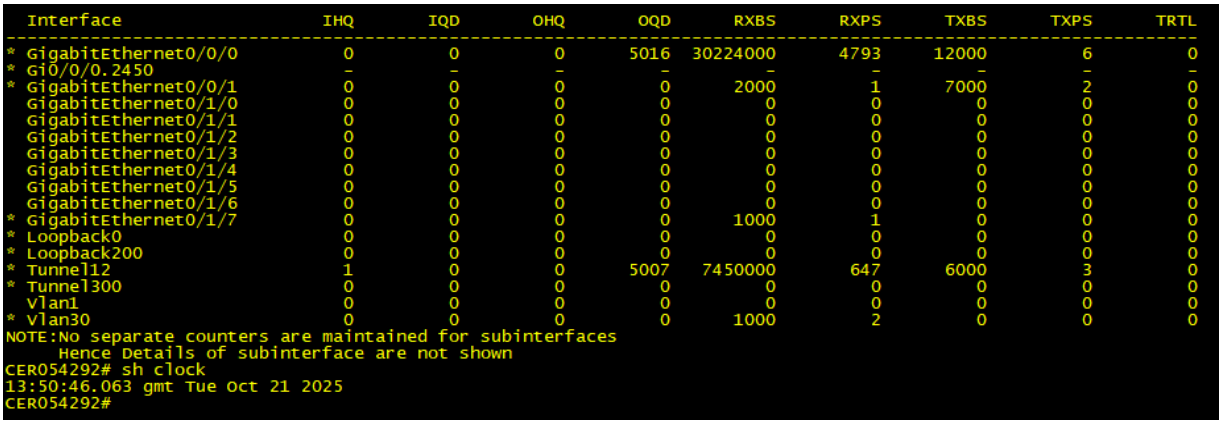

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0           0           0        5016   30224000       4793      12000          6          0
* Gi0/0/0.2450                  -           -           -           -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0       2000          1       7000          2          0
  GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                     0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                      1           0           0        5007    7450000        647       6000          3          0
* Tunnel300                     0           0           0           0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0           0           0           0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054292# sh clock
13:50:46.063 gmt Tue Oct 21 2025
CER054292#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
526	3	Boyacá, Villa de Leyva; Calle Principal	32 Mbps	29,4

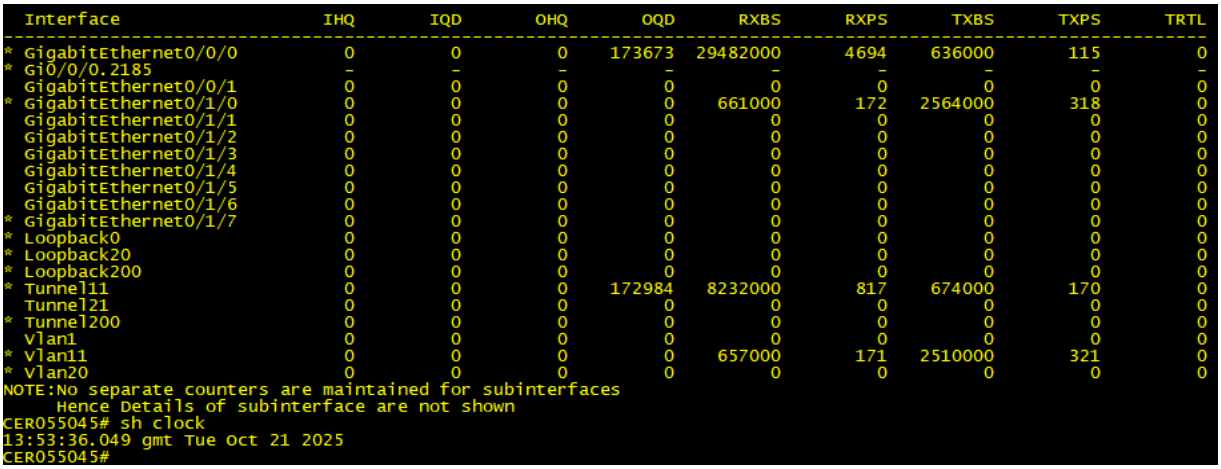

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0     173673   29482000       4694     636000        115          0
* Gi0/0/0.2185               -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     661000        172    2564000        318          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                   0          0          0     172984    8232000        817     674000        170          0
  Tunnel21                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     657000        171    2510000        321          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055045# sh clock
13:53:36.049 gmt Tue Oct 21 2025
CER055045#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
532	4	Casanare, Paz De Ariporo; Calle 14 No. 9-20/30/32	32 Mbps	29,8

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0           0           0       11750    29891000        4570     1752000         330           0
* Gi0/0/0.2241                -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0         0           0           0           0     1031000         285     4280000         625           0
  GigabitEthernet0/1/1         0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2         0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3         0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4         0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5         0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6         0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7         0           0           0           0        1000           1           0           0           0
* Loopback0                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback210                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel15                     0           0           0       11687     4517000         652     1062000         286           0
* Tunnel300                    0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                       0           0           0           0     1034000         287     4345000         640           0
* Vlan30                       0           0           0           0        1000           2           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062525# sh clock
13:56:55.121 gmt Tue Oct 21 2025
CER062525#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
541	3	Córdoba, Planeta Rica; 18 # 9-50, Palacio de Justicia	32 Mbps	29,3

```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0     29875   29344000       4321    3702000        798          0
* Gi0/0/0.1300                  -         -         -         -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0    4671000       1174   15141000       1998          0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0          0          1          0          0          0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel10                      2         0         0     29702   18600000       2551    4811000       1182          0
* Tunnel20                      0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0         0         0         0    4695000       1185   15366000       2035          0
* Vlan3350                      0         0         0         0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER044538# sh clock
14:01:11.054 gmt Tue Oct 21 2025
CER044538#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
544	3	La Guajira, Fonseca; Calle 11 # 17-48	32 Mbps	29,3

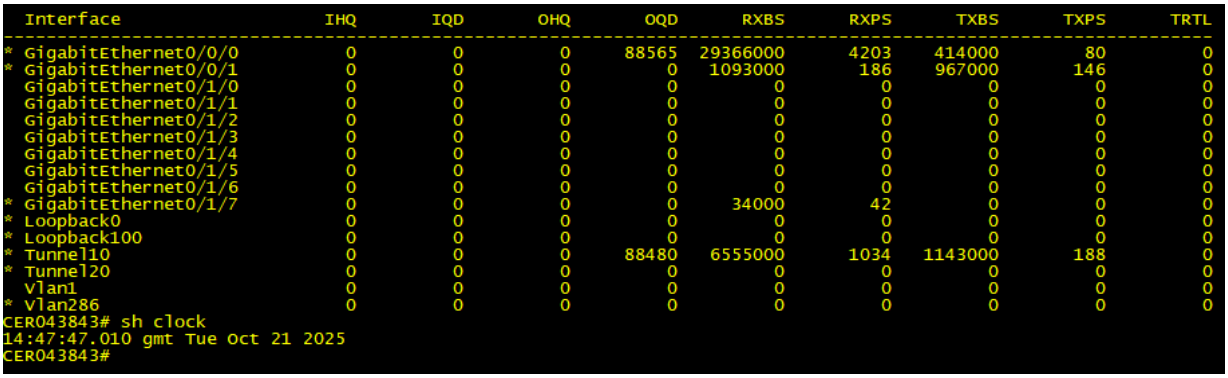


```
  Interface                   IHQ         IQD          OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0           0            0       88565   29366000       4203     414000         80         0
* GigabitEthernet0/0/1         0           0            0           0    1093000        186     967000        146         0
  GigabitEthernet0/1/0         0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1         0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0           0            0           0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0           0            0           0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0           0            0           0      34000         42          0          0         0
* Loopback0                    0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Loopback100                  0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Tunnel10                     0           0            0       88480    6555000       1034    1143000        188         0
* Tunnel20                     0           0            0           0          0          0          0          0         0
  Vlan1                        0           0            0           0          0          0          0          0         0
* Vlan286                      0           0            0           0          0          0          0          0         0
CER043843# sh clock
14:47:47.010 gmt Tue Oct 21 2025
CER043843#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
548	3	Quindío, Córdoba; Carrera 11 # 14-15/17	32 Mbps	30,2


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     969813   30283000       4011     206000         46         0
* Gi0/0/0.2413                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0      87064     164000         54     744000         86         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          1          0          0         0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel12                      0          0          0     963237     938000        110     161000         43         0
* Tunnel22                      0          0          0       6225          0          0          0          0         0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan30                        0          0          0          0       2000          4          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062515# sh clock
15:12:06.151 gmt Tue Oct 21 2025
CER062515#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
549	3	Quindío, Filandia; Calle 4 # 4-36 Local 2	32 Mbps	30,8

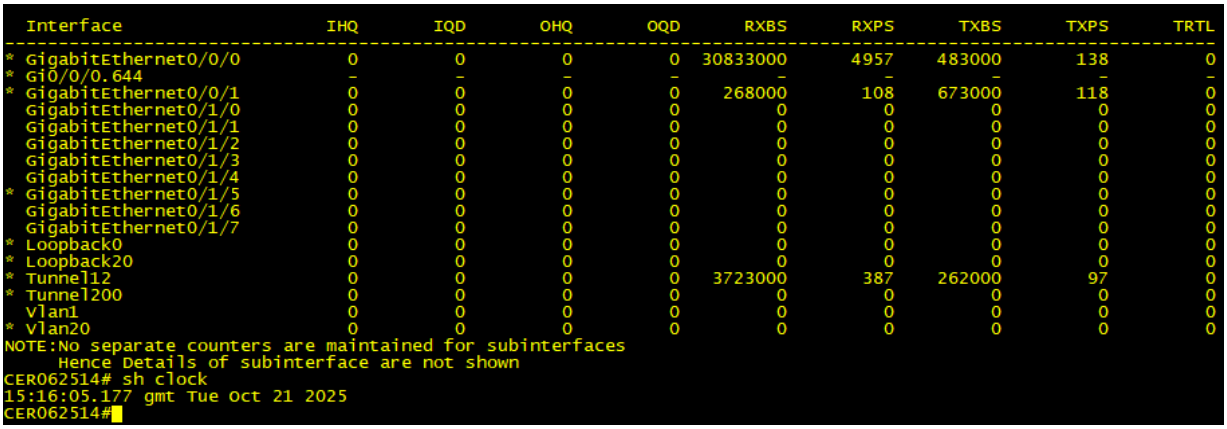


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0   30833000       4957     483000        138         0
* Gi0/0/0.644                 -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0     268000        108     673000        118         0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback20                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel12                    0          0          0          0    3723000        387     262000         97         0
* Tunnel200                   0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan20                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062514# sh clock
15:16:05.177 gmt Tue Oct 21 2025
CER062514#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
551	3	Quindío, Pijao; Carrera 5 # 10-35, Palacio Municipal	32 Mbps	30,5

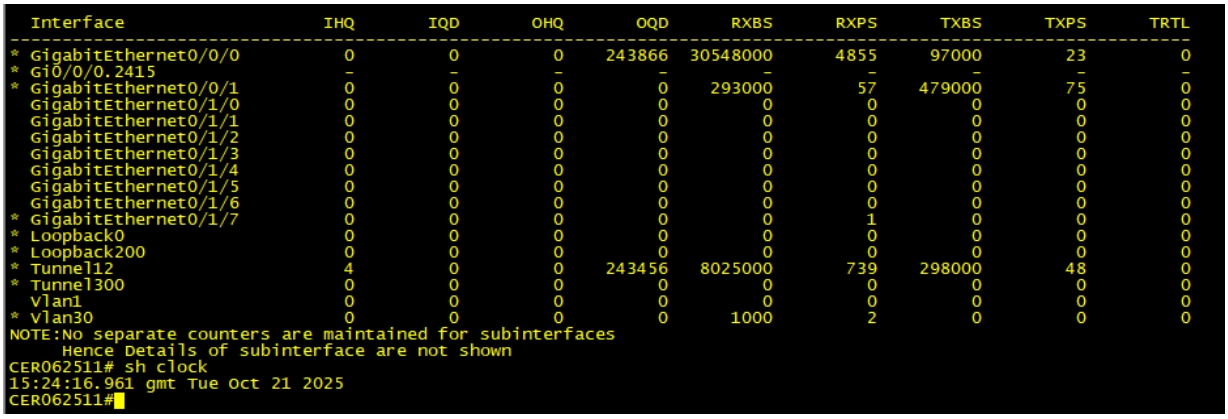


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0         0         0    243866   30548000       4855      97000         23          0
* Gi0/0/0.2415               -         -         -         -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0         0         0         0     293000         57     479000         75          0
  GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0         0         0         0          0          1          0          0          0
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                   4         0         0    243456    8025000        739     298000         48          0
* Tunnel300                  0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan30                     0         0         0         0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062511# sh clock
15:24:16.961 gmt Tue Oct 21 2025
CER062511#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
567	4	Boyacá, El Cocuy; Calle 8 # 6-12	32 Mbps	29,8

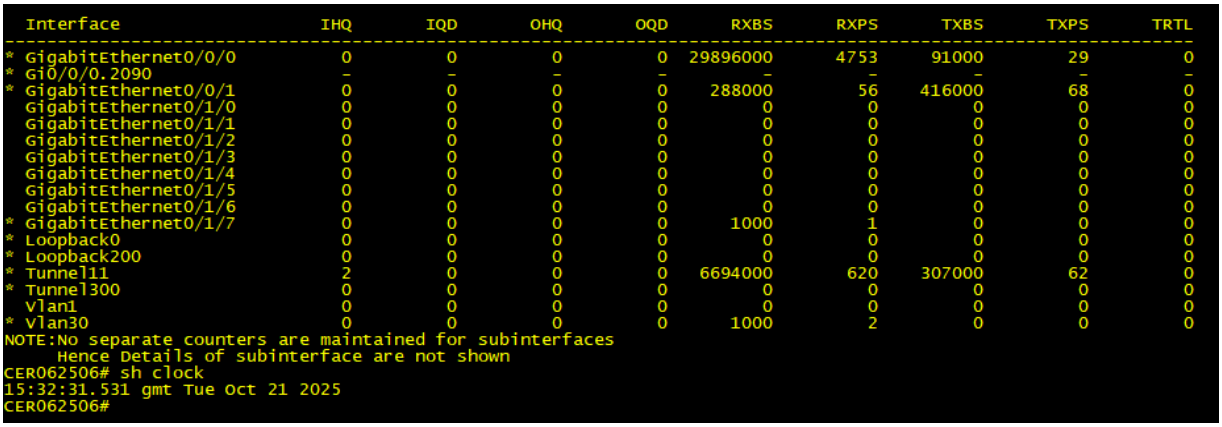


```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0         0         0         0      29896000       4753      91000         29          0
* Gi0/0/0.2090                -         -         -         -             -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0         0         0         0        288000         56     416000         68          0
  GigabitEthernet0/1/0        0         0         0         0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0         0         0         0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0         0         0         0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0         0         0         0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0         0         0         0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0         0         0         0             0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0         0         0         0             0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0         0         0         0          1000          1          0          0          0
* Loopback0                   0         0         0         0             0          0          0          0          0
* Loopback200                 0         0         0         0             0          0          0          0          0
* Tunnel11                    2         0         0         0       6694000        620     307000         62          0
* Tunnel300                   0         0         0         0             0          0          0          0          0
  Vlan1                       0         0         0         0             0          0          0          0          0
* Vlan30                      0         0         0         0          1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062506# sh clock
15:32:31.531 gmt Tue Oct 21 2025
CER062506#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
571	3	Boyacá, Miraflores; Carrera 7 # 4-26	32 Mbps	30,9

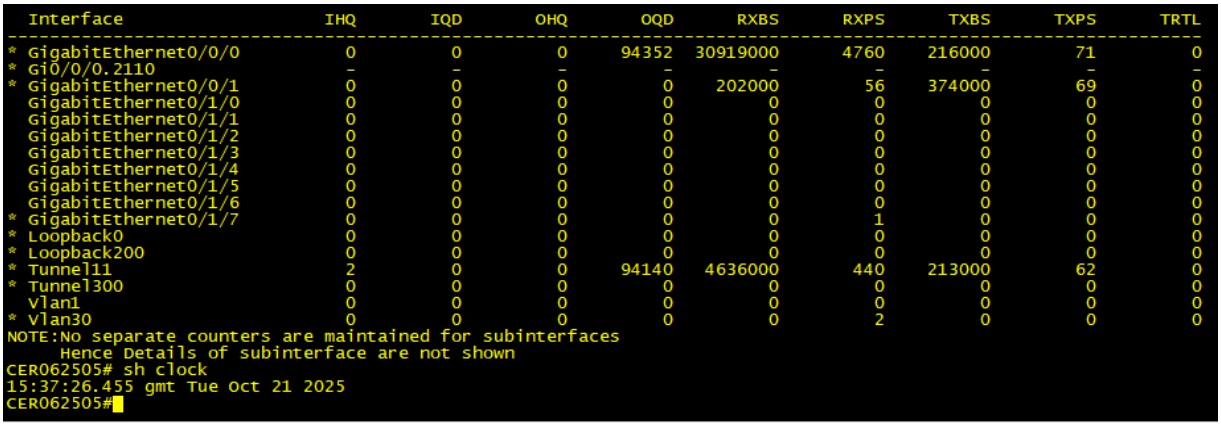

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      94352   30919000       4760     216000         71          0
* Gi0/0/0.2110                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     202000         56     374000         69          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      2          0          0      94140    4636000        440     213000         62          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062505# sh clock
15:37:26.455 gmt Tue Oct 21 2025
CER062505#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
611	4	Casanare, Monterrey; Carrera 6 # 16-16	32 Mbps	29,5

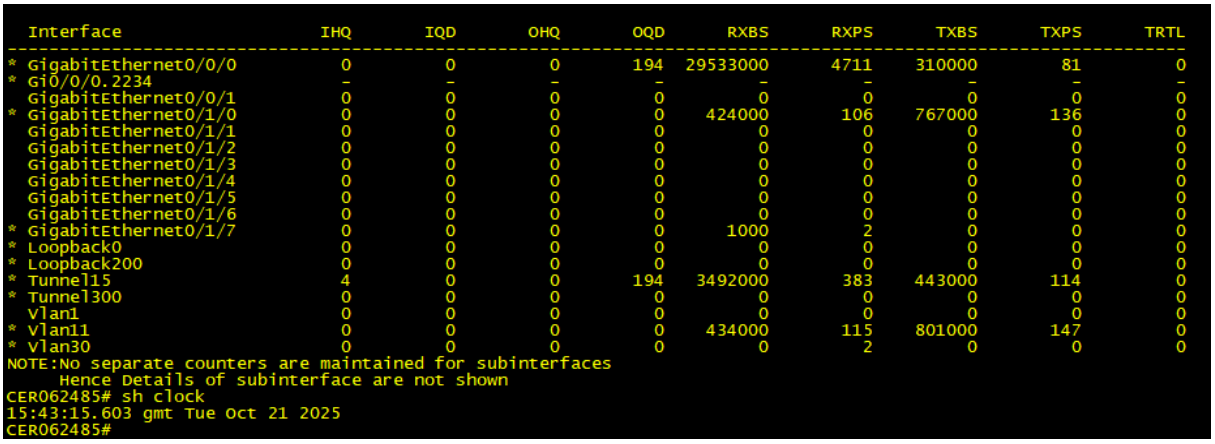


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          194   29533000       4711     310000         81          0
* Gi0/0/0.2234                -          -          -          -           -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0           0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0      424000        106     767000        136          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0           0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0           0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0           0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0           0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0           0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0           0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0        1000          2          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0           0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0           0          0          0          0          0
* Tunnel15                    4          0          0          194   3492000        383     443000        114          0
* Tunnel300                   0          0          0          0           0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0           0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0      434000        115     801000        147          0
* Vlan30                      0          0          0          0           0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062485# sh clock
15:43:15.603 gmt Tue Oct 21 2025
CER062485#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
649	4	Cundinamarca, Paime; Calle 2 # 2-19	32 Mbps	30,6


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          1           0           0           0   30639000       4862      27000         13          0
* Gi0/0/0.2318                  -           -           -           -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2539                  -           -           -           -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0           0           0           0       8000          3     144000          7          0
* GigabitEthernet0/1/0          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0           0           0           0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0           0           0           0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0           0           0           0          0          1          0          0          0
* Loopback0                     0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      3           0           0           0    7233000        628      14000          5          0
* Tunnel300                     0           0           0           0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0           0           0           0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0           0           0           0       1000          2          0          0          0
* Vlan100                       0           0           0           0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054434# sh clock
15:48:21.733 gmt Tue Oct 21 2025
CER054434#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
651	4	Cundinamarca, Quebradanegra; Calle 4 # 3-04	32 Mbps	29,5

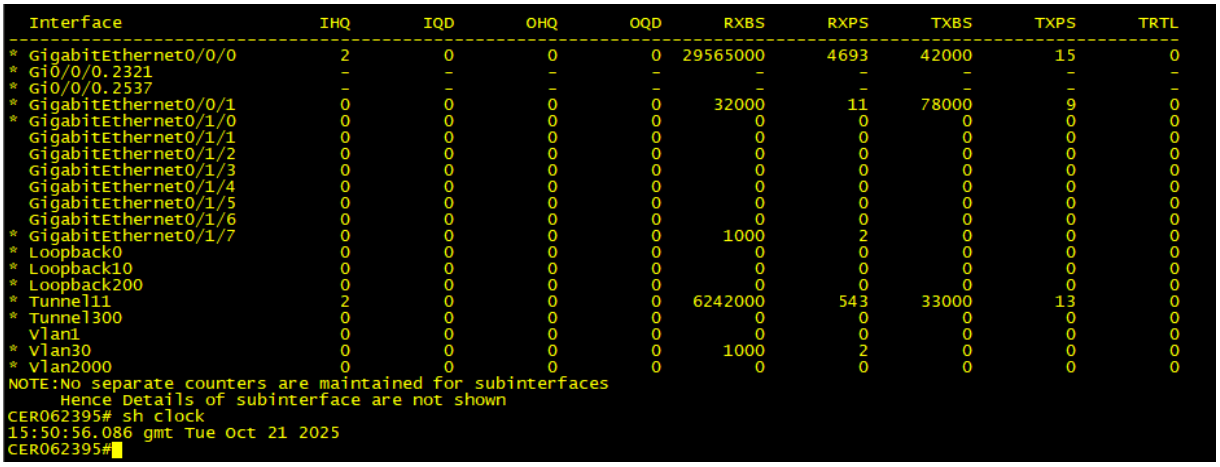

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       2          0          0          0   29565000       4693      42000         15          0
* Gi0/0/0.2321               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2537               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0      32000         11      78000          9          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                   2          0          0          0    6242000        543      33000         13          0
* Tunnel300                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                     0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Vlan2000                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062395# sh clock
15:50:56.086 gmt Tue Oct 21 2025
CER062395#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
653	3	Cundinamarca, San Bernardo; Calle 6 #3-43/57, Casa del Café, Palacio Municipal	32 Mbps	31,2

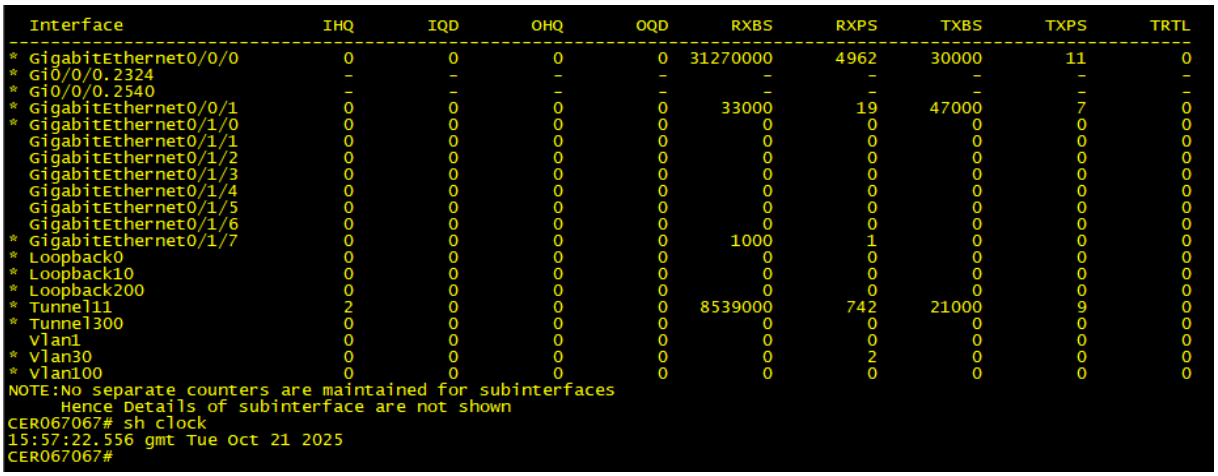


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0         0         0         0   31270000       4962      30000         11          0
* Gi0/0/0.2324               -         -         -         -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2540               -         -         -         -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0         0         0         0      33000         19      47000          7          0
* GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0         0         0         0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                   2         0         0         0    8539000        742      21000          9          0
* Tunnel300                  0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan30                     0         0         0         0          0          2          0          0          0
* Vlan100                    0         0         0         0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067067# sh clock
15:57:22.556 gmt Tue Oct 21 2025
CER067067#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
654	4	Cundinamarca, San Cayetano; Cra 8 # 8-07	32 Mbps	29,7


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          3          0          0      75182   29745000       4715     143000         47          0
* Gi0/0/0.2325                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2545                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      90000         21      96000         20          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          1          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      2          0          0      74952    5188000        462      99000         24          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054001# sh clock
16:02:23.399 gmt Tue Oct 21 2025
CER054001#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
677	3	Magdalena, Pivijay; Carrera 15 # 4-23	32 Mbps	31

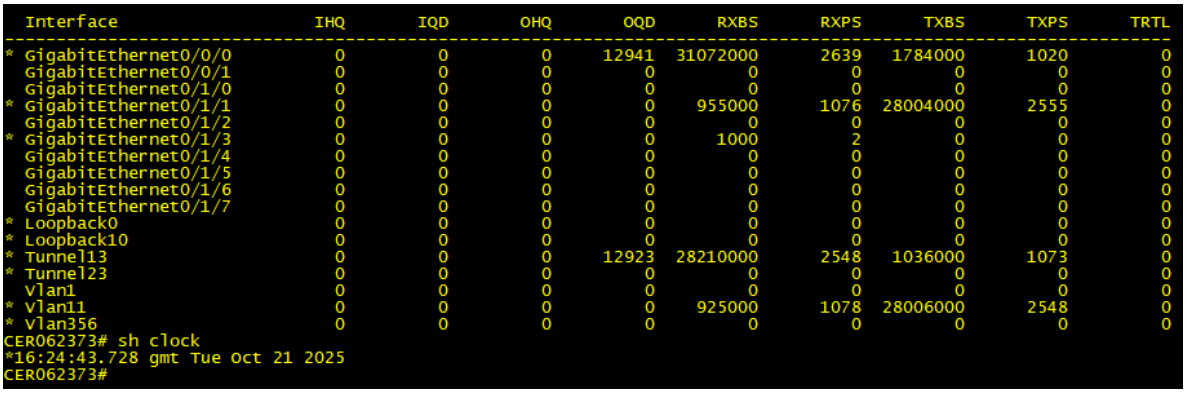

```
  Interface                 IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0         0         0     12941   31072000       2639    1784000       1020         0
  GigabitEthernet0/0/1        0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/0        0         0         0         0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/1        0         0         0         0     955000       1076   28004000       2555         0
  GigabitEthernet0/1/2        0         0         0         0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3        0         0         0         0       1000          2          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7        0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback0                   0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback10                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel13                    0         0         0     12923   28210000       2548    1036000       1073         0
* Tunnel23                    0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                       0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan11                      0         0         0         0     925000       1078   28006000       2548         0
* Vlan356                     0         0         0         0          0          0          0          0         0
CER062373# sh clock
*16:24:43.728 gmt Tue Oct 21 2025
CER062373#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
686	4	Risaralda, Quinchía; Carrera 6 # 9, Palacio de Justicia	32 Mbps	32,3

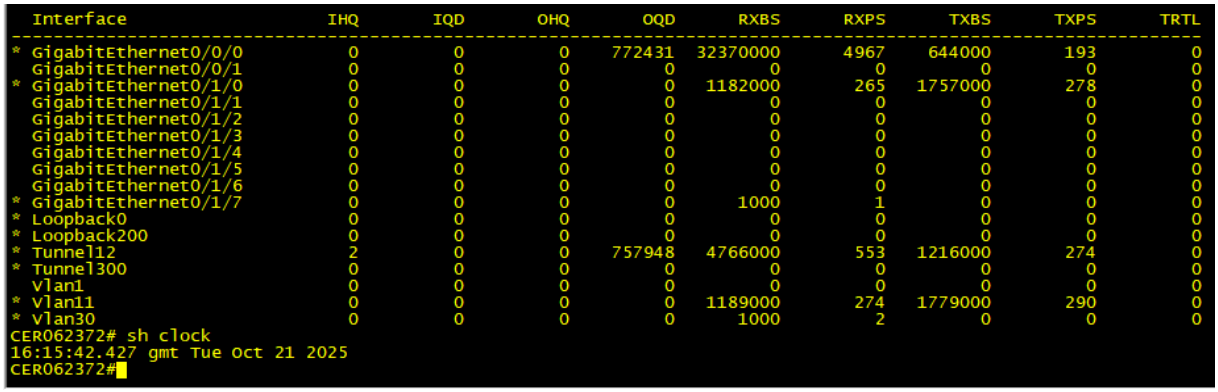


```
  Interface                   IHQ        IQD          OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0            0     772431    32370000        4967      644000         193           0
  GigabitEthernet0/0/1          0          0            0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0            0          0     1182000         265     1757000         278           0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0            0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0            0          0        1000           1           0           0           0
* Loopback0                     0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel12                      2          0            0     757948     4766000         553     1216000         274           0
* Tunnel300                     0          0            0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Vlan11                        0          0            0          0     1189000         274     1779000         290           0
* Vlan30                        0          0            0          0        1000           2           0           0           0
CER062372# sh clock
16:15:42.427 gmt Tue Oct 21 2025
CER062372#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
903	2	Meta, Restrepo; Calle 8 # 8-18 Urbanización Las Acacias	32 Mbps	31


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0   31085000       4762     266000         93          0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0     161000         70     561000         82          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                   0          0          0          0    5922000        543     153000         64          0
* Tunnel210                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER057216# sh clock
16:27:02.430 gmt Tue Oct 21 2025
CER057216#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
907	4	Cundinamarca, Albán; Carrera 1 # 3-08, Alcaldía Municipal	32 Mbps	31,7

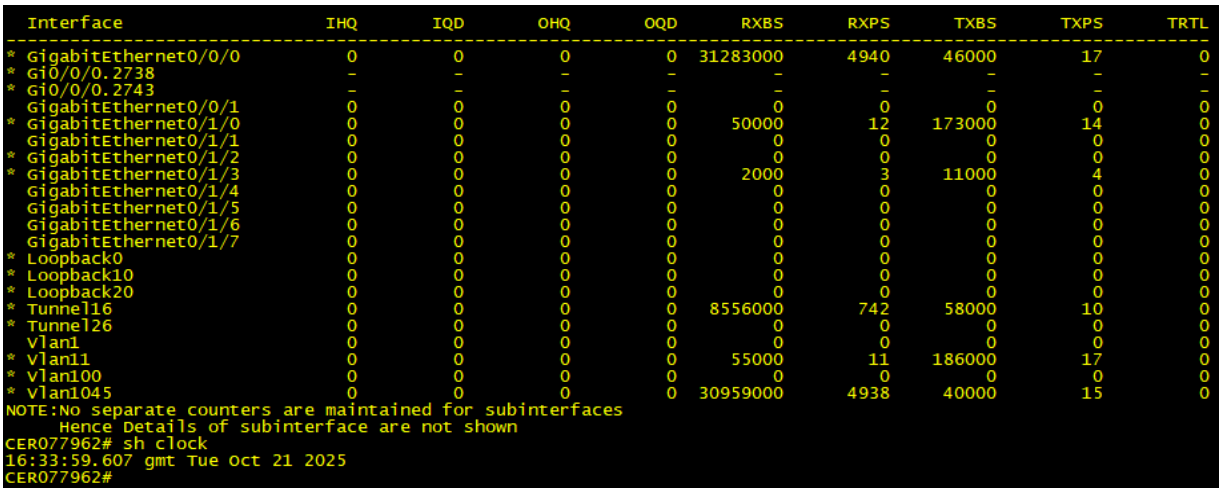


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0   31283000       4940      46000         17          0
* Gi0/0/0.2738               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2743               -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0      50000         12     173000         14          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0       2000          3      11000          4          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                   0          0          0          0    8556000        742      58000         10          0
* Tunnel26                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0      55000         11     186000         17          0
* Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1045                   0          0          0          0   30959000       4938      40000         15          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER077962# sh clock
16:33:59.607 gmt Tue Oct 21 2025
CER077962#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1053	3	Cundinamarca, Nemocon; Calle 2 # 5-78 Piso 2	32 Mbps	30,8

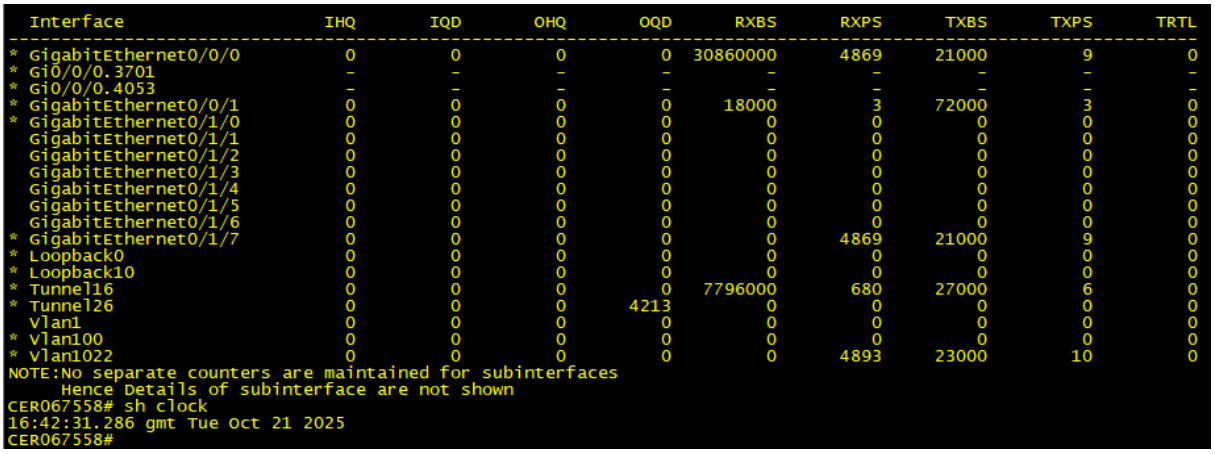


```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0   30860000       4869      21000          9          0
* Gi0/0/0.3701                  -         -         -         -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4053                  -         -         -         -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0      18000          3      72000          3          0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0         0         0         0          0       4869      21000          9          0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      0         0         0         0    7796000        680      27000          6          0
* Tunnel26                      0         0         0      4213          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan1022                      0         0         0         0          0       4893      23000         10          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067558# sh clock
16:42:31.286 gmt Tue Oct 21 2025
CER067558#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1054	4	Cundinamarca, Nilo; Palacio Municipal	32 Mbps	29,5

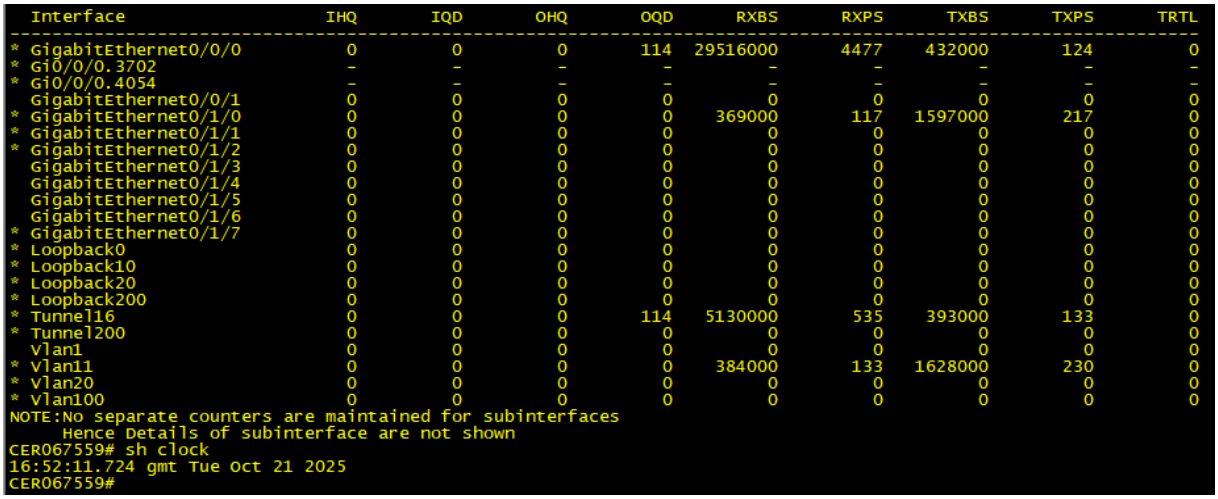


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0          0          0          114   29516000       4477     432000        124         0
* Gi0/0/0.3702             -          -          -          -            -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.4054             -          -          -          -            -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1     0          0          0          0            0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0     0          0          0          0       369000        117    1597000        217         0
* GigabitEthernet0/1/1     0          0          0          0            0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/2     0          0          0          0            0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3     0          0          0          0            0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4     0          0          0          0            0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5     0          0          0          0            0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6     0          0          0          0            0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7     0          0          0          0            0          0          0          0         0
* Loopback0                0          0          0          0            0          0          0          0         0
* Loopback10               0          0          0          0            0          0          0          0         0
* Loopback20               0          0          0          0            0          0          0          0         0
* Loopback200              0          0          0          0            0          0          0          0         0
* Tunnel16                 0          0          0          114    5130000        535     393000        133         0
* Tunnel200                0          0          0          0            0          0          0          0         0
  Vlan1                    0          0          0          0            0          0          0          0         0
* Vlan11                   0          0          0          0       384000        133    1628000        230         0
* Vlan20                   0          0          0          0            0          0          0          0         0
* Vlan100                  0          0          0          0            0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067559# sh clock
16:52:11.724 gmt Tue Oct 21 2025
CER067559#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1065	2	Antioquia, Barbosa; Calle 15 # 11- 50	32 Mbps	30

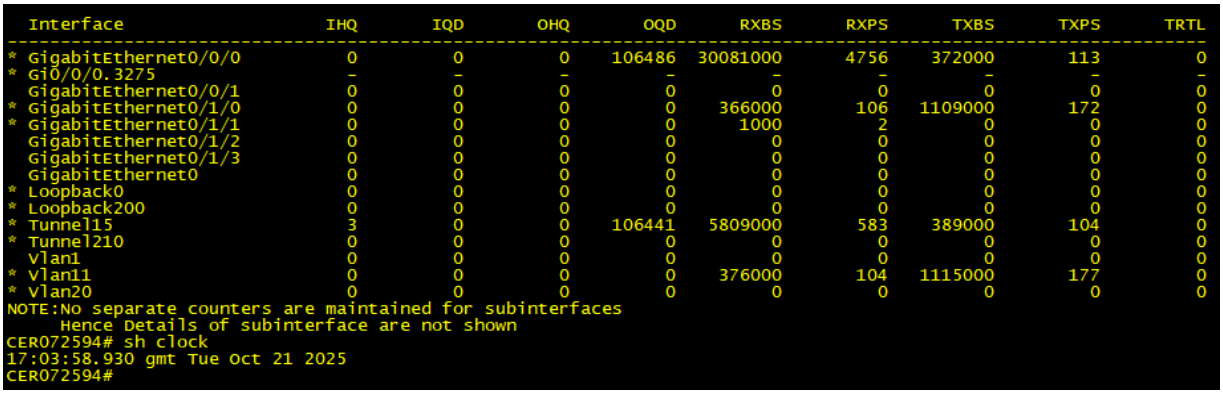


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     106486    30081000        4756      372000         113           0
* GiO/O/O.3275                  -          -          -          -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      366000         106     1109000         172           0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0        1000           2           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback0                     0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback200                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel15                      3          0          0     106441     5809000         583      389000         104           0
* Tunnel210                     0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                         0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan11                        0          0          0          0      376000         104     1115000         177           0
* Vlan20                        0          0          0          0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER072594# sh clock
17:03:58.930 gmt Tue Oct 21 2025
CER072594#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1087	3	Antioquia, Caucasia; Calle 19# 13-13	32 Mbps	29,8

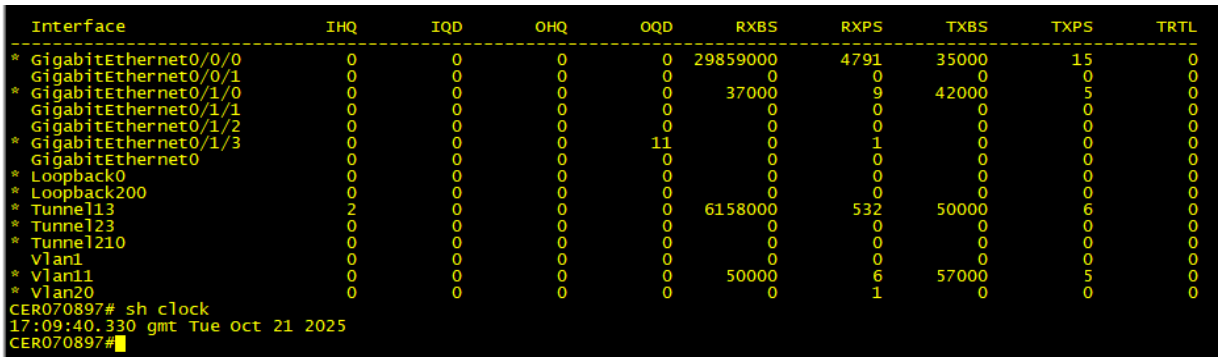

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0   29859000       4791      35000         15          0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0      37000          9      42000          5          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0         11          0          1          0          0          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                   2          0          0          0    6158000        532      50000          6          0
* Tunnel23                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel210                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0      50000          6      57000          5          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          1          0          0          0
CER070897# sh clock
17:09:40.330 gmt Tue Oct 21 2025
CER070897#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1120	3	Antioquia, Caucasia; Calle 20 B # 14-31	32 Mbps	29,6

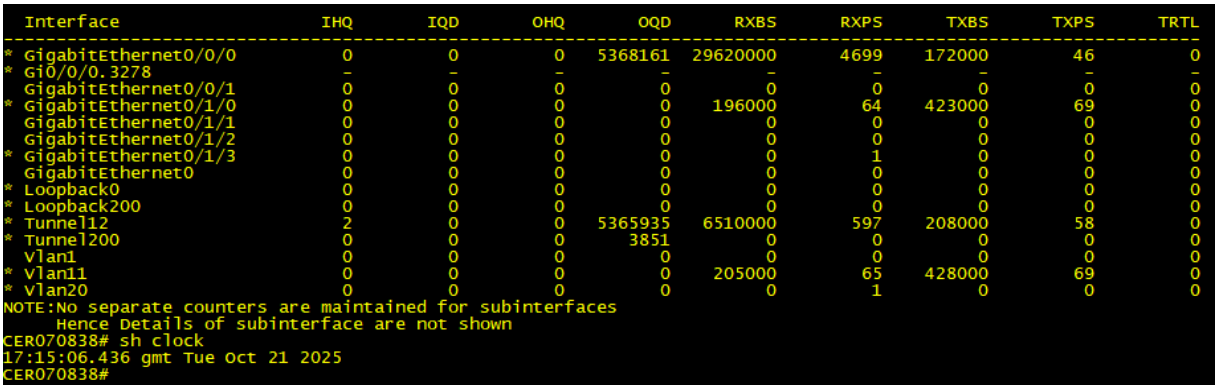


```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0   5368161   29620000       4699     172000         46         0
* Gi0/0/0.3278                  -         -         -         -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0     196000         64     423000         69         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0          0          1          0          0         0
  GigabitEthernet0              0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel12                      2         0         0   5365935    6510000        597     208000         58         0
* Tunnel200                     0         0         0      3851          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan11                        0         0         0         0     205000         65     428000         69         0
* Vlan20                        0         0         0         0          0          1          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER070838# sh clock
17:15:06.436 gmt Tue Oct 21 2025
CER070838#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1123	2	Antioquia, Barbosa; Carrera 15 # 10-40 piso 5° - local 501	32 Mbps	31,3


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      43218   31373000       4987      20000          7          0
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          1          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      10000          5       4000          4          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                      2          0          0      43215   17023000       1474      15000          7          0
* Tunnel200                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      13000          5      12000          5          0
CER067693# sh clock
17:29:03.509 gmt Tue Oct 21 2025
CER067693#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1133	1	Antioquia, Copacabana; Carrera 48 No.50-143 PISO 2 CC JAZMÍN PLAZA COPACABANA	32 Mbps	29,2

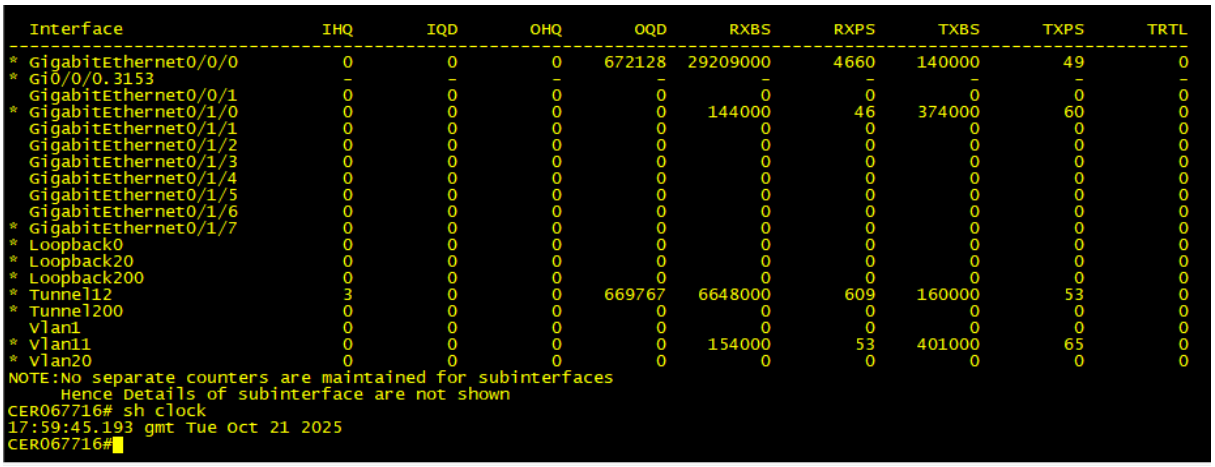


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0     672128   29209000       4660     140000         49          0
* GiO/O/O.3153               -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     144000         46     374000         60          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                   3          0          0     669767    6648000        609     160000         53          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     154000         53     401000         65          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067716# sh clock
17:59:45.193 gmt Tue Oct 21 2025
CER067716#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1138	2	Antioquia, El Retiro; Calle 18 # 21-01	32 Mbps	29,4

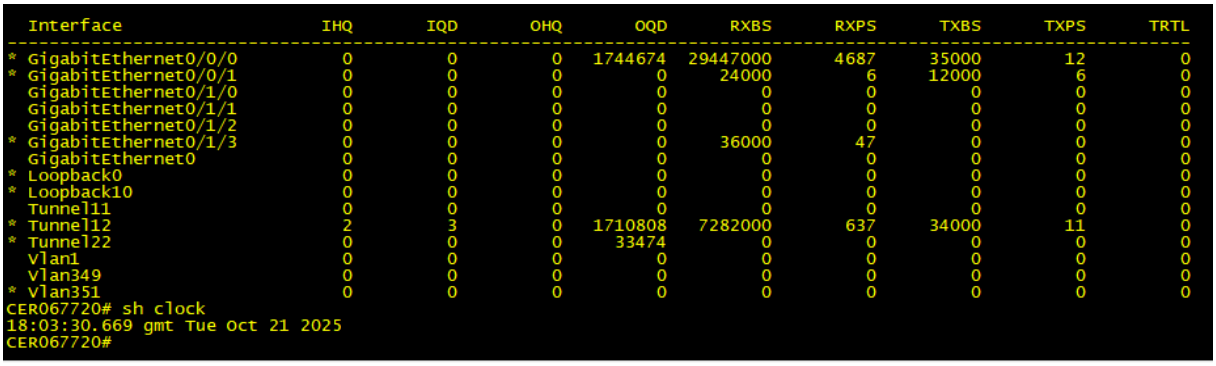


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0    1744674   29447000       4687      35000         12          0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0      24000          6      12000          6          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0      36000         47          0          0          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel11                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                   2          3          0    1710808    7282000        637      34000         11          0
* Tunnel22                   0          0          0      33474          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan349                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan351                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER067720# sh clock
18:03:30.669 gmt Tue Oct 21 2025
CER067720#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1140	3	Antioquia, Entrerríos; Carrera 13 # Calle 8-04 Edificio El Portal Local 102	32 Mbps	30,3

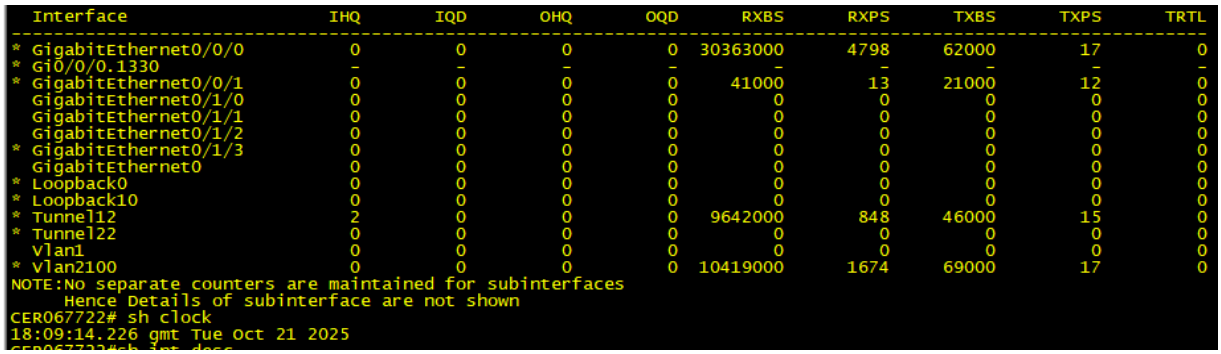


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   30363000       4798      62000         17         0
* Gi0/0/0.1330                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      41000         13      21000         12         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel12                      2          0          0          0    9642000        848      46000         15         0
* Tunnel22                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan2100                      0          0          0          0   10419000       1674      69000         17         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067722# sh clock
18:09:14.226 gmt Tue Oct 21 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1165	4	Antioquia, San Jerónimo; Carrera 10 # 23-05	32 Mbps	29,4

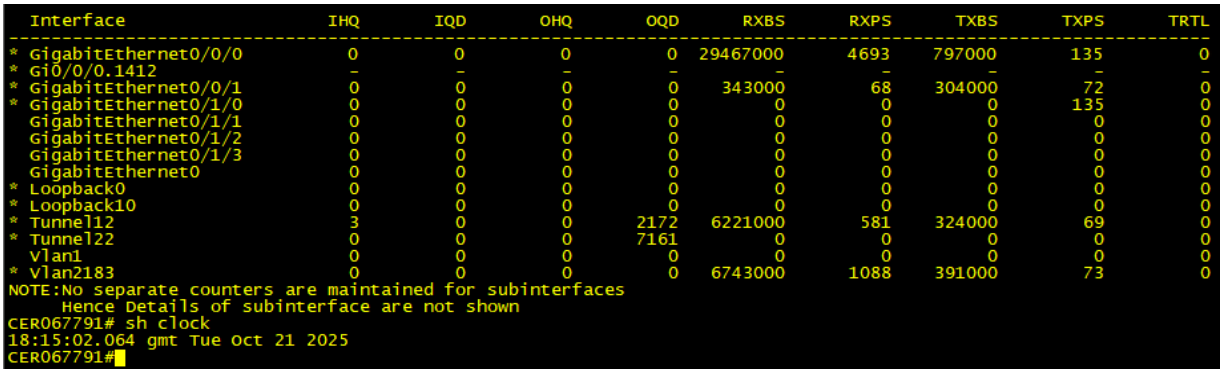

```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0         0         0         0   29467000       4693     797000        135         0
* Gi0/0/0.1412               -         -         -         -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1       0         0         0         0     343000         68     304000         72         0
* GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0          0          0          0        135         0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0           0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback10                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel12                   3         0         0      2172    6221000        581     324000         69         0
* Tunnel22                   0         0         0      7161          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan2183                   0         0         0         0    6743000       1088     391000         73         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067791# sh clock
18:15:02.064 gmt Tue Oct 21 2025
CER067791#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1167	3	Antioquia, San Juan de Urabá; Carrera 20 B # 19-11	32 Mbps	29,1

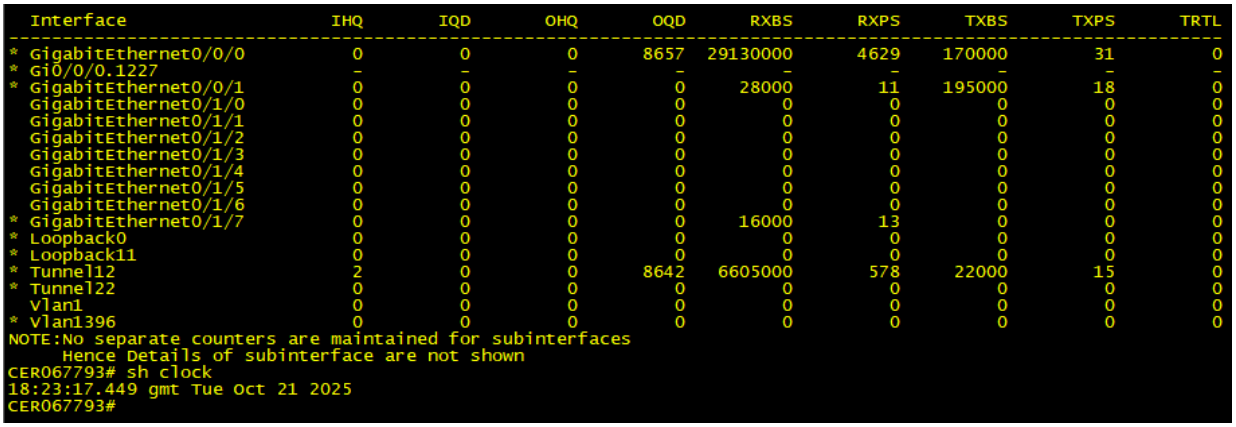


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0       8657   29130000       4629     170000         31          0
* Gi0/0/0.1227                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0      28000         11     195000         18          0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0      16000         13          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback11                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                    2          0          0       8642    6605000        578      22000         15          0
* Tunnel22                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1396                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067793# sh clock
18:23:17.449 gmt Tue Oct 21 2025
CER067793#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1169	3	Antioquia, San Vicente Ferrer; Calle 30 # 32-84	32 Mbps	29,6

```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0     61437   29672000       4721     178000         38         0
* Gi0/0/0.3183                  -         -         -         -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0     148000         34     341000         77         0
  GigabitEthernet0/1/0          0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0         0         0         0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0         0         0         0      36000         46          0          0         0
  GigabitEthernet0              0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback11                    0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback20                    0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel12                      3         0         0     61425    7377000        772     172000         39         0
* Tunnel22                      0         0         0         1          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan358                       0         0         0         0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067795# sh clock
19:36:18.824 gmt Tue Oct 21 2025
CER067795#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1170	3	Antioquia, Santa Fé de Antioquia; Calle 11 # 11 - 70	32 Mbps	29,4

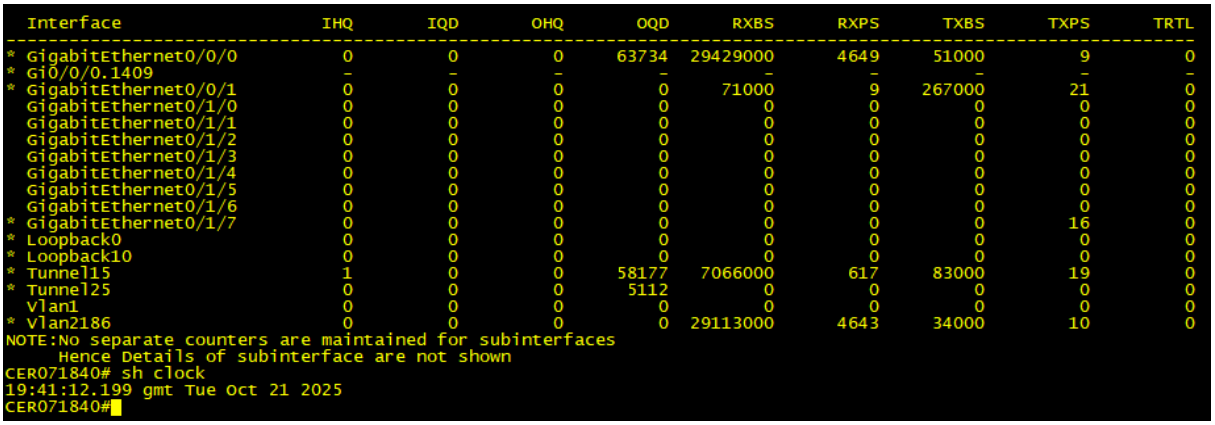


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0         0         0     63734   29429000       4649      51000          9          0
* Gi0/0/0.1409               -         -         -         -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0         0         0         0      71000          9     267000         21          0
  GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0         0         0         0          0          0          0         16          0
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                   1         0         0     58177    7066000        617      83000         19          0
* Tunnel25                   0         0         0      5112          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan2186                   0         0         0         0   29113000       4643      34000         10          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER071840# sh clock
19:41:12.199 gmt Tue Oct 21 2025
CER071840#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1183	3	Cundinamarca, Anolaima; Carrera 5 # 1-06 Piso 2	32 Mbps	30,9


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   30969000       4509     359000          1          0
* GiO/O/O.3741                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GiO/O/O.4029                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     315000         78     789000         98          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      14000         11          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0         80          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback11                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      0          0          0          0    5764000        528     309000         70          0
* Tunnel26                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0      12000         10          0          0          0
* Vlan1044                      0          0          0          0   10721000       1611     350000         71          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067577# sh clock
19:46:45.675 gmt Tue Oct 21 2025
CER067577#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1186	3	Cundinamarca, Fosca; Carrera 2 # 3-40 Piso 2	32 Mbps	31

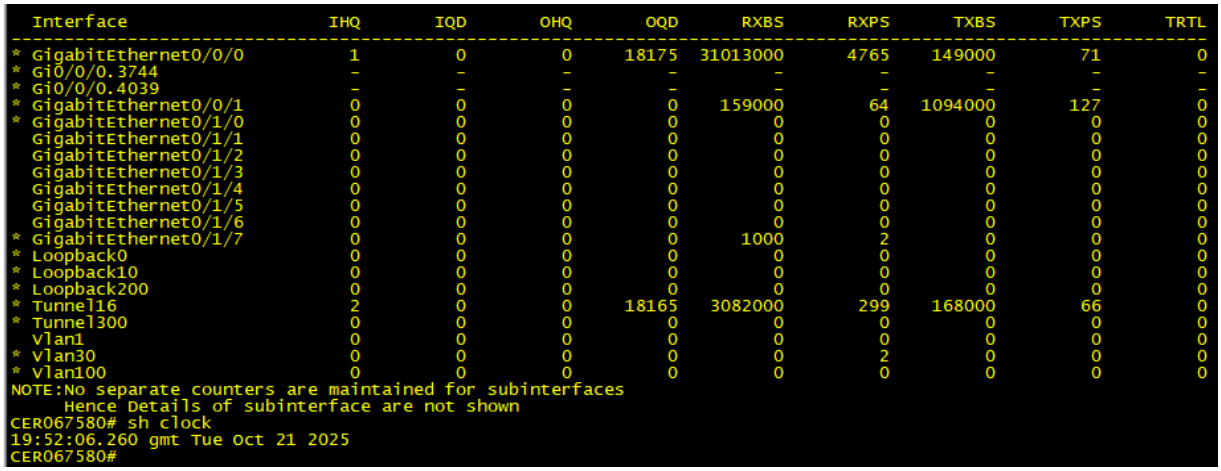


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          1          0          0      18175   31013000       4765     149000         71          0
* Gi0/0/0.3744                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4039                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0     159000         64    1094000        127          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                      2          0          0      18165    3082000        299     168000         66          0
* Tunnel300                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0          0          2          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067580# sh clock
19:52:06.260 gmt Tue Oct 21 2025
CER067580#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1196	4	Cundinamarca, Macheta; Calle 5 # 7-03/07	32 Mbps	30

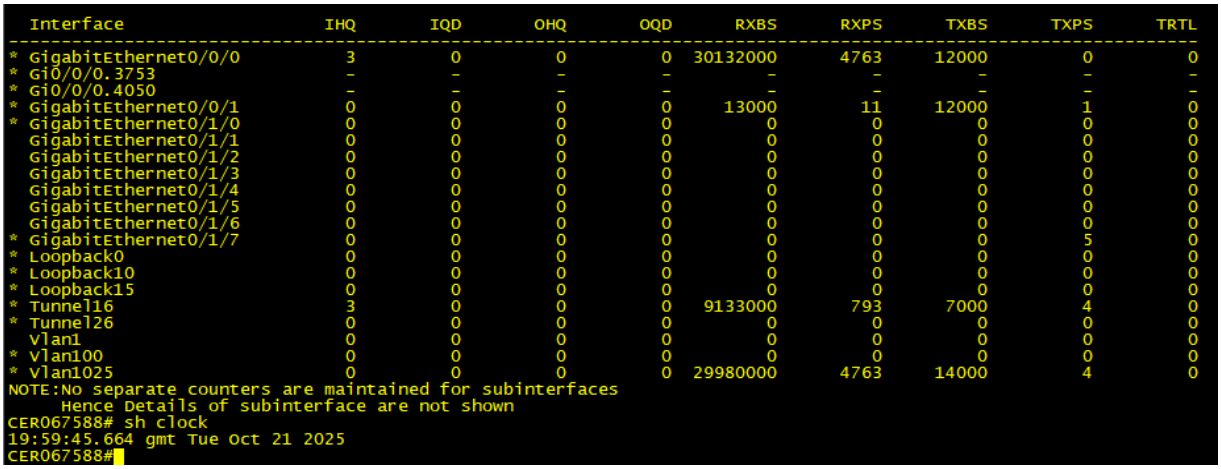


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       3          0          0          0   30132000       4763      12000          0          0
* Gi0/0/0.3753               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4050               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0      13000         11      12000          1          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          5          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback15                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel16                   3          0          0          0    9133000        793       7000          4          0
* Tunnel26                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1025                   0          0          0          0   29980000       4763      14000          4          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067588# sh clock
19:59:45.664 gmt Tue Oct 21 2025
CER067588#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1197	4	Cundinamarca, Manta; Calle 3 # 2-102	32 Mbps	31,7

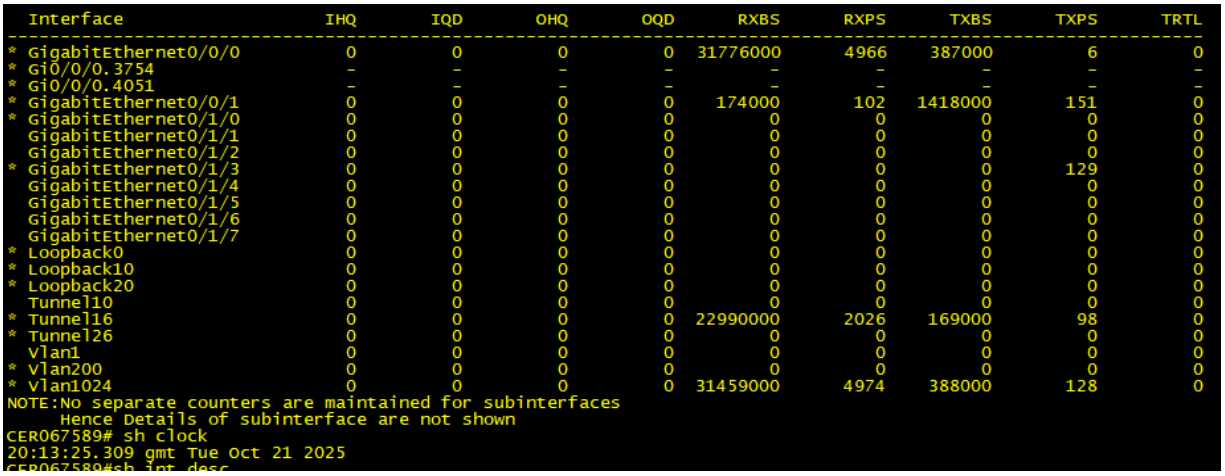

```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0         0         0         0   31776000       4966     387000          6         0
* Gi0/0/0.3754               -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.4051               -         -         -         -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1       0         0         0         0     174000        102    1418000        151         0
* GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0          0          0          0        129         0
  GigabitEthernet0/1/4       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7       0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback10                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback20                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Tunnel10                   0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                   0         0         0         0   22990000       2026     169000         98         0
* Tunnel26                   0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan200                    0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan1024                   0         0         0         0   31459000       4974     388000        128         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067589# sh clock
20:13:25.309 gmt Tue Oct 21 2025
CER067589#sh int desc
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1199	4	Cundinamarca, Nocaima; Carrera 4 # 5-38	32 Mbps	29,2

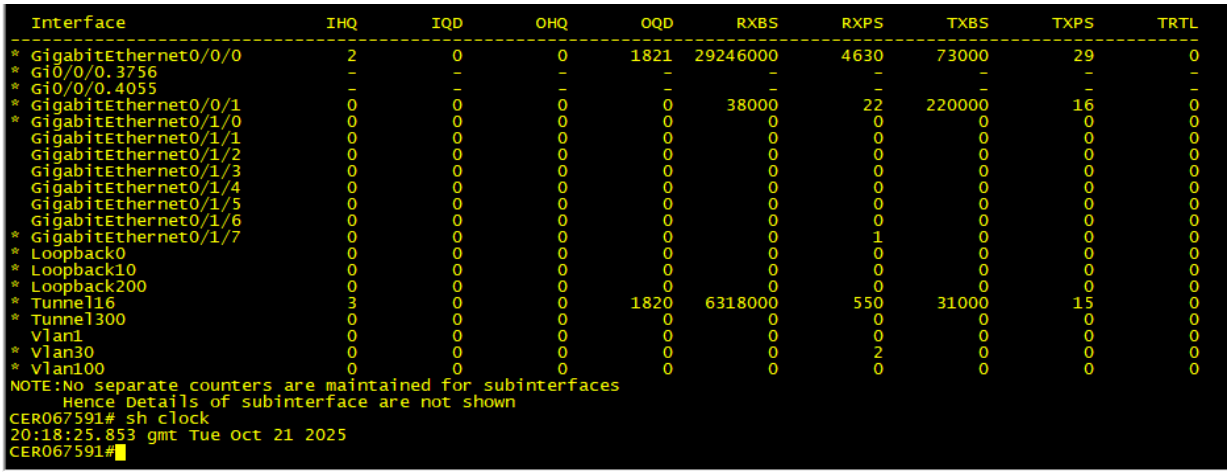


```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          2          0         0       1821   29246000       4630      73000         29         0
* Gi0/0/0.3756                  -          -         -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.4055                  -          -         -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0         0          0      38000         22     220000         16         0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0         0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0         0          0          0          1          0          0         0
* Loopback0                     0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                   0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel16                      3          0         0       1820    6318000        550      31000         15         0
* Tunnel300                     0          0         0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0         0          0          0          0          0          0         0
* Vlan30                        0          0         0          0          0          2          0          0         0
* Vlan100                       0          0         0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067591# sh clock
20:18:25.853 gmt Tue Oct 21 2025
CER067591#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1545	2	Casanare, Yopal; Calle 7 # 19- 10 Piso 2	32 Mbps	29,1


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0      14058   29176000       4647     572000        114          0
* Gi0/0/0.2583                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0       4000          2          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0     528000        117    1050000        147          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                      2          0          0      14019    5470000        533     547000        117          0
* Tunnel27                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     538000        122    1066000        151          0
* Vlan632                       0          0          0          0       4000          3          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER081036# sh clock
20:21:59.764 gmt Tue Oct 21 2025
CER081036#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
491	2	Valle Del Cauca, Buenaventura; Calle 4 Sur # 73B Esquina, Casa de Justicia	25 Mbps	23,5

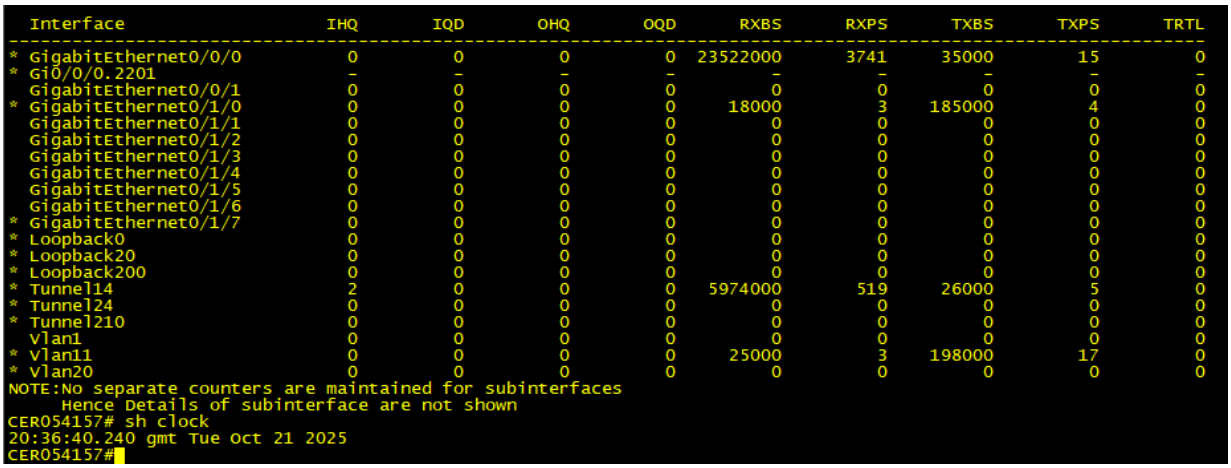

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   23522000       3741      35000         15          0
* Gi0/0/0.2201                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      18000          3     185000          4          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      2          0          0          0    5974000        519      26000          5          0
* Tunnel24                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel210                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      25000          3     198000         17          0
* Vlan20                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054157# sh clock
20:36:40.240 gmt Tue Oct 21 2025
CER054157#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
693	4	Tolima, Casabianca; Calle 4 Nro. 2-56 segundo piso	25 Mbps	23,8

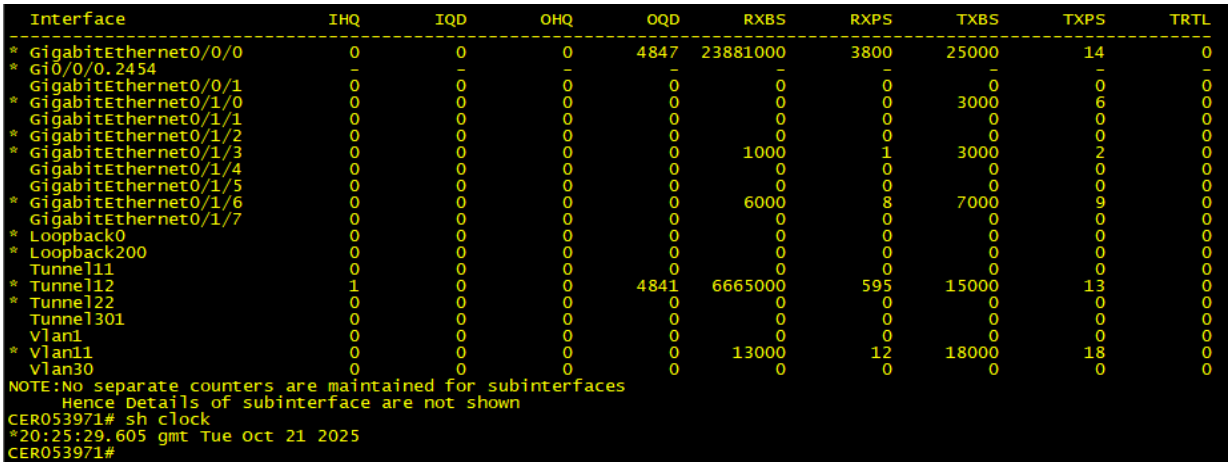


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0       4847   23881000       3800      25000         14          0
* Gi0/0/0.2454                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0       3000          6          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0       1000          1       3000          2          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0       6000          8       7000          9          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel11                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                      1          0          0       4841    6665000        595      15000         13          0
* Tunnel22                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      13000         12      18000         18          0
  Vlan30                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER053971# sh clock
*20:25:29.605 gmt Tue Oct 21 2025
CER053971#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
383-B	3	Cundinamarca, Paratebueno; Calle 2 # 9-21 piso 1	25 Mbps	23,7


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0          0          0          0          3          0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0   23741000       3773       4000          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                   1          0          0          0          0          0          0          2          0
* Tunnel21                   0          0          0          0    7012000        606       1000          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1348                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER054429# sh clock
12:20:20.977 gmt Wed Oct 22 2025
CER054429#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
387-B	3	Cundinamarca, Silvania; Calle 10 # 4-58/60, Palacio de Justicia	25 Mbps	23,7

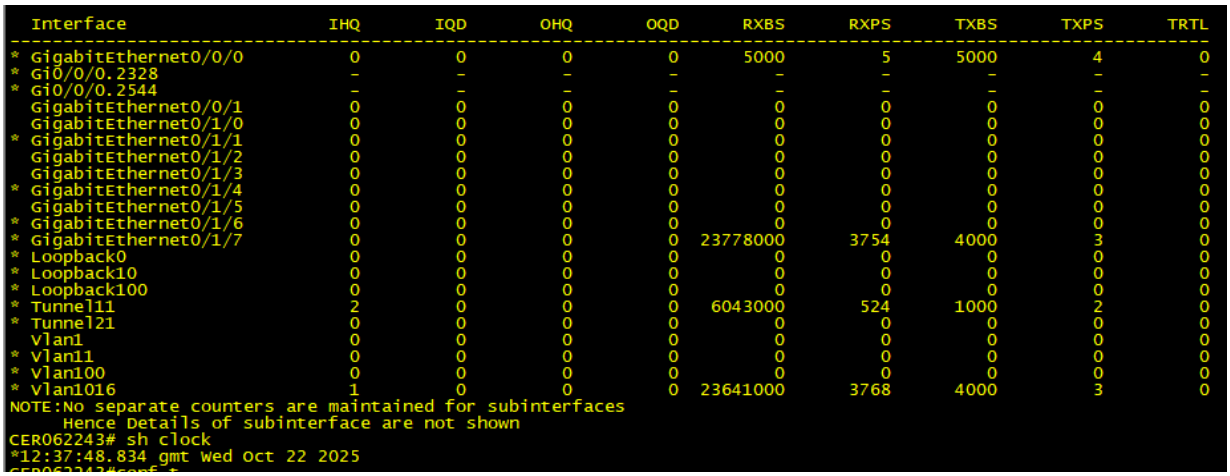

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0       5000          5       5000          4          0
* Gi0/0/0.2328                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2544                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   23778000       3754       4000          3          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback100                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      2          0          0          0    6043000        524       1000          2          0
* Tunnel21                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1016                      1          0          0          0   23641000       3768       4000          3          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062243# sh clock
*12:37:48.834 gmt Wed Oct 22 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
388-B	4	Cundinamarca, Simijaca; Calle 8 # 8-37	25 Mbps	22,5

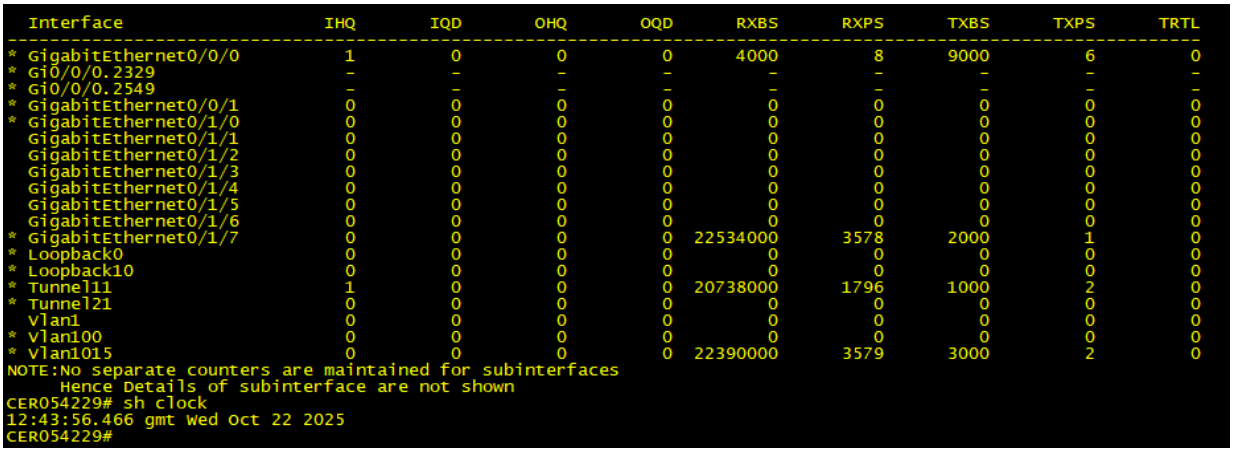


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          1          0          0          0       4000          8       9000          6         0
* Gi0/0/0.2329                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.2549                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   22534000       3578       2000          1         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel11                      1          0          0          0   20738000       1796       1000          2         0
* Tunnel21                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan1015                      0          0          0          0   22390000       3579       3000          2         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054229# sh clock
12:43:56.466 gmt Wed Oct 22 2025
CER054229#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
447-B	4	Sucre, La Unión; Calle 14 # 8A-103	25 Mbps	23,1


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0         0         0         0       1000          1          0          0         0
* Gi0/0/0.2438               -         -         -         -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1       0         0         0      2009   23160000       3431     397000        226         0
* Gi0/0/1.3363               -         -         -         -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0     256000        254    4658000        439         0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0           0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback10                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel13                   0         0         0      2009    5435000        504     278000        260         0
* Tunnel23                   0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan11                     0         0         0         0     256000        260    4811000        452         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054424-CER138654# sh clock
12:54:49.129 gmt Wed Oct 22 2025
CER054424-CER138654#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
486-B	2	Valle Del Cauca, Alcalá; Carrera 8 # 8-47	25 Mbps	22,9

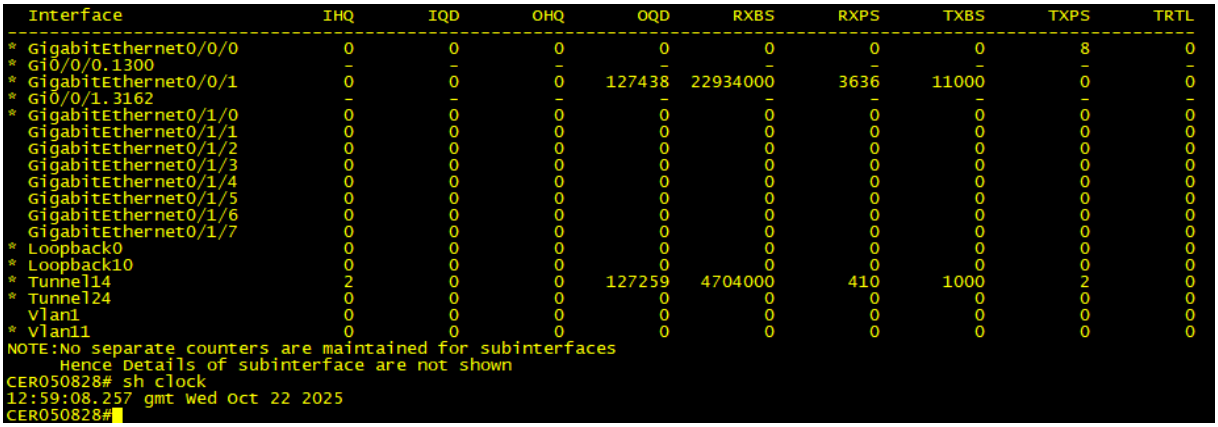

```
  Interface                IHQ         IQD          OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0           0            0           0           0           0           0           8           0
* Gi0/0/0.1300             -           -            -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1     0           0            0           127438      22934000    3636        11000       0           0
* Gi0/0/1.3162             -           -            -           -           -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/1/0     0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1     0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2     0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3     0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4     0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5     0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6     0           0            0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7     0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10               0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel14                 2           0            0           127259      4704000     410         1000        2           0
* Tunnel24                 0           0            0           0           0           0           0           0           0
  Vlan1                    0           0            0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                   0           0            0           0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER050828# sh clock
12:59:08.257 gmt Wed Oct 22 2025
CER050828#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
488-B	3	Valle Del Cauca, Ansermanuevo; Calle 7 # 3-28	25 Mbps	23,5

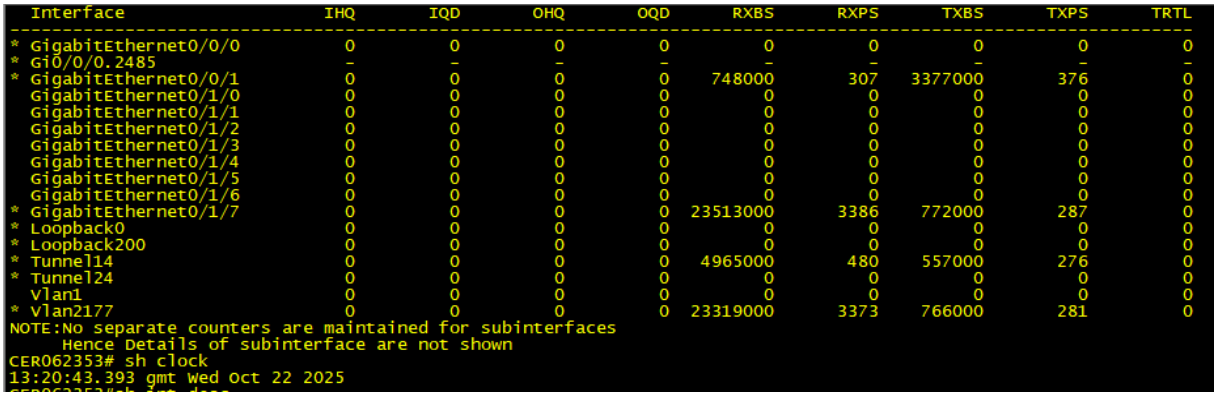


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Gi0/0/0.2485             -          -          -          -          -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1     0          0          0          0          748000      307         3377000     376         0
  GigabitEthernet0/1/0     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6     0          0          0          0          0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7     0          0          0          0          23513000    3386        772000      287         0
* Loopback0                0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Loopback200              0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Tunnel14                 0          0          0          0          4965000     480         557000      276         0
* Tunnel24                 0          0          0          0          0           0           0           0           0
  Vlan1                    0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Vlan2177                 0          0          0          0          23319000    3373        766000      281         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062353# sh clock
13:20:43.393 gmt Wed Oct 22 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
489-B	4	Valle Del Cauca, Argelia; Calle 3 # 6-33 / 37	25 Mbps	22,5


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/0.2486                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     584000        100     604000         89          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   22559000       3455     704000        109          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback11                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      0          0          0          0    1702000        188     505000        101          0
* Tunnel24                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     495000        100     618000         93          0
* Vlan2204                      0          0          0          0   22311000       3431     588000        105          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062354# sh clock
13:23:55.619 gmt Wed Oct 22 2025
CER062354#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
490-B	3	Valle Del Cauca, Bolívar; Calle 3 # 4-81	25 Mbps	22,8

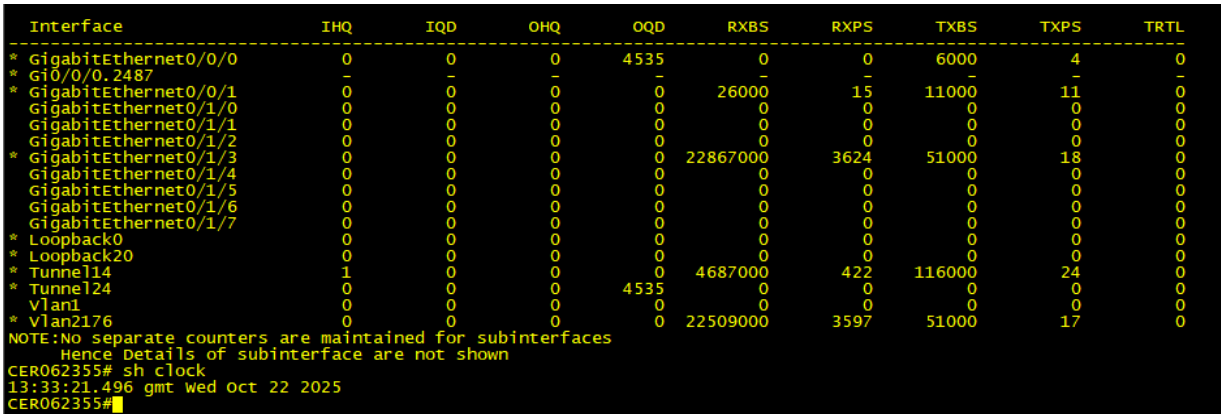


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          4535      0          0          6000       4          0
* Gi0/0/0.2487                -          -          -          -         -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         26000      15         11000      11         0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         22867000   3624       51000      18         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback20                  0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Tunnel14                    1          0          0          0         4687000    422        116000     24         0
* Tunnel24                    0          0          0          4535      0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Vlan2176                    0          0          0          0         22509000   3597       51000      17         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062355# sh clock
13:33:21.496 gmt Wed Oct 22 2025
CER062355#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
496-B	4	Valle Del Cauca, Calima; Calle 12 # 7-49	25 Mbps	23,6

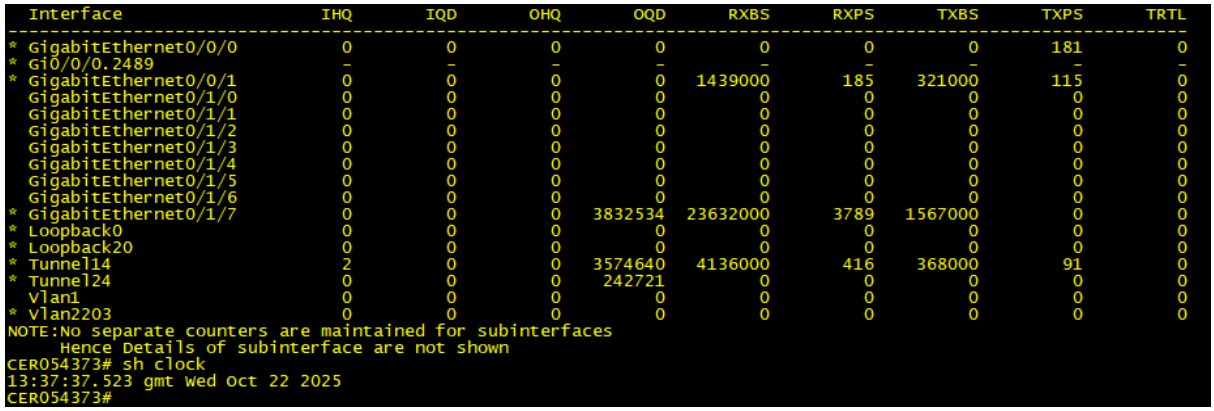


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0          0          0          0        181          0
* Gi0/0/0.2489               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0    1439000        185     321000        115          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0    3832534   23632000       3789    1567000          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                   2          0          0    3574640    4136000        416     368000         91          0
* Tunnel24                   0          0          0     242721          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan2203                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054373# sh clock
13:37:37.523 gmt Wed Oct 22 2025
CER054373#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
498-B	4	Valle Del Cauca, Dovio; Calle 12 # 10-12	25 Mbps	23,3

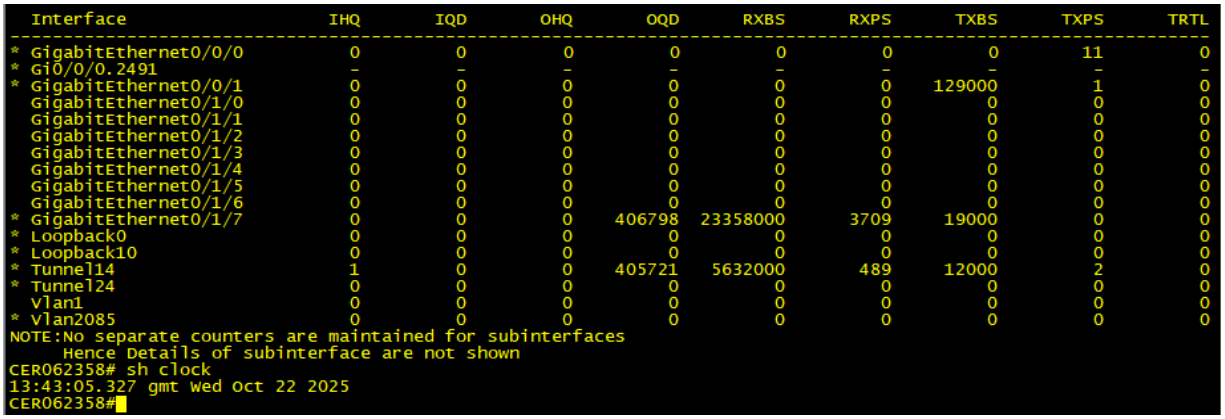

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0           0           0           0          11          0
* Gi0/0/0.2491                  -          -          -          -           -           -           -           -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0           0           0      129000           1          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0           0           0           0           0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0     406798    23358000        3709       19000           0          0
* Loopback0                     0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback10                    0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Tunnel14                      1          0          0     405721     5632000         489       12000           2          0
* Tunnel24                      0          0          0          0           0           0           0           0          0
  Vlan1                         0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Vlan2085                      0          0          0          0           0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062358# sh clock
13:43:05.327 gmt Wed Oct 22 2025
CER062358#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
499-B	3	Valle Del Cauca, Ginebra; Carrera 2 # 3-33	25 Mbps	23,4

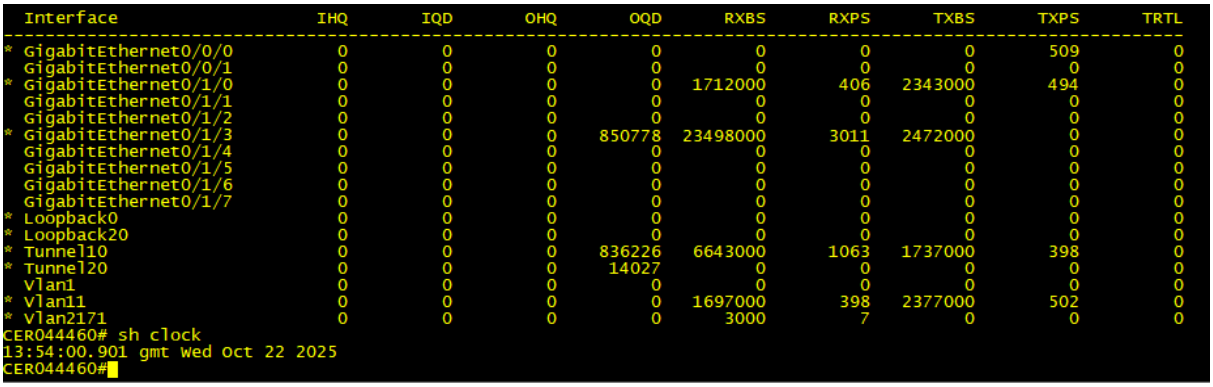


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0           0           0           0         509          0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0           0           0           0           0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     1712000         406     2343000         494          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0           0           0           0           0          0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0     850778    23498000        3011     2472000           0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0           0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Loopback20                 0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Tunnel10                   0          0          0     836226     6643000        1063     1737000         398          0
* Tunnel20                   0          0          0      14027           0           0           0           0          0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     1697000         398     2377000         502          0
* Vlan2171                   0          0          0          0        3000           7           0           0          0
CER044460# sh clock
13:54:00.901 gmt Wed Oct 22 2025
CER044460#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
500-B	3	Valle del Cauca, Guacarí; Calle 5a # 4-94 barrio Chapinero	25 Mbps	23,8


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0          0           0           0           8          0
* Gi0/0/0.865                 -          -          -          -          -           -           -           -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0     110000           4      141000           8          0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0           0           0           0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0           0           0           0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0      40517   23879000        3794       21000           0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0           0           0           0          0
* Loopback10                  0          0          0          0          0           0           0           0          0
* Tunnel14                    1          0          0      40447    7458000         657      121000          15          0
* Tunnel24                    0          0          0         48          0           0           0           0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0           0           0           0          0
* Vlan3164                    0          0          0          0          0           0           0           0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054232# sh clock
14:04:14.489 gmt Wed Oct 22 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
501-B	3	Valle Del Cauca, La Cumbre; Carrera 4 # 1-42	25 Mbps	23

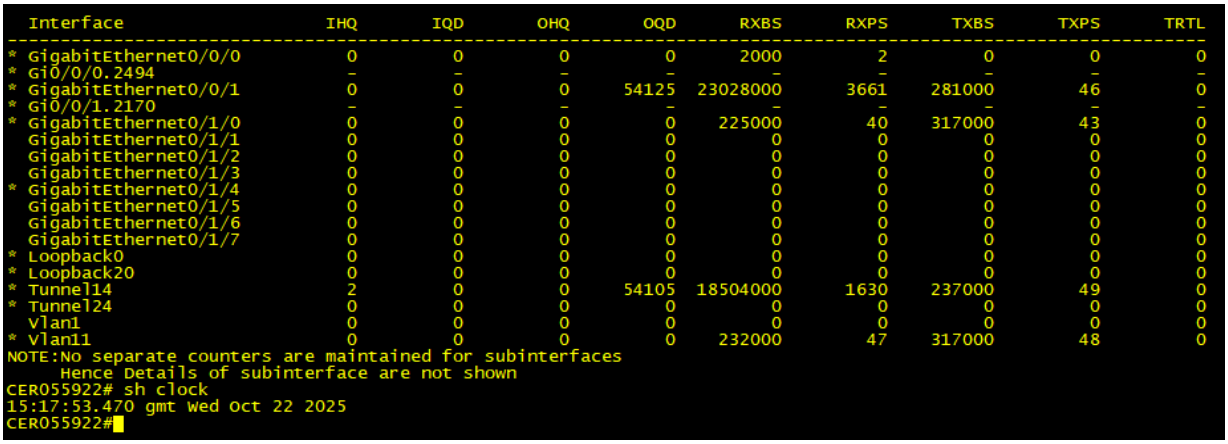


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0       2000          2          0          0          0
* GiO/O/0.2494                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0      54125   23028000       3661     281000         46          0
* GiO/O/1.2170                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     225000         40     317000         43          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      2          0          0      54105   18504000       1630     237000         49          0
* Tunnel24                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     232000         47     317000         48          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055922# sh clock
15:17:53.470 gmt Wed Oct 22 2025
CER055922#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
502-B	3	Valle Del Cauca, La Victoria; Carrera 7 # 8-45	25 Mbps	23,6

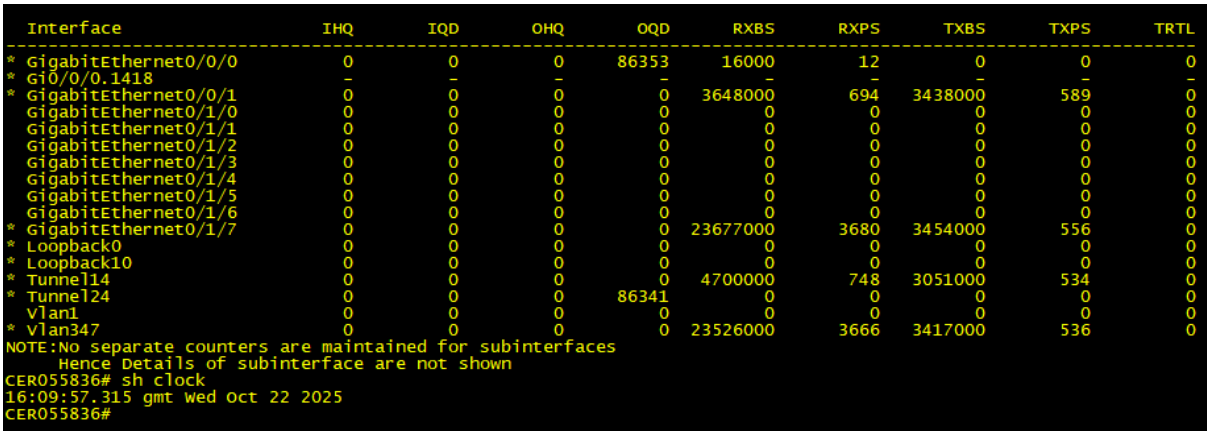


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          86353     16000      12         0          0          0
* GI0/0/0.1418                -          -          -          -         -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         3648000    694        3438000    589        0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         23677000   3680       3454000    556        0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Tunnel14                    0          0          0          0         4700000    748        3051000    534        0
* Tunnel24                    0          0          0          86341     0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Vlan347                     0          0          0          0         23526000   3666       3417000    536        0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO55836# sh clock
16:09:57.315 gmt Wed Oct 22 2025
CERO55836#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
506-B	4	Valle Del Cauca, Restrepo; Carrera 12 # 12-15	25 Mbps	23,1

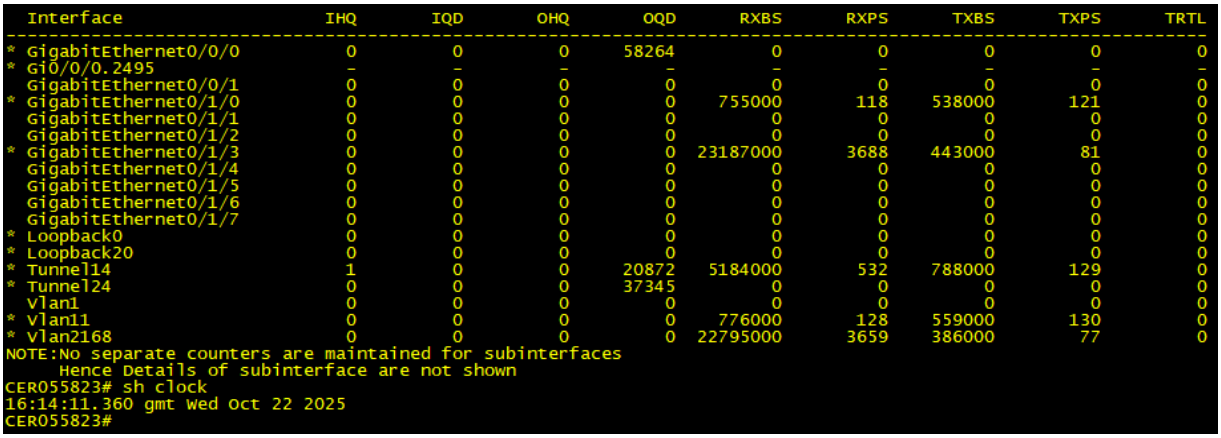


```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           58264       0           0           0           0           0
* Gi0/0/0.2495                -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0           755000      118         538000      121         0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0           23187000    3688        443000      81          0
  GigabitEthernet0/1/4        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback20                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Tunnel14                    1           0           0           20872       5184000     532         788000      129         0
* Tunnel24                    0           0           0           37345       0           0           0           0           0
  Vlan1                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                      0           0           0           0           776000      128         559000      130         0
* Vlan2168                    0           0           0           0           22795000    3659        386000      77          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055823# sh clock
16:14:11.360 gmt Wed Oct 22 2025
CER055823#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
509-B	4	Valle Del Cauca, Trujillo; Carrera 18 # 19-16	25 Mbps	23,6

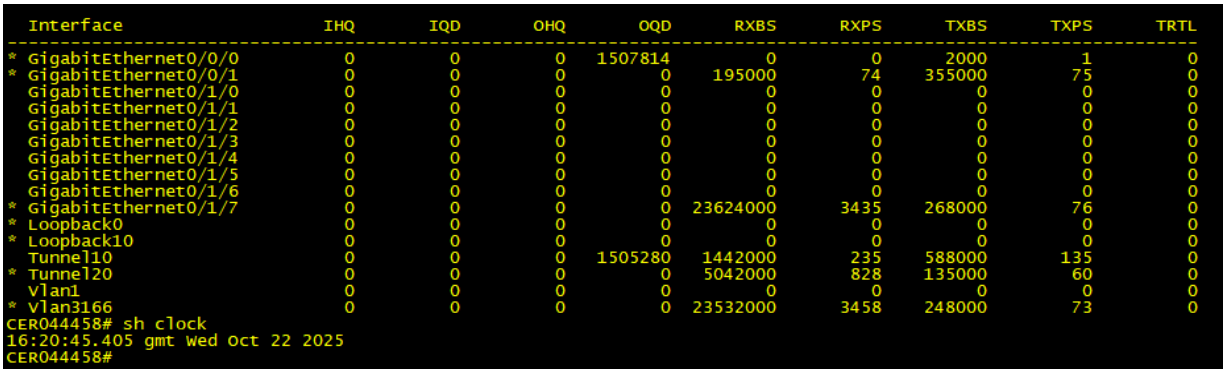


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0    1507814           0           0     2000           1           0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0      195000          74   355000          75           0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0           0           0        0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0           0           0        0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0           0           0        0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0           0           0        0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0           0           0        0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0           0           0        0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0           0           0        0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0    23624000        3435   268000          76           0
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0        0           0           0
* Loopback10                 0          0          0          0           0           0        0           0           0
  Tunnel10                   0          0          0    1505280     1442000         235   588000         135           0
* Tunnel20                   0          0          0          0     5042000         828   135000          60           0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0        0           0           0
* Vlan3166                   0          0          0          0    23532000        3458   248000          73           0
CER044458# sh clock
16:20:45.405 gmt Wed Oct 22 2025
CER044458#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
513-B	4	Valle Del Cauca, Versalles; Carrera 6 # 6-43, Alcaldía	25 Mbps	24,9

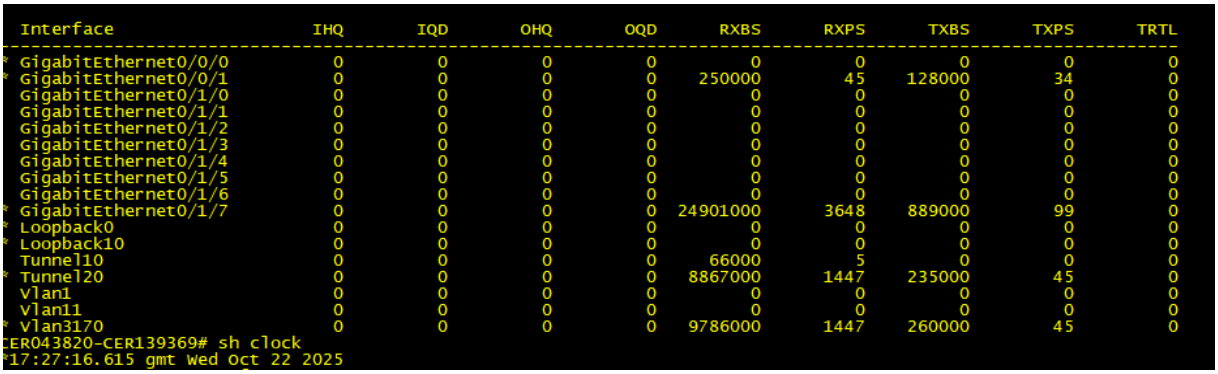


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0      250000          45      128000          34           0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0    24901000        3648      889000          99           0
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback10                 0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Tunnel10                   0          0          0          0       66000           5           0           0           0
* Tunnel20                   0          0          0          0     8867000        1447      235000          45           0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Vlan11                     0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan3170                   0          0          0          0     9786000        1447      260000          45           0
CER043820-CER139369# sh clock
*17:27:16.615 gmt Wed Oct 22 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
552-B	4	Sucre, Ovejas; Calle 24 # 15C-23 Calle La Nariño	25 Mbps	22,7

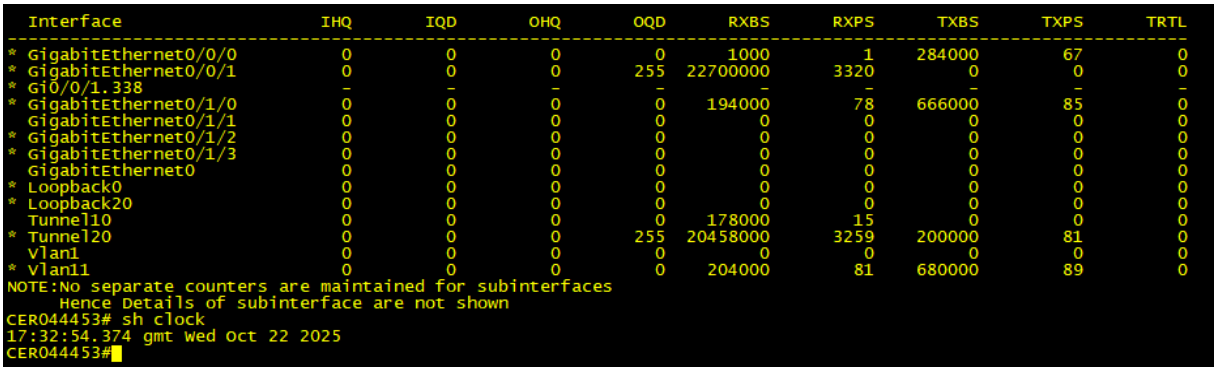

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0       1000          1     284000         67          0
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0        255   22700000       3320          0          0          0
* Gi0/0/1.338                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0     194000         78     666000         85          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0            0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel10                    0          0          0          0     178000         15          0          0          0
* Tunnel20                    0          0          0        255   20458000       3259     200000         81          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0     204000         81     680000         89          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO44453# sh clock
17:32:54.374 gmt Wed Oct 22 2025
CERO44453#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
554-B	4	Sucre, San Pedro; Carrera 9 # 18-77, Barrio San Martín	25 Mbps	22,5

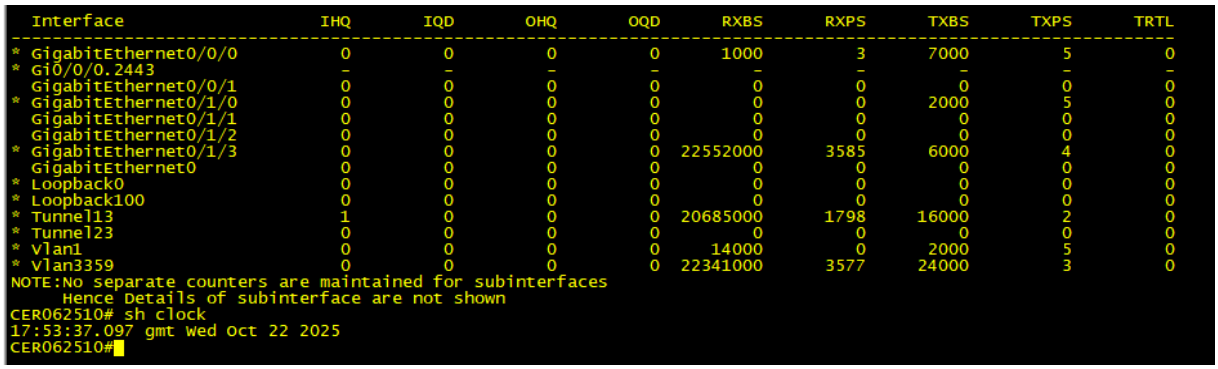

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0         1000           3       7000          5          0
* Gi0/0/0.2443                -          -          -          -            -           -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0            0           0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0            0           0       2000          5          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0            0           0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0            0           0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0     22552000        3585       6000          4          0
  GigabitEthernet0            0          0          0          0            0           0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0            0           0          0          0          0
* Loopback100                 0          0          0          0            0           0          0          0          0
* Tunnel13                    1          0          0          0     20685000        1798      16000          2          0
* Tunnel23                    0          0          0          0            0           0          0          0          0
* Vlan1                       0          0          0          0        14000           0       2000          5          0
* Vlan3359                    0          0          0          0     22341000        3577      24000          3          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062510# sh clock
17:53:37.097 gmt Wed Oct 22 2025
CER062510#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
645-B	4	Cundinamarca, Guataqui; Carrera 4 # 5-03, Palacio Municipal	25 Mbps	23,2

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0        440       6000          4       3000          3          0
* GiO/0/0.2313                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GiO/0/0.2561                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0   23212000       3681     200000         68          0
* GiO/0/1.1029                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      41000         23     101000         22          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0       1000          1       1000          1          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback15                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel11                      0          0          0        440     363000         28          0          0          0
* Tunnel21                      0          0          0          0    4732000        419      31000         22          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      31000         24     115000         20          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CSJ_GUATAQUI_PALACIO_MUNICIPAL# sh clock
18:01:19.306 gmt Wed Oct 22 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
646-B	4	Cundinamarca, Guatavita; Calle 6 # 2-09	25 Mbps	23,1


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* GiO/0/0.2314                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GiO/0/0.2529                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      29000         22     182000         33          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   23121000       3672      81000         31          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      2          0          0          0    4939000        453      38000         24          0
* Tunnel21                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1028                      2          0          0          0    5353000        863      82000         31          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062422# sh clock
18:05:10.691 gmt Wed Oct 22 2025
CER062422#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
655-B	3	Cundinamarca, Supatá; Carrera 7 # 3-44	25 Mbps	23,6

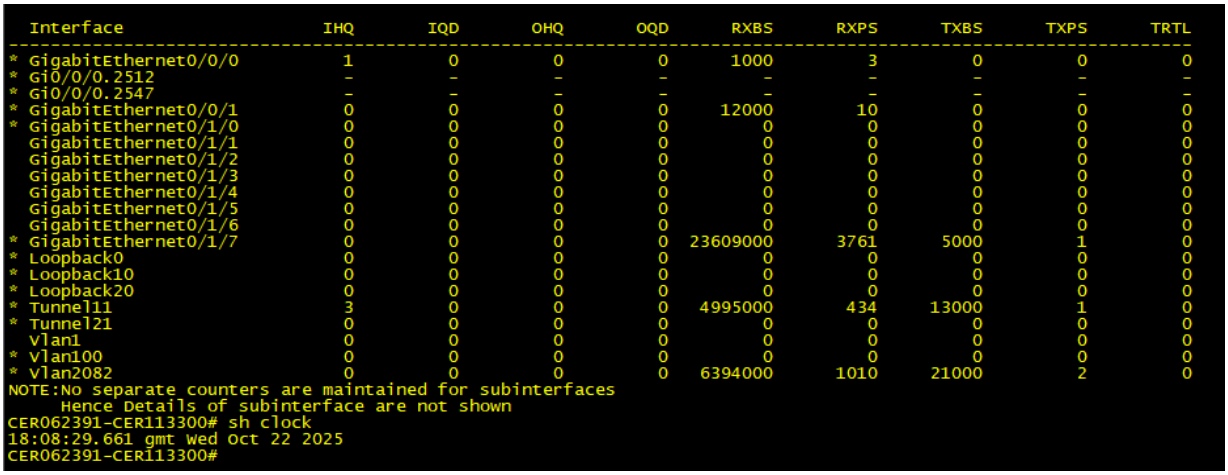


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       1         0         0         0       1000          3          0          0          0
* Gi0/0/0.2512               -         -         -         -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2547               -         -         -         -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0         0         0         0      12000         10          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0         0         0         0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0         0         0         0   23609000       3761       5000          1          0
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                   3         0         0         0    4995000        434      13000          1          0
* Tunnel21                   0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan100                    0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Vlan2082                   0         0         0         0    6394000       1010      21000          2          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062391-CER113300# sh clock
18:08:29.661 gmt Wed Oct 22 2025
CER062391-CER113300#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
660-B	4	Cundinamarca, Villagomez; Carrera 3 # 4-22	25 Mbps	22,8

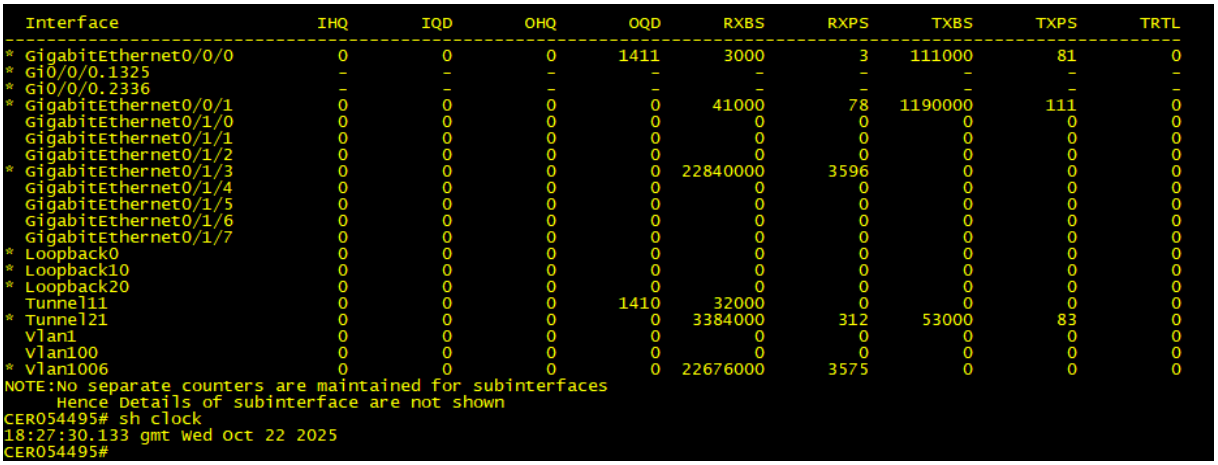


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0       1411       3000          3     111000         81          0
* Gi0/0/0.1325                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2336                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      41000         78    1190000        111          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0   22840000       3596          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel11                      0          0          0       1410      32000          0          0          0          0
* Tunnel21                      0          0          0          0    3384000        312      53000         83          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1006                      0          0          0          0   22676000       3575          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054495# sh clock
18:27:30.133 gmt Wed Oct 22 2025
CER054495#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
687-B	4	Sucre, Buenavista; Carrera 10 #7-33	25 Mbps	22,5

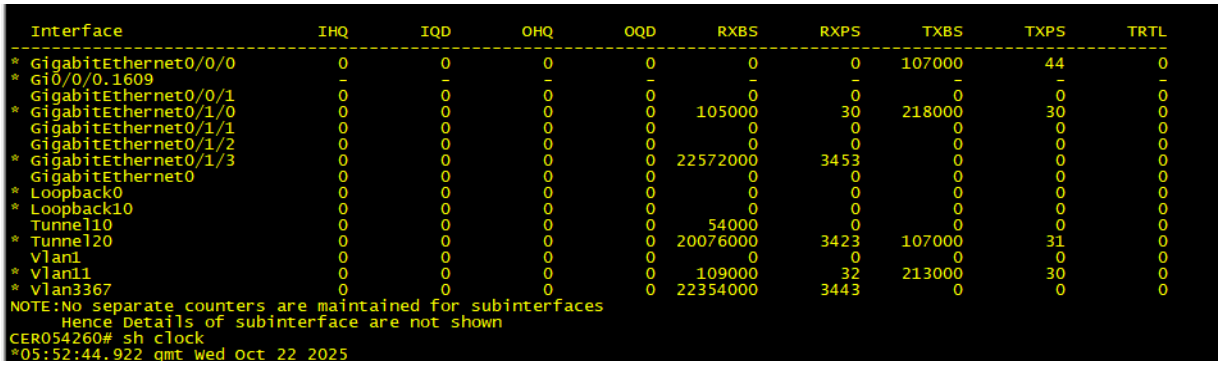

```
  Interface                   IHQ         IQD         OHQ         OQD         RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0           0           0           0           0           0           107000      44          0
* Gi0/0/0.1609                -           -           -           -           -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0        0           0           0           0           105000      30          218000      30          0
  GigabitEthernet0/1/1        0           0           0           0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2        0           0           0           0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/3        0           0           0           0           22572000    3453        0           0           0
  GigabitEthernet0            0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback0                   0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Loopback10                  0           0           0           0           0           0           0           0           0
  Tunnel10                    0           0           0           0           54000       0           0           0           0
* Tunnel20                    0           0           0           0           20076000    3423        107000      31          0
  Vlan1                       0           0           0           0           0           0           0           0           0
* Vlan11                      0           0           0           0           109000      32          213000      30          0
* Vlan3367                    0           0           0           0           22354000    3443        0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054260# sh clock
*05:52:44.922 gmt Wed Oct 22 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
690-B	4	Sucre, El Roble; Calle 6 # 10-79	25 Mbps	22,5

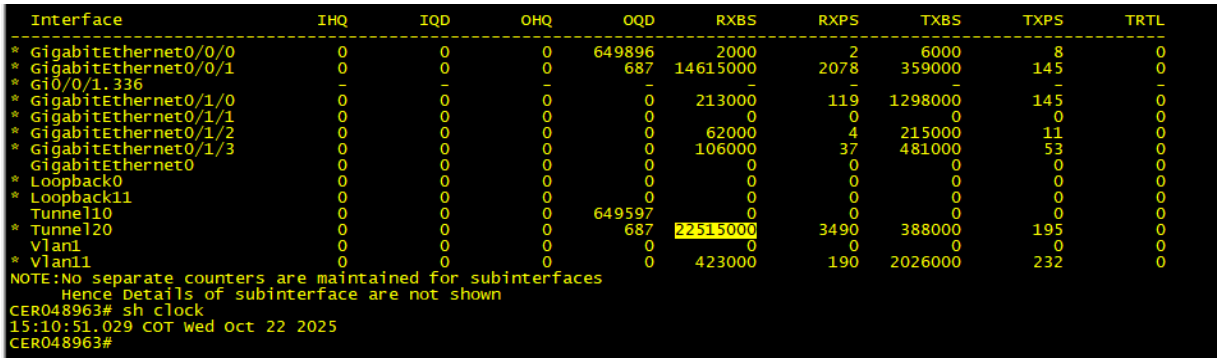


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     649896       2000          2       6000          8          0
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0        687   14615000       2078     359000        145          0
* Gi0/0/1.336                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     213000        119    1298000        145          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0      62000          4     215000         11          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0     106000         37     481000         53          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback11                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel10                      0          0          0     649597          0          0          0          0          0
* Tunnel20                      0          0          0        687   22515000       3490     388000        195          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     423000        190    2026000        232          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER048963# sh clock
15:10:51.029 COT Wed Oct 22 2025
CER048963#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
691-B	4	Sucre, Galeras; Carrera 12 # 9 -95	25 Mbps	24,8


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/0.2436               -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     330000        107     449000         74          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0   24805000       3906     692000        136          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel13                   0          0          0          0     161000         22      39000         14          0
* Tunnel23                   0          0          0          0    5444000        499     300000         86          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     331000        107     460000         79          0
* Vlan2084                   0          0          0          0   24602000       3905     757000        145          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062371# sh clock
*13:56:02.974 gmt Wed Oct 22 2025
CER062371#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
699-B	4	Valle Del Cauca, El Aguila;Calle 9 Nro.3-02 Palacio Municipal piso 1º	25 Mbps	24,2

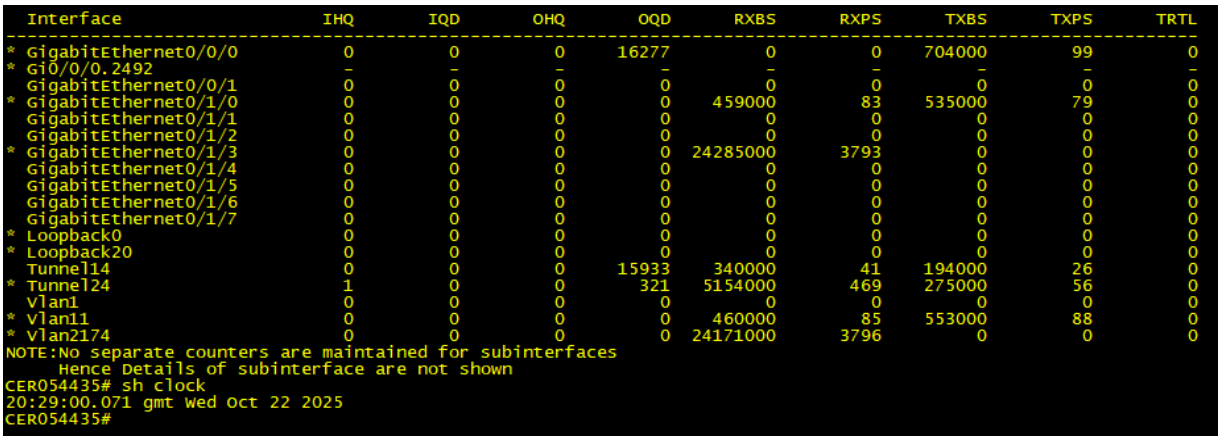


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          16277     0          0          704000     99        0
* GI0/0/0.2492                -          -          -          -         -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         459000     83         535000     79        0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         24285000   3793       0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback20                  0          0          0          0         0          0          0          0         0
  Tunnel14                    0          0          0          15933     340000     41         194000     26        0
* Tunnel24                    1          0          0          321       5154000    469        275000     56        0
  Vlan1                       0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Vlan11                      0          0          0          0         460000     85         553000     88        0
* Vlan2174                    0          0          0          0         24171000   3796       0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054435# sh clock
20:29:00.071 gmt Wed Oct 22 2025
CER054435#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
700-B	4	Valle Del Cauca, El Cairo; Carrera 4 # 9-17	25 Mbps	24,9

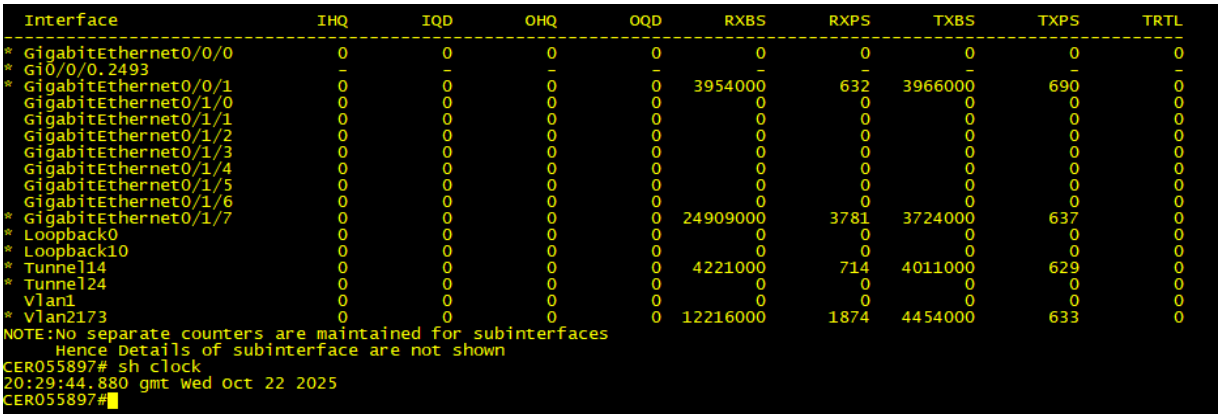


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/0.2493                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0    3954000        632    3966000        690          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   24909000       3781    3724000        637          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      0          0          0          0    4221000        714    4011000        629          0
* Tunnel24                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan2173                      0          0          0          0   12216000       1874    4454000        633          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055897# sh clock
20:29:44.880 gmt Wed Oct 22 2025
CER055897#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
916-B	1	Santander, Bucaramanga; Calle 45 # 14A-50	25 Mbps	24,4

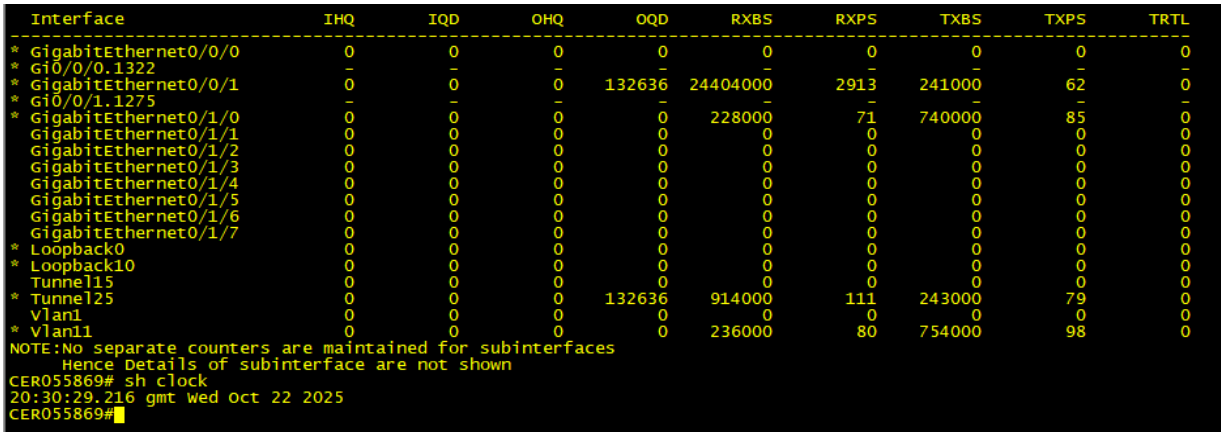


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/0.1322               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0     132636   24404000       2913     241000         62          0
* Gi0/0/1.1275               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     228000         71     740000         85          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel15                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel25                   0          0          0     132636     914000        111     243000         79          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     236000         80     754000         98          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER055869# sh clock
20:30:29.216 gmt Wed Oct 22 2025
CER055869#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
939-B	4	Santander, Rionegro; Calle 11 # 8-40	25 Mbps	23,4

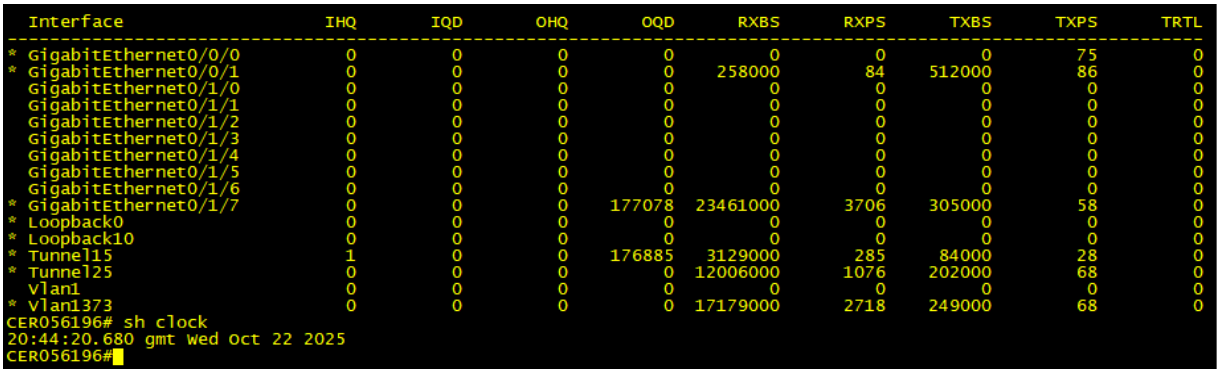


```
  Interface                   IHQ        IQD          OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0            0          0           0           0           0          75           0
* GigabitEthernet0/0/1          0          0            0          0      258000          84      512000          86           0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0            0          0           0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0            0          0           0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0            0     177078    23461000        3706      305000          58           0
* Loopback0                     0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Loopback10                    0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel15                      1          0            0     176885     3129000         285       84000          28           0
* Tunnel25                      0          0            0          0    12006000        1076      202000          68           0
  Vlan1                         0          0            0          0           0           0           0           0           0
* Vlan1373                      0          0            0          0    17179000        2718      249000          68           0
CER056196# sh clock
20:44:20.680 gmt Wed Oct 22 2025
CER056196#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
957-B	4	Santander, El Playon; Calle 11 No. 5-27/29	25 Mbps	22,6

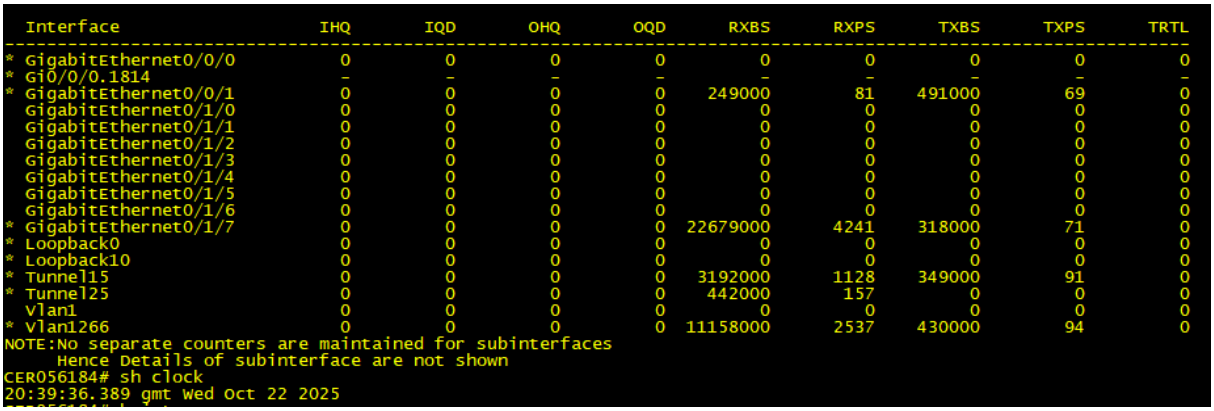


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/0.1814                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0     249000         81     491000         69          0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0   22679000       4241     318000         71          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel15                    0          0          0          0    3192000       1128     349000         91          0
* Tunnel25                    0          0          0          0     442000        157          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1266                    0          0          0          0   11158000       2537     430000         94          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056184# sh clock
20:39:36.389 gmt Wed Oct 22 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
984-B	3	Cundinamarca, Susa; Carrera 8 # 6-73 Piso 3	25 Mbps	22,7

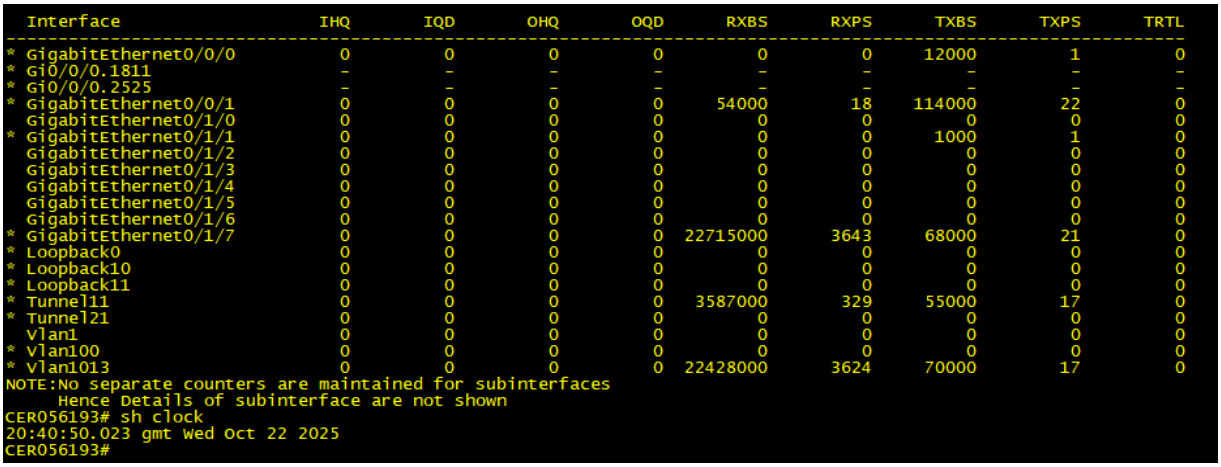


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0          0          0      12000          1          0
* Gi0/0/0.1811                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.2525                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      54000         18     114000         22          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0       1000          1          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0   22715000       3643      68000         21          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback11                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                      0          0          0          0    3587000        329      55000         17          0
* Tunnel21                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1013                      0          0          0          0   22428000       3624      70000         17          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER056193# sh clock
20:40:50.023 gmt Wed Oct 22 2025
CER056193#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
178	3	Boyacá, Guateque; Calle 7 # 6-46 Palacio Municipal	50 Mbps	45,1

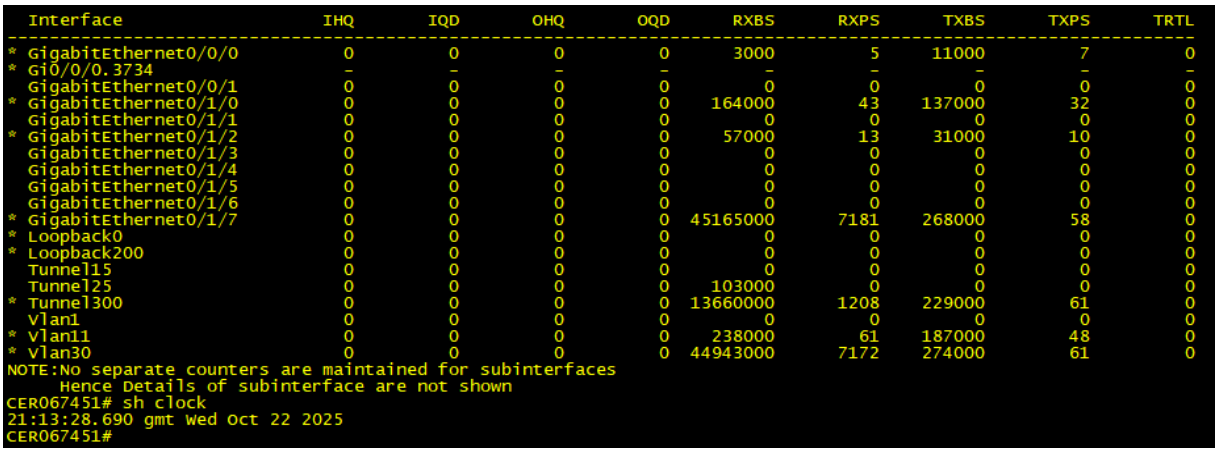

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0       3000          5      11000          7          0
* GiO/O/O.3734               -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     164000         43     137000         32          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0      57000         13      31000         10          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0   45165000       7181     268000         58          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel15                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel25                   0          0          0          0     103000          0          0          0          0
* Tunnel300                  0          0          0          0   13660000       1208     229000         61          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     238000         61     187000         48          0
* Vlan30                     0          0          0          0   44943000       7172     274000         61          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067451# sh clock
21:13:28.690 gmt Wed Oct 22 2025
CER067451#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
197	3	Norte de Santander, Ocaña; Carrera 13 No. 12-52 Barrio el Tamaco	56 Mbps	51,5

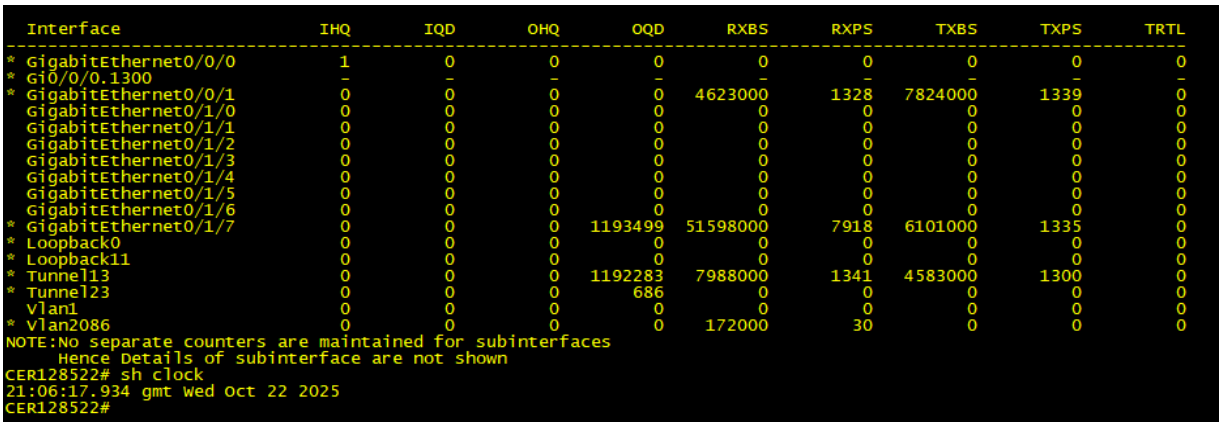

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          1          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/0.1300                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0    4623000       1328    7824000       1339          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0    1193499   51598000       7918    6101000       1335          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback11                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                      0          0          0    1192283    7988000       1341    4583000       1300          0
* Tunnel23                      0          0          0        686          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan2086                      0          0          0          0     172000         30          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER128522# sh clock
21:06:17.934 gmt Wed Oct 22 2025
CER128522#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
618	3	Cauca, Miranda; Calle 9 # 7-35	32 Mbps	31,8

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0     112292   31815000       4987    1369000        261          0
* Gi0/0/0.2263                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0    1138000        260    3579000        604          0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                    0          0          0     112102    4200000        663    1053000        225          0
* Tunnel24                    0          0          0          3          0          0          0          0          0
* Tunnel300                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                      0          0          0          0       1000          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER066811# sh clock
*21:09:46.906 gmt Wed Oct 22 2025
CER066811#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
512-B	4	Valle Del Cauca, Ulloa; Calle 5 # 2-43	25 Mbps	24,7


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0          0          0          0         37          0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     291000         48     428000         49          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0    1053047   24716000       2887     111000          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback100                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                   0          0          0    1045199     487000         64     315000         57          0
* Tunnel24                   0          0          0       6603          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     307000         57     453000         62          0
* Vlan3168                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER057756# sh clock
21:41:44.300 gmt Wed Oct 22 2025
CER057756#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1129	3	Antioquia, Carepa; Palacio Municipal Piso 2	32 Mbps	31,8

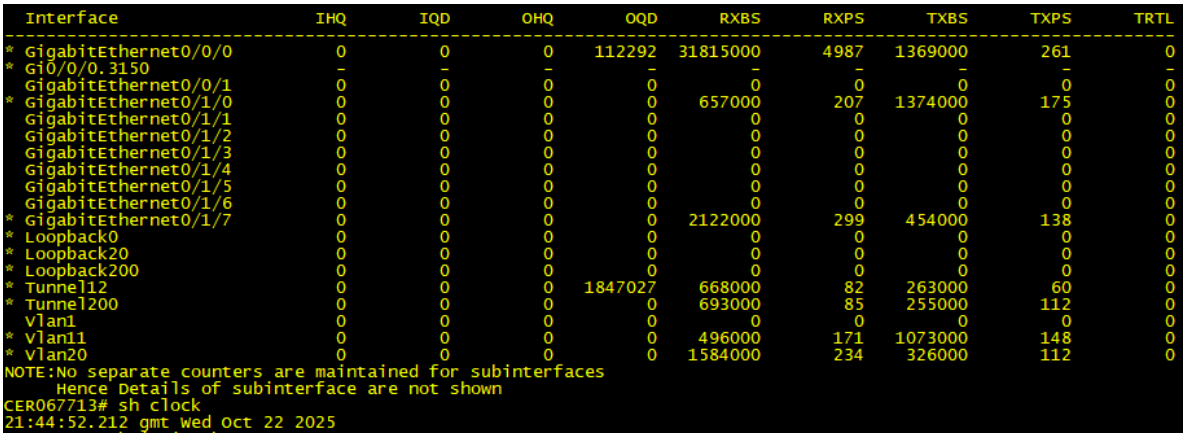

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0     112292   31815000       4987    1369000        261          0
* Gi0/0/0.3150                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0     657000        207    1374000        175          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0    2122000        299     454000        138          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel12                      0          0          0    1847027     668000         82     263000         60          0
* Tunnel200                     0          0          0          0     693000         85     255000        112          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     496000        171    1073000        148          0
* Vlan20                        0          0          0          0    1584000        234     326000        112          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067713# sh clock
21:44:52.212 gmt Wed Oct 22 2025
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
0009	1	Cundinamarca, Bogota; Sede Judicial del CAN,Carrera 57 # 43-91 Av. La Esmeralda	2 Gbps	5,02

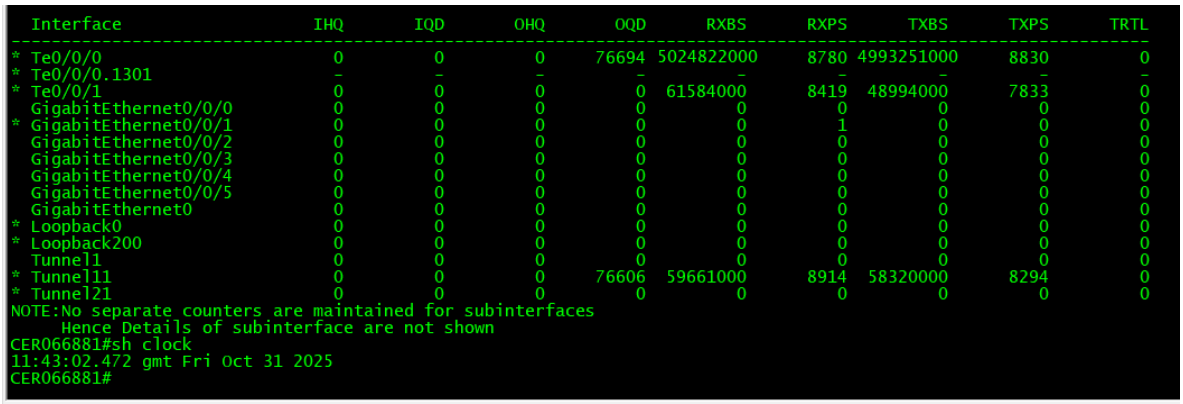


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Te0/0/0                     0          0          0          76694     5024822000 8780       4993251000 8830       0
* Te0/0/0.1301                -          -          -          -         -          -          -          -          -
* Te0/0/1                     0          0          0          0         61584000   8419       48994000   7833       0
  GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0         0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         0          1          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/2        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/3        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/4        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/5        0          0          0          0         0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0            0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0         0          0          0          0          0
  Tunnel1                     0          0          0          0         0          0          0          0          0
* Tunnel11                    0          0          0          76606     59661000   8914       58320000   8294       0
* Tunnel21                    0          0          0          0         0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER066881#sh clock
11:43:02.472 gmt Fri Oct 31 2025
CER066881#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
4500	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 12 # 7-65, Palacio de Justicia	1 Gbps	1,07


```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0         0         0  95670764 1077106000       1916 1012731000       3679         0
* Gi0/0/0.1302                  -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.1310                  -         -         -         -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0   27645000       3635    6398000       1912         0
* Gi0/0/1.9                     -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/1.31                    -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/1.90                    -         -         -         -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/2          0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/3          0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0              0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel11                      0         0         0  94390870    8165000       2113   30127000       3890         0
  Tunnel21                      0         0         0         0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CSJ_BOGOTA_PALACIO_JUSTICIA_PP#sh clock
11:46:21.173 gmt Fri Oct 31 2025
CSJ_BOGOTA_PALACIO_JUSTICIA_PP#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
4500-B	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 12 # 7-65, Palacio de Justicia	1 Gbps	1,5

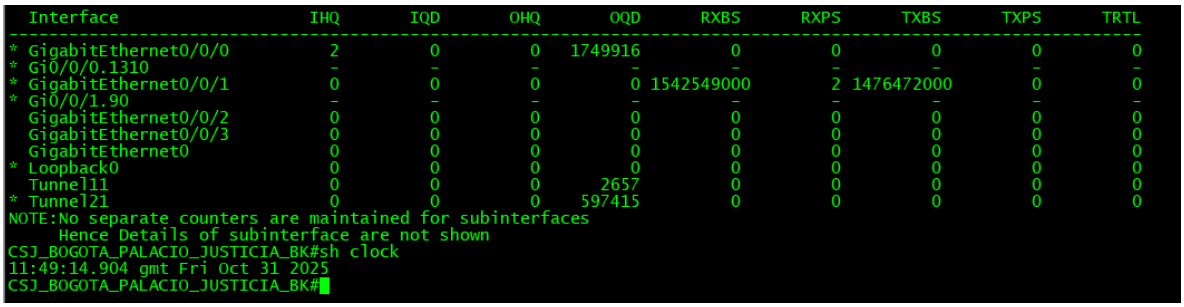


```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          2         0         0   1749916          0          0          0          0          0
* Gi0/0/0.1310                  -         -         -         -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0 1542549000          2 1476472000          0          0
* Gi0/0/1.90                    -         -         -         -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/2          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/3          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0              0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Tunnel11                      0         0         0      2657          0          0          0          0          0
* Tunnel21                      0         0         0    597415          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CSJ_BOGOTA_PALACIO_JUSTICIA_BK#sh clock
11:49:14.904 gmt Fri Oct 31 2025
CSJ_BOGOTA_PALACIO_JUSTICIA_BK#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1035	1	Cundinamarca, Bogotá; Datacenter IFX, Diagonal 97 # 17 - 60 - Internet aplicaciones	4 Gbps	5

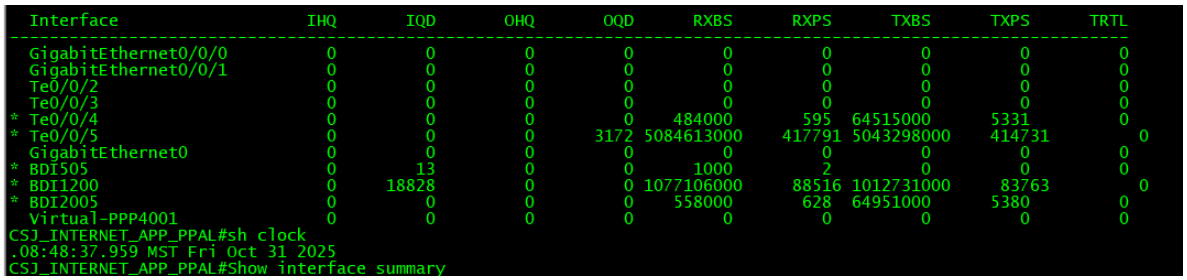

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Te0/0/2                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Te0/0/3                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Te0/0/4                       0          0          0          0     484000        595   64515000       5331          0
* Te0/0/5                       0          0          0       3172 5084613000     417791 5043298000     414731          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* BDI505                        0         13          0          0       1000          2          0          0          0
* BDI1200                       0      18828          0          0 1077106000      88516 1012731000      83763          0
* BDI2005                       0          0          0          0     558000        628   64951000       5380          0
  Virtual-PPP4001               0          0          0          0          0          0          0          0          0
CSJ_INTERNET_APP_PPAL#sh clock
.08:48:37.959 MST Fri Oct 31 2025
CSJ_INTERNET_APP_PPAL#Show interface summary
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1035-B	1	Cundinamarca, Bogotá; Datacenter IFX, Diagonal 97 # 17 - 60 - Internet aplicaciones	4 Gbps	6,5

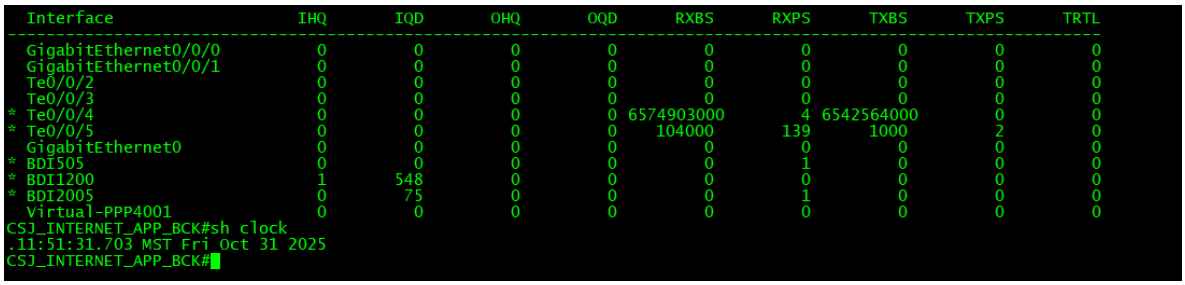

```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Te0/0/2                       0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Te0/0/3                       0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Te0/0/4                       0         0         0         0 6574903000          4 6542564000          0          0
* Te0/0/5                       0         0         0         0     104000        139       1000          2          0
  GigabitEthernet0              0         0         0         0          0          0          0          0          0
* BDI505                        0         0         0         0          0          1          0          0          0
* BDI1200                       1       548         0         0          0          0          0          0          0
* BDI2005                       0        75         0         0          0          1          0          0          0
  Virtual-PPP4001               0         0         0         0          0          0          0          0          0
CSJ_INTERNET_APP_BCK#sh clock
.11:51:31.703 MST Fri Oct 31 2025
CSJ_INTERNET_APP_BCK#
```


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1-B	1	Cundinamarca, Bogotá; Datacenter IFX, Diagonal 97 # 17 - 60 - Internet Zona D	10 Gbps	9,1

```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Te0/0/0                     0      27414         0          0          0          0       3000          2          0
* Te0/0/0.1202                -          -         -          -          -          -          -          -          -
* Te0/0/0.1203                -          -         -          -          -          -          -          -          -
* Te0/0/1                     0        104         0          0 9153223000       2119 9168676000          0          0
* Te0/0/1.200                 -          -         -          -          -          -          -          -          -
* Te0/0/1.2004                -          -         -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/0        0          0         0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/1        0          0         0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/2        0          0         0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/3        0          0         0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/4        0          0         0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/5        0          0         0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0            0          0         0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel0                     0          0         0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
INET_ZONA_D_BKP#sh clock
.11:56:51.434 gmt Fri Oct 31 2025
INET_ZONA_D_BKP#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
0001	1	Cundinamarca, Bogotá; Datacenter IFX, Diagonal 97 # 17 - 60 - Internet Zona D	10 Gbps	9,7


```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Te0/0/0                     1     278029         0       9316 9707167000    801502 9730736000    803622         0
* Te0/0/0.1204                -          -         -          -         -         -         -         -         -
* Te0/0/1                     0          0         0          0  23593000      7871  21589000      3873         0
* Te0/0/1.2004                -          -         -          -         -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/0        0          0         0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/0/1        0          0         0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/0/2        0          0         0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/0/3        0          0         0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/0/4        0          0         0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/0/5        0          0         0          0         0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0            0          0         0          0         0         0         0         0         0
* Tunnel0                     0          0         0          0         0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
INET_ZONA_D_PPAL#sh clock
.12:01:45.548 gmt Fri Oct 31 2025
INET_ZONA_D_PPAL#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
2-B	1	Cundinamarca, Bogotá; Datacenter IFX, Diagonal 97 # 17 - 60 - Internet Zona B	10 Gbps	9,5

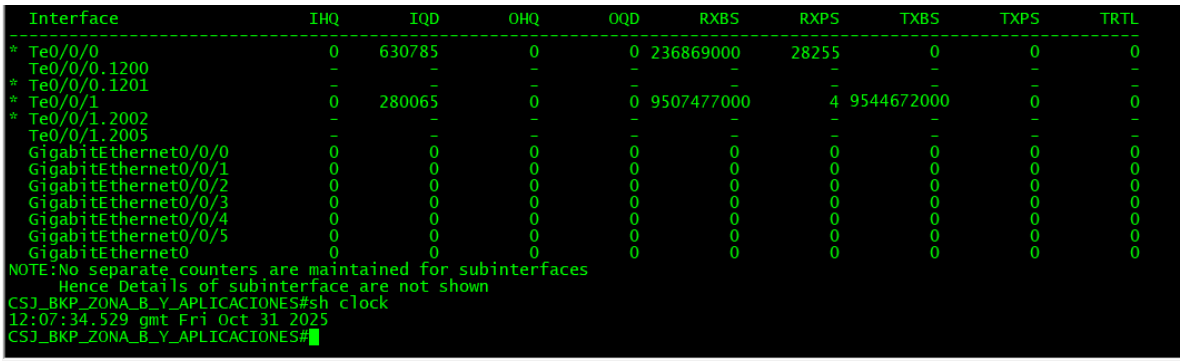

```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Te0/0/0                     0     630785         0          0  236869000      28255          0          0         0
  Te0/0/0.1200                -          -         -          -          -          -          -          -         -
* Te0/0/0.1201                -          -         -          -          -          -          -          -         -
* Te0/0/1                     0     280065         0          0 9507477000          4 9544672000          0         0
* Te0/0/1.2002                -          -         -          -          -          -          -          -         -
  Te0/0/1.2005                -          -         -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/0        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/1        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/2        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/3        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/4        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/5        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0            0          0         0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CSJ_BKP_ZONA_B_Y_APLICACIONES#sh clock
12:07:34.529 gmt Fri Oct 31 2025
CSJ_BKP_ZONA_B_Y_APLICACIONES#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
0002	1	Cundinamarca, Bogotá; Datacenter IFX, Diagonal 97 # 17 - 60 - Internet Zona B	10 Gbps	9,6

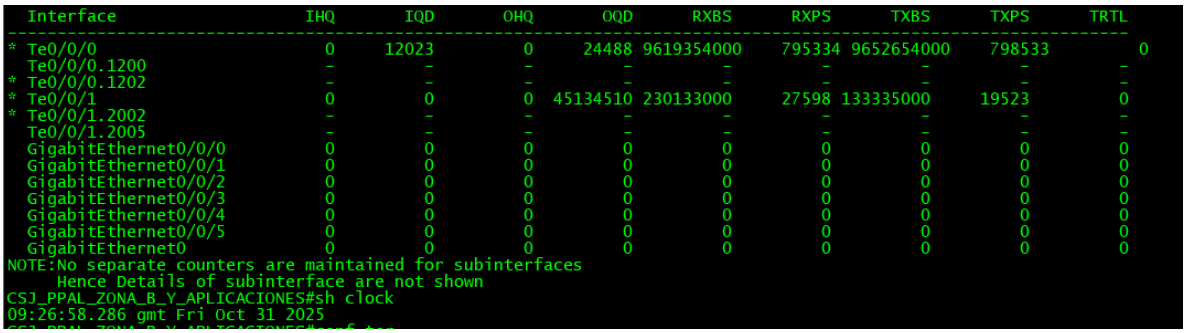


```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Te0/0/0                     0      12023         0      24488 9619354000     795334 9652654000     798533         0
  Te0/0/0.1200                -          -         -          -          -          -          -          -         -
* Te0/0/0.1202                -          -         -          -          -          -          -          -         -
* Te0/0/1                     0          0         0   45134510 230133000      27598 133335000      19523         0
* Te0/0/1.2002                -          -         -          -          -          -          -          -         -
  Te0/0/1.2005                -          -         -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/0        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/1        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/2        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/3        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/4        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/5        0          0         0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0            0          0         0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CSJ_PPAL_ZONA_B_Y_APLICACIONES#sh clock
09:26:58.286 gmt Fri Oct 31 2025
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
3-B	1	Cundinamarca, Bogotá; Datacenter IFX, Diagonal 97 # 17 - 60 - Internet Zona C	10 Gbps	9,1

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Te0/0/0                     0        167          0          0          0          1      20000         14         0
* Te0/0/0.1202                -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Te0/0/1                     0       2233          0          0 9190731000         31 9159069000          0         0
* Te0/0/1.200                 -          -          -          -          -          -          -          -         -
* Te0/0/1.2003                -          -          -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/2        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/3        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/4        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/5        0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0            0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
INET_ZONA_C_BKP#sh clock
.12:15:18.086 gmt Fri Oct 31 2025
INET_ZONA_C_BKP#
```


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
0003	1	Cundinamarca, Bogotá; Datacenter IFX, Diagonal 97 # 17 - 60 - Internet Zona C	10 Gbps	9,7

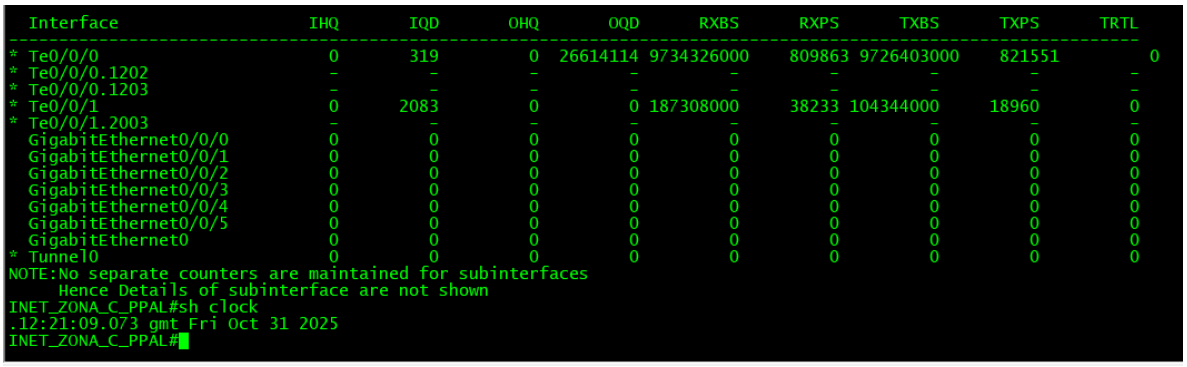

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
4-B	1	Cundinamarca, Bogotá; Datacenter IFX, Diagonal 97 # 17 - 60 - Internet Zona A	10 Gbps	9,3

```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Te0/0/0                     0       123         0         0   39726000      13211  208695000          0          0
* Te0/0/0.1200                -         -         -         -          -          -          -          -          -
* Te0/0/0.1201                -         -         -         -          -          -          -          -          -
* Te0/0/1                     0       123         0         0 9311154000     770262 9295735000          1          0
* Te0/0/1.2001                -         -         -         -          -          -          -          -          -
  Te0/0/1.2002                -         -         -         -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/0        0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/1        0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/2        0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/3        0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/4        0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/0/5        0         0         0         0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0            0         0         0         0          0          0          0          0          0
* Loopback16                  0         0         0         0          0          0          0          0          0
  Tunnel0                     0         0         0         0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
ADI_RUTA2_ZONA_A_BKP#sh clock
12:26:07.363 gmt Fri Oct 31 2025
ADI_RUTA2_ZONA_A_BKP#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
0004	1	Cundinamarca, Bogotá; Datacenter IFX, Diagonal 97 # 17 - 60 - Internet Zona A	10 Gbps	9,7

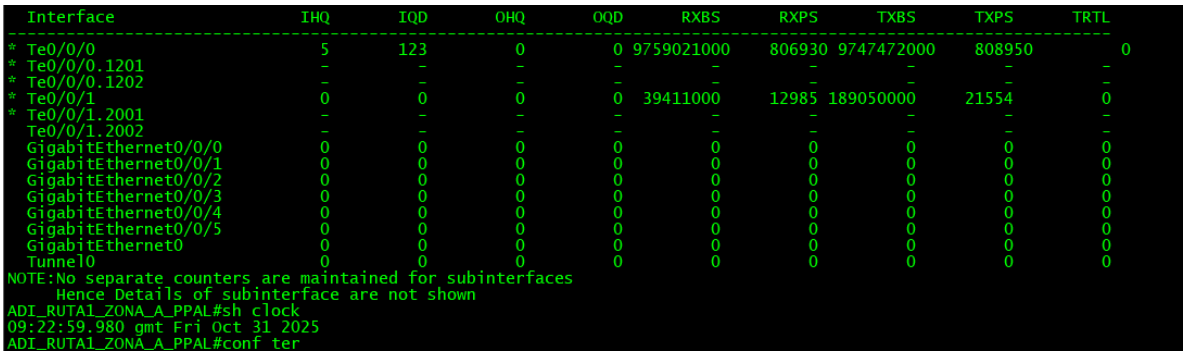


```
  Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Te0/0/0                     5         123       0         0         9759021000 806930     9747472000 808950    0
* Te0/0/0.1201                -         -         -         -         -          -          -          -         -
* Te0/0/0.1202                -         -         -         -         -          -          -          -         -
* Te0/0/1                     0         0         0         0         39411000   12985      189050000  21554     0
* Te0/0/1.2001                -         -         -         -         -          -          -          -         -
  Te0/0/1.2002                -         -         -         -         -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/0        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/1        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/2        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/3        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/4        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/0/5        0         0         0         0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0            0         0         0         0         0          0          0          0         0
  Tunnel0                     0         0         0         0         0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
ADI_RUTA1_ZONA_A_PPAL#sh clock
09:22:59.980 gmt Fri Oct 31 2025
ADI_RUTA1_ZONA_A_PPAL#conf ter
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1084	3	Bolívar, María la Baja; Carrera 16 con Carrera 15 # 15-31 Barrio las Delicias	15 Mbps	16,7

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0        16782000  1627      0         0         0
* Gi0/0/0.3720                -          -          -          -        -         -         -         -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0        0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0        0         0         2000      1         0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Loopback0                   0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Loopback11                  0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Tunnel13                    2          0          0          0        7218000   751       1000      2         0
* Tunnel23                    0          0          0          0        0         0         0         0         0
  Vlan1                       0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Vlan11                      0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Vlan1293                    0          0          0          0        0         0         2000      2         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO67566#sh clock
15:10:40.802 gmt Fri Oct 31 2025
CERO67566#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1089	3	Bolívar, Soplaviento; Carrera 13 # 8-39	15 Mbps	15,1

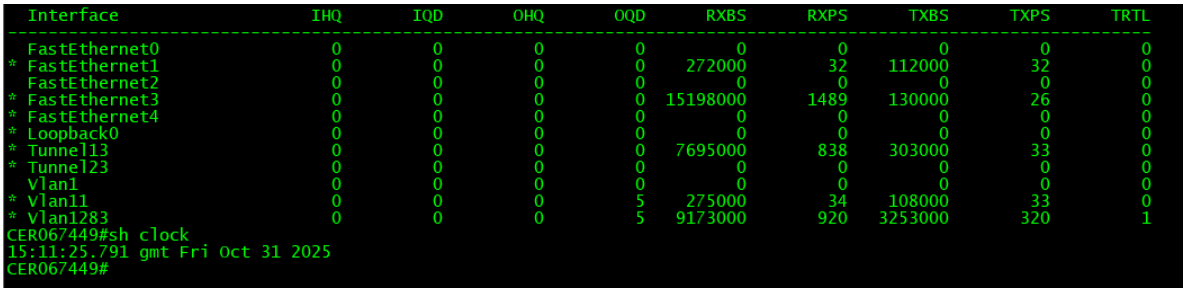


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0           0
* FastEthernet1              0          0          0          0      272000          32      112000          32           0
  FastEthernet2              0          0          0          0           0           0           0           0           0
* FastEthernet3              0          0          0          0    15198000        1489      130000          26           0
* FastEthernet4              0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel13                   0          0          0          0     7695000         838      303000          33           0
* Tunnel23                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan11                     0          0          0          5      275000          34      108000          33           0
* Vlan1283                   0          0          0          5     9173000         920     3253000         320           1
CER067449#sh clock
15:11:25.791 gmt Fri Oct 31 2025
CER067449#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1101	4	Córdoba, Pueblo Nuevo; Calle 12 Carrera 10 Y 11	15 Mbps	14,8


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0              0          0          0          0           0           0           0           0           0
  FastEthernet1              0          0          0          0           0           0           0           0           0
  FastEthernet2              0          0          0          0           0           0           0           0           0
* FastEthernet3              0          0          0          0       35000          27        1000           2           0
* FastEthernet4              0        856          0          0    14878000        1446        3000           2          35
* FastEthernet4.848          -          -          -          -           -           -           -           -           -
* Loopback0                  0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Loopback10                 0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Tunnel13                   0          3          0          0     5687000         597        1000           2           0
* Tunnel23                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
  Vlan1                      0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan11                     0          0          0          0           0           0           0           0           0
* Vlan1350                   0          0          0          0           0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067680#sh clock
15:12:13.989 gmt Fri Oct 31 2025
CER067680#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1249	4	Bolívar, El Peñon; Calle San Antonio S, Casa Parroquial	15 Mbps	14,4

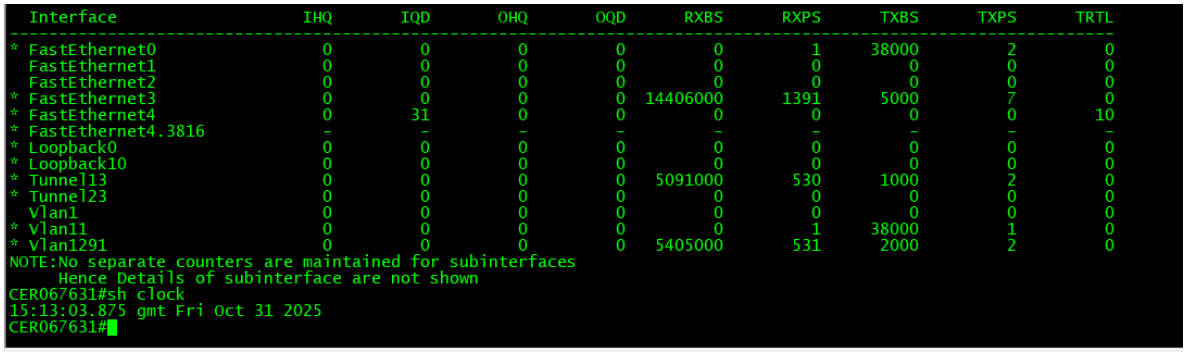


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0              0          0          0          0          0          1      38000          2          0
  FastEthernet1              0          0          0          0          0          0          0          0          0
  FastEthernet2              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet3              0          0          0          0   14406000       1391       5000          7          0
* FastEthernet4              0         31          0          0          0          0          0          0         10
* FastEthernet4.3816         -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                   0          0          0          0    5091000        530       1000          2          0
* Tunnel23                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0          0          1      38000          1          0
* Vlan1291                   0          0          0          0    5405000        531       2000          2          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067631#sh clock
15:13:03.875 gmt Fri Oct 31 2025
CER067631#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1288	4	Bolívar, Hatillo de loba; Calle 4 # 8-17a 8-1	15 Mbps	14,5

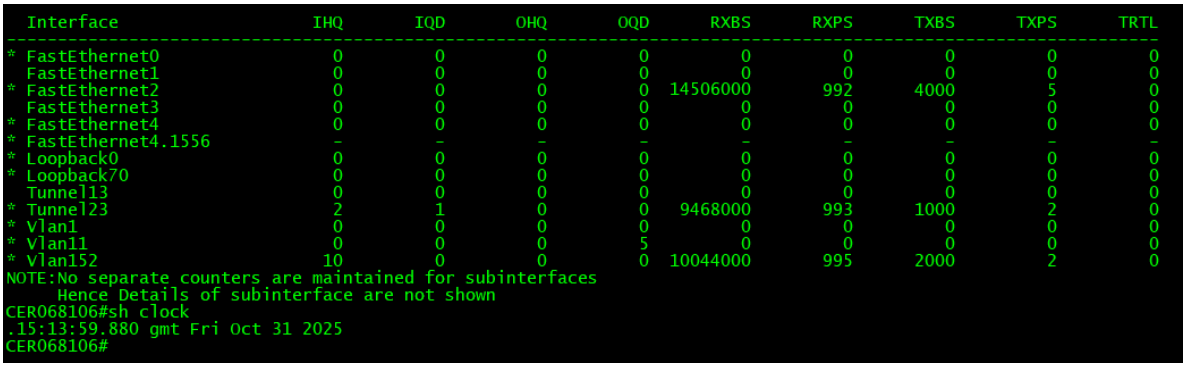


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0               0          0          0          0         0         0         0         0         0
  FastEthernet1               0          0          0          0         0         0         0         0         0
* FastEthernet2               0          0          0          0  14506000       992      4000         5         0
  FastEthernet3               0          0          0          0         0         0         0         0         0
* FastEthernet4               0          0          0          0         0         0         0         0         0
* FastEthernet4.1556          -          -          -          -         -         -         -         -         -
* Loopback0                   0          0          0          0         0         0         0         0         0
* Loopback70                  0          0          0          0         0         0         0         0         0
  Tunnel13                    0          0          0          0         0         0         0         0         0
* Tunnel23                    2          1          0          0   9468000       993      1000         2         0
* Vlan1                       0          0          0          0         0         0         0         0         0
* Vlan11                      0          0          0          5         0         0         0         0         0
* Vlan152                    10          0          0          0  10044000       995      2000         2         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER068106#sh clock
.15:13:59.880 gmt Fri Oct 31 2025
CER068106#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1289	4	Bolívar, Magarita; Calle Principal	15 Mbps	15

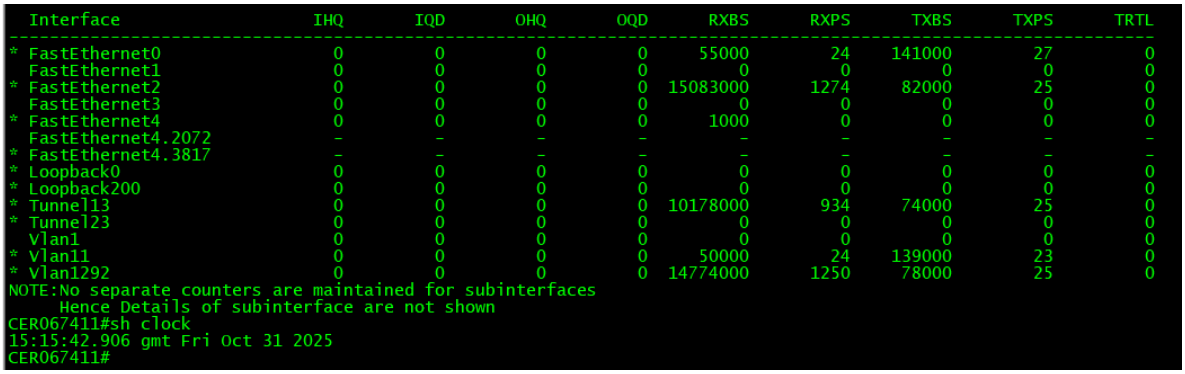


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0          0          0          0        55000     24        141000    27        0
  FastEthernet1            0          0          0          0        0         0         0         0         0
* FastEthernet2            0          0          0          0        15083000  1274      82000     25        0
  FastEthernet3            0          0          0          0        0         0         0         0         0
* FastEthernet4            0          0          0          0        1000      0         0         0         0
  FastEthernet4.2072       -          -          -          -        -         -         -         -         -
* FastEthernet4.3817       -          -          -          -        -         -         -         -         -
* Loopback0                0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Loopback200              0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Tunnel13                 0          0          0          0        10178000  934       74000     25        0
* Tunnel23                 0          0          0          0        0         0         0         0         0
  Vlan1                    0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Vlan11                   0          0          0          0        50000     24        139000    23        0
* Vlan1292                 0          0          0          0        14774000  1250      78000     25        0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067411#sh clock
15:15:42.906 gmt Fri Oct 31 2025
CER067411#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1386	3	Meta, El Dorado; Calle 4 # 5-47 Centro	15 Mbps	14,5

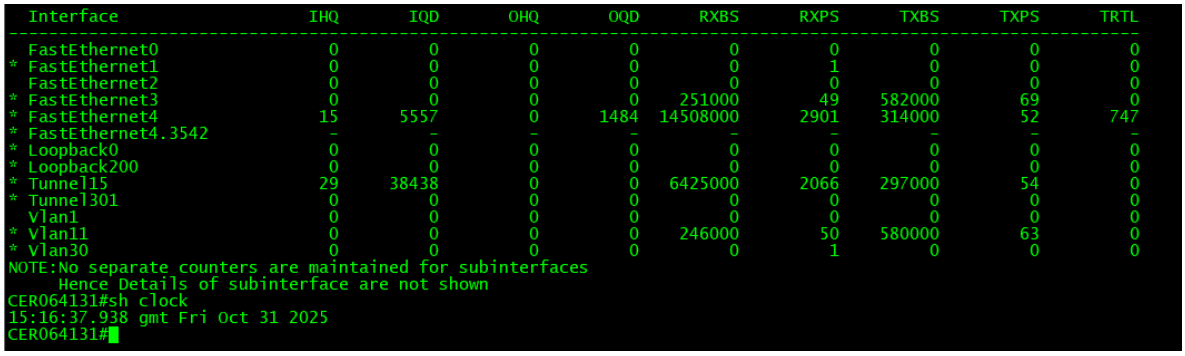


```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0               0          0         0          0         0          0          0          0         0
* FastEthernet1               0          0         0          0         0          1          0          0         0
  FastEthernet2               0          0         0          0         0          0          0          0         0
* FastEthernet3               0          0         0          0    251000         49     582000         69         0
* FastEthernet4              15       5557         0       1484  14508000       2901     314000         52       747
* FastEthernet4.3542          -          -         -          -         -          -          -          -         -
* Loopback0                   0          0         0          0         0          0          0          0         0
* Loopback200                 0          0         0          0         0          0          0          0         0
* Tunnel15                   29      38438         0          0   6425000       2066     297000         54         0
* Tunnel301                  0          0         0          0         0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0         0          0         0          0          0          0         0
* Vlan11                     0          0         0          0    246000         50     580000         63         0
* Vlan30                     0          0         0          0         0          1          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO64131#sh clock
15:16:37.938 gmt Fri Oct 31 2025
CERO64131#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1548	4	Guaviare, Calamar; Carrera 7 Barrio La Paz	15 Mbps	14,8

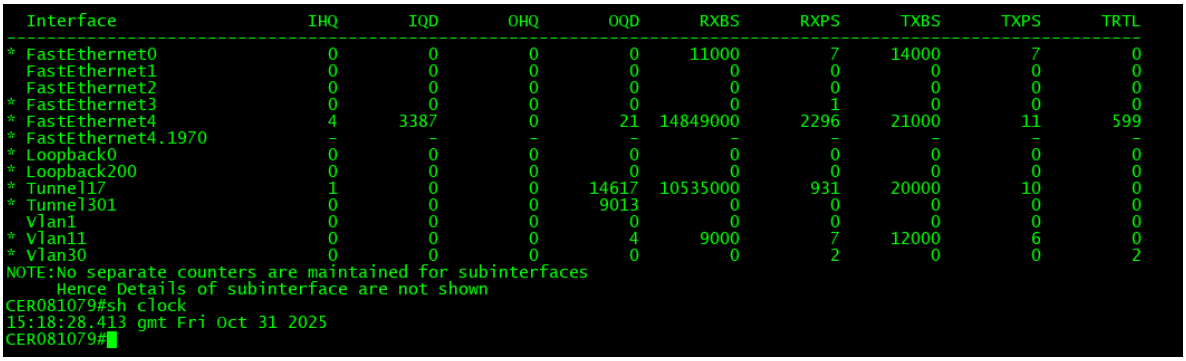


```
  Interface                   IHQ        IQD       OHQ        OQD       RXBS        RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0               0          0         0          0         11000          7      14000         7         0
  FastEthernet1               0          0         0          0             0          0          0         0         0
  FastEthernet2               0          0         0          0             0          0          0         0         0
* FastEthernet3               0          0         0          0             0          1          0         0         0
* FastEthernet4               4       3387         0         21      14849000       2296      21000        11       599
* FastEthernet4.1970          -          -         -          -             -          -          -         -         -
* Loopback0                   0          0         0          0             0          0          0         0         0
* Loopback200                 0          0         0          0             0          0          0         0         0
* Tunnel17                    1          0         0      14617      10535000        931      20000        10         0
* Tunnel301                   0          0         0       9013             0          0          0         0         0
  Vlan1                       0          0         0          0             0          0          0         0         0
* Vlan11                      0          0         0          4          9000          7      12000         6         0
* Vlan30                      0          0         0          0             0          2          0         0         2
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER081079#sh clock
15:18:28.413 gmt Fri Oct 31 2025
CER081079#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1716	4	Chocó, Alto Baudó; Pie de Pato, Calle Primera, Segundo Piso	15 Mbps	19,5

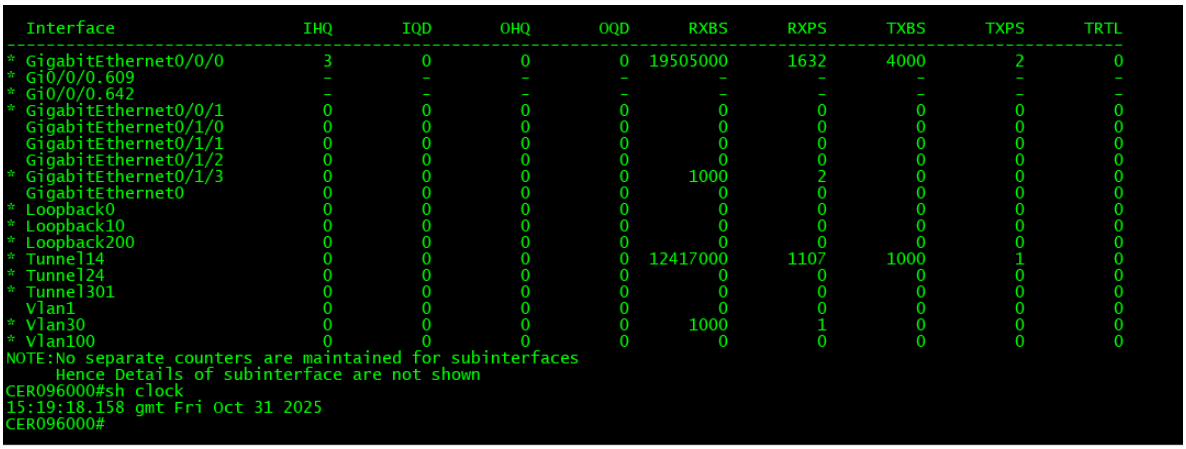

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          3          0          0          0   19505000       1632       4000          2          0
* Gi0/0/0.609                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.642                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0       1000          2          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      0          0          0          0   12417000       1107       1000          1          0
* Tunnel24                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel301                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                        0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER096000#sh clock
15:19:18.158 gmt Fri Oct 31 2025
CER096000#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
2213	4	Bollivar San Jacinto del Cauca; Barrio Las Margaritas	15 Mbps	14,3

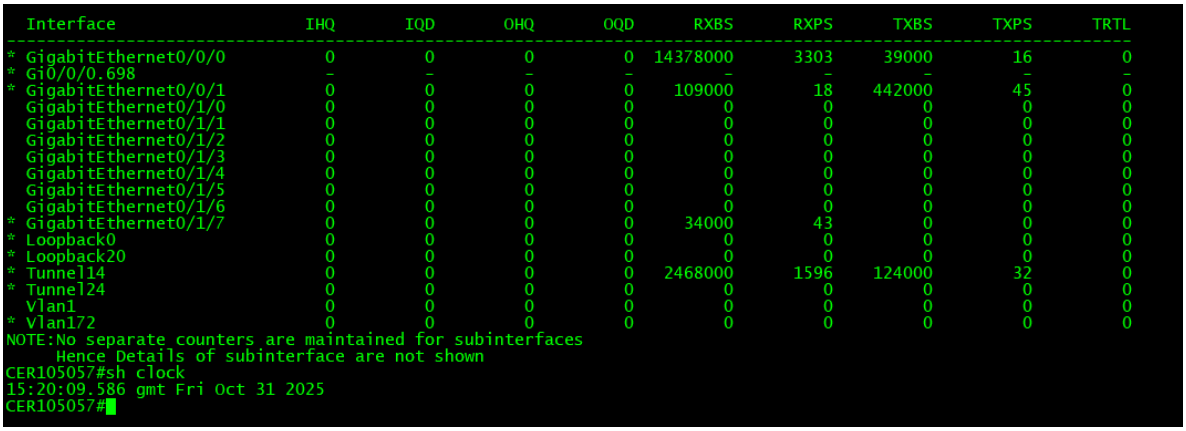


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0   14378000        3303       39000          16           0
* Gi0/0/0.698                 -          -          -          -          -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0     109000          18      442000          45           0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0      34000          43           0           0           0
* Loopback0                   0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Loopback20                  0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Tunnel14                    0          0          0          0    2468000        1596      124000          32           0
* Tunnel24                    0          0          0          0          0           0           0           0           0
  Vlan1                       0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Vlan172                     0          0          0          0          0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER105057#sh clock
15:20:09.586 gmt Fri Oct 31 2025
CER105057#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
2214	3	Bolivar, San Pablo; Palacio Justicia	15 Mbps	13,9


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0   13991000       1369     187000         48          0
* Gi0/0/0.160                 -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0     127000         29     400000         45          0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0      65000          7      85000          7          0
* GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                    7          0          0          0    3226000        352     229000         57          0
* Tunnel23                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel301                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                      0          0          0          0     224000         57     526000         72          0
* Vlan30                      0          0          0          0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER128526#sh clock
15:31:22.425 gmt Fri Oct 31 2025
CER128526#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
3499	1	Antioquia, Itagüí; Calle 31 # 50A-31 barrio Santa Catalina	15 Mbps	14,6

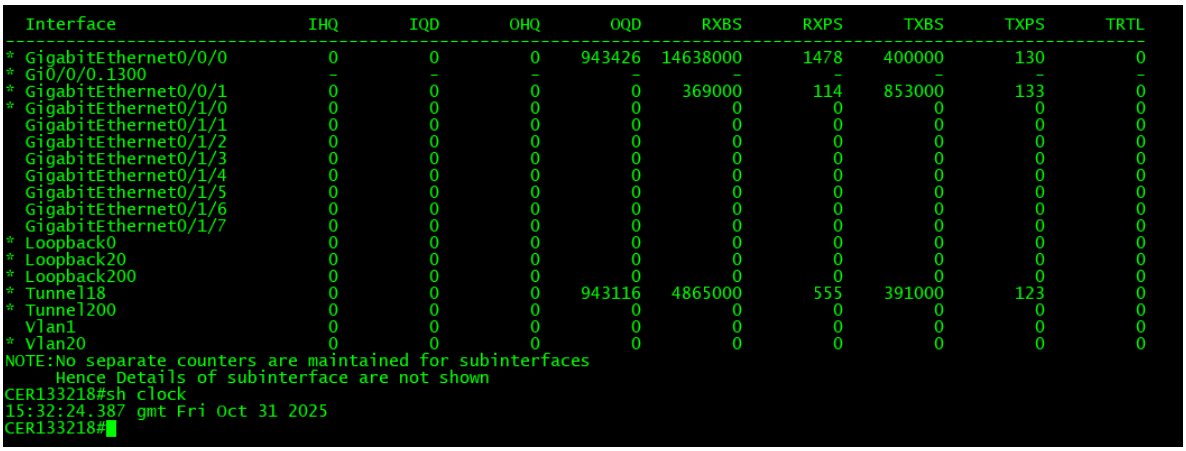


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0          0          0          943426     14638000    1478        400000      130         0
* Gi0/0/0.1300             -          -          -          -          -           -           -           -           -
* GigabitEthernet0/0/1     0          0          0          0          369000      114         853000      133         0
* GigabitEthernet0/1/0     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/1     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/6     0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/7     0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Loopback0                0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Loopback20               0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Loopback200              0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Tunnel18                 0          0          0          943116     4865000     555         391000      123         0
* Tunnel200                0          0          0          0          0           0           0           0           0
  Vlan1                    0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Vlan20                   0          0          0          0          0           0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER133218#sh clock
15:32:24.387 gmt Fri Oct 31 2025
CER133218#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
3569-B	1	Bolívar, Cartagena; Diagonal 38 # 75-06 Urbanización	15 Mbps	15

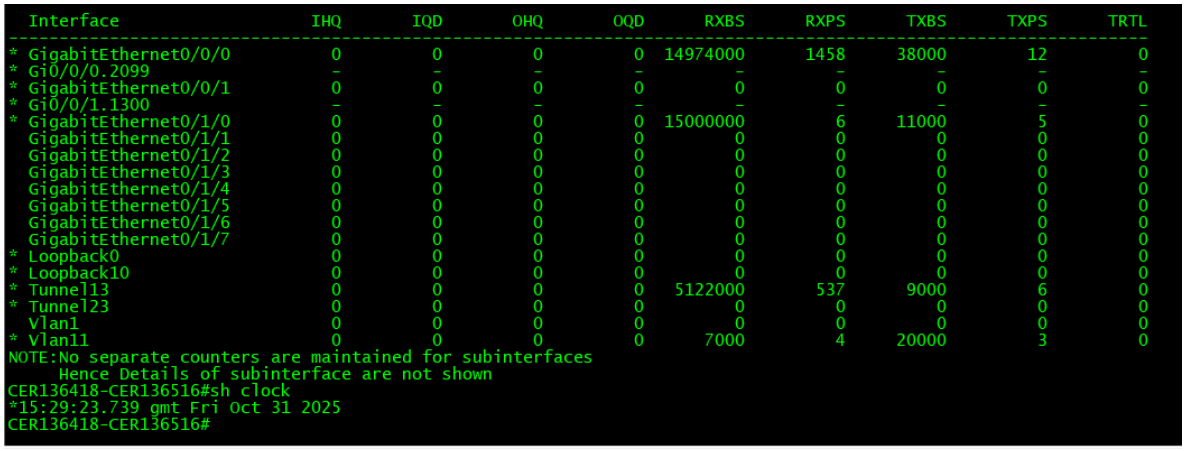


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0   14974000       1458      38000         12          0
* Gi0/0/0.2099               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Gi0/0/1.1300               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0   15000000          6      11000          5          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                   0          0          0          0    5122000        537       9000          6          0
* Tunnel23                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0       7000          4      20000          3          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER136418-CER136516#sh clock
*15:29:23.739 gmt Fri Oct 31 2025
CER136418-CER136516#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
557-B	3	CSJ- JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL RIO VIEJO	15 Mbps	14,9

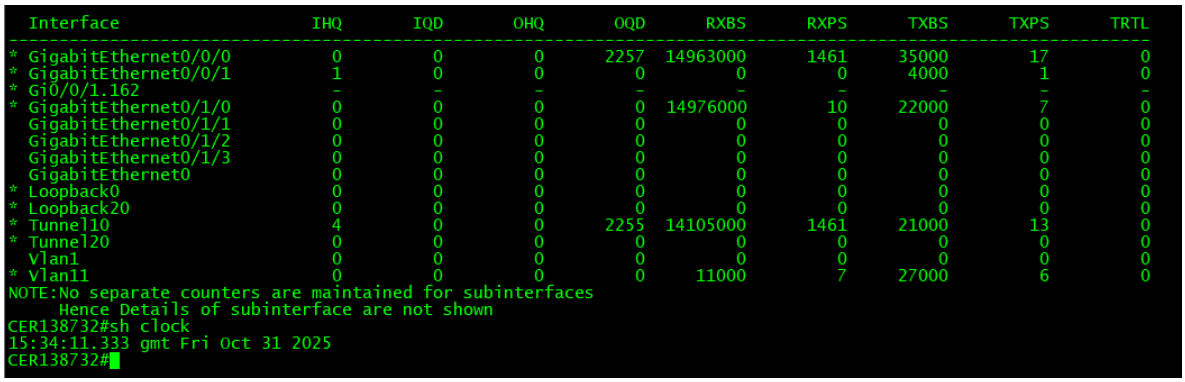


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0       2257   14963000       1461      35000         17          0
* GigabitEthernet0/0/1       1          0          0          0          0          0       4000          1          0
* Gi0/0/1.162                -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0   14976000         10      22000          7          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0           0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel10                   4          0          0       2255   14105000       1461      21000         13          0
* Tunnel20                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0      11000          7      27000          6          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER138732#sh clock
15:34:11.333 gmt Fri Oct 31 2025
CER138732#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
559-B	4	Bolívar, Monte Cristo; Diagonal. 7 con Calle 5 # 4-27	15 Mbps	14,9

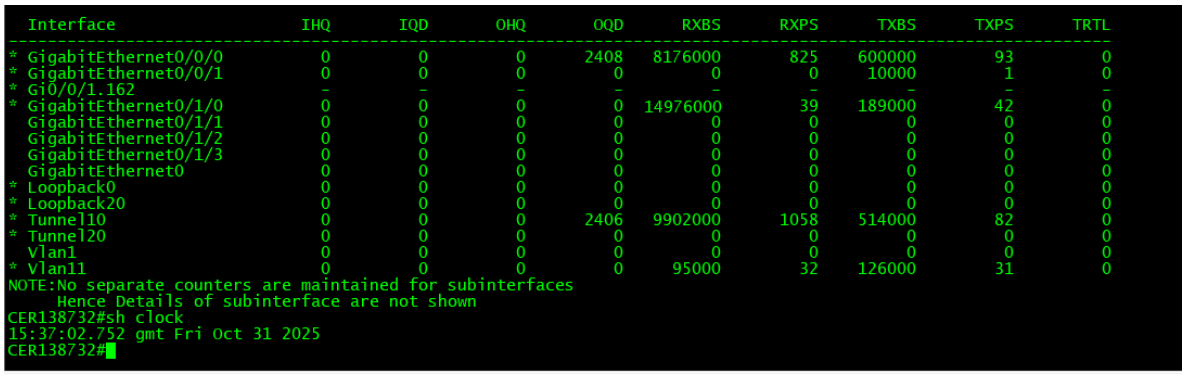


```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0         0         0      2408    8176000        825     600000         93         0
* GigabitEthernet0/0/1       0         0         0         0          0          0      10000          1         0
* Gi0/0/1.162                -         -         -         -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0   14976000         39     189000         42         0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0           0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback20                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel10                   0         0         0      2406    9902000       1058     514000         82         0
* Tunnel20                   0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan11                     0         0         0         0      95000         32     126000         31         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER138732#sh clock
15:37:02.752 gmt Fri Oct 31 2025
CER138732#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
481	3	Tolima, Suarez; Carrera 3 # 1-07, Altos de la Cruz	25 Mbps	24

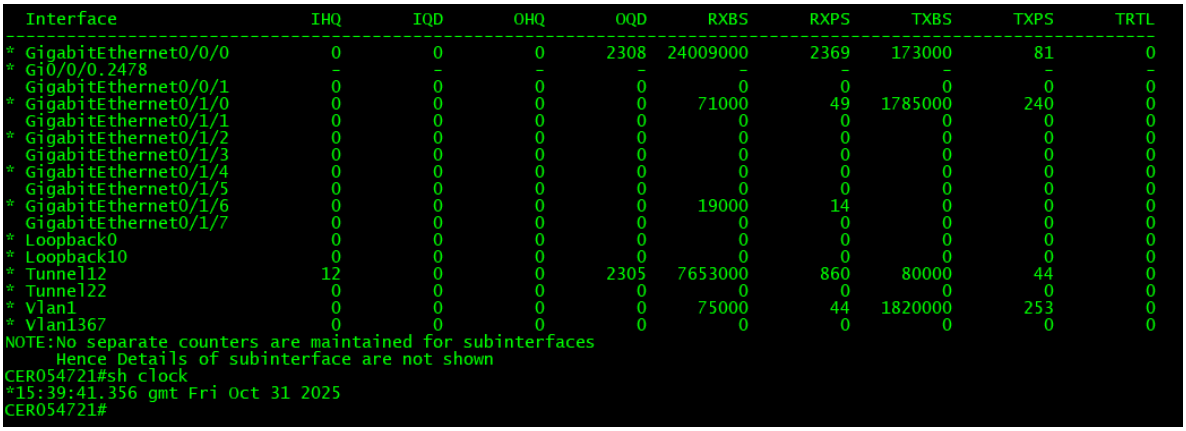


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          2308      24009000   2369       173000     81        0
* Gi0/0/0.2478                -          -          -          -         -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         71000      49         1785000    240       0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         19000      14         0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Tunnel12                    12         0          0          2305      7653000    860        80000      44        0
* Tunnel22                    0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Vlan1                       0          0          0          0         75000      44         1820000    253       0
* Vlan1367                    0          0          0          0         0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER054721#sh clock
*15:39:41.356 gmt Fri Oct 31 2025
CER054721#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
803	4	Guainía, Puerto Inirida; Calle 26 # 11-15, Palacio de Justicia	32 Mbps	32,7

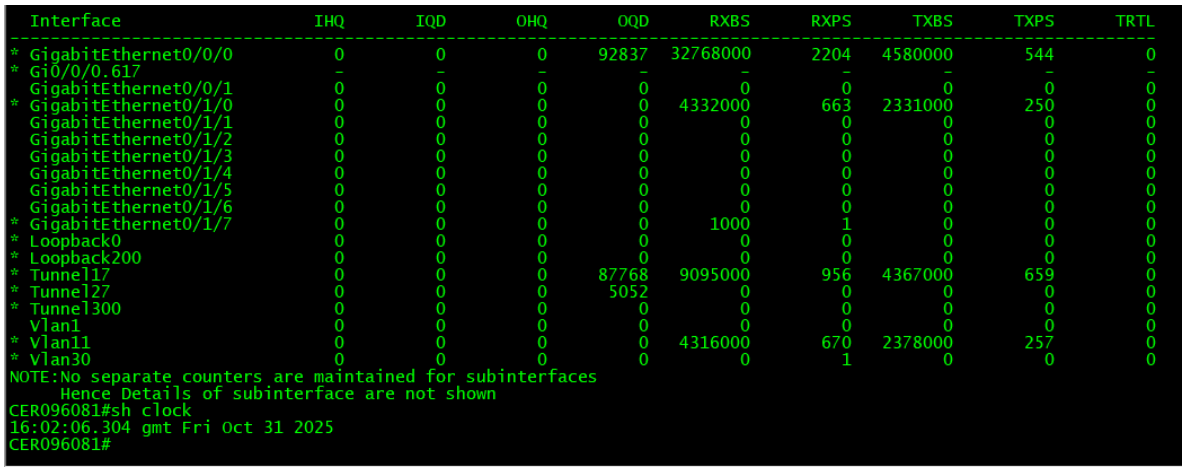


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0         0          0          0      92837   32768000       2204    4580000        544         0
* Gi0/0/0.617                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0         0          0          0          0    4332000        663    2331000        250         0
  GigabitEthernet0/1/1         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7         0          0          0          0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback200                  0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel17                     0          0          0      87768    9095000        956    4367000        659         0
* Tunnel27                     0          0          0       5052          0          0          0          0         0
* Tunnel300                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                       0          0          0          0    4316000        670    2378000        257         0
* Vlan30                       0          0          0          0          0          1          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER096081#sh clock
16:02:06.304 gmt Fri Oct 31 2025
CER096081#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3249	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Calle 5 # 6-29	0,512 Mbps	0,909

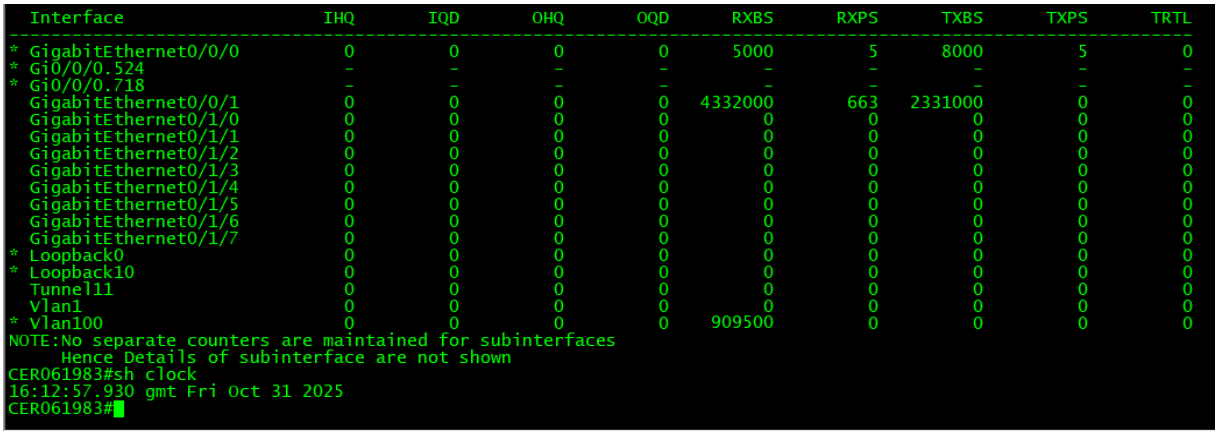

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0       5000          5       8000          5          0
* Gi0/0/0.524                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.718                   -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0    4332000        663    2331000          0          0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel11                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                       0          0          0          0     909500          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER061983#sh clock
16:12:57.930 gmt Fri Oct 31 2025
CER061983#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3253	1	Cundinamarca, Zipaquirá; Carrera 13 # 5-49 Piso 2	0,512 Mbps	0,972

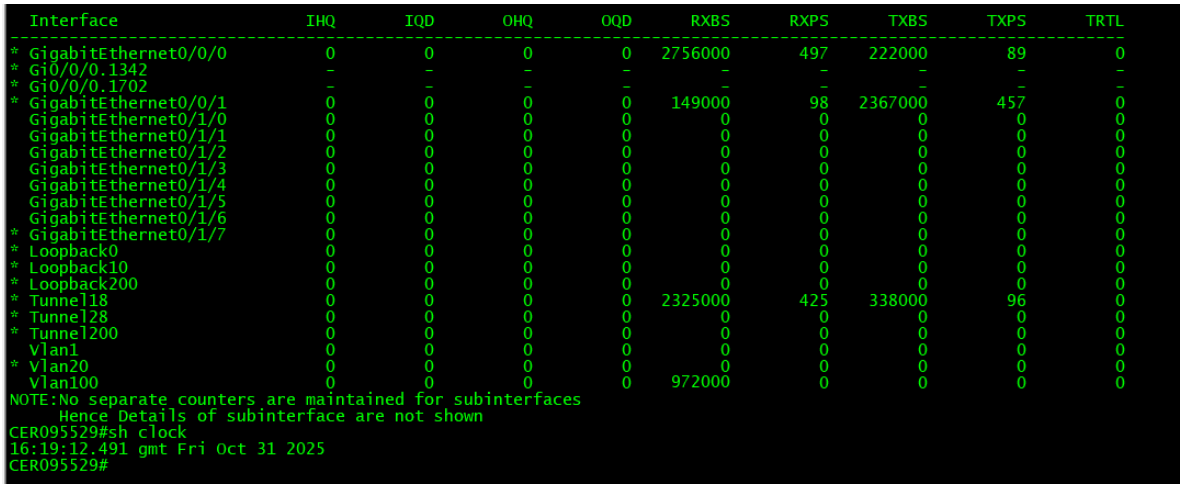

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0    2756000        497     222000         89          0
* Gi0/0/0.1342               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.1702               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0     149000         98    2367000        457          0
  GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel18                   0          0          0          0    2325000        425     338000         96          0
* Tunnel28                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel200                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan100                    0          0          0          0     972000          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER095529#sh clock
16:19:12.491 gmt Fri Oct 31 2025
CER095529#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3257	4	Chocó, Bagadó; Cabecera Municipal, Palacio de Justicia	1 Mbps	1,3

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS        RXPS        TXBS        TXPS        TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          1044       0           0           2000        2           0
* Gi0/0/0.271                 -          -          -          -          -           -           -           -           -
* Gi0/0/0.2282                -          -          -          -          -           -           -           -           -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0          0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0          1000        1           14000       2           0
  GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0          0           0           0           0           0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0          0           0           0           0           0
* GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0          29000       7           10000       5           0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Loopback0                   0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Loopback10                  0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Loopback200                 0          0          0          0          0           0           0           0           0
  Tunnel14                    0          0          0          1044       0           0           0           0           0
* Tunnel300                   0          0          0          0          28000       4           7000        5           0
  Vlan1                       0          0          0          0          0           0           0           0           0
* Vlan11                      0          0          0          0          7000        5           29000       4           0
* Vlan30                      0          0          0          0          36000       7           12000       5           0
* Vlan100                     0          0          0          0          1389900     0           0           0           0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062026#sh clock
*16:01:01.927 gmt Fri Oct 31 2025
CER062026#
```


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
3559	4	Chocó, Medio Atrato; Calle Principal	1 Mbps	1

```
  Interface                IHQ       IQD       OHQ       OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0         0         0         0       8000         14       5000          8         0
* Gi0/0/0.499                -         -         -         -          -          -          -          -         -
* Gi0/0/0.625                -         -         -         -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1       0         0         0         0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/0       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5       0         0         0         0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6       0         0         0         0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/7       0         0         0         0       1000          1          0          0         0
* Loopback0                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback10                 0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Loopback200                0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel14                   0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel24                   0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Tunnel301                  0         0         0         0          0          0          0          0         0
  Vlan1                      0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan11                     0         0         0         0          0          0          0          0         0
* Vlan30                     0         0         0         0       1000          2          0          0         0
* Vlan100                    0         0         0         0    1017800          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER107671#sh clock
16:29:13.315 gmt Fri Oct 31 2025
CER107671#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1324	3	Antioquia, Olaya; Calle Principal # 10-36	32 Mbps	31,9

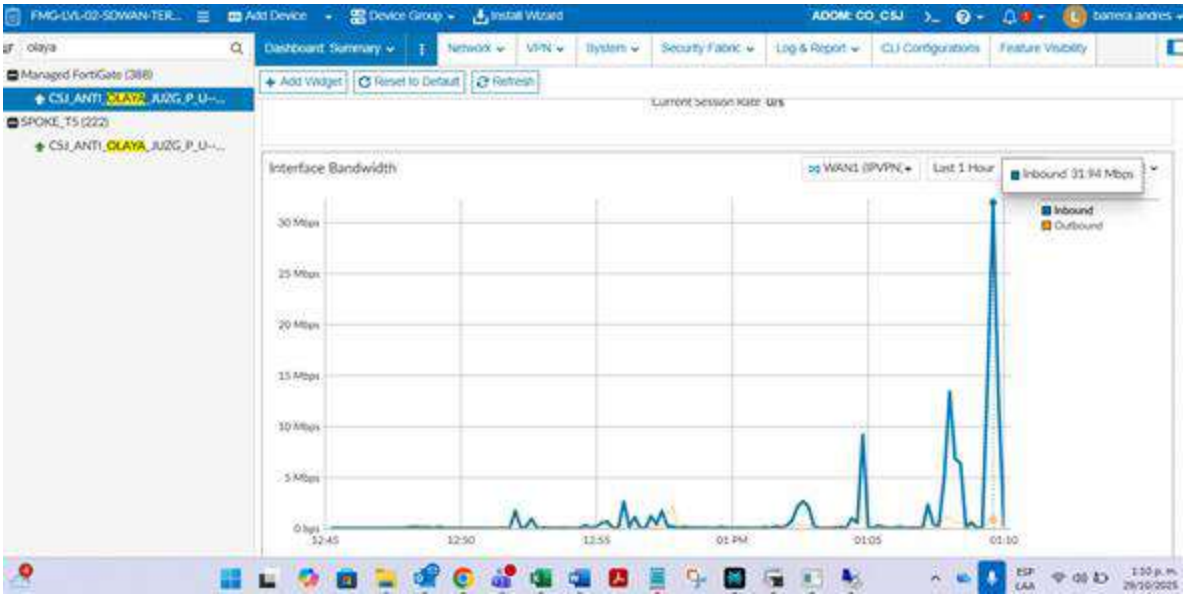

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
510	2	Valle Del Cauca, Tuluá; Carrera 27 # 22-48	20Mbps	18,6

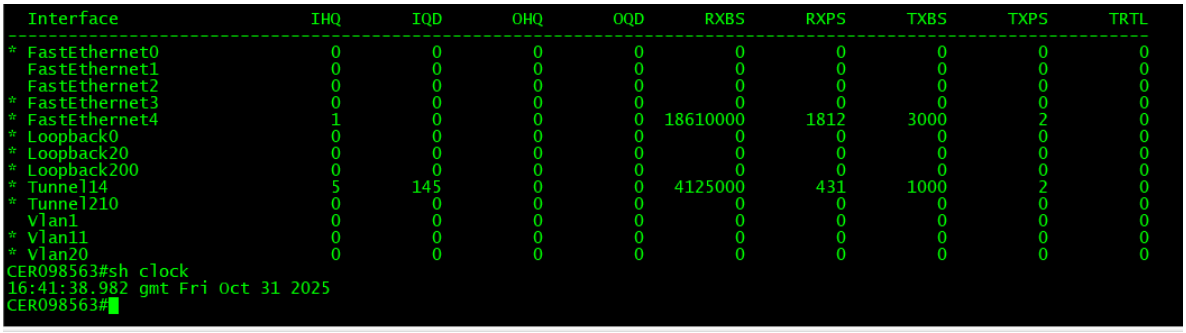


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0             0          0          0          0          0          0          0          0          0
  FastEthernet1             0          0          0          0          0          0          0          0          0
  FastEthernet2             0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet3             0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet4             1          0          0          0   18610000       1812       3000          2          0
* Loopback0                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback20                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200               0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                  5        145          0          0    4125000        431       1000          2          0
* Tunnel210                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan20                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER098563#sh clock
16:41:38.982 gmt Fri Oct 31 2025
CER098563#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
634	4	Chocó, Medio San Juan; calle principal	12 Mbps	11,2


```
  Interface              IHQ   IQD  OHQ   OQD  RXBS RXPS  TXBS TXPS TRTL
------------------------------------------------------------------------
  FastEthernet0            0     0    0     0     0    0     0    0    0
* FastEthernet1            0     0    0     0  1000    1 45000    1    0
  FastEthernet2            0     0    0     0     0    0     0    0    0
* FastEthernet3            0     0    0     0  1000    2     0    0    0
* FastEthernet4            2    89    0   967 11284000  1100 13000   10   13
* FastEthernet4.277        -     -    -     -     -    -     -    -    -
* FastEthernet4.2291       -     -    -     -     -    -     -    -    -
* Loopback0                0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Loopback10               0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Loopback200              0     0    0     0     0    0     0    0    0
* SSLVPN-VIF0              0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Tunnel14                 8     6    0 10595 2628000  273  3000    3    0
* Tunnel24                 0     0    0     1     0    0     0    0    0
* Tunnel300                0     0    0    20     0    0     0    0    0
  Vlan1                    0     0    0     0     0    0     0    0    0
* Vlan11                   0   370    0     1     0    1 43000    1    0
* Vlan30                   0     0    0     0     0    2     0    0    0
  Vlan100                  0     0    0     1     0    0     0    0    0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER062430#sh clock
*14:07:49.757 gmt Fri Oct 31 2025
CER062430#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1239	3	Nariño, Aldana; Alcaldía Municipal	20Mbps	18,8

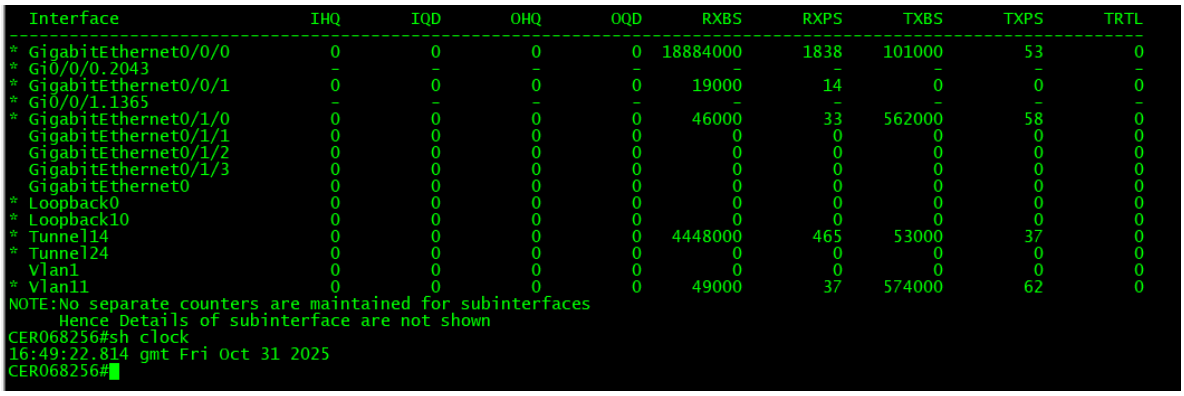


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   18884000       1838     101000         53          0
* Gi0/0/0.2043                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0      19000         14          0          0          0
* Gi0/0/1.1365                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0      46000         33     562000         58          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                      0          0          0          0    4448000        465      53000         37          0
* Tunnel24                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0      49000         37     574000         62          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER068256#sh clock
16:49:22.814 gmt Fri Oct 31 2025
CER068256#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1294	4	Bolívar, San Cristobal; Plaza principal, Calle 19 # 2-43	15 Mbps	14,1

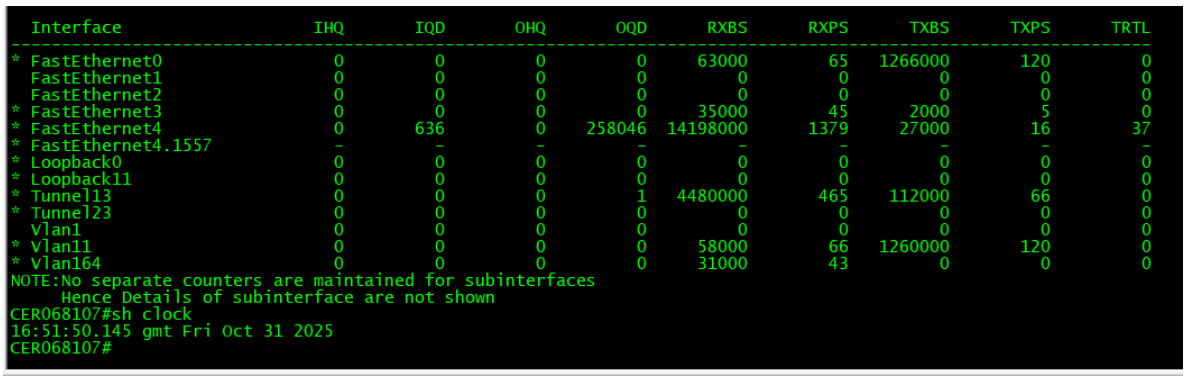


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS        RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0              0          0          0          0      63000          65    1266000        120          0
  FastEthernet1              0          0          0          0          0           0          0          0          0
  FastEthernet2              0          0          0          0          0           0          0          0          0
* FastEthernet3              0          0          0          0      35000          45       2000          5          0
* FastEthernet4              0        636          0     258046   14198000        1379      27000         16         37
* FastEthernet4.1557         -          -          -          -          -           -          -          -          -
* Loopback0                  0          0          0          0          0           0          0          0          0
* Loopback11                 0          0          0          0          0           0          0          0          0
* Tunnel13                   0          0          0          1    4480000         465     112000         66          0
* Tunnel23                   0          0          0          0          0           0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0           0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0      58000          66    1260000        120          0
* Vlan164                    0          0          0          0      31000          43          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER068107#sh clock
16:51:50.145 gmt Fri Oct 31 2025
CER068107#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1726	4	Meta, Macarena; Carrera 6 # 5-15	20Mbps	18,2

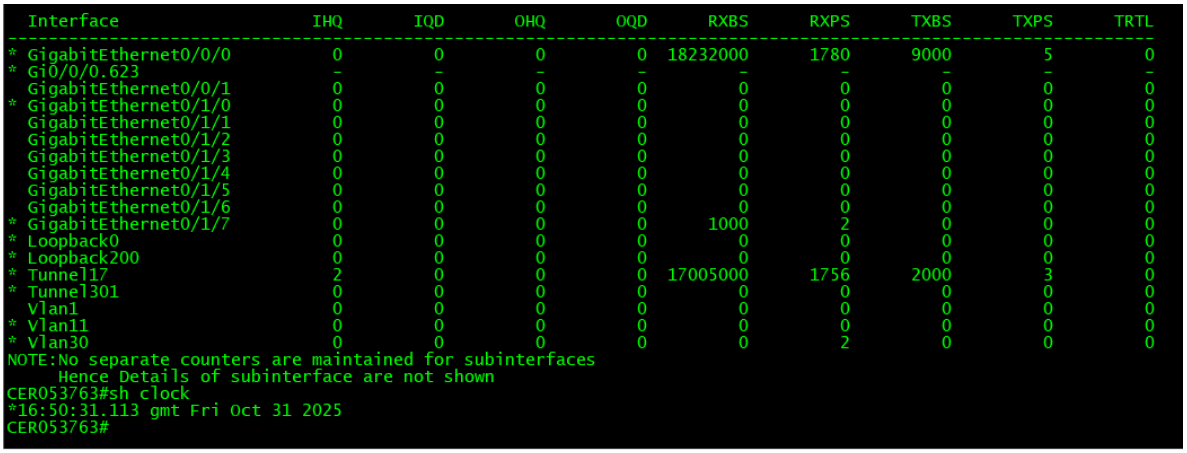


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0   18232000       1780       9000          5          0
* Gi0/0/0.623                -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0       1000          2          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel17                   2          0          0          0   17005000       1756       2000          3          0
* Tunnel301                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan30                     0          0          0          0          0          2          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CERO53763#sh clock
*16:50:31.113 gmt Fri Oct 31 2025
CERO53763#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1042-B	4	Cundinamarca, Apulo; Calle 12 # 5-01	40 Mbps	38,6

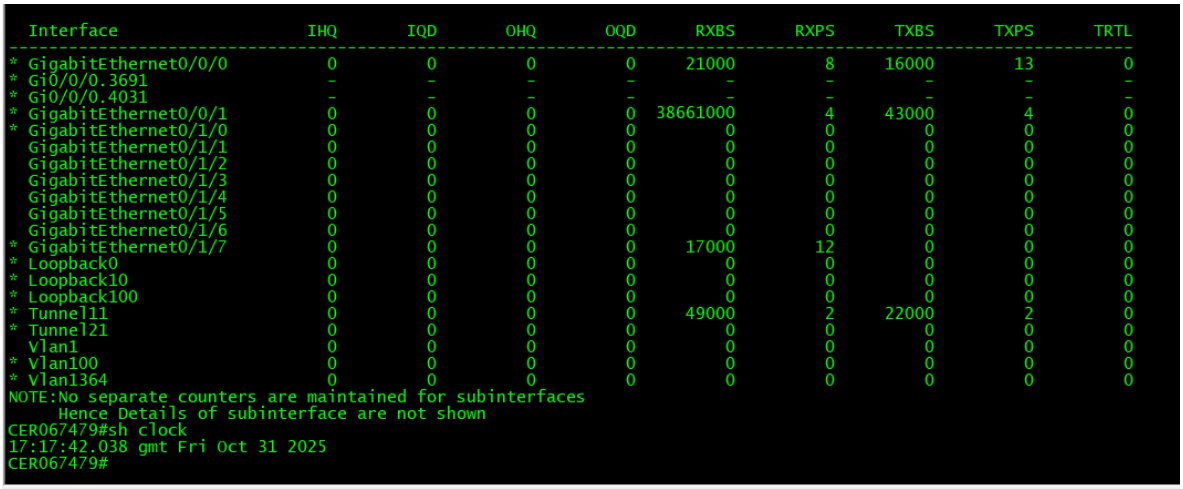

```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0          0      21000          8      16000         13          0
* Gi0/0/0.3691               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Gi0/0/0.4031               -          -          -          -          -          -          -          -          -
* GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0   38661000          4      43000          4          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0      17000         12          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10                 0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback100                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel11                   0          0          0          0      49000          2      22000          2          0
* Tunnel21                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan100                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan1364                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER067479#sh clock
17:17:42.038 gmt Fri Oct 31 2025
CER067479#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1559-B	3	Magdalena, Nueva Granada; Calle 3 # 9-45	20Mbps	18,6

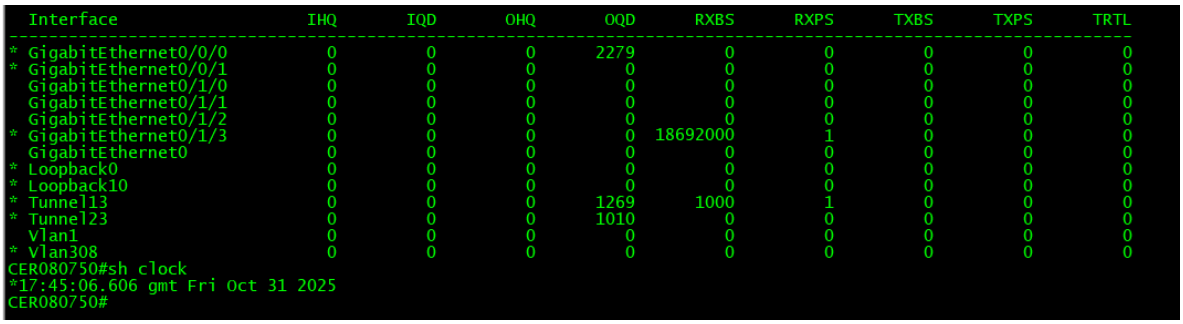


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD        RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0     0          0          0          2279       0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/0/1     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/0     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/1     0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/3     0          0          0          0          18692000   1          0          0          0
  GigabitEthernet0         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback0                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10               0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel13                 0          0          0          1269       1000       1          0          0          0
* Tunnel23                 0          0          0          1010       0          0          0          0          0
  Vlan1                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan308                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER080750#sh clock
*17:45:06.606 gmt Fri Oct 31 2025
CER080750#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
3579-B	4	Casanare, Paz de Ariporo; Calle 7 # 10-46	15 Mbps	14,1


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* FastEthernet0            0          0          0          0   14195000          0          0          0          0
  FastEthernet1            0          0          0          0          0          0          0          0          0
  FastEthernet2            0          0          0          0          0          0          0          0          0
* FastEthernet3            0          0          0          0      35000         40       4000          5          0
  FastEthernet4            0          0          0          0          0          0          0          0          0
  FastEthernet4.665        -          -          -          -          -          -          -          -          -
* Loopback0                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback10               0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel15                 0          0          0          5          0          0          0          0          0
* Tunnel25                 0          0          0        103          0          0          0          0          0
  Vlan1                    0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                   0          0          0          2          0          0          0          0          0
* Vlan1421                 3          0          0          0       1000          2       1000          2          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER143084#sh clock
*15:47:26.359 gmt Fri Oct 31 2025
CER143084#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
377-B	4	Córdoba, Ayapel; Calle 9 # 8A-08, Palacio de Justicia	20Mbps	18,5

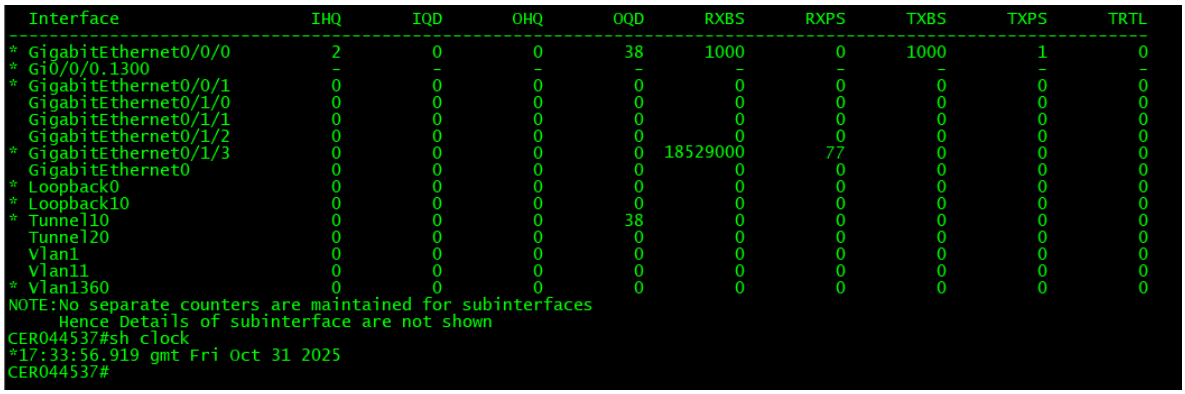


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          2          0          0         38       1000          0       1000          1         0
* Gi0/0/0.1300                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0   18529000         77          0          0         0
  GigabitEthernet0              0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Loopback10                    0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel10                      0          0          0         38          0          0          0          0         0
  Tunnel20                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan11                        0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan1360                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER044537#sh clock
*17:33:56.919 gmt Fri Oct 31 2025
CER044537#
```


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
969	4	Santander, Betulia; Calle 5 # 5 Esquina Piso 2, Alcaldía Municipal	20Mbps	19,3

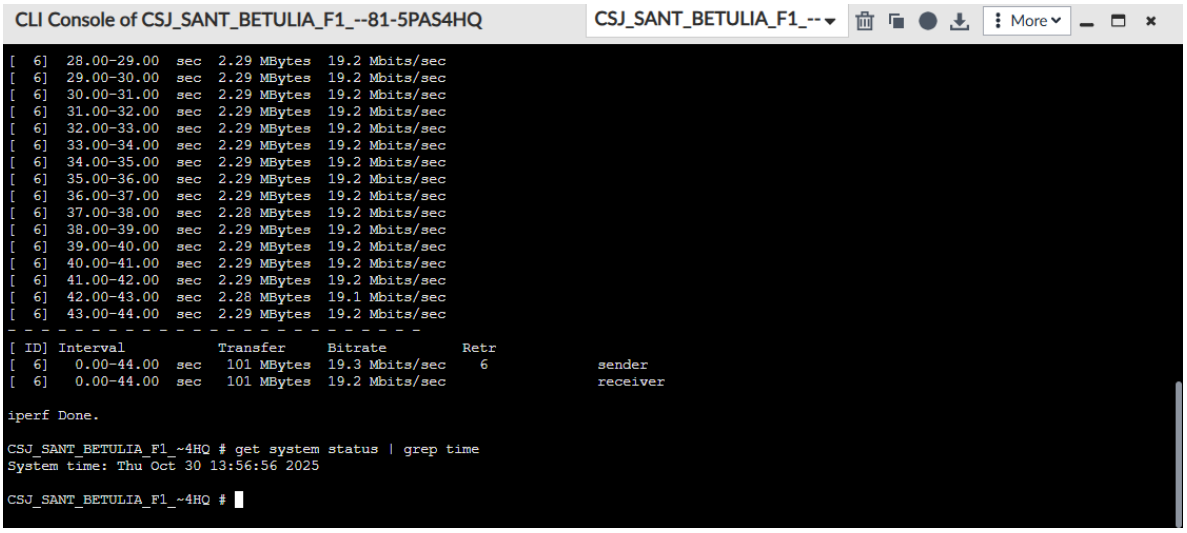


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1112	4	Nariño, Iles; Carrera 5 # 4-34	20Mbps	22

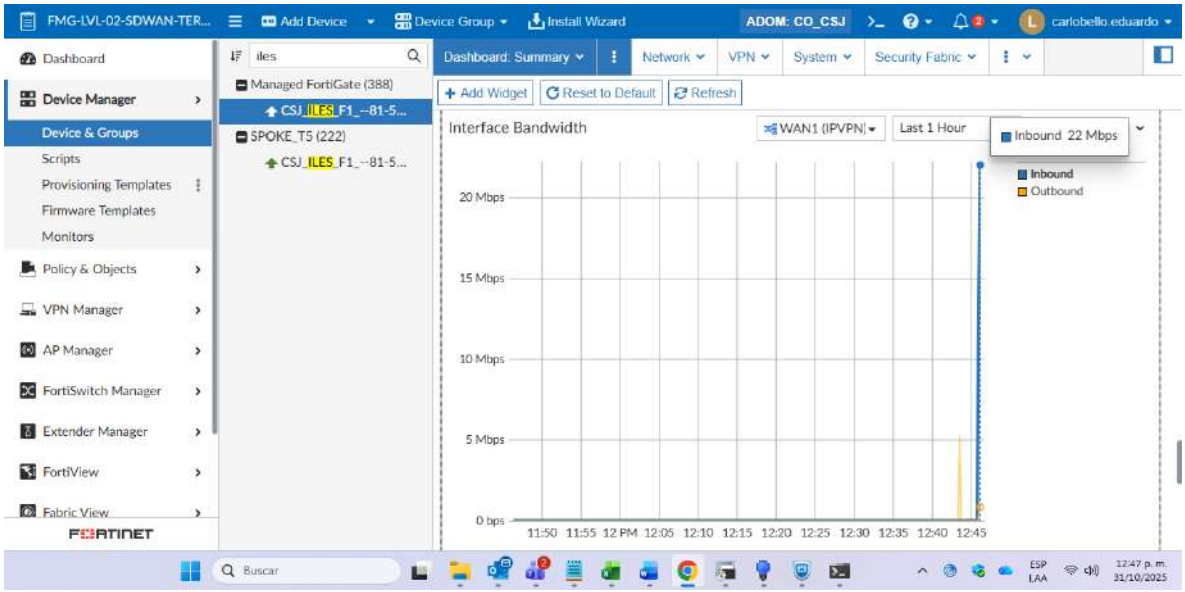


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1222	3	Nariño, Providencia; Carrera 5 # calle 6 esquina - Barrio Lourdes	20Mbps	20,8

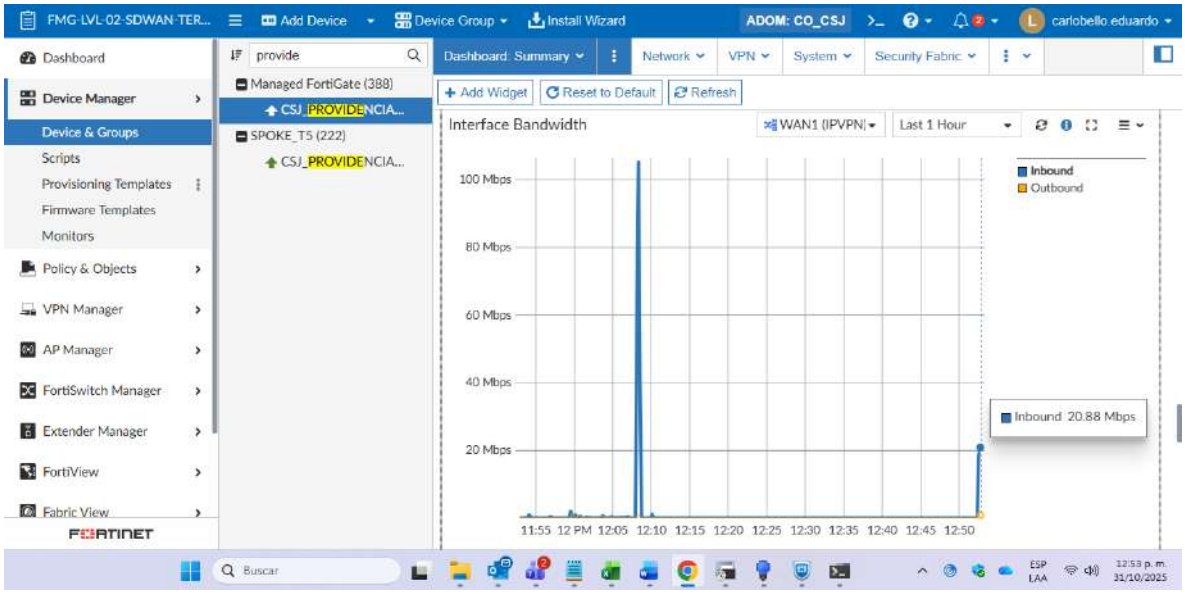


PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1501	4	Antioquia, Anzá; Carrera 11 # 09-34	25 Mbps	30,2

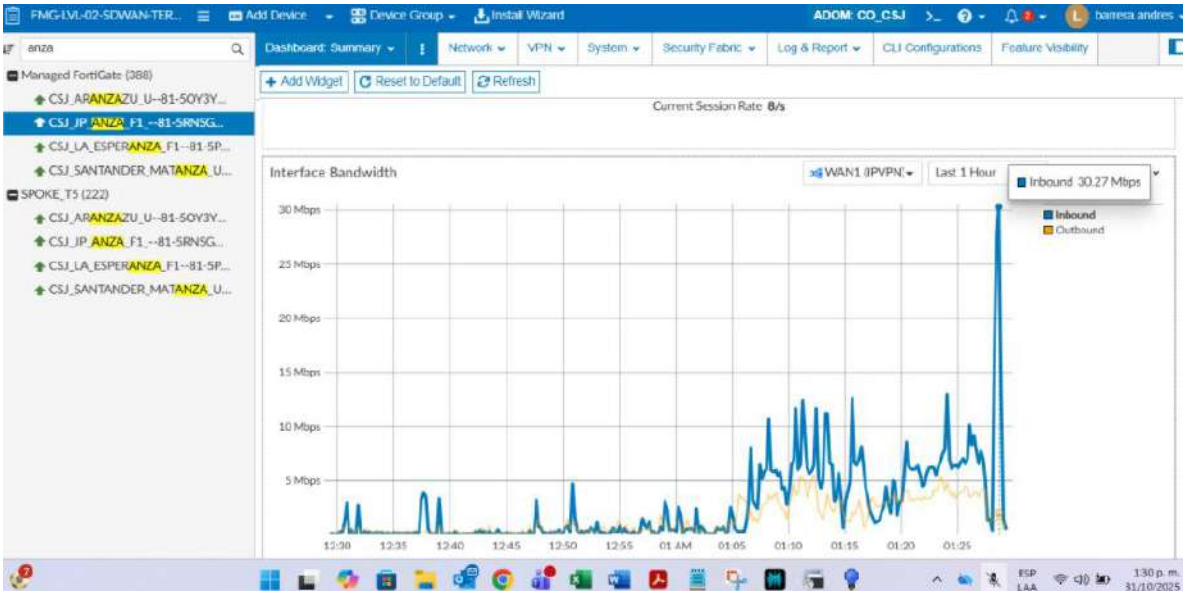


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1179	4	Antioquia, Vigía del Fuerte; Calle Venezuela Piso 1	20Mbps	20,5

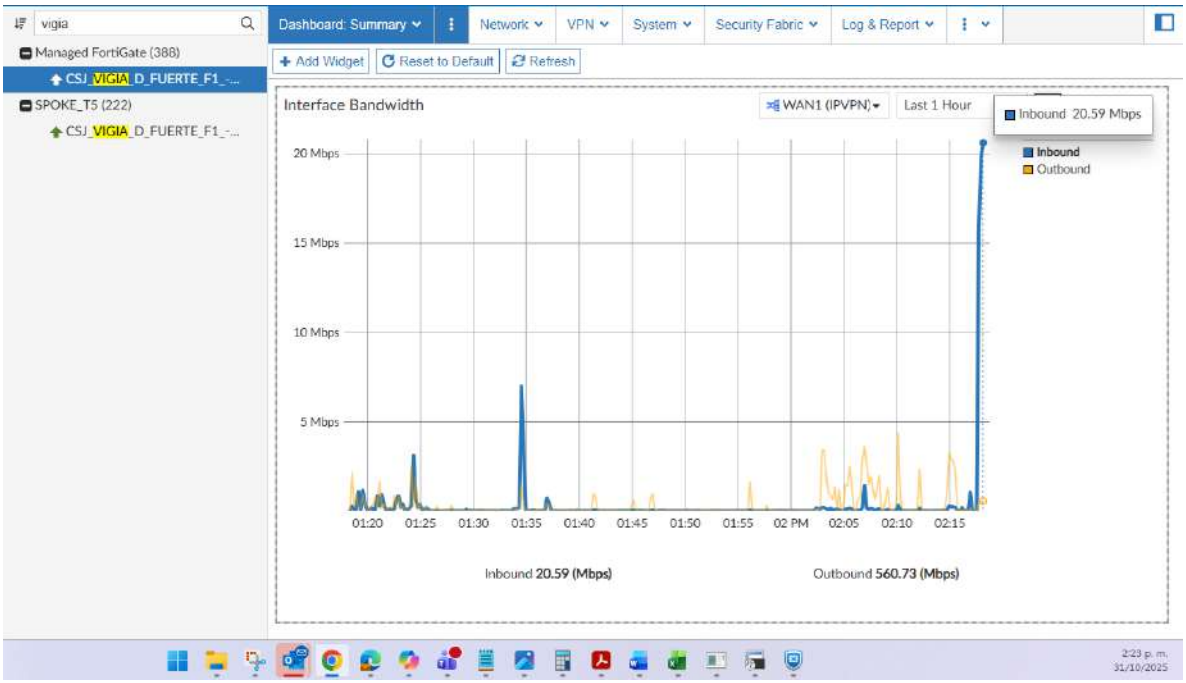

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1407	3	Nariño, Roberto Payan; Calle Principal	20Mbps	20

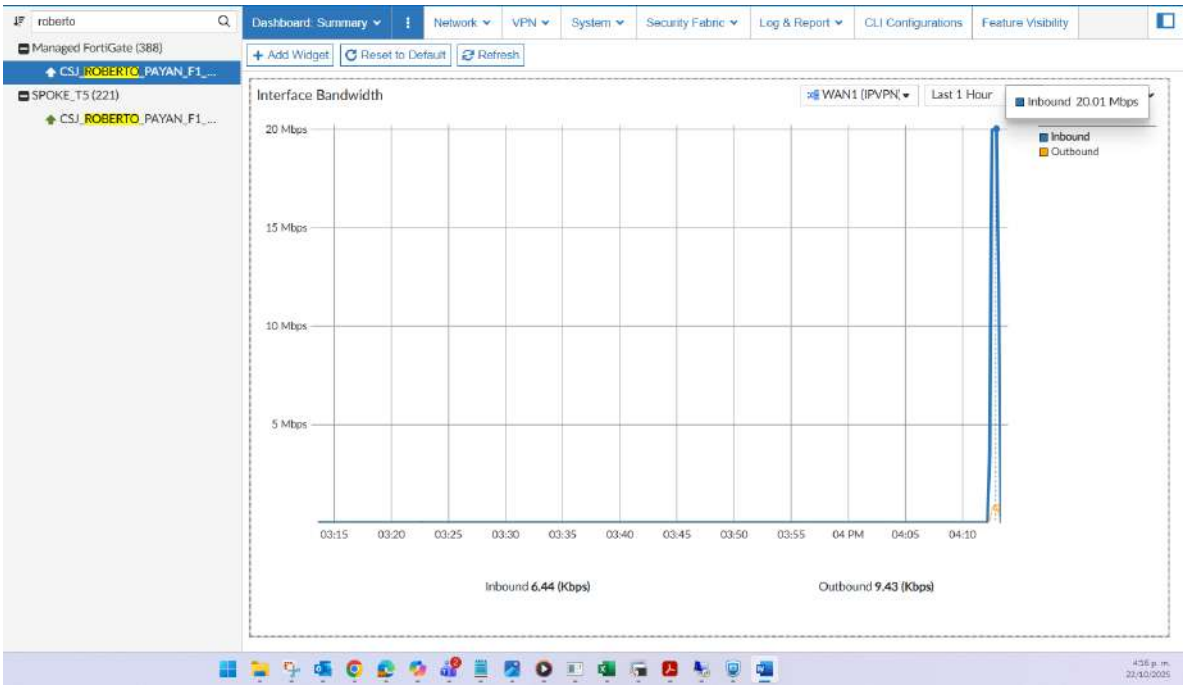


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1718	4	Chocó, Bojayá; Banco Agrario piso 2	15 Mbps	14,5

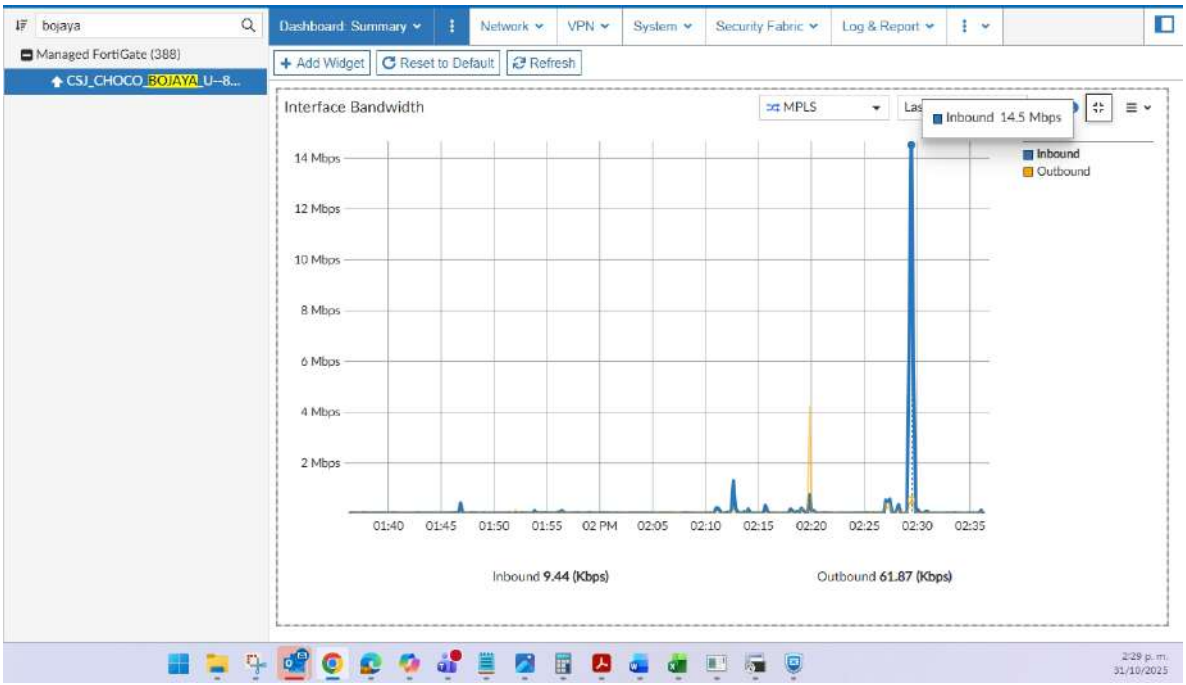

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1950	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 23 # 7-36	150 Mbps	147,5




PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
5167	3	Córdoba, Montelíbano; Calle 17 # 3-140, Palacio de Justicia	50 Mbps	50,2

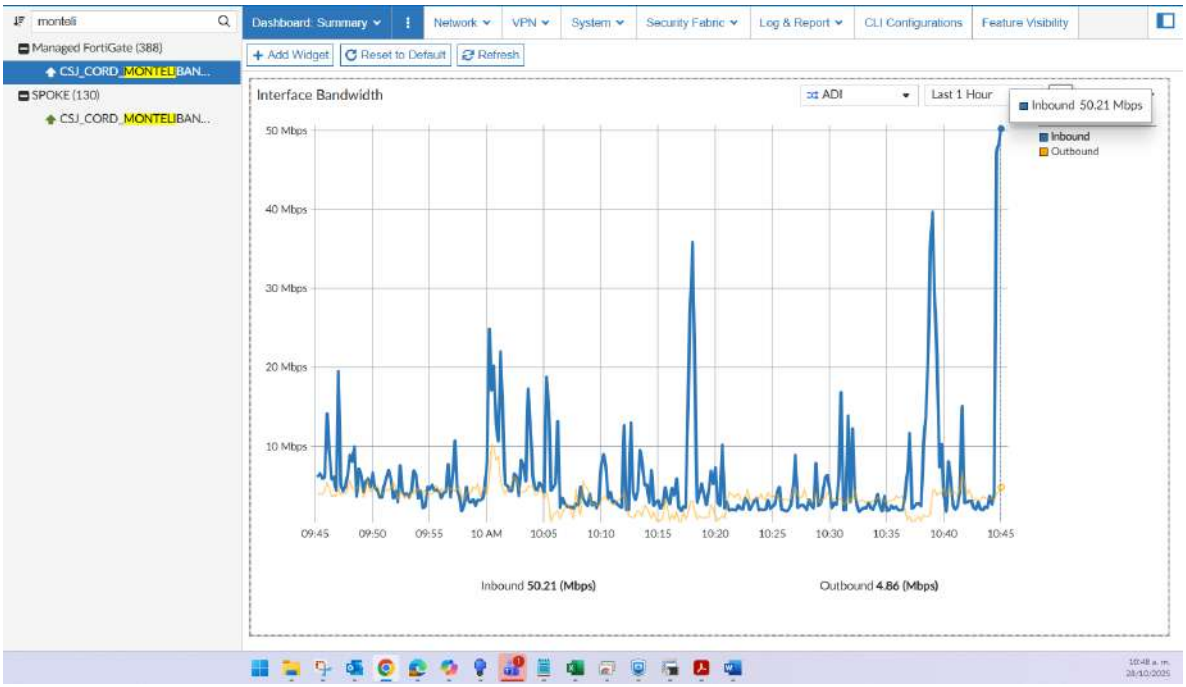

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1337	3	Norte de Santander, Abrego; Carrera 5 # 15-67	25 Mbps	25


```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          1          0          0          0          0          2       2000          2          0
* Gi0/0/0.1560                  -          -          -          -          -          -          -          -          -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0   25070000        103    1045000        142          0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0    5106000        583     449000         97          0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback200                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Tunnel17                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel300                     0          0          0          0    4035000        458     386000        106          0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                        0          0          0          0     412000        111    1082000        152          0
* Vlan30                        0          0          0          0    4399000        521     470000        105          0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER068110#sh clock
12:16:34.816 gmt Wed Oct 29 2025
CER068110#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
512	4	Valle Del Cauca, Ulloa; Calle 5 # 2-43	25 Mbps	24,2

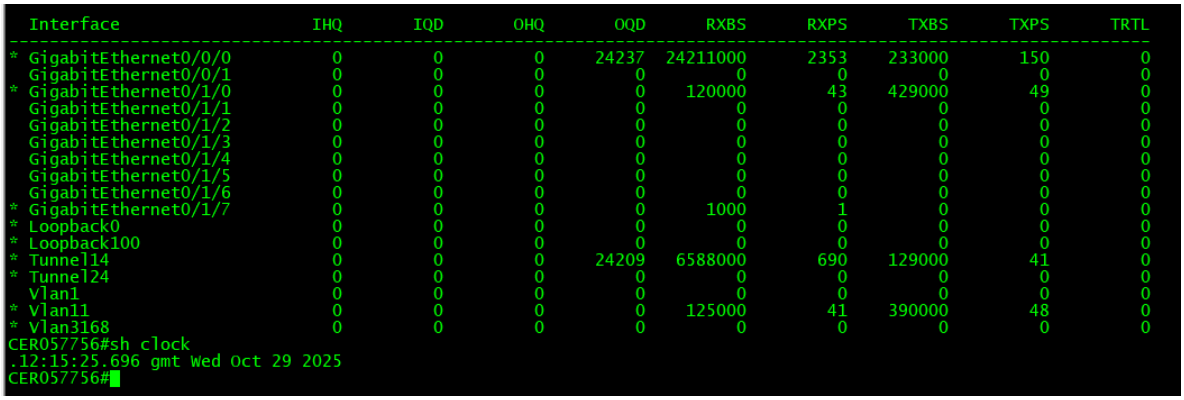


```
  Interface                IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS       TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0       0          0          0      24237   24211000       2353     233000        150          0
  GigabitEthernet0/0/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/0       0          0          0          0     120000         43     429000         49          0
  GigabitEthernet0/1/1       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/2       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/3       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/4       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/5       0          0          0          0          0          0          0          0          0
  GigabitEthernet0/1/6       0          0          0          0          0          0          0          0          0
* GigabitEthernet0/1/7       0          0          0          0       1000          1          0          0          0
* Loopback0                  0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Loopback100                0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Tunnel14                   0          0          0      24209    6588000        690     129000         41          0
* Tunnel24                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
  Vlan1                      0          0          0          0          0          0          0          0          0
* Vlan11                     0          0          0          0     125000         41     390000         48          0
* Vlan3168                   0          0          0          0          0          0          0          0          0
CER057756#sh clock
.12:15:25.696 gmt Wed Oct 29 2025
CER057756#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1221	4	Putumayo, Santiago; Carrera 6 # 4-23	20Mbps	20

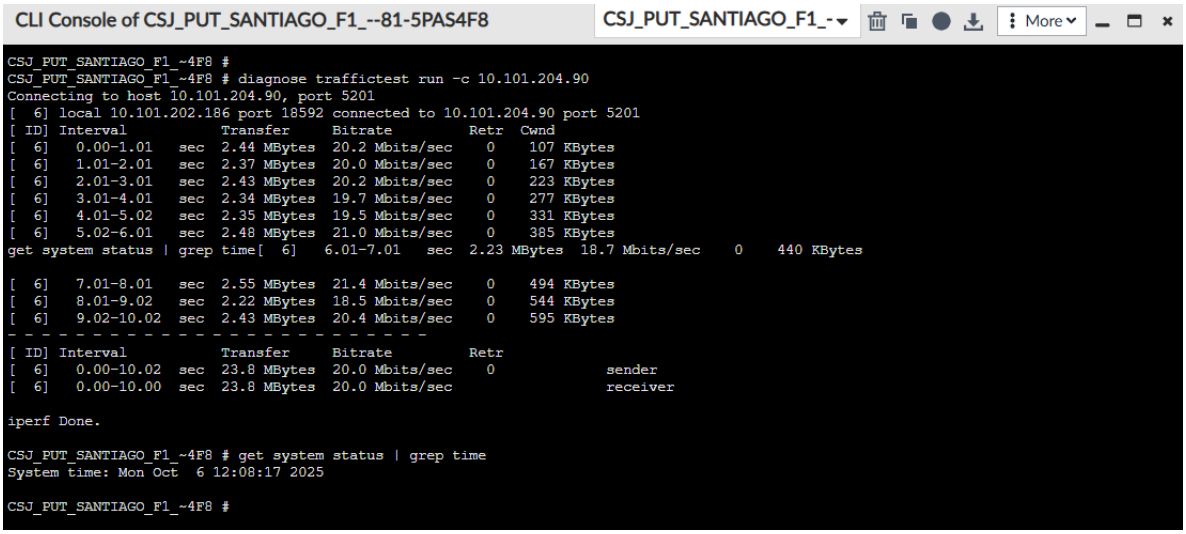

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
1216-B	4	Cundinamarca, Villapinzón; Carrera 5 # 4-43 Piso 2	25 Mbps	25,7

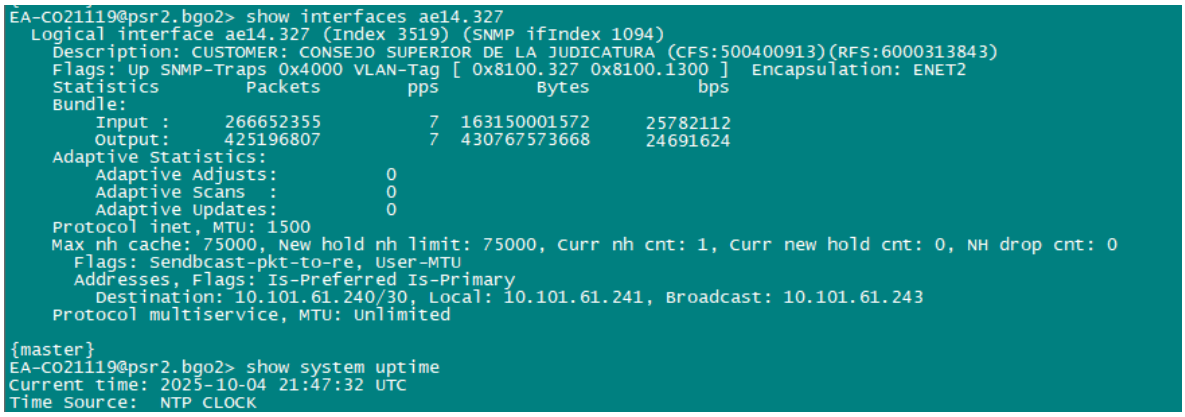


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3241	4	Cundinamarca, Villapinzón; Carrera 5 # 4-43 Piso 2	0,512 Mbps	0,691

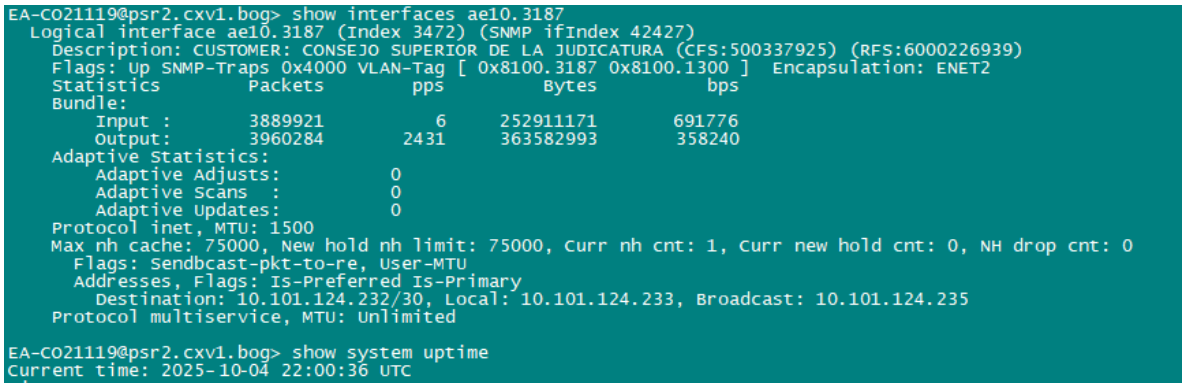


```
EA-CO21119@psr2.cxv1.bog> show interfaces ae10.3187
  Logical interface ae10.3187 (Index 3472) (SNMP ifIndex 42427)
    Description: CUSTOMER: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA (CFS:500337925) (RFS:6000226939)
    Flags: Up SNMP-Traps 0x4000 VLAN-Tag [ 0x8100.3187 0x8100.1300 ]  Encapsulation: ENET2
    Statistics        Packets        pps         Bytes          bps
    Bundle:
        Input :       3889921          6     252911171       691776
        Output:       3960284       2431     363582993       358240
    Adaptive Statistics:
        Adaptive Adjusts:          0
        Adaptive Scans  :          0
        Adaptive Updates:          0
    Protocol inet, MTU: 1500
    Max nh cache: 75000, New hold nh limit: 75000, Curr nh cnt: 1, Curr new hold cnt: 0, NH drop cnt: 0
      Flags: Sendbcast-pkt-to-re, User-MTU
      Addresses, Flags: Is-Preferred Is-Primary
        Destination: 10.101.124.232/30, Local: 10.101.124.233, Broadcast: 10.101.124.235
    Protocol multiservice, MTU: Unlimited

EA-CO21119@psr2.cxv1.bog> show system uptime
Current time: 2025-10-04 22:00:36 UTC
```

PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
380-B	4	Cundinamarca, Beltrán; Calle 4 # 2-80	25 Mbps	26

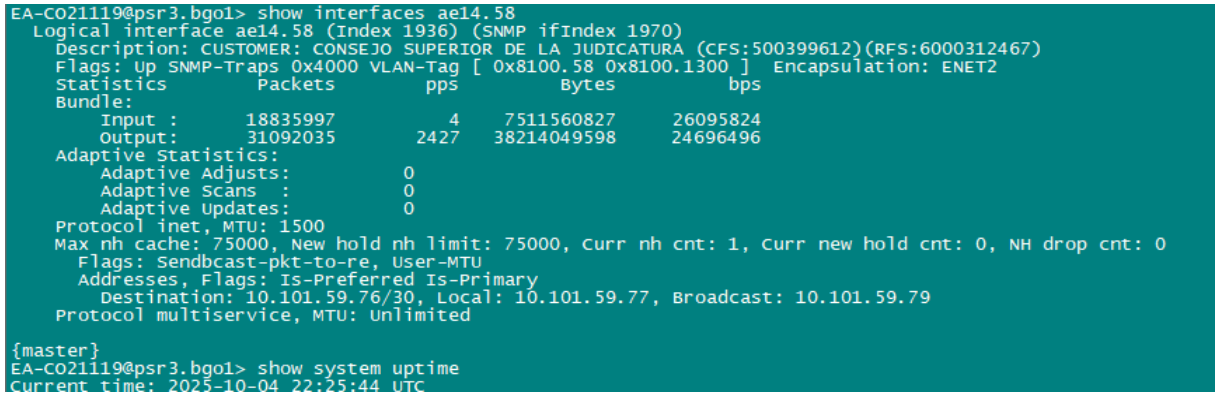


PIVOT	ZONA	DIRECCIÓN	BW CONTRATO	RESULTADO BW
3601	4	Caquetá, Florencia; Carrera 11 Kilómetro 3, Bodega 3, Parque Industrial Santa María (Archivo Central)	32 Mbps	32,7

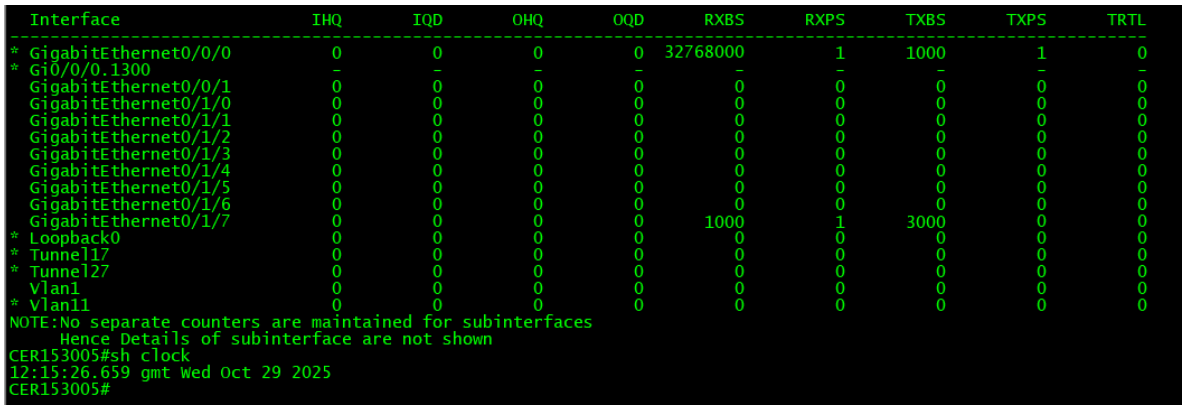

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0          0          0          0          0   32768000          1       1000          1         0
* Gi0/0/0.1300                  -          -          -          -          -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/0/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/1          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/2          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6          0          0          0          0          0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7          0          0          0          0       1000          1       3000          0         0
* Loopback0                     0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel17                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Tunnel27                      0          0          0          0          0          0          0          0         0
  Vlan1                         0          0          0          0          0          0          0          0         0
* Vlan11                        0          0          0          0          0          0          0          0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER153005#sh clock
12:15:26.659 gmt Wed Oct 29 2025
CER153005#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
3604-B	1	Magdalena, Santa Marta; Calle 15 # 2 - 60 piso 8 Edificio Bolívar	64 Mbps	62,7

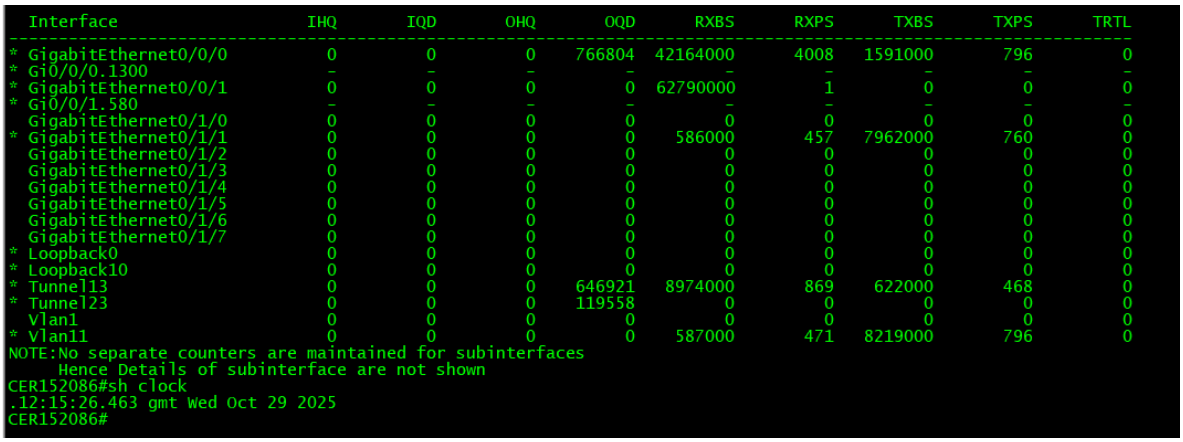

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD       RXBS       RXPS       TXBS       TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          766804    42164000   4008       1591000    796       0
* Gi0/0/0.1300                -          -          -          -         -          -          -          -         -
* GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0         62790000   1          0          0         0
* Gi0/0/1.580                 -          -          -          -         -          -          -          -         -
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0         586000     457        7962000    760       0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0         0          0          0          0         0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback0                   0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Loopback10                  0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Tunnel13                    0          0          0          646921    8974000    869        622000     468       0
* Tunnel23                    0          0          0          119558    0          0          0          0         0
  Vlan1                       0          0          0          0         0          0          0          0         0
* Vlan11                      0          0          0          0         587000     471        8219000    796       0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER152086#sh clock
.12:15:26.463 gmt Wed Oct 29 2025
CER152086#
```

PIVOT	ZONA	Direccion	BW Contrato	Resultado BW
1390-B	4	Nariño, Magui; Parque Principal	20 Mbps	20,1

```
  Interface                   IHQ        IQD        OHQ        OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* GigabitEthernet0/0/0        0          0          0          0        26000     10        35000     11        0
* Gi0/0/0.2011                -          -          -          -        -         -         -         -         -
  GigabitEthernet0/0/1        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/0        0          0          0          0        0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/1        0          0          0          0        10000     5         6000      4         0
  GigabitEthernet0/1/2        0          0          0          0        0         0         0         0         0
* GigabitEthernet0/1/3        0          0          0          0        20173000  18        0         0         0
  GigabitEthernet0/1/4        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/5        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/6        0          0          0          0        0         0         0         0         0
  GigabitEthernet0/1/7        0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Loopback0                   0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Loopback20                  0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Tunnel14                    0          0          0          0        14000     3         9000      3         0
* Tunnel24                    0          0          0          0        0         0         0         0         0
  Vlan1                       0          0          0          0        0         0         0         0         0
* Vlan11                      0          0          0          0        12000     3         14000     3         0
* Vlan3138                    2          0          0          0        0         0         0         0         0
NOTE:No separate counters are maintained for subinterfaces
     Hence Details of subinterface are not shown
CER064122#sh clock
.12:15:25.774 gmt Wed Oct 29 2025
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1157-B	2	Calle 6 # 14-43	64 Mbps	65,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh run int Te0/1/0/1.1544
Wed Oct  1 11:17:38.433 COT
interface TenGigE0/1/0/1.1544
 description IPDP RAMA JUDICIAL GESTION_PROACTIVA - DWK0000670
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.1 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1544
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh policy-map int Te0/1/0/1.1544 | inc confo
Wed Oct  1 11:17:51.368 COT
    Policed(conform)    :           518599909/320272966512         1
    Policed(conform)    :           934196795/972054387728         65506
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#show clock
Wed Oct  1 11:17:53.513 COT
11:17:53.717 COT Wed Oct 1 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1142-B	2	Carrera 15 # 7-12	70 Mbps	71,6

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh run int Te0/1/0/1.2545
Wed Oct  1 11:18:40.212 COT
interface TenGigE0/1/0/1.2545
 description RAMA JUDICIAL DWK0000671
 service-policy input CAR-70M
 service-policy output CAR-70M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.5 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2545
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sho policy-map int Te0/1/0/1.2545 | inc confo
Wed Oct  1 11:18:47.606 COT
    Policed(conform)    :          469043303/246796558662         0
    Policed(conform)    :          626281794/621548750550         71613
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#show clock
Wed Oct  1 11:18:49.840 COT
11:18:50.037 COT Wed Oct 1 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1510-B	1	Carrera 50 Calle 51-49 (Interior 2)	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Te0/3/0/2.2613
Wed Oct  1 11:19:53.927 COLOMBIA
interface TenGigE0/3/0/2.2613
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000673
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.13/30
 encapsulation dot1q 2613
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sho policy-map int Te0/3/0/2.2613 | inc confo
Wed Oct  1 11:20:01.691 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          1236631456/743229970986         1
    Policed(conform)    :          1459810101/1481570781350        32746
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Wed Oct  1 11:20:04.046 COLOMBIA
11:20:04.086 COLOMBIA Wed Oct 1 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
915-B	1	Diagonal 26M Calle 73 Esquina	65 Mbps	65

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh run int Te0/0/2/2.511
Wed Oct  1 11:20:44.177 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/2.511
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000674+
 service-policy input CAR-65M
 service-policy output CAR-65M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.17 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 511
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh policy-map int Te0/0/2/2.511 | inc confo
Wed Oct  1 11:20:53.369 COLOMBIA
    Policed(conform)    :              79498/13910072             1
    Policed(conform)    :            6112308/8849512380           65057
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#show clock
Wed Oct  1 11:20:55.874 COLOMBIA
11:20:56.166 COLOMBIA Wed Oct 1 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1087-B	3	Calle 19# 13-13	37 Mbps	37,8

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Te0/3/0/2.615
Wed Oct  1 11:22:17.395 COLOMBIA
interface TenGigE0/3/0/2.615
 description RAMA JUDICIAL DWK0000676
 service-policy input CAR-37M
 service-policy output CAR-37M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.25/30
 encapsulation dot1q 615
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sho policy-map int Te0/3/0/2.615 | inc confo
Wed Oct  1 11:22:23.831 COLOMBIA
    Policed(conform)    :              380606/68384636              1
    Policed(conform)    :            14928413/21310364766           37872
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Wed Oct  1 11:22:25.961 COLOMBIA
11:22:26.000 COLOMBIA Wed Oct 1 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1526-B	1	Carrera 36A # 39-26 Piso 3 Barrio el Salvador	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#sh run int BE92.3616
Wed Oct  1 11:23:17.611 COT
interface Bundle-Ether92.3616
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000677
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.29/30
 encapsulation dot1q 3616
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#sho policy-map int BE92.3616 | inc confo
Wed Oct  1 11:23:23.421 COT
    Policed(conform)    :               34653/5684310              1
    Policed(conform)    :             1110560/1565581400           32757
RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#show clock
Wed Oct  1 11:23:25.694 COT
11:23:25.753 COT Wed Oct 1 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1525-B	1	Carrera 79 # 41Sur 36, Casa de Justicia San Antonio de Prado	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Gi0/3/0/18.643
Wed Oct  1 11:26:23.186 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/3/0/18.643
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000678
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.33/30
 encapsulation dot1q 643
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh policy-map int Gi0/3/0/18.643 | inc confo
Wed Oct  1 11:26:29.201 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            83116603/58716505915          1
    Policed(conform)    :           143279180/151422851596         32725
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Wed Oct  1 11:26:31.953 COLOMBIA
11:26:31.988 COLOMBIA Wed Oct 1 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
909-B	1	Calle 73 Diagonal 26M-90 Barrio Los Mangos Calle 73	100 Mbps	106,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh run int Te0/0/2/2.560
Wed Oct 15 14:41:25.038 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/2.560
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000680
 service-policy input CAR-100M
 service-policy output CAR-100M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.41 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 560
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh policy-map int Te0/0/2/2.560 | inc confo
Wed Oct 15 14:42:56.861 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            30014641/19245223444          1
    Policed(conform)    :           156034996/207077145726         106783
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh clock
Wed Oct 15 14:43:01.111 COLOMBIA
14:43:01.398 COLOMBIA Wed Oct 15 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
434-B	1	Carrera 16 # 35-03, Centro Comercial Guadalupe Plaza 2 piso	40 Mbps	43,4

```
<THBHDOSQUEBRADASCORP>dis cur int Eth-Trunk10.2681
#
interface Eth-Trunk10.2681
 vlan-type dot1q 2681
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000681 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.237.37 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-40M inbound
 traffic-policy CAR-40M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHDOSQUEBRADASCORP>dis int Eth-Trunk10.2681 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 2040 bits/sec, 4 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 43434152 bits/sec, 3694 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.21%
<THBHDOSQUEBRADASCORP>dis clock
2025-10-05 16:13:53-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHDOSQUEBRADASCORP>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
910-B	1	Calle 73 # 7G-28 Barrio Alfonso Lopez	50 Mbps	51,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#sh run int Te0/0/0/3.555
Wed Oct  1 11:29:44.926 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/3.555
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000682
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.45 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 555
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#sh policy-map int Te0/0/0/3.555 | inc confo
Wed Oct  1 11:29:58.179 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           393645524/238604695664         1
    Policed(conform)    :          1245837131/1544584707808        51314
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#show clock
Wed Oct  1 11:30:00.816 COLOMBIA
11:30:01.110 COLOMBIA Wed Oct 1 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
286-B	2	Carrera 25 # 4-59	64 Mbps	83,3

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.588
Wed Oct  1 11:31:04.701 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.588
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000685
 service-policy input CAR-64M_IN
 service-policy output CAR-64M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.57 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 588
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh policy-map int Hu0/7/0/0.588 | inc Match
Wed Oct  1 11:31:12.538 COT
    Matched             :            4286104/1937562420           1
    Matched             :          104740259/150788691706         83341
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock
Wed Oct  1 11:31:15.076 COT
11:31:15.313 COT Wed Oct 1 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
283-B	3	Carrera 11 # 14-03/05/07	64 Mbps	65,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#sh run int Te0/1/0/4.650
Wed Oct  1 11:31:58.472 GMT+5
interface TenGigE0/1/0/4.650
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000686
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.61 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 650
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#sh policy-map int Te0/1/0/4.650 | inc confo
Wed Oct  1 11:32:06.023 GMT+5
    Policed(conform)    :           174732214/139495910276         0
    Policed(conform)    :           308356459/320208417606         65534
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#show clock
Wed Oct  1 11:32:09.388 GMT+5
11:32:09.567 GMT+5 Wed Oct 1 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
549-B	3	Calle 4 # 4-36 Local 2	32 Mbps	34,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh run int Te0/0/0/1.450
Sun Oct  5 16:15:57.438 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/1.450
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000691
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.85/30
 encapsulation dot1q 450
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh policy-map int Te0/0/0/1.450 | inc confo
Sun Oct  5 16:15:59.532 COLOMBIA
    Policed(conform)     :             1310250/778419308            0
    Policed(conform)     :             9943418/13203307008          34928
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#show clock
Sun Oct  5 16:16:01.878 COLOMBIA
16:16:02.169 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
122-B	1	Calle 6 # 17-60	50 Mbps	65

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.648
Sun Oct  5 16:16:56.100 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.648
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000695
 service-policy input CAR-50M-IN
 service-policy output CAR-50M-OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.101 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 648
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh policy-map int Hu0/7/0/0.648 | inc Match
Sun Oct  5 16:17:03.193 COT
    Matched             :           160171004/110128975630         0
    Matched             :           325983477/374396948356         65004
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock
Sun Oct  5 16:17:05.603 COT
16:17:05.945 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3375-B	2	Carrera 12 # 16-33 Piso 2	132 Mbps	135,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KGIRARDOT2#sh run int BE91.349
Sun Oct  5 16:17:35.421 GMT+5
interface Bundle-Ether91.349
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000696
 service-policy input CAR-132M
 service-policy output CAR-132M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.105/30
 encapsulation dot1q 349
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KGIRARDOT2#sh policy-map int BE91.349 | inc confo
Sun Oct  5 16:17:43.880 GMT+5
    Policed(conform)    :           101087273/69094158254          1
    Policed(conform)    :           595197134/793922070050         135131
RP/0/RSP0/CPU0:A9KGIRARDOT2#show clock
Sun Oct  5 16:17:45.627 GMT+5
16:17:45.777 GMT+5 Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KGIRARDOT2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
312-B	2	Alcaldía Municipal	15 Mbps	15,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#sh run int Gi0/0/0/2.510
Sun Oct  5 16:18:17.236 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/0/2.510
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000697
 service-policy input CAR-15M
 service-policy output CAR-15M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.109 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 510
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#sho policy-map int Gi0/0/0/2.510 | inc confo
Sun Oct  5 16:18:25.870 COLOMBIA
    Policed(conform)    :              228493/39332928             0
    Policed(conform)    :            10678800/11710361384          15384
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#show clock
Sun Oct  5 16:18:27.953 COLOMBIA
16:18:28.244 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
116-B	1	Carrera 78 # 77A-62, URI Engativa	64 Mbps	83,1

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.228
Sun Oct  5 16:18:57.673 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.228
 description RAMA JUDICIAL DWK0000698
 service-policy input CAR-64M_IN
 service-policy output CAR-64M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.113 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 228
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh policy-map int Hu0/7/0/0.228 | inc Match
Sun Oct  5 16:19:07.107 COT
    Matched             :           161672770/98718519798          54
    Matched             :           263920336/297487846724         83196
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock
Sun Oct  5 16:19:09.453 COT
16:19:09.597 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
117-B	1	Carrera 69 # 36-70, URI Kennedy	65 Mbps	84,6

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.568
Sun Oct  5 16:19:34.632 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.568
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000699
 service-policy input CAR-65M_IN
 service-policy output CAR-65M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.117 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 568
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh policy-map int Hu0/7/0/0.568 | inc Match
Sun Oct  5 16:19:43.510 COT
    Matched             :             5607432/2357814316           30
    Matched             :            88151871/125414015244         84625
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock

Sun Oct  5 16:19:45.915 COT
16:19:46.056 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
98-B	1	Calle 16B # 9-83, Edifico Leslie	50 Mbps	52,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sh run int Gi0/0/0/7.580
Sun Oct  5 16:20:17.530 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/0/7.580
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000702
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.129/30
 encapsulation dot1q 580
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sh policy-map int Gi0/0/0/7.580 | inc confo
Sun Oct  5 16:20:28.652 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            32209867/18113169495          1
    Policed(conform)    :           305960649/426640892288         52390
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#show clock
Sun Oct  5 16:20:31.228 COLOMBIA
16:20:31.511 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1536-B	1	Calle 56 # 11-102, Sede UPJ	20 Mbps	20,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#sh run int Gi0/1/0/5.618
Sun Oct  5 16:21:03.176 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/1/0/5.618
 description RAMA JUDICIAL - DWK0000703
 service-policy input CAR-20M
 service-policy output CAR-20M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.133/30
 encapsulation dot1q 618
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#sh policy-map int Gi0/1/0/5.618 | inc confo
Sun Oct  5 16:21:10.056 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           206466870/138516403969         1
    Policed(conform)    :           293126239/277748445868         20463
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#show clock
Sun Oct  5 16:21:11.726 COLOMBIA
16:21:11.769 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
95-B	1	Calle 16 # 9-44, Caja Agraria Piso 4	50 Mbps	52

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sh run int Gi0/0/0/7.275
Sun Oct  5 16:21:38.388 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/0/7.275
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000704
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.137/30
 encapsulation dot1q 275
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sho policy-map int Gi0/0/0/7.275 | inc confo
Sun Oct  5 16:21:45.505 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           185965212/101874857298         1
    Policed(conform)    :           321508521/342757225138         52059
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#show clock
Sun Oct  5 16:21:48.739 COLOMBIA
16:21:49.023 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1365-B	3	Calle 30 # 30-30 Oficina 202	34 Mbps	34,8

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#sh run int Gi0/1/1/5.3615
Sun Oct  5 16:22:18.037 COT
interface GigabitEthernet0/1/1/5.3615
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000715
 service-policy input CAR-34M
 service-policy output CAR-34M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.145/30
 encapsulation dot1q 3615
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#sho policy-map int Gi0/1/1/5.3615  | inc confo
Sun Oct  5 16:22:25.059 COT
    Policed(conform)    :             1557334/930034244            1
    Policed(conform)    :             4656668/5419698140           34813
RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#show clock
Sun Oct  5 16:22:27.015 COT
16:22:27.073 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3378-B	1	Transversal 12 # 38 A - 18 Plazoleta Terreros Soacha	150 Mbps	168,9

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.410
Sun Oct  5 16:25:32.708 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.410
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000716
 service-policy input CAR-150M-IN
 service-policy output CAR-150M-OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.185 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 410
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh policy-map int Hu0/7/0/0.410 | inc Match
Sun Oct  5 16:25:43.656 COT
    Matched             :            73732461/58988561426          0
    Matched             :           417037354/565704471850         168932
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock
Sun Oct  5 16:25:45.933 COT
16:25:46.108 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1507-B	1	Carrera 41 # 36Sur -67 (Interior 304) Edificio Hurbe	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Hu0/0/0/1.1612
Sun Oct  5 16:26:25.374 COLOMBIA
interface HundredGigE0/0/0/1.1612
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000720
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.193/30
 encapsulation dot1q 1612
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sho policy-map int Hu0/0/0/1.1612 | inc confo
Sun Oct  5 16:26:35.339 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           651974069/403741020288         2
    Policed(conform)    :           913779454/980972443611         32753
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Sun Oct  5 16:26:37.126 COLOMBIA
16:26:37.167 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
913-B	1	Carrera 41B # 50 Barrio El Vallado Cali 15	25 Mbps	25,6

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#sh run int Gi0/0/1/8.1634
Sun Oct  5 16:27:06.308 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/8.1634
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000723
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.213 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1634
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#sho policy-map int Gi0/0/1/8.1634 | inc confo
Sun Oct  5 16:27:14.164 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           102209091/69230029674          0
    Policed(conform)    :           166980077/174417765350         25634
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#show clock
Sun Oct  5 16:27:16.341 COLOMBIA
16:27:16.625 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
176-B	2	Carrera7 # 14-88, Palacio de Justicia	50 Mbps	51,2

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#sh run int Gi0/0/0/4.1574
Sun Oct  5 16:27:49.675 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/0/4.1574
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000726
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.225 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1574
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#sh policy-map int Gi0/0/0/4.1574 | inc confo
Sun Oct  5 16:27:57.840 COLOMBIA
    Policed(conform)    :              587929/248609258            0
    Policed(conform)    :             5291350/7060034920           51225
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#show clock
Sun Oct  5 16:28:01.940 COLOMBIA
16:28:02.213 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
88-B	1	Carrera 15 # 59A-11 Barrio Canapote	64 Mbps	65,5

```
RP/0/RSP1/CPU0:A9KBOSQUE#sh run int Te0/0/0/0/2.1519
Sun Oct  5 16:28:49.513 COT
interface TenGigE0/0/0/0/2.1519
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000730
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.137 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1519
!

RP/0/RSP1/CPU0:A9KBOSQUE#show policy-map int Te0/0/0/0/2.1519 | inc confo
Sun Oct  5 16:28:56.003 COT
    Policed(conform)    :            35281039/22032952172          1
    Policed(conform)    :           182566591/242858883176         65520
RP/0/RSP1/CPU0:A9KBOSQUE#show clock
Sun Oct  5 16:28:57.909 COT
16:28:58.077 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP1/CPU0:A9KBOSQUE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
123-B	1	Calle 5 # 6-29	50 Mbps	51,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sh run int Te0/1/0/15.1524
Sun Oct  5 16:29:26.557 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/15.1524
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000740
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.161/30
 encapsulation dot1q 1524
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sho policy-map int Te0/1/0/15.1524 | inc confo
Sun Oct  5 16:29:32.687 COLOMBIA
    Policed(conform)     :             5907815/3834875262          1
    Policed(conform)     :            66206155/91433647852         51131
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#show clock
Sun Oct  5 16:29:34.768 COLOMBIA
16:29:34.831 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
908-B	1	Calle 38 # 41H Barrio La Unión Cali 16	25 Mbps	25,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh run int Gi0/0/1/3.1632
Sun Oct  5 16:30:01.506 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/3.1632
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000742
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.165 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1632
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sho policy-map int Gi0/0/1/3.1632 | inc confo
Sun Oct  5 16:30:09.483 COLOMBIA
    Policed(conform)     :           199705133/142742956749         0
    Policed(conform)     :           290374426/301045391024         25989
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#show clock
Sun Oct  5 16:30:11.535 COLOMBIA
16:30:11.845 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
491-B	2	Calle 4 Sur # 73B Esquina, Casa de Justicia	30 Mbps	30,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KERMITA2#sh run int Te0/0/0/2.1629
Mon Oct  6 10:03:08.054 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/2.1629
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000747
 service-policy input CAR-30M
 service-policy output CAR-30M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.173/30
 encapsulation dot1q 1629
!


RP/0/RSP0/CPU0:A9KERMITA2#sh policy-map int Te0/0/0/2.1629 | inc confo
Mon Oct  6 10:03:15.011 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            55928921/49737062871          0
    Policed(conform)    :           134748132/153298747104         30767
RP/0/RSP0/CPU0:A9KERMITA2#show clock
Mon Oct  6 10:03:17.005 COLOMBIA
10:03:17.294 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KERMITA2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1550-B	1	Carrera 5 # 19-56 Sur	30 Mbps	32,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sh run int Te0/0/1/0.1555
Sun Oct  5 16:31:52.388 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/1/0.1555
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000750
 service-policy input CAR-30M
 service-policy output CAR-30M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.17 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1555
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sho policy-map int Te0/0/1/0.1555 | inc confo
Sun Oct  5 16:31:54.221 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            35856493/16269141094          0
    Policed(conform)    :            98582508/121023075516         32306
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#show clock
Sun Oct  5 16:31:56.643 COLOMBIA
16:31:56.920 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
300-B	1	Calle 7 # 3-62, Casa de Justicia	65 Mbps	67,5

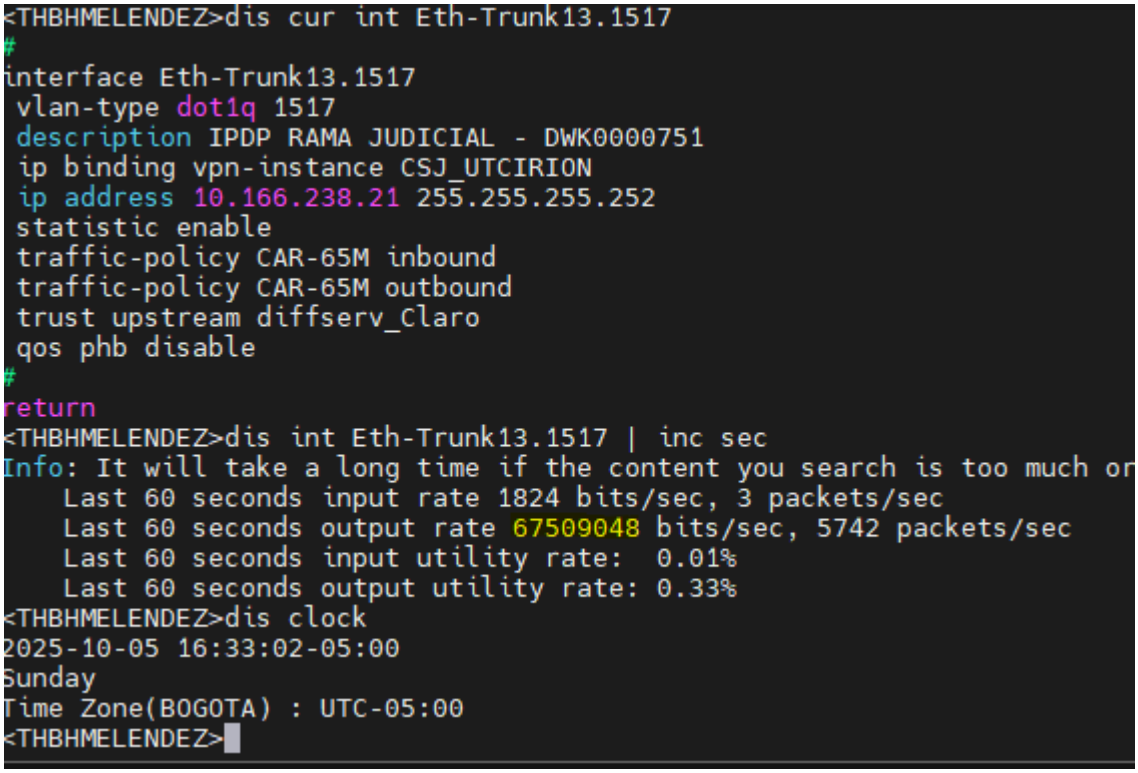

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3371-B	1	Calle 15 # 11-15 Piso 2	104 Mbps	108,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sh run int Hu0/2/0/1.1507
Sun Oct  5 16:35:01.841 COLOMBIA
interface HundredGigE0/2/0/1.1507
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000753
 service-policy input CAR-104M
 service-policy output CAR-104M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.185/30
 encapsulation dot1q 1507
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sho policy-map int Hu0/2/0/1.1507 | inc confo
Sun Oct  5 16:35:10.450 COLOMBIA
    Policed(conform)     :            33758290/29399114492          0
    Policed(conform)     :           165677804/217730520172         108930
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#show clock
Sun Oct  5 16:35:12.821 COLOMBIA
16:35:12.867 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
294-B	1	Calle 12 # 11-60, Palacio de Justicia	100 Mbps	102,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh run int Te0/0/2/2.3233
Sun Oct  5 16:35:42.627 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/2.3233
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000754
 service-policy input CAR-100M
 service-policy output CAR-100M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.93 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 3233
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sho policy-map int Te0/0/2/2.3233 | inc confo
Sun Oct  5 16:35:50.075 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          815745193/500382218398         1
    Policed(conform)    :         1472295379/1508498725532        102521
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#show clock
Sun Oct  5 16:35:52.011 COLOMBIA
16:35:52.290 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1502-B	3	Carrera 100 # 94-21 Piso 2	70 Mbps	71,6

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh run int TenGigE0/1/0/1.1542
Sun Oct  5 16:36:21.430 COT
interface TenGigE0/1/0/1.1542
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000758
 service-policy input CAR-70M
 service-policy output CAR-70M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.41 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1542
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#show policy-map int TenGigE0/1/0/1.1542 | inc confo
Sun Oct  5 16:36:28.048 COT
    Policed(conform)     :           206976080/119028651771         1
    Policed(conform)     :           392702843/434912720458         71675
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#show clock
Sun Oct  5 16:36:29.941 COT
16:36:30.140 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
906-B	1	Calle 7 # 19-19, Casa de la Justicia	25 Mbps	25,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#sh run int Te0/0/0/1.1761
Sun Oct  5 16:37:08.197 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.1761
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000772
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.93 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1761
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#sho policy-map int Te0/0/0/1.1761 | inc confo
Sun Oct  5 16:37:16.315 GMT+5
    Policed(conform)    :           223549454/125046690654         1
    Policed(conform)    :           350371748/371440013722         25589
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#show clock
Sun Oct  5 16:37:18.287 GMT+5
16:37:18.437 GMT+5 Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
911-B	1	Carrera 1D # 65-00 Barrio La Rivera	50 Mbps	51,2

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh run int Gi0/0/1/8.1633
Sun Oct  5 16:37:46.748 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/8.1633
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000774
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.89 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1633
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sho policy-map int Gi0/0/1/8.1633 | inc confo
Sun Oct  5 16:37:53.297 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          265631549/139930779664         0
    Policed(conform)     :          444469481/463665877444         51249
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#show clock
Sun Oct  5 16:37:55.616 COLOMBIA
16:37:55.896 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
83-B	1	Calle 24 # 7-07	45 Mbps	46

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh run int Te0/1/0/11.1653
Sun Oct  5 16:38:26.285 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/11.1653
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000776
 service-policy input CAR-45M
 service-policy output CAR-45M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.117/30
 encapsulation dot1q 1653
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sho policy-map int Te0/1/0/11.1653 | inc confo
Sun Oct  5 16:38:32.086 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             2972060/1971178782           1
    Policed(conform)    :            79293028/98738042054          46020
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show clock
Sun Oct  5 16:38:34.345 COLOMBIA
16:38:34.389 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
132-B	1	Calle 20A # 14-15, Edificio Gómez	65 Mbps	66,6

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh run int Te0/0/0/1.780
Sun Oct  5 16:38:59.462 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/1.780
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000780
 service-policy input CAR-65M
 service-policy output CAR-65M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.61/30
 encapsulation dot1q 780
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sho policy-map int Te0/0/0/1.780 | inc confo
Sun Oct  5 16:39:07.795 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            98133466/76131988092          0
    Policed(conform)    :           176800852/197124859032         66651
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#show clock
Sun Oct  5 16:39:10.618 COLOMBIA
16:39:10.904 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
902-B	1	Carrera 52 # 2-00, Estación de Policia de Siloé	25 Mbps	26

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh run int Gi0/0/1/9.1635
Sun Oct  5 16:39:37.789 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/9.1635
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000785
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.69 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1635
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#show policy-map int Gi0/0/1/9.1635 | inc confo
Sun Oct  5 16:39:45.544 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           634047569/425071635790         0
    Policed(conform)    :           973381709/945107580958         26002
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#show clock
Sun Oct  5 16:39:47.584 COLOMBIA
16:39:47.879 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
429-B	2	Carrera 5 # 12-27, Palacio Municipal	50 Mbps	51,2

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh run int Te0/0/0/1.508
Sun Oct  5 16:40:15.043 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/1.508
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000786
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.65/30
 encapsulation dot1q 508
!


RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh policy-map int Te0/0/0/1.508 | inc confo
Sun Oct  5 16:40:24.820 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           124357516/92687286516          1
    Policed(conform)    :           185724583/202239361096         51239
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#show clock
Sun Oct  5 16:40:27.012 COLOMBIA
16:40:27.303 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
167-B	1	Calle 63 # 9-76, Casa de Justicia de Chapinero	52 Mbps	55,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sh run int Hu0/2/0/1.2826
Sun Oct  5 16:43:28.531 COLOMBIA
interface HundredGigE0/2/0/1.2826
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000818
 service-policy input CAR-52M
 service-policy output CAR-52M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.9/30
 encapsulation dot1q 2826
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sho policy-map int Hu0/2/0/1.2826  | inc confo
Sun Oct  5 16:43:34.475 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            68683835/43595099595          1
    Policed(conform)    :           169644974/187838126010         55393
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#show clock
Sun Oct  5 16:43:36.418 COLOMBIA
16:43:36.463 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1065-B	2	Calle 15 # 11- 50	32 Mbps	33,7

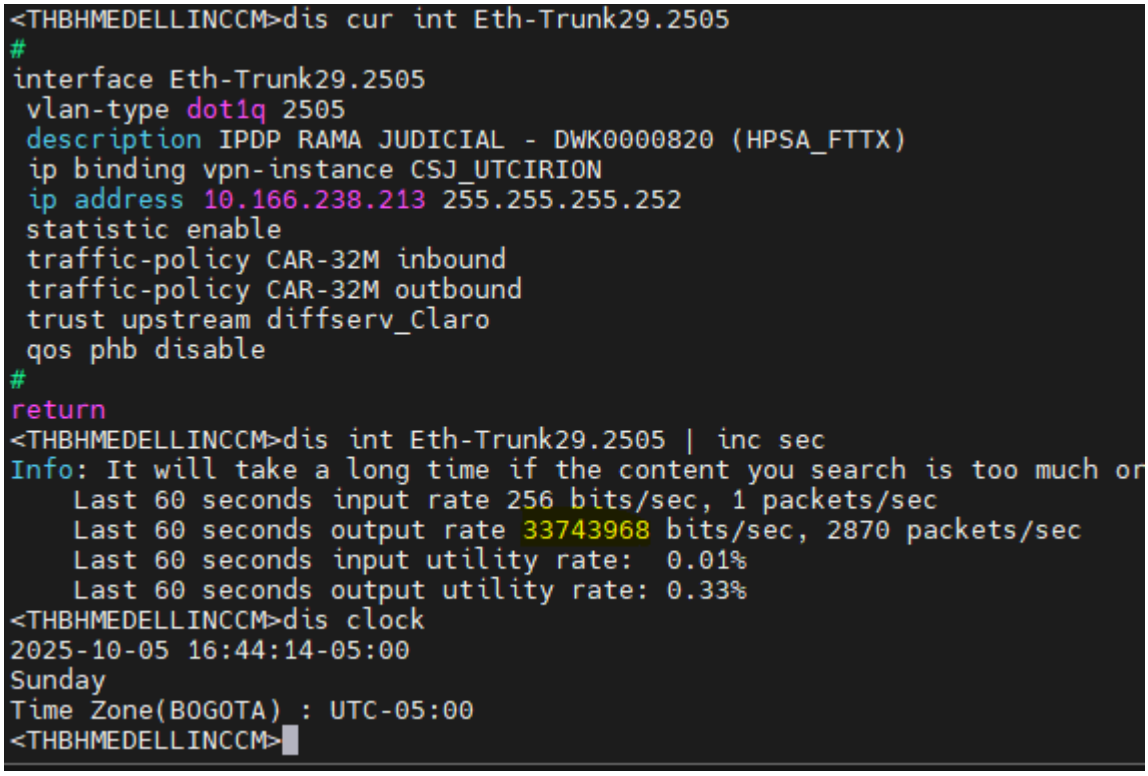


PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
914-B	1	Calle 85 Sur # 94 – 35	60 Mbps	62,2

```
<THBHVENECIA>dis cur int Eth-Trunk12.1030
#
interface Eth-Trunk12.1030
 vlan-type dot1q 1030
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000821
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.238.197 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-60M inbound
 traffic-policy CAR-60M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHVENECIA>dis int Eth-Trunk12.1030 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 2008 bits/sec, 4 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 62272080 bits/sec, 5296 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.31%
<THBHVENECIA>dis clock
2025-10-05 16:44:51-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHVENECIA>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2236-B	1	Calle 26A # 58D-6 contiguo inspección 6ta de Policía	32 Mbps	33,2

```
<THBHBELLO>dis cur int Eth-Trunk10.2823
#
interface Eth-Trunk10.2823
 vlan-type dot1q 2823
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000823 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.238.217 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-32M inbound
 traffic-policy CAR-32M outbound
 trust upstream default
 qos phb disable
#
return
<THBHBELLO>dis int Eth-Trunk10.2823 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 1784 bits/sec, 3 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 33218040 bits/sec, 2825 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.16%
<THBHBELLO>dis clock
2025-10-05 16:45:51-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHBELLO>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1129-B	3	Palacio Municipal Piso 2	32 Mbps	33,2

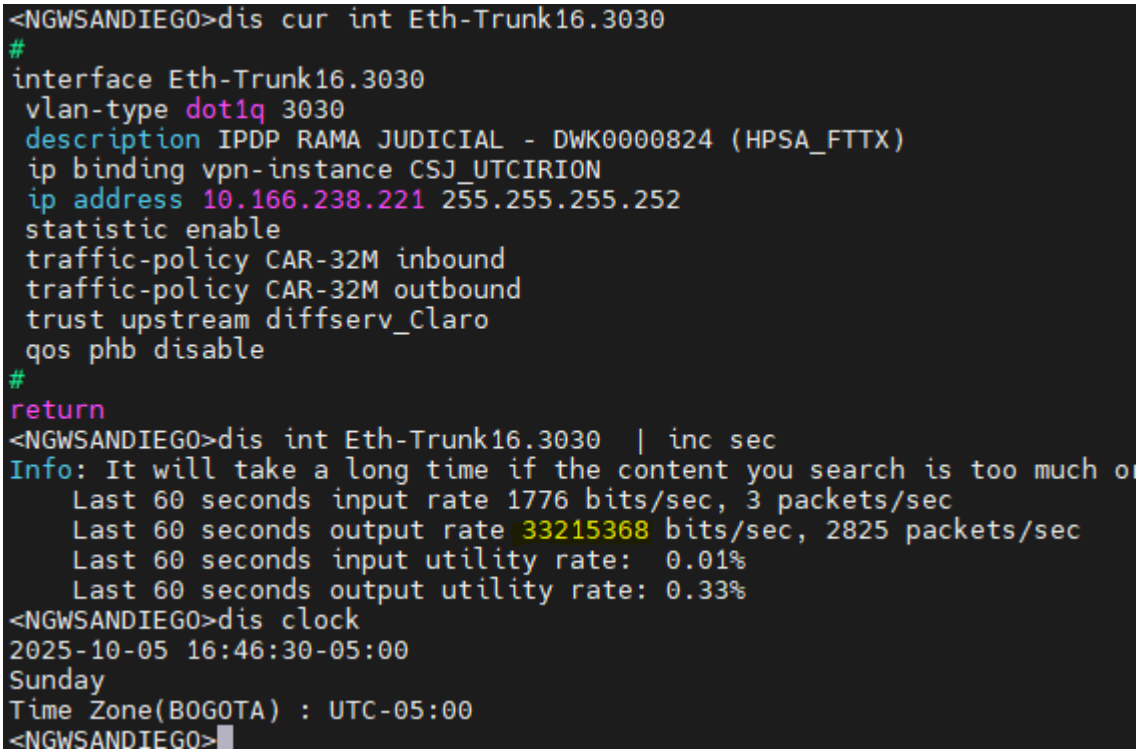

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1120-B	3	Calle 20 B # 14-31	34 Mbps	34,8

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Hu0/0/0/1.1056
Sun Oct  5 16:46:58.985 COLOMBIA
interface HundredGigE0/0/0/1.1056
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000825
 service-policy input CAR-34M
 service-policy output CAR-34M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.225/30
 encapsulation dot1q 1056
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh policy-map int  Hu0/0/0/1.1056 | inc confo
Sun Oct  5 16:47:05.377 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            52421448/31570632982          1
    Policed(conform)    :           102088186/110338989022         34821
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Sun Oct  5 16:47:07.550 COLOMBIA
16:47:07.589 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1506-B	1	Carrera 50 # 50-76	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh run int Gi0/0/1/0.2055
Mon Oct  6 10:04:21.032 COT
interface GigabitEthernet0/0/1/0.2055
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000826
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.229 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2055
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh policy-map int Gi0/0/1/0.2055   | inc confo
Mon Oct  6 10:04:30.855 COT
    Policed(conform)    :             3491987/1049162661           1
    Policed(conform)    :            33317925/46053852090          32763
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#show clock
Mon Oct  6 10:04:32.789 COT
10:04:32.985 COT Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1508-B	1	Calle 40 Sur # 24F-106 Barrio El Salado	32 Mbps	33,1

```
<NGWESPACIOSUR>dis cur int Eth-Trunk12.2827
#
interface Eth-Trunk12.2827
 vlan-type dot1q 2827
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000827 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.238.233 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-32M inbound
 traffic-policy CAR-32M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<NGWESPACIOSUR>dis int Eth-Trunk12.2827 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 1816 bits/sec, 3 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 33190744 bits/sec, 2824 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.16%
<NGWESPACIOSUR>dis clock
2025-10-05 16:48:18-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<NGWESPACIOSUR>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1511-B	2	Carrera 22 #18-39 Local 103 - 104	32 Mbps	33,2

```
<THBHRIONEGRO>dis cur int Eth-Trunk14.2828
#
interface Eth-Trunk14.2828
 vlan-type dot1q 2828
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000828 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.238.237 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-32M inbound
 traffic-policy CAR-32M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHRIONEGRO>dis int Eth-Trunk14.2828 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 2072 bits/sec, 4 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 33221216 bits/sec, 2825 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.16%
<THBHRIONEGRO>dis clock
2025-10-05 16:49:08-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHRIONEGRO>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1524-B	1	Calle 10 # 40 Este 44 Piso 2, Casa de Justicia Santa Elena	34 Mbps	34,8

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#sh run int Te0/0/0/2.601299
Sun Oct  5 16:49:42.487 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/2.601299
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000829,+UWZ4917
 service-policy input CAR-34M
 service-policy output CAR-34M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.241 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 60 second-dot1q 1299
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#sh policy-map int Te0/0/0/2.601299 | inc confo
Sun Oct  5 16:49:49.608 GMT+5
    Policed(conform)    :             5073248/3745690157           0
    Policed(conform)    :            28710720/38208241470          34807
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#show clock
Sun Oct  5 16:49:51.511 GMT+5
16:49:51.682 GMT+5 Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1518-B	1	Calle 104B #48-60 Villa del Socorro	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh run int Gi0/1/1/0.2530
Sun Oct  5 16:50:21.683 COT
interface GigabitEthernet0/1/1/0.2530
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000830
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.245 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2530
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh policy-map int Gi0/1/1/0.2530 | inc confo
Sun Oct  5 16:50:29.856 COT
    Policed(conform)    :           128098125/82649689453          1
    Policed(conform)    :           197705095/254481945824         32750
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#show clock
Sun Oct  5 16:50:37.413 COT
16:50:37.613 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1517-B	1	Carrera 32 # 101-283 Santo Domingo	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh run int Gi0/1/1/0.1008
Wed Oct 15 16:17:54.077 COT
interface GigabitEthernet0/1/1/0.1008
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000831
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.249 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1008
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh policy-map int Gi0/1/1/0.1008 | inc confo
Wed Oct 15 16:17:57.240 COT
    Policed(conform)    :            85990056/53895864886          1
    Policed(conform)    :           342309056/452404947280         32745
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#show clock
Wed Oct 15 16:18:02.071 COT
16:18:02.272 COT Wed Oct 15 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1519-B	1	Casa de Justicia Robledo, Diagonal 85 # 79-173 Piso 2	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Hu0/0/0/1.2833
Sun Oct  5 16:51:35.089 COLOMBIA
interface HundredGigE0/0/0/1.2833
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000833
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.5/30
 encapsulation dot1q 2833
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh policy-map int Hu0/0/0/1.2833 | inc confo
Sun Oct  5 16:51:41.008 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             1359601/311797732            0
    Policed(conform)    :            32788522/46417271740          32766
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Sun Oct  5 16:51:42.897 COLOMBIA
16:51:42.934 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1160-B	3	Palacio Municipal Piso 2	40 Mbps	40,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#sh run int te0/0/0/3.1804
Sun Oct  5 16:53:03.994 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/3.1804
 description IPDD RAMA JUDICIAL - DWK0000834
 service-policy input CAR-40M
 service-policy output CAR-40M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.1 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1804
!


RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#sh policy-map int te0/0/0/3.1804 | inc confo
Sun Oct  5 16:53:07.148 COLOMBIA
    Policed(conform)     :             9162516/4874101644           0
    Policed(conform)     :            24121416/29583859518          40988
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#show clock
Sun Oct  5 16:53:10.275 COLOMBIA
16:53:10.569 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1534-B	1	Calle 39No 43-123, Edificio Las Flores	16 Mbps	16,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh run int BE92.2836
Sun Oct  5 16:53:40.047 COLOMBIA
interface Bundle-Ether92.2836
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000836
 service-policy input CAR-16M
 service-policy output CAR-16M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.13/30
 encapsulation dot1q 2836
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show policy-map int BE92.2836 | inc confo
Sun Oct  5 16:53:46.922 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             3384769/1606555954           1
    Policed(conform)    :            34476497/47605915830          16366
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show clock
Sun Oct  5 16:53:48.745 COLOMBIA
16:53:48.789 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
331-B	1	Calle 60 # 13-64, Uri Campote	40 Mbps	40,9

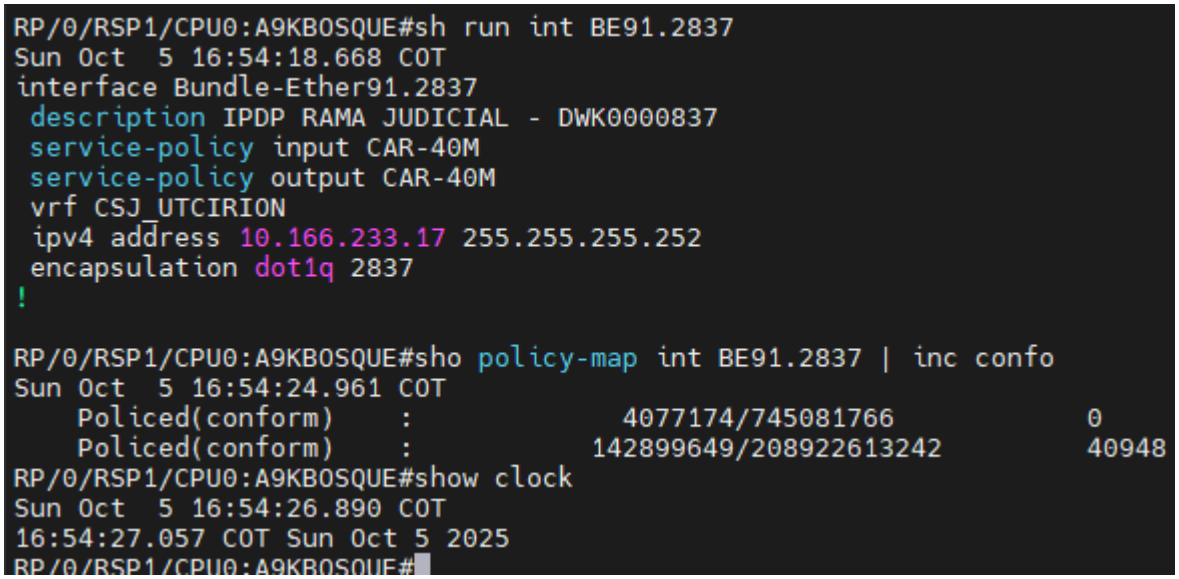

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1071-B	1	Carrera 18 # 27-25	20 Mbps	20,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#sh run int Te0/0/0/3.14054070
Sun Oct  5 16:54:53.446 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/3.14054070
 description IPDD RAMA JUDICIAL - DWK0000841,+TTI4198
 service-policy input CAR-20M
 service-policy output CAR-20M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.229.153 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1405 second-dot1q 4070
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#sho policy-map int Te0/0/0/3.14054070 | inc confo
Sun Oct  5 16:54:59.988 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             1470331/258936854            1
    Policed(conform)    :            50916040/65667994827          20484
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#show clock
Sun Oct  5 16:55:02.099 COLOMBIA
16:55:02.383 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
600-B	1	Kilometro 14 Vía al Magdalena, Centro Logístico Tesorito bodega 5	20 Mbps	20,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh run int Gi0/0/1/3.3234
Sun Oct  5 18:46:36.086 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/3.3234
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000842
 service-policy input CAR-20M
 service-policy output CAR-20M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.229.225/30
 encapsulation dot1q 3234
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh policy-map int Gi0/0/1/3.3234 | inc confo
Sun Oct  5 18:46:42.579 COLOMBIA
    Policed(conform)    :              928845/258561846            1
    Policed(conform)    :            24280818/34937695040          20461
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#show clock
Sun Oct  5 18:46:44.696 COLOMBIA
18:46:44.985 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
564-B	2	Carrera 3 Calle 8	40 Mbps	40,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#sh run int Te0/0/0/1.2843
Sun Oct  5 18:47:21.432 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.2843
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000843
 service-policy input CAR-40M
 service-policy output CAR-40M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.53 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2843
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#sho policy-map int Te0/0/0/1.2843 | inc confo
Sun Oct  5 18:47:28.219 GMT+5
    Policed(conform)    :            36670841/24057402844          1
    Policed(conform)    :           123440915/147105677108         40946
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#show clock
Sun Oct  5 18:47:29.945 GMT+5
18:47:30.097 GMT+5 Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
193-B	2	Carrera 5 # 3-74	64 Mbps	65,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sh run int Te0/0/2/0.2531
Sun Oct  5 18:48:28.999 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/0.2531
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000844
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.61/30
 encapsulation dot1q 2531
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sh policy-map int Te0/0/2/0.2531 | inc confo
Sun Oct  5 18:48:39.305 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            97852758/62866143826          1
    Policed(conform)    :           286287921/349928619332         65518
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#show clock
Sun Oct  5 18:48:42.579 COLOMBIA
18:48:42.718 COLOMBIA Sun Oct 05 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
194-B	2	Calle 5A # 1-11	64 Mbps	65,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sh run int Te0/0/2/0.2845
Sun Oct  5 18:49:03.283 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/0.2845
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000845
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.237/30
 encapsulation dot1q 2845
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sh policy-map int Te0/0/2/0.2845 | inc confo
Sun Oct  5 18:49:10.867 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            85249681/49841117635          1
    Policed(conform)    :           197863258/221420945399         65584
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#show clock
Sun Oct  5 18:49:12.857 COLOMBIA
18:49:12.995 COLOMBIA Sun Oct 05 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
355-B	2	Carrera 13 # 6-55	25 Mbps	25,6

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sh run int Te0/0/2/0.2846
Sun Oct  5 18:49:38.747 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/0.2846
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000846
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.241/30
 encapsulation dot1q 2846
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sho policy-map int Te0/0/2/0.2846 | inc confo
Sun Oct  5 18:49:48.227 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             6786568/2133564615           0
    Policed(conform)    :            57229611/78436105694          25634
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#show clock
Sun Oct  5 18:49:50.373 COLOMBIA
18:49:50.509 COLOMBIA Sun Oct 05 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
216-B	1	Calle 7 # 3-40	60 Mbps	61,3

```
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#sh run int Gi0/1/0/19.822
Sun Oct  5 18:50:18.308 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/1/0/19.822
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000851
 service-policy input CAR-60M
 service-policy output CAR-60M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.33/30
 encapsulation dot1q 822
!

RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#sho policy-map int Gi0/1/0/19.822 | inc confo
Sun Oct  5 18:50:24.644 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           124486172/100556635201         1
    Policed(conform)    :           269697001/289420886286         61390
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#show clock
Sun Oct  5 18:50:26.335 COLOMBIA
18:50:26.379 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1616-B	1	Carrera 2 # 4–75PrimerPiso	65 Mbps	66,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sh run int Hu0/2/0/1.3321
Sun Oct  5 18:50:53.537 COLOMBIA
interface HundredGigE0/2/0/1.3321
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000852
 service-policy input CAR-65M
 service-policy output CAR-65M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.37/30
 encapsulation dot1q 3321
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sh policy-map int Hu0/2/0/1.3321 | inc confo
Sun Oct  5 18:50:58.898 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            97917268/67509692439          0
    Policed(conform)    :           228649342/259787222296         66536
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#show clock
Sun Oct  5 18:51:00.617 COLOMBIA
18:51:00.667 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2120-B	1	Carrera 4 # 38-66	250 Mbps	255,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#sh run int Te0/1/0/3.853
Sun Oct  5 18:51:31.709 GMT+5
interface TenGigE0/1/0/3.853
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000853
 service-policy input CAR-250M
 service-policy output CAR-250M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.235.57/30
 encapsulation dot1q 853
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#sho policy-map int Te0/1/0/3.853 | inc confo
Sun Oct  5 18:51:39.869 GMT+5
    Policed(conform)    :            91614958/69169028160          1
    Policed(conform)    :           159219389/178264471350         255766
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#show clock
Sun Oct  5 18:51:41.608 GMT+5
18:51:41.803 GMT+5 Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
391-B	1	Calle 10 # 7-05	65 Mbps	69,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sh run int Te0/1/0/15.2854
Sun Oct  5 18:53:20.528 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/15.2854
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000854
 service-policy input CAR-65M
 service-policy output CAR-65M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.49/30
 encapsulation dot1q 2854
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sh policy-map int Te0/1/0/15.2854 | inc confo
Sun Oct  5 18:53:28.794 COLOMBIA
    Policed(conform)     :            29247348/19709288822          0
    Policed(conform)     :           141327108/186333496116         69137
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#show clock
Sun Oct  5 18:53:30.923 COLOMBIA
18:53:31.019 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW	Resultado BW
1621-B	1	Calle 4C # 19-13	40 Mbps	45,5

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.1857
Sun Oct  5 18:54:25.490 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.1857
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000857
 service-policy input CAR-40M-IN
 service-policy output CAR-40M-OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.57 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1857
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sho policy-map int Hu0/7/0/0.1857 | inc Match
Sun Oct  5 18:54:27.734 COT
    Matched             :           119046419/90968510260          1
    Matched             :           180610034/183671068782         45586
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock
Sun Oct  5 18:54:29.935 COT
18:54:30.083 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1701-B	1	Carrera 13 # 5-49 Piso 2	50 Mbps	51,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sh run int Te0/1/0/15.1031
Sun Oct  5 18:55:19.168 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/15.1031
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000858
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.73/30
 encapsulation dot1q 1031
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#show policy-map int Te0/1/0/15.1031 | inc confo
Sun Oct  5 18:55:25.610 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            1190196/322242391           1
    Policed(conform)    :           31161745/44156696104         51171
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#show clock
Sun Oct  5 18:55:28.401 COLOMBIA
18:55:28.496 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1619-B	1	Carrera 17 # 6B-14	41 Mbps	53,1

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.90251
Sun Oct  5 18:56:05.358 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.90251
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000859,+UWZ1567
 service-policy input CAR-41M_IN
 service-policy output CAR-41M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.77 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 90 second-dot1q 251
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh policy-map int Hu0/7/0/0.90251 | inc Match
Sun Oct  5 18:56:14.320 COT
    Matched             :             1171675/254814424            0
    Matched             :            41105896/59979283196          53193
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock
Sun Oct  5 18:56:16.410 COT
18:56:16.553 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
237-B	2	Carrera 32A # 1-45 Barrio Primavera	25 Mbps	27,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#sh run int BE11.2354
Sun Oct  5 18:56:49.868 COLOMBIA
interface Bundle-Ether11.2354
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000862
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.97 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2354
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#sh policy-map int BE11.2354 | inc confo
Sun Oct  5 18:56:57.899 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            16774155/10507757355          0
    Policed(conform)    :            59308198/72507319032          27374
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#show clock
Sun Oct  5 18:56:59.889 COLOMBIA
18:57:00.008 COLOMBIA Sun Oct 05 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
245-B	2	Calle 13 # 1-48, CESPA, Barrio la Playa	50 Mbps	65,1

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sh run int Gi0/13/0/4.715
Sun Oct  5 18:57:30.708 COT
interface GigabitEthernet0/13/0/4.715
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000863
 service-policy input CAR-50M_IN
 service-policy output CAR-50M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.101 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 715
!


RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sh policy-map int Gi0/13/0/4.715 | inc Match
Sun Oct  5 18:58:03.818 COT
    Matched             :            10694780/6593964328           0
    Matched             :            65326142/87586748214          65177
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#show clock
Sun Oct  5 18:58:05.995 COT
18:58:06.157 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
892-B	2	Calle 16 # 12-06 La Libertad	25 Mbps	32,5

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sh run int Te0/11/0/1.2864
Sun Oct  5 18:58:29.955 COT
interface TenGigE0/11/0/1.2864
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000864
 service-policy input CAR-25M_IN
 service-policy output CAR-25M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.105 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2864
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sho policy-map int Te0/11/0/1.2864 | inc Match
Sun Oct  5 18:58:38.196 COT
    Matched             :             1768822/1071924964           1
    Matched             :            12274303/16441082450          32582
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#show clock
Sun Oct  5 18:58:40.108 COT
18:58:40.249 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
893-B	2	Calle 4BN # 18-27 Manzana G6 Lote 11-1, Conjunto Multifamiliar Diana, Etapa Atalaya	25 Mbps	32,5

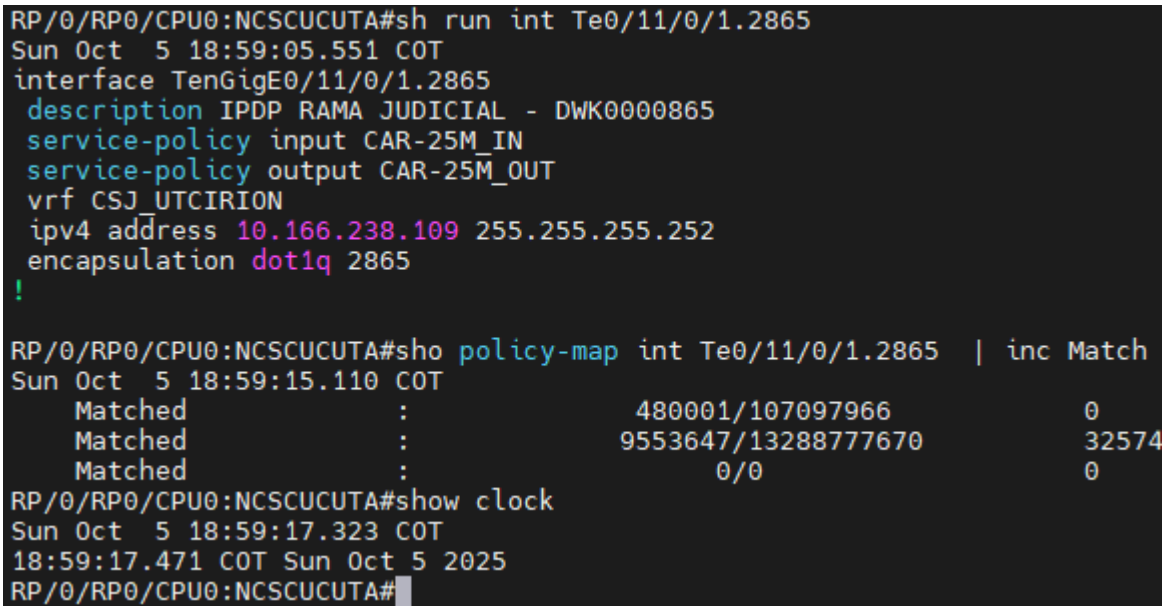

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
251-B	2	Kilómetro 3 Auto Internacional San Antonio # 22N-193, Edificio los Pinos	70 Mbps	91,2

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sh run int Te0/11/0/1.2866
Sun Oct  5 18:59:46.116 COT
interface TenGigE0/11/0/1.2866
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000866
 service-policy input CAR-70M_IN
 service-policy output CAR-700_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.113 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2866
!


RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sho policy-map int Te0/11/0/1.2866 | inc Match
Sun Oct  5 18:59:57.860 COT
    Matched             :            7835051/3534275246          1
    Matched             :           47341598/62865627092         91267
    Matched             :                 0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#show clock
Sun Oct  5 19:00:00.265 COT
19:00:00.413 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
435-B	1	Avenida Simón Bolívar Carrera 16 # 32-56, Centro Comercial Los Molinos Locales 2 y 3	25 Mbps	25,6

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh run int Te0/0/2/2.1126
Sun Oct  5 19:00:28.578 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/2.1126
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000867
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.21/30
 encapsulation dot1q 1126
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sho policy-map int Te0/0/2/2.1126 | inc confo
Sun Oct  5 19:00:34.458 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            15552503/10529675430          1
    Policed(conform)    :            36758463/40049157106          25633
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#show clock
Sun Oct  5 19:00:38.291 COLOMBIA
19:00:38.579 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
436-B	2	CARRERA 7 # 3-20	40 Mbps	51,8

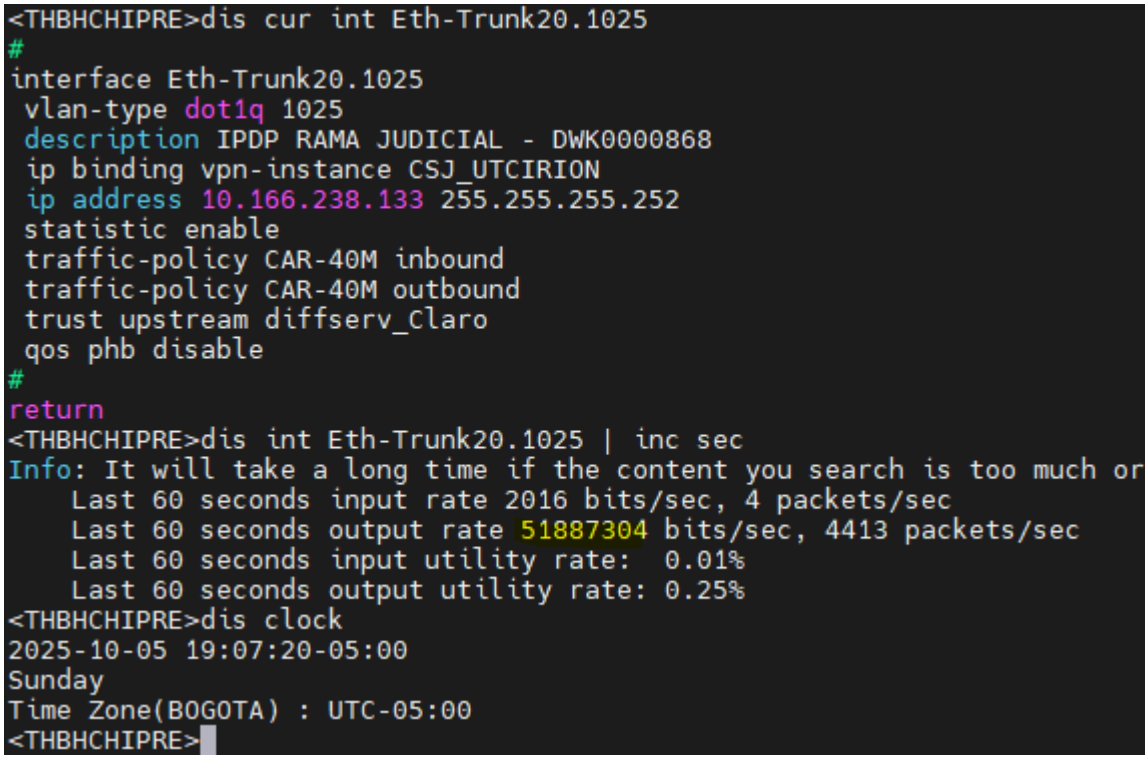

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
891-B	1	Carrera 26 # 31-36	64 Mbps	66,4

```
<NGWBULEVAR>dis cur int Eth-Trunk24.2870
#
interface Eth-Trunk24.2870
 vlan-type dot1q 2870
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000870 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.238.149 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-64M inbound
 traffic-policy CAR-64M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<NGWBULEVAR>dis int Eth-Trunk24.2870 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 224 bits/sec, 1 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 66421192 bits/sec, 5649 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.33%
<NGWBULEVAR>dis clock
2025-10-05 19:01:35-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<NGWBULEVAR>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
493-B	1	carrera 12 # 6-08 piso 2, edificio coja agra	40 Mbps	40,8

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh run int Gi0/0/1/3.2102
Sun Oct  5 19:02:12.771 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/3.2102
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000871
 service-policy input CAR-40M
 service-policy output CAR-40M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.169 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2102
!


RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sho policy-map int Gi0/0/1/3.2102 | inc confo
Sun Oct  5 19:02:19.505 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            2164792/888411622           0
    Policed(conform)    :           35433904/50023104356         40899
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#show clock
Sun Oct  5 19:02:22.460 COLOMBIA
19:02:22.752 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
494-B	1	Cr 4 #6-70 Palacio Municipal	25 Mbps	25,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh run int Te0/0/0/1.7002728
Sun Oct  5 19:03:03.106 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.7002728
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000872,+TSO3056
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.177/30
 encapsulation dot1q 700 second-dot1q 2728
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sho policy-map int Te0/0/0/1.7002728 | inc confo
Sun Oct  5 19:03:09.890 GMT+5
    Policed(conform)    :             1481643/368205882            1
    Policed(conform)    :            19785385/27456188998          25595
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#show clock
Sun Oct  5 19:03:11.666 GMT+5
19:03:11.866 GMT+5 Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
165-B	2	Cr 4 #6-70 Palacio Municipal	25 Mbps	25,6

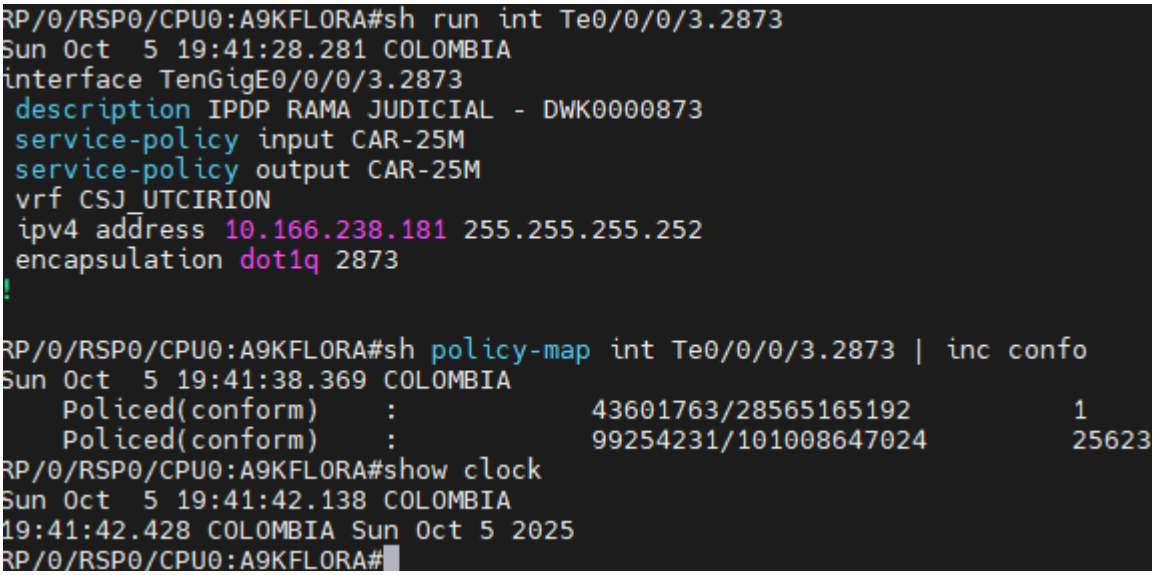

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
497-B	4	Calle 9 # 9-32	65 Mbps	66,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh run int Gi0/0/1/8.2826
Sun Oct  5 19:42:16.671 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/8.2826
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000874
 service-policy input CAR-65M
 service-policy output CAR-65M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.201 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2826
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sho policy-map int Gi0/0/1/8.2826 | inc confo
Sun Oct  5 19:42:23.939 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             2356287/1089112349           0
    Policed(conform)    :            49362184/70366612700          66711
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#show clock
Sun Oct  5 19:42:25.866 COLOMBIA
19:42:26.153 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1704-B	1	Calle 57 # 44-22	25 Mbps	25,6

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#sh run int Gi0/0/1/8.2436
Sun Oct  5 19:42:53.400 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/8.2436
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000875
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.205 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2436
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#show policy-map int Gi0/0/1/8.2436 | inc confo
Sun Oct  5 19:43:00.321 COLOMBIA
    Policed(conform)     :            14187313/7678492598          1
    Policed(conform)     :            47006130/59744302230         25638
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#show clock
Sun Oct  5 19:43:02.457 COLOMBIA
19:43:02.743 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
701-B	3	Calle 6 # 9-38	30 Mbps	30,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh run int Te0/0/0/1.7002596
Sun Oct  5 19:43:30.174 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.7002596
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000876
 service-policy input CAR-30M
 service-policy output CAR-30M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.209/30
 encapsulation dot1q 700 second-dot1q 2596
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sho policy-map int Te0/0/0/1.7002596 | inc confo
Sun Oct  5 19:43:36.798 GMT+5
    Policed(conform)    :            10236609/6049034655          0
    Policed(conform)    :            38798808/50175108772         30746
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#show clock
Sun Oct  5 19:43:38.542 GMT+5
19:43:38.740 GMT+5 Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
511-B	2	Carrera 10 # 25-50 Barrio Marandúa	25 Mbps	25,6

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KERMITA2#sh run int Te0/0/0/2.2877
Sun Oct  5 19:44:04.725 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/2.2877
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000877
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.65/30
 encapsulation dot1q 2877
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KERMITA2#show policy-map int Te0/0/0/2.2877 | inc confo
Sun Oct  5 19:44:11.682 COLOMBIA
    Policed(conform)     :            20807527/10068665755          1
    Policed(conform)     :            47410399/55456574248          25653
RP/0/RSP0/CPU0:A9KERMITA2#show clock
Sun Oct  5 19:44:13.566 COLOMBIA
19:44:13.856 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KERMITA2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3484-B	1	Calle 18 # 32-90	80 Mbps	81,8

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO#sh run int Te0/0/0/0.2878
Sun Oct  5 19:44:52.647 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/0.2878
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000878
 service-policy input CAR-80M
 service-policy output CAR-80M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.141/30
 encapsulation dot1q 2878
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO#sh policy-map int Te0/0/0/0.2878 | inc confo
Sun Oct  5 19:45:06.191 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           597976796/336790359374         1
    Policed(conform)    :           993373531/1048750208152        81885
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO#show clock
Sun Oct  5 19:45:08.199 COLOMBIA
19:45:08.244 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
912-B	1	Calle 39 nro 2N -12	25 Mbps	26

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh run int Gi0/0/1/8.2825
Sun Oct  5 19:45:37.660 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/8.2825
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000880
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.73 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2825
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sho policy-map int Gi0/0/1/8.2825 | inc confo
Sun Oct  5 19:45:44.245 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            14596256/4629018941           35
    Policed(conform)    :            56718564/71206299484          26042
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#show clock
Sun Oct  5 19:45:46.253 COLOMBIA
19:45:46.536 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
299-B	2	CALLE 25 # 23-35 Ed, Wespedes	70 Mbps	74

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#sh run int Te0/0/2/2.1881
Sun Oct  5 19:46:14.142 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/2.1881
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000881
 service-policy input CAR-70M
 service-policy output CAR-70M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.77 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1881
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#sho policy-map int Te0/0/2/2.1881 | inc confo
Sun Oct  5 19:46:20.685 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            2983373/1486534486          0
    Policed(conform)    :          102953445/148176051022        74017
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#show clock
Sun Oct  5 19:46:22.807 COLOMBIA
19:46:23.091 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
510-B	2	Carrera 27 Nro, 22-48	20 Mbps	22,5

```
<THBHTULUA>dis cur int Eth-Trunk10.2882
#
interface Eth-Trunk10.2882
 vlan-type dot1q 2882
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000882 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.81 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-20M inbound
 traffic-policy CAR-20M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHTULUA>dis int Eth-Trunk10.2882 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 1872 bits/sec, 3 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 22554704 bits/sec, 1919 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.11%
<THBHTULUA>dis clock
2025-10-06 10:51:47-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHTULUA>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2065-B	1	Calle 68 #53-34/50	50 Mbps	51,2

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sh run int Hu0/2/0/1.715
Sun Oct  5 19:50:25.934 COLOMBIA
interface HundredGigE0/2/0/1.715
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000883
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.85/30
 encapsulation dot1q 715
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sho policy-map int Hu0/2/0/1.715  | inc confo
Sun Oct  5 19:50:33.223 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             1538594/273143634            1
    Policed(conform)    :            44663392/63216032940          51285
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#show clock
Sun Oct  5 19:50:34.827 COLOMBIA
19:50:34.874 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3456-B	1	Carrera 12 # 11-21	50 Mbps	51,6

```
<THBHJAMUNDI2>dis cur int Eth-Trunk13.2885
#
interface Eth-Trunk13.2885
 vlan-type dot1q 2885
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000885 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.238.25 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-50M inbound
 traffic-policy CAR-50M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHJAMUNDI2>dis int Eth-Trunk13.2885 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 248 bits/sec, 1 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 51649792 bits/sec, 4393 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.25%
<THBHJAMUNDI2>dis clock
2025-10-05 19:56:46-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHJAMUNDI2>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3461-B	2	Av, Gran Colombia No, 3E-22, Piso 3, Oficina 307	50 Mbps	65,1

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sh run int Te0/11/0/1.2887
Sun Oct  5 19:59:21.879 COT
interface TenGigE0/11/0/1.2887
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000887
 service-policy input CAR-50M_IN
 service-policy output CAR-50M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.97 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2887
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sho policy-map int Te0/11/0/1.2887 | inc Match
Sun Oct  5 19:59:30.059 COT
    Matched             :            37821150/21592550892          1
    Matched             :            75861869/87381980708          65142
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#show clock
Sun Oct  5 19:59:31.986 COT
19:59:32.160 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3459-B	2	Avenida 4E No, 7-10, Barrio Popular, Piso 1 Oficina 304	50 Mbps	65,2

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sh run int Te0/11/0/1.2888
Sun Oct  5 19:59:53.595 COT
interface TenGigE0/11/0/1.2888
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000888
 service-policy input CAR-50M_IN
 service-policy output CAR-50M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.101 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2888
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sho policy-map int Te0/11/0/1.2888 | inc Match
Sun Oct  5 20:00:01.981 COT
    Matched             :            14023985/5990022782           1
    Matched             :            37761500/47532439802          65249
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#show clock
Sun Oct  5 20:00:04.665 COT
20:00:04.801 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2249-B	1	Carrera 25 No, 31-50 Casco Antiguo del municipio de Girón	64 Mbps	66,4

```
<NGWBULEVAR>dis cur int Eth-Trunk24.2530
#
interface Eth-Trunk24.2530
 vlan-type dot1q 2530
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000889 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.105 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-64M inbound
 traffic-policy CAR-64M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<NGWBULEVAR>dis int Eth-Trunk24.2530 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much o
    Last 60 seconds input rate 440 bits/sec, 2 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 66424752 bits/sec, 5649 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.33%
<NGWBULEVAR>dis clock
2025-10-05 20:03:48-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<NGWBULEVAR>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3460-B	1	Calle 14 # 14-51 Piso 2, Edificio Milenium	64 Mbps	65

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sh run int Gi0/0/0/7.1578
Sun Oct  5 20:04:38.703 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/0/7.1578
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000890
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.109/30
 encapsulation dot1q 1578
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#show policy-map int Gi0/0/0/7.1578 | inc confo
Sun Oct  5 20:04:46.233 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           118060407/80464451163          0
    Policed(conform)    :           238649987/264992691508         65086
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#show clock
Sun Oct  5 20:04:48.046 COLOMBIA
20:04:48.329 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3470-B	1	Carrera 14 # 12-54	45Mbps	52,8

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.1684
Sun Oct  5 20:05:13.635 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.1684
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000892
 service-policy input CAR-45M_IN
 service-policy output CAR-45M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.209 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1684
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sho policy-map int Hu0/7/0/0.1684 | inc Match
Sun Oct  5 20:05:26.241 COT
    Matched             :           123454443/78073370128          1
    Matched             :            62007191/75615652346          58277
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock
Sun Oct  5 20:05:28.801 COT
20:05:28.954 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3474-B	1	CARRERA 2 NO 7-57	64 Mbps	83,2

```
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#sh run int Gi0/13/0/2.151
Sun Oct  5 20:05:58.270 COT
interface GigabitEthernet0/13/0/2.151
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000893
 service-policy input CAR-64M_IN
 service-policy output CAR-64M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.121 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 151
!

RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#sho policy-map int Gi0/13/0/2.151 | inc Match
Sun Oct  5 20:06:06.807 COT
    Matched             :            2243414/636261948            1
    Matched             :           76740864/110020756592         83259
    Matched             :                 0/0                     0
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#show clock
Sun Oct  5 20:06:09.165 COT
20:06:09.378 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3477-B	Zona 7	CALLE 6 # 17 -45	51 Mbps	51,7

```
<THBHZIPAQUIRA>dis cur int Eth-Trunk11.2895
#
interface Eth-Trunk11.2895
 vlan-type dot1q 2895
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000895 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.133 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-51M inbound
 traffic-policy CAR-51M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHZIPAQUIRA>dis int Eth-Trunk11.2895 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 280 bits/sec, 1 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 51717280 bits/sec, 4398 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.25%
<THBHZIPAQUIRA>dis clock
2025-10-05 20:06:47-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHZIPAQUIRA>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
111-B	1	Carrera 2 # 3- 16, piso 3	55 Mbps	56,2

```
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#sh run int Gi0/1/0/19.1026
Sun Oct  5 20:07:37.053 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/1/0/19.1026
 description RAMA JUDICIAL - DWK0000896
 service-policy input CAR-55M
 service-policy output CAR-55M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.137/30
 encapsulation dot1q 1026
!

RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#sho policy-map int Gi0/1/0/19.1026 | inc confo
Sun Oct  5 20:07:44.823 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           168704885/96689228642          0
    Policed(conform)    :           366080423/396368684510         56260
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#show clock
Sun Oct  5 20:07:47.197 COLOMBIA
20:07:47.242 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3279-B	1	Cundinamarca, Bogotá; Av, primero de Mayo (Calle 26 sur) #52 A 94	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#sh run int Te0/1/0/3.1230
Sun Oct  5 20:08:15.542 GMT+5
interface TenGigE0/1/0/3.1230
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000897
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.145/30
 encapsulation dot1q 1230
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#sho policy-map int Te0/1/0/3.1230 | inc confo
Sun Oct  5 20:08:21.663 GMT+5
    Policed(conform)    :              231834/53548788             1
    Policed(conform)    :             3383333/4641827214           32730
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#show clock
Sun Oct  5 20:08:24.058 GMT+5
20:08:24.253 GMT+5 Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3038-B	1	Cundinamarca, Bogotá; Calle 17 # 98-71	30 Mbps	30,7

```
<THBHFONTIBONCCM>dis cur int Eth-Trunk10.807
#
interface Eth-Trunk10.807
 vlan-type dot1q 807
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000898
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.125 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-30M inbound
 traffic-policy CAR-30M outbound
 trust upstream default
 qos phb disable
#
return
<THBHFONTIBONCCM>dis int Eth-Trunk10.807 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 304 bits/sec, 1 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 30756872 bits/sec, 2617 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.15%
<THBHFONTIBONCCM>dis clock
2025-10-05 20:09:06-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHFONTIBONCCM>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3034-B	1	Carrera 14 B # 0 sur 56 bodega Imprenta	33 Mbps	42,9

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.2899
Sun Oct  5 20:09:39.620 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.2899
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000899
 service-policy input CAR-33M_IN
 service-policy output CAR-33M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.153 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2899
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sho policy-map int Hu0/7/0/0.2899 | inc Match
Sun Oct  5 20:09:48.186 COT
    Matched             :            12345887/5272086736           1
    Matched             :            64280466/84778127365          42990
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock
Sun Oct  5 20:09:52.806 COT
20:09:52.984 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3489-B	1	Carrera 52 N 52 – 63, barrio Villa Paula, Centro comercial Itagüi Plaza, local 404	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Hu0/0/0/1.1589
Sun Oct  5 20:10:23.622 COLOMBIA
interface HundredGigE0/0/0/1.1589
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000900
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.157/30
 encapsulation dot1q 1589
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sho policy-map int Hu0/0/0/1.1589 | inc confo
Sun Oct  5 20:10:30.945 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            25398165/14628175198          0
    Policed(conform)    :            63152228/72689423542          32770
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Sun Oct  5 20:10:32.719 COLOMBIA
20:10:32.755 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3505-B	1	Calle 42 No, 33-20	112 Mbps	116,2

```
<NGWBULEVAR>dis cur int Eth-Trunk12.2110
#
interface Eth-Trunk12.2110
 vlan-type dot1q 2110
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000901
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.161 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-112M inbound
 traffic-policy CAR-112M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<NGWBULEVAR>dis int Eth-Trunk12.2110 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 248 bits/sec, 1 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 116232288 bits/sec, 9885 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.58%
<NGWBULEVAR>dis clock
2025-10-05 20:11:05-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<NGWBULEVAR>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3492-B	1	CALLE 7 NO, 2-64 BARRIO LA POLA	64 Mbps	75,2

```
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#sh run int Gi0/2/0/2.1548
Sun Oct  5 20:13:55.599 COT
interface GigabitEthernet0/2/0/2.1548
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000902
 service-policy input CAR-64M_IN
 service-policy output CAR-64M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.165 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1548
!

RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#sh policy-map int Gi0/2/0/2.1548 | inc Match
Sun Oct  5 20:14:00.307 COT
    Matched             :            28914890/16043649361          0
    Matched             :           119872636/155064159554         75298
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#show clock
Sun Oct  5 20:14:02.305 COT
20:14:02.524 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3509-B	1	Calle 22 # 4-70 piso 5 Edificio Galaxia	64 Mbps	82,3

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSSANTAMARTA#sh run int Te0/4/0/2.1052
Sun Oct  5 20:14:42.777 COT
interface TenGigE0/4/0/2.1052
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000903
 service-policy input CAR-64M_IN
 service-policy output CAR-64M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.169 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1052
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSSANTAMARTA#sho policy-map int Te0/4/0/2.1052 | inc Match
Sun Oct  5 20:14:46.890 COT
    Matched             :           33811862/18028458696          1
    Matched             :          265140832/359690461236         82330
    Matched             :                  0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSSANTAMARTA#show clock
Sun Oct  5 20:14:48.770 COT
20:14:48.909 COT Sun Oct 5 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSSANTAMARTA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1513-B	1	Calle 34a # 34a-04 torre 2, piso 3	96 Mbps	99,6

```
<THBHVILLAVICENCIO>dis cur int Eth-Trunk10.2904
#
interface Eth-Trunk10.2904
 vlan-type dot1q 2904
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000904 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.173 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-96M inbound
 traffic-policy CAR-96M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHVILLAVICENCIO>dis int Eth-Trunk10.2904 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 2456 bits/sec, 5 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 99692256 bits/sec, 8479 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.24%
<THBHVILLAVICENCIO>dis clock
2025-10-05 20:15:23-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHVILLAVICENCIO>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
104-B	1	Calle 15 # 14-19 piso 3 y 4, barrio Centro	66 Mbps	67,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sh run int Hu0/2/0/1.2905
Sun Oct  5 20:15:55.944 COLOMBIA
interface HundredGigE0/2/0/1.2905
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000905
 service-policy input CAR-66M
 service-policy output CAR-66M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.229.241/30
 encapsulation dot1q 2905
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sho policy-map int Hu0/2/0/1.2905 | inc confo
Sun Oct  5 20:16:01.666 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          679711611/422522733055         0
    Policed(conform)    :         1193215011/1178134020444        67565
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#show clock
Sun Oct  5 20:16:03.420 COLOMBIA
20:16:03.466 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3498-B	1	Avenida Universitaria No, 35-230 Esquina Unicentro	64 Mbps	65,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#sh run int Gi0/0/0/3.2536
Sun Oct  5 20:16:30.540 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/0/3.2536
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000906
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.181 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2536
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#show policy-map int Gi0/0/0/3.2536 | inc confo
Sun Oct  5 20:16:38.049 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          1172915534/771214078978         0
    Policed(conform)    :          1718929466/1754170086858        65503
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#show clock
Sun Oct  5 20:16:40.719 COLOMBIA
20:16:40.996 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTUNJA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3499-B	1	Calle 31 # 50A-31 barrio Santa Catalina	15 Mbps	15,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int BE92.2305
Sun Oct  5 20:17:11.302 COLOMBIA
interface Bundle-Ether92.2305
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000907
 service-policy input CAR-15M
 service-policy output CAR-15M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.185/30
 encapsulation dot1q 2305
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show policy-map int BE92.2305 | inc confo
Sun Oct  5 20:17:17.058 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          1091842999/663992760941         25
    Policed(conform)    :          1512026206/1357345272097        15352
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Sun Oct  5 20:17:18.693 COLOMBIA
20:17:18.731 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3490-B	2	Calle 11 No 8-34	67 Mbps	68,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sh run int Hu0/2/0/1.2505
Sun Oct  5 20:17:47.030 COLOMBIA
interface HundredGigE0/2/0/1.2505
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000908
 service-policy input CAR-67M
 service-policy output CAR-67M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.189/30
 encapsulation dot1q 2505
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sh policy-map int Hu0/2/0/1.2505 | inc confo
Sun Oct  5 20:17:58.590 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             1976646/609477286            1
    Policed(conform)    :           130404968/187627955588         68571
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#show clock
Sun Oct  5 20:18:00.211 COLOMBIA
20:18:00.256 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3491-B	1	Calle 8 N° 9-41 Zona Centro	15 Mbps	15,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh run int Te0/0/0/1.2909
Sun Oct  5 20:18:27.359 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.2909
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000909
 service-policy input CAR-15M
 service-policy output CAR-15M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.193/30
 encapsulation dot1q 2909
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#show policy-map int Te0/0/0/1.2909 | inc confo
Sun Oct  5 20:18:33.619 GMT+5
    Policed(conform)     :             1139276/198088826            1
    Policed(conform)     :            22097420/30539051132          15347
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#show clock
Sun Oct  5 20:18:35.615 GMT+5
20:18:35.811 GMT+5 Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1537-B	1	Carrera 15 # 13C -35 Barrio Alfonso López	32 Mbps	32,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sh run int Gi0/0/0/7.2025
Sun Oct  5 20:19:04.175 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/0/7.2025
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000910
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.197/30
 encapsulation dot1q 2025
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sho policy-map int Gi0/0/0/7.2025 | inc confo
Sun Oct  5 20:19:11.772 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            92489218/70511581891          1
    Policed(conform)    :           200809019/218420030820         32514
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#show clock
Sun Oct  5 20:19:13.622 COLOMBIA
20:19:13.906 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1299-B	1	Carrera 14 # 14-46 Barrio Alfonso López	32 Mbps	32,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sh run int Gi0/0/0/7.2911
Sun Oct  5 20:19:34.529 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/0/7.2911
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000911
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.205/30
 encapsulation dot1q 2911
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#show policy-map int Gi0/0/0/7.2911 | inc confo
Sun Oct  5 20:19:40.663 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           103627341/67275669006          0
    Policed(conform)    :           205439372/218907632292         32995
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#show clock
Sun Oct  5 20:19:42.961 COLOMBIA
20:19:43.240 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1041-B	4	Calle Principal	33 Mbps	33,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sh run int Te0/0/0/12.702313
Sun Oct  5 20:20:09.943 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/12.702313
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000913,+PKFO184
 service-policy input CAR-33M
 service-policy output CAR-33M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.253/30
 encapsulation dot1q 70 second-dot1q 2313
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#show policy-map int Te0/0/0/12.702313 | inc confo
Sun Oct  5 20:20:16.603 COLOMBIA
    Policed(conform)     :           143125155/91539649762          1
    Policed(conform)     :           272487395/304914243552         33738
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#show clock
Sun Oct  5 20:20:18.225 COLOMBIA
20:20:18.266 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
257-B	2	CARRERA 14 # 6-37	50 Mbps	51,8

```
<THBHARMENIA2>dis cur int Eth-Trunk15.2505
#
interface Eth-Trunk15.2505
 vlan-type dot1q 2505
 description IPDP RAMA JUDICIAL GESTION_PROACTIVA - DWK0000914 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.238.121 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-50M inbound
 traffic-policy CAR-50M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHARMENIA2>dis int Eth-Trunk15.2505 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or the
    Last 60 seconds input rate 1832 bits/sec, 3 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 51887248 bits/sec, 4413 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.25%
<THBHARMENIA2>dis clock
2025-10-05 20:20:51-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHARMENIA2>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
495-B	2	Carrera 15 # 9-4 Esquina	25 Mbps	26,3

```
<THBHARMENIA2>dis cur int Eth-Trunk14.2916
#
interface Eth-Trunk14.2916
 vlan-type dot1q 2916
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000916 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.238.193 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-25M inbound
 traffic-policy CAR-25M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHARMENIA2>dis int Eth-Trunk14.2916 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 1800 bits/sec, 3 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 26357320 bits/sec, 2242 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.26%
<THBHARMENIA2>dis clock
2025-10-05 20:21:21-05:00
Sunday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHARMENIA2>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
735-B	3	Calle 6 # 3-86	15 Mbps	15,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#sh run int Te0/0/0/2.601287
Sun Oct  5 20:21:57.248 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/2.601287
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000917,+UWZ4917
 service-policy input CAR-15M
 service-policy output CAR-15M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.25/30
 encapsulation dot1q 60 second-dot1q 1287
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#sho policy-map int Te0/0/0/2.601287 | inc confo
Sun Oct  5 20:22:05.141 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            10118882/9412582944           0
    Policed(conform)    :            18745746/20746262550          15382
RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#show clock
Sun Oct  5 20:22:07.167 COLOMBIA
20:22:07.470 COLOMBIA Sun Oct 5 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
9-B	1	Carrera 57 # 43-91, Av, La Esmeralda, Sede Judicial del CAN	2000 Mbps	3957

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sho policy-map int Hu0/7/0/0.2435 | inc Match
Fri Oct 10 15:25:02.791 COT
    Matched             :          1291270064/1170822799580        1
    Matched             :          3429759759/3878830078180        3957637
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock
Fri Oct 10 15:26:26.916 COT
15:26:27.111 COT Fri Oct 10 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.2435
Fri Oct 10 15:26:30.762 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.2435
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000918
 service-policy input CAR-2G_IN
 service-policy output CAR-2G_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.235.61 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2435
!
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
318-B	4	Calle 13 # 4-07	65Mbps	73,4

```
<THBHCHIPRE>dis cur int Eth-Trunk80.1412
#
interface Eth-Trunk80.1412
 vlan-type dot1q 1412
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000920
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.41 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-65M_RAMA_JUDICIAL inbound
 traffic-policy CAR-65M_RAMA_JUDICIAL outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHCHIPRE>dis int Eth-Trunk80.1412 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 1784 bits/sec, 3 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 73453168 bits/sec, 6247 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.36%
<THBHCHIPRE>dis clock
2025-10-06 09:08:09-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHCHIPRE>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
326-B	4	Calle 8 # 6-30 Piso 1	20 Mbps	33

```
<THBHCHIPRE>dis cur int Eth-Trunk90.2137
#
interface Eth-Trunk90.2137
 vlan-type dot1q 2137
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001449 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.57 255.255.255.252
 statistic enable
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHCHIPRE>dis int Eth-Trunk90.2137 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 1386640 bits/sec, 271 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 33063640 bits/sec, 2851 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.16%
<THBHCHIPRE>dis clock
2025-10-06 09:09:16-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHCHIPRE>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
258-B	2	Carrera 5 # 15-20	50 Mbps	51,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#sh run int Te0/0/0/1.1020
Mon Oct  6 09:09:59.210 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.1020
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000923
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.129 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1020
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#sho policy-map int Te0/0/0/1.1020 | inc confo
Mon Oct  6 09:10:07.184 GMT+5
    Policed(conform)    :             2628390/1041578943           0
    Policed(conform)    :            65858895/93009880502          51155
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#show clock
Mon Oct  6 09:10:09.061 GMT+5
09:10:09.214 GMT+5 Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3494-B	1	Carrera 10 No 14-77	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCUMBRE#sh run int HundredGigE0/0/0/2.2924
Tue Oct  7 08:17:29.020 GMT+5
interface HundredGigE0/0/0/2.2924
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000924
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.201 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2924
!

RP/0/RSP1/CPU0:A9KCUMBRE#sh policy-map int HundredGigE0/0/0/2.2924 | inc confo
Tue Oct  7 08:17:36.345 GMT+5
    Policed(conform)    :           418273460/234229487298         0
    Policed(conform)    :           659565997/767153064690         32775
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCUMBRE#show clock
Tue Oct  7 08:17:39.037 GMT+5
08:17:39.234 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCUMBRE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1113-B	3	calle 9 # 9-12, Edificio Alcaldía Municipal	25 Mbps	25,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#sh run int Te0/0/0/2.601283
Mon Oct  6 09:11:13.185 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/2.601283
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000925,+UWZ4917
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.229.145 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 60 second-dot1q 1283
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#sho policy-map int Te0/0/0/2.601283 | inc confo
Mon Oct  6 09:11:19.808 GMT+5
    Policed(conform)    :           272706807/158665438610         1
    Policed(conform)    :           413072732/402984390688         25589
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#show clock
Mon Oct  6 09:11:22.250 GMT+5
09:11:22.424 GMT+5 Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
361-B	3	Carrera 8 # 3-04 Parque Principal	30 Mbps	30,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh run int Te0/0/0/1.7002719
Mon Oct  6 09:12:02.925 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.7002719
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000926,+TSO3056
 service-policy input CAR-30M
 service-policy output CAR-30M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.245/30
 encapsulation dot1q 700 second-dot1q 2719
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sho policy-map int Te0/0/0/1.7002719 | inc confo
Mon Oct  6 09:12:09.549 GMT+5
    Policed(conform)    :            6159307/3583645502          1
    Policed(conform)    :           74460792/104805378422        30718
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#show clock
Mon Oct  6 09:12:11.348 GMT+5
09:12:11.545 GMT+5 Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1363-B	4	Carrera 10 # 9-28	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sh run int TenGigE0/0/0/12.702330
Mon Oct  6 09:12:38.574 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/12.702330
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000930,+PKFO184
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.213/30
 encapsulation dot1q 70 second-dot1q 2330
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sho policy-map int TenGigE0/0/0/12.702330  | inc confo
Mon Oct  6 09:12:44.915 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            33531314/18202446477          1
    Policed(conform)    :           104651301/129459525944         32743
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#show clock
Mon Oct  6 09:12:47.452 COLOMBIA
09:12:47.503 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1523-B	1	Calle 62 # 128-103	40 Mbps	40,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sh run int  Te0/0/0/12.701091
Mon Oct  6 09:13:08.651 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/12.701091
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000931,+PKF0184
 service-policy input CAR-40M
 service-policy output CAR-40M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.221/30
 encapsulation dot1q 70 second-dot1q 1091
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sho policy-map int  Te0/0/0/12.701091  | inc confo
Mon Oct  6 09:13:15.604 COLOMBIA
    Policed(conform)     :            36653971/21329216282          1
    Policed(conform)     :           102591168/124711669593         40928
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#show clock
Mon Oct  6 09:13:17.371 COLOMBIA
09:13:17.413 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1155-B	4	Calle 10 # 8-22 Piso 1	20 Mbps	20,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sh run int Te0/0/0/12.704066
Mon Oct  6 09:13:44.833 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/12.704066
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000932,+PKF0184
 service-policy input CAR-20M
 service-policy output CAR-20M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.124.89/30
 encapsulation dot1q 70 second-dot1q 4066
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sho policy-map int Te0/0/0/12.704066 | inc confo
Mon Oct  6 09:13:54.198 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            30334750/18890488345          2
    Policed(conform)    :            86548022/84971349536          20481
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#show clock
Mon Oct  6 09:13:58.226 COLOMBIA
09:13:58.272 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1373-B	4	Carrera 20 # 17-34	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sh run int Te0/0/0/12.702332
Mon Oct  6 09:14:29.778 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/12.702332
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000934,+PKF0184
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.229/30
 encapsulation dot1q 70 second-dot1q 2332
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sho policy-map int Te0/0/0/12.702332 | inc confo
Mon Oct  6 09:14:35.616 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             1148401/304762256            1
    Policed(conform)    :            80906972/87978382624          32729
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#show clock
Mon Oct  6 09:14:37.355 COLOMBIA
09:14:37.402 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1740-B	4	Calle # 6-32	15 Mbps	15,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh run int Te0/0/0/6.1141952
Mon Oct  6 09:17:07.991 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/6.1141952
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000936,+TSO2506
 service-policy input CAR-15M
 service-policy output CAR-15M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.237/30
 encapsulation dot1q 114 second-dot1q 1952
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sho policy-map int Te0/0/0/6.1141952 | inc confo
Mon Oct  6 09:17:14.033 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            6321363/5612725345          0
    Policed(conform)    :           48732899/53064932608         15357
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show clock
Mon Oct  6 09:17:15.844 COLOMBIA
09:17:15.888 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1078-B	3	Calle 3 # 289	15 Mbps	15,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh run int Te0/0/0/6.1141101
Mon Oct  6 09:17:38.243 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/6.1141101
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000937+TSO2506
 service-policy input CAR-15M
 service-policy output CAR-15M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.241/30
 encapsulation dot1q 114 second-dot1q 1101
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sho policy-map int Te0/0/0/6.1141101 | inc confo
Mon Oct  6 09:17:45.395 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             2425569/941320842            1
    Policed(conform)    :            20949275/28191985586          15345
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show clock
Mon Oct  6 09:17:47.149 COLOMBIA
09:17:47.191 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1606-B	3	Calle Principal	15 Mbps	15,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#sh run int Te0/1/0/2.1142390
Mon Oct  6 09:18:23.872 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/2.1142390
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000939,+ATR1400
 service-policy input CAR-15M
 service-policy output CAR-15M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.235.69/30
 encapsulation dot1q 114 second-dot1q 2390
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#sho policy-map int Te0/1/0/2.1142390 | inc confo
Mon Oct  6 09:18:30.315 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             9347659/3923899691           1
    Policed(conform)    :            47899576/64420640376          15369
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#show clock
Mon Oct  6 09:18:32.047 COLOMBIA
09:18:32.086 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
182-B	4	Calle 4 # 4-27	20 Mbps	20,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#sh run int Te0/0/0/3.14051251
Mon Oct  6 09:19:01.290 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/3.14051251
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000940,+TTI4198
 service-policy input CAR-20M
 service-policy output CAR-20M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.249 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1405 second-dot1q 1251
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#sho policy-map int Te0/0/0/3.14051251 | inc confo
Mon Oct  6 09:19:06.868 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            20020787/13802141019          0
    Policed(conform)    :            48173769/58213291446          20498
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#show clock
Mon Oct  6 09:19:08.848 COLOMBIA
09:19:09.163 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
321-B	3	Calle 3 # 1A-60, Palacio Municipal	20 Mbps	20,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sh run int Te0/0/0/12.702339
Mon Oct  6 09:19:34.224 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/12.702339
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000941,+PKFO184
 service-policy input CAR-20M
 service-policy output CAR-20M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.253/30
 encapsulation dot1q 70 second-dot1q 2339
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sho policy-map int Te0/0/0/12.702339 | inc confo
Mon Oct  6 09:19:42.175 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            32967918/12318913278          0
    Policed(conform)    :            74475257/103708371886         20470
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#show clock
Mon Oct  6 09:19:43.859 COLOMBIA
09:19:43.905 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1097-B	3	Calle 15 # 6-165 Barrio El Carmen	20 Mbps	23,7

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#sh run int Gi0/2/0/0.2002440
Mon Oct  6 09:23:39.930 COT
interface GigabitEthernet0/2/0/0.2002440
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000943,+ZATR1398
 service-policy input CAR-20M_IN
 service-policy output CAR-20M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.235.5 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 200 second-dot1q 2440
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#sho policy-map int Gi0/2/0/0.2002440 | inc Match
Mon Oct  6 09:23:47.218 COT
    Matched             :             3607102/2380335564           1
    Matched             :             7807724/9475316228           23781
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#show clock
Mon Oct  6 09:23:49.460 COT
09:23:49.607 COT Mon Oct 6 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1049-B	4	Calle 6 # 3-15/19	40 Mbps	40,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sh run int Te0/0/0/12.704020
Mon Oct  6 09:24:18.731 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/12.704020
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000945
 service-policy input CAR-40M
 service-policy output CAR-40M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.235.9/30
 encapsulation dot1q 70 second-dot1q 4020
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sh policy-map int Te0/0/0/12.704020 | inc confo
Mon Oct  6 09:24:26.407 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            61834845/46307926105          92
    Policed(conform)    :           197720575/226779304012         40945
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#show clock
Mon Oct  6 09:24:28.347 COLOMBIA
09:24:28.391 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1054-B	4	Palacio Municipal	33 Mbps	33,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sh run int Te0/0/0/12.702317
Mon Oct  6 09:24:54.139 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/12.702317
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000946,+PKF0184
 mtu 1518
 service-policy input CAR-33M
 service-policy output CAR-33M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.235.81/30
 encapsulation dot1q 70 second-dot1q 2317
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sho policy-map int Te0/0/0/12.702317 | inc confo
Mon Oct  6 09:25:00.366 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          138434065/137782106073         0
    Policed(conform)    :          229035613/204300720602         33776
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#show clock
Mon Oct  6 09:25:02.089 COLOMBIA
09:25:02.134 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1320-B	4	Carrera 25 # 31 B-35	20 Mbps	20,4


```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh run int Gi0/1/1/0.2966
Mon Oct  6 09:25:35.926 COT
interface GigabitEthernet0/1/1/0.2966
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000966
 service-policy input CAR-20M
 service-policy output CAR-20M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.217 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2966
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh policy-map int Gi0/1/1/0.2966 | inc confo
Mon Oct  6 09:25:43.210 COT
    Policed(conform)    :            2061999/525146196            0
    Policed(conform)    :           59874078/67200408252          20476
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#show clock
Mon Oct  6 09:25:44.896 COT
09:25:45.095 COT Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
336-B	3	Calle 9 # 17-49	32 Mbps	33,2

```
<THBHYOPAL>dis cur int Eth-Trunk13.2968
#
interface Eth-Trunk13.2968
 vlan-type dot1q 2968
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000968 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.235.1 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-32M inbound
 traffic-policy CAR-32M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHYOPAL>dis int Eth-Trunk13.2968 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 300 seconds input rate 2040 bits/sec, 4 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 33215312 bits/sec, 2826 packets/sec
    Last 300 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 300 seconds output utility rate: 0.16%
<THBHYOPAL>dis clock
2025-10-06 09:26:38-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHYOPAL>
```


PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1403-B	3	Calle 6 No 5 - 34	26 Mbps	26,9

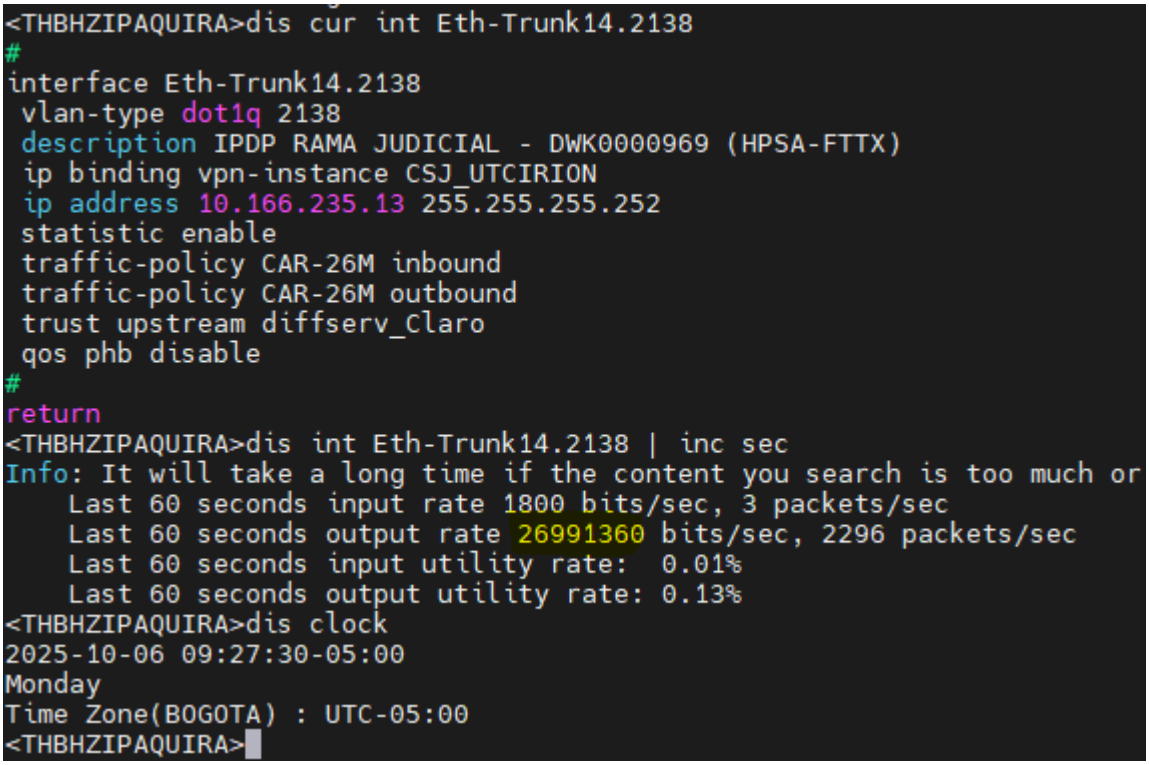

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1744-B	4	Carrera 22 # 12-93	25 Mbps	32,5

```
<THBHCUMARAL>dis cur interface Eth-Trunk10.2970
#
interface Eth-Trunk10.2970
 vlan-type dot1q 2970
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000970 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.235.17 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-25M inbound
 traffic-policy CAR-25M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHCUMARAL>dis int Eth-Trunk10.2970 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 300 seconds input rate 272 bits/sec, 1 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 32562816 bits/sec, 2770 packets/sec
    Last 300 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 300 seconds output utility rate: 0.16%
<THBHCUMARAL>dis clock
2025-10-06 09:35:23-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHCUMARAL>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
903-B	2	Calle 8 # 8-18 Urbanización Las Acacias	32 Mbps	33,2

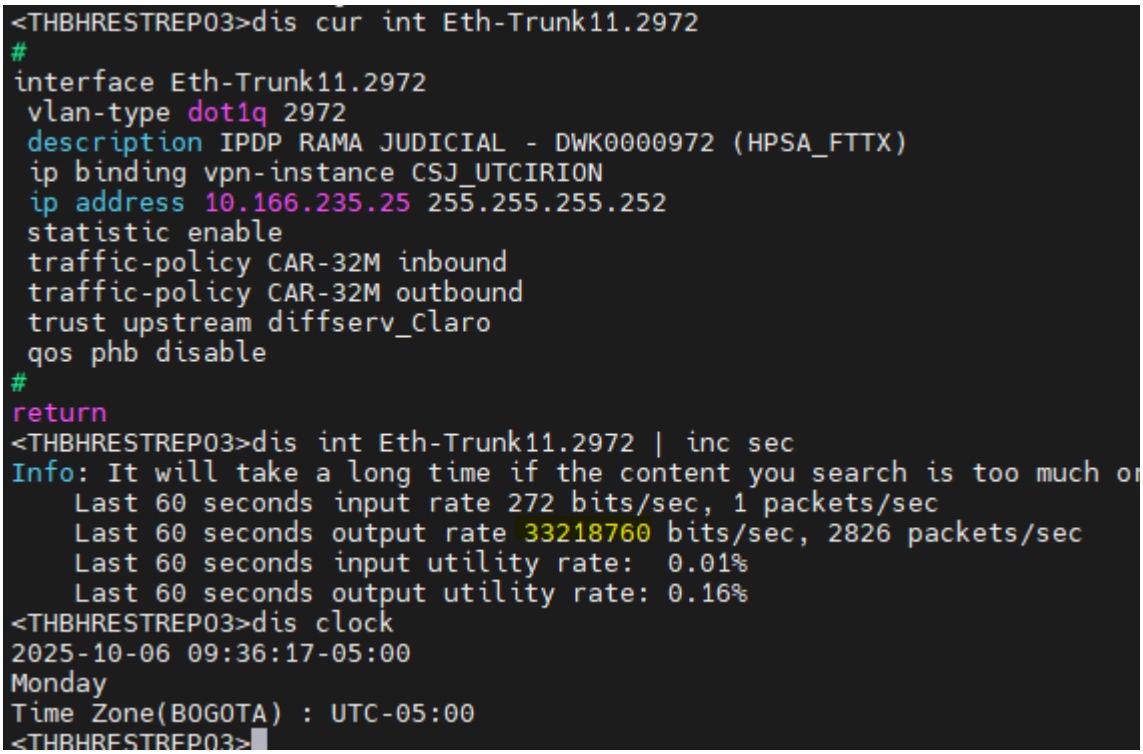

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1576-B	3	Carrera 11 # 11-58 Apto 201, Barrio Centro	32 Mbps	33,2

```
<NGWBULEVAR>dis cur int Eth-Trunk14.3030
#
interface Eth-Trunk14.3030
 vlan-type dot1q 3030
 description IPDP RAMA JUDICIAL GESTION_PROACTIVA - DWK0000973 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.235.29 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-32M inbound
 traffic-policy CAR-32M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<NGWBULEVAR>dis int Eth-Trunk14.3030 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or the
    Last 60 seconds input rate 320 bits/sec, 1 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 33218360 bits/sec, 2825 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.16%
<NGWBULEVAR>dis clock
2025-10-06 16:22:30-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<NGWBULEVAR>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
505-B	3	Carrera 8 # 9-18	25 Mbps	25,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sh run int Te0/0/0/12.702002
Mon Oct  6 09:37:22.790 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/12.702002
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000975,+ATR1400
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.235.37/30
 encapsulation dot1q 70 second-dot1q 2002
!


RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#sh policy-map int Te0/0/0/12.702002 | inc confo
Mon Oct  6 09:37:29.262 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             4903176/2502829725           1
    Policed(conform)    :            35546447/48445956100          25583
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#show clock
Mon Oct  6 09:37:31.813 COLOMBIA
09:37:31.855 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA1#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2227-B	3	Calle 8 No 8 -24, Bodega de Procesos de los despachos judiciales	25 Mbps	25,6

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#sh run int Gi0/0/1/8.2437
Mon Oct  6 09:38:10.203 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/8.2437
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000976
 service-policy input CAR-25M
 service-policy output CAR-25M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.235.41 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2437
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#sho policy-map int Gi0/0/1/8.2437 | inc confo
Mon Oct  6 09:38:15.712 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             3216300/913527030           1
    Policed(conform)    :            73003538/103265342640        25626
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#show clock
Mon Oct  6 09:38:17.589 COLOMBIA
09:38:17.884 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3464-B	3	Carrera 13 # 12-107 Barrio el Tamaco	48 Mbps	49,4

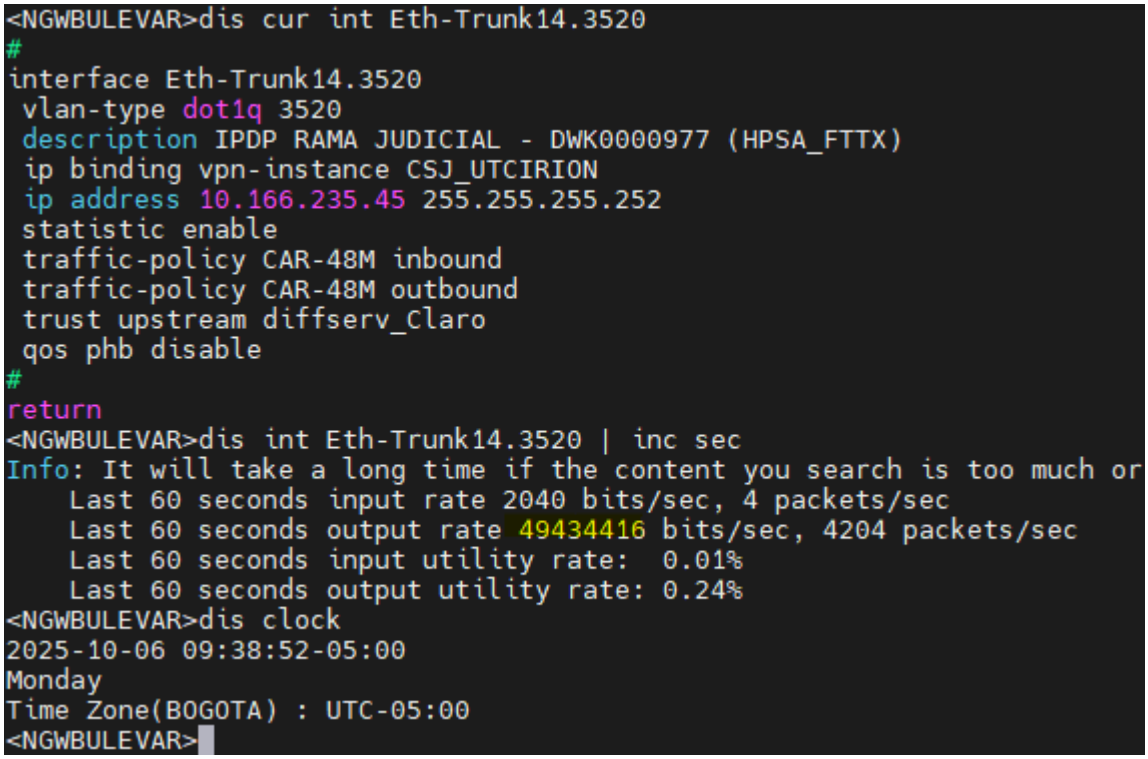

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3465-B	3	Cra 12 No 10-33 esquina	35 Mbps	35,8

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh run int Te0/1/0/11.1126
Tue Oct  7 08:18:49.530 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/11.1126
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000978
 service-policy input CAR-35M
 service-policy output CAR-35M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.235.49/30
 encapsulation dot1q 1126
!


RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show policy-map int Te0/1/0/11.1126 | inc confo
Tue Oct  7 08:18:59.038 COLOMBIA
    Policed(conform)     :            72846384/32829147156          0
    Policed(conform)     :           166606716/216953325732         35830
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show clock
Tue Oct  7 08:19:02.112 COLOMBIA
08:19:02.156 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3510-B	3	Carrera 9 # 10 9-4/8/14/20 Centro Comercial La Contaduría oficina 26 (piso 2)	50 Mbps	51,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh run int Gi0/1/1/0.1520
Mon Oct  6 09:40:06.151 COT
interface GigabitEthernet0/1/1/0.1520
 description RAMA JUDICIAL - DWK0000979
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.235.53 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1520
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sho policy-map int Gi0/1/1/0.1520 | inc confo
Mon Oct  6 09:40:12.795 COT
    Policed(conform)    :            1015937/225018748           0
    Policed(conform)    :           60229057/86335262478         51199
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#show clock
Mon Oct  6 09:40:14.578 COT
09:40:14.776 COT Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
317-B	4	Carrera 11 # 7-55, Barrio Fundadores	32 Mbps	33,2

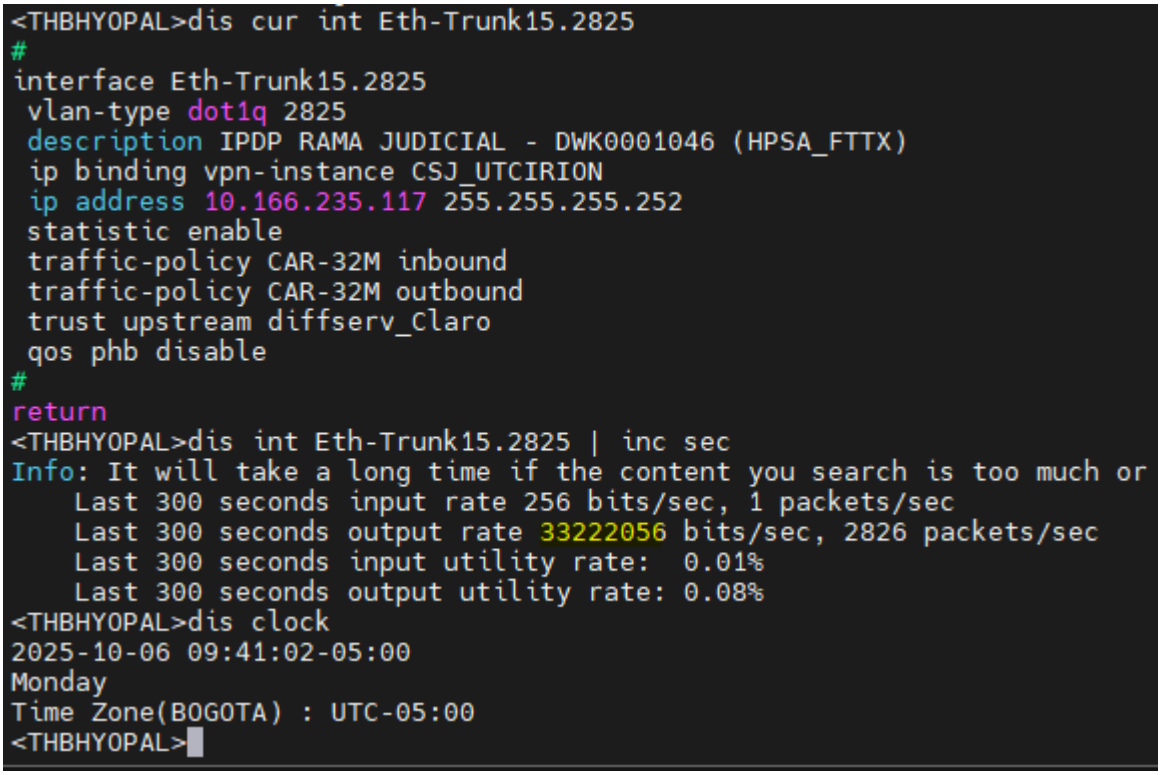

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1123-B	2	Carrera 15 # 10-40 piso 5° - local 501	32 Mbps	33,2

```
<THBHMEDELLINCCM>dis cur int Eth-Trunk29.2403
#
interface Eth-Trunk29.2403
 vlan-type dot1q 2403
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001403 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.237.49 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-32M inbound
 traffic-policy CAR-32M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHMEDELLINCCM>dis int Eth-Trunk29.2403 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 304 bits/sec, 1 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 33231936 bits/sec, 2826 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.33%
<THBHMEDELLINCCM>dis clock
2025-10-06 09:41:37-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHMEDELLINCCM>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1521-B	1	Carrera 39C # 109-24, Casa de Justicia 20 de Julio	32 Mbps	32,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int HundredGigE0/0/0/1.1404
Mon Oct  6 09:42:07.039 COLOMBIA
interface HundredGigE0/0/0/1.1404
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001404
 service-policy input CAR-32M
 service-policy output CAR-32M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.253/30
 encapsulation dot1q 1404
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sho policy-map int HundredGigE0/0/0/1.1404 | inc confo
Mon Oct  6 09:42:13.079 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             1418625/358525508           1
    Policed(conform)    :            59428642/56233912849         32748
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Mon Oct  6 09:42:14.814 COLOMBIA
09:42:14.855 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1133-B	1	Carrera 48 No,50-143 PISO 2 CC JAZMÍN PLAZA COPACABANA	50 Mbps	51,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sh run int Gi0/1/1/0.1234
Mon Oct  6 09:42:40.693 COT
interface GigabitEthernet0/1/1/0.1234
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0001405
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.45 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1234
!


RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#sho policy-map int Gi0/1/1/0.1234 | inc confo
Mon Oct  6 09:42:47.397 COT
    Policed(conform)    :          199484346/134381824385         1
    Policed(conform)    :          796245136/1023051248473        51169
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#show clock
Mon Oct  6 09:42:49.293 COT
09:42:49.493 COT Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1671-B	1	Carrera 72J # 36-56 Sur, Casa de Justicia Kennedy	65 Mbps	73,6

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.2448
Mon Oct  6 09:45:41.536 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.2448
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001448
 service-policy input CAR-65M_IN
 service-policy output CAR-65M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.1 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2448
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh policy-map int Hu0/7/0/0.2448 | inc Match
Mon Oct  6 09:45:44.298 COT
    Matched             :            39989949/28144924564          1
    Matched             :           310070291/305788532790         73686
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock
Mon Oct  6 09:45:47.178 COT
09:45:47.350 COT Mon Oct 6 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2062-B	1	Calle 8 # 6 - 83	60 Mbps	68,4

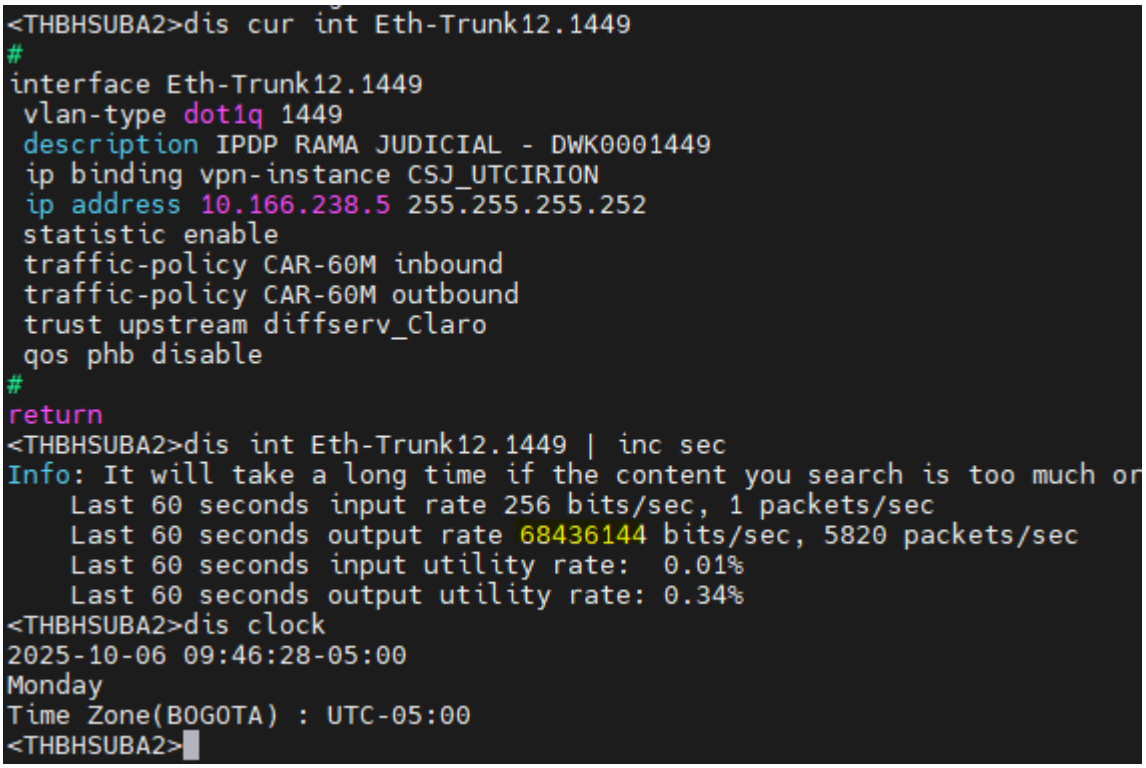

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1052-B	1	Calle 8 # 6 - 83	30 Mbps	30,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sh run int Te0/1/0/15.1021
Mon Oct  6 09:47:04.228 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/15.1021
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001465
 service-policy input CAR-30M
 service-policy output CAR-30M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.29/30
 encapsulation dot1q 1021
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sh policy-map int Te0/1/0/15.1021 | inc confo
Mon Oct  6 09:47:10.674 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            49576079/34063319672          0
    Policed(conform)    :           197023562/189875772119         30716
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#show clock
Mon Oct  6 09:47:12.675 COLOMBIA
09:47:12.741 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3463-B	1	Calle 85 Sur # 94 – 35 (URI Fiscalía)	60 Mbps	62,2

```
<THBHVENECIA>dis cur int Eth-Trunk12.1022
#
interface Eth-Trunk12.1022
 vlan-type dot1q 1022
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001565
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.113 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-60M inbound
 traffic-policy CAR-60M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHVENECIA>dis int Eth-Trunk12.1022 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 2064 bits/sec, 4 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 62286488 bits/sec, 5298 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.31%
<THBHVENECIA>dis clock
2025-10-06 09:47:47-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHVENECIA>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
364-B	3	CARRERA 17 # 11-59, BARRIO PARAÍSO	40 Mbps	41,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#sh run int Te0/0/0/2.601302
Mon Oct  6 09:48:21.166 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/2.601302
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001613,+UWZ4917
 service-policy input CAR-40M
 service-policy output CAR-40M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.237.249/30
 encapsulation dot1q 60 second-dot1q 1302
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#sh policy-map int Te0/0/0/2.601302 | inc confo
Mon Oct  6 09:48:27.692 COLOMBIA
    Policed(conform)    :             1282263/408077370           0
    Policed(conform)    :             6227930/7697335804          41184
RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#show clock
Mon Oct  6 09:48:29.763 COLOMBIA
09:48:30.059 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
279-B	3	CALLE 76 NO, 49C-26 EDIFICIO GAULA PISO 5	64 Mbps	65,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh run int Te0/0/0/1.7002027
Mon Oct  6 09:48:58.185 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.7002027
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001614,+UWZ4917
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.153/30
 encapsulation dot1q 700 second-dot1q 2027
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh policy-map int Te0/0/0/1.7002027 | inc confo
Mon Oct  6 09:49:04.469 GMT+5
    Policed(conform)    :              987025/176886607            0
    Policed(conform)    :           165823767/166182840570         65491
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#show clock
Mon Oct  6 09:49:06.342 GMT+5
09:49:06.546 GMT+5 Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1736-B	1	CALLE 76 NO, 49C-26 EDIFICIO GAULA PISO 5	40 Mbps	40

```
<NGWBOSTON>dis cur int Eth-Trunk35.1530
2025-10-06 09:49:36.883 -05:00
#
interface Eth-Trunk35.1530
 vlan-type dot1q 1530
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001616
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.9 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-40M inbound
 traffic-policy CAR-40M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<NGWBOSTON>dis int Eth-Trunk35.1530 | inc sec
2025-10-06 09:49:40.652 -05:00
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 1872 bits/sec, 3 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 40066496 bits/sec, 3408 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.20%
<NGWBOSTON>dis clock
2025-10-06 09:49:42.393 -05:00
2025-10-06 09:49:42-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<NGWBOSTON>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1613-B	1	CALLE 76 NO, 49C-26 EDIFICIO GAULA PISO 5	25 Mbps	27,8

```
<NGWBOSQUE>dis cur int Eth-Trunk10.2617
2025-10-06 09:50:19.468 -05:00
#
interface Eth-Trunk10.2617
 vlan-type dot1q 2617
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001617 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.21 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-25M inbound
 traffic-policy CAR-25M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<NGWBOSQUE>dis int Eth-Trunk10.2617 | inc sec
2025-10-06 09:50:22.936 -05:00
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 240 bits/sec, 1 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 27867376 bits/sec, 2370 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.13%
<NGWBOSQUE>dis clock
2025-10-06 09:50:25.162 -05:00
2025-10-06 09:50:25-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<NGWBOSQUE>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
657-B	2	CALLE 9 # 7 -32 OFI 402	65 Mbps	66,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sh run int Gi0/0/1/0.1618
Mon Oct  6 09:50:55.360 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/0.1618
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001618
 service-policy input CAR-65M
 service-policy output CAR-65M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.238.53/30
 encapsulation dot1q 1618
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#show policy-map int Gi0/0/1/0.1618 | inc confo
Mon Oct  6 09:51:01.706 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          315682792/254476606352         0
    Policed(conform)     :          519683263/489394040110         66568
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#show clock
Mon Oct  6 09:51:03.668 COLOMBIA
09:51:03.766 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
417-B	4	CRA 12 # 13-26 BARRIO MANACACIAS	32 Mbps	41,4

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#sh run int Gi0/2/0/6.2116
Mon Oct  6 09:51:33.148 COT
interface GigabitEthernet0/2/0/6.2116
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001619
 service-policy input CAR-32M_IN
 service-policy output CAR-32M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.235.21 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2116
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#sh policy-map int Gi0/2/0/6.2116 | inc Match
Mon Oct  6 09:51:40.982 COT
    Matched             :           147290449/104107346431         0
    Matched             :           303286512/310030609516         41419
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#show clock
Mon Oct  6 09:51:43.052 COT
09:51:43.348 COT Mon Oct 6 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1592-B	1	CARRERA 12 # 4-38	100 Mbps	102,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#sh run int Te0/0/0/1.2434
Mon Oct  6 09:52:11.213 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.2434
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001621
 service-policy input CAR-100M
 service-policy output CAR-100M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.229.249 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2434
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#sho policy-map  int Te0/0/0/1.2434 | inc confo
Mon Oct  6 09:52:18.125 GMT+5
    Policed(conform)    :           303738184/204830012531         0
    Policed(conform)    :           660412252/655698793534         102406
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#show clock
Mon Oct  6 09:52:19.854 GMT+5
09:52:20.006 GMT+5 Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
487-B	2	CALLE 8 # 3-17	25 Mbps	27,8

```
<THBHTULUA>dis cur int Eth-Trunk14.2915
#
interface Eth-Trunk14.2915
 vlan-type dot1q 2915
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000915 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.238.157 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-25M inbound
 traffic-policy CAR-25M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHTULUA>dis int Eth-Trunk14.2915 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 232 bits/sec, 1 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 27883632 bits/sec, 2373 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.13%
<THBHTULUA>dis clock
2025-10-06 09:59:12-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHTULUA>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1081-B	4	CARRERA 11 # 14-135	15 Mbps	18,9


```
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#sh run int Gi0/2/0/0.2001307
Mon Oct  6 09:59:48.220 COT
interface GigabitEthernet0/2/0/0.2001307
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001624,+TSO2506
 service-policy input CAR-15M_IN
 service-policy output CAR-15M_OUT
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.245 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 200 second-dot1q 1307
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#sho policy-map int Gi0/2/0/0.2001307 | inc Match
Mon Oct  6 09:59:55.901 COT
    Matched             :              374656/120959324            1
    Matched             :             1819449/2358353886           18917
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#show clock
Mon Oct  6 09:59:58.657 COT
09:59:58.813 COT Mon Oct 6 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#
```


PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1541-B	4	CARRERA 11 # 14-135	50 Mbps	51,7

```
<THBHSOGAMOSO>dis cur int Eth-Trunk11.3564
#
interface Eth-Trunk11.3564
 vlan-type dot1q 3564
 description IPDP RAMA JUDICIAL GESTION_PROACTIVA - DWK0001628 (HPSA_FTTX)
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.233.29 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-50M inbound
 traffic-policy CAR-50M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHSOGAMOSO>dis int Eth-Trunk11.3564 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or the
    Last 60 seconds input rate 1880 bits/sec, 3 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 51774312 bits/sec, 4404 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.25%
<THBHSOGAMOSO>dis clock
2025-10-06 10:00:30-05:00
Monday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHSOGAMOSO>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1543-B	1	CARRERA 9 # 14B -61	64 Mbps	64,9

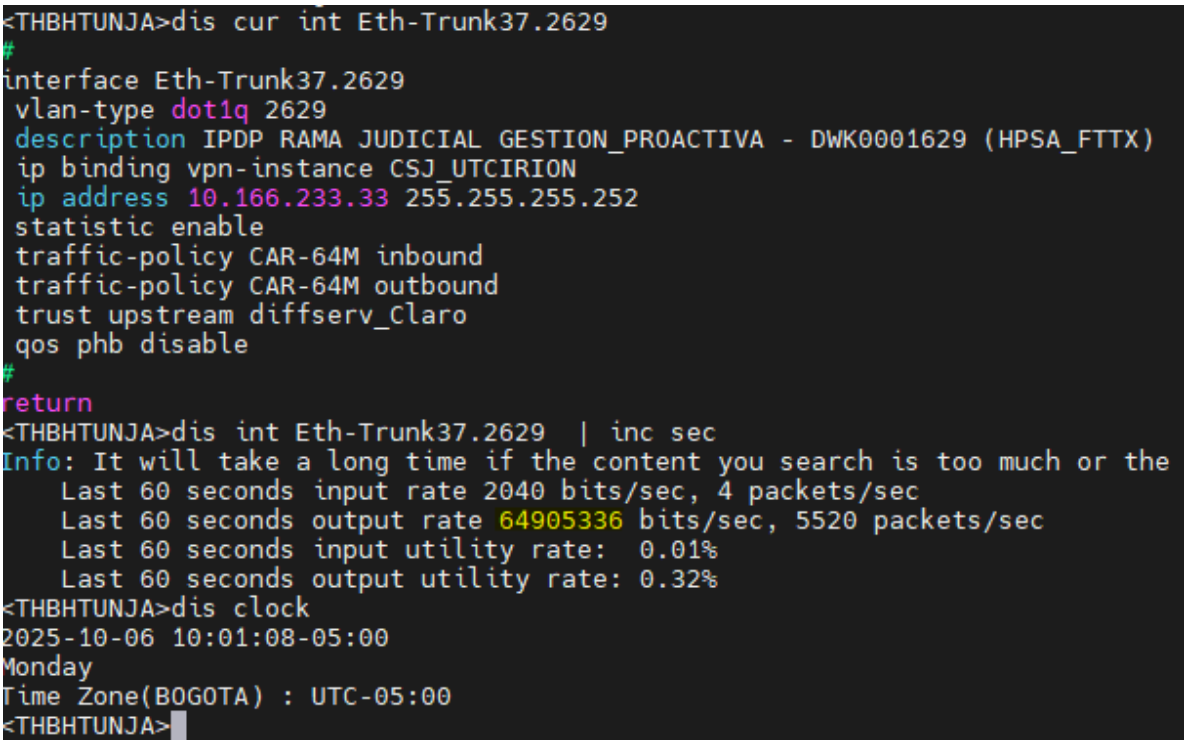

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
526-B	3	TRANSVERSAL 10 # 9-50	32 Mbps	33,2

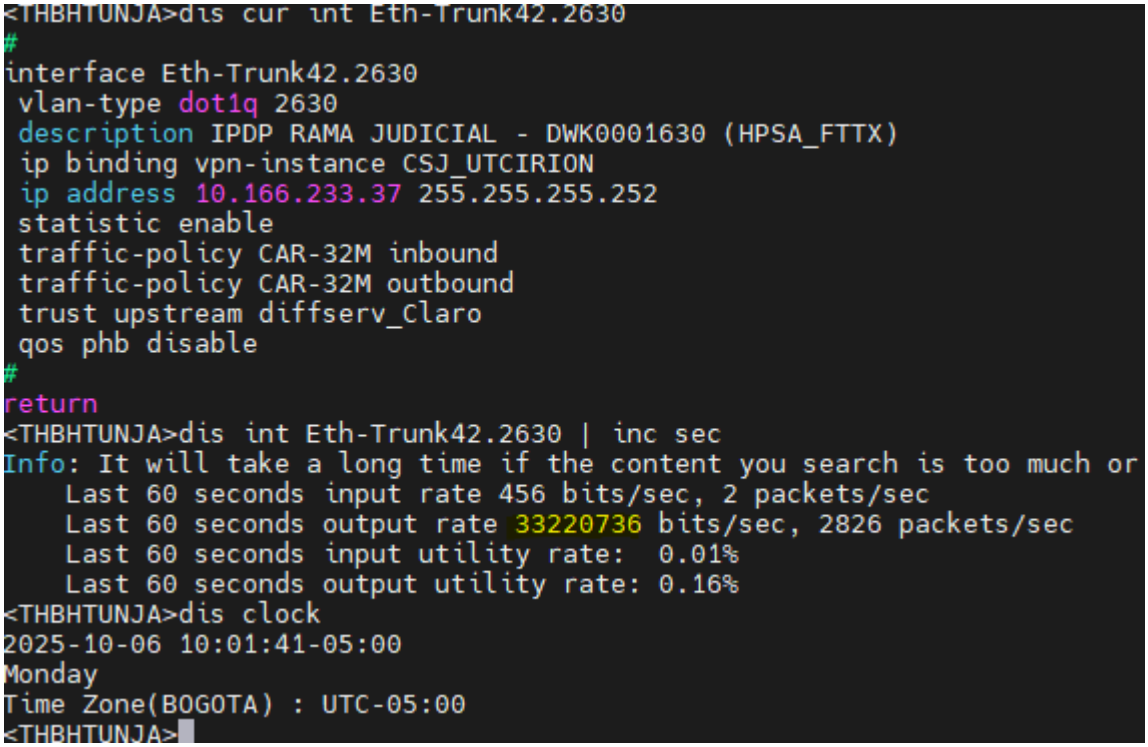

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1072-B	4	CALLE 9 # 14-46	16 Mbps	16,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh run int Te0/0/0/6.2127
Mon Oct  6 10:02:17.626 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/6.2127
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001688
 service-policy input CAR-16M
 service-policy output CAR-16M
 vrf CSJ_UTCIRION
 ipv4 address 10.166.233.233/30
 encapsulation dot1q 2127
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh policy-map int Te0/0/0/6.2127 | inc confo
Mon Oct  6 10:02:25.741 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            52640076/30085582682          1
    Policed(conform)    :            92674496/99215587562          16390
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show clock
Mon Oct  6 10:02:27.672 COLOMBIA
10:02:27.712 COLOMBIA Mon Oct 6 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3603-B	3	Calle 103 # 94-76, Edificio Rafael Uribe Uribe, juzgados 001, 002, 003 administrativos	64 Mbps	98,3

```
<THBHAPARTADO>dis cur int Eth-Trunk11.2105
#
interface Eth-Trunk11.2105
 vlan-type dot1q 2105
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001706
 ip binding vpn-instance CSJ_UTCIRION
 ip address 10.166.200.9 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-64M inbound
 traffic-policy CAR-64M outbound
 trust upstream default
 qos phb disable
#
return
<THBHAPARTADO>dis int Eth-Trunk11.2105 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 4175456 bits/sec, 1526 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 98330288 bits/sec, 9245 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.32%
<THBHAPARTADO>dis clock
2025-10-30 09:13:03-05:00
Thursday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHAPARTADO>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3347	1	Calle 22 # 28A-10	64 Mbps	65,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA2#sh run int Te0/0/2/3.533
Tue Oct  7 08:48:05.521 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/3.533
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000672
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 190.145.79.149 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 533
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA2#sh policy-map int Te0/0/2/3.533 | inc confo
Tue Oct  7 08:48:07.569 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          5646652414/3102162235284        2896
    Policed(conform)    :          8013991975/7022351720613        65515
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA2#sh clock
Tue Oct  7 08:48:10.181 COLOMBIA
08:48:10.463 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KFLORA2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3303	2	Calle 30 # 31-64	64 Mbps	65,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#sh run int Te0/1/0/1.2518
Tue Oct  7 12:12:57.660 COT
interface TenGigE0/1/0/1.2518
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000675
 mtu 1522
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.9/30
 encapsulation dot1q 2518
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#sh policy-map int Te0/1/0/1.2518 | inc confo
Tue Oct  7 12:13:04.957 COT
    Policed(conform)    :           201964249/110234991585         703
    Policed(conform)    :           244114141/219400279968         65501
RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#show clock
Tue Oct  7 12:13:06.498 COT
12:13:06.556 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KSANDIEGO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3305	1	Carrera 83 # 47A-47 Barrio La Floresta	150 Mbps	153,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Gi0/3/0/18.578
Tue Oct  7 08:51:17.430 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/3/0/18.578
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000679
 service-policy input CAR-150M
 service-policy output CAR-150M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.81/30
 encapsulation dot1q 578
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh policy-map int Gi0/3/0/18.578 | inc confo
Tue Oct  7 08:51:23.821 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          3520365689/1712318245278        346
    Policed(conform)    :          5021543039/4457249980199        153485
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Tue Oct  7 08:51:25.643 COLOMBIA
08:51:25.679 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3344	2	Carrera 9 # 2-21 Edificio Transferencia K9C2	64 Mbps	64,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#sh run int Gi0/0/0/2.425
Tue Oct  7 08:51:57.141 COL
interface GigabitEthernet0/0/0/2.425
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000683
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.1 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 425
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#sh policy-map int Gi0/0/0/2.425 | inc confo
Tue Oct  7 08:52:04.556 COL
    Policed(conform)    :          6706683412/4761194548435        2730
    Policed(conform)    :          8912415217/7552322491968        64105
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#show clock
Tue Oct  7 08:52:07.208 COL
08:52:07.492 COL Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3342	2	Calle 3 # 2A-35, Palacio de Justicia, Edificio Centro Empresarial	70 Mbps	70,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#sh run int Gi0/0/0/2.525
Tue Oct  7 08:52:32.557 COL
interface GigabitEthernet0/0/0/2.525
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000684
 service-policy input CAR-70M
 service-policy output CAR-70M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.85 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 525
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#sh policy-map int Gi0/0/0/2.525 | inc confo
Tue Oct  7 08:52:39.235 COL
    Policed(conform)     :          10367234907/5707321819915         3097
    Policed(conform)     :          14893538042/13690436717955        70195
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#show clock
Tue Oct  7 08:52:41.429 COL
08:52:41.708 COL Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3341	2	Carrera 6 # 10-38/54, Palacio de Justicia	64 Mbps	91,3

```
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#sh run int Te0/4/0/1.358
Tue Oct  7 08:56:16.904 COT
interface TenGigE0/4/0/1.358
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000687
 service-policy input CAR-64M_IN
 service-policy output CAR-64M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.129 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 358
!

RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#sho policy-map int Te0/4/0/1.358 | inc Match
Tue Oct  7 08:56:25.233 COT
    Matched             :          3300557538/1770411264772        2500
    Matched             :          5580302979/5594540398301        91384
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#show clock
Tue Oct  7 08:56:27.437 COT
08:56:27.627 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2161	2	Sincelejo Juzgado de Restitución de Tierras,Calle 23 #16–33 Edificio Las Marías	64 Mbps	106,3

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#sh run int Gi0/13/0/2.1228
Tue Oct  7 08:59:05.935 COT
interface GigabitEthernet0/13/0/2.1228
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000688
 service-policy input CAR-64M_IN
 service-policy output CAR-64M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.197 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1228
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#sho policy-map int Gi0/13/0/2.1228 | inc Match
Tue Oct  7 08:59:11.366 COT
    Matched             :          2270442911/1501609058919        9064
    Matched             :          3264640603/3180200158765        106382
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#show clock
Tue Oct  7 08:59:13.578 COT
08:59:13.725 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1953	1	Calle 50 # 8B-48, Palacio de Justicia	128 Mbps	131

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#sh run int Te0/0/0/3.322
Tue Oct  7 08:59:46.128 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/3.322
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000689
 service-policy input CAR-128M
 service-policy output CAR-128M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.205/30
 encapsulation dot1q 322
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#sho policy-map int Te0/0/0/3.322 | inc confo
Tue Oct  7 08:59:55.383 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          21028243629/15686065520378        12736
    Policed(conform)    :          28112451767/24639616703866        131085
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#show clock
Tue Oct  7 08:59:57.392 COLOMBIA
08:59:57.690 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2157	1	Avenida Simón Bolívar Carrera 16 # 36-44, Centro Administrativo Municipal -CAM	80 Mbps	81,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh run int Gi0/0/1/3.375
Tue Oct  7 09:04:26.546 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/3.375
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000690
 service-policy input CAR-80M
 service-policy output CAR-80M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.33/30
 encapsulation dot1q 375
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh policy-map int Gi0/0/1/3.375 | inc confo
Tue Oct  7 09:04:33.190 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          2281401027/1498832270699        4055
    Policed(conform)    :          4352424798/4626649862460        81974
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#show clock
Tue Oct  7 09:04:35.670 COLOMBIA
09:04:35.954 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5187	1	Calle 5 # 22-67	50 Mbps	52,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS2#sh run int Te0/0/2/1.278
Tue Oct  7 09:05:28.949 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/1.278
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000692
 mtu 1522
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.117/30
 encapsulation dot1q 278
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS2#sho policy-map int Te0/0/2/1.278 | inc confo
Tue Oct  7 09:05:30.637 COLOMBIA
    Policed(conform)     :           928030374/536146035880         3111
    Policed(conform)     :          1524976833/1569185151361        52946
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS2#show clock
Tue Oct  7 09:05:33.557 COLOMBIA
09:05:33.838 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3333	1	Carrera 36 # 29-35, DESAJ	95 Mbps	133

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#sh run int Gi0/13/0/6.540
Tue Oct  7 09:08:16.861 COT
interface GigabitEthernet0/13/0/6.540
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000693
 service-policy input CAR-95M_IN
 service-policy output CAR-95M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.249 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 540
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#sh policy-map int Gi0/13/0/6.540 | inc Match
Tue Oct  7 09:08:26.280 COT
    Matched             :          9837527240/5869371395788         3702
    Matched             :         13567034318/12431008582073        133049
    Matched             :                       0/0                 0
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#show clock
Tue Oct  7 09:08:28.378 COT
09:08:28.622 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3330	1	Carrera 4 # 12-37	64 Mbps	65,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sh run int Te0/0/1/0.288
Tue Oct  7 09:08:52.971 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/1/0.288
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000694
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.213 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 288
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sho policy-map int Te0/0/1/0.288 | inc confo
Tue Oct  7 09:09:02.029 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          4664809557/2758426474588        906
    Policed(conform)    :          6775630800/5772578208531        65572
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#show clock
Tue Oct  7 09:09:04.252 COLOMBIA
09:09:04.549 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3311	1	Carrera 14 # 14-09, Edificio Torre Premium	64 Mbps	65

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sh run int Gi0/0/0/7.368
Tue Oct  7 09:09:57.519 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/0/7.368
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000700
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.221/30
 encapsulation dot1q 368
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sh policy-map int Gi0/0/0/7.368 | inc confo
Tue Oct  7 09:10:04.545 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          7012178469/6061239744285        2903
    Policed(conform)    :          6353512704/4070327822766        65096
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#show clock
Tue Oct  7 09:10:06.635 COLOMBIA
09:10:06.921 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3310	1	Carrera 12 # 15-32, Edificio Sagrado Corazon de Jesus	100 Mbps	101,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sh run int Gi0/0/0/7.430
Tue Oct  7 09:10:26.584 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/0/7.430
 description IPDP IRAMA JUDICIAL - DWK0000701
 service-policy input CAR-100M
 service-policy output CAR-100M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.225/30
 encapsulation dot1q 430
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sh policy-map int Gi0/0/0/7.430 | inc confo
Tue Oct  7 09:10:34.918 COLOMBIA
    Policed(conform)    :         11114777238/6033425699798        7317
    Policed(conform)    :         16479965873/16635154841410       101905
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#show clock
Tue Oct  7 09:10:37.144 COLOMBIA
09:10:37.426 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5163	2	Calle 5A # 10-92, Palacio de Justicia	60 Mbps	61,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#sh run int Te0/1/0/2.538
Tue Oct  7 09:11:18.947 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/2.538
 description IPDP RAMA JUDICIAL GESTION_PROACTIVA - DWK0000705
 service-policy input CAR-60M
 service-policy output CAR-60M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.53/30
 encapsulation dot1q 538
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#sho policy-map int Te0/1/0/2.538 | inc confo
Tue Oct  7 09:11:20.984 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          8072415124/5451512442463        29
    Policed(conform)     :         10945471966/10254371648714       61422
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#show clock
Tue Oct  7 09:11:22.857 COLOMBIA
09:11:22.900 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1789	1	Carrera 12 # 20-63, Palacio de Justicia Fabio Calderón Botero	300 Mbps	307,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#sh run int Te0/0/0/1.453
Tue Oct  7 09:13:57.598 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.453
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000707
 mtu 1522
 service-policy input CAR-300M
 service-policy output CAR-300M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.173 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 453
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#sho policy-map int Te0/0/0/1.453 | inc confo
Tue Oct  7 09:14:04.198 GMT+5
    Policed(conform)    :          57349667323/41922024100141       25234
    Policed(conform)    :          79370451751/77230601583982       307199
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#show clock
Tue Oct  7 09:14:06.132 GMT+5
09:14:06.285 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPEREIRACCM#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1775	2	Calle 22 # 16-40 piso 1, Palacio de Justicia	128 Mbps	189,6

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#sh run int BE92.1519
Tue Oct  7 09:14:37.069 COT
interface Bundle-Ether92.1519
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000708
 service-policy input CAR-128M_IN
 service-policy output CAR-128M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.17 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1519
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#sho policy-map int BE92.1519 | inc Match
Tue Oct  7 09:14:45.132 COT
    Matched             :          9607710344/6424445111695        27209
    Matched             :         11391764990/10932690346123       189648
    Matched             :                    0/0                   0
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#show clock
Tue Oct  7 09:14:47.186 COT
09:14:47.337 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1782	1	Calle 20 # 2A-20, Palacio de Justicia	128 Mbps	131

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#sh run int Te0/1/0/2.380
Tue Oct  7 09:15:19.970 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/2.380
 description RAMA JUDICIAL - DWK0000709
 mtu 1522
 service-policy input CAR-128M
 service-policy output CAR-128M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.13/30
 encapsulation dot1q 380
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#sho policy-map int Te0/1/0/2.380 | inc confo
Tue Oct  7 09:15:25.701 COLOMBIA
    Policed(conform)    :         17905020550/10009252476637       10336
    Policed(conform)    :         23857347904/24702071459610       131035
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#show clock
Tue Oct  7 09:15:27.573 COLOMBIA
09:15:27.614 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBQWTC#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1763	2	Calle 4 # 1C-45 Pisos No 2, Edificio Ackar	600 Mbps	613,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#sh run int Te0/1/0/3.1563
Tue Oct  7 09:30:52.544 GMT+5
interface TenGigE0/1/0/3.1563
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000710
 mtu 1526
 service-policy input CAR-600M
 service-policy output CAR-600M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.137/30
 encapsulation dot1q 1563
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#sho policy-map int Te0/1/0/3.1563 | inc confo
Tue Oct  7 09:30:55.048 GMT+5
    Policed(conform)     :          13692488956/9453554395810         10184
    Policed(conform)     :          17111625492/14407210823658        613764
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#show clock
Tue Oct  7 09:30:56.768 GMT+5
09:30:56.963 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTEUSAQUILLO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3338	2	Calle 4 # 1C-45 Pisos No 2, Edificio Ackar	65 Mbps	65,9

```
<THBHSANANDRES>dis cur int Eth-Trunk11.1882
#
interface Eth-Trunk11.1882
 vlan-type dot1q 1882
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000711
 ip binding vpn-instance internet
 ip address 10.166.254.69 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-65M inbound
 traffic-policy CAR-65M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHSANANDRES>dis int Eth-Trunk11.1882 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 300 seconds input rate 2445016 bits/sec, 594 packets/sec
    Last 300 seconds output rate 65969064 bits/sec, 5951 packets/sec
    Last 300 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 300 seconds output utility rate: 0.32%
<THBHSANANDRES>dis clock
2025-10-07 09:39:19-05:00
Tuesday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHSANANDRES>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1773	1	Calle 27 # 2-06, Palacio de Justicia	100 Mbps	147,5

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSMONTERIA#sh run int Gi0/2/0/2.316
Tue Oct  7 09:39:55.799 COT
interface GigabitEthernet0/2/0/2.316
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000712
 service-policy input CAR-100M_IN
 service-policy output CAR-100M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 186.145.15.213 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 316
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSMONTERIA#sh policy-map int Gi0/2/0/2.316 | inc Match
Tue Oct  7 09:40:07.670 COT
    Matched             :         14071893762/8850044278674        4689
    Matched             :         17651860149/16481111852169       147578
    Matched             :                    0/0                   0
RP/0/RP0/CPU0:NCSMONTERIA#show clock
Tue Oct  7 09:40:10.238 COT
09:40:10.401 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSMONTERIA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3302	3	Carrera 4 # 13-64	64 Mbps	65,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sh run int Te0/0/1/0.688
Tue Oct  7 09:40:45.073 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/1/0.688
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000713
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 186.145.15.209 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 688
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sh policy-map int Te0/0/1/0.688 | inc confo
Tue Oct  7 09:40:51.266 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          11375478394/8278284677603         7046
    Policed(conform)    :          16655957067/15575693197664        65510
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#show clock
Tue Oct  7 09:40:53.086 COLOMBIA
09:40:53.364 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1784	1	Carrera 44 # 38-26, Edificio Antiguo Telecom	300 Mbps	307,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh run int TenGigE0/0/0/6.1595
Tue Oct  7 09:41:17.804 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/6.1595
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000714
 service-policy input CAR-300M
 service-policy output CAR-300M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.237/30
 encapsulation dot1q 1595
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sho policy-map int TenGigE0/0/0/6.1595 | inc confo
Tue Oct  7 09:41:25.075 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          22467673691/16875919077564       20105
    Policed(conform)    :          30489463087/29049377077444       307130
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show clock
Tue Oct  7 09:41:26.684 COLOMBIA
09:41:26.732 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
3343	2	Carrera 3 # 2-40, Edificio Atlantis	64 Mbps	66,8

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh run int Te0/0/2/2.633
Tue Oct  7 09:41:57.309 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/2.633
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000717
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.29 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 633
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sho policy-map int Te0/0/2/2.633 | inc confo
Tue Oct  7 09:42:03.818 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          2803772357/1309549849336        3683
    Policed(conform)    :          3746413534/3065664647130        66817
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#show clock
Tue Oct  7 09:42:05.984 COLOMBIA
09:42:06.271 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1767	1	Carrera 2 # 9 Esquina, Palacio de Justicia	384 Mbps	537,6

```
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#sh run int Te0/4/0/1.1570
Tue Oct  7 09:44:17.231 COT
interface TenGigE0/4/0/1.1570
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000718
 mtu 1522
 service-policy input CAR-384M_IN
 service-policy output RAMA_384M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.5 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1570
!

RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#sh policy-map int Te0/4/0/1.1570 | inc Match
Tue Oct  7 09:44:28.009 COT
    Matched             :        110339994710/76577829918193       65343
    Matched             :        121413584008/115502576916025      537663
    Matched             :                     0/0                  0
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#show clock
Tue Oct  7 09:44:31.559 COT
09:44:31.728 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1774	1	Carrera 29 # 33B-79, Palacio de Justicia	300 Mbps	392

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#sh run int Te0/4/0/1.1609
Tue Oct  7 09:45:02.258 COT
interface TenGigE0/4/0/1.1609
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000719
 service-policy input CAR-300M-IN
 service-policy output CAR-300M-OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.9 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1609
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#sho policy-map int Te0/4/0/1.1609 | inc Match
Tue Oct  7 09:45:12.856 COT
    Matched             :         83696540749/62451088837362       9160
    Matched             :        104449704109/101578214678716      392087
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#show clock
Tue Oct  7 09:45:15.134 COT
09:45:15.365 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2160	2	Carrera 16 No, 22 - 51 Edificio Gentium	80 Mbps	119,9

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#sh run int Gi0/13/0/2.1528
Tue Oct  7 09:57:26.601 COT
interface GigabitEthernet0/13/0/2.1528
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000721
 service-policy input CAR-80M_IN
 service-policy output CAR-80M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.145 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1528
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#sh policy-map int Gi0/13/0/2.1528 | inc Match
Tue Oct  7 09:57:34.827 COT
    Matched             :          2752038383/1578567448249        15521
    Matched             :          3901820366/3966186996792        119989
    Matched             :                    0/0                   0
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#show clock
Tue Oct  7 09:57:36.944 COT
09:57:37.101 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSSINCELEJO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1884	1	Avenida Calle 24 (La Esperanza) # 53-28 Tribunales Salitre	512 Mbps	525,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA2#sh run int Te0/0/2/3.1642
Tue Oct  7 09:58:41.092 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/3.1642
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000724
 mtu 1522
 service-policy input CAR-512M
 service-policy output CAR-512M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.253/30
 encapsulation dot1q 1642
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA2#sho policy-map int Te0/0/2/3.1642 | inc confo
Tue Oct  7 09:58:47.533 COLOMBIA
    Policed(conform)    :         18391146865/13775851948517       10595
    Policed(conform)    :         30013438513/32295116748188       525307
RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA2#show clock
Tue Oct  7 09:58:49.611 COLOMBIA
09:58:49.893 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KARANDA2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1772	1	Carrera 14 Calle 14 Esquina, Palacio de Justicia	300 Mbps	309,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sh run int Gi0/0/0/7.1606
Tue Oct  7 10:04:01.205 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/0/7.1606
 description IPDP RAMA JUDICIAL-DWK0000725
 service-policy input CAR-300M
 service-policy output CAR-300M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.241/30
 encapsulation dot1q 1606
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#sho policy-map int Gi0/0/0/7.1606 | inc confo
Tue Oct  7 10:04:09.171 COLOMBIA
    Policed(conform)    :         44574951847/34333382388567       12111
    Policed(conform)    :         56046925065/50247306224119       309375
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#show clock
Tue Oct  7 10:04:11.590 COLOMBIA
10:04:11.875 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KVALLEDUPAR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1762	1	Carrera 9 # 20-62 Palacio de Justicia	300 Mbps	307,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sh run int Te0/1/0/15.1562
Tue Oct  7 10:04:50.761 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/15.1562
 description IPDP RAMA JUDICAL - DWK0000727
 service-policy input CAR-300M
 service-policy output CAR-300M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.37/30
 encapsulation dot1q 1562
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sh policy-map int Te0/1/0/15.1562 | inc confo
Tue Oct  7 10:04:57.069 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          12057147151/8272438772034         10699
    Policed(conform)     :          18877845198/15541533300024        307123
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#show clock
Tue Oct  7 10:04:58.822 COLOMBIA
10:04:58.903 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1761	1	Calle 40 # 44-80 Edificio Centro Cívico, Palacio de Justicia	400 Mbps	409,2

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh run int Te0/1/0/11.2561
Tue Oct  7 10:08:42.310 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/11.2561
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000729
 service-policy input CAR-400M
 service-policy output CAR-400M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.245/30
 encapsulation dot1q 2561
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh policy-map int Te0/1/0/11.2561 | inc confo
Tue Oct  7 10:08:51.676 COLOMBIA
    Policed(conform)    :         82801460284/58716166457155       69900
    Policed(conform)    :        115592758730/113028081220541      409288
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show clock
Tue Oct  7 10:08:53.999 COLOMBIA
10:08:54.042 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1783	1	Calle 23 # 5-63, Edificio Benavides Macea	128 Mbps	194,6

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSSANTAMARTA#sh run int Te0/4/0/2.1598
Tue Oct  7 10:09:24.095 COT
interface TenGigE0/4/0/2.1598
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000731
 service-policy input CAR-128M_IN
 service-policy output CAR-128M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 186.145.15.205 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1598
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSSANTAMARTA#sho policy-map int Te0/4/0/2.1598 | inc Match
Tue Oct  7 10:09:31.316 COT
    Matched             :          9991010339/5996992676008        17736
    Matched             :         13125501849/13168618721772       194685
    Matched             :                     0/0                  0
RP/0/RP0/CPU0:NCSSANTAMARTA#show clock
Tue Oct  7 10:09:33.552 COT
10:09:33.689 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSSANTAMARTA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1808	1	Carrera 23 # 21-48, Palacio de Justicia Fanny González Franco	384 Mbps	393,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh run int Te0/0/2/2.1640
Tue Oct  7 10:20:07.525 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/2.1640
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000732
 service-policy input CAR-384M
 service-policy output CAR-384M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.13/30
 encapsulation dot1q 1640
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh policy-map int Te0/0/2/2.1640 | inc confo
Tue Oct  7 10:20:15.607 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          30633222284/20223841345711       54864
    Policed(conform)     :          44766529676/44644491069708       393383
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#show clock
Tue Oct  7 10:20:17.856 COLOMBIA
10:20:18.166 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1779	2	Calle 8 # 10-00, Palacio de Justicia	150 Mbps	153,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sh run int Te0/0/2/0.1605
Tue Oct  7 10:20:48.619 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/0.1605
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000733
 mtu 1522
 service-policy input CAR-150M
 service-policy output CAR-150M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.133/30
 encapsulation dot1q 1605
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sh policy-map int  Te0/0/2/0.1605 | inc confo
Tue Oct  7 10:20:56.012 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          46390622304/30126469345876       22778
    Policed(conform)     :          54946354830/46898323066521       153720
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#show clock
Tue Oct  7 10:20:58.021 COLOMBIA
10:20:58.161 COLOMBIA Tue Oct 07 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5199	2	Calle 3 # 5-41, Edificio Jireth	64 Mbps	66,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#sh run int BE91.1531
Tue Oct  7 10:21:29.202 COL
interface Bundle-Ether91.1531
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000734
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.149 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1531
!


RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#sh policy-map int BE91.1531  | inc confo
Tue Oct  7 10:21:37.889 COL
    Policed(conform)     :          1403670249/645529399086         1127
    Policed(conform)     :          1831545119/1685684497978        66735
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#show clock
Tue Oct  7 10:21:40.224 COL
10:21:40.516 COL Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUENAVENTURA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1889	1	Calle 14 # 48-32 El Poblado, Edificio Horacio Montoya Gil	256 Mbps	261,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Hu0/0/0/1.1601
Tue Oct  7 10:28:14.921 COLOMBIA
interface HundredGigE0/0/0/1.1601
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000735
 service-policy input CAR-256M
 service-policy output CAR-256M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.229/30
 encapsulation dot1q 1601
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh policy-map int Hu0/0/0/1.1601 | inc confo
Tue Oct  7 10:28:31.891 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          6434302752/3855484221320        17739
    Policed(conform)    :          9191667662/9951850541775        261988
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Tue Oct  7 10:28:33.939 COLOMBIA
10:28:33.980 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1793	2	Av Los Libertadores # 2A-106, Palacio de Justicia	150 Mbps	157,7

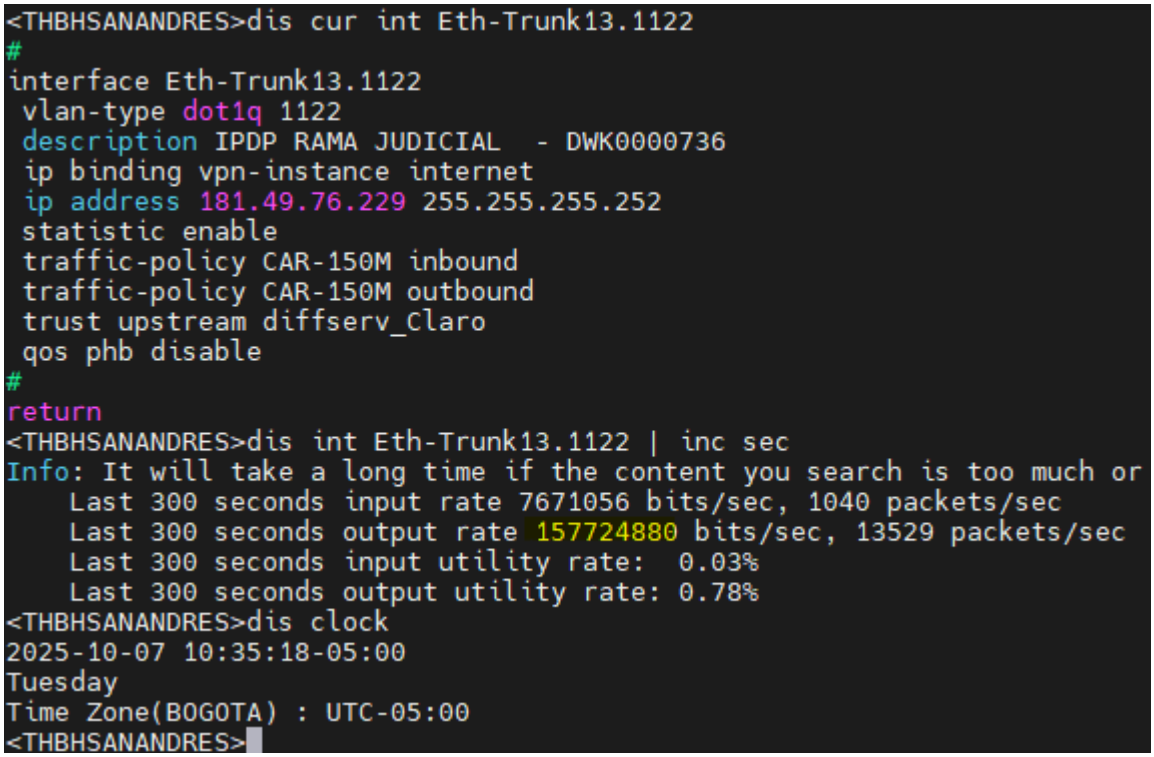

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1786	2	Calle 16 # 6-47, Palacio de Justicia	200 Mbps	200,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sh run int TenGigE0/0/1/0.2595
Tue Oct  7 10:30:22.519 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/1/0.2595
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000737
 service-policy input CAR-200M
 service-policy output CAR-200M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.21 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2595
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sh policy-map int TenGigE0/0/1/0.2595 | inc confo
Tue Oct  7 10:30:24.488 COLOMBIA
    Policed(conform)    :         14942660924/10299097327566       38264
    Policed(conform)    :         19924656138/18917293265244       200142
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#show clock
Tue Oct  7 10:30:26.438 COLOMBIA
10:30:26.725 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1785	1	Calle 7 # 14-32, Palacio de Justicia	224 Mbps	229,2

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh run int Te0/0/0/2.1601
Tue Oct  7 10:36:51.214 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/2.1601
 description RAMA JUDICIAL - DWK0000738
 mtu 1522
 service-policy input CAR-224M
 service-policy output CAR-224M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.165/30
 encapsulation dot1q 1601
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh policy-map int Te0/0/0/2.1601 | inc confo
Tue Oct  7 10:36:59.869 GMT+5
    Policed(conform)    :          1834734508/1031980655430        3334
    Policed(conform)    :          2815697208/2663888896411        229253
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#show clock
Tue Oct  7 10:37:03.909 GMT+5
10:37:04.107 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1787	2	Carrera 11 # 11-20	120 Mbps	123,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sh run int TenGigE0/0/1/0.1597
Tue Oct  7 10:37:33.590 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/1/0.1597
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000739
 service-policy input CAR-120M
 service-policy output CAR-120M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 186.145.68.77 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1597
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sh policy-map int TenGigE0/0/1/0.1597 | inc confo
Tue Oct  7 10:37:40.316 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          9372469358/5638413902496        2604
    Policed(conform)    :         13136628255/12649728668413       123191
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#show clock
Tue Oct  7 10:37:42.619 COLOMBIA
10:37:42.898 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5172	1	Calle 11 # 2-55	64 Mbps	65,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sh run int Te0/0/2/0.1515
Tue Oct  7 10:38:08.180 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/0.1515
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000741
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.153 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1515
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sho policy-map int Te0/0/2/0.1515 | inc confo
Tue Oct  7 10:38:15.062 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          3716698859/2011737247818        4952
    Policed(conform)     :          4199939554/3847295586036        65492
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#show clock
Tue Oct  7 10:38:17.372 COLOMBIA
10:38:17.653 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1769	2	Calle 19 # 23-00, Palacio de Justicia	384 Mbps	393,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#sh run int BE20.1568
Tue Oct  7 10:46:45.639 COLOMBIA
interface Bundle-Ether20.1568
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000743
 service-policy input CAR-384M
 service-policy output CAR-384M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.93 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1568
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#sh policy-map int BE20.1568 | inc confo
Tue Oct  7 10:46:55.713 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          57657853944/41066925600455       55122
    Policed(conform)    :          81392980605/83017379872164       393365
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#show clock
Tue Oct  7 10:47:03.513 COLOMBIA
10:47:03.634 COLOMBIA Tue Oct 07 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5181	2	Carrera 22 # 19-52, Edificio Genova	50 Mbps	52,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#sh run int BE20.1579
Tue Oct  7 10:47:28.126 COLOMBIA
interface Bundle-Ether20.1579
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000744
 mtu 1522
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 186.145.15.229 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1579
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#sh policy-map int BE20.1579 | inc confo
Tue Oct  7 10:47:36.941 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          2118881288/1149491655086        1999
    Policed(conform)    :          2966896629/2776713095301        52393
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#show clock
Tue Oct  7 10:47:39.370 COLOMBIA
10:47:39.490 COLOMBIA Tue Oct 07 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1885	1	Calle 73 # 10 - 83, Centro Comercial Avenidad Ciudad de Chile Torre D	266 Mbps	272,3

```
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#sh run int Hu0/3/0/1.1608
Tue Oct  7 10:48:12.413 COLOMBIA
interface HundredGigE0/3/0/1.1608
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000745
 service-policy input CAR-266M
 service-policy output CAR-266M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.141/30
 encapsulation dot1q 1608
!

RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#sh policy-map int Hu0/3/0/1.1608 | inc confo
Tue Oct  7 10:48:24.858 COLOMBIA
    Policed(conform)    :         28968338373/24088333088075       8409
    Policed(conform)    :         37072314640/35445064068501       272343
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#show clock
Tue Oct  7 10:48:26.879 COLOMBIA
10:48:26.920 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1765	1	Carrera 4 # 6-99, Palacio de Justicia	400 Mbps	409,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sh run int Te0/0/1/0.1567
Tue Oct  7 10:59:08.080 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/1/0.1567
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000746
 service-policy input CAR-400M
 service-policy output CAR-400M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.77 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1567
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#sh policy-map int Te0/0/1/0.1567  | inc confo
Tue Oct  7 10:59:13.583 COLOMBIA
    Policed(conform)     :        111535451021/74997002104766       75571
    Policed(conform)     :        154453940010/144358416294810      409947
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#show clock
Tue Oct  7 10:59:15.924 COLOMBIA
10:59:16.200 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KNEIVACENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5179	2	Calle 19 # 21B-22, Edificio Montana	50 Mbps	63,1

```
<THBHPASTO>dis cur int Eth-Trunk13.2748
#
interface Eth-Trunk13.2748
 vlan-type dot1q 2748
 description IPDP RAMA JUDICIAL TE(OT21574393) - DWK0000748 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance internet
 ip address 186.145.15.233 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-50M inbound
 traffic-policy CAR-50M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHPASTO>dis int Eth-Trunk13.2748 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or the
    Last 60 seconds input rate 32971296 bits/sec, 3876 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 63167136 bits/sec, 6658 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.16%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.31%
<THBHPASTO>dis clock
2025-10-07 10:59:54-05:00
Tuesday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHPASTO>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5201	2	Calle 7 # 19- 71 Piso 2	50 Mbps	51,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sh run int Te0/1/0/15.1572
Tue Oct  7 11:00:38.967 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/15.1572
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000749
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.101/30
 encapsulation dot1q 1572
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#sh policy-map int Te0/1/0/15.1572 | inc confo
Tue Oct  7 11:00:47.853 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          2526018280/1223271590171        761
    Policed(conform)    :          3580210397/3452987646082        51142
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#show clock
Tue Oct  7 11:00:50.107 COLOMBIA
11:00:50.192 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTOBERIN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2153	2	Transversal 16 # 11-85, Palacio de Justicia	65 Mbps	66,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#sh run int Te0/0/0/4.2430
Tue Oct  7 11:01:24.020 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/4.2430
 description IPDP RAMA JUDICIAL  GESTION_PROACTIVA -  DWK0000752
 service-policy input CAR-65M
 service-policy output CAR-65M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.217/30
 encapsulation dot1q 2430
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#sh policy-map int Te0/0/0/4.2430 | inc confo
Tue Oct  7 11:01:31.584 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          11786347663/7479983233023        4123
    Policed(conform)    :          19617684366/19703443182589       66548
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#show clock
Tue Oct  7 11:01:33.376 COLOMBIA
11:01:33.442 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1959	3	Calle 108 # 98-48, Palacio de Justicia Edificio Horacio Montoya	112 Mbps	111,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#sh run int Te0/1/0/1.1538
Tue Oct  7 11:03:39.502 GMT+5
interface TenGigE0/1/0/1.1538
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000756
 service-policy input CAR-112MEGAS
 service-policy output CAR-112MEGAS
 vrf internet-vip
 ipv4 address 186.145.15.217 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1538
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#sh policy-map int Te0/1/0/1.1538 | inc confo
Tue Oct  7 11:03:45.771 GMT+5
    Policed(conform)    :          4283714621/2894995668436        63063
    Policed(conform)    :          6169536207/5957512717806        111928
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#show clock
Tue Oct  7 11:03:47.811 GMT+5
11:03:48.006 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1764	1	Calle 72 # 7-96 (Mezanine)	230 Mbps	235,3

```
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#sh run int Te0/1/0/2.1564
Tue Oct  7 11:21:30.073 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/2.1564
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000757
 service-policy input CAR-230M
 service-policy output CAR-230M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.193/30
 encapsulation dot1q 1564
!

RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#sh policy-map int Te0/1/0/2.1564 | inc confo
Tue Oct  7 11:21:36.637 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          4864556746/3395072709221        9567
    Policed(conform)    :          7354203882/7397847428399        235305
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#show clock
Tue Oct  7 11:21:39.396 COLOMBIA
11:21:39.439 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1886	1	Calle 41 # 7-36 piso 1 de la Torre B	384 Mbps	392,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh run int Te0/0/2/2.2610
Tue Oct  7 11:22:10.805 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/2.2610
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000759
 service-policy input CAR-384M
 service-policy output CAR-384M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.25/30
 encapsulation dot1q 2610
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh policy-map int Te0/0/2/2.2610 | inc confo
Tue Oct  7 11:22:19.516 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          37004216774/30439045379341       99565
    Policed(conform)     :          45062673240/42585158895860       392991
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#show clock
Tue Oct  7 11:22:22.931 COLOMBIA
11:22:23.212 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1883	1	Carrera 8 # 13-82, Edificio Antigua Bolsa de Valores	266 Mbps	272,2

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#sh run int Te0/0/0/9.1641
Tue Oct  7 11:30:09.300 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/9.1641
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000760
 service-policy input CAR-266M
 service-policy output CAR-266M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.185/30
 encapsulation dot1q 1641
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#sh policy-map int Te0/0/0/9.1641 | inc confo
Tue Oct  7 11:30:16.473 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          36626657376/24620446052542       157027
    Policed(conform)     :          55406307589/53511957937640       272289
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#show clock
Tue Oct  7 11:30:18.745 COLOMBIA
11:30:18.810 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1760	1	Carrera 52, Edificio José Félix de Restrepo	400 Mbps	409,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Hu0/0/0/1.1560
Tue Oct  7 11:30:57.424 COLOMBIA
interface HundredGigE0/0/0/1.1560
 description IPDP RAMA JUDICIAL GESTION_PROACTIVA - DWK0000761
 service-policy input CAR-400M
 service-policy output CAR-400M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.73/30
 encapsulation dot1q 1560
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh policy-map int Hu0/0/0/1.1560 | inc confo
Tue Oct  7 11:30:59.316 COLOMBIA
    Policed(conform)    :        161227279508/128167107520782      62265
    Policed(conform)    :        164811212145/129812160029317      409423
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Tue Oct  7 11:31:02.150 COLOMBIA
11:31:02.187 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1890	1	Calle 11 # 9-24, Escuela Judicial (Juzgados de Ejecución de Penas)	384 Mbps	393

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#sh run int Te0/0/0/9.1584
Tue Oct  7 11:49:28.406 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/9.1584
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000762
 service-policy input CAR-384M
 service-policy output CAR-384M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.181/30
 encapsulation dot1q 1584
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#sh policy-map int  Te0/0/0/9.1584 | inc confo
Tue Oct  7 11:49:36.700 COLOMBIA
    Policed(conform)    :         26838006881/19802667222372       12165
    Policed(conform)    :         33553032857/31830342781161       393053
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#show clock
Tue Oct  7 11:49:38.473 COLOMBIA
11:49:38.537 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1958	2	Carrera 47 # 60-50, Palacio de Justicia José Hernando Albeláez	300 Mbps	307

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#sh run int Te0/1/0/1.1591
Tue Oct  7 11:50:08.765 GMT+5
interface TenGigE0/1/0/1.1591
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000763
 service-policy input CAR-300M
 service-policy output CAR-300M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.109 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1591
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#sh policy-map int Te0/1/0/1.1591 | inc confo
Tue Oct  7 11:50:15.501 GMT+5
    Policed(conform)     :          3310195919/2338804773115        800
    Policed(conform)     :          3698662373/3088950416372        307036
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#show clock
Tue Oct  7 11:50:18.182 GMT+5
11:50:18.376 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5148	1	Calle 80 Sur # 60-38	50 Mbps	51

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#sh run int Te0/1/0/1.1502
Tue Oct  7 12:02:02.026 GMT+5
interface TenGigE0/1/0/1.1502
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000764
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.61 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1502
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#sh policy-map int Te0/1/0/1.1502 | inc confo
Tue Oct  7 12:02:10.955 GMT+5
    Policed(conform)    :          2072872538/1279174493601        2380
    Policed(conform)    :          2541151875/2201236928314        51073
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#show clock
Tue Oct  7 12:02:12.729 GMT+5
12:02:12.923 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KMEGACENTER2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1781	1	Carrera 9 # 11-45, Edificio Kaysser 3 (El Virrey Torre Central)	256 Mbps	255,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO#sh run int Te0/0/0/0.1604
Tue Oct  7 12:04:41.013 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/0.1604
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000765
 service-policy input CAR-256M
 service-policy output CAR-256M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.201/30
 encapsulation dot1q 1604
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO#sh policy-map int  Te0/0/0/0.1604 | inc confo
Tue Oct  7 12:04:44.285 COLOMBIA
    Policed(conform)    :         65945851634/49218126730782       21065
    Policed(conform)    :         78587427523/70566873529288       255904
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO#show clock
Tue Oct  7 12:04:47.183 COLOMBIA
12:04:47.229 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1881	1	Carrera 29 # 18-45, Complejo Judicial de Paloquemao	600 Mbps	614,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#sh run int Te0/0/0/2.1565
Tue Oct  7 12:07:34.055 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/2.1565
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000766
 service-policy input CAR-600M
 service-policy output CAR-600M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.89/30
 encapsulation dot1q 1565
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#sh policy-map int Te0/0/0/2.1565 | inc confo
Tue Oct  7 12:07:35.360 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          31567151440/23002156885247        102319
    Policed(conform)     :          42396090757/34964063395773        614121
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#show clock
Tue Oct  7 12:07:39.531 COLOMBIA
12:07:39.598 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1770	1	Calle 42 # 48-55, Edificio Atlas	300 Mbps	307,1


```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Hu0/0/0/1.1639
Tue Oct  7 12:12:19.964 COLOMBIA
interface HundredGigE0/0/0/1.1639
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000767
 service-policy input CAR-300M
 service-policy output CAR-300M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.209/30
 encapsulation dot1q 1639
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh policy-map int Hu0/0/0/1.1639 | inc confo
Tue Oct  7 12:12:26.352 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          13159057987/9091496193500         117179
    Policed(conform)     :          16967314618/15012222383463        307166
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Tue Oct  7 12:12:29.190 COLOMBIA
12:12:29.230 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5186	1	Calle 22 # 16-54, Edificio Cervantes	50 Mbps	50,1

```
<THBHARMENIA2>dis cur int Eth-Trunk60.20411581
#
interface Eth-Trunk60.20411581
 mtu 9000
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000768
 ip binding vpn-instance internet
 ip address 181.51.199.169 255.255.255.252
 statistic enable
 encapsulation qinq-termination rt-protocol
 vlan-group 1
  group mode multiple
 qinq termination pe-vid 2041 ce-vid 1581 vlan-group 1
 arp broadcast enable
 traffic-policy CAR-50M inbound
 traffic-policy CAR-50M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
#
return
<THBHARMENIA2>dis int Eth-Trunk60.20411581 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 2760040 bits/sec, 409 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 50194456 bits/sec, 4323 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.02%
<THBHARMENIA2>dis clock
2025-10-07 12:15:53-05:00
Tuesday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHARMENIA2>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5189	1	Carrera 11 # 34-52 CAM Fase II Piso 5	64 Mbps	66,6

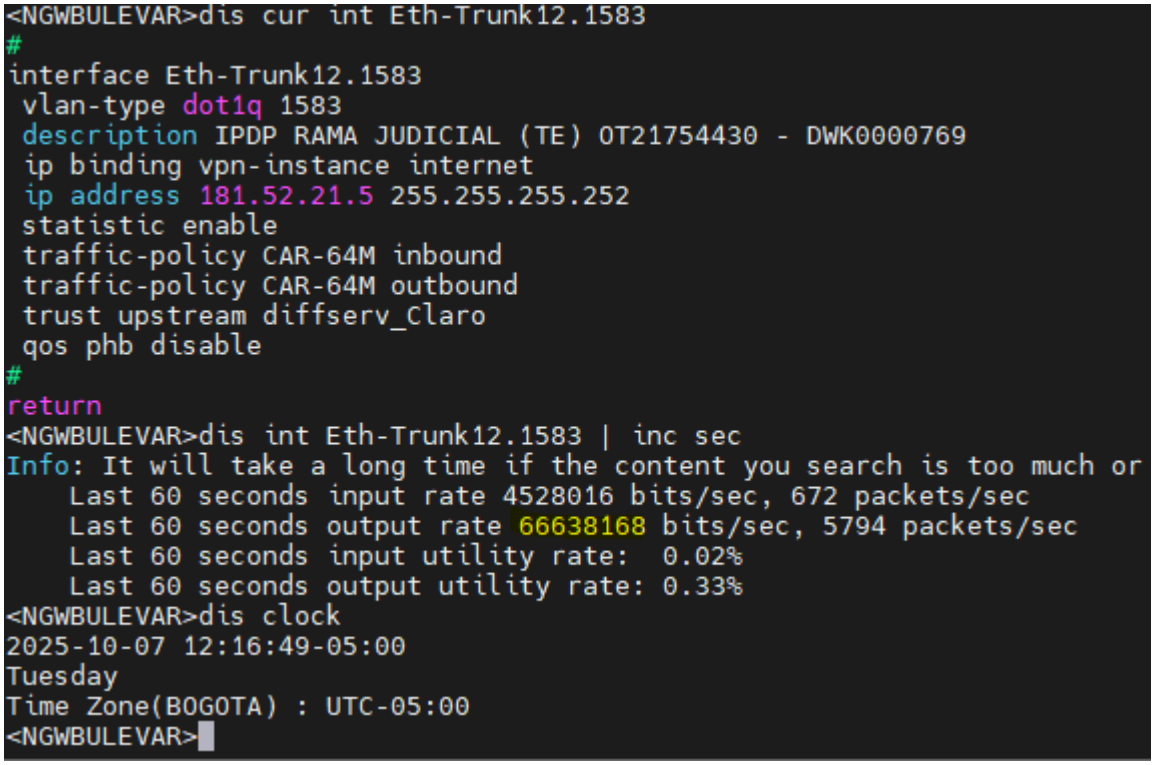

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1790	1	Carrera 12 # 31-08, Edificio el Frente (Nuevo)	64 Mbps	65,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#sh run int Te0/0/0/1.3589
Tue Oct  7 12:17:23.160 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.3589
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000770
 service-policy input CAR-64M
 service-policy output CAR-64M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.17 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 3589
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#sh policy-map int Te0/0/0/1.3589 | inc confo
Tue Oct  7 12:17:32.370 GMT+5
    Policed(conform)    :          9557001180/5700825683817        2686
    Policed(conform)    :         11630497638/9541321610760        65524
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#show clock
Tue Oct  7 12:17:34.494 GMT+5
12:17:34.647 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5192	1	Carrera 6 # 9-82, Edificio de Transito y Consejo Municipal	50 Mbps	51,1

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#sh run int TenGigE0/0/0/1.1527
Tue Oct  7 12:18:05.694 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.1527
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000771
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 186.145.15.221 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1527
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#sh policy-map int TenGigE0/0/0/1.1527 | inc confo
Tue Oct  7 12:18:13.625 GMT+5
    Policed(conform)    :          1932830179/1095977165478        9
    Policed(conform)    :          2900010347/2443901751541        51132
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#show clock
Tue Oct  7 12:18:16.442 GMT+5
12:18:16.594 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KRICAURTE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5190	1	Carrera 10 # 04-48/ 4-54	50 Mbps	51,2

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#sh run int Te0/0/0/2.1526
Tue Oct  7 12:18:45.129 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/2.1526
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000773
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 186.145.15.225/30
 encapsulation dot1q 1526
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#sh policy-map int Te0/0/0/2.1526  | inc confo
Tue Oct  7 12:18:52.395 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          5522270335/3480319489749        7377
    Policed(conform)     :          6553048834/5839382787446        51244
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#show clock
Tue Oct  7 12:18:54.379 COLOMBIA
12:18:54.689 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1795	3	Calle 7 # 15-58	250 Mbps	255,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh run int Te0/1/0/0.1585
Tue Oct  7 12:21:56.595 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/0.1585
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000775
 mtu 1522
 service-policy input CAR-250M
 service-policy output CAR-250M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.1/30
 encapsulation dot1q 1585
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh policy-map int Te0/1/0/0.1585 | inc confo
Tue Oct  7 12:21:58.779 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          18044788628/14419233763504       18383
    Policed(conform)     :          25770057145/26218717025858       255940
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show clock
Tue Oct  7 12:22:01.867 COLOMBIA
12:22:01.911 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1788	1	Carrera 5 # 22-25 Piso 5 oficina 506, Edificio Vives	150 Mbps	153,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh run int  Te0/1/0/11.1591
Tue Oct  7 12:22:25.755 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/11.1591
 description description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000777
 service-policy input CAR-150M
 service-policy output CAR-150M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.161/30
 encapsulation dot1q 1591
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh policy-map int  Te0/1/0/11.1591  | inc confo
Tue Oct  7 12:22:34.011 COLOMBIA
    Policed(conform)    :         15371594715/11191422606116       946
    Policed(conform)    :         21092368793/21246963608636       153595
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show clock
Tue Oct  7 12:22:35.915 COLOMBIA
12:22:35.958 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1796	3	Calle 8 # 12-89, Edificio Caracoli	150 Mbps	153,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh run int Te0/0/0/6.2586
Tue Oct  7 12:23:11.514 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/6.2586
 description RAMA JUDICIAL - DWK0000779
 service-policy input CAR-150M
 service-policy output CAR-150M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.105/30
 encapsulation dot1q 2586
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#sh policy-map int Te0/0/0/6.2586 | inc confo
Tue Oct  7 12:23:17.395 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          5178028102/3583574918446        1834
    Policed(conform)    :          7091472882/6757609394974        153577
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#show clock
Tue Oct  7 12:23:19.107 COLOMBIA
12:23:19.153 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBOSTON#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1768	1	Carrera 10 # 12-15, Palacio de Justicia	750 Mbps	768

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#sh run int Gi0/0/1/8.3113
Tue Oct  7 12:26:59.520 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/8.3113
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000781
 service-policy input CAR-750M
 service-policy output CAR-750M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 186.145.68.129 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 3113
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#sh policy-map int Gi0/0/1/8.3113 | inc confo
Tue Oct  7 12:27:01.328 COLOMBIA
    Policed(conform)     :        100271677863/79681250075142       8331
    Policed(conform)     :        116253049734/99217842270256       768037
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#show clock
Tue Oct  7 12:27:04.484 COLOMBIA
12:27:04.775 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
1791	1	Calle 8 # 1-16, Edificio Entreceibas	250 Mbps	266,8

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh run int Te0/0/0/2.1590
Tue Oct  7 12:32:37.761 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/2.1590
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000782
 service-policy input CAR-250M
 service-policy output CAR-250M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.113/30
 encapsulation dot1q 1590
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh policy-map int Te0/0/0/2.1590 | inc confo
Tue Oct  7 12:32:46.611 GMT+5
    Policed(conform)     :          39507252170/23680125149319        17716
    Policed(conform)     :          47340688026/42716088311418        266835
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#show clock
Tue Oct  7 12:32:48.954 GMT+5
12:32:49.151 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2060	1	Carrera 4 # 12 -02, Palacio Nacional	256 Mbps	262,4

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh run int Te0/0/0/2.1599
Tue Oct  7 12:33:14.985 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/2.1599
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000783
 service-policy input CAR-256M
 service-policy output CAR-256M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.157/30
 encapsulation dot1q 1599
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh policy-map int Te0/0/0/2.1599 | inc confo
Tue Oct  7 12:33:21.615 GMT+5
    Policed(conform)    :         49618940701/33335845123386       2460
    Policed(conform)    :         67629324616/66766309015540       262480
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#show clock
Tue Oct  7 12:33:23.883 GMT+5
12:33:24.081 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5162	2	Calle 3 # 8-33, Palacio de Justicia	50 Mbps	51,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh run int Gi0/0/1/7.1534
Tue Oct  7 12:34:08.658 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/7.1534
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000784
 service-policy input CAR-50M
 service-policy output CAR-50M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.51.199.145 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1534
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#sh policy-map int Gi0/0/1/7.1534 | inc confo
Tue Oct  7 12:34:11.474 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          12451934470/8883494601583         3040
    Policed(conform)     :          14327897661/13342065539943        51328
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#show clock
Tue Oct  7 12:34:15.729 COLOMBIA
12:34:16.020 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCALICENTRO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
4506	1	Calle 12 # 7-65, Palacio de Justicia	2000 Mbps	2048

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#sh policy-map int Te0/0/0/9.787 | inc confo
Mon Oct 20 18:05:14.983 COLOMBIA
    Policed(conform)     :          45893688705/35749295420091        73445
    Policed(conform)     :          54420635720/59938059392941        2048524
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#show clock
Mon Oct 20 18:05:17.131 COLOMBIA
18:05:17.196 COLOMBIA Mon Oct 20 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#sh run int Te0/0/0/9.787
Mon Oct 20 18:05:19.661 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/9.787
 description IPDP RAMA JUDICIAL PPAL - DWK0000787(DWK0001615)
 service-policy input CAR-2G
 service-policy output CAR-2G
 vrf internet-vip
 ipv4 address 10.166.235.65/30
 encapsulation dot1q 787
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KCENTRO2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5143	1	Calle 132 Sur # 50-47	100 Mbps	100,4

```
<NGWESPACIOSUR>dis cur int Eth-Trunk14.2788
#
interface Eth-Trunk14.2788
 vlan-type dot1q 2788
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000788 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance internet
 ip address 186.145.68.253 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-100M inbound
 traffic-policy CAR-100M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<NGWESPACIOSUR>dis int Eth-Trunk14.2788 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 4616888 bits/sec, 622 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 100428832 bits/sec, 8647 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.02%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.50%
<NGWESPACIOSUR>dis clock
2025-10-07 12:43:51-05:00
Tuesday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<NGWESPACIOSUR>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5144	3	Calle 20 # 10-160	100 Mbps	104,8

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int Hu0/0/0/1.1158
Tue Oct  7 12:44:20.817 COLOMBIA
interface HundredGigE0/0/0/1.1158
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000789
 service-policy input CAR-100M
 service-policy output CAR-100M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.33/30
 encapsulation dot1q 1158
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh policy-map int Hu0/0/0/1.1158 | inc confo
Tue Oct  7 12:44:30.296 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          2497288027/1441197926842        80
    Policed(conform)    :          3146399088/2867229537085        104869
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Tue Oct  7 12:44:32.716 COLOMBIA
12:44:32.757 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5147	2	Carrera 22 # 19-46	100 Mbps	107

```
<THBHRIONEGRO>dis cur int Eth-Trunk13.578
#
interface Eth-Trunk13.578
 vlan-type dot1q 578
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000790
 ip binding vpn-instance internet
 ip address 181.52.21.37 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-100M inbound
 traffic-policy CAR-100M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHRIONEGRO>dis int Eth-Trunk13.578 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much o
    Last 60 seconds input rate 3187152 bits/sec, 397 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 107007672 bits/sec, 9131 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.53%
<THBHRIONEGRO>dis clock
2025-10-07 12:45:22-05:00
Tuesday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHRIONEGRO>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5151	1	Carrera 45 # 68Sur-61	100 Mbps	104,7

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh run int BE92.2030
Tue Oct  7 12:45:58.846 COLOMBIA
interface Bundle-Ether92.2030
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000792
 service-policy input CAR-100M
 service-policy output CAR-100M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.41/30
 encapsulation dot1q 2030
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#sh policy-map int BE92.2030 | inc confo
Tue Oct  7 12:46:05.128 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          3104521061/2189440401794        9
    Policed(conform)    :          4609240749/4419387381299        104794
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#show clock
Tue Oct  7 12:46:06.923 COLOMBIA
12:46:06.965 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KESPACIOSUR#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5152	3	Calle 20 # 20-05	100 Mbps	100,4

```
<THBHMEDELLINCCM>dis cur int Eth-Trunk16.2793
#
interface Eth-Trunk16.2793
 vlan-type dot1q 2793
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000793 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance internet
 ip address 181.52.21.45 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-100M inbound
 traffic-policy CAR-100M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHMEDELLINCCM>dis int  Eth-Trunk16.2793 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 4870096 bits/sec, 648 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 100459352 bits/sec, 8591 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.02%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.50%
<THBHMEDELLINCCM>dis clock
2025-10-07 12:48:30-05:00
Tuesday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHMEDELLINCCM>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5153	1	Carrera 10B # 32 C-14 Plazoleta Telecom, Edificio Almirante	100 Mbps	102,2

```
RP/0/RSP1/CPU0:A9KBOSQUE#sh run int Te0/0/0/0/2.2354
Tue Oct  7 12:49:05.724 COT
interface TenGigE0/0/0/0/2.2354
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000794
 service-policy input CAR-100M
 service-policy output CAR-100M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.49 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2354
!

RP/0/RSP1/CPU0:A9KBOSQUE#sh policy-map int Te0/0/0/0/2.2354 | inc confo
Tue Oct  7 12:49:13.500 COT
    Policed(conform)    :          8065388709/4845180114033        12
    Policed(conform)    :         10436706082/9707110559375        102291
RP/0/RSP1/CPU0:A9KBOSQUE#sh clock
Tue Oct  7 12:49:17.171 COT
12:49:17.344 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP1/CPU0:A9KBOSQUE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5157	1	Calle 19 # 8-11	100 Mbps	102,6

```
<THBHTUNJA>dis cur int Eth-Trunk37.2795
#
interface Eth-Trunk37.2795
 vlan-type dot1q 2795
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000795 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance internet
 ip address 181.52.21.53 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-100M inbound
 traffic-policy CAR-100M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHTUNJA>dis int Eth-Trunk37.2795 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 17498168 bits/sec, 2429 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 102621376 bits/sec, 9712 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.08%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.51%
<THBHTUNJA>dis clock
2025-10-07 15:43:34-05:00
Tuesday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHTUNJA>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2147	2	Carrera 4 # 2-30, Edificio Canencio	200 Mbps	204,8

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sh run int Te0/0/2/0.2796
Tue Oct  7 15:44:18.151 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/0.2796
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000796
 service-policy input CAR-200M
 service-policy output CAR-200M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.57/30
 encapsulation dot1q 2796
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sh policy-map int Te0/0/2/0.2796 | inc confo
Tue Oct  7 15:44:25.065 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          13265514313/8137125334050        5208
    Policed(conform)    :          18738336673/18450877629602       204826
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#show clock
Tue Oct  7 15:44:28.053 COLOMBIA
15:44:28.190 COLOMBIA Tue Oct 07 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5175	1	Carrera 2 A 19-30 parque de los novios Edificio Anita Diaz de Padilla	130 Mbps	138,2

```
<THBHSANTAMARTA>dis cur int Eth-Trunk12.3050
#
interface Eth-Trunk12.3050
 vlan-type dot1q 3050
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000798 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance internet
 ip address 181.52.21.61 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-130M inbound
 traffic-policy CAR-130M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHSANTAMARTA>dis int Eth-Trunk12.3050 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 4473832 bits/sec, 657 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 138235112 bits/sec, 11917 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.02%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.69%
<THBHSANTAMARTA>dis clock
2025-10-07 15:46:50-05:00
Tuesday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHSANTAMARTA>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5176	2	Carrera 20 # 13-42, Palacio de Justicia	150 Mbps	199,2

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#sh run int Gi0/13/0/6.1521
Tue Oct  7 15:47:46.205 COT
interface GigabitEthernet0/13/0/6.1521
 description RAMA JUDICIAL   DWK0000799
 service-policy input CAR-150M_IN
 service-policy output CAR-150M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.149 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1521
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#sh policy-map int Gi0/13/0/6.1521 | inc Match
Tue Oct  7 15:47:50.256 COT
    Matched             :         26106568891/22855816754648       16969
    Matched             :         29207421475/28857501157534       199209
    Matched             :                    0/0                   0
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#show clock
Tue Oct  7 15:47:53.254 COT
15:47:53.661 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5180	2	Calle 19 # 22-16, Edificio Ril	100 Mbps	102,3

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTOH#sh run int Te0/1/0/1.1005
Tue Oct  7 15:50:51.870 GMT+5
interface TenGigE0/1/0/1.1005
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000801
 service-policy input CAR-100M
 service-policy output CAR-100M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.73 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1005
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTOH#sh policy-map int Te0/1/0/1.1005 | inc confo
Tue Oct  7 15:50:58.341 GMT+5
    Policed(conform)    :          4275514329/2334682177617        13956
    Policed(conform)    :          5760420966/5624168423733        102398
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTOH#show clock
Tue Oct  7 15:51:00.983 GMT+5
15:51:01.134 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPASTOH#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5184	2	Calle 36 # 0-28	128 Mbps	148,7

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sh run int Te0/11/0/1.1909
Tue Oct  7 15:51:37.183 COT
interface TenGigE0/11/0/1.1909
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000803
 service-policy input CAR-128M_IN
 service-policy output CAR-128M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.133 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1909
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sh policy-map int Te0/11/0/1.1909 | inc Match
Tue Oct  7 15:51:48.967 COT
    Matched             :          2597786207/1604341021237        7793
    Matched             :          3830400384/3959125197336        148758
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#show clock
Tue Oct  7 15:51:51.423 COT
15:51:51.594 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5188	1	Calle 13 # 16B-14, Alcaldía Municipal	128 Mbps	142,6

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh run int Gi0/0/1/3.2009
Tue Oct  7 15:52:56.727 COLOMBIA
interface GigabitEthernet0/0/1/3.2009
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000804
 service-policy input CAR-128M
 service-policy output CAR-128M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.81/30
 encapsulation dot1q 2009
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#sh policy-map int Gi0/0/1/3.2009  | inc confo
Tue Oct  7 15:52:58.629 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          1296828158/821068844907         4786
    Policed(conform)    :          1823923957/1863882200626        142676
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#show clock
Tue Oct  7 15:53:00.702 COLOMBIA
15:53:01.000 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KDOSQUEBRADAS#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5198	1	Carrera 5 # 39 A-77	128 Mbps	168,5

```
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#sh run int Gi0/2/0/2.3231
Tue Oct  7 15:53:48.447 COT
interface GigabitEthernet0/2/0/2.3231
 description IPDP RAMA JUDICIAL  -  DWK0000805
 service-policy input CAR-128M_IN
 service-policy output CAR-128M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.85 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 3231
!

RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#sh policy-map int Gi0/2/0/2.3231 | inc Match
Tue Oct  7 15:53:57.020 COT
    Matched             :          2269074816/1181526657585        5255
    Matched             :          3266233011/3122832047576        168563
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#show clock
Tue Oct  7 15:53:59.348 COT
15:53:59.493 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP1/CPU0:NCSIBAGUE#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2163	1	Calle 7 # 13-56, Edificio Condado Plaza	256 Mbps	271,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sh run int Hu0/2/0/1.70995
Mon Oct 27 10:43:08.402 COLOMBIA
interface HundredGigE0/2/0/1.70995
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000806
 service-policy input CAR-256M
 service-policy output CAR-256M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.89/30
 encapsulation dot1q 70 second-dot1q 995
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#sho policy-map int Hu0/2/0/1.70995 | inc confo
Mon Oct 27 10:43:10.027 COLOMBIA
    Policed(conform)    :            35336482/25987032939          305
    Policed(conform)    :            58156829/64145500583          271994
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#show clock
Mon Oct 27 10:43:12.288 COLOMBIA
10:43:12.336 COLOMBIA Mon Oct 27 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KTRIARA2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5200	1	CRA 15 No, 3AN - 10 Oficinas 809 y 810	100 Mbps	102,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#sh run int Te0/0/0/2.2525
Tue Oct  7 15:54:30.286 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/0/2.2525
 description IPDP RAMA JUDICIAL  - DWK0000807
 service-policy input CAR-100M
 service-policy output CAR-100M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.93/30
 encapsulation dot1q 2525
!


RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#sh policy-map int Te0/0/0/2.2525  | inc confo
Tue Oct  7 15:54:36.905 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          3953463917/2540064623818        4209
    Policed(conform)    :          5222351082/4748406033783        102515
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#show clock
Tue Oct  7 15:54:38.887 COLOMBIA
15:54:39.179 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KBUCARAMANGA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5202	1	Calle 8 # 14 - 47 - Sede Tribunales	512 Mbps	523,5

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh run int Te0/0/0/1.7002732
Tue Oct  7 15:59:31.426 GMT+5
interface TenGigE0/0/0/1.7002732
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000808,+TSO3056
 service-policy input CAR-512M
 service-policy output CAR-512M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.97/30
 encapsulation dot1q 700 second-dot1q 2732
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#sh policy-map int Te0/0/0/1.7002732 | inc confo
Tue Oct  7 15:59:37.823 GMT+5
    Policed(conform)    :          9364633378/6254446595011        3421
    Policed(conform)    :         14939398307/15654661123592       523575
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#show clock
Tue Oct  7 15:59:39.631 GMT+5
15:59:39.829 GMT+5 Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KHOLGUINES2#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5204	1	Calle 34 Nro 36-43	128 Mbps	130,2

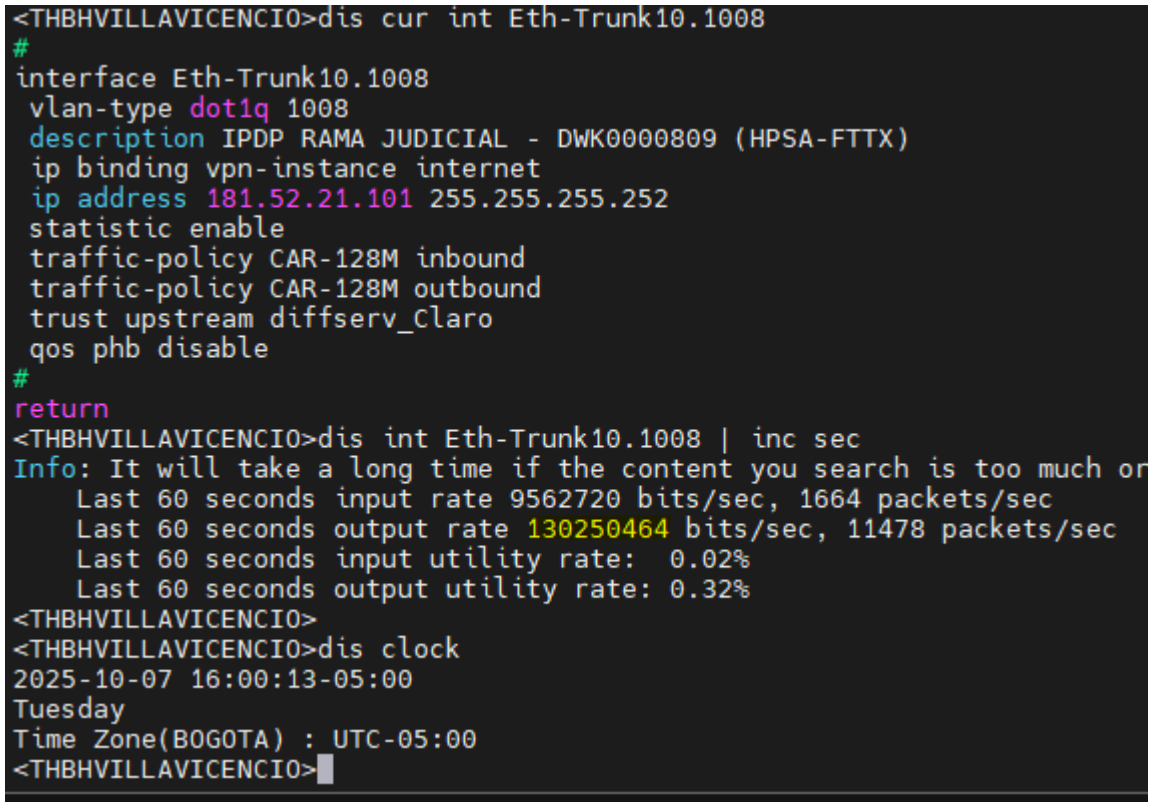

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5205	2	Calle 26 carrera 27 esquina	256 Mbps	364,5


```
<THBHTULUA>dis cur int Eth-Trunk10.2810
#
interface Eth-Trunk10.2810
 vlan-type dot1q 2810
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000810 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance internet
 ip address 181.52.21.105 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-256M inbound
 traffic-policy CAR-256M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHTULUA>dis int Eth-Trunk10.2810 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 22066424 bits/sec, 3628 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 364574168 bits/sec, 32202 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.11%
    Last 60 seconds output utility rate: 1.82%
<THBHTULUA>dis clock
2025-10-07 16:06:43-05:00
Tuesday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHTULUA>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5206	1	Carrera 1 # 1e 27	150 Mbps	206,9

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh run int Hu0/7/0/0.2811
Tue Oct  7 16:07:29.822 COT
interface HundredGigE0/7/0/0.2811
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000811
 mtu 1522
 service-policy input CAR-150M-IN
 service-policy output CAR-150M-OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.109 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2811
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#sh policy-map int Hu0/7/0/0.2811 | inc Match
Tue Oct  7 16:07:34.184 COT
    Matched             :         13707918322/8995901429238        15629
    Matched             :         19355119781/19839265256879       206909
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#show clock
Tue Oct  7 16:07:37.031 COT
16:07:37.181 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSORTEZAL#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5207	1	Carrera 1a N° 46-08 Manzana 1 Urbanización Manolete (Centro Médico y de Negocios Norte)	128 Mbps	139,6

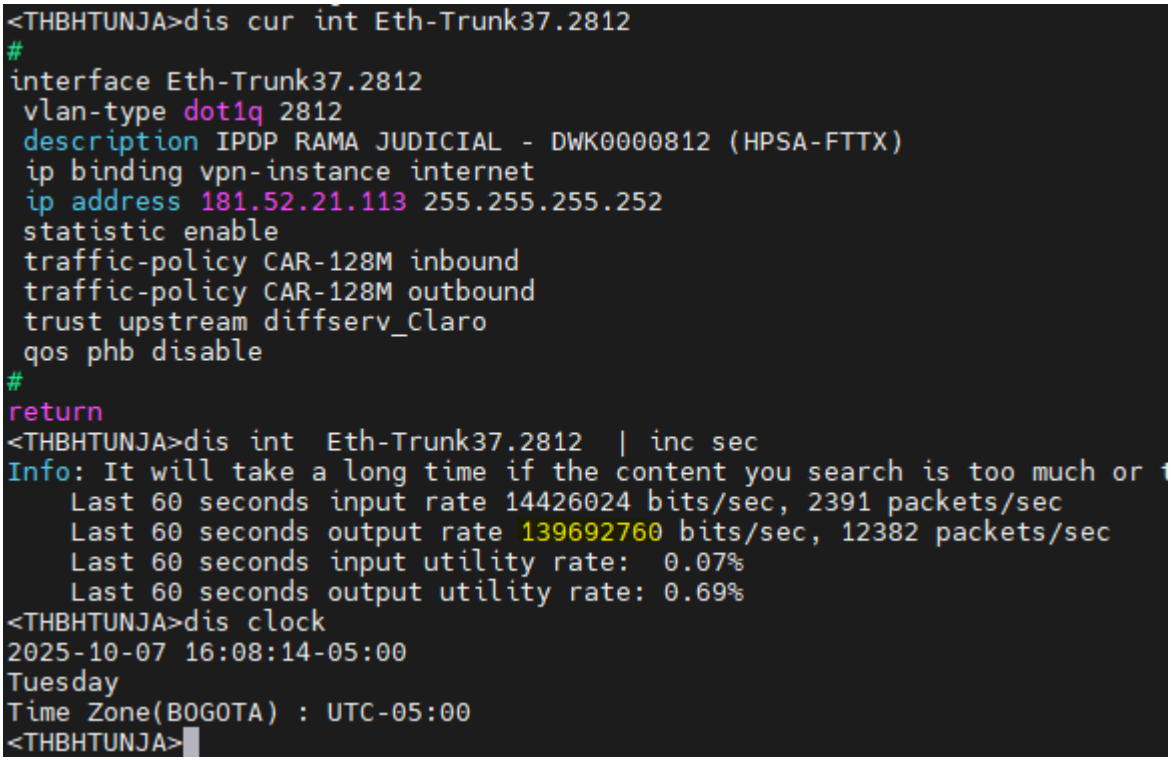

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5212	2	Calle 2da con carrera 8va parque “José Hilario López” Balcones del Molino - Barrio Centro	128 Mbps	130,9

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sh run int Te0/0/2/0.2813
Tue Oct  7 16:08:50.586 COLOMBIA
interface TenGigE0/0/2/0.2813
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000813
 service-policy input CAR-128M
 service-policy output CAR-128M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.117/30
 encapsulation dot1q 2813
!

RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#sh policy-map int Te0/0/2/0.2813 | inc confo
Tue Oct  7 16:09:03.505 COLOMBIA
    Policed(conform)    :          3507654668/2150303684662        13352
    Policed(conform)    :          5101913066/5195052654988        130995
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#show clock
Tue Oct  7 16:09:07.256 COLOMBIA
16:09:07.394 COLOMBIA Tue Oct 07 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KPOPAYAN#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5208	1	Calle 5 # 22-75 Dirección Seccional	100 Mbps	117,7

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#sh run int BE91.2814
Tue Oct  7 16:13:38.979 COT
interface Bundle-Ether91.2814
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000814
 service-policy input CAR-100M_IN
 service-policy output CAR-100M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.121 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2814
!


RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#sh policy-map int BE91.2814  | inc Match
Tue Oct  7 16:13:41.469 COT
    Matched             :          8099686783/4587346918747        5934
    Matched             :         11110841082/11709828735430       117709
    Matched             :                    0/0                   0
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#sh clock
Tue Oct  7 16:13:46.353 COT
16:13:46.526 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSVILLAVICENCIO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5209	1	Av, Carrera 7 # 73-55 piso 9 Ultraserfinco	100 Mbps	102,3

```
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#sh run int Te0/1/0/1.1815
Tue Oct  7 16:14:17.243 COLOMBIA
interface TenGigE0/1/0/1.1815
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000815
 service-policy input CAR-100M
 service-policy output CAR-100M
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.125/30
 encapsulation dot1q 1815
!

RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#sh policy-map int Te0/1/0/1.1815 | inc confo
Tue Oct  7 16:14:23.942 COLOMBIA
    Policed(conform)    :           293649646/145665034220         3535
    Policed(conform)    :           596783266/711069719410         102321
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#show clock
Tue Oct  7 16:14:25.773 COLOMBIA
16:14:25.817 COLOMBIA Tue Oct 7 2025
RP/0/RSP1/CPU0:A9KCFINANCIERO#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5210	1	Calle 43 No 14-43 piso 5, Edificio River Park, barrio Versalles	200 Mbps	200,6

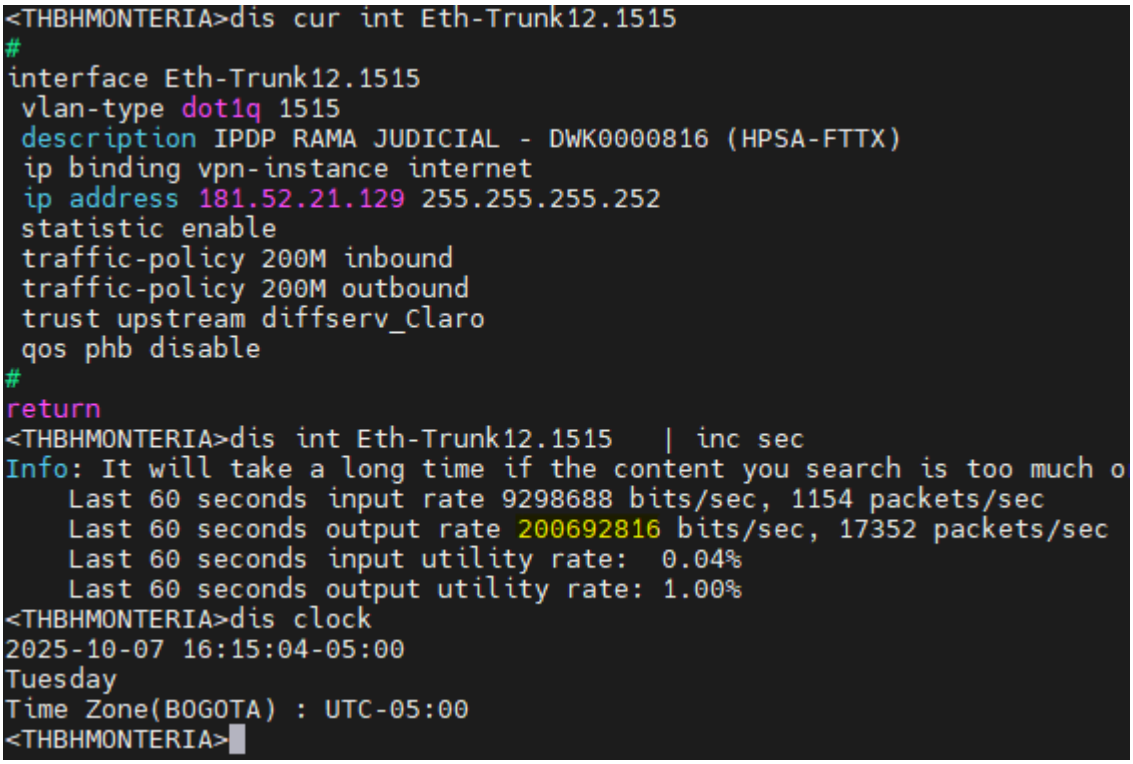


PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
2063-B	1	Diagonal 31C # 3-67 Este, Casa de Justicia de San Cristobal	50 Mbps	69,3

```
<THBHRESTREPO>dis cur int Eth-Trunk13.2848
#
interface Eth-Trunk13.2848
 vlan-type dot1q 2848
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0000848 (HPSA-FTTX)
 ip binding vpn-instance internet
 ip address 181.55.79.209 255.255.255.252
 statistic enable
 traffic-policy CAR-52M inbound
 traffic-policy CAR-52M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<THBHRESTREPO>dis int Eth-Trunk13.2848 | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 2612080 bits/sec, 334 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 69331440 bits/sec, 5947 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.34%
<THBHRESTREPO>dis clock
2025-10-07 16:15:46-05:00
Tuesday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<THBHRESTREPO>
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
4506-B	1	Sede Palacio de Justicia CALLE 12 # 7-65	2000 Mbps	2092

```
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#sh policy-map int Te0/1/0/2.1615 | inc confo
Fri Oct 10 15:26:00.483 GMT+5
    Policed(conform)     :             4434813/3594559799           159
    Policed(conform)     :           235332614/354472326786         2092463
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#show clock
Fri Oct 10 15:26:21.458 GMT+5
15:26:21.632 GMT+5 Fri Oct 10 2025
RP/0/RSP0/CPU0:A9KORTEZAL2#sh run int Te0/1/0/2.1615
Fri Oct 10 15:26:36.899 GMT+5
interface TenGigE0/1/0/2.1615
 description IPDP RAMA JUDICIAL BACKUP DWK0000787 - DWK0001615
 service-policy input CAR-2G
 service-policy output CAR-2G
 vrf internet-vip
 ipv4 address 10.166.235.121 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 1615
!
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5178	1	Carrera 36 no, 33 b - 51	64 Mbps	67,9

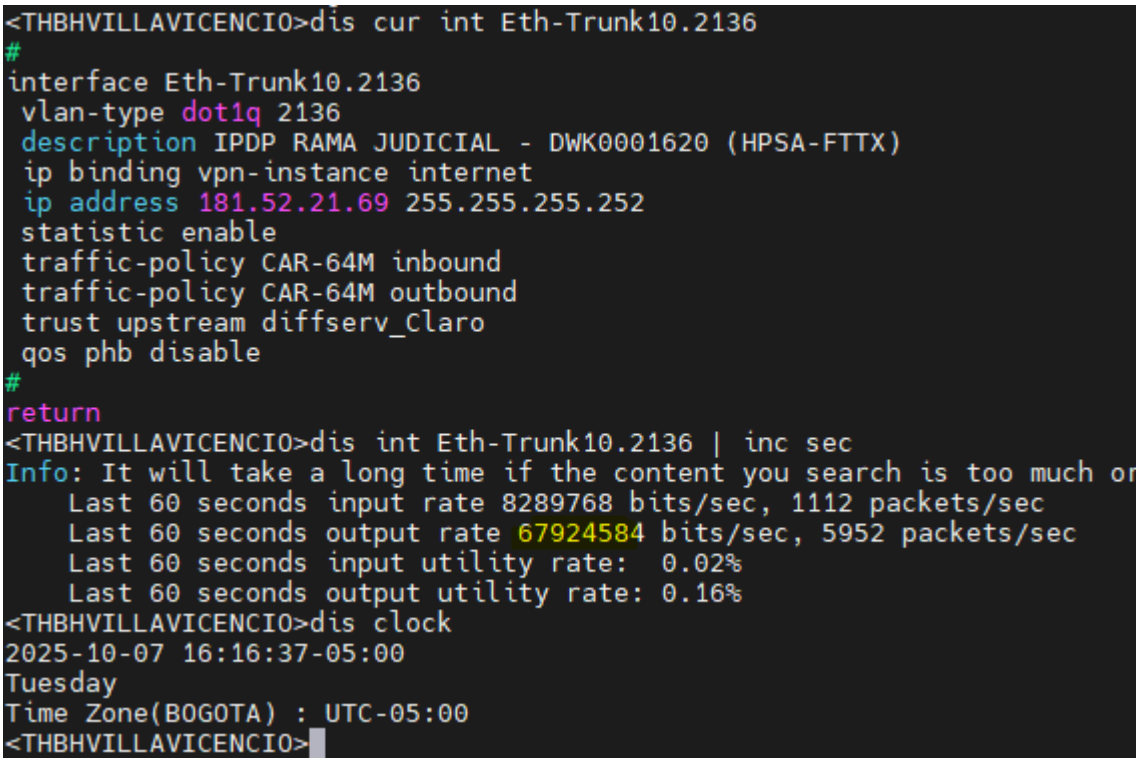

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5183	2	avenida 4 este # 7-100, edificio temis - barrio popular	50 Mbps	72,7

```
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sh run int Te0/4/0/2.2840
Tue Oct  7 16:17:34.700 COT
interface TenGigE0/4/0/2.2840
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001627
 service-policy input CAR-50M_IN
 service-policy output CAR-50M_OUT
 vrf internet-vip
 ipv4 address 181.52.21.77 255.255.255.252
 encapsulation dot1q 2840
!

RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#sh policy-map int Te0/4/0/2.2840 | inc Match
Tue Oct  7 16:17:43.930 COT
    Matched             :          1605001071/1030796322550        8743
    Matched             :          2279484921/2307430052855        72756
    Matched             :                   0/0                    0
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#show clock
Tue Oct  7 16:17:48.033 COT
16:17:48.307 COT Tue Oct 7 2025
RP/0/RP0/CPU0:NCSCUCUTA#
```

PIVOT	ZONA	DIRECCION	BW Contratado	Resultado BW
5149	1	Carrera 41 No 38 Sur - 43 Piso 4, Edificio Emporio	50 Mbps	52,5

```
<NGWESPACIOSUR>dis cur int Eth-Trunk61.21541693
#
interface Eth-Trunk61.21541693
 description IPDP RAMA JUDICIAL - DWK0001696
 ip binding vpn-instance internet
 ip address 181.55.78.9 255.255.255.252
 statistic enable
 encapsulation qinq-termination rt-protocol
 vlan-group 1
  group mode multiple
 qinq termination pe-vid 2154 ce-vid 1693 vlan-group 1
 arp broadcast enable
 traffic-policy CAR-50M inbound
 traffic-policy CAR-50M outbound
 trust upstream diffserv_Claro
 qos phb disable
#
return
<NGWESPACIOSUR>dis int Eth-Trunk61.21541693  | inc sec
Info: It will take a long time if the content you search is too much or
    Last 60 seconds input rate 4672504 bits/sec, 629 packets/sec
    Last 60 seconds output rate 52596896 bits/sec, 4721 packets/sec
    Last 60 seconds input utility rate:  0.01%
    Last 60 seconds output utility rate: 0.02%
<NGWESPACIOSUR>dis clock
2025-10-07 16:18:30-05:00
Tuesday
Time Zone(BOGOTA) : UTC-05:00
<NGWESPACIOSUR>
```
