SECRETARÍA GENERAL – ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
EVIDENCIA DE REUNIÓN

Dependencia: DAF	**Objetivo:** Verificación de actividades a realizar con el contrato 781-2025 en las sedes Manzana Liévano y archivo distrital	
Fecha: 17/09/2025	**Lugar:** Manzana Liévano y Archivo distrital	**Hora: 10:00 am**

Asistentes

Nombre	Área	Entidad	Tel.	Firma
Patricia Rubio Cubides	DDAB	Secretaría General	3195667856	
Martha Piñeros Rodríguez	DAF	Secretaría General	3203410482	
Jahir Guerrero Rozo	DAF	Secretaría General	3016777230	
Andrey Díaz Ríos	Contratista	Constructora GED	3209438792	

Desarrollo

Se realiza el recorrido por las sedes:

- Manzana Liévano – Edificio municipal – Edificio Liévano
- Archivo Distrital

Durante la visita a la manzana de Liévano se realizan las siguientes verificaciones:

- Se valida la baranda a reemplazar en la rampa de la plaza central, se define que se debe elaborar en acero inoxidable.

- Se verifica el estado de las divisiones de los baños de los edificios palacio municipal y palacio de Liévano, definiendo como prioridad la totalidad del palacio municipal, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos del contrato.

Durante la visita al archivo distrital se realizan las siguientes verificaciones:


- Se requiere una baranda para la rampa del costado nor-oriental, sin embargo, la rampa se debe reconstruir para que cumpla con la pendiente máxima. Dado lo anterior, la arquitecta Patricia replanteará la rampa y remitirá el plano, de igual manera se confirmará si se requiere baranda en las escaleras por el ancho que queda disponible.

- Se requiere pasamanos entre las dos puertas de salida del auditorio, teniendo en cuenta que es una rampa.

- Se requiere continuar con un pasamanos doble en las escaleras exteriores que conectan con la rampa de acceso a las salidas del auditorio.


- Se verifica que la rampa de acceso interna de la edificación, requiere pasamanos doble y en los descansos una baranda, se propone inicialmente que la estructura sea en acero con pintura electrostática negra y pasamanos (bolillo) en madera, como alternativa se propone que la integridad de los elementos sea en acero con pintura electrostática negra incluido el pasamanos (bolillo), teniendo en cuenta la dificultad para la elaboración de las curvas en madera. No obstante, la arquitecta Patricia queda con el compromiso de consultar y remitir planos de como serían los detalles de los elementos.

Anexos

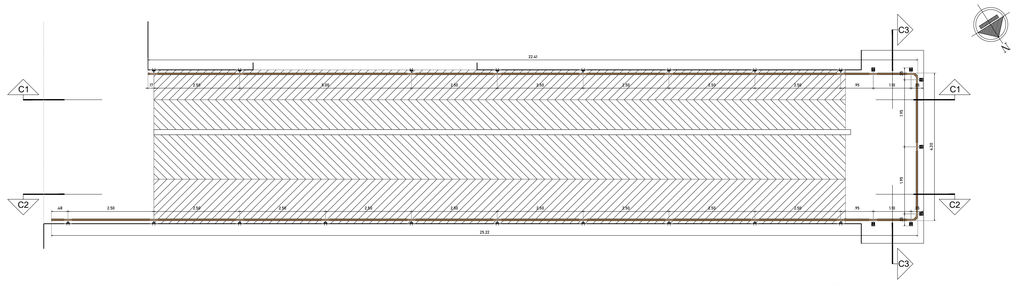


PLANTA RAMPA 1 A 2 PISO

Esc 1-75

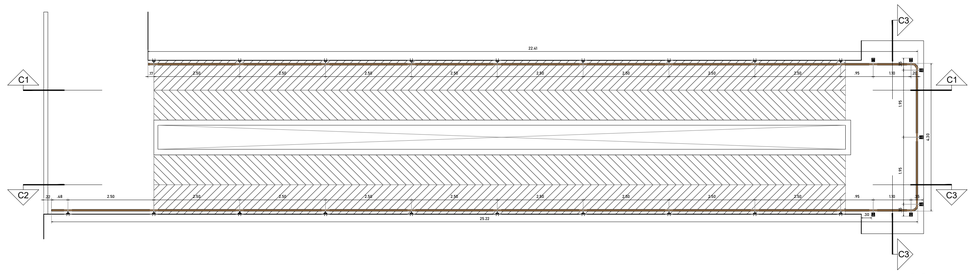


PLANTA RAMPA 2 A 3 PISO

Esc 1-75

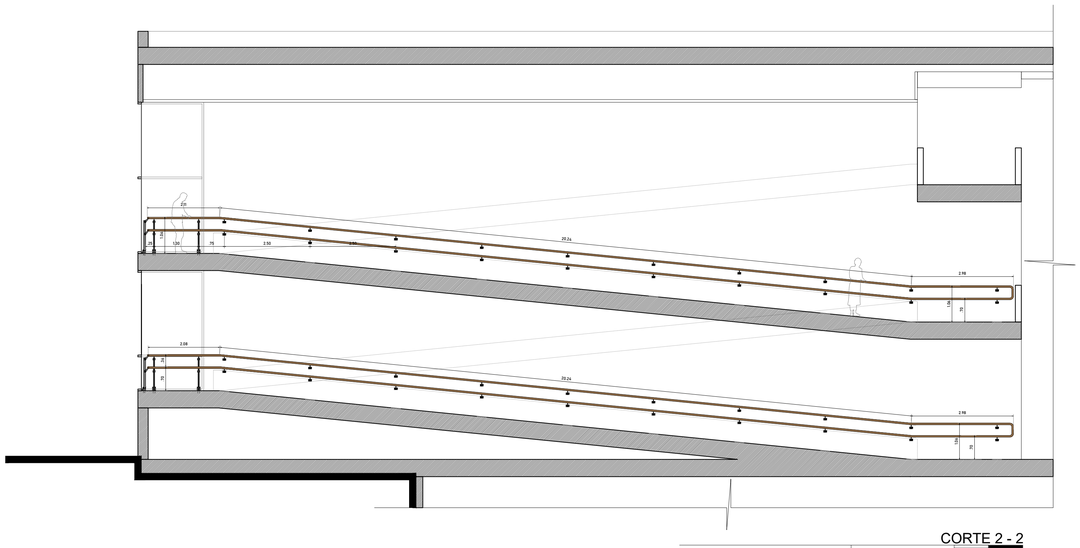


CORTE 2 - 2

Esc 1-75

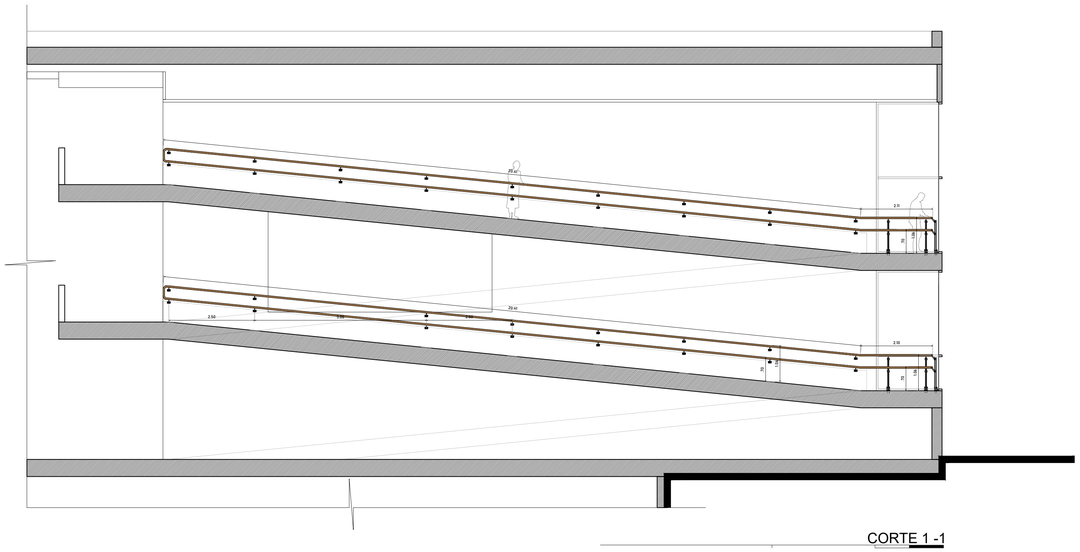


CORTE 1 -1

Esc 1-75

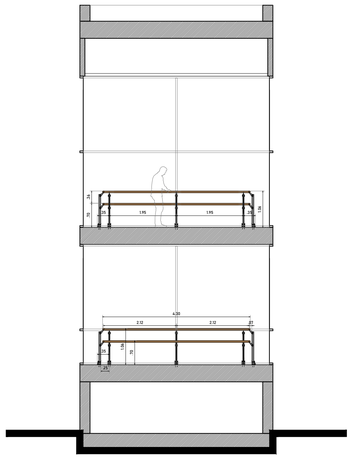


CORTE 3 - 3

Esc 1-75



DETALLE PASAMANOS

Esc 1-20



DETALLE BARANDA

Esc 1-20

OBSERVACIONES GENERALES

1. Las medidas deberán ser verificadas en sitio.
2. Las alturas de las barandas y pasamanos se deberán verificar con la altura existente de la escalera de oficinas.
3. Los niveles finales de acabados deben ser revisados directamente en obra.
4. Los enchapes de piso y muros deberán ser protegidos en el momento de anclaje.
5. El material de terminación de pasamanos está planteado en madera, pero podría ser metal, de acuerdo a presupuesto.
6. Las separaciones de apoyos de pasamanos deberán corresponder a la separación existente y se deberá cumplir con estándares de normativa ante fuerzas laterales y verticales.
7. El diseño esta basado en planos de detalles del Archivo.

PROPUESTA DE DISEÑO BARANDA Y PASAMANOS RAMPA ARCHIVO DE BOGOTÁ

SEPTIEMBRE 25 DE 2025

Realizó Arq. Patricia Rubio Cubides

SECRETARIA GENERAL
ALCALDIA MAYOR SANTA FE DE BOGOTA

PROYECTO: ARCHIVO DE BOGOTA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO: ARQ. JUAN PABLO ORTIZ EN ASOCIO CON ARQ. ANDRES ORTIZ y ARQ. PABLO MORENO

ESCALA: INDICADAS

PLANO No. PB-01 2025

CONTIENE: PROPUESTA DISEÑO BARANDAS PASAMANOS


FECHA PLANOS RECORD: 12 FEBRERO 2001

Este plano esta basado en el plano de detalles con codificación 101.06.002.09, que reposa en la carpeta del proyecto Archivo de Bogotá.

Dibujo: LPRUBIO@ALCALDIAB.GOV.CO

Fecha Dibujo: SEPTI 25 _2025

Archivo: ARC_PAS_BARA_09_2025

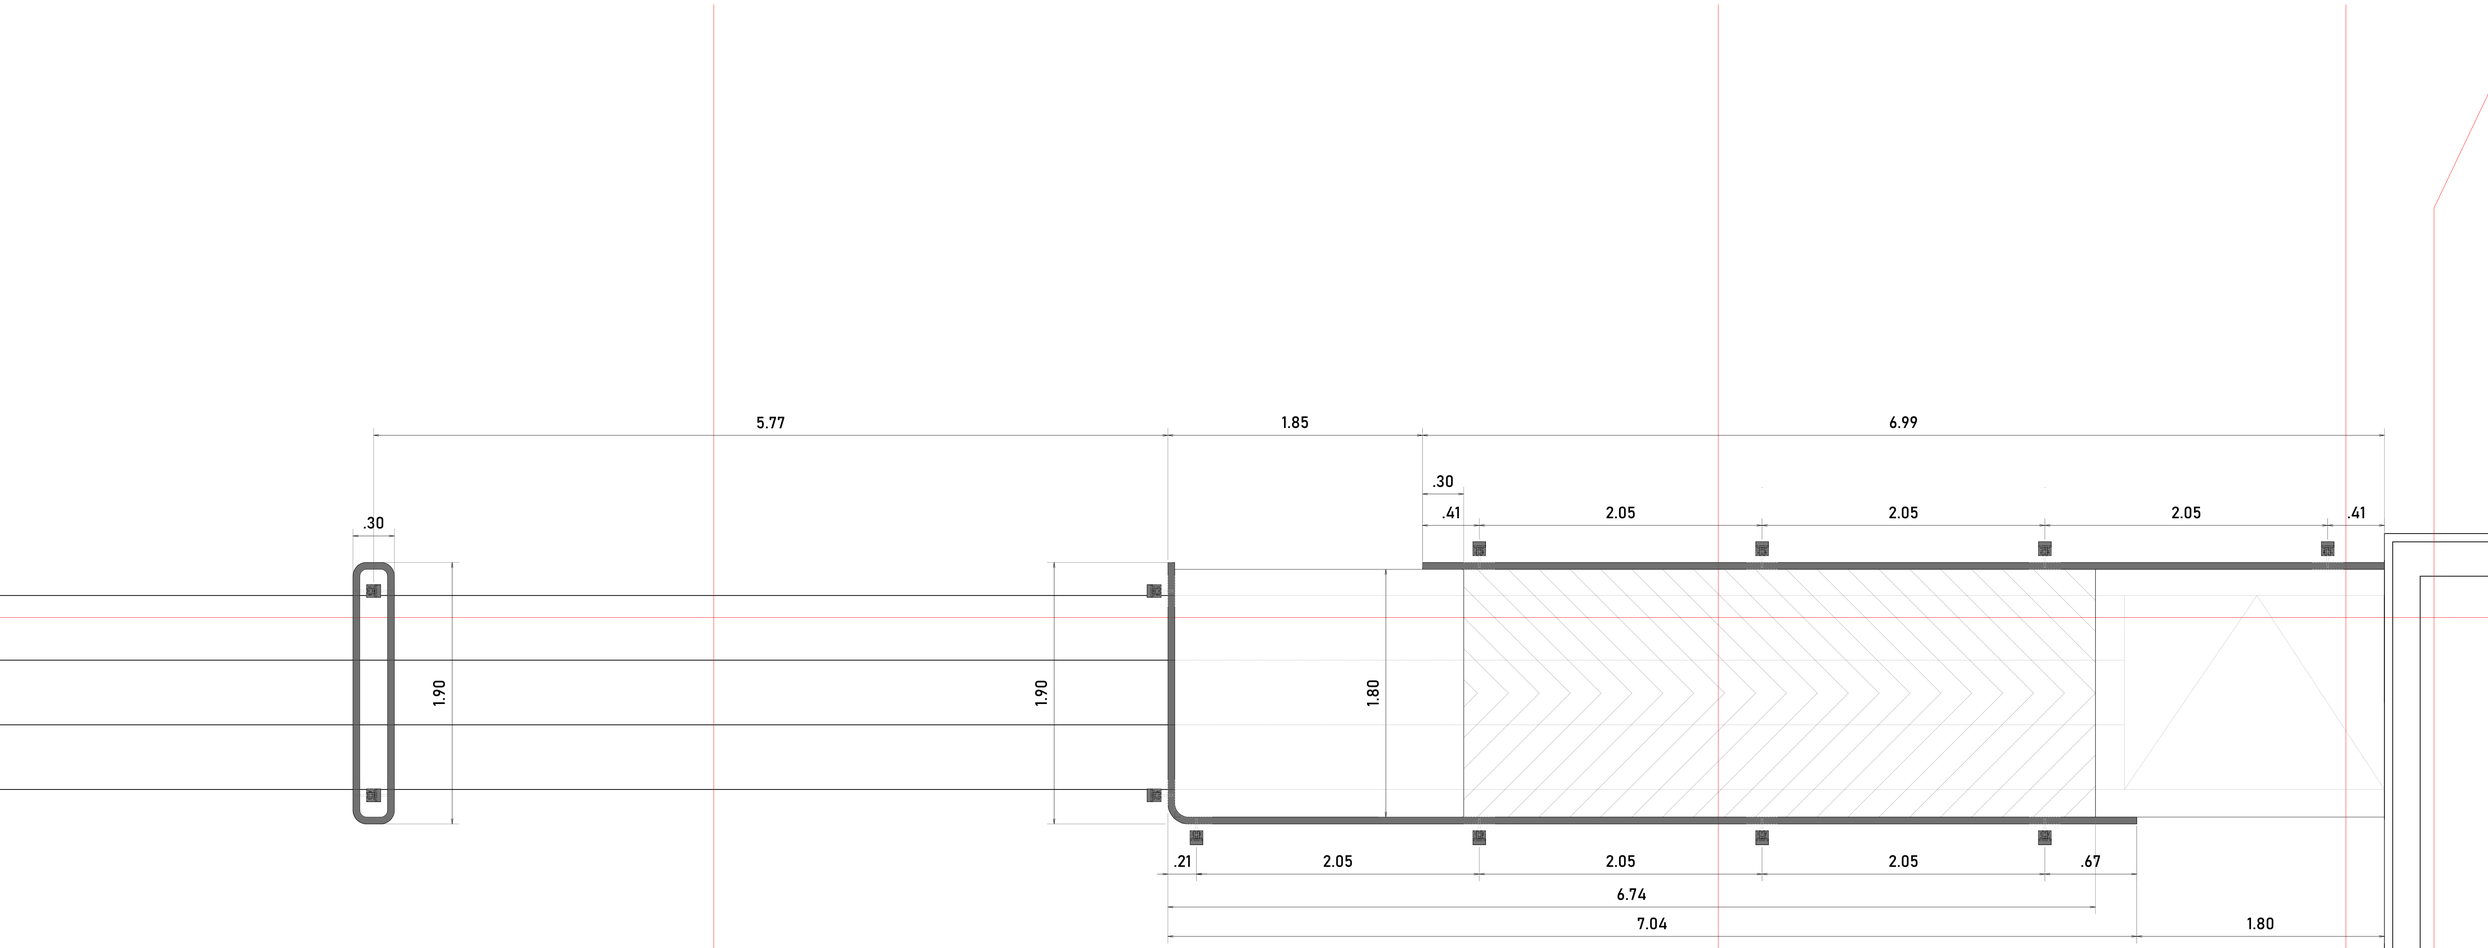

PLANTA RAMPA EXTERIOR
