AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-04
No. CARPETA:	5
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS** OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META **CONTRATO N° 274 24 PY 062-24 INFORME N°1 C2-2 C5**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
41.	LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE INTERVENTORÍA INFORMES MENSUALES	467
42.	INFORME DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA – INFORME MENSUAL 2	468-485
43.	INFORME MENSUAL SST DE INTERVENORÍA No. 002	486-499
44.	INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENORÍA No. 002	500-510
45.	ACTA RELACIÓN PERSONAL INTERVENTORÍA	511-512
46.	ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA	513-525
47.	ANEXOS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA	526-583
48.	INFORME DE SUPERVISIÓN	584-598

Fecha de Elaboración :		Nombre del Archivo en el SIGA	274 24 PY 062-24 INFORME N°1 C2-2 C5

Firma		Firma	
Nombre:	**JUAN CAMILO POSADA VARELA**	Nombre:	**GINA TATIANA ELAICA NIETO**
Cargo:	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Cargo:	SUPERVISOR

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

LISTA DE CHEQUEO CONTRATO DE INTERVENTORIA
INFORMES MENSUALES

112-ECP-FR-177-V03
05/07/2023

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

INFORMES MENSUALES	CODIGO FORMATO	CASILLA DE VERIFICACIÓN SI / NO / N/A
INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORIA	112-ECP-FR-051	SI
INFORME DE LA GESTIÓN REALIZADA POR CADA ESPECIALISTA, DEBIDAMENTE FIRMADO POR EL PROFESIONAL.	-	SI
ACTA RELACIÓN DE PERSONAL INTERVENTORIA	112-ECP-FR-047	SI
ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA	112-ECP-FR-052	SI
ENTREGA DE DOTACIÓN Y/O ELEMENTOS PROTECCIÓN PERSONAL	112-ECP-FR-015	N/A
INFORME DE SUPERVISIÓN	112-ECP-FR-067	SI
ACTA APROBACIÓN CAMBIO PERSONAL INTERVENTORÍA (Cuando Aplique)	112-ECP-FR-061	N/A
INFORME PRESUNTO INCUMPLIMIENTO OBRA. Aplica para dar inicio a un proceso de *presunto incumplimiento.*	112-ECP-FR-042	N/A
CARGUE A SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTION DE ARCHIVOS (SIGA). Todos los documentos entregables de cada informe mensual, deben ser digitalizados y cargados a la carpeta del contrato de interventoria que se encuentra en la plataforma SIGA, en cumplimiento de la Resolución 82 del 6 de Abril de 2017.	-	
REGISTRO EN GESPROY -SGR - De conformidad con la Circular 062 de 2013 del DNP, con el objeto de facilitar la gestión y monitoreo a la ejecución de los proyectos de inversión financiados *con recursos del SGR ; el responsable del proyecto debera realizar el registro de la información de* ejecución con el detalle definido en cada uno de los componentes de la plataforma y presentar a la AIM el reporte del estado actual del proyecto.	-	
ENTREGA DOCUMENTACION AL RESPECTIVO RESPONSABLE DE ARCHIVO		

NOTAS

*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER ORIGINALES, IMPRESIÓN CLARA Y A COLOR, SERÁN RADICADOS ÚNICAMENTE POR EL SUPERVISOR A LA GERENCIA DONDE DEBEN ESTAR FOLIADOS 1-200 EN CARPETAS DE CONFORMIDAD A LA LEY DE ARCHIVO Y CARGADOS A LAS PLATAFORMAS DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE LA ENTIDAD .

*LA LISTA DE CHEQUEO DEBE IR FIRMADA POR LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROCESO, COMO INDICADOR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS AQUI ESTABLECIDOS.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre:JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR INTERVENTORIA
M.P. 63202-294712

Firma
Nombre:GINA TATIANA ELAICA NIETO
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS.
M.P. 25202-193880 CND

Firma
Nombre:N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN
M.P.

Firma
Nombre:N/A
RESPONSABLE DEL ARCHIVO

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-051-V05
21/06/2024

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

INFORME MENSUAL 2
Periodo de 14 de julio de 2024 al 13 de agosto de 2024
Fecha de Presentación: 29 de agosto de 2024

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
OBJETO CONTRATO:	INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($139.580.336,00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
OBJETO PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVEZ DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIAÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR DEL PROYECTO:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($139.580.336,00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
CONTRATISTA:	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@intercons.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN:	16/08/2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	14/10/2024

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-051-V05
21/06/2024

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

Meses	4 MESES
TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/06/2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	14/10/2024
Meses	4 MESES

SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	GINA TATIANA ELAICA NIETO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A

A. INFORME TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

1. AVANCE ACUMULADO PROPUESTA ECONOMICA VIGENTE

PERIODO QUE COMPRENDE EL AVANCE: 14/07/2024 AL 13/08/2024

CATEGORIA	CARGO	N° PERSONAS	% DEDICACION	TIEMPO EN MESES	HONORARIOS	VALOR TOTAL
PERFIL PROFESIONAL						
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	20%	4	$ 8.920.000,00	$4.905.286
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100%	4	$7.580.000,00	$20.841.968
PERFIL TECNICO						
PERFIL AUXILIAR						
SUBTOTAL PERSONAL						$25.747.254
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$61.793.411

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-051-V05
21/06/2024

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

COSTOS DIRECTOS					
TIPO	CANTIDAD	%	MESES	VALOR	VALOR TOTAL
TOPOGRAFIA (Inlcuye transito.nivel y elementos complementarios)Incluye Topógrafo	1	50%	1	$4.500.000	$6.186.600
Campero, Pick-up, Camioneta	1	100%	1	$4.600.000	$12.648.160
				SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS	$18.834.760
				TOTAL COSTOS	$80.628.171
				IVA (%)	$15.319.352
				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$95.947.523

Avance físico programado 66,06% y avance físico ejecutado 68,74%


2. CONTROL PROGRAMACIÓN Y AVANCE FISICO DE INTERVENTORIA

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Periodo 1	60,5%	$ 83.817.992	60,5%	$ 83.817.992	61,62%	$ 86.009.403	61,62%	$ 86.009.403
Periodo 2	6,01%	$ 8.388.778	66,06%	$ 92.206.770	7,12%	$ 9.938.120	68,74%	$ 95.947.523
Periodo 3	%	$	%	$	%	$	%	$

DEPARTAMENTO DEL META
Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

Grafica

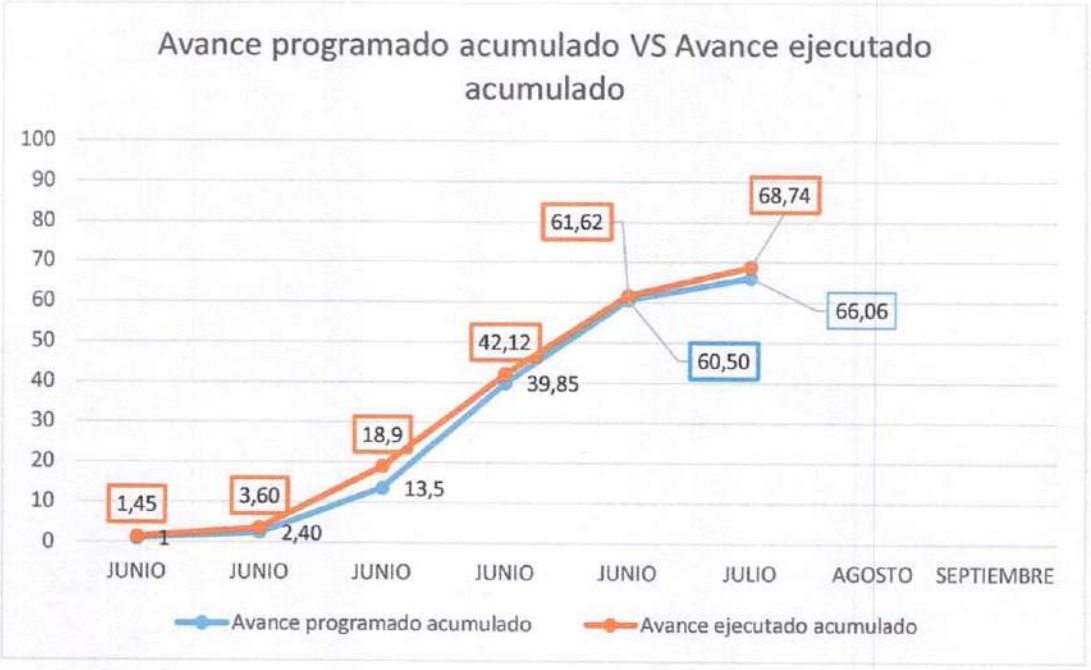

3. FORMA DE PAGO

La Agencia para la Infraestructura del Meta, pagará las obligaciones económicas por la suscripción del contrato de obra, producto del presente proceso de la siguiente manera:

1. El valor del presente proceso de interventoría es: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($139.580.336,00).

2. Los valore a liquidar serán por el valor del contrato.

3. Se cancelará hasta el 90% del valor del contrato en actas parciales, el valor a cobrar por acta será, el resultado de multiplicar el porcentaje que representa la interventoría frente al valor del contrato de obra o contrato vigilado, por el porcentaje de obra ejecutada a la fecha de corte o cobro, avalado por el supervisor del contrato de interventoría.

4. El diez por ciento (10%), restante, se cancelará, una vez se liquide el contrato.

5. Las actas de pago deben ser refrendadas por el contratista y el supervisor, acompañadas del pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente con el contratista y del periodo correspondiente.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

6. Para el pago de la última acta de interventoría se debe presentar el Acta de Recibo final del Contrato. El pago será por la totalidad del valor del contrato; no habrá pago por proyectos.

7. Para el pago de dichas actas de avance parcial se requerirá previa aprobación por el interventor y/o supervisor y presentación de la factura de venta correctamente elaborada.

8. Los pagos estarán sujetos a la programación de giros de cada uno de los proyectos.

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en los demás Documentos del Proceso, el Contratista se obliga a:

OBLIGACIONES	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
1. **Cumplir con el objeto del contrato conforme al estudio previo, la propuesta, el contrato, las especificaciones técnicas y/o requerimientos técnicos, y los aspectos contenidos en la Resolución el Manual de Interventoría y Supervisión de la Agencia.**	**Se cumplió Cumplir con el análisis y la viabilidad del proyecto según los estudios realizados**
2. **Presentar en el plazo establecido en los estudios previos, los documentos y cumplir con los requisitos exigidos como condición previa e indispensable para suscribir acta de iniciación del presente contrato, y del contrato a intervenir.**	**Se cumplió con lo establecido en la Orden de *Inicio por Urgencia* Manifiesta**
3. **Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato.**	**Se presentan informes mensuales y de gestión de interventoría**
4. **Verificar que las obras intervenidas se realicen y cumplan con los parámetros y normas técnicas establecidas para ese tipo de obra, en el contrato, o en pliego, o en el estudio previo, o en el proyecto para su ejecución, de lo cual dejará constancia de su calidad, cantidad y aceptación en Actas de Recibo Parcial, y Acta de Recibo Final de las obras objeto de interventoría.**	**Se desarrolla el seguimiento de las actividades contractuales, en base a las especificaciones técnicas.**
5) Tener conocimiento completo y detallado del proyecto, estudios, diseños, contrato, propuesta técnica y económica, cronograma de ejecución de la obra respecto del cual va a recaer la interventoría.	**Se verifica la gestión documental y cumplimiento a las exigencias del contrato**
6) Antes de iniciar los trabajos, se elaborará conjuntamente entre la INTERVENTORIA y el CONTRATISTA, un registro fotográfico de donde se adelantarán las obras, así como en su ejecución; así mismo se obliga a verificar que el Contratista de Obra publicite, convoque, y adelante Audiencia de socialización a la comunidad bajo el esquema Auditorías Visibles, de la cual levantará acta, haciendo la presentación previa al inicio de ejecución de las actividades de obra.	**Se realizó verificación previa y ajustes necesarios según la Orden de Inicio por Urgencia Manifiesta**
7) Requerir al Contratista de obra objeto de interventoría, antes del inicio de las obras, verificar, y avalar o requerir cambios, a los Análisis de Precios Unitarios con sus memorias de cálculo, así como la Programación, o en caso de prórrogas la Reprogramación de las actividades de obra, en todo caso en forma detallada acorde con las etapas constructivas adecuadas.	**Se verificó las condiciones contractuales según Análisis de Precios Unitarios con sus memorias de cálculo, así como la Programación**
8)Acatar las indicaciones que la Agencia le señale a la Interventoría en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones de los servicios a prestar. Y siempre brindar apoyo técnico y concepto adecuados a los intereses de la entidad estatal contratante en cuanto al cumplimiento del fin social que persigue la Contratación estatal de la obra objeto de Interventoría.	**Se toma en consideración las condiciones contractuales exigidas por el AIM**
9) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos. Y No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	**Se da cumplimiento a las condiciones contractuales, bajo el concepto de ética profesional**
10) Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato.	**Bajo el código de ética profesional que maneja la**

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-051-V05
21/06/2024

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

	empresa de interventoría se requiere reserva y dominio de los contratos en ejecución
11) Ejecutar las actividades objeto del contrato con el personal requerido por la Agencia y ofrecido en la propuesta. Cualquier cambio de personal deberá ser previamente sometido a aprobación de la Agencia. Solamente se aceptarán dichas modificaciones bajo razones justificadas y por personal de iguales o superiores condiciones en cuanto a formación académica y experiencia a las ofrecidas.	Se da cumplimiento a las condiciones contractuales en cada una de sus actividades.
12) Ejercer, bajo su entera responsabilidad, la dirección y el control de la interventoría, con el objeto de obtener la correcta realización del objeto contratado a intervenir, manteniendo durante la ejecución del contrato, la organización técnica y administrativa presentada en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional, para atender sus obligaciones.	Se ejerce responsabilidad, la dirección y el control de la interventoría, con el objeto de obtener la correcta realización del objeto contratado a intervenir, manteniendo durante la ejecución del contrato, la organización técnica y administrativa presentada en *la propuesta,*
13) Proponer mecanismos de solución a los problemas que se presentan en desarrollo del contrato y coordinar con la Entidad la aplicación cuando sea el caso, así como dar prelación al interés social que se busca satisfacer con la contratación de la obra.	Se hace seguimiento, y propuestas mediante el desarrollo del comité de obra y las ejecuciones en el lugar de ejecución del contrato.
14) Presentar informes del desarrollo del contrato en las condiciones pactadas en los estudios previos, contrato y otros que la supervisión le exija en relación con aspectos concernientes al buen desarrollo del mismo.	Se permite hacer entrega de los informes mensuales, según lo estipulado en el AIM
15) Al finalizar el contrato, el Consultor deberá anexar al acta de liquidación, la paz y salvos por concepto de salarios de los trabajadores.	No se presenta aún proceso de liquidación, en fase contractual.
16) Garantizar el cumplimiento y la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con el artículo 50 numeral 40 de la Ley 80 de 1993, independientemente de las garantías ofrecidas.	El contratista es responsable de los servicios prestados y de cualquier incumplimiento o defecto, sin importar si se han ofrecido garantías adicionales. Las garantías sirven como un respaldo adicional, pero no sustituyen la obligación principal del contratista de cumplir con el contrato
17) Radicar las facturas de cobro por el trabajo ejecutado dentro de los plazos convenidos.	Aún no se presentan parciales de cobro.
18) Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario.	Aún no se presentan parciales de cobro.
19) avisar con la debida anticipación la solicitud de prórroga del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley.	El contrato se encuentra en ejecución según la programación inicial.
20) Suscribir con el supervisor el acta de liquidación del contrato, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado.	No se presenta aún proceso de liquidación, en fase contractual.
21) Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables.	El contrato se encuentra en ejecución sin afectación a daños a terceros.
22) Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato. 22) Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo.	Se ha ejercido control y cumplimiento a las obligaciones contractuales, haciendo seguimiento a las actividades de obra en el marco Técnico, Administrativo, Financiero,

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-051-V05
21/06/2024

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

	Contable Y Jurídico, se verifican las vigencias de las garantías
23) El Contratista deberá tener afiliado su personal a los sistemas de seguridad social (EPS, Pensión y ARP) e igualmente estar al dia en los pagos de los anteriores aportes y en el pago de sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje — Sena-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar) de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo acreditar su pago en su oportunidad con la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal cuando a ello hubiera a lugar y/o mediante la presentación de los recibos de pago.	Basado en la Orden de Inicio para la Urgencia Manifiesta con fecha 14 de junio de 2024, el contratista ha presentado el pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones, y Riesgos) de sus profesionales
24) Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.	el contratista ha presentado el pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones, y Riesgos) de sus profesionales
25) Proyectar y firmar las actas que se suscriban en el desarrollo del contrato de interventoría y el de obra intervenida, en especial el acta de liquidación del contrato.	Se deja asentado los *compromisos de los comités* desarrollados.
26) Alimentar en forma mensual el cuadro de avance de la Entidad y el sistema de Seguimiento del DNP.	Deberá reportar mensualmente el progreso del proyecto
27) El interventor en ejercicio de sus funciones deberá tener en cuenta lo establecido en el artículo 82 y siguientes de la ley 1474 de 2011.	No se establece un ejercicio contractual errado, en el que genere imputabilidad, daño o perjuicio a la Entidad Contratante – AIM, por medio de las funciones de interventoría.
28) En virtud de lo establecido en el Decreto Departamental N°114 de 2012, modificatorio del Decreto 272 de 2009 el interventor deberá rendir dos (2) informes como mínimo al grupo de auditorías visibles en un lenguaje común, señalando especificaciones técnicas, actividades a cargo del contratista, avance a las obras y las labores realizadas para el seguimiento y vigilancia de la correcta ejecución de los contratos. Adicionalmente deberá articular su acción con el grupo de auditores visibles, asistir y participar a los foros y facilitar el acceso a la información a su cargo acudiendo a los mecanismos que estime pertinentes.	Se presentan informes mensuales y de gestión de interventoría
29) El Interventor está obligado a llevar una bitácora en forma conjunta con el contratista de obra	Se hace entrega de la bitácora de obra, mediante el formato estipulado por el AIM.
30) El interventor deberá verificar los ajustes y/o modificaciones a los diseños presentados por el Contratista de Obra y recomendar sus ajustes aprobación al AIM.	No se presenta a la fecha posibles ajustes y/o modificaciones a los diseños presentados por el Contratista de Obra
31) El Interventor deberá colaborar con el contratista de obra en las gestiones o trámites para la obtención de las licencias, permisos, autorizaciones, sanciones cuando sea necesario.	A la presente fecha, no se ha requerido de gestiones o trámites
32) Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las Entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.	No se establece un ejercicio contractual errado, en el que genere imputabilidad, daño o perjuicio a la Entidad Contratante – AIM, por medio de las funciones de interventoría, según lo estipulado en la ley 1474 de 2011.
33) El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause	No se ha desarrollado evento alguno en el que se deba responder ante las

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

perjuicio a la Administración o a terceros y las demás contempladas en los documentos del proceso tales como estudios previos, pliego de condiciones, especificaciones técnicas.	autoridades competentes por cualquier acción o negligencia que afecte negativamente a la Administración o a terceros.
34) El contratista deberá asistir a los comités de obra, decidir sobre el desarrollo del Contrato de obra, y presentar inmediata y oportunamente informes de oficio o a requerimiento de la AIM, en términos legales, e idóneo en términos probatorios, y en este sentido acompañar a la AIM en procesos sancionatorios por presunto incumplimiento del contrato de obra.	Se da cumplimiento de asistencia a los comités desarrollados y citados por las partes contractuales.
35) Proferir o Expedir por escrito órdenes al Contratista de obra para apremiarlo a cumplir cabalmente con el objeto y las obligaciones específicas del contrato incluyendo el Cronograma de Obra.	No ha existido la necesidad, el contratista de obra, lleva un avance superior a los programado inicialmente.
36) El Contratista deberá presentar informe detallado para la liquidación del contrato de obra.	El contrato se encuentra en su fase de ejecución contractual.
37) *De conformidad con la Ley 1636 de 2013 artículo 31, el Contratista deberá adquirir* profesionales, técnicos, y la mano de obra no calificada, o la vinculación del personal no mínimo exigido, o no ofrecido, a través de agentes de gestión de empleo como COFREM, SENA, o privados debidamente autorizados para operaren el departamento del Meta de conformidad con el Decreto 2113 de 2013. El incumplimiento de esta obligación podrá ser objeto de sanción administrativa contractual sin perjuicio de las sanciones que aplique el Gobierno Nacional.	Debido a la premura del tipo *de contratación*, por Urgencia Manifiesta se requirió de iniciar las actividades de manera inmediata, sin embargo, La Interventoría presenta profesionales de la zona de influencia.
38) El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.	El contrato se ha desarrollado financieramente con los medios propios del contratista, en espera de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. GESTIÓN TECNICA:

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Hace control y seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato; que todas las garantías del contrato se mantengan vigentes hasta que se finalice el contrato. Mantener informadas a las partes involucradas sobre las posibilidades de realizar modificaciones al contrato y verificar si son viables o no.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las actividades dentro del desarrollo del proyecto, y hacer control en obra sobre las actividades que se estén realizando, como el uso adecuado de los materiales incluidos en el contrato.
PERFIL TECNICO	**GESTIÓN /OBSERVACIÓN**
Topógrafo	Supervisar y verificar la localización de los puntos obtenidos por el topógrafo del contrato de obra.
PERFIL AUXILIAR	**GESTIÓN /OBSERVACIÓN**

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

Se debe anexar al presente informe, copia de la gestión realizada por cada especialista, debidamente firmado por el profesional.

6. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

Oficios y documentos elaborados sobre el desarrollo del proyecto, comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
14/06/2024	ICMO-RPGP-OO1	ENTREGA DEL DISEÑO DE LA VALLA	ICMO SAS	INTERVENTORIA
14/06/2024	INT-2024-001	APROBACIÓN VALLA DE OBRA N° 271 DE 2024	INTERVENTORÍA	ICMO
(25/06/2024)	ICMO-RPGP-OO2	ENTREGA DE AVANCES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	ICMO SAS	INTERVENTORIA
25/06/2024	INT-2024-002	CONVOCATORIA REUNIÓN DE COMITÉ SEGUIMIENTO DEL PROYECTO NO2	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
27/06/2024	INT-2024-003	OBSERVACIONES AL CONCEPTO DE LOS AVANCES DE LOS DISEÑOS	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
01/07/2024	ICMO-RPGP-OO3	ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS	ICMO SAS	INTERVENTORIA
01/07/2024	INT-2024-004	CONVOCATORIA REUNIÓN DE COMITÉ SEGUIMIENTO DEL PROYECTO NO3	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
04/07/2024	INT-2024-005	VALIDEZ A LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS	INTERVENTORIA	ICMO SAS
05/07/2024	INT-2024-006	SOLICITUD DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO Y SOCIALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
09/07/2024	ICMO-RPGP-OO4	CONFIRMACIÓN DE SOCIALIZACIÓN EL DÍA 11 DE JULIO	ICMO SAS	INTERVENTORIA
11/07/2024	ICMO-RPGP-OO5	DOCUMENTACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA	ICMO SAS	INTERVENTORIA
12/07/2024	INT-2024-007	CONCEPTO DE JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
12/07/2024	INT-2024-008	SOLICITUD PERSONAL DE OBRA	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
12/07/2024	INT-2024-009	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
17/07/2024	ICMO-RPGP-OO6	Respuesta Comunicado INT-2024-001 (Solicitud de Personal en Obra) Y 002 (plan de calidad y Manejo Ambiental)	ICMO SAS	INTERVENTORIA
19/07/2024	ICMO-RPGP-OO7	Entrega documentación Inicial Contractual y mensual No.1	ICMO SAS	INTERVENTORIA
22/07/2024	INT-2024-010	Aprobación documentos del contrato de obra No 271 de 2024	INTERVENTORÍA	ICMO SAS

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
22/07/2024	INT-2024-011	Convocatoria reunión de comité seguimiento del proyecto No4	INTERVENTORÍA	ICMO SAS

Apoyo a la contestación derechos de petición……o solicitudes a la comunidad

Cargue realizado al sistema de información SIGA

Plataformas Tecnológicas y Bases de datos requeridos por las entidades de control y seguimiento (Gesproy, Sia Observa)

7. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta planilla de pago N°: 9470092008-9472194289

Anexo: 112-ECP-FR-052-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

8. GESTIÓN SOCIAL

EMPLEO	CANTIDAD
Total empleos generados:	4
Empleos directos generados:	4
Empleos indirectos generados:	2

9. CLASIFICACIÓN DEMOGRAFICA DE LOS EMPLEOS GENERADOS POR LA INTERVENTORIA

CLASIFICACIÓN	DETALLE	CANTIDAD
Etaria (Edad)	15 a 19 años	N/A
Etaria (Edad)	20 a 59 años	4
Etaria (Edad)	Mayor de 60 años	N/A
Grupos étnicos	Población Indígena	N/A
Grupos étnicos	Población Afrocolombiana	N/A
Grupos étnicos	Población Raizal	N/A
Género	Masculino	4
Género	Femenino	N/A
Población Vulnerable	Desplazados	N/A
Población Vulnerable	Discapacitados	N/A
Población Vulnerable	Víctimas	N/A
Total		4

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-051-V05
21/06/2024

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

B. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTIAS: Pólizas contractuales de cumplimiento y responsabilidad civil derivado del cumplimiento

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	21-44-101448824
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	21-40-101238138
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	21-40-101238138
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Seguros del estado

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/08/2024	16/04/2025	$13.958.033,60
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/08/2024	16/12/2027	$6.979.016,80
Calidad del servicio	16/12/2024	16/12/2029	$13.958.033,60

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-051-V05
21/06/2024

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

C. INFORME FINANCIERO


1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		TOTALES					N/A

Avance físico ejecutado 68,74% y avance financiero ejecutado **0,00 %**

D. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES CONTRACTUALES

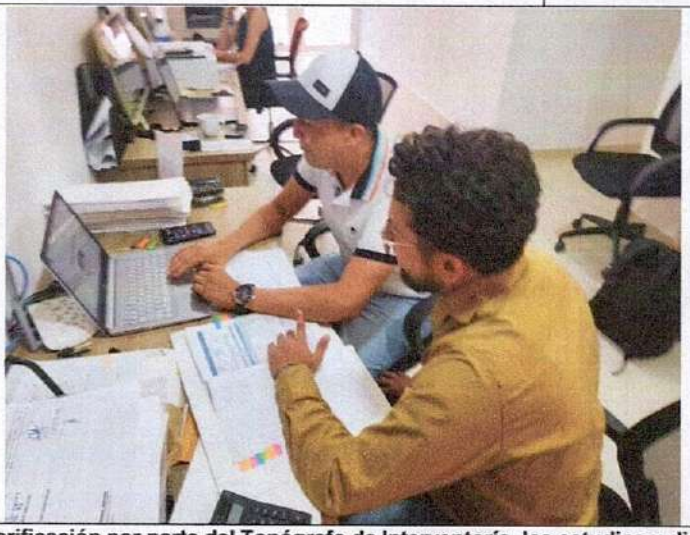ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMITÉ AVANCES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	EJECUTADO	N/A
			
	OBSERVACIONES Verificación por parte del Topógrafo de Interventoría, los estudios y diseños del puente		

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-051-V05
21/06/2024

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA Y DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	EJECUTADO	N/A



OBSERVACIONES Se realiza inspección de los elementos y estructura física del puente, como evaluación previa para los Estudios y Diseños definitivos

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	TOPOGRAFO DE INTERVENTORÍA	EJECUTADO	N/A



OBSERVACIONES: Chequeo y verificación de niveles topográficos.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-051-V05
21/06/2024

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	VEHICULO DE LA INTERVENTORÍA	EJECUTADO	N/A
			
	OBSERVACIONES Cumplimiento del vehículo de la Interventoría		

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMITÉ DE REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	EJECUTADO	N/A
			
	OBSERVACIONES Verificación de los estudios y diseños definitivos del Puente Piñalito.		

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-051-V05
21/06/2024

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	Actividad Social	EJECUTADO	N/A



OBSERVACIONES Verificación de la Instalación de la Valla Informativa del Contrato de Urgencia Manifiesta según las especificaciones técnicas del AIM.

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN LA SOLDADURA	EJECUTADO	N/A



OBSERVACIONES: se verifica por parte del Residente de Interventoría el proceso de soldadura de las actividades desarrolladas por obra.

DEPARTAMENTO DEL META

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA Y DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	EJECUTADO	N/A
			
	OBSERVACIONES Acompañamiento del Director de Interventoría, Residente de Interventoría y del Ingeniero Estructural de Interventoría con el fin de hacer seguimiento a las labores de ejecución de obra		

E. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE INTERVENTORÍA

El Contratista **Intercons de Colombia SAS** a corte del presente informe, reporta un avance de acuerdo a lo establecido en la programación de obra, representando un avance ejecutado del 68,74 % frente a un avance programado del 66,06 %, datos que son consernientes al avance de ejecución de obra.

La Contratista **Intercons de Colombia SAS** del Contrato de Obra No. 274 DE 20243, Inicia actividades de obra en fecha 14 de junio de 2024 según Orden de Inicio para la Urgencia Manifiesta.

El desarrollo de las actividades se presentan en base a la calidad de lo requerido dentro de los estudios y diseños y el compromiso enmarcado dentro de los APU, por lo que se resalta que el rendimiento de operatividad es optimo.

se realizó socialización del contrato de obra por parte del contratista, donde se hablaron temas de la fase constructiva del puente, la importancia de desarrollo y recuperación de la infraestructura para el libre comercio de la zona de influencia y comunidades vecinas.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

El Contratista de obra permitió cumplir con los estándares de calidad, por lo que la presente Interventoría permitió realizar chequeo y control por medio de la prueba de pintura penetrante, en base al tipo de pintura penetrantes, de limpieza de superficie y reveladora de fallas en soldaduras, lo que se verificó la calidad de los trabajos.

- **Integridad estructural asegurada**: Las actividades de desmontaje, suministro y montaje de la estructura metálica, junto con el reforzamiento, han sido realizadas conforme a los diseños entregados. Esto garantiza que el puente mantenga su capacidad máxima de uso original, correspondiente a 32 toneladas.

- **Respuesta a la calamidad pública**: La intervención se llevó a cabo bajo un contexto de emergencia debido a la declaración de calamidad pública. Esta situación requirió una respuesta rápida y efectiva, la cual se ha logrado con el avance actual del proyecto, alineado con los decretos departamentales de emergencia.

- **Desfase entre el avance físico y financiero**: Al corte del presente informe se evidencia un avance del 68.74% en la ejecución física del proyecto, el avance financiero pagado es del 0%. Esto indica una discrepancia significativa que podría generar problemas de flujo de caja y sostenibilidad del proyecto en las etapas finales. La falta de desembolso de los recursos financieros podría poner en riesgo la culminación de las actividades restantes.

Nota: Las actividades se iniciaron según Orden de Inicio para la Urgencia Manifiesta con fecha 14 de junio de 2024, la cual considera que:

Que el departamento del Meta ha declarado la situación de Calamidad Pública mediante Decretos 251 de mayo 10 de 2024 y 256 de mayo 14 de 2024, en virtud de la Ley 1523 de 2012, en vista de la temporada invernal que afectó vías secundarias y terciarias en la jurisdicción del Departamento del Meta, la Unidad Departamental de Gestión de Riesgos y Desastres de la Secretaría de Gobierno y Seguridad del departamento del Meta con algunas entidades como CORMACARENA, EDESA, EMSA, Defensa civil Meta, Cruz Roja, Bomberos, Policía, Ejercito Nacional y Fuerza área mediante Acta CDGRD META No 5 de mayo 15 de 2024 se asignó a la AIM adelantar la contratación de obras para la "Rehabilitación del puente sobre el rio Güejar de la vía que comunica el centro poblado de Piñalito con el centro poblado de Santo Domingo".

Basado en la Orden de Inicio para la Urgencia Manifiesta con fecha 14 de junio de 2024, el contratista ha presentado el pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones, y Riesgos) de sus profesionales en ejercicio de las actividades vinculadas al contrato, correspondiente al periodo en ejecución, dando cumplimiento al requerimiento de la entidad al aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales que competen al artículo No. 50 de la Ley 789 de 2002.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE GESTIÓN INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-051-V05
21/06/2024

INFORME 002

CONTRATO N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062

F. ANEXOS

El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:

- Registro fotográfico detallado.
- Correspondencia generada entre el contratista – Interventor – supervisor – entidad contratante.
- Control de Seguridad Social.
- Actas de comité técnico.
- Ensayos de laboratorio, certificados de calidad de los materiales, y demás documentos que soporten el control de calidad.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 29 días del mes agosto del 2024

Firma

Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 63202-294712

Firma

Nombre: CARLOS ARTURO VEGA CASTELLANOS
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional:157341-8925126

Firma V°B°

Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS.
N° Matrícula Profesional: 25202-193880 CND

Firma V°B°

Nombre: N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional:

DEPARTAMENTO DEL META


Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORÍA Nº. 002

URGENCIA MANIFIESTA. ORDEN DE INICIO EN FECHA 14 JUNIO 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META"

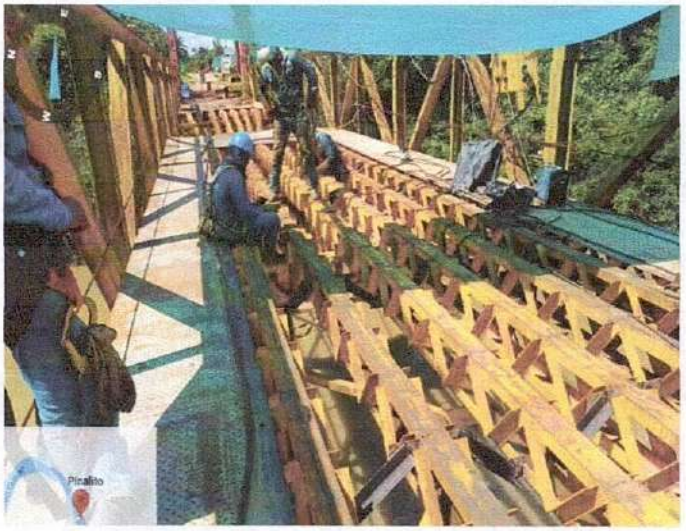

CONTRATISTA
ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EN REORGANIZACIÓN

INTERVENTORÍA
INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

ENTIDAD CONTRATANTE
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

PERIODO: 14 de julio de 2024 al 13 de agosto de 2024

PÁG.

1. INTRODUCCIÓN 3

GENERALIDADES 4

2.1. FINALIDAD DEL PROYECTO 4

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO 5

2.3. LOCALIZACIÓN 5

2.4. CONTROL DEL PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 6

2.5. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS 7

3. ACTAS GENERADAS 8

3.1. CONTROL DE SEGUMIENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORÍA. 8

4. ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, HSEQ Y AMBIENTAL 9

4.1. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 9

PERSONAL DE LA OBRA 9

4.2. NUMERO DE ACCIDENTES 10

4.4. INDICADORES Y ANALISIS DE LOS MISMOS 11

4.5. INGRESO DE NUEVO PERSONAL 12

4.6. RETIRO DEL PERSONAL 12

5. Plan de Manejo de transito - PMT 12

1. INTRODUCCIÓN

INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S. y como representante legal de este **Juan Camilo Posada Varela**, se encuentra ejecutando el Contrato de Interventoría por Urgencia Manifiesta que tiene como objeto **"INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META".**

El desarrollo de las actividades contractuales está comprendido en el periodo del **14 de julio de 2024 al 13 de agosto de 2024**, el cual contiene la descripción general de las actividades realizadas, información del contrato de interventoría, sujeto exclusivamente al desarrollo de las actividades de **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** donde su objetivo principal es el de ejercer el control, seguimiento y vigilancia sobre el desarrollo del proyecto mencionado y objeto de interventoría para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las obligaciones especiales y de todo que se comprometen en el proyecto de interventoría.

La **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, mediante ORDEN DE INICIO PARA LA "INTERVENTORÍA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO". En fecha de 14 de junio de 2024 expedida por el Gerente de la AIM, SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁNEZ, declarado la situación de Calamidad Pública mediante Decretos 251 de mayo 10 de 2024 y 256 de mayo 14 de 2024, en virtud de la Ley 1523 de 2012, en vista de la temporada invernal que afectó vías secundarias y terciarias en la jurisdicción del Departamento del Meta, la Unidad Departamental de Gestión de Riesgos y Desastres de la Secretaría de Gobierno y Seguridad del departamento del

Meta con algunas entidades como CORMACARENA, EDESA, EMSA, Defensa civil Meta, Cruz Roja, Bomberos, Policía, Ejercito Nacional y Fuerza área mediante Acta CDGRD META No 5 de mayo 15 de 2024 se asignó a la AIM adelantar la contratación de obras para la "Rehabilitación del puente sobre el rio Guejar de la vía que comunica el centro poblado de Piñalito con el centro poblado de Santo Domingo".

2. GENERALIDADES

2.1. FINALIDAD DEL PROYECTO

Es importante destacar que la finalidad de urgencia manifiesta y su posterior habilitación para realizar los procesos de selección asociados a este para conjurar las causas o a mitigar los efectos que le dieron origen a través de la modalidad de contratación directa, no dispensa, desde ningún punto de vista, a las entidades estatales de aplicar el principio de selección objetiva con miras a escoger a la persona que, cumpliendo con las exigencias y condiciones que demanda el bien, servicio u obra requeridos, lo ejecute, por lo tanto, es *indispensable cumplir con la* "INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META", como obligaciones pactadas. Además, de acuerdo con la naturaleza del ejercicio de la interventoría y con el fin de proteger el patrimonio del centro poblado de Piñalito, con el centro poblado de Santo Domingo, de un eventual incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato o de su cumplimiento defectuoso por parte del contratista, es poder conminarlo cuando éste suministre un bien o servicio de mala calidad no atendiendo las condiciones pactadas en el contrato.

2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

De acuerdo a las necesidades de la Urgencia Manifiesta, se prevé desarrollar la "MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GÜEJAR, DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO; EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META". por un valor del contrato de **DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 2.858.923.490,00)**, el cual debe cumplirse acorde a los diseños presentados por la contratista ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EN REORGANIZACIÓN con Nit No 800.078.011-9 representada legalmente por Camilo Torres Nope identificado con C.C. No 19.305.797

2.3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el Municipio de Vista Hermosa a 30 Kilómetros en el corregimiento del Centro Poblado Piñalito, situado en la llanura oriental de la cordillera oriental, en la región Orinoquia.

LOCALIZACION GENERAL



Localización geográfica del centro poblado y la ubicación del Puente Piñalito.

2.4. CONTROL DEL PERSONAL Y PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Se presenta el personal de Obra, se revisó y avaló la hoja de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con Orden Manifiesta para la ejecución de actividades de Interventoría, los profesionales se relacionan a continuación:

PERFIL PROFESIONAL - INTERVENTORÍA					
Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula			

			Tipo de Vinculación	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro
JUAN CAMILO POSADA VARELA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1.094.921.302	fijo	14/06/2024	13/10/2024
CARLOS ARTURO VEGA CASTELLANOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1.075.654.639	fijo	14/06/2024	13/10/2024

Relación Profesionales INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

De igual manera En el periodo comprendido del **14 de julio de 2024 al 13 de agosto de 2024**, el contratista de Interventoría cumplió con las leyes y reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial con el personal descrito en el acta de inicio.

2.5. INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS

Para realizar las obras del Proyecto la empresa Contratista deberá instalar las respectivas adecuaciones correspondientes a las necesidades preliminares, tales como: Limpieza, localización y replanteo, campamento provisional del proyecto, almacén de obra, oficina de campamento para profesionales de campo y cuerpo de interventoría, cerramiento perimetral de obra.

La Interventoría cuenta con domicilio de oficina en la Carrera 10 No 11-48 barrio popular Vista Hermosa - Meta, como espacio independiente a los campamentos de obra, para darle recepción de documentos y trámites pertinentes al contrato.

Nota: las actividades o etapas se encuentran en el contrato de obra, a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la propuesta económica, las áreas de campamentos deberán contar con condiciones adecuadas de temperatura, humedad, circulación de aire e iluminación natural y artificial.

2.6 CONTROL Y VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE INTERVENTORÍA

El presente estado de las pólizas, esta actualizado respecto a la fecha de Orden de Inicio en fecha 14 de junio de 2024 dichas garantías con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en el desarrollo del proceso contractual.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	21-44-101448824
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	21-40-101238138
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	21-40-101238138
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Seguros del estado

3. ACTAS GENERADAS

El presente proyecto de Interventoría tiene como verificación de PMT en proceso de estudio por parte de contratista como de las agremiaciones de volquetas, por lo tanto, se da por avisado para el cumplimiento de la misma lo más pronto posible.

3.1. CONTROL DE SEGUMIENTO TECNICO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE INTERVENTORÍA.

A continuación, se evidencia las actividades que se entregaron ante la supervisión en el periodo comprendido, dichas actividades son descritas así:

- Se hace recorrido por la obra para encerramiento y delimitación de la zona la cual se hace con lona verde.
- Se verifica la seguridad social de los trabajadores de obra.
- Se hace acompañamiento a las actividades desarrolladas por el contratista de obra,

4. ASPECTOS LEGALES, TECNICOS, HSEQ Y AMBIENTAL

4.1. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Para este periodo comprendido en el presente informe, se realizan las afiliaciones y el pago de las obligaciones parafiscales del personal que se encuentra laborando para la Contratista ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EN REORGANIZACIÓN, bajo el contrato de obra 377 DE 2023, para así dar cumplimiento a la obligación del contrato, igualmente en los términos de la ley 789 de 2002, el decreto 1703 de 2002 y demás normas.

PERSONAL DE LA OBRA

A continuación, Se relaciona el personal de la Contratista ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EN REORGANIZACIÓN, con su respectivo número de planilla de pago, cargo, salud, ARL y fondo de pensiones, se presenta informe de Seguridad Salud en el Trabajo con los respectivos anexos.

DATOS PERSONAL DE OBRA	CARGO	DEDICACIÓN
BAEZ GALINDO JORGE ELIECER	DIRECTOR DE OBRA	100%
DIAZ VARGAS JHONATHAN STEVEN	ING.RESIDENTE	100%
LESMES NIETO FANY AURORA	SUPERVISO HSEQ	100%
ALFONSO OSCAR DAVID	SOLDADOR	100%
ARANDA GUALTEROS WILMAR ANDRES	MONTADOR	100%
BERNAL ROJAS EMIGDIO	SOLDADOR	100%
BUSTAMENTE CASTAÑO CAMILO ANDRES	CAPATAZ	100%
CHAPETA CAMARGO JHON JAIRO	MONTADOR	100%

HERRERA YILBER ESNEIDER	AYUDANTE	100%
LOPEZ SAAVEDRA JOSE ALEXANDER	MONTADOR	100%
MELO MARTIN HERNANDO	MONTADOR	100%
RIVERA RICARDO EDER DAVID	MONTADOR	100%
SARMIENTO LUIS ALFONSO	SOLDADOR	100%
TORRES HERRERA JOSE DAVID	MONTADOR	100%
TORRES PADILLA JOSE LUIS	AYUDANTE	100%
VELASQUEZ RINCON EDILSON FABIAN	AYUDANTE	100%
ZUBIETA CALDERON NELSON	ALMACEN1STA	100%
RIOS CARDONA SANTIAGO	VIGILANTE	100%
RINCON JORGE	CAPATAZ	
ARANGO PALOMO ERNESTO	PINTOR	
RIVERA VEGA DANILSON	PINTOR	

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL: **9469768683-9469783666**

4.2. NUMERO DE ACCIDENTES

N°	CARGO Y EVENTO	FECHA	TRABAJADOR	INVESTIGADO	MEDIDAS DE INTERVENCION	INCAPACIDAD
0						


NOTA: Durante el período del mes de junio del presente año, no se presentaron eventos de accidentalidad, contratista demuestra estadística de accidentes en obra, permitiendo demostrar un índice de frecuencia (IFAT) en (0,0).

4.3. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES

El contratista de obra manifiesta y hace entrega de evidencia de charlas y capacitaciones SST al personal como compromiso diario permitiendo dar un cumplimiento de 3.94 horas de intensidad al desarrollo, dentro del informe SST del contratista ICMO, se evidencia listados de asistencia de los trabajadores.

El contratista realiza entrega de los EPP, permitiéndose dar cumplimiento a las exigencias y obligaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se da cumplimiento al desarrollo de impartir el formato de Análisis de Trabajo Seguro (ATS) a los trabajadores que realizan actividades al replanteo topográfico, documentos que se encuentran anexos en el informe SST del contratista.

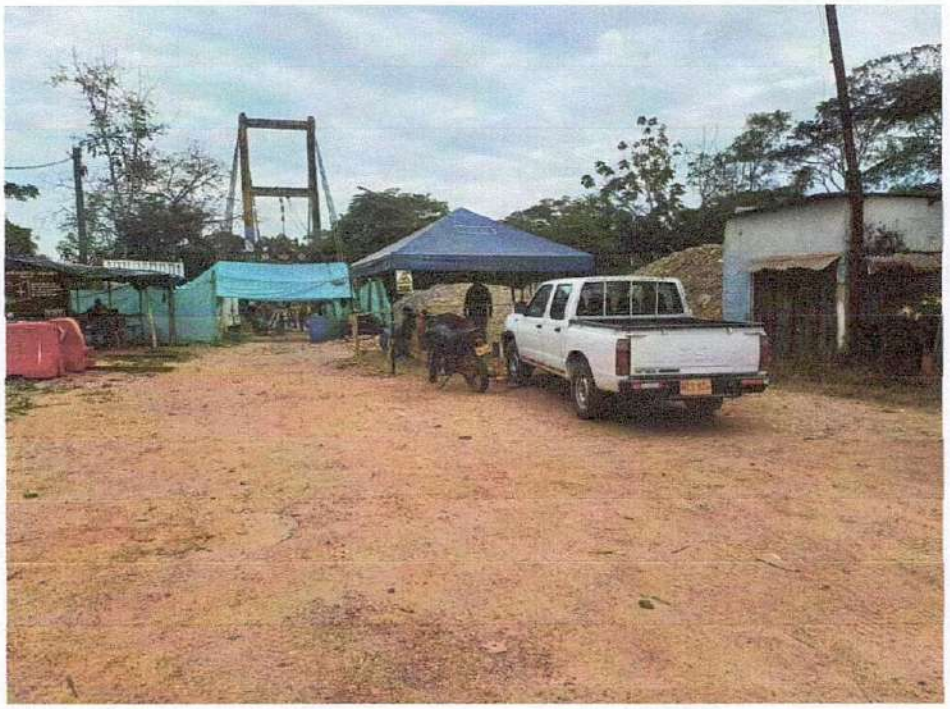

4.4. INDICADORES Y ANALISIS DE LOS MISMOS

Resultado, estructura, proceso .

Los indicadores del SG-SST, nos dejan evidenciar la gestión que se realiza en la obra, sobre prevención, el ausentismo y demás actividades. En cuanto a

la accidentalidad no se presentaron eventos, y se continúa con las labores de prevención en campo y se está llevando a cabo las actividades. Durante este período no se presentó ausentismo por ningún motivo, ni por enfermedad común. Como parte de la gestión se complementa con la caracterización de accidentalidad e indicadores, cronograma, plan de trabajo, matriz de ausentismo, incapacidades.

4.5. INGRESO DE NUEVO PERSONAL

El contratista no presenta nuevo personal de ingreso a obra la base de datos del personal. Se hace evidencia de los parafiscales que se tiene estipulados para el contratista, revisado por parte de la interventoría.

4.6. RETIRO DEL PERSONAL

Por inicio a las labores de desarrollo de obra, no se presenta retiro de personal, ni paz y salvo que genere competencia alguna.

Se aclara que el contratista presenta reporte de Cero Accidentes en el período del 14 de julio de 2024 al 13 de agosto de 2024, emitido por la ARL SURA


5. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO - PMT

Se ha recibido el Plan de Manejo de Tránsito por parte del contratista, en el que se determinan compromisos a cumplir durante la ejecución y desarrollo de trabajos de obra, en donde se requiere de la incorporación de señales de tipo fijas y móviles que permitirán el libre desarrollo de tránsito vehicular controladas bajo un controlador vial y su auxiliar de tránsito, considerando que el paso vehicular por el Puente Piñalito se encuentra deshabilitado

mediante la calamidad de desplome acontecido bajo la afectación del mismo.

A continuación, se hace un resumen de las señales preventivas, reglamentarias e informativas de obra que se deberán instalar de manera temporal durante la fase de construcción del mejoramiento del corredor vial.





Fuente Manual de señalización vial 2015

Por lo antes detallado, se le da como sugerencia al contratista cumplir estrictamente con lo descrito en la Plan de Manejo de Tránsito presentado,

así como instalar la señalización provisional de acuerdo con lo establecido en el PMT presentado y ajustada a lo establecido en el Capítulo 4 del Manual de Señalización adoptado por el Ministerio del Transporte mediante Resolución 1885 de 2015, antes de iniciar las obras y realizar la socialización de los desvíos que se llevaran a cabo, así como de las labores a desarrollar en cada uno de sus respectivas etapas a intervenir.

PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL
JUAN CAMILO POSADA VARELA
T.P.: 63202-294712 QND
C.C.: 1.094.921.302 de Armenia

INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA Nº. 002

URGENCIA MANIFIESTA. ORDEN DE INICIO EN FECHA 14 JUNIO 2024

OBJETO DEL CONTRATO

"INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META"



CONTRATISTA
ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EN REORGANIZACIÓN

INTERVENTORÍA
INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.

ENTIDAD CONTRATANTE
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

PERIODO: 14 de julio de 2024 al 13 de agosto de 2024

TABLA DE CONTENIDO

PÁG.

1. INTRODUCCIÓN 3

2. GENERALIDADES 4

2.1. finalidad del proyecto 4

2.2. alcance del proyecto 5

2.3. LOCALIZACIÓN 5

2.4. seguimiento y control de actividades en función responsable del cumplimiento ambiental 6

2.5. OBSERVACIONES del cumplimiento ambiental POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE OBRA. 10

2.6. conclusiones. 11

1. INTRODUCCIÓN

INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S. y como representante legal de este **Juan Camilo Posada Varela**, se encuentra ejecutando el Contrato de Interventoría por Urgencia Manifiesta que tiene como objeto **"INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META".**

El desarrollo de las actividades contractuales está comprendido en el periodo del **14 de julio de 2024 al 13 de agosto de 2024**, el cual contiene la descripción general de las actividades realizadas, información del contrato de interventoría, sujeto exclusivamente al desarrollo de las actividades **AMBIENTALES** donde su objetivo principal es el de ejercer el control, seguimiento y vigilancia sobre el desarrollo del proyecto mencionado y objeto de interventoría para asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, las obligaciones especiales y de todo que se comprometen en el proyecto de interventoría.

La **AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META**, mediante ORDEN DE INICIO PARA LA "INTERVENTORÍA PARA LA URGENCIA MANIFIESTA DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO". En fecha de 14 de junio de 2024 expedida por el Gerente de la AIM, SERGIO IVÁN MUÑOZ YÁNEZ, declarado la situación de Calamidad Pública mediante Decretos 251 de mayo 10 de 2024 y 256 de mayo 14 de 2024, en virtud de la Ley 1523 de 2012, en vista de la temporada invernal que afectó vías secundarias y terciarias en la jurisdicción del Departamento del Meta, la Unidad Departamental de Gestión de Riesgos y Desastres de la Secretaría de Gobierno y Seguridad del departamento del

Meta con algunas entidades como CORMACARENA, EDESA, EMSA, Defensa civil Meta, Cruz Roja, Bomberos, Policía, Ejercito Nacional y Fuerza área mediante Acta CDGRD META No 5 de mayo 15 de 2024 se asignó a la AIM adelantar la contratación de obras para la "Rehabilitación del puente sobre el rio Guejar de la vía que comunica el centro poblado de Piñalito con el centro poblado de Santo Domingo".

2. GENERALIDADES

2.1. FINALIDAD DEL PROYECTO

Es importante destacar que la finalidad de urgencia manifiesta y su posterior habilitación para realizar los procesos de selección asociados a este para conjurar las causas o a mitigar los efectos que le dieron origen a través de la modalidad de contratación directa, no dispensa, desde ningún punto de vista, a las entidades estatales de aplicar el principio de selección objetiva con miras a escoger a la persona que, cumpliendo con las exigencias y condiciones que demanda el bien, servicio u obra requeridos, lo ejecute, por lo tanto, es indispensable cumplir con la "INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META", como obligaciones pactadas. Además, de acuerdo con la naturaleza del ejercicio de la interventoría y con el fin de proteger el patrimonio del centro poblado de Piñalito, con el centro poblado de Santo Domingo, de un eventual incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato o de su cumplimiento defectuoso por parte del contratista, es poder conminarlo cuando éste suministre un bien o servicio de mala calidad no atendiendo las condiciones pactadas en el contrato.


2.2. ALCANCE DEL PROYECTO

De acuerdo a las necesidades de la Urgencia Manifiesta, se prevé desarrollar la "MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GÜEJAR, DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO; EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META". por un valor del contrato de **DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 2.858.923.490,00)**, el cual debe cumplirse acorde a los diseños presentados por la contratista ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EN REORGANIZACIÓN con Nit No 800.078.011-9 representada legalmente por Camilo Torres Nope identificado con C.C. No 19.305.797

2.3. LOCALIZACIÓN

El proyecto se localiza en el Municipio de Vista Hermosa a 30 Kilómetros en el corregimiento del Centro Poblado Piñalito, situado en la llanura oriental de la cordillera oriental, en la región Orinoquia.

LOCALIZACION GENERAL

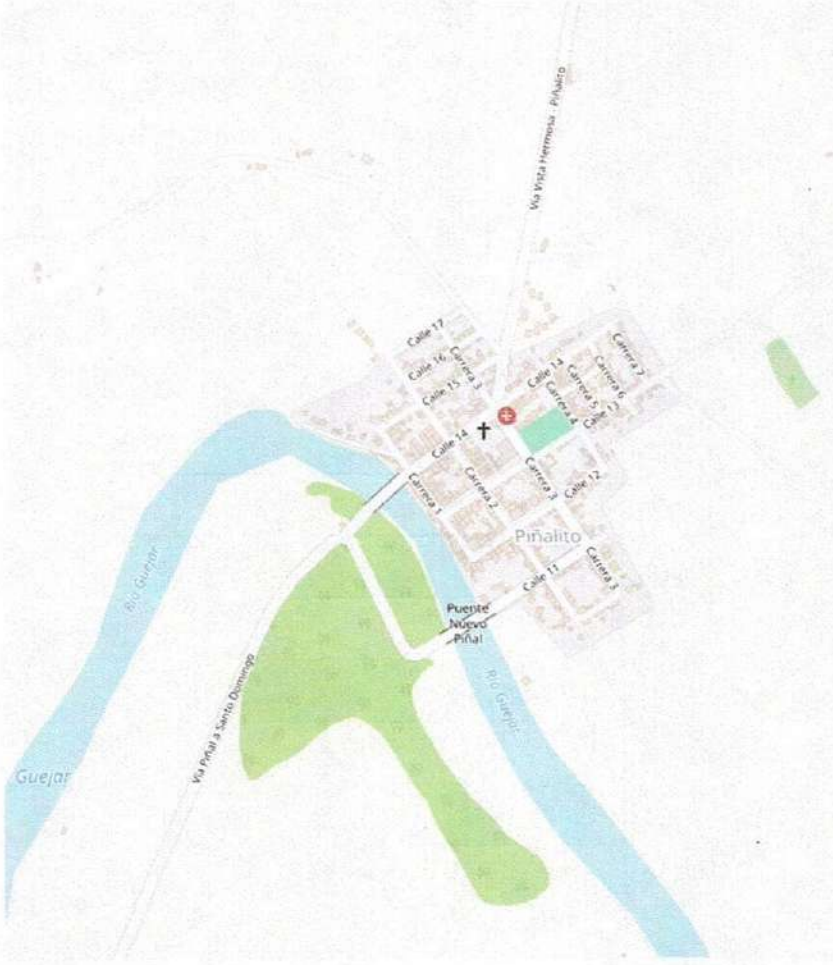

Localización geográfica del centro poblado y la ubicación del Puente Piñalito.

2.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES EN FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

Las actividades desarrolladas dentro del marco del Plan de Manejo Ambiental presentado por el contratista ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EN REORGANIZACIÓN, de acuerdo a cada uno de sus componentes los cuales son presentados por PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL en el período establecido fueron las siguientes:

Programa No. 1 – Conformación grupo de gestión socio-ambiental.

No se encuentran actividades desarrolladas por el contratista que permita dar cumplimiento a dicho programa de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el desarrollo de obra, lo que determina avance a nivel cero en actividades de obra programadas y proyectadas en el flujo de caja del presupuesto del proyecto.

Durante a ejecución del contrato no se han presentado quejas, inquietudes o reclamos de la comunidad por escrito. Sin embargo, en algunas ocasiones la comunidad se acercado a realizar preguntas de forma verbal sobre la obra y estas han sido atendidas por el personal presente (maestro de obra, ingeniero residente o contratista).

Señala el carácter de la medida, como son: prevención, protección, seguimiento, mitigación, recuperación y compensación

- Conformación del grupo de gestión social y ambiental
- Capacitación ambiental al personal de obra
- Cumplimiento de los requisitos legales

Durante este mes se realizaron charlas sobre el seguimiento del documento Plan de Adaptación de la Guía Ambiental — PAGA al personal del proyecto, en temas de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Lo anterior, con el fin de generar conciencia a cada uno de los trabajadores en el cuidado y preservación del medio ambiente y en seguridad y salud en el trabajo.

Programa No. 2 – ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Los materiales o residuos de construcción no utilizados en las obras están siendo retirados del frente de obra.

Se están manteniendo en el frente de obra los materiales necesarios para una jornada laboral (1 día o 2 como máximo), el resto de los materiales están en el patio de almacenamiento.

Para garantizar el adecuado manejo de estos materiales, se está realizando dentro de los programas de sensibilización ambiental la capacitación sobre este tema

Manejo Integral de material de construcción.

El contratista manifiesta no generar residuos sólidos de tipo convencional en el desarrollo de las actividades ejecutadas, sin embargo, manifiesta la

implementación del punto ecológico bajo la clasificación residuos sólidos aprovechables y no aprovechables de la Resolución 2184 de 2019 de la siguiente manera:

- Verde: Residuos orgánicos aprovechables
- Negro: Residuos no aprovechables
- Blanco: Residuos aprovechables

Los materiales o residuos de construcción no utilizados en las obras están siendo retirados del frente de obra.

Se están manteniendo en el frente de obra los materiales necesarios para una jornada laboral (1 día o 2 como máximo), el resto de los materiales están en el patio de almacenamiento.

Para garantizar el adecuado manejo de estos materiales, se está realizando dentro de los programas de sensibilización ambiental la capacitación sobre este tema

Señalización frentes de obra y sitios temporales

Manejo y disposición de residuos sólidos convencionales y especiales

Programa No. 3 – GESTIÓN RECURSO HÍDRICO

Manejo y disposición de residuos líquidos, domésticos e industriales

Manejo y disposición final de residuos de construcción y demolición

En el periodo de ejecución, el contratista expresa no haber desarrollado *actividades de construcción y/o demolición que genere escombros, para esta* ficha el contratista deberá presentar si así lo requiera, Certificado de Disposición Final de Residuos y Material Sobrante, emitido por la escombrera o empresa que desarrolle el cargue de los mismos con su respectivo transporte, con el fin de controlar y mitigar todos los impactos generados por el manejo materiales y equipos de construcción.

De igual manera, se solicitará al contratista la entrega de la hoja de vida de equipos que desarrollan actividades en obra con su respectivo control de mantenimiento preventivo y correctivo, en el que permita demostrar la mitigación de impactos ambientales bajo el adecuado funcionamiento de los mismos, es indispensable acotar que los equipos operativos deberán cumplir con el kit de antiderrames y los operadores con el respetivo uso de elementos de protección personal.

Se prohibió el lavado de la maquinaria y equipos en los cursos de agua, con la finalidad de evitar el derrame de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminación de los mismos. Además, es importante mencionar que durante la ejecución de la obra no se ha presentado ningún derrame en el suelo ni en las fuentes hídricas. Cuando la maquinaria y equipos requerían de lavado, éstos eran realizados en el casco urbano del municipio, en sitios autorizados para tal fin.

Programa No. 4 – BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Educación ambiental

El equipo de trabajo profesional concientiza a la población laboral al buen manejo y uso de las condiciones ambientales, y resguardo de la mismas, a fin de minimizar y no provocar impacto ambiental alguno.

La Contratista Antes de iniciar con las actividades de obra se ha brindado capacitación e inducción ambiental a todos los trabajadores del proyecto. En las inducciones se han tratado temas relacionados con los permisos y programas ambientales con los que cuenta el proyecto, explicando a su vez las obligaciones que debían cumplir cada trabajador (contratista, profesionales y obreros), teniendo en cuenta la normativa ambiental

Recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las solicitudes que la comunidad presenten al proyecto.

Manejo de materiales y equipos de construcción

El contratista manifiesta haber implementado señalización y demarcación de los frentes de obra activos.

Se manifiesta que a la fecha no se ha incorporado materiales de construcción ni se han implementado acopios, destacando que, no se encuentran afectaciones a cuerpos hídricos en la zona de influencia a la ejecución del proyecto en la que se evidencie afectación directa de la comunidad y la población aledaña.

Este proyecto busca capacitar a todo el personal del proyecto sobre aspectos de

conservación y manejo de la fauna silvestre potencial en la zona. Dentro del proceso de inducción y capacitación al personal que participara en el proyecto se deberá contemplar aspectos como el manejo, cuidado y responsabilidad con la fauna silvestre, involucrando a los trabajadores directos y contratistas de modo que sean los primeros en prevenir los impactos producidos por las diferentes actividades del proyecto.

Programa No. 5 – MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES

instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal

Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

No se encuentran actividades desarrolladas por el contratista que permita dar cumplimiento a dicho programa de acuerdo con las necesidades que se presenten durante el desarrollo de obra, lo que determina avance a nivel cero en actividades de obra programadas y proyectadas en el flujo de caja del presupuesto del proyecto.

No se encuentran actividades que generen residuos peligrosos de carácter especial o cualquier otro, en el caso que la contratista genere componentes químicos en el que sus propiedades o características sean corrosivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radioactivas puede causar riesgo o daño para la salud humana y el medio ambiente, se considera desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos, deberá presentar la ficha de datos de seguridad u hoja técnica ambiental, en el que demuestre el Sistema Globalmente Armonizado (SGA) es un sistema acordado a nivel internacional con el objetivo de normalizar la clasificación y la comunicación de los peligros químicos con los usuarios, para esta ficha el contratista deberá impartir capacitación al referente de los usuarios.

Programa No. 6 – GESTIÓN SOCIAL.

Se estableció compromisos dentro de la Socialización de requerimientos de cumplimiento ambiental, donde se hace importante resaltar que los requerimientos expedidos por la autoridad ambiental son de obligatorio cumplimiento y la omisión de estos generan procesos de incumplimiento al contrato. Todos los requerimientos deben ser solicitados de acuerdo con los tiempos y términos establecidos en la respectiva resolución

2.5. OBSERVACIONES DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL POR PARTE DE LA CONTRATISTA DE OBRA.

- Implementar el punto ecológico en óptimas condiciones de buen acceso para el uso por parte de los trabajadores de la obra.
- Evitar afectación alguna con el cuerpo de agua existente.
- Los materiales procedentes de escombros deberán ser acopiados de manera organizada y desalojados de manera pronta e inmediata una vez

culminada la ejecución de obra, a fin de no afectar a usuarios de comunidades de la zona de influencia al proyecto, ni transeúntes o en su defecto a personas con movilización en vehículos particulares.

- El contratista deberá hacer entrega a la Interventoría o en su defecto al municipio, a fin de dar disposición final de los mismos.

2.6. CONCLUSIONES.

- El contratista de obra deberá socializar y/o capacitar a su personal de obra, la comunidad o veedurías en base a lo contemplado en el PAGA entregado a la Interventoría y a la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META.
- Las fichas de Programas del informe de cumplimiento ambiental deberán ser de acuerdo con lo planteado dentro del PAGA y en base a las actividades o labores de ocurrencia que se van generando dentro del proyecto.
- Se requiere de la incorporación de anexos, registro fotográfico como evidencia del cumplimiento de actividades.

Por lo antes detallado, se le da como sugerencia al contratista cumplir estrictamente con lo descrito en la PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL PAGA presentada, para cada una de las labores a desarrollar en cada una de sus respectivas etapas a intervenir.

PROFESIONAL AMBIENTAL
CHRISTIAN FERNANDO PADILLA SANDOVAL.
T.P.: 25260-202466.CND
CC. 17.423.913 DE ACACIAS.

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

ACTA RELACIÓN PERSONAL INTERVENTORÍA

112-ECP-FR-047-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVEZ DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	900.849.552-3
SUPERVISOR:	GINA TATIANA ELAICA NIETO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N/A
APOYO A LA SUPERVISION:	N/A

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de julio de 2024 a 31 de julio de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACIÓN								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	Pensión	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
JUAN CAMILO POSADA VARELA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1.094.921.302	fijo	14/06/2024	13/10/2024	$ 8.920.000,00	SANITAS	16%	PORVENIR	12,5	SURA	V	COFREM	4%	$ 1.300.000,00
CARLOS ARTURO VEGA CASTELLANOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1.075.654.639	fijo	14/06/2024	13/10/2024	$ 7.580.000,00	NUEVA EPS	16%	PORVENIR	12,5	SURA	V	COFREM	4%	$ 7.580.000,00

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **jueves, 29 de agosto de 2024**

Firma:
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre:GINA TATIANA ELAICA NIETO
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional

Firma:
Nombre: MARYURI KARINA RINCON GIL
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 246413-T

Firma:
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional 63202-294702

Firma:
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.
Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA RELACIÓN PERSONAL INTERVENTORÍA
112-ECP-FR-047-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	274 DE 2024	**PROYECTO N°**	2024005500062

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVEZ DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIAÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	900.849.552-3
SUPERVISOR:	GINA TATIANA ELAICA NIETO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISION N°	N/A
APOYO A LA SUPERVISION:	N/A

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE: 1 de agosto de 2024 a 29 de agosto de 2024

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculacion	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro	Asignación Salarial	AFILIACIÓN								Ingreso Base de Cotización
							EPS	%	Pensión	%	ARL	NIVEL	Caja de Compensación	%	
JUAN CAMILO POSADA VARELA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1.094.921.302	fijo	14/06/2024	13/10/2024	$ 8.920.000,00	SANITAS	16%	PORVENIR	12,5	SURA	V	COFREM	4%	$ 1.300.000,00
CARLOS ARTURO VEGA CASTELLANOS	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1.075.654.639	fijo	14/06/2024	13/10/2024	$ 7.580.000,00	NUEVA EPS	16%	PORVENIR	12,5	SURA	V	COFREM	4%	$ 7.580.000,00

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos; incluso los trabajadores independientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **Jueves, 29 de agosto de 2024**

Firma:
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: JUAN CAMILO POSADA VARELA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
N° Matrícula Profesional: 3202294712

Firma:
Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PRC
N° Matrícula Profesional:

Firma:
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional

Firma:
Nombre: MARYURI KARINA RINCON GIL
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 246413-T

OBSERVACIONES:

Nota: Se debe Anexar a la presente Acta las afiliaciones del personal relacionado, previamente verificadas por la Supervisión.
Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

112-ECP-FR052-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVEZ DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	900.849.552-3
SUPERVISOR:	GINA TATIANA ELAICA NIETO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

NUMERO DE PLANILLA:	9470092008-9472194289						PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:			1 de julio de 2024 a 31 de julio de 2024			
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	SALUD		PENSIÓN		Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
					EPS	VALOR	PENSION	VALOR					
JUAN CAMILO POSADA VARELA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1.094.921.302	$ 1.300.000,00	30	SANITAS	$ 162.500,00	PORVENIR	$ 208.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.800,00	$ 378.300,00
CARLOS ARTURO VEGA CASTELLANOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1.075.654.639	$ 7.580.000,00	30	NUEVA EPS	$ 303.200,00	PORVENIR	$ 1.288.600,00	$ 527.600,00	$ -	$ -	$ 303.200,00	$ 2.422.600,00
												Total	$ 2.800.900,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **jueves, 29 de agosto de 2024**

Firma:
Nombre:JUAN CAMILO POSADA VARELA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORÍA

Firma:
Nombre: MARYURI KARINE RINCON GIL
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matrícula Profesional: 246413-T

Firma:
Nombre:GINA TATIANA ELAICA NIETO
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-193880 CND

Firma:N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional:

OBSERVACIONES:

Nota: Los pagos parafiscales serán verificados por la interventoría o supervisión y podrán ser requeridos por la entidad cuando considere pertinente.
Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 947-5

ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

112-ECP-FR052-V04
02/10/2023

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVEZ DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META
CONTRATISTA:	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT:	900.849.552-3
SUPERVISOR:	GINA TATIANA ELAICA NIETO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

NUMERO DE PLANILLA:	9471434849-9472194999				PERIODO COMPRENDIDO ENTRE:				1 de agosto de 2024 a 31 de agosto de 2024			
					SALUD		PENSIÓN					
Nombre personal	Cargo y/o oficio	cedula	sueldo	Dias Cotizados	EPS	VALOR	PENSION	VALOR	Valor Riesgos profesionales	I.C.B.F.	SENA	caja de compensación	Total a pagar
JUAN CAMILO POSADA VARELA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1.094.921.302	$ 1.300.000,00	30	SANITAS	$ 182.500,00	PORVENIR	$ 208.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.600,00	$ 378.300,00
CARLOS ARTURO VEGA CASTELLANOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	1.075.654.639	$ 7.580.000,00	30	NUEVA EPS	$ 303.200,00	PORVENIR	$ 1.288.600,00	$ 527.600,00	$ -	$ -	$ 303.200,00	$ 2.422.600,00
												Total	$ 2.800.900,00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los **jueves, 29 de agosto de 2024**

Firma:
Nombre:JUAN CAMILO POSADA VARELA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORIA

Firma:
Nombre:GINA TATIANA ELAICA NIETO
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
N° Matricula Profesional: 25202-193880 CND

Firma:
Nombre: MARYURI KARINE RINCON GIL
CONTADOR DE CONTRATISTA
N° Matricula Profesional: 246413-T

Firma:N/A
Nombre:
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matricula Profesional:

OBSERVACIONES:

Nota: Los pagos parafiscales serán verificados por la interventoria o supervisión y podrán ser requeridos por la entidad cuando considere pertinente.
Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de Director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matricula profesional, deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INTERCONS S.A.S.
INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS
Certification
No. CO21.09805

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

AUDITA QUE:

La empresa **INTERVENTORES, CONSULTORES Y CONSTRUSTORES DE COLOMBIA S.A.S.** con NIT **900.849.552-3** durante los seis (6) meses previos a la expedición del presente comunicado ha cumplido con los requisitos y las condiciones establecidas en la ley, que le obligaran el cumplimiento de las normas y reglamentaciones relacionadas con los aportes y obligaciones a los sistemas de salud, pensión, ARL y obligaciones parafiscales, señaladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, por lo cual se encontraba a Paz y Salvo por estos conceptos.

Se expide en Villavicencio (Meta) a 08 de agosto de 2024.

JUAN CAMILO POSADA VARELA
CC 1.094.921.302
RL INTERCONS S.A.S
NIT: 900.849.552-3

MARYURI KARINE RINCON GIL
CC 1.116.796.581
T.P: 246413-T

516

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

700B0B6F3575B373

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARYURI KARINE RINCON GIL** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1116796581 de ARAUCA (ARAUCA) Y Tarjeta Profesional No 246413-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

246413-T



MARYURI KARINE
RINCON GIL
C.C. 1116796581
RES. INSCRIPCION 725 DEL 24/08/2018
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

253831 272272

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.116.796.581**
RINCON GIL
APELLIDOS
MARYURI KARINE
NOMBRES

Maryuri Rincón
FIRMA



aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094921302		POSADA VARELA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA H9 BIFAMILIAR BC	VILLAVICENCIO-META	6836783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	816002325	9470092008	I	2024/08/02	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$378,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$7,800			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$7,800			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					**$1,300,000**	**$208,000**			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$7,800			$0	$0		$0	$0
1	CC	1094921302	POSADA JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF34	30	$1,300,000	$7,800		0	$0	$0	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,300,000**	**$208,000**			$1,300,000	**$162,500**			$1,300,000	$7,800			$0	$0		$0	$0

2024/08/29 10:00 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094921302		POSADA VARELA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA H9 BIFAMILIAR 8C	VILLAVICENCIO-META	6836783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	816002325	9470092008	I	2024/08/02	2024/08/01	BANCOLOMBIA	0	$378,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,800	$0	$0	$7,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$7,800	$0	$0	$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$378,300	$0	$0	$378,300

2024/08/29 10:00 AM

519

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849552	3	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOM	MANZANA H9 BIFAMILIAR 8C	VILLAVICENCIO-META	6836783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	874593812	9472194289	E	2024/08/14	2024/08/29	BANCO DAVIVIENDA	15	$2,449,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOM (1 Afiliados)					$7,580,000	$1,288,600			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$527,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$7,580,000	$1,288,600			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$527,600		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$7,580,000	$1,288,600			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$527,600		$0	$0
1	CC	1075654639	VEGA CARLOS	230301	30	$7,580,000	$1,288,600	EPS037	30	$7,580,000	$303,200	CCF34	30	$7,580,000	$303,200	14-11	30	$7,580,000	$527,600	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$7,580,000	$1,288,600			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$527,600		$0	$0

2024/08/29 10:32 AM

520

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849552	3	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOM	MANZANA H9 BIFAMILIAR 8C	VILLAVICENCIO-META	6836783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	874593812	9472194289	E	2024/08/14	2024/08/29	BANCO DAVIVIENDA	15	$2,449,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,288,600	$14,600	$0	$1,303,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,288,600	$14,600	$0	$1,303,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$527,600	$5,900	$0	$533,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$527,600	$5,900	$0	$533,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,200	$3,400	$0	$306,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$303,200	$3,400	$0	$306,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,200	$3,400	$0	$306,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$303,200	$3,400	$0	$306,600
TOTAL				1	$2,422,600	$27,300	$0	$2,449,900

2024/08/29 10:32 AM

125

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849552	3	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOM	MANZANA H9 BIFAMILIAR 8C	VILLAVICENCIO-META	6836783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	874603327	9472194999	E	2024/09/12	2024/08/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,422,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOM (1 Afiliados)					$7,580,000	$1,288,600			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$527,600		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					$7,580,000	$1,288,600			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$527,600		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$7,580,000	$1,288,600			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$527,600		$0	$0
1	CC	1075654639	VEGA CARLOS	230301	30	$7,580,000	$1,288,600	EPS037	30	$7,580,000	$303,200	CCF34	30	$7,580,000	$303,200	14-11	30	$7,580,000	$527,600	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$7,580,000	$1,288,600			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$303,200			$7,580,000	$527,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900849552	3	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOM	MANZANA H9 BIFAMILIAR 8C	VILLAVICENCIO-META	6836783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	874603327	9472194999	E	2024/09/12	2024/08/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,422,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,288,600	$0	$0	$1,288,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$1,288,600	$0	$0	$1,288,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$527,600	$0	$0	$527,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$527,600	$0	$0	$527,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,200	$0	$0	$303,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$303,200	$0	$0	$303,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$303,200	$0	$0	$303,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$303,200	$0	$0	$303,200
TOTAL				1	$2,422,600	$0	$0	$2,422,600

2024/08/29 10:33 AM

523

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094921302		POSADA VARELA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA H9 BIFAMILIAR 8C	VILLAVICENCIO-META	6836783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	874524152	9471434849	I	2024/09/03	2024/08/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$378,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$7,800			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$7,800			$0	$0		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$7,800			$0	$0		$0	$0
1	CC	1094921302	POSADA JUAN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF34	30	$1,300,000	$7,800		0	$0	$0	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$7,800			$0	$0		$0	$0

525

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094921302		POSADA VARELA JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	MANZANA H9 BIFAMILIAR 8C	VILLAVICENCIO-META	6836783	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	874524152	9471434849	I	2024/09/03	2024/08/29	BANCO DAVIVIENDA	0	$378,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,800	$0	$0	$7,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	$7,800	$0	$0	$7,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$378,300	$0	$0	$378,300

2024/08/29 09:59 AM

ANEXOS DEL INFORME DE INTERVENTORÍA

REGISTRO FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO; EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META



Foto1. Desmonte de láminas del piso del puente.



Foto 2. Desmonte Vigas longitudinales y Transversales



Foto 3. Desmonte Vigas longitudinales y Transversales



Foto 4. Suministro Acero de Refuerzo Estructural



Foto 5. Desmonte Tablero Lamina Alfajor



Foto 6. Suministro Lamina de Alfajor Tablero

REGISTRO FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO; EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META



Foto 7. Refuerzos en vigas longitudinales, de rigidez y transversales



Foto 8. Refuerzos en vigas longitudinales, de rigidez y transversales



Foto 9. Instacion Refuerzo Entre Vig. Longitudinales



Foto 10. Instacion Refuerzo Entre Vig. Longitudinales



Foto 11. Instacion Refuerzo Viga de Rigidez



Foto 12. Instacion Refuerzo Viga Transversales

REGISTRO FOTOGRAFICO

MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO; EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META



Foto 13. Actividad de Sandblasting.



Foto 14. Actividad de Sandblasting.

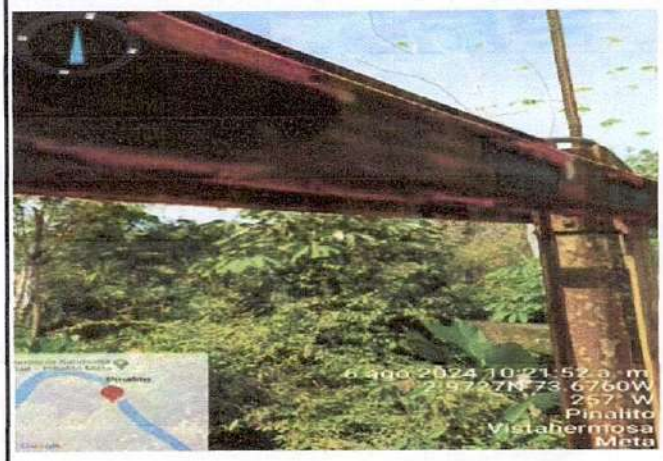


Foto 15. Prueba de tintas penetrantes.



Foto 16. Prueba de tintas penetrantes.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 26/08/2024 (Dia / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: .....

CONTRATISTA: ICMO S.A.S

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GÜEJAR, DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO; EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 14/07/2024 AL 13/08/2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: .....

INTERVENTOR: INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Total
Seco	24	24	24	24	24	24	24	22	24	23	23	24	24	24	21	24	24	23	22	24	24	24	21	24	23	24	24	23	24	23	24	752,8
Lluvias moderadas																																0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0		2	0	0,7	1	0	0	0	3	0,3	0	1,5	1,7	0	0	0	2,7	0	0,7	0	0	0,7	0	0,9	0	15,2
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Firma

Nombre: Jhonathan Steven Díaz Vargas
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:091037-0592439 CND

Firma


Nombre: Carlos arturo Vega Castellanos
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 157341-8925126


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor. Dirección Territorial.

530

	INFORME TECNICO - 0143	Identificacion ETSU
	ENSAYO LIQUIDOS PENETRANTES	Fecha 29/05/2024

EMPRESA: INTERCONS DE COLOMBIA S.A.S
CONTRATO: 274 de 2024
LUGAR: Puente Piñailto, Municipio Vista Hermosa
REALIZADO POR : CWE-CWI-CW-IE-PT-UT AWS
FECHA DE ENSAYO: 24/07/2024; 01/08/2024; 06/08/2024
MUESTRAS: END - TINTAS PENETRANTES (PT)
ESTAMPA: J-1 hasta J-12

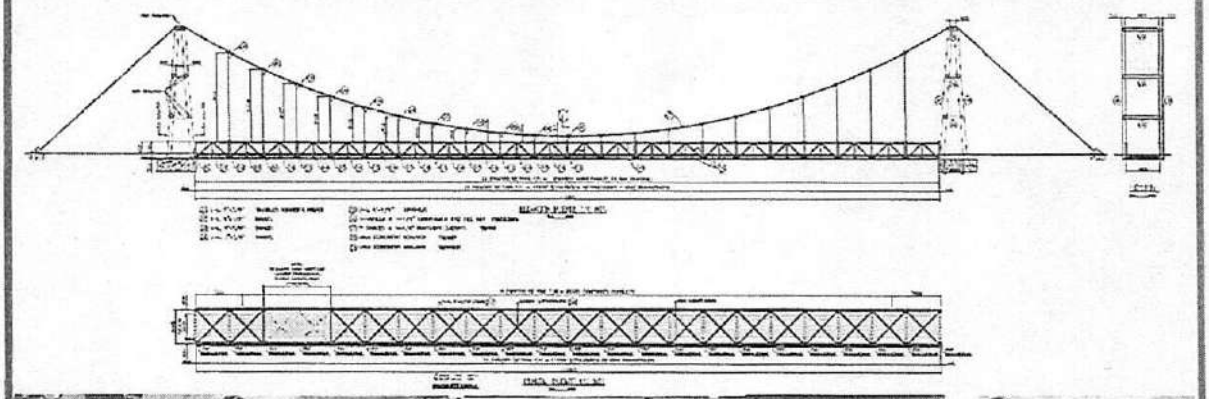

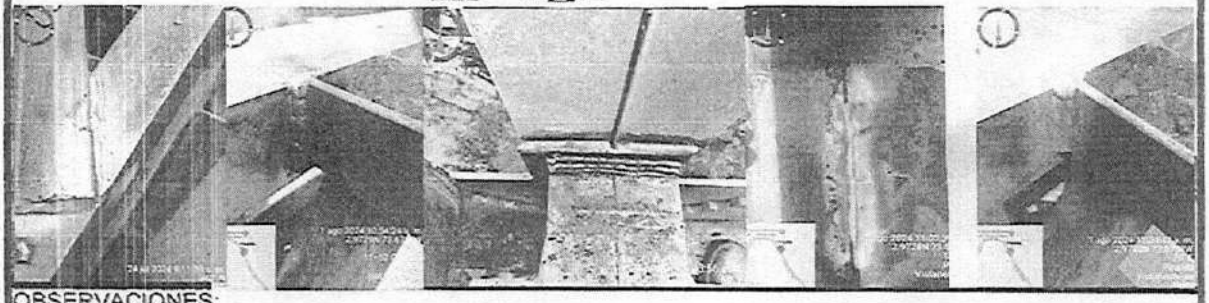

OBSERVACIONES:

1. Norma Aplicada en el ensayo : ASTM E165

2. Material Base: Según el contratista Acero Estructural ASTM A36 Refuerzo Puente de 110 mi Refuerzo viga iongitudinai y tabiero, Estandar. Proceso de soldadura AWS, tipo de Soldadura 70.18 1/8" 5/32"

3. Las soidaduras fueron reaiizadas por: ICMO S.A.S

4. De acuerdo al cliente estas muestras pertenecen a la estructura metáiica para rehabiiitación dei puente sobre ei rio Güejar, de ia via que comunica ei centro poblado de Piñailto con el centro pobiado Santo Domingo municipio de Vista Hermosa, Meta.

5. Caracteristicas del ensayo: (A)Limpieza Previa - (B)Temperatura de Pieza 20°C , se utilizo eliminador marca cantesco,penetrante por 7 minutos y revelador cantesco en 7 minutos.

Soldador: EDISON ANDRES SEGURA ROMERO
CC.1121147340

INSPECCION CONFORME OK

*Prohibida la reproduccion total o parcial de este informe sin la autorizacion de la ESCUELA TALLER SOLDADOR UNIVERSAL.

CONFORME ☒

Carlos Hernan Matiz Bustos
CWI 11031191
QC1 EXP. 3/1/2026

REPRESENTANTE - ETSU

American Welding Society

AWS Certification
Notification & Documentation

July 30, 2023

Carlos Hernan Matiz Bustos
Condominio 1A Toscana
Calle 25-187 Casa 223
Villavicencio Meta 500001
Colombia

Dear Mr. Carlos Hernan Matiz Bustos,

Enclosed you will find your new AWS certificate and wallet card.

For SCWI, CWI, or CRI certification, a stamp will follow in the mail within approximately (30) days of receiving this notice.

To order additional copies of your Certification certificate or wallet card access the Certification Order Form on the AWS website and email it to certification@aws.org



Your certification demonstrates that you've worked hard to become a top professional in your field. Remember to renew your certification prior to the expiration date indicated on your certificate and wallet card to ensure your certification status.

Feel free to visit the AWS website or call (800)-443-WELD, ext. 273 for more information regarding the renewal requirements for your certification.

Regards,

AWS Certification Department

8669 NW 36 St, Suite 130 Miami, FL 33166
800-443-9353 or (305) 443-9353 Fax 305 443-7559
E-mail certification@aws.org http://www.aws.org

533

AWS American Welding Society®

Certifies that Welding Inspector

Carlos Hernan Matiz Bustos

has complied with the requirements of AWS QC1,
Standard for AWS Certification of Welding Inspectors

11031191
CERTIFICATE NUMBER

Mar/01/2026
EXPIRATION DATE

AWS PRESIDENT

AWS QUALIFICATION & CERTIFICATION
COMMITTEE CHAIR

Certificate of Analysis

(No. COA001713)

Kemper System America, Inc. | 1200 North America Dr. | 14224 West Seneca

Product Description: P101S-A PENETRANT GLOBAL 354G

Product No.:	40081	Lot:	2021060009
Date of Entry:	06/10/21	Release Date:	06/10/21
		Best before:	06/10/23

Feature / Inspection Method	Actual Value	Unit	LTL	UTL
CHLORINE CONTENT (ASME BPCD SEC V SD-8	0.0000	PPH		1.0000
FLOURINE CONTENT (ASME ASME BPCD SEC V	0.0000	PPH		1.0000
SULFUR CONTENT (ASME BPCD SEC V SE-165)	0.0000	PPH		1.0000
TOTAL HALOGEN CONTENT (ASME T-641)	0.0000	PPH		

City, Date:West Seneca, 06/11/21 Signed by B Applewhite

Kemper System America, Inc.
1200 North America Dr.
West Seneca, NY 14224
Phone No.: 716-558-2971
Fax No.: 716-558-2967
Homepage: www.kempersystem.net

Escaneado con CamScanner

Certificate of Analysis

(No. COA002035)

Kemper System America, Inc. | 1200 North America Dr. | 14224 West Seneca

Product Description: C101-A CLEANER GLOBAL 340G

Product No.:	40085	Lot:	2023030002
Date of Entry:	03/03/23	Release Date:	03/08/23
		Best before:	03/03/25

HALOGEN TESTING

Feature / Inspection Method	Actual Value	Unit	LTL	UTL
CHLORINE CONTENT (ASME BPCD SEC V SD-8	0.15000	%		+1.00000
SULPHUR CONTENT (ASME BPCD SEC V SD-12	0.09000	%		+1.00000
FLOURINE CONTENT (ASME BPCD SEC V SE-16	0.00010	%		+1.00000
TOTAL HALOGEN CONTENT (ASME T-641)	0.24010	%		

City, Date:West Seneca, 03/14/23 Signed by N Abbass

Kemper System America, Inc.
1200 North America Dr.
West Seneca, NY 14224
Phone No.: 716-558-2971
Fax No.: 716-558-2967
Website: www.kemper-system.com

Escaneado con CamScanner

Certificate of Analysis

(No. COA002017)

Kemper System America, Inc. | 1200 North America Dr. | 14224 West Seneca

Product Description: D101-A DEVELOPER GLOBAL 340G

Product No.:	40083	Lot:	2023020002
Date of Entry:	01/31/23	Release Date:	02/02/23
		Best before:	01/31/25

INCOMING QC of D101-A

Using QSF 970 Aerosol Evaluation Form, determine if the performance is passing or failing.

Feature / Inspection Method	Actual Value	Unit	LTL	UTL
CHLORINE CONTENT (ASME BPCD SEC V SD-8	0.01000	%		+1.00000
SULPHUR CONTENT (ASME BPCD SEC V SD-12	0.09000	%		+1.00000
FLOURINE CONTENT (ASME BPCD SEC V SE-16	0.00000	%		+1.00000
TOTAL HALOGEN CONTENT (ASME T-641)	0.10000	%		

City, Date:West Seneca, 02/02/23 Signed by N Abbass

Kemper System America, Inc.
1200 North America Dr.
West Seneca, NY 14224
Phone No.: 716-558-2971
Fax No.: 716-558-2967
For Sale: www.kempersystem.com

CS Digitalizado com CamScanner


PENETRANT
1
CLEANER
2
DEVELOPER
3
City, Date:West Sene

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

CLIENTE

ICMO SAS

INSPECCIÓN REALIZADA POR

ING MILLER JOSE RIVERA.
INSPECTOR
NIVEL II VT, PT, MT, UT, PAUT.
INTERVENTOR EN RECUBRIMIENTOS

Bogotá D.C 06 de agosto de 2024

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

CONTENIDO

1. Objeto
2. Alcance
3. Términos y definiciones
4. Normas de referencia
5. Certificación y calificación de personal
6. Equipo utilizado
7. Equipo inspeccionado
8. Procedimiento de inspección
   - **8.1** Método de inspección
   - **8.2** Preparación de la superficie
   - **8.3** Aplicación del penetrante
   - **8.4** Remoción de exceso de penetrante
   - **8.5** Secado
   - **8.6** Aplicación del revelador
   - **8.7** Criterios de aceptación
9. Reporte de inspección
10. Técnica
11. Resultados de inspección

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

1. OBJETIVO

Determinar la presencia de defectos superficiales en la soldadura mediante la inspección por líquidos penetrantes (PT), evaluando la presencia de fisuras, grietas, socavados, faltas de fusión y poros, defectos abiertos a la superficie.

2. ALCANCE

Fijar las condiciones exigibles en la realización de Ensayos No Destructivos por medio de líquidos penetrantes y el cubrimiento de pruebas estándar para el ensayo de líquidos penetrantes visibles a la luz día, removibles con solvente (tipo 2 método C) en la inspección de materiales, en la detección de defectos y discontinuidades superficiales para garantizar la calidad en cuanto a sanidad del cordón de soldadura.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

PT: siglas en ingles de inspección por líquidos penetrantes (Penetrant Testing)

Calificación: Es la demostración, por medio de exámenes debidamente preparados, que un individuo posee los conocimientos teóricos y las habilidades necesarias para desarrollar correctamente una inspección no destructiva, aplicar correctamente los criterios de aceptación y rechazo, y elaborar un reporte de inspección.

Certificación: Es un testimonio escrito extendido por una agencia central certificadora (ISO 9712) o por una empresa contratante (SNT-TC-1A) que demuestra que un individuo ha sido capacitado, que está debidamente calificado y tiene la experiencia suficiente para emplear correctamente un método de inspección no destructiva.

Indicación: Es lo que marca el ensayo no destructivo (END), que pueden ser no relevantes o relevantes, la primera no afecta el comportamiento de la estructura y la segunda afecta el comportamiento de la estructura (no pasa según código).

Defecto: Es una discontinuidad o grupo de discontinuidades cuyas indicaciones no cumplen con los criterios de aceptación especificados.

Ángulo de contacto: Para un buen penetrante, el ángulo de mojado debería ser cero. Este valor, teóricamente resultaría en el esparcimiento completo del penetrante sobre la superficie y la penetración en todas las discontinuidades superficiales. En la práctica, la mayoría de los penetrantes presentan ángulos menores a 5°. Este ángulo es función de la energía interfacial o tensión superficial entre las interfaces involucradas.

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

Viscosidad: La viscosidad de un fluido es la propiedad consecuencia de la fricción o roce interno entre sus moléculas, oponiendo resistencia al deslizamiento entre dos capas sucesivas.

Tensión superficial: La tensión superficial de un líquido, es la fuerza que tiende a mantener unida la superficie de este.

4. NORMAS DE REFERENCIA:

ASTM E165, Standard Test Method for Liquid Penetrant Examination

ASTM E1417, Standard Practice for Liquid Penetrant Testing

ASNT SNT-TC-1A, Recommended Practice for Personal Qualification and Certification in Nondestructive Testing.

AWS B1.10 GUIDE FOR THE NONDESTRUCTIVE EXAMINATION OF WELDS

AWS B1.11 GUIDE FOR THE VISUAL EXAMINATION OF WELDS

GTC110 GUIA PARA LA INSPECCION VISUAL DE SOLDADURAS.

Código AWS D1,1/D1,1M:2020, Estructural Welding Code - Steel

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

5. CERTIFICACION Y CALIFICACION DE PERSONAL

El personal que realizará las operaciones estará debidamente calificado y certificado en el método como Nivel I y Nivel II según SNT-TC-1A suplemento A.

El Ingeniero y/o técnico Nivel II tendrá a su cargo interpretar los resultados obtenidos durante el trabajo y determinará su aceptabilidad de acuerdo con los estándares establecidos por el código a aplicar.



Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

1. EQUIPO UTILLIZADO

Kit de líquidos penetrantes conformados por penetrante visibles, reveladores y limpiador.

2. EQUIPO INSPECCIONADO

REFORZAMIENTO PUENTE PIÑALITO

3. PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

El inspector antes de realizar el examen de líquidos penetrantes, la superficie a ser examinada y todas las áreas adyacentes, dentro de una distancia mínima de 25mm, deberán estar secas y libres de suciedades, grasa, escamas, escorias de soldadura y otros materiales extraños que puedan encubrir las aberturas superficiales o interferir de algún modo con el examen.

Para realizar la limpieza, se usará grata manual o eléctrica para remover cualquier irregularidad superficial que pueda enmascarar las indicaciones de discontinuidades inaceptables. Además, se empleará cualquier tipo de removedor comercial.

Después de la limpieza, se permitirá el secado de todas las superficies a ser examinadas por evaporación normal. El periodo mínimo de tiempo para que la solución empleada en la limpieza se evapore, se determinara de acuerdo con la humedad relativa existente en el lugar de la prueba.

8.1 Método de inspección

El rango de temperatura sobre la pieza a examinar estar entre 16ºC y 51ºC permaneciendo constante durante el ensayo.

8.2 Preparación de la superficie

La superficie para examinar debe estar limpia, es decir exenta de aceite, grasa, óxidos, pintura, calamina, fundentes de soldadura, salpicaduras y otros cuerpos extraños capaces de ocultar los defectos en evidencia. Dicha limpieza se puede realizar con grata metálica, cepillo o pulidora.

8.3 Aplicación del penetrante

Se empleará penetrante en spray de alto color de contraste con el revelador.

El penetrante es un líquido capaz de penetrar en las más pequeñas discontinuidades abiertas a la superficie de una pieza, esta penetrabilidad es una combinación de la capilaridad, viscosidad y tensión superficial.

El tiempo de penetración es máximo 20 minutos, la aplicación se realiza a una distancia de 20-30 cms.

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

8.4 Remoción del exceso del penetrante

Después del periodo adecuado sobre el tiempo de actuación del penetrante, el exceso será removido por fricción repetidamente con paño, trapo seco, papel absorbente (que no deje residuos de este) en toda la superficie.

La eliminación del exceso del penetrante debe ser total a fin de no obtener indicaciones falsas al aplicar el revelador tomando los cuidados necesarios para minimizar la remoción del penetrante y antes de la aplicación del revelador.

8.5 Secado

El revelador debe ser aplicado sobre superficie seca, para ello se emplea la evaporación natural, trapos secos y limpios.

8.6 Aplicación del revelador

Serán usados reveladores en espray de tipo húmedo (polvo suspendido en líquido volátil-alcohol etílico).

Antes de la aplicación del revelador, este deberá ser vigorosamente agitado para asegurar una adecuada dispersión de las partículas suspendidas en él.

Después de efectuar la remoción del exceso de penetrante, se aplicará inmediatamente el revelador de forma uniforme en toda la superficie inspeccionada evitando goteras y exceso del mismo, con una distancia mínima de 25cm entre la pieza y la boca del spray.

El tiempo en que actúa el revelador es de 30 segundos a un minuto pudiendo alargarse hasta 5 minutos debido a las condiciones atmosféricas del momento.

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

8.7 Criterios de Aceptación

Table 6.1
Visual Inspection Acceptance Criteria (see 6.9)

Discontinuity Category and Inspection Criteria	Statically Loaded Nontubular Connections	Cyclically Loaded Nontubular Connections
(1) **Crack Prohibition** Any crack shall be unacceptable, regardless of size or location.	X	X
(2) **Weld/Base Metal Fusion** Complete fusion shall exist between adjacent layers of weld metal and between weld metal and base metal.	X	X
(3) **Crater Cross Section** All craters shall be filled to provide the specified weld size, except for the ends of intermittent fillet welds outside of their effective length.	X	X
(4) **Weld Profiles** Weld profiles shall be in conformance with 5.24.	X	X
(5) **Time of Inspection** Visual inspection of welds in all steels may begin immediately after the completed welds have cooled to ambient temperature. Acceptance criteria for ASTM A514, A517, and A709 Grade HPS 100W [HPS 690W] steels shall be based on visual inspection performed not less than 48 hours after completion of the weld.	X	X
(6) **Undersized Welds** The size of a fillet weld in any continuous weld may be less than the specified nominal size (L) without correction by the following amounts (U): L_s specified nominal weld size, in [mm] — U_s allowable decrease from L_s in [mm] ≤ 3/16 [5] — ≤ 1/16 [2] 1/4 [6] — ≤ 3/32 [2.5] ≥ 5/16 [8] — ≤ 1/8 [3] In all cases, the undersize portion of the weld shall not exceed 10% of the weld length. On web-to-flange welds on girders, undercut shall be prohibited at the ends for a length equal to twice the width of the flange.	X	X
(7) **Undercut** (A) For material less than 1 in [25 mm] thick, undercut shall not exceed 1/32 in [1 mm], with the following exception: undercut shall not exceed 1/16 in [2 mm] for any accumulated length up to 2 in [50 mm] in any 12 in [300 mm]. For material equal to or greater than 1 in [25 mm] thick, undercut shall not exceed 1/16 in [2 mm] for any length of weld.	X	
(B) In primary members, undercut shall be no more than 0.01 in [0.25 mm] deep when the weld is transverse to tensile stress under any design loading condition. Undercut shall be no more than 1/32 in [1 mm] deep for all other cases.		X
(8) **Porosity** (A) CJP groove welds in butt joints transverse to the direction of computed tensile stress shall have no visible piping porosity. For all other groove welds and for fillet welds, the sum of the visible piping porosity 1/32 in [1 mm] or greater in diameter shall not exceed 3/8 in [10 mm] in any linear inch of weld and shall not exceed 3/4 in [20 mm] in any 12 in [300 mm] length of weld.	X	
(B) The frequency of piping porosity in fillet welds shall not exceed one in each 4 in [100 mm] of weld length and the maximum diameter shall not exceed 3/32 in [2.5 mm]. Exception: for fillet welds connecting stiffeners to web, the sum of the diameters of piping porosity shall not exceed 3/8 in [10 mm] in any linear inch of weld and shall not exceed 3/4 in [20 mm] in any 12 in [300 mm] length of weld.		X
(C) CJP groove welds in butt joints transverse to the direction of computed tensile stress shall have no piping porosity. For all other groove welds, the frequency of piping porosity shall not exceed one in 4 in [100 mm] of length and the maximum diameter shall not exceed 3/32 in [2.5 mm].		X

Note: An "X" indicates applicability for the connection type; a shaded area indicates non-applicability.

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

Lugar:	Proyecto:		Reporte No.
PIÑALITO / META	ESTRUCTURA METÁLICA REFORZAMIENTO PUENTE PIÑALITO		PI-01
11.1 ESPECIFICACIONES			
Norma Criterios Aceptación:	Material:	Empresa:	Dirigido a:
AWS D1.5/2020	ASTM A 572 G50	ICMO SAS	ING. CAMILO TORRES
11.2 INSPECCIÓN			
Ciudad / Dpto.:	Dirección:	Elemento Evaluados:	Tipo de Junta:
PIÑALITO / META	PIÑALITO (META)	angulo reforzamiento	FILETE
Limpieza (antes de iniciar procedimiento):	Procedimiento No.	Clasificación por tipo y método:	Limpieza (antes de iniciar procedimiento):
SSPC-SP-2 Manual		Tipo II método C	SSPC-SP-2 Manual
Marca KIT.	Limpiador ref./No. Lote	Penetrante ref./no. lote/tp(min)	Revelador ref./no. lote/tp(min)
MAGNAFLUX	MAGNAFLUX	MAGNAFLUX	MAGNAFLUX

LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR NUESTRO CLIENTE PARA EL DESARROLLO DE EVALUACIONES, CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN

11.3 RESULTADO

Ubicación	Junta	Foto	Longitud	Aprobado	No Aprobado	Observaciones
ALEATORIO	J1	1	******	CONFORME CON EL CÓDIGO DE FABRICACIÓN	----------	NO SE ENCONTRARON INDICACIONES RELEVANTES SEGÚN CODIGO AWS D 1.5/2020 (Tabla 8.1)
ALEATORIO	J2	2	******		----------	
ALEATORIO	J3	5	******		----------	
ALEATORIO	J4	6	******		----------	
ALEATORIO	J5	7	******		----------	
ALEATORIO	J6	8	******		----------	
ALEATORIO	J7	9	******		----------	
ALEATORIO	J8	10	******		----------	
ALEATORIO	J9	11	******		----------	
ALEATORIO	J10	12	******		----------	
ALEATORIO	J11	13	******		----------	

(FS) Fisura	(TF) Traslape en frio	(SE) Socavado externo	(IF) Fusión incompleta	(PAG) Porosidad agrupada	(PAS) Porosidad aislada	(GT) Grietas transversales

ELABORO:	APROBO:	INTERVENTOR:
ING MILLER JOSE RIVERA RICARDO Inspector NIVEL II M.RIVERA@ICMO.COM.CO Movil: 3107285180	Firma:	Firma:

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

Lugar:	Proyecto:		Reporte No.
PIÑALITO/ META	ESTRUCTURA METÁLICA REFORZAMIENTO PUENTE PIÑALITO		PI-01
11.1 ESPECIFICACIONES			
Norma Criterios Aceptación:	Material:	Empresa:	Dirigido a:
AWS D1.5/2020	ASTM A 572 G50	ICMO SAS	ING. CAMILO TORRES
LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR NUESTRO CLIENTE PARA EL DESARROLLO DE EVALUACIONES, CUMPLE CON EL PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN			

11.3 RESULTADO

Ubicación	Junta	Foto	Longitud	Aprobado	No Aprobado	Observaciones
ALEATORIO	J12	14	******	CONFORME CON EL CÓDIGO DE FABRICACIÓN	----------	NO SE ENCONTRARON INDICACIONES RELEVANTES SEGÚN CODIGO AWS D 1.5/2020 (Tabla 8.1)
ALEATORIO	J13	15	******		----------	
ALEATORIO	J14	16	******		----------	
ALEATORIO	J15	1	******		----------	
ALEATORIO	J16	2	******		----------	

FIN DE LA EVALUACIÓN

(FS) Fisura	(TF) Traslape en frio	(SE) Socavado externo	(IF) Fusión incompleta	(PAG) Porosidad agrupada	(PAS) Porosidad aislada	(GT) Grietas transversales


ELABORO:	APROBO:	INTERVENTOR:
ING MILLER JOSE RIVERA RICARDO Inspector NIVEL II MRIVERA@ICMO.COM.CO Móvil: 3107285180	Firma:	Firma:

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.


INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA 1
JUNTA 1 Y 15



FOTOGRAFIA 2
JUNTA 2 Y 16



FOTOGRAFIA 3



FOTOGRAFIA 4

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA 5
Junta 3



FOTOGRAFIA 6
Junta 4



FOTOGRAFIA 7
Junta 5



FOTOGRAFIA 8
Junta 6

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA 9
Junta 7



FOTOGRAFIA 10
Junta 8



FOTOGRAFIA 11
Junta 9



FOTOGRAFIA 12
Junta 10

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTOGRAFIA 13
Junta 11



FOTOGRAFIA 14
Junta 12



FOTOGRAFIA 15
Junta 13



FOTOGRAFIA 16
Junta 14

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

INFORME DE INSPECCIÓN POR EL METODO DE LIQUIDOS PENETRANTES

CONSTRUCCION DE UNIONES SOLDADAS

9. TÉCNICA

Es un método utilizado para la detección de discontinuidades superficiales, siempre y cuando éstas se encuentren abiertas a la superficie y el material no sea poroso. La técnica consiste en la aplicación de líquidos penetrantes sobre la pieza el cual penetra en las discontinuidades abiertas a la superficie por principios de capilaridad, después se retira el exceso de penetrante por medio de un líquido removedor y seguidamente se aplica un revelador. El líquido penetrante contenido en la discontinuidad será absorbido por el revelador y se hará visible sobre la superficie de la pieza indicando la presencia de esta. La habilidad del líquido penetrante de fluir sobre la superficie y entrar en las discontinuidades depende de: la Limpieza de la superficie, la tensión superficial del líquido, configuración de la cavidad, ángulo de contacto del líquido, habilidad del líquido para mojar la superficie, limpieza de la cavidad y tamaño de la abertura de la cavidad. Las discontinuidades típicas que se pueden encontrar mediante líquidos penetrantes son: discontinuidades superficiales, costuras, grietas, pliegues, porosidad y fugas.

10. RESULTADOS DE INSPECCION

En la inspección por líquidos penetrantes a muestras de la estructura metálica proyecto Estructura metálica **ESTRUCTURA METÁLICA REFORZAMIENTO PUENTE PIÑALITO, NO** se encuentran indicaciones relevantes.

En términos generales las soldaduras inspeccionadas **SI** cumplen con los requerimientos del código **AWS D 1.5/ 2020.**

La técnica de tintas penetrantes es para identificar discontinuidades abiertas a la superficie, el método de tintas penetrantes **NO** garantiza que por dentro de la soldadura este buena.
Estas verificaciones de soldadura se realizaron de cuerdo a la exigencia del cliente.

La estructura al momento de la evaluación se encontraba en producción y en buenas condiciones.

ELABORO:	APROBO:	INTERVENTOR:
Firma: ING MILLER JOSE RIVERA RICARDO Inspector NIVEL II M.RIVERA@ICMO.COM.CO Móvil: 3107285180	Firma:	Firma:

Este documento pertenece **QUALITY CONTRO TEST S.A.S** se prohíbe reproducirlo total o parcialmente, o guardarlo en un sistema electrónico sin previa autorización escrita de Gerencia.
Esta copia digital es **NO** controlada.

553

5591

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.547-6

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022 V02
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PIÑALITO	13	7	2024	9:00 a.m.	2:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	211 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUEJAR, DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META.		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	

Tiempo de Inactividad (HORAS)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
ING RESIDENTE						
CAPATAZ	2	SI		Mantenimiento manual	1	
HSEQ	1	SI		Vehículo	2	
MONTALADORES	6	SI		Transporte	1	
SOLDADORES	8	SI		Equipo de oficina	3	
AYUDANTES	5	SI		Equipo de soldadura	5	
CELADOR	1	SI		Palustre	2	
ALMACENISTA	1	SI				
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SPEC)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (BPM)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		0.58	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 0610137 0562459 CND	
Nombre Carlos Alcon Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 157511 8925126 CND	
Nombre Jorge Eliecer Diaz Collazo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25252 194070 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Tibata	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 63262 294712	

Cualquier otra persona vinculada (profesionales, técnicos, auxiliares, etc.) que participe en las actividades contractuales y requiera su firma

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 13 No. 42-01 Lotes 1-3
CGP Proyecto Urbano Villavi
contactenos@aim.gov.co
Teléfono (608) 6

554

1686

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112 ESP FR 022 V06
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	12	7	2024	6:00 a.m	5:00 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 DE 2024	PROYECTO N°	20240050G0062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA RETROALIMENTACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUEJAR, DE LA VÍA QUE COMUNICA A EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SALTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
TIEMPO DE TRABAJO PERDIDO				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	ERP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE	1	N				
CAPATAZ	1	N		Electrobombas	1	
PEON	3	N		Vibrador	2	
MONTADORES	6	N		Retroexcavadora	1	
SOLDADORES	3	N		Equipo de oxicorte	1	
AYUDANTES	3	N		Equipo de soldadura	5	
CELADOR	1	N		Volqueta	3	
ALMACENISTA	1	N				
TOPOGRAFO	2	N				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE - REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		0.95	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Jhonathan Steven Ortiz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0910370504334 CND	
Nombre: Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 1073439925326 CND	
Nombre: Jorge Eliecer Diaz Gallego	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194070 CND	
Nombre: Juan Camilo Pulido Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 68202-234112	

Diligencia de presentes visitas de seguridad, especificando, en cada caso, el nombre y cargo de quien firma y su número de identificación

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el sistema integrado de documentos

Calle 15 No. 40 -31 Edificio [illegible]
PBX [illegible]
[illegible]
Villavicencio - Meta

555

191

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.347-3

BITACORA DE OBRA
110-ECP-FR-022-V05
03/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	15	7	2024	8:00 a.m.	4:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	371 DE 2024	PROYECTO N°	20240065000062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	374 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
DESPEJADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Terminado el trabajo por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	ESTADO	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ING. RESIDENTE	1	SI				
CAPATAZ	2	SI		Herramienta menor	1	
HSEQ	1	SI		Vibrador	2	
MONTADORES	6	SI		Formaleta	1	
SOLDADORES	3	SI		Equipo de soldadura	3	
AYUDANTES	4	SI		Equipo de izaje	1	
CELADOR	1	SI		Polipasto	3	
ALMACENISTA	1	SI				
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PYP DE LA CONSTRUCTIVA (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE - REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		0.65	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	M				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 501037-059249 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 15741-0925126 CND	
Nombre Jorge Enrique Baez Galindo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-124878 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 10202-294112	

Cuando se requieran más de cuatro profesionales especialistas u otras entidades, se deberán diligenciar otros formatos de Bitácora de obra.

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 B No. 40-18 Edificio [illegible]
Oficina [illegible]
Villavicencio - Meta

556

1686

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.230.547-3

BITACORA DE OBRA
112-SCP-FR-032-V05
02/07/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	17	7	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 DE 2024	PROYECTO N	2024005506052
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PUERTO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 254 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x	x	
Tiempo de trabajo perdido				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ING. RESIDENTE	1	SI				
CAPATAZ	2	SI		Herramienta menor	1	
FIJOS	1	SI		Winches	2	
MONTADORES	6	SI		Tronzadora	1	
SOLDADORES	2	SI		Equipo de oxicorte	1	
AYUDANTES	5	SI		Equipo de soldadura	5	
OBLADOR	1	SI		Peldaños	3	
ALMACENISTA	1	SI				
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		6.85	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 051037-056439 CND	
Nombre: Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 15741-195136 CSD	
Nombre: Jorge Eliecer Baez Galeon	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 2520-194708 CND	
Nombre: Juan Carlos Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 41202-298712	

Cualquier observación visitas de profesionales, especialistas, otras entidades, incluir las observaciones generadas y validadas o rechazadas

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Carrera 40 No. 40-01 Edificio [illegible]
PBX [illegible]
contactenos@ami.meta.gov.co
https://ami.meta.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.147-3

BITACORA DE OBRA
VER FOR-FR-072-V05
02/10/2020

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	19	7	2024	6:00 a.m	5:00 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 DE 2024	PROYECTO N°	2024006500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUEJAR, DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 258 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 296 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo Inestable(Lluvia)				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
ING RESIDENTE	1	W				
CAPATAZ	2	W		Retromezcladora	1	
HSEQ*	1	W		Vibrador	2	
MONTADORES	6	W		Bobcat	1	
SOLDADORES	2	W		Equipo de oxicorte	1	
AYUDANTES	2	W		Equipo de soldadura	1	
CELADOR	1	W		Polipasto	2	
ALMACENISTA	1	W				
PINTOR	2	W				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		6.80	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 1010374597-439 CND	
Nombre: Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 15745-0925136 CND	
Nombre: Jorge Eliecer Diaz Galindo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-109978 CND	
Nombre: Juan Camilo Posada Valella	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 61202-234712	

Diligencia la presente visita de inspección el representante y otras entidades, presentan observaciones, aclaraciones y se firma a continuación:

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 44-46 Edificio [illegible]
CC Palmeras Oficina [illegible]
[illegible]@ani.gov.co
https://www.ani.gov.co

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.547-6

BITACORA DE OBRA

112-ECP-FR-032-V05
03/10/2023

CIUDAD Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA Y PINALITO	19	7	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024006500063
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA N° 254 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo de Varada (en horas)				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
ING RESIDENTE	1	M				
CAPATAZ	2	M		Retroexcavadora mixta	1	
HSEQ	1	M		Volqueta	2	
MONTADORES	6	M		Tractocamion	1	
SOLDADORES	3	M		Equipo de oxicorte	1	
AYUDANTES	8	M		Equipo de soldadura	5	
CELADOR	1	M		Planta eléctrica	1	
ALMACENISTA	1	M				
PINTOR	2	M				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE - REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		0.00	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Ingeniero Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 1015437459 CND	
Ingeniero Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 1075413975126 CND	
Ingeniero Jorge Elmer Baez Gaona	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194859 CND	
Ingeniero Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 1-6302-194752	

Cuando se requieran visitas de profesionales externos a la obra, indicarlo, con nombre, descripción, cargo, firma y observación

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 33 No. 40-51 Edificio [illegible]
CC Primavera Plaza Local [illegible]
contacto@aim-meta.c
[illegible]-aim-meta.c

559

(691

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT: 900.820.547-9

BITACORA DE OBRA

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	20	7	2024	8:00 a.m.	2:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE DOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA (META), DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	5 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x	x	

Tiempo de atención por turnos

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
ING. RESIDENTE	1	SI				
CAPATAZ	2	SI		Mini cargadora multiuso	1	
HSEQ	1	SI		Vehículo	2	
MONTADORES	6	SI		Formaleta	1	
SOLDADORES	3	SI		Equipo de soldadura	3	
AYUDANTES	3	SI		Equipo de soldadura	5	
CELADOR	1	SI		Pulidora	3	
ALMACENISTA	1	SI				
PINTOR	3	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	M				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 098341-050439 CND	
Nombre: Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 152341-0226126 CND	
Nombre: Jorge Eliecer Baez Garrido	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194030 CND	
Nombre: Juan Camilo Posada Varon	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 63202-294713	

Quienes no firmaron están de acuerdo con lo consignado en la presente bitácora, no presentan observaciones, anexos y no tienen novedades

Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	
Nombre:		N° Mat. Profesional:	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 35 No. 40-04 Colinas I y II
CC. Praderas Vistahermosa
contactenos@ami-meta.c
http://ami-meta.c

560

1692

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.541-9

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V06
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PRADITO	31	7	2024	6:00 a.m.	2:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 DE 2024	PROYECTO N°	2024006500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEJAR, DE LA VIA QUE CONDUCE A EL CENTRO POBLADO DE PRADITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X	X	
Tiempo de Standby por lluvia				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML				
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Jhoiethan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 68183-0592439 CND	
Nombre: Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 157341 5025126 CND	
Nombre: Jorge Eliecer Baez Galeano	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25262 19689 CND	
Nombre: Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 13202-294192	

Cualquier persona que ejerza alguna de las profesiones relacionadas en las actividades, especialidades y especialidades asociadas a la obra, deberá firmar

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

NOTA: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-15 Lotes 1 - 2
CC Parque Industrial VILLAVI
www.infraestructuradelmeta.gov.co
Villavicencio - Meta

561

1693

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.947-5

BITACORA DE OBRA
112.ECP.FR.022.V02
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	22	7	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 DE 2024	PROYECTO N°	2024006500082
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA N° 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
ESTABLE				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x	x	
Tiempo de Garantía (por horas)				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	ERP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INGENIERO RESIDENTE	1	N				
CAPATAZ	1	N		Herramienta menor	1	
HSEQ	1	N		Vehículo	2	
MONTADORES	6	N		Retroexcavadora	1	
SOLDADORES	3	N		Equipo de corte	3	
AYUDANTES	3	N		Equipo de soldadura	5	
OPERADOR	1	N		Pulidora	2	
ALMACENISTA	1	N				
PINTOR	2	N				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1010570640459 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1057431925126 CND	
Nombre Jorge Eliecer Diaz Ramirez	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25262 194010 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1.6292.396712	

Si durante la ejecución del proyecto se requiere de otros profesionales, se registran aquí con su firma y se firma en la siguiente:

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 - 31 Locales 1 - 2
Centro Administrativo Departamental
Villavicencio (Meta)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.547-5

BITACORA DE OBRA
113-FOR-FR-022-V06
02/10/2023

CIUDAD Y MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PUBLITO	23	7	2024	9:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 DE 2023	PROYECTO N°	2024005500082
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE CONDUCE AL CENTRO POBLADO DE PARATO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de Ejecución por Horas		0 DE 8 horas		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	ESP.	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ING. RESIDENTE	1	SI				
CAPATAZ	2	SI		Herramienta menor	1	
HSEQ	1	SI		Winches	2	
MONTADORES	8	SI		Pirnzadora	1	
SOLDADORES	3	SI		Equipo de oxicorte	3	
AYUDANTES	3	SI		Equipo de soldadura	5	
OBLADOR	1	SI		Pinzadoras	3	
ALMACENISTA	1	SI				
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	DESCRIPCION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROYECTO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonatan Somer Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional 1052397105836 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional 1072411926126 CND	
Nombre Jorge Enrique Baez Guarin	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional 25702 134870 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional 68202 224713	

Cuando se presenten visitas de profesionales especializados o ajenos a la obra, se registrará observaciones generales y se firmará a continuación.

Nombre		Nº Mat. Profesional	
Nombre		Nº Mat. Profesional	
Nombre		Nº Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Cra 15 No. 42-01 Locales 1-1
Centro Empresarial Granada Vista
contactenos@aim.meta.gov.co
https://aim.meta.gov.co

563

1695

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Nit: 900.220.147-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022-V05
02/07/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	27	7	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	273 DE 2024	PROYECTO N°	2024006500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		

Tiempo productivo/No productivo

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ING. RESIDENTE	1	SI				
CAPATAZ	2	SI		Herramientas menor	1	
OFICIAL	1	SI		Winches	2	
MONTADORES	6	SI		Retroexcavadora	1	
SOLDADORES	3	SI		Equipo de corte	1	
AYUDANTES	5	SI		Equipo de soldadura	1	
OPERADOR	1	SI		Pinzas	2	
ALMACENISTA	1*	SI				
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCEDIMIENTOS (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1052717059 ALEJ CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1537439925 136 CND	
Nombre Jorge Eliecer Baez Galindo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-84078 CND	
Nombre Juan Carlos Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 68393-244112	

Quienes suscriben declaran de la veracidad y exactitud de la información consignada en el presente documento y se comprometen a cumplir lo aquí pactado

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 33-01 Lobby 1-1
Cel: 3144444444 - 3144444444
contactenos@aim-meta.gov
http://aim-meta.gov

564

1696

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.347-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022 V03
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	25	7	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 DE 2024	PROYECTO N°	2024006500082
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUEJAR DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA N° 251 DEL 19 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	

Tiempo Perdido por Lluvia:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ING. RESIDENTE	1	SI				
CAPATAZ	1	SI		Herramienta menor	1	
HSEQ	1	SI		Winches	2	
MONTADORES	6	SI		Trazadora	1	
SOLDADORES	3	SI		Equipo de corte	2	
AYUDANTES	3	SI		Equipo de soldadura	5	
OXICADOR	1	SI		Pescante	2	
ALMACENISTA	1	SI				
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Ingeniero Jhonattan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 501027-052485 CND	
Ingeniero Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 157461-092136 CND	
Ingeniero Jorge Eliecer Blanco Guevara	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-194909 CND	
Ingeniero Juan Camilo Peñuela Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 63503-254712	

Cualquier observación visitas de profesionales, especialistas, entidades de control, observaciones generales o relativas a contratación

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Locales 1 y 2
CC Plaza Mayor La Grama Villavicencio
www.ainfraestructuradelmeta.gov.co
Villavicencio - Meta - Colombia

565

697

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.547-3

BITACORA DE OBRA

112-FOR-FR-022 V08
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	29	7	2024	8:00 am	5:00 p.m

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	211 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	213 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE CONDUCE EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 351 DEL 19 DE MAYO DE 2024 Y No. 354 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x	x	

Tiempo de trabajo por Turno:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
INTERVENTOR	1	SI				
CAPATAZ	1	SI		Herramientas Menor	1	
HSEQ	1	SI		Vehiculo	2	
MONTADORES	4	SI		Guadañadora	1	
SOLDADORES	3	SI		Equipo de soldadura	3	
AYUDANTES	3	SI		Equipo de oxiacetileno	3	
OBLADOR	1	SI		Pulidora	3	
ALMACENISTA	1	SI				
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO SI/NO
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1015974500-439 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1013413925126 CND	
Nombre Jorge Oscar Baez Galindo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 193676 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 14202 234712	

Cualquier modificación debe ser descrita en observaciones y notificada inmediatamente al residente / interventor, supervisor y/o director de interventoría

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 -01 Edificio 1-1
CC Parque Urbano Villa...
Direccion@ami-meta
Villavicencio-meta

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.941-8

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-022 V05
02/08/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	27	7	2024	8:00 a.m.	12:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	213 DE 2024	PROYECTO N°	2024000500052
CONTRATO INTERVENTORIA N°	214 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO MAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MARQUE	PARCIAL	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo perdido por lluvias		0 horas		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	ERP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
RD RESIDENTE	1	N				
CAPATAZ	2	N		Herramienta menor	1	
HSEQ	1	N		Vehículo	2	
MONTADORES	6	N		Formaleta	1	
SOLDADORES	2	N		Equipo de oxicorte	3	
AYUDANTES	3	N		Equipo de soldadura	5	
OBLADOR	1	N		Pulidora	2	
ALMACENISTA	1	N				
PINTOR	2	N				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		100	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 501027-65642 CND	
Nombre Carlos Alfonso Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 157341-0925156 CND	
Nombre Jorge Eliecer Bello Garcia	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-134070 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 13202-234712	

Quienes no intervienen visitas de su profesión, son responsables ante terceros y entidades, se requiere citación de responsables y vigencia a permisión

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA

112.ECP.FR.022.V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	26	7	2023	8:00 a.m.	3:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	273 DE 2023	PROYECTO N°	2024005500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2023		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LOS ESTRIBOS, DESENGO Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE CONECTA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 1ro DE MAYO DE 2023 Y No. 276 DEL 14 DE MAYO DE 2023, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	x			
SOLEADO		x	x	
Tiempo de Inactividad por lluvias		3 horas		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	ESP.	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML				
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1015270540 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1057471925 CND	
Nombre Jorge Eliecer Baez Galeano	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25203 194018 CND	
Nombre Juan Carlos Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 63203-294712	

Firma(s) representante(s) visitante(s) (entidad(es) externa(s) que no pertenecen a la Agencia para la Infraestructura del Meta, su(s) cargo(s) y número(s) de identificación)

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-41 Local 1-1
CD Panorama Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co
https://aim.meta.gov.co

021

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.229.947-5

BITACORA DE OBRA
113.ECP.FR.032.V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	29	7	2024	6:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 DE 2024	PROYECTO N°	2024006500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEJAR DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 254 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	X			
SOLEADO		X	X	
Tiempo trabajado por (horas)		0,25 horas		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
RES. RESIDENTE	1	M				
CAPATAZ	2	M		Mantenimiento	1	
RESID.	1	M		Vehiculo	2	
MONTADORES	6	M		Ponteadora	1	
SOLDADORES	5	M		Equipo de montaje	2	
AYUDANTES	7	M		Equipo de soldadura	5	
DELADOR	1	M		Pulmon	3	
ALMACENISTA	1	M				
PINTOR	2	M				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SI/NO	CUMPLE CON PLANOS CONSTRUCTIVOS SI/NO
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		100	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Jonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0910-1020439-CND	
Nombre: Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 15741-992512-CND	
Nombre: Jorge Eliecer Baez Garcia	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194370 CND	
Nombre: Juan Camilo Posada Valois	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 13202-294712	

Cuando se presenten visitas de fiscalización, se debe anotar: nombre completo del visitante, entidad que representa, cargo que desempeña y motivo de la visita.

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Lotes 1, 1
CC Plaza de la Libertad Villavicencio
direccion@aim-meta.gov.co
http://aim-meta.gov.co

569

(20)

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.229.547-5

BITACORA DE OBRA
113-SCF-FR-023-V05
02/10/2020

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	30	7	2024	6:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA Nº	271 DE 2024	PROYECTO N	2024006500002
CONTRATO INTERVENTORIA Nº	274 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 254 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
SOLEADO				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo de la visita por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
ING. RESIDENTE	1	SI				
CAPATAZ	1	SI		Herramienta menor	1	
HSEQ	1	SI		Vehículo	2	
MONTADORES	4	SI		Guadañadora	1	
SOLDADORES	3	SI		Equipo Soldadura	3	
AYUDANTES	4	SI		Equipo Oxiacetilénico	1	
CELADOR	1	SI		Eslingas	2	
ALMACENISTA	1	SI				
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPEC	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO CUMP
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		110	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	Nº MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	Nº Mat. Profesional 1026587459 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional 1123413835 CND	
Nombre Jorge Elmer Diaz Galindo	DIRECTOR DE OBRA	Nº Mat. Profesional 25203-194070 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Nº Mat. Profesional 63202-294112	

Cualquier señalamiento, visita de autoridades, especialistas y otras entidades, se registrará, describiendo datos de la visita y anotando la observación

Nombre		Nº Mat. Profesional	
Nombre		Nº Mat. Profesional	
Nombre		Nº Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 37 N 6-66 Of. 1201 y 1
CC Primavera Plaza Local
contactenos@ami.meta.gov.co
http://ami.meta.gov.co

570

1202

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
111-FOR-FR-072-V05
03/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
VISTA HERMOSA / PINALITO	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
	31	7	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	311 DE 2024	PROYECTO N°	2024006620062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	314 DE 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUEJAR DE LA VÍA QUE CONJUNCA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA N° 257 DEL 16 DE MAYO DE 2024 Y NO. 254 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
SOLEADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	x			
SOLEADO		x	x	
Temperatura Mínima por Turnos		15		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	ERP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ING RESIDENTE	1	N				
CAPATAZ	2	N		Almacen de equipos	1	
HSEQ	1	N		Vibrador	2	
MONTADORES	6	N		Formaleta	1	
SOLDADORES	2	N		Equipo de oxicorte	2	
AYUDANTES	3	N		Equipo de soldadura	5	
OBLADOR	1	N		Pistola	2	
ALMACENISTA	1	N				
ENTIGIN	2	N				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE - REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1.00	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1010974593453 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 157341 8825125 CND	
Nombre Jorge Eliecer Baez Galindo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-134078 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Yepes	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 63202 254132	

Cuando se requiera validar información con otras entidades, (propietarios, vecindarios, comunidad, autoridades)

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 N.o 40-05 Edificio [illegible]
PBX: [illegible]
www.aim.meta.gov.co

571

1203

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-3

BITACORA DE OBRA
113-SGP-FR-022 V05
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	1	6	2024	6:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	371 de 2024	PROYECTO N°	2024005000062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	374 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUEJAR, DE LA VÍA QUE CONDUCE EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 261 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 266 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo de trabajo por turnos		1	0	

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ING RESIDENTE	1	si		Herramienta menor	1	
CAPATAZ	2	si		Vibrador	2	
INSPC	1	si		Formaleta	1	
MONTADORES	4	si		Equipo de oxicorte	1	
SOLDADORES	3	si		Equipo de soldadura	1	
AYUDANTES	3	si		Baldeta	3	
CELADOR	1	si		Equipo de pruebas ajustes	1	
ALMACENISTA	1	si		Compresor ingersoll rand 185	1	
Pintor	2	si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO OBRA
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE - REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		0.40	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA O TP PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Dimmer Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1016071552 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1574516926126 CND	
Nombre Jorge Eliecer Baez Garrido	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 194070 CND	
Nombre Juan Camilo Peñuela Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 63202 254712	

Cuando se requieran visitas de profesionales especializados a otras actividades, se realizan observaciones, anexando a esta hoja la información

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40 - 01 Lucky 1 - 1
CC. Plaza de la Hispanidad Local
contactenos@aim.meta.gov.co
TEL: (608) 6...

572

1704

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.275.947-5

BITACORA DE OBRA
312.ECP.FR.022 V05
02/08/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	3	6	2024	6:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 de 2024	PROYECTO N°	2024006500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA PAVIMENTACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA AL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA N° 251 DEL 19 DE MAYO DE 2024 Y NO 256 DEL 24 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
LLOVIENDO				
NUBLADO				
SOLEADO	X	X	X	

Tiempo de Suficiencia por Alertas

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RES RESIDENTE	1	si		Retroexcavadora (Buldog)	1	
CAPATAZ	2	si		Volqueta	2	
HSEQ	1	si		Motoniveladora	1	
MONTADORES	6	si		Equipo de oxicorte	3	
SOLDADORES	3	si		Compactador de rodillos	1	
AYUDANTES	2	si		Pulidoras	3	
CELADOR	1	si		Equipos de pintura airless	3	
ALMACENISTA	1	si		Compresor engomado (gasolina)	1	
PINTOR	2	si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SINO)	CUMPLE CON PLANOS CONSTRUCTIVOS (SINO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		0.0m	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1010310560439 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1057343 5925126 CND	
Nombre Jorge Eliecer Baez Guarin	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 252013 5A870 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 11232 254812	

Cuando no pertenezcan cuadro de profesionales especificados, o datos erroneos, se registran observaciones generales y se firma y da identificación

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Locay 1 - 4
CC Plaza Principal Villavicencio
contactenos@aim.meta.gov.co
https://aim.meta.gov.co

573

5061

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.230.547-6

BITACORA DE OBRA
113-ESCRIT-022 V02
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	7	5	2024	8:00 a.m.	4:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 de 2024	PROYECTO N°	2024006500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SUMAPAZ DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA NO. 251 DEL 19 DE MAYO DE 2024 Y NO. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	

Tiempo perdido por lluvias

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
ING. RESIDENTE	1	Si		Herramienta menor	1	
CAPATAZ	2	Si		Volquetas	2	
HOBO	1	Si		Retroexcavadora	1	
MONTADORES	6	Si		Equipo de oxicorte	1	
SOLDADORES	4	Si		Equipo de soldadura	5	
AYUDANTES	3	Si		Pinzas	3	
CELADOR	1	Si		Equipo de pintura aplicada	3	
ALMACENISTA	1	Si		Compresor ingresa cada 125	1	
PINTOR	2	Si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CONTR.	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO CONTR.
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE - REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1.929	SI	SI
GANCHOLASTRE Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1010213592429 CND	
Nombre Carlos Adan Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 157341 8025126 CND	
Nombre Jorge Eliecer Baez Galindo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25262 194070 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 68202 294113	

Si existe un cambio de profesional responsable, especificar cuál, cuándo y por qué motivo, y anexar hoja de vida y tarjeta profesional.

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Prohibida la enmienda del documento en el módulo maestro de documentos.

Calle 15 No. 40-18 Lobby 1 - 1
PBX: (+57) (8) 673 0 673
www.inframeta.gov.co
Villavicencio - Meta

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.223.941-5

BITACORA DE OBRA
112-ECP-FR-023 V05
02/07/2021

CIUDAD I MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	4	5	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 de 2024	PROYECTO N°	2024006500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUAYURIBA DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 16 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 13 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
SOLEADO	X	X	X	
LLUVIOSO				
TORMENTA				
NUBLADO				

Fuente: Los Simios (2014)

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		15		
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhoiskhon Steven Cruz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 0936318540459 CND	
Nombre Carlos Alberto Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1523412025126 CND	
Nombre Jorge Eliecer Rios Gelindo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202168276 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 63202 234112	

Cualquier persona visitante de la obra que no se encuentre relacionada en el cuadro anterior, se identificará plenamente con nombre y cedula para su anotación

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 42 - 01 Lotes 1 - 1
C.C. Portal de la Urbana Villavo
Teléfono (608) 6 [illegible]
Vista Hermosa

575

121

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.543-5

BITACORA DE OBRA
112-ECH-FR-022-V05
02/19/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	5	8	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	371 de 2024	PROYECTO N	2024006500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	374 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X		
Tiempo Inestable por Lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
ING RESIDENTE	1	SI		Herramienta menor	1	
CAPATAZ	2	SI		Vibrador	2	
HSEQ	1	SI		Bomba H2O	1	
MONTADORES	4	SI		Equipo de izaje	1	
SOLDADORES	4	SI		Equipo de soldadura	5	
PINTORES	2	SI		Pistolas	1	
OPERADOR	1	SI		Equipo de pintura airless	2	
ALMACENISTA	1	SI		Compresor de gasolina 185	1	
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DISEÑO	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO DISEÑO
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1.1279	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Ingeniero Jhojuan Esteven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1018471650 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1517351922 CND	
Nombre Jorge Eliecer Ojeda Quiroga	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-194870 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 63202-294113	

Cuando se presente la visita de un profesional, esta se indicara en el cuadro establecido, se relacionara el objeto de la visita y se firmara la misma.

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 42-01 Locales 1-5
CC. Primavera Victoria Plaza
contactenos@am.meta.gov.co
https://am.meta.gov.co

576

896

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900.899.597-3

BITACORA DE OBRA
332-BOF-FR-020 V05
02/19/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	7	5	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	273 de 2024	PROYECTO N	2024006500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE CONDUCE A EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 16 DE MAYO DE 2023 Y No. 256 DEL 19 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x	x	
Tiempo de Standby por lluvias				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EXP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
ING. RESIDENTE	1	si		Retroexcavadora mini	1	
CAPATAZ	2	si		Vibrador	2	
HSEQ	1	si		Formaleta	4	
MONTADORES	4	si		Equipo de soldadura	3	
SOLDADORES	4	si		Equipo de oxiacetileno	1	
AYUDANTES	2	si		Pulidora	3	
CELADOR	1	si		Equipos de pintura varios	3	
ALMACENISTA	1	si		Compresor engrapadora N/S	1	
PINTOR	3	si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1.129	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonatan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1010272420249 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 157341 6925126 2765	
Nombre Jorge Elvecr Baez Galindo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 154659 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 03202264712	

Cuando se presenten visitas de profesionales, especialistas u otras entidades, se anotará el objeto y los generalidades y se firmará a continuación

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 30-01 Edificio E.I.
CD Fray Jesús Antonio Velasco
contactenos@ajm.meta.c
https://ajm.meta.c

577

1201

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.720.547-5

BITACORA DE OBRA
112.ESP.FR.022.V08
02/10/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	1	7	2024	8:00 a.m.	2:00 P.M.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 de 2024	PROYECTO N°	20240065000062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR DE LA VIA QUE CONECTA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA NO. 251 DEL 30 DE MAYO DE 2024 Y NO. 256 DEL 31 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	x		x	
SOLEADO		x		
Turno destajeros festivos		DES horas		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
ING. RESIDENTE	1	SI		Herramienta menor	1	
CAPATAZ	2	SI		Vibrador	2	
NOBO	1	SI		Formaleta	1	
MAMPOSTEROS	4	SI		Equipo de soldadura	2	
OFICIALES	4	SI		Equipo de topografia	5	
AYUDANTES	2	SI		Planta eléctrica	3	
CELADOR	1	SI		Equipos de oficina y sistemas	3	
ALMACENISTA	1	SI		Compresor ingersoll rand 185	1	
PITOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO EXIGIDO
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	KL				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	KL				
MONTAJE - REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1.1279	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1010574602 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1015414925126 CND	
Nombre Jorge Eduar Baez Garzon	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-194070 CND	
Nombre Juan Camilo Penado Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 68202-294113	

Cuando se requieran visitas, favor tener los requerimientos de seguridad, señalización, dotación y entrega anticipada

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Validar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 13 No. 42-41 Edificio [illegible]
PBX [illegible]
[illegible]
[illegible]

578

1210

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
Nit: 900.220.987-5

BITACORA DE OBRA
11-BOPR-FR-022-V05
03/09/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	5	5	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	274 de 2024	PROYECTO N°	2024005500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA N° 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 MESES		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	

Tiempo de Ejecución por Dias: 0

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT.	ERP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT.	OBSERVACIONES
RESIDENTE	1	SI		Retroexcavadora mixtor	1	
CAPATAZ	2	SI		Vibrador	2	
OFICIO	5	SI		Formaleta	1	
MONTADORES	4	SI		Equipo de oxicorte	1	
SOLDADORES	4	SI		Equipo de soldadura	5	
AYUDANTES	2	SI		Eslingas	2	
OPERADOR	1	SI		Equipos de protección	1	
ALMACENISTA	1	SI		Compresor neumatico 185	1	
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		0.5692	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1010310503439 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1023413025126 CND	
Nombre Jorge Eliecer Diaz Osorio	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-194978 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 63700 294737	

Durante la prevención social de la enfermedad respiratoria COVID-19 se registran observaciones generales y se firma la presente

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 40-01 Locales 1-4
CC Primavera - Villavicencio
correo@ami-meta.gov.co
www.ami-meta.gov.co

579

121

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT 900 220 547 5

BITACORA DE OBRA
EJECUCIÓN 022 VIM
02/09/2024

CIUDAD I MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	9	9	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 de 2024	PROYECTO N°	2024005600082
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SALTO DORADO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 16 DE MAYO DE 2024 Y No. 254 DEL 17 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MARCAR	HORA	FECHA	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Tiempo desfavorable por horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
R/S RESIDENTE	1	SI		Motoniveladora	1	
CAPATAZ	2	SI		Vibrador	2	
HSEQ	1	SI		Retroexcavadora	1	
MONTADORES	4	SI		Equipo de soldadura	3	
SOLDADORES	4	SI		Equipo de soldadura	5	
AYUDANTES	2	SI		Pulidora	3	
OBLADOR	1	SI		Equipos de oxicorte y cortes	3	
ALMACENISTA	1	SI		Compresor (Agencia) carro 165	1	
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESOS CONSTRUCTIVOS (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		11275	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 1003120502-CND	
Nombre: Carlos Adan Vega Castañeda	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 1057441825-CND	
Nombre: Jorge Eliecer Diaz Estrada	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202-194870-CND	
Nombre: Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 63202-254212	

Quienes suscriben estas firmas manifiestan que aprueban todas las actividades realizadas en el día y las observaciones generales y técnicas plasmadas.

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 15 No. 32-61 Lobby 1 - 1
Ed. Primavera Urbana Unidad
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

580

1712

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.547-5

BITACORA DE OBRA
172-BOP-FR-022-V05
02/19/2023

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	10	5	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 de 2024	PROYECTO N°	2024006600062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA NO. 254 DEL 15 DE MAYO DE 2024 Y NO. 256 DEL 16 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	3 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NEBULOSO				
TORMENTA				
LLUVIOSO	x			
SOLEADO		x		
Tiempo de trabajo por turno		8HS		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	ESP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
ING RESIDENTE	1	si		Retroexcavadora	1	
CAPATAZ	3	si		Vibrador	2	
RESID	1	si		Formaleta	1	
MONTADORES	4	si		Equipo de oxicorte	3	
SOLDADORES	4	si		Equipo de soldadura	4	
AYUDANTES	2	si		Planta de	3	
CELADOR	1	si		Equipo de bombeo (MINE	3	
ALMACENISTA	1	si		Compresor diesel con 185	1	
PINTOR	2	si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	KL				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1.170	SI	SI
CAMBIO ASTIVO Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1090451 092403 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1057341 392526 CND	
Nombre Jorge Eliecer Baez Galeano	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25260 134875 CND	
Nombre Juan Camilo Peñuela Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 52260 234713	

Cuando se presenten visitas de entidades externas, ajenas al proyecto, se deberá dejar constancia de la misma en la siguiente información

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar congruencia de documento en el listado maestro de documentos

Calle 13 No. 49-01 Edificio [illegible]
PBX [illegible]
[illegible]

581

1713

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.941-0

BITACORA DE OBRA
112.ECP-FR.022 V05
03/09/2021

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	11	8	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	211 de 2024	PROYECTO N	2024005500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	214 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL A TRAVES DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUEJAR DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA NO. 251 DEL 16 DE MAYO DE 2024 Y No. 254 DEL 18 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	X	X	X	
Factores de Afectación (Lluvia)				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACIÓN	CANT EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROYECTO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE , REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML				
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre: Johnathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional: 0910170592424 CND	
Nombre: Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: 15734149251 CND	
Nombre: Jorge Eliecer Diaz Galindo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional: 25202 (68) RBO CND	
Nombre: Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional: N/201 254713	

Cuando se presenten visitas de personas distintas a las mencionadas anteriormente, se registrarán a continuación, con el fin de llevar un control.

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No 40-01 Lotes 1-3
CC Primavera Urbana Villavo
contactenos@aim.meta.g
Tel: (1) 6 [illegible]

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.047-3

BITACORA DE OBRA

112-ECHFR-022 V07
03/10/2022

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminacion de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	17	8	2024	8:00 a.m.	5:00 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	271 de 2024	PROYECTO N°	2024006500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	274 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA REHABILITACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA No. 251 DEL 16 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO		x		
NUBLADO	x		x	
Tiempo de duración (en horas)		6:57		

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
RES PESIDENTE	1	si		Herramienta menor	1	
CAPATAZ	2	si		Winches	2	
OPER.	1	si		Tronzadora	1	
MONTADORES	4	si		Equipo de oxicorte	1	
SOLDADORES	4	si		Equipo de soldadura	1	
AYUDANTES	2	si		Malacate	1	
CELADOR	1	si		Equipos de oficina (portátil)	2	
ALMACENISTA				Compresor engrasado MS	1	
PINTOR	2	si				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUANTAS CUADRILLAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SPIR)	CUANTAS CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SIRO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE - REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		11,79	9	9
ANDEBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	M				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonathan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1010736923459 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1513440905126 CND	
Nombre Jorge Eliecer Báez Galindo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202 164078 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 63302 284712	

Cualquier persona podrá realizar observaciones sobre el registro diario, en el cual se describan observaciones sobre el avance y el cumplimiento

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado firmado en el sistema de documentos

Calle 15 No. 40 - 61 Edificio [illegible]
CC. Parque Industrial [illegible]
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

583

5461

AIM
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900.220.347-5

BITACORA DE OBRA
112.ECP.FR-022.V05
02/08/2022

CIUDAD / MUNICIPIO	FECHA			HORA	
	DIA	MES	AÑO	Inicio de labores	Terminación de labores
VISTA HERMOSA / PINALITO	11	6	2024	5:00 a.m.	4:30 p.m.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

CONTRATO OBRA N°	371-de 2024	PROYECTO N°	2024005500062
CONTRATO INTERVENTORIA N°	374 de 2024		
OBJETO PROYECTO	MEJORAMIENTO MAL...A TRAVES DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO QUEJAR, DE LA VIA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PINALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, EN CONCORDANCIA CON LOS ESCRITOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PUBLICA tal...251 DEL 16 DE MAYO DE 2023 Y tal...256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, EN EL DEPARTAMENTO DEL META		
TIEMPO DE EJECUCION	4 Meses		

ESTADO DEL CLIMA

ESTADO DEL CLIMA	MAÑANA	TARDE	NOCHE	OBSERVACIONES
NUBLADO				
TORMENTA				
LLUVIOSO				
SOLEADO	x	x	x	
Tomar en cuenta Hy por Horas				

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

PERSONAL	CANT	EPP	OBSERVACIONES	EQUIPO	CANT	OBSERVACIONES
RAD RESIDENTE	1	SI		Herramienta menor	1	
CAPATAZ	2	SI		Vehiculo	2	
HSEQ	1	SI		Compactadora	1	
MONTADORES	4	SI		Equipo de oxicorte	5	
SOLDADORES	4	SI		Equipo de soldadura	5	
AYUDANTES	2	SI		Formaleta	2	
OBLADOR	1	SI		Equipos de protección	3	
ALMACENISTA				Compresor ingersoll rand 185	1	
PINTOR	2	SI				

ASPECTOS TÉCNICOS

ITEM CONTRACTUAL	UNIDAD	OBSERVACION	CANT. EJECUTADA	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (SI/NO)	CUMPLE CON PROCESO CONSTRUCTIVO (SI/NO)
DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR 50	ML				
SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36	ML				
MONTAJE - REFORZAMIENTO ESTRUCTURA METALICA	ML		1.12(5)	SI	SI
SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA	ML				

IMPREVISTOS DE OBRA

IMPREVISTOS DE OBRA	OBSERVACIONES

OBSERVACIONES GENERALES

FIRMAS

NOMBRE	CARGO	N° MATRICULA PROFESIONAL	FIRMA
Nombre Jhonatan Steven Diaz Vargas	RESIDENTE DE OBRA	N° Mat. Profesional 1018470492459 CND	
Nombre Carlos Arturo Vega Castellanos	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 1075813925126 CND	
Nombre Jorge Eliecer Baez Galindo	DIRECTOR DE OBRA	N° Mat. Profesional 25202-248870 CND	
Nombre Juan Camilo Posada Varela	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	N° Mat. Profesional 63202-264712	

Diligencia para anotaciones de profesionales, representantes de otras entidades, etc. (Nombre de las personas, cargos y la firma de la anotación)

Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	
Nombre		N° Mat. Profesional	

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos

Calle 35 No. 10 - 28 Barrio La Grama
Edificio Torre Mirador
Villavicencio - Meta

INFORME DE SUPERVISIÓN

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE SUPERVISIÓN

112-ECP-FR-067-V05
12/07/2024

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

INFORME MENSUAL No. 02

Periodo de 14 de julio de 2024 al 13 de agosto de 2024
Fecha de Presentación: 29 de agosto de 2024

INFORMACIÓN BASICA CONTRATO DE INTERVENTORIA	
OBJETO PROYECTO:	INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META
VALOR DEL PROYECTO:	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($139.580.336,00)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
CONTRATISTA:	**INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S.**
CORREO ELECTRONICO:	gerencia@intercons.co

TIEMPO DE EJECUCIÓN ACTUAL DEL PROYECTO	
FECHA DE INICIACIÓN:	14/06/2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
TIEMPO:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	14/10/2024
Meses	CUATRO (04) MESES

CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	
NOMBRE SUPERVISOR:	GINA TATIANA ELAICA NIETO
CONTRATO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN N°	N/A
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

A. AVANCE INTERVENTORÍA

1. CONTROL DE COSTOS

CATEGORIA	CARGO	N° PERSONAS	% DEDICACION	TIEMPO EN MESES	HONORARIOS	VALOR TOTAL
PERFIL PROFESIONAL						
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	1	20%	1	$ 8.920.000,00	$4.397.203
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100%	1	$7.580.000,00	$18.683.184
PERFIL TECNICO						
PERFIL AUXILIAR						
SUBTOTAL PERSONAL						$23.080.387
FACTOR MULTIPLICADOR						2,40
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$55.392.929

COSTOS DIRECTOS					
TIPO	CANTIDAD	%	MESES	VALOR	VALOR TOTAL
TOPOGRAFIA (incluye transito Nivel y elementos complementarios) Incluye Topógrafo	1	50%	1	$4.500.000	$5.545.800
Campero, Pick-up, Camioneta	1	100%	1	$4.600.000	$11.338.080
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					$16.883.880
TOTAL COSTOS					$72.276.809
IVA (%)					$13.732.594
VALOR TOTAL DEL CONTRATO					$86.009.403

Avance físico programado 66,06% y avance físico ejecutado 68,74%.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co


INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

2. AVANCE FISICO

MENSUAL	PROGRAMADO				EJECUTADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		MENSUAL		ACUMULADO	
Periodo 1	60,5%	$ 83.817.992	60,5%	$ 83.817.992	61,62%	$ 86.009.403	61,62%	$ 86.009.403
Periodo 2	6,01%	$ 8.388.778	66,06%	$ 92.206.770	7,12%	$ 9.938.120	68,74%	$ 95.947.523
Periodo 3	%	$	%	$	%	$	%	$

Grafica

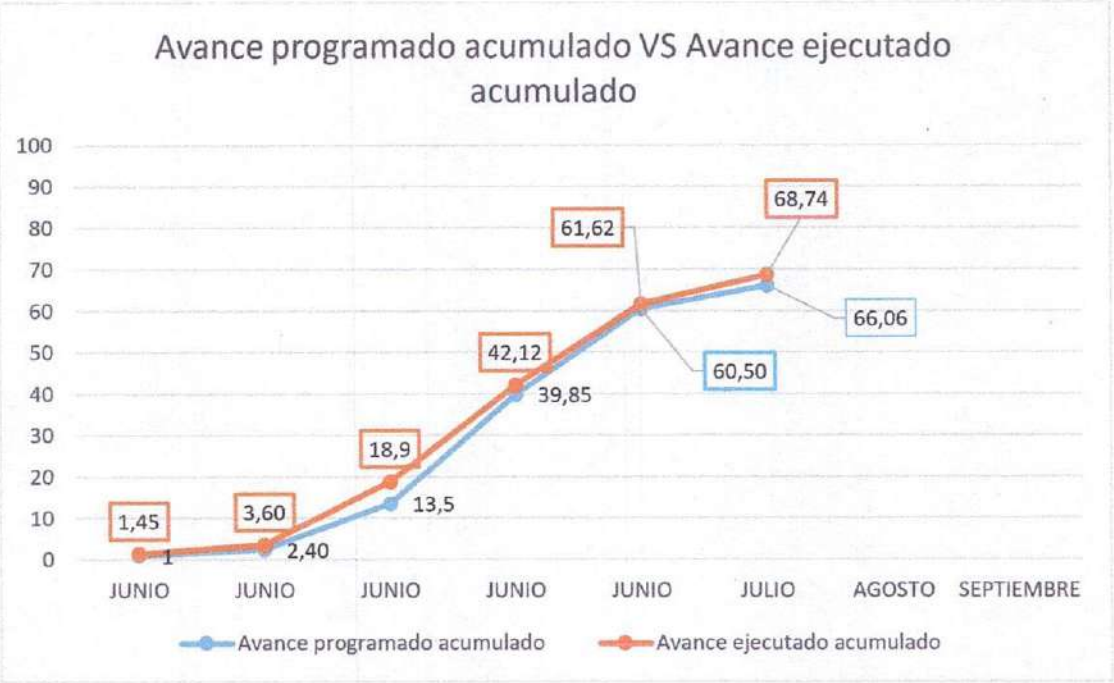

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

3. AVANCE OBRA

PROYECTO DE OBRA N° 271 de 2024	
OBJETO:	MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GÜEJAR, DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO; EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META
VALOR:	DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($2.858.923.490)
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR ACTUALIZADO:	N/A
CONTRATISTA:	ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – EN REORGANIZACIÓN
CORREO ELECTRONICO:	j.baez@icmo.com.co
FECHA DE INICIACIÓN:	14/06/2024
PRORROGA:	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A
REINICIO:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	14/10/2024
AVANCE FISICO PROGRAMADO:	**66,06%**
AVANCE FISICO EJECUTADO:	**68,74%**
AVANCE FINANCIERO:	**0,00 %**
OBSERVACIONES: REVISION Y APROBACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS. 100% EJECUTADO DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE 43.26% EJECUTADO SUMINISTRO Y FABRICACION DE ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-572 GR.50 97,47% EJECUTADO SUMINISTRO Y FABRICACION ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 100% EJECUTADO MONTAJE, REFORZAMIENTO ESTRUCTURA 54.25% EJECUTADO SANDBLASTING Y PINTURA ESTRUCTURA METALICA 0.00% EJECUTADO	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

B. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN DE PLANES Y ESPECIFICACIONES

1. REVISIÓN Y APROBACIÓN PLAN DE CALIDAD

Concerniente al Plan de Calidad para el desarrollo de actividades que ejecutó la Interventoría, se evidencia bajo metodología en la fase de preparación y planificación detallada, la revisión y de Planos y Estructura enfocándose especialmente en los tramos 18 y 19, afectados por el incidente.

Evaluación de Riesgos: Se identifican los riesgos asociados con la caída de las vigas y el hundimiento en el tramo 19, y revisión de Equipos y Personal para la intervención de actividades de obra.

Para la fase de obra, en su Desmontaje de las Láminas comienza por los tramos no afectados (del 1 al 17). Las láminas se desmontan por tramo, las correspondientes al Tramo 18: Debido al daño en este tramo, se realizó un corte parcial de las láminas afectadas para liberar las tensiones, del Tramo 19: Con las vigas hundidas, se procede a cortar las láminas en partes manejables antes de su retirada. Se asegura que las vigas no se desplacen más durante la operación

Se permite evidenciar el Retiro de las Vigas Longitudinales, iniciando la corrección del Hundimiento en el Tramo 19: Se evalúa la posibilidad de reutilizar las vigas hundidas o de retirarlas y reemplazarlas. Se cortan las conexiones existentes

Control de Calidad y Seguridad
Supervisión Continua: Se monitorea constantemente el proceso de desmontaje para garantizar la seguridad de los trabajadores y la estabilidad de la estructura.
Evaluación Post-Desmontaje: Tras la retirada de todas las láminas y vigas, se realiza una evaluación estructural para determinar la seguridad de la estructura restante y si se requieren reparaciones adicionales

2. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SGSST REALIZADA	OBSERVACIÓN /ACCIÓN
27/06/2024	ATS ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	
28/06/2024	RUTAS DE EVACUACION	
01/07/2024	SEÑALIZACIÓN Y MARCACIÓN	
5/07/2024	RIESGO BIOLOGICO	

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

5/07/2024	INDUCCION SST - -MEDIO AMBIENTAL	
12/07/2024	COPASST	

Anexo:112-ECP-FR-052-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. GESTIÓN TECNICA Y DOCUMENTAL

Oficios y documentos elaborados por la supervisión sobre el desarrollo de la interventoría, Comités realizados, solicitudes, temas varios e Informes presentados.

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
14/06/2024	INT-2024-001	PRESENTACIÓN DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	ICMO
14/06/2024	ICMO-RPGP-OO1	PRESENTACIÓN DE CONTRATISTA DE OBRA	ICMO SAS	INTERVENTORIA
(25/06/2024)	ICMO-RPGP-OO2	ENTREGA DE AVANCES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	ICMO SAS	INTERVENTORIA
25/06/2024	INT-2024-002	CONVOCATORIA REUNIÓN DE COMITÉ SEGUIMIENTO DEL PROYECTO NO2	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
27/06/2024	INT-2024-003	OBSERVACIONES AL CONCEPTO DE LOS AVANCES DE LOS DISEÑOS	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
01/07/2024	ICMO-RPGP-OO3	ENTREGA ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS	ICMO SAS	INTERVENTORIA
01/07/2024	INT-2024-004	CONVOCATORIA REUNIÓN DE COMITÉ SEGUIMIENTO DEL PROYECTO NO3	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
04/07/2024	INT-2024-005	VALIDEZ A LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS AJUSTADOS	INTERVENTORIA	ICMO SAS
05/07/2024	INT-2024-006	SOLICITUD DE SOCIALIZACIÓN DEL CONTRATO Y SOCIALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
09/07/2024	ICMO-RPGP-OO4	CONFIRMACIÓN DE SOCIALIZACIÓN EL DÍA 11 DE JULIO	ICMO SAS	INTERVENTORIA
11/07/2024	ICMO-RPGP-OO5	DOCUMENTACIÓN DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LA REFERENCIA	ICMO SAS	INTERVENTORIA
12/07/2024	INT-2024-007	CONCEPTO DE JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL	INTERVENTORÍA	ICMO SAS

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

FECHA	REFERENCIA - RADICADO	ASUNTO	QUIEN ELABORA	QUIEN RECIBE
12/07/2024	INT-2024-008	SOLICITUD PERSONAL DE OBRA	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
12/07/2024	INT-2024-009	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
17/07/2024	ICMO-RPGP-OO6	Respuesta Comunicado INT-2024-001 (Solicitud de Personal en Obra) Y 002 (plan de calidad y Manejo Ambiental)	ICMO SAS	INTERVENTORIA
22/07/2024	INT-2024-010	Aprobación documentos del contrato de obra No 271 de 2024	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
22/07/2024	Medios electrónicos	Convocatoria reunión de comité seguimiento del proyecto No4	INTERVENTORÍA	ICMO SAS
16/08/2024	ICMO-RPGP-OO7	Entrega de garantías contrato de obra e informes mensual de obra.	ICMO SAS	INTERVENTORIA
20/08/2024	ICMO-RPGP-O08	Entrega diseño del arte de la valla	ICMO SAS	INTERVENTORIA
20/08/2024	INT-2024-011	Aprobación valla de obra N° 271 de 2024	INTERVENTORÍA	ICMO
23/08/2024	ICMO-RPGP-O09	Entrega acta parcial No 1.	ICMO SAS	INTERVENTORIA

2. GESTIÓN TECNICA DE LA INTERVENTORIA

PERFIL ESPECIALIZADO	GESTIÓN /OBSERVACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	Hace control y seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato; que todas las garantías del contrato se mantengan vigentes hasta que se finalice el contrato. Mantener informadas a las partes involucradas sobre las posibilidades de realizar modificaciones al contrato y verificar si son viables o no.
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	Coordinar, supervisar y verificar la ejecución de las actividades dentro del desarrollo del proyecto, y hacer control en obra sobre las actividades que se estén realizando, como el uso adecuado de los materiales incluidos en el contrato.
PERFIL TECNICO	**GESTIÓN /OBSERVACIÓN**
Topógrafo	Supervisar y verificar la localización de los puntos obtenidos por el topógrafo del contrato de obra.
PERFIL AUXILIAR	**GESTIÓN /OBSERVACIÓN**

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

3. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista presentó planilla de pago N°: (9472194289-9470092008) julio

Anexo: Formato 112-ECP-FR-052-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA

D. INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

1. ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO			
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

ADICIÓN			
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN			
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN	FOLIO N°
N/A	N/A	N/A	N/A

2. GARANTÍAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	21-44-101448824
ANEXO N°	0
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	21-40-101238138
ANEXO N°	0
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	21-40-101238138
COMPAÑÍA DE SEGUROS	Seguros del estado

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	16/08/2024	16/04/2025	$13.958.033,60
Pago salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	16/08/2024	16/12/2027	$6.979.016,80
Calidad del servicio	16/12/2024	16/12/2029	$13.958.033,60

E. INFORME FINANCIERO

1. PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	EGRESO No.	FECHA	% EJECUCION	VALOR PAGO	VALOR AMORTIZADO	VALOR DESCUENTO	VALOR ACUMULADO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES							N/A

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 14 de julio de 2024 al 13 de agosto de 2024.

Avance físico programado 66,06% - Avance físico ejecutado 68,74% hasta la fecha no se ha realizado ningún pago.

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORIA, identificación de personal y costos directos ejecutados por la interventoría.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	COMITÉ SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	N/A



OBSERVACIONES Comité mensual entre director de Obra, Interventoría y Supervisión

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA EN LA SOLDADURA – RESIDENTE INTERVENTORÍA	EJECUTADO	N/A



OBSERVACIONES: se verifica por parte del Residente de Interventoría el proceso de soldadura de las actividades desarrolladas por obra.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE SUPERVISIÓN
112-ECP-FR-067-V05
12/07/2024

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	ESTRUCTURAL DE INTERVENTORÍA Y DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	EJECUTADO	N/A



OBSERVACIONES Acompañamiento del director de Interventoría, Residente de Interventoría y del Ingeniero Estructural de Interventoría con el fin de hacer seguimiento a las labores de ejecución de obra

ITEMS	ACTIVIDAD	CANTIDAD	
	SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE INTERVENTORÍA	EJECUTADO	N/A



OBSERVACIONES Revisión de procesos de gestión documental entre Interventoría y Supervisión

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

G. COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Contratista **Intercons de Colombia SAS** a corte del presente informe, reporta un avance de acuerdo a lo establecido en la programación de obra, representando un avance ejecutado del 68,74% frente a un avance programado del 66.06 %, datos que son consernientes al avance de ejecución de obra.

La Contratista **Intercons de Colombia SAS** del Contrato de Obra No. 274 DE 20243, inicia actividades de obra en fecha 14 de junio de 2024 según Orden de Inicio para la Urgencia Manifiesta.

En fecha 04 de julio de 2024, la interventoría viabiliza y avala los Estudios y Diseños Estructurales.

La supervisión , verifica el cumplimiento de las condiciones contractuales de la interventoría.

Se realiza una verificación en campo en relación con el personal propuesto por la interventoría, de acuerdo con el porcentaje de dedicación ofertado. Durante este periodo, se ha confirmado que la interventoría cumple con el personal propuesto.

Avance físico y financiero: Al corte del presente informe se evidencia un avance ejecutado 68,74% vs avance programado de 66.06%, a la fecha del informe no se ha realizado ningún pago parcial.

Avance de obra certificado por la interventoría del proyecto BPIN No. 2024005500062.

OBJETO DEL CONTRATO N. 271 DE 2024					
"MEJORAMIENTO VIAL, A TRAVÉS DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO GÜEJAR, DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO; EN CONCORDANCIA CON LOS DECRETOS DEPARTAMENTALES DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 251 DEL 10 DE MAYO DE 2024 Y No. 256 DEL 14 DE MAYO DE 2024, EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA; EN EL DEPARTAMENTO DEL META".					
CONTRATO No.	**PROYECTO No.**	**VALOR INICIAL**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**% PROGRAMADO**
271 DE 2024	2024005500062	$2.858.923.490	$ 1.965.224.007	68,74	66.06

De conformidad con lo establecido en la Minuta **274** DE 2024 correspondiente a Interventoría, según la CLÁUSULA 8 - FORMA DE PAGO: "*El valor del presente proceso de interventoría es: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($139.580.336,00)*"

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

Del contrato de interventoría suscrito entre INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S y la AIM, el valor del avance de la Interventoría se determina en función del avance de obra aprobado y avalado por la Supervisión".

Por lo anterior, me permito certificar el avance correspondiente al informe mensual No. 01 del contrato de interventoría. Según lo estipulado en la cláusula mencionada, se establece en función del avance de la obra, debidamente aprobado y respaldado por la interventoría. En este caso específico, el avance de la obra para el presente informe ha sido verificado y certificado en un 68,74% por la interventoría correspondiente.

Avance de la interventoría certificado por la supervisión del proyecto No. 274 de 2024

OBJETO CONTRATO INTERVENTORÍA "274 de 2024"					
INTERVENTORIA INTEGRAL DEL PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE VÍA A TRAVÉS DE LA REHABILITACIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GÜEJAR DE LA VÍA QUE COMUNICA EL CENTRO POBLADO DE PIÑALITO CON EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE VISTA HERMOSA, META					
CONTRATO	**PROYECTO**	**VALOR INICIAL**	**VALOR EJECUTADO**	**% EJECUTADO**	**%PROGRAMADO**
274 DE 2024	2024005500062	$139.580.336	$ 95.947.522,97	68.74	66.06

Nota: Las actividades se iniciaron según Orden de Inicio para la Urgencia Manifiesta con fecha 14 de junio de 2024, la cual considera que:

> Que el departamento del Meta ha declarado la situación de Calamidad Pública mediante Decretos 251 de mayo 10 de 2024 y 256 de mayo 14 de 2024, en virtud de la Ley 1523 de 2012, en vista de la temporada invernal que afectó vías secundarias y terciarias en la jurisdicción del Departamento del Meta, la Unidad Departamental de Gestión de Riesgos y Desastres de la Secretaría de Gobierno y Seguridad del departamento del Meta con algunas entidades como CORMACARENA, EDESA, EMSA, Defensa civil Meta, Cruz Roja, Bomberos, Policía, Ejercito Nacional y Fuerza área mediante Acta CDGRD META No 5 de mayo 15 de 2024 se asignó a la AIM adelantar la contratación de obras para la "Rehabilitación del puente sobre el rio Güejar de la vía que comunica el centro poblado de Piñalito con el centro poblado de Santo Domingo".

Basado en la Orden de Inicio para la Urgencia Manifiesta con fecha 14 de junio de 2024, el contratista ha presentado el pago de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones, y Riesgos) de sus profesionales en ejercicio de las actividades vinculadas al contrato, correspondiente al periodo en ejecución, dando cumplimiento al requerimiento de la entidad al aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales que competen al artículo No. 50 de la Ley 789 de 2002.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900 220 547-5

INFORME DE SUPERVISIÓN

112-ECP-FR-067-V05
12/07/2024

INFORME SUPERVISIÓN N° 02

CONTRATO N°	274 DE 2024	PROYECTO N°	2024005500062

H. ANEXOS

- Actas de comité técnico.
- Formato 112-ECP-FR-052-ACTA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL INTERVENTORÍA.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen, a los 29 días del mes agosto del 2024.

Firma

Nombre: GINA TATIANA ELAICA NIETO
DIRECTOR OPERATIVO DE EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
N° Matrícula Profesional: 25202-193880 CND

Firma V°B°

Nombre: N/A
APOYO A LA SUPERVISIÓN
N° Matrícula Profesional:

Firma V°B°

Nombre: N/A
SUPERVISIÓN CPS - (Cargo)
N° Matrícula Profesional:

Nota: Cuando el proyecto no contempla profesional de Apoyo a la Supervisión, se selecciona de la lista desplegable para firma el cargo de director Operativo de Ejecución, seguimiento y control de proyectos.
Nota: Los formatos deben ser registrados según su correspondencia, así mismo las casillas de N° de matrícula profesional deben ser diligenciadas en su totalidad.
Nota: El informe y sus anexos, deben ser cargados a la plataforma para la gestión de archivos SIGA, una vez sea presentado a la entidad.
Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1- Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co
