COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Reporte de Accidentes E incidentes de trabajo

FECHA: 11/11/2023 **HORA:** 07:00 Am

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Karen Lorena Montaño.

OBJETIVO: Informar al personal de obra la importancia de reportar los reportes de AT / IT; al Jefe inmediato y personal SST

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Felipe Gualdrón Anaya	Ayudante de obra	
2	Delvison Centeno Toloza	Ayudante de obra	
3	Enrique Beltran Beleño	Ayudante de obra	
4	Jesus ramón Hernadez Pernia	Oficial Electricista	
5	Jhon Jairo Domico Fernia	Ayudante de obra	
6	Nelson Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
7	Pastor Rangel	Oficial Civil	
8	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
9	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
10	Omar Arias Molgado	Ayudante de obra	
11	Oscar Fabian Estupiñan	Ayudante de obra	
12	Carlos Mauricio Bautista	Operador de maquinaria	
13	Edinson Javier Lizcano Ruiz	Ayudante de obra	
14	Juan Alonso Castellanos Florez	Oficial Civil	
15	Alfonso Correa Parra	Oficial Civil	
16	Juan David Guerrero Baez	Ayudante de obra	
17	Gerardo Tovar Ramos	Ayudante de obra	
18	Evaristo Pinilla Linares	Ayudante de obra	
19	Carlos Eduardo Solano Barrios	Ayudante de obra	
20	Evelio Cárdenas Becerra	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: JORNADAS DE ORDENY ASEO

FECHA: 16/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: NANCY HERNANDEZ G.

OBJETIVO: : Importancia de las jornadas para evitar accidentes

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
41	Rodolfo José Castro	Ayudante de obra	
42	Uriel Antonio Flores	Ayudante de obra	
43	Gabriel Bravo	Ayudante de obra	
44	Lisandro Pérez	Oficial civil	
45	Edgar Augusto Cancela	Oficial enchapador	
46	Adaniez Rodríguez	Oficial enchapador	
47	Héctor Avilez Ortiz	Ayudante de obra	
48	Ever Arias Lozano	Ayudante de obra	
49	Jesús Rojas	Oficial	
50	Diego Armando Estupiñán	Ayudante de obra	
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA:

JORNADAS DE ORDENY ASEO

FECHA:16/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: NANCY HERNANDEZ G.

OBJETIVO: Importancia de las jornadas para evitar accidentes

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Andrés Felipe Guadrón Anaya	Ayudante de obra	
2	Delvison Centeno Toloza	Ayudante de obra	
3	Enrique Beltrán Beleño	Ayudante de obra	
4	Jesús Ramón Hernández Pernía	Oficial Electricista	
5	Jhon Jairo Domico Fernia	Ayudante de obra	
6	Nelson Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
7	Pastor Rangel	Oficial Civil	
8	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
9	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
10	Omar Arias Molgado	Ayudante de obra	
11	Oscar Fabian Estupiñán	Ayudante de obra	
12	Carlos Mauricio Bautista	Operador de maquinaria	
13	Edinson Javier Lizcano Ruiz	Ayudante de obra	
14	Juan Alonso Castellanos Flórez	Oficial Civil	
15	Alfonso Correa Parra	Oficial Civil	
16	Juan David Guerrero Báez	Ayudante de obra	
17	Gerardo Tovar Ramos	Ayudante de obra	
18	Evaristo Pinilla Linares	Ayudante de obra	
19	Carlos Eduardo Solano Barrios	Ayudante de obra	
20	Evelio Cárdenas Becerra	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA:

JORNADAS DE ORDENY ASEO

FECHA: 16/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: NANCY HERNANDEZ G.

OBJETIVO: Importancia de las jornadas para evitar accidentes

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
21	Digno Antonio Calcedo Araque	Ayudante de obra	
22	Isidro Camacho Casanova	BOAL	
23	Jhon freddy Sánchez Cuadros	Oficial civil	
24	German Montoya Castro	Ayudante de obra	
25	Jhonler Pérez Serrano	Ayudante de obra	
26	Belisario Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
27	Yovanni Ríos Prato	Ayudante de obra	
28	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante de obra	
29	Melkis Calderón Mejía	Ayudante de obra	
30	Willinton Guillermo Ortega Valencia	Ayudante de obra	
31	Antonio Hipólito Galvis Rodríguez	Bodega	
32	Juan Carlos Carmona Bueno	Ayudante	
33	Jairo Fidel Cuadros Delgado	Ayudante	
34	Luis Hernando Prada Ochoa	Oficial electricista	
35	Joel Enrique Visbal Pacheco	Ayudante de obra	
36	Pedro Amaya Rivera	Oficial Civil	
37	Santiago Romero Almeida	Oficial Civil	
38	William Fernández	Ayudante de obra	
39	Mijaiz Josue Maita Martínez	Ayudante de obra	
40	Francisco José Castillo González	Ayudante de obra	

Rafael carcamo Ayudante

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Actos y Condiciones Inseguras

FECHA:17/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

- OBJETIVO: **Identificación de riesgos**

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diego Estupiñán		Diego
2	José Tarazona		
3	Juan carlos		Juan carlos
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Autoculdado

FECHA:17/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Prevenir riesgos

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Diego Estupiñán	oficial	
2	José Tarazona	Auxiliar	
3	ABEL RODRIGUEZ	OFICIA	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: CUIDADO DE MANOS, USO DE EPP GUANTES

FECHA:17/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Sensibilizar el uso de guantes.

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Andrés Felipe Guadrón Anaya	Ayudante de obra	
2	Deivison Centeno Toloza	Ayudante de obra	
3	Enrique Beltran Beleño	Ayudante de obra	
4	Jesus ramón Hernadez Pernia	Oficial Electricista	
5	Jhon Jairo Domico Fernia	Ayudante de obra	
6	Nelson Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
7	Pastor Rangel	Oficial Civil	
8	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
9	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
10	Omar Arias Molgado	Ayudante de obra	
11	Oscar Fabian Estupiñán	Ayudante de obra	
12	Carlos Mauricio Bautista	Operador de maquinaria	
13	Edinson Javier Lizcano Ruiz	Ayudante de obra	
14	Juan Alonso Castellanos Flórez	Oficial Civil	
15	Alfonso Correa Parra	Oficial Civil	
16	Juan David Guerrero Báez	Ayudante de obra	
17	Gerardo Tovar Ramos	Ayudante de obra	
18	Evaristo Pinilla Linares	Ayudante de obra	
19	Carlos Eduardo Solano Barrios	Ayudante de obra	
20	Evelio Cárdenas Becerra	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: CUIDADO DE MANOS, USO DE EPP GUANTES

FECHA:17/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Sensibilizar el uso de guantes.

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
21	Digno Antonio Calcedo Araque	Ayudante de obra	
22	Isidro Camacho Casanova	BOAL	
23	Jhon freddy Sánchez Cuadros	Oficial civil	
24	German Montoya Castro	Ayudante de obra	
25	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante de obra	
26	Belisario Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
27	Yovanni Rios Prato	Ayudante de obra	
28	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante de obra	
29	Melkis Calderón Mejía	Ayudante de obra	
30	Willinton Guillermo Ortega Valencia	Ayudante de obra	
31	Antonio Hipólito Galvis Rodríguez	Bodega	
32	Juan Carlos Carmona Bueno	Ayudante	
33	Jairo Fidel Cuadros Delgado	Ayudante	
34	Luis Hernando Prada Ochoa	Oficial electricista	
35	Joel Enrique Visbal Pacheco	Ayudante de obra	
36	Pedro Amaya Rivera	Oficial Civil	
37	Santiago Romero Almeida	Oficial Civil	
38	William Fernández	Ayudante de obra	
39	Mijaiz Josue Maita Martinez	Ayudante de obra	
40	Francisco José Castillo González	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Autocuidado

FECHA:20/11/2023 | **HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Prevenir riesgos

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
41	Rodolfo José Castro	Ayudante de obra	
42	Uriel Antonio Flores	Ayudante de obra	
43	Gabriel Bravo	Ayudante de obra	
44	Lisandro Pérez	Oficial civil	
45	Edgar Augusto Cancela	Oficial enchapador	
46	Adaniez Rodríguez	Oficial enchapador	
47	Héctor Avilez Ortiz	Ayudante de obra	
48	Ever Arias Lozano	Ayudante de obra	
49	Jesús Rojas	Oficial	
50	Diego Armando Estupiñán	Ayudante de obra	
51	Luz Mary Rivero	Topógrafa	
52	José G. Tarazona	Ayudante de obra	
53	Amílcar Sepúlveda	Maestro de obra	
54	Alexander Ochoa	Operador	
55	Juan Carlos Bautista	Ayudante	
56	Edgar Mauricio Martínez	Topógrafo	
57	Ronal Yesid Corzo Beltrán	Inspector de Obra	
58	Ariel Rodríguez	Oficial	
59	Rafael Carcamo		
60	Ronald Corzo		

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Autocuidado

FECHA:20/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Prevenir riesgos

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
21	Digno Antonio Calcedo Araque	Ayudante de obra	
22	Isidro Camacho Casanova	BOAL	
23	Jhon freddy Sánchez Cuadros	Oficial civil	
24	German Montoya Castro	Ayudante de obra	
25	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante de obra	
26	Belisario Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
27	Yovanni Ríos Prato	Ayudante de obra	
28	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante de obra	
29	Melkis Calderón Mejía	Ayudante de obra	
30	Willinton Guillermo Ortega Valencia	Ayudante de obra	
31	Antonio Hipólito Galvis Rodríguez	Bodega	
32	Juan Carlos Carmona Bueno	Ayudante	
33	Jairo Fidel Cuadros Delgado	Ayudante	
34	Luis Hernando Prada Ochoa	Oficial electricista	
35	Joel Enrique Visbal Pacheco	Ayudante de obra	
36	Pedro Amaya Rivera	Oficial Civil	
37	Santiago Romero Almeida	Oficial Civil	
38	William Fernández	Ayudante de obra	
39	Mijaiz Josue Malta Martínez	Ayudante de obra	
40	Francisco José Castillo González	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Clasificación de Residuos

FECHA:20/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Retroalimentar clasificación adecuada de residuos.

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
41	Rodolfo José Castro	Ayudante de obra	
42	Uriel Antonio Flores	Ayudante de obra	
43	Gabriel Bravo	Ayudante de obra	
44	Lisandro Pérez	Oficial civil	
45	Edgar Augusto Cancela	Oficial enchapador	
46	Adaniez Rodríguez	Oficial enchapador	
47	Héctor Avilez Ortiz	Ayudante de obra	
48	Ever Arias Lozano	Ayudante de obra	
49	Jesús Rojas	Oficial	Jesús Rojas
50	Diego Armando Estupiñán	Ayudante de obra	
51	Luz Mary Rivero	Topógrafa	
52	José G. Tarazona	Ayudante de obra	
53	Amílcar Sepúlveda	Maestro de obra	
54	Alexander Ochoa	Operador	
55	Juan Carlos Bautista	Ayudante	
56	Edgar Mauricio Martínez	Topógrafo	
57	Ronal Yesid Corzo Beltrán	Inspector de Obra	Ronal Corzo
58	Ariel Rodríguez	Oficial	
59	Rafael Carcamo	Ayudante	
60	Ronald Corzo		

Tarea rotación oficial Diana

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Autocuidado

FECHA:20/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Prevenir riesgos

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Felipe Guadrón Anaya	Ayudante de obra	Andres Anaya
2	Deivison Centeno Toloza	Ayudante de obra	
3	Enrique Beltran Beleño	Ayudante de obra	
4	Jesus ramón Hernadez Pernia	Oficial Electricista	
5	Jhon Jairo Domico Fernia	Ayudante de obra	
6	Nelson Mendoza Meneces	Ayudante de obra	Nelson Mendoza
7	Pastor Rangel	Oficial Civil	
8	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
9	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	Susana pinzon
10	Omar Arias Molgado	Ayudante de obra	
11	Oscar Fabian Estupiñán	Ayudante de obra	
12	Carlos Mauricio Bautista	Operador de maquinaria	
13	Edinson Javier Lizcano Ruiz	Ayudante de obra	Edinson Lizcano
14	Juan Alonso Castellanos Flórez	Oficial Civil	Alonso Castellanos
15	Alfonso Correa Parra	Oficial Civil	Alfonso C P.
16	Juan David Guerrero Báez	Ayudante de obra	Juan Guerrero
17	Gerardo Tovar Ramos	Ayudante de obra	
18	Evaristo Pinilla Linares	Ayudante de obra	
19	Carlos Eduardo Solano Barrios	Ayudante de obra	Carlos Solano
20	Evelio Cárdenas Becerra	Ayudante de obra	EVELIO C. C.

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Clasificación de Residuos

FECHA:21/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Retroalimentar clasificación adecuada de residuos.

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Felipe Guadrón Anaya	Ayudante de obra	Andrés Anaya
2	Delvison Centeno Toloza	Ayudante de obra	
3	Enrique Beltran Beleño	Ayudante de obra	
4	Jesus ramón Hernadez Pernia	Oficial Electricista	
5	Jhon Jairo Domico Fernia	Ayudante de obra	
6	Nelson Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
7	Pastor Rangel	Oficial Civil	
8	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
9	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
10	Omar Arias Molgado	Ayudante de obra	
11	Oscar Fabian Estupiñán	Ayudante de obra	
12	Carlos Mauricio Bautista	Operador de maquinaria	
13	Edinson Javier Lizcano Ruiz	Ayudante de obra	
14	Juan Alonso Castellanos Flórez	Oficial Civil	
15	Alfonso Correa Parra	Oficial Civil	
16	Juan David Guerrero Báez	Ayudante de obra	
17	Gerardo Tovar Ramos	Ayudante de obra	
18	Evaristo Pinilla Linares	Ayudante de obra	
19	Carlos Eduardo Solano Barrios	Ayudante de obra	
20	Evelio Cárdenas Becerra	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Clasificación de Residuos

FECHA:2/11/2023 | **HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Retroalimentar clasificación adecuada de residuos.

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
21	Digno Antonio Calcedo Araque	Ayudante de obra	
22	Isidro Camacho Casanova	BOAL	
23	Jhon freddy Sánchez Cuadros	Oficial civil	
24	German Montoya Castro	Ayudante de obra	
25	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante de obra	
26	Belisario Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
27	Yovanni Rios Prato	Ayudante de obra	
28	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante de obra	
29	Melkis Calderón Mejía	Ayudante de obra	
30	Willinton Guillermo Ortega Valencia	Ayudante de obra	
31	Antonio Hipólito Galvis Rodríguez	Bodega	
32	Juan Carlos Carmona Bueno	Ayudante	
33	Jairo Fidel Cuadros Delgado	Ayudante	
34	Luis Hernando Prada Ochoa	Oficial electricista	
35	Joel Enrique Visbal Pacheco	Ayudante de obra	
36	Pedro Amaya Rivera	Oficial Civil	
37	Santiago Romero Almeida	Oficial Civil	
38	William Fernández	Ayudante de obra	
39	Mijaiz Josue Maita Martínez	Ayudante de obra	
40	Francisco José Castillo González	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Actos y condiciones inseguras

FECHA:22/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Identificación de Riesgos

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
41	Rodolfo José Castro	Ayudante de obra	
42	Uriel Antonio Flores	Ayudante de obra	
43	Gabriel Bravo	Ayudante de obra	
44	Lisandro Pérez	Oficial civil	
45	Edgar Augusto Cancela	Oficial enchapador	
46	Adaniez Rodríguez	Oficial enchapador	
47	Héctor Avilez Ortiz	Ayudante de obra	
48	Ever Arias Lozano	Ayudante de obra	
49	Jesús Rojas	Oficial	
50	Diego Armando Estupiñán	Ayudante de obra	
51	Luz Mary Rivero	Topógrafa	
52	José G. Tarazona	Ayudante de obra	
53	Amílcar Sepúlveda	Maestro de obra	
54	Alexander Ochoa	Operador	
55	Juan Carlos Bautista	Ayudante	
56	Edgar Mauricio Martínez	Topógrafo	
57	Ronal Yesid Corzo Beltrán	Inspector de Obra	
58	Ariel Rodríguez	Oficial	
59	Rafael Carcamo	Ayudante	
60	Ronald Corzo	Insp. Obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Actos y condiciones inseguras

FECHA:22/11/2023 | **HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Identificación de riesgos

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
21	Digno Antonio Caicedo Araque	Ayudante de obra	
22	Isidro Camacho Casanova	BOAL	
23	Jhon freddy Sánchez Cuadros	Oficial civil	
24	German Montoya Castro	Ayudante de obra	
25	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante de obra	
26	Belisario Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
27	Yovanni Rios Prato	Ayudante de obra	
28	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante de obra	
29	Melkis Calderón Mejia	Ayudante de obra	
30	Willinton Guillermo Ortega Valencia	Ayudante de obra	
31	Antonio Hipólito Galvis Rodriguez	Bodega	
32	Juan Carlos Carmona Bueno	Ayudante	
33	Jairo Fidel Cuadros Delgado	Ayudante	
34	Luis Hernando Prada Ochoa	Oficial electricista	
35	Joel Enrique Visbal Pacheco	Ayudante de obra	
36	Pedro Amaya Rivera	Oficial Civil	
37	Santiago Romero Almeida	Oficial Civil	
38	William Fernández	Ayudante de obra	
39	Mijaiz Josue Maita Martinez	Ayudante de obra	
40	Francisco José Castillo González	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Actos y condiciones inseguras

FECHA: 22/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Identificación de riesgos

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Andrés Felipe Guadrón Anaya	Ayudante de obra	Andrés Anaya
2	Deivison Centeno Toloza	Ayudante de obra	
3	Enrique Beltrán Beleño	Ayudante de obra	
4	Jesús ramón Hernández Pernia	Oficial Electricista	
5	Jhon Jairo Domico Fernia	Ayudante de obra	
6	Nelson Mendoza Meneces	Ayudante de obra	NelsonMendoza
7	Pastor Rangel	Oficial Civil	
8	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
9	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	Susana
10	Omar Arias Molgado	Ayudante de obra	
11	Oscar Fabian Estupiñán	Ayudante de obra	
12	Carlos Mauricio Bautista	Operador de maquinaria	
13	Edinson Javier Lizcano Ruiz	Ayudante de obra	
14	Juan Alonso Castellanos Flórez	Oficial Civil	
15	Alfonso Correa Parra	Oficial Civil	
16	Juan David Guerrero Báez	Ayudante de obra	
17	Gerardo Tovar Ramos	Ayudante de obra	
18	Evaristo Pinilla Linares	Ayudante de obra	
19	Carlos Eduardo Solano Barrios	Ayudante de obra	
20	Evelio Cárdenas Becerra	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Riesgos en las actividades de Excavación, Instalación base granular

FECHA:23/11/2023	HORA: 6:50 AM

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Identificación de Riesgos

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
41	Rodolfo José Castro	Ayudante de obra	
42	Uriel Antonio Flores	Ayudante de obra	
43	Gabriel Bravo	Ayudante de obra	
44	Lisandro Pérez	Oficial civil	
45	Edgar Augusto Cancela	Oficial enchapador	
46	Adaniez Rodríguez	Oficial enchapador	
47	Héctor Avilez Ortiz	Ayudante de obra	
48	Ever Arias Lozano	Ayudante de obra	
49	Jesús Rojas	Oficial	
50	Diego Armando Estupiñán	Ayudante de obra	
51	Luz Mary Rivero	Topógrafa	
52	José G. Tarazona	Ayudante de obra	
53	Amílcar Sepúlveda	Maestro de obra	
54	Alexander Ochoa	Operador	
55	Juan Carlos Bautista	Ayudante	
56	Edgar Mauricio Martínez	Topógrafo	
57	Ronal Yesid Corzo Beltrán	Inspector de Obra	
58	Ariel Rodríguez	Oficial	
59	Rafael Carcamo		
60	Ronald Corzo		

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Riesgos en las actividades de Excavación, Instalación base granular

FECHA:23/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Identificación de riesgos

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
21	Digno Antonio Caicedo Araque	Ayudante de obra	
22	Isidro Camacho Casanova	BOAL	
23	Jhon freddy Sánchez Cuadros	Oficial civil	
24	German Montoya Castro	Ayudante de obra	
25	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante de obra	
26	Belisario Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
27	Yovanni Ríos Prato	Ayudante de obra	
28	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante de obra	
29	Melkis Calderón Mejía	Ayudante de obra	
30	Willinton Guillermo Ortega Valencia	Ayudante de obra	
31	Antonio Hipólito Galvis Rodríguez	Bodega	
32	Juan Carlos Carmona Bueno	Ayudante	
33	Jairo Fidel Cuadros Delgado	Ayudante	
34	Luis Hernando Prada Ochoa	Oficial electricista	
35	Joel Enrique Visbal Pacheco	Ayudante de obra	
36	Pedro Amaya Rivera	Oficial Civil	
37	Santiago Romero Almeida	Oficial Civil	
38	William Fernández	Ayudante de obra	
39	Mijaiz Josue Maita Martínez	Ayudante de obra	
40	Francisco José Castillo González	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Riesgos en las actividades de Excavación, instalación base granular

FECHA: 23/11/2023	HORA: 6:50 AM

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Identificación de riesgos

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Felipe Guadrón Anaya	Ayudante de obra	
2	Delvison Centeno Toloza	Ayudante de obra	
3	Enrique Beltrán Beleño	Ayudante de obra	
4	Jesús ramón Hernández Pernía	Oficial Electricista	
5	Jhon Jairo Domico Fernia	Ayudante de obra	
6	Nelson Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
7	Pastor Rangel	Oficial Civil	
8	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
9	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
10	Omar Arias Molgado	Ayudante de obra	
11	Oscar Fabian Estupiñán	Ayudante de obra	
12	Carlos Mauricio Bautista	Operador de maquinaria	
13	Edinson Javier Lizcano Ruiz	Ayudante de obra	
14	Juan Alonso Castellanos Flórez	Oficial Civil	
15	Alfonso Correa Parra	Oficial Civil	
16	Juan David Guerrero Báez	Ayudante de obra	
17	Gerardo Tovar Ramos	Ayudante de obra	
18	Evaristo Pinilla Linares	Ayudante de obra	
19	Carlos Eduardo Solano Barrios	Ayudante de obra	
20	Evelio Cárdenas Becerra	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Inspección de herramientas

FECHA:24/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Estado de herramientas

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
41	Rodolfo José Castro	Ayudante de obra	
42	Uriel Antonio Flores	Ayudante de obra	
43	Gabriel Bravo	Ayudante de obra	
44	Lisandro Pérez	Oficial civil	
45	Edgar Augusto Cancela	Oficial enchapador	
46	Adaniez Rodríguez	Oficial enchapador	
47	Héctor Avilez Ortiz	Ayudante de obra	
48	Ever Arias Lozano	Ayudante de obra	
49	Jesús Rojas	Oficial	
50	Diego Armando Estupiñán	Ayudante de obra	
51	Luz Mary Rivero	Topógrafa	
52	José G. Tarazona	Ayudante de obra	
53	Amílcar Sepúlveda	Maestro de obra	
54	Alexander Ochoa	Operador	
55	Juan Carlos Bautista	Ayudante	
56	Edgar Mauricio Martínez	Topógrafo	
57	Ronal Yesid Corzo Beltrán	Inspector de Obra	
58	Ariel Rodríguez	Oficial	
59	Rafael Carcamo	Ayudante	
60	Ronald Corzo		

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Inspeccion de herramientas

FECHA:24/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: estado de herramientas

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diego Estupiñán		
2	José Tarazona		
3	Hernando prada	electrico	
4	Jhon Freddy Sanchez	oficial	
5	Germán Montoya C.	AYUDANTE	
6	ANTONIO	AYUDANTE	ANTONIO
7	Eduardo Tarazona	ayudante	
8	FRANCISCO		
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Inspección de herramientas

FECHA:24/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Estado de herramientas

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
21	Digno Antonio Calcedo Araque	Ayudante de obra	
22	Isidro Camacho Casanova	BOAL	
23	Jhon freddy Sánchez Cuadros	Oficial civil	
24	German Montoya Castro	Ayudante de obra	
25	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante de obra	
26	Bellsario Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
27	Yovanni Rios Prato	Ayudante de obra	
28	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante de obra	
29	Melkis Calderón Mejía	Ayudante de obra	
30	Willinton Guillermo Ortega Valencia	Ayudante de obra	
31	Antonio Hipólito Galvis Rodríguez	Bodega	
32	Juan Carlos Carmona Bueno	Ayudante	
33	Jairo Fidel Cuadros Delgado	Ayudante	
34	Luis Hernando Prada Ochoa	Oficial electricista	
35	Joel Enrique Visbal Pacheco	Ayudante de obra	
36	Pedro Amaya Rivera	Oficial Civil	
37	Santiago Romero Almeida	Oficial Civil	
38	William Fernández	Ayudante de obra	
39	Mijaiz Josue Maita Martínez	Ayudante de obra	
40	Francisco José Castillo González	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Inspección de herramientas

FECHA:24/11/2023	**HORA: 6:50 AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Estado de herramientas

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Andrés Felipe Guadrón Anaya	Ayudante de obra	Andrés Anaya
2	Delvison Centeno Toloza	Ayudante de obra	
3	Enrique Beltran Beleño	Ayudante de obra	
4	Jesus ramón Hernadez Pernia	Oficial Electricista	
5	Jhon Jairo Domico Fernia	Ayudante de obra	
6	Nelson Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
7	Pastor Rangel	Oficial Civil	
8	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
9	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
10	Omar Arias Molgado	Ayudante de obra	
11	Oscar Fabian Estupiñán	Ayudante de obra	
12	Carlos Mauricio Bautista	Operador de maquinaria	
13	Edinson Javier Lizcano Ruiz	Ayudante de obra	
14	Juan Alonso Castellanos Flórez	Oficial Civil	
15	Alfonso Correa Parra	Oficial Civil	
16	Juan David Guerrero Báez	Ayudante de obra	
17	Gerardo Tovar Ramos	Ayudante de obra	
18	Evaristo Pinilla Linares	Ayudante de obra	
19	Carlos Eduardo Solano Barrios	Ayudante de obra	
20	Evelio Cárdenas Becerra	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Plan de atencion de emergencias

FECHA: 25/11/2023 **HORA:** 7:00AM

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Diego Espinoza	oficial	Diego
2	Juan Solis		Juan Solis
3	Daniel Mejia	ayudante	Daniel Mejia
4	Carlos G. Ruiz	Operador	Carlos Ruiz
5	Gerardo Tovar	Ayudante	Gerardo
6	Carlos Pinto	HSJ	Carlos
7	Jesus Rojas	OFICIAL	Jesus Rojas
8	GERMAN MONTOYA C	AYUDANTE	
9	Hernando Pardo	electrico	
10	YOVANNI TEJOS PRAT	AYUDANTE	
11	Jhon Freddy Sanchez	Oficial	
12	William Alberto Fund	Ayudante	
13	Willington Ortega Valencia	Ayudante	
14	Jesus Fernandez.	Electricista	
15	Ulises Cardoso	BEA1	
16	Eulalio Carbonos	Ayudante	Eulalio
17	Rafael Carcamo	Ayudante	
18	Hipolito Gaviria	Bodega	
19			
20			

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Plan de evacuacion emergencias Vanti

FECHA: 25/11/2023 | **HORA: 7:00AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO:

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Felipe Gualdron	Ayudante obra	Andres Duque
2	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
3	Belisario Mendoza	Ayudante obra	
4	Carlos Eduardo Solano Barros	Ayudante obra	Carlos Solano
5	Carlos Bautista	Operador	
6	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante obra	
7	Delvison Centeno	Ayudante obra	
8	Diego Estupiñán	Oficial	
9	Digno Antonio Calcedo	Ayudante obra	
10	Enrique Beltrán	Ayudante obra	
11	Edinson Lizcano	Ayudante obra	
12	Evelio Cárdenas	Ayudante obra	
13	Evaristo Avila Linares	Ayudante obra	
14	Ever Arias	Ayudante obra	
15	Francisco José Castillo	Ayudante obra	
16	Gerardo Tovar	Ayudante obra	
17	Germán Montoya	Ayudante obra	
16	Hernando Prada	Oficial eléctrico	
18	Isidro Camacho	Boal	
19	Jairo Fidel Cuadros Mercado	Ayudante obra	
20	Jhon Freddy Sánchez Cuadros	Oficial	
21	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante obra	
22	Juan Carlos Carmona	Ayudante obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Plan de atención de emergencias

FECHA: 25/11/2023 | **HORA: 7:00AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO:

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Juan Alonso Castellanos	Maestro Obra	Juan Castellanos
2	Jesús Rojas	Ayudante obra	
3	José Gabriel Tarazona	Ayudante obra	
4	Juan David Guerrero	Ayudante obra	Juan Guerrero
5	Lisandro Pérez Mora	Oficial	
6	Mijaiz Martínez	Ayudante obra	
8	Melkis Calderón	Oficial	Melkis calderon
9	Pastor Rangel	Oficial	
10	Pedro Amaya	Ayudante obra	
11	Rafael Carcamo	Ayudante obra	
12	Ronal Corzo	Inspector Obra	Ronal Corzo
13	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	Susana P
4	Yovanni Ríos Prato	Ayudante obra	
15	Alexander Ochoa	Operador	
16	Amílcar Sepúlveda	Maestro	
17	Ariel Rodríguez	Oficial	
18	Joel Bisbal	Ayudante obra	
19	Gabriel Bueno	Ayudante obra	
20	Rodolfo José Castro	Ayudante de Obra	
21	Uriel Flórez	Oficial	
22	William Alberto Fernández	Ayudante obra	
23			

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Levantamiento de cargas

FECHA: 27/11/2023	**HORA: 7:00AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Retroalimentar peso máximo permitido

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Andrés Felipe Gualdron	Ayudante obra	
2	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
3	Belisario Mendoza	Ayudante obra	
4	Carlos Eduardo Solano Barros	Ayudante obra	
5	Carlos Bautista	Operador	
6	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante obra	
7	Delvison Centeno	Ayudante obra	
8	Diego Estupiñán	Oficial	
9	Digno Antonio Calcedo	Ayudante obra	
10	Enrique Beltrán	Ayudante obra	
11	Edinson Lizcano	Ayudante obra	
12	Evelio Cárdenas	Ayudante obra	
13	Evaristo Avila Linares	Ayudante obra	
14	Ever Arias	Ayudante obra	
15	Francisco José Castillo	Ayudante obra	
16	Gerardo Tovar	Ayudante obra	
17	Germán Montoya	Ayudante obra	
16	Hernando Prada	Oficial eléctrico	
18	Isidro Camacho	Boal	
19	Jairo Fidel Cuadros Mercado	Ayudante obra	
20	Jhon Freddy Sánchez Cuadros	Oficial	
21	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante obra	
22	Juan Carlos Carmona	Ayudante obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Levantamiento de cargas

FECHA: 27/11/2023	**HORA: 7:00AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Retroalimentar peso máximo permitido

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Juan Alonso Castellanos	Maestro Obra	Juan Castellanos
2	Jesús Rojas	Ayudante obra	OFICIAL
3	José Gabriel Tarazona	Ayudante obra	
4	Juan David Guerrero	Ayudante obra	
5	Jesús Ramon Hernández		
6	Lisandro	Oficial	
7	Mijaiz Martínez	Ayudante obra	
8	Melisa		
9	Melkis Calderón	Oficial	
10	Pastor Rangel	Oficial	
11	Pedro Amaya	Ayudante obra	
12	Rafael Carcamo	Ayudante obra	
13	Ronal Corzo	Inspector Obra	
14	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
15	Yovanni Ríos Prato	Ayudante obra	
16	Alexander Ochoa	Operador	
17	Amilcar Sepúlveda	Maestro	
18	Ariel Rodríguez	Oficial	
19	Joel Bisbal	Ayudante obra	
20	Gabriel Bueno	Ayudante obra	
21	Rodolfo José Castro	Ayudante de Obra	
22	Uriel Flórez	Oficial	
23	William Alberto Fernández	Ayudante obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: PAUSAS ACTIVAS

FECHA: 28/11/2023 | **HORA: 7:00AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: PRECALENTAMIENTO

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Felipe Gualdron	Ayudante obra	Andrés Arayld
2	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
3	Belisario Mendoza	Ayudante obra	
4	Carlos Eduardo Solano Barros	Ayudante obra	
5	Carlos Bautista	Operador	
6	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante obra	
7	Deivison Centeno	Ayudante obra	
8	Diego Estupiñán	Oficial	
9	Digno Antonio Calcedo	Ayudarite obra	
10	Enrique Beltrán	Ayudante obra	
11	Edinson Lizcano	Ayudante obra	
12	Evello Cárdenas	Ayudante obra	
13	Everisto Ávila Linares	Ayudante obra	
14	Ever Arias	Ayudante obra	
15	Francisco José Castillo	Ayudante obra	
16	Gerardo Tovar	Ayudante obra	
17	Germán Montoya	Ayudante obra	
16	Hernando Prada	Oficial eléctrico	
18	Isidro Camacho	Boal	
19	Jairo Fidel Cuadros Mercado	Ayudante obra	
20	Jhon Freddy Sánchez Cuadros	Oficial	
21	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante obra	
22	Juan Carlos Carmona	Ayudante obra	

Nelson Mendoza

Nelson M

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: PAUSAS ACTIVAS

FECHA: 28/11/2023 | **HORA: 7:00AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: PRECALENTAMINTO

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Juan Alonso Castellanos	Maestro Obra	Incapacidad.
2	Jesús Rojas	Ayudante obra	Oficial
3	José Gabriel Tarazona	Ayudante obra	
4	Juan David Guerrero	Ayudante obra	Juan Guerrero
5	Jesús Ramon Hernández	Electricista	
6	Lisandro Pérez Mora	Oficial	
8	Mijaiz Martínez	Ayudante obra	
9	Melkis Calderón	Oficial	
10	Pastor Rangel	Oficial	
11	Pedro Amaya	Ayudante obra	
12	Rafael Carcamo	Ayudante obra	
13	Ronal Corzo	Inspector Obra	
14	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
15	Yovanni Ríos Prato	Ayudante obra	
16	Alexander Ochoa	Operador	
17	Amílcar Sepúlveda	Maestro	
18	Ariel Rodríguez	Oficial	
19	Joel Bisbal	Ayudante obra	
20	Gabriel Bueno	Ayudante obra	
21	Rodolfo José Castro	Ayudante de Obra	
22	Uriel Flórez	Oficial	
23	William Alberto Fernández	Ayudante obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA.: PAUSAS ACTIVAS			
FECHA: 28/11/2023		HORA: 7:00AM	
LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España			
CAPACITADOR: Nancy Hernández G.			
OBJETIVO: PRECALENTAMINTO			
No	***NOMBRE***	***CARGO***	***FIRMA***
1	Hipólito Galvis	Bodeguero	
2	Alfonso Correa	Maestro Obra	
3	Luz Yolanda Ribera	Topógrafo	
4			
5			
6			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
4			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Reporte de accidentes

FECHA: 29/11/2023 | **HORA: 7:00AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Procedimiento para reporte HL

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Felipe Gualdron	Ayudante obra	Andres Angela
2	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
3	Belisario Mendoza	Ayudante obra	
4	Carlos Eduardo Solano Barros	Ayudante obra	
5	Carlos Bautista	Operador	
6	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante obra	
7	Deivison Centeno	Ayudante obra	
8	Diego Estupiñán	Oficial	
9	Digno Antonio Calcedo	Ayudante obra	
10	Enrique Beltrán	Ayudante obra	
11	Edinson Lizcano	Ayudante obra	
12	Evelio Cárdenas	Ayudante obra	
13	Evaristo Ávila Linares	Ayudante obra	
14	Ever Arias	Ayudante obra	
15	Francisco José Castillo	Ayudante obra	
16	Gerardo Tovar	Ayudante obra	
17	Germán Montoya	Ayudante obra	
16	Luis Hernando Prada	Oficial eléctrico	
18	Isidro Camacho	Boal	
19	Jairo Fidel Cuadros Mercado	Ayudante obra	
20	Jhon Freddy Sánchez Cuadros	Oficial	
21	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante obra	
22	Juan Carlos Carmona	Ayudante obra	

Nelson Mondo 26

Nelson

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Reporte de accidentes	
FECHA: 29/11/2023	**HORA: 7:00AM**
LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España	
CAPACITADOR: Nancy Hernández G.	
OBJETIVO: Procedimiento para reporte AL	

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Alonso Castellanos	Maestro Obra	
2	Jesús Rojas	Oficial	
3	José Gabriel Tarazona	Ayudante obra	
4	Juan David Guerrero	Ayudante obra	
5	Jesús Ramon Hernández	Electricista	
6	Lisandro Pérez Mora	Oficial	
8	Mijaiz Martínez	Ayudante obra	
9	Melkis Calderón	Oficial	
10	Pastor Rangel	Oficial	
11	Pedro Amaya	Ayudante obra	
12	Rafael Carcamo	Ayudante obra	
13	Ronal Corzo	Inspector Obra	
4	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
15	Yovanni Ríos Prato	Ayudante obra	
16	Alexander Ochoa	Operador	
17	Amílcar Sepúlveda	Maestro	
18	Ariel Rodríguez	Oficial	
19	Joel Bisbal	Ayudante obra	
20	Gabriel Bueno	Ayudante obra	
21	Rodolfo José Castro	Ayudante de Obra	
22	Uriel Flórez	Oficial	
23	William Alberto Fernández	Ayudante obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Reporte de accidents			
FECHA: 29/11/2023		HORA: 7:00AM	
LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España			
CAPACITADOR: Nancy Hernández G.			
OBJETIVO: Procedimiento para reporte de AL			
No	***NOMBRE***	***CARGO***	***FIRMA***
1	Antonio Hipólito Galvis	Bodeguero	
2	Alfonso Correa	Maestro de Obra	
3	Nelson Mendoza	Ayudante de obra	Nelson
4	Willington Ortega Valencia	Ayudante de obra	
5	Lin Mary Ribon	Topografa	
6			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
4			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Atención del primer auxilio por quemadura

FECHA: 30/11/2023 | **HORA: 7:00AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Atención del primer auxilio por quemadura

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Felipe Gualdron	Ayudante obra	
2	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
3	Belisario Mendoza	Ayudante obra	
4	Carlos Eduardo Solano Barros	Ayudante obra	
5	Carlos Bautista	Operador	
6	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante obra	
7	Delvison Centeno	Ayudante obra	
8	Diego Estupiñán	Oficial	
9	Digno Antonio Calcedo	Ayudante obra	
10	Enrique Beltrán	Ayudante obra	
11	Edinson Lizcano	Ayudante obra	
12	Evelio Cárdenas	Ayudante obra	
13	Evaristo Ávila Linares	Ayudante obra	
14	Ever Arias	Ayudante obra	
15	Francisco José Castillo	Ayudante obra	
16	Gerardo Tovar	Ayudante obra	
17	Germán Montoya	Ayudante obra	
16	Luis Hernando Prada	Oficial eléctrico	
18	Isidro Camacho	Boal	
19	Jairo Fidel Cuadros Mercado	Ayudante obra	
20	Jhon Freddy Sánchez Cuadros	Oficial	
21	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante obra	
22	Juan Carlos Carmona	Ayudante obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Primeros Auxilios por quemaduras	
FECHA: 30/11/2023	**HORA: 7:00AM**
LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España	
CAPACITADOR: Nancy Hernández G.	
OBJETIVO: Atención del primer auxilio por quemadura	

No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Juan Alonso Castellanos	Maestro Obra	Juan C.
2	Jesús Rojas	Oficial	
3	José Gabriel Tarazona	Ayudante obra	
4	Juan David Guerrero	Ayudante obra	
5	Jesús Ramon Hernández	Electricista	
6	Lisandro Pérez Mora	Oficial	
8	Mijaiz Martínez	Ayudante obra	
9	Melkis Calderón	Oficial	
10	Pastor Rangel	Oficial	
11	Pedro Amaya	Ayudante obra	
12	Rafael Carcamo	Ayudante obra	
13	Ronal Corzo	Inspector Obra	
4	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
15	Yovanni Ríos Prato	Ayudante obra	
16	Alexander Ochoa	Operador	
17	Amílcar Sepúlveda	Maestro	
18	Ariel Rodríguez	Oficial	
19	Joel Bisbal	Ayudante obra	
20	Gabriel Bueno	Ayudante obra	
21	Rodolfo José Castro	Ayudante de Obra	
22	Uriel Flórez	Oficial	
23	William Alberto Fernández	Ayudante obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Primeros Auxilios por quemaduras			
FECHA: 30/11/2023		HORA: 7:00AM	
LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España			
CAPACITADOR: Nancy Hernández G.			
OBJETIVO: Atención del primer auxilio por quemadura			
No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Antonio Hipólito Galvis	Bodeguero	
2	Alfonso Correa	Maestro de Obra	
3	Nelson Mendoza	Ayudante de obra	
4	Willington Ortega Valencia	Ayudante de obra	
5			
6			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
4			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: PAUSAS ACTIVAS

FECHA: 28/11/2023 | **HORA: 7:00AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: PRECALENTAMIENTO

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Felipe Gualdron	Ayudante obra	Andrés Angulo
2	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
3	Belisario Mendoza	Ayudante obra	Belisario Mendoza
4	Carlos Eduardo Solano Barros	Ayudante obra	Carlos E Solano
5	Carlos Bautista	Operador	
6	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante obra	
7	Delvison Centeno	Ayudante obra	
8	Diego Estupiñán	Oficial	Diego
9	Digno Antonio Calcedo	Ayudante obra	
10	Enrique Beltrán	Ayudante obra	
11	Edinson Lizcano	Ayudante obra	
12	Evelio Cárdenas	Ayudante obra	
13	Evaristo Ávila Linares	Ayudante obra	
14	Ever Arias	Ayudante obra	
15	Francisco José Castillo	Ayudante obra	
16	Gerardo Tovar	Ayudante obra	
17	Germán Montoya	Ayudante obra	
16	Hernando Prada	Oficial eléctrico	
18	Isidro Camacho	Boal	
19	Jairo Fidel Cuadros Mercado	Ayudante obra	
20	Jhon Freddy Sánchez Cuadros	Oficial	
21	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante obra	
22	Juan Carlos Carmona	Ayudante obra	

Nelson Mendoza

Nelson M

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: PAUSAS ACTIVAS			
FECHA: 28/11/2023		HORA: 7:00AM	
LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España			
CAPACITADOR: Nancy Hernández G.			
OBJETIVO: PRECALENTAMINTO			
No	***NOMBRE***	***CARGO***	***FIRMA***
1	Juan Alonso Castellanos	Maestro Obra	Incapacidad.
2	Jesús Rojas	Ayudante obra	Oficial
3	José Gabriel Tarazona	Ayudante obra	
4	Juan David Guerrero	Ayudante obra	Juan Guerrero
5	Jesús Ramon Hernández	Electricista	
6	Lisandro Pérez Mora	Oficial	
8	Mijaiz Martínez	Ayudante obra	
9	Melkis Calderón	Oficial	
10	Pastor Rangel	Oficial	
11	Pedro Amaya	Ayudante obra	
12	Rafael Carcamo	Ayudante obra	
13	Ronal Corzo	Inspector Obra	
14	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
15	Yovanni Ríos Prato	Ayudante obra	
16	Alexander Ochoa	Operador	
17	Amílcar Sepúlveda	Maestro	
18	Ariel Rodríguez	Oficial	
19	Joel Bisbal	Ayudante obra	
20	Gabriel Bueno	Ayudante obra	
21	Rodolfo José Castro	Ayudante de Obra	
22	Uriel Flórez	Oficial	
23	William Alberto Fernández	Ayudante obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Levantamiento de cargas

FECHA: 27/11/2023 | **HORA: 7:00AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Retroalimentar peso máximo permitido

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Felipe Gualdron	Ayudante obra	
2	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
3	Belisario Mendoza	Ayudante obra	
4	Carlos Eduardo Solano Barros	Ayudante obra	
5	Carlos Bautista	Operador	
6	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante obra	
7	Delvison Centeno	Ayudante obra	
8	Diego Estupiñán	Oficial	
9	Digno Antonio Calcedo	Ayudante obra	
10	Enrique Beltrán	Ayudante obra	
11	Edinson Lizcano	Ayudante obra	
12	Evelio Cárdenas	Ayudante obra	
13	Evaristo Avila Linares	Ayudante obra	
14	Ever Arias	Ayudante obra	
15	Francisco José Castillo	Ayudante obra	
16	Gerardo Tovar	Ayudante obra	
17	Germán Montoya	Ayudante obra	
16	Hernando Prada	Oficial eléctrico	
18	Isidro Camacho	Boal	
19	Jairo Fidel Cuadros Mercado	Ayudante obra	
20	Jhon Freddy Sánchez Cuadros	Oficial	
21	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante obra	
22	Juan Carlos Carmona	Ayudante obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Levantamiento de cargas

FECHA: 27/11/2023	**HORA: 7:00AM**

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández G.

OBJETIVO: Retroalimentar peso máximo permitido

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Juan Alonso Castellanos	Maestro Obra	Juan Castellanos
2	Jesús Rojas	Ayudante obra	OFICIAL
3	José Gabriel Tarazona	Ayudante obra	
4	Juan David Guerrero	Ayudante obra	
5	Jesús Ramon Hernández		
6	Lisandro	Oficial	
7	Mijaiz Martínez	Ayudante obra	
8	Melisa		
9	Melkis Calderón	Oficial	
10	Pastor Rangel	Oficial	
11	Pedro Amaya	Ayudante obra	
12	Rafael Carcamo	Ayudante obra	
13	Ronal Corzo	Inspector Obra	
14	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
15	Yovanni Ríos Prato	Ayudante obra	
16	Alexander Ochoa	Operador	
17	Amílcar Sepúlveda	Maestro	
18	Ariel Rodríguez	Oficial	
19	Joel Bisbal	Ayudante obra	
20	Gabriel Bueno	Ayudante obra	
21	Rodolfo José Castro	Ayudante de Obra	
22	Uriel Flórez	Oficial	
23	William Alberto Fernández	Ayudante obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: Lección aprendida "Levantamiento de carga"

FECHA: 29/11/2023 **HORA:** 7:00 am

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernández

OBJETIVO: Divulgar lección aprendida

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
21	Digno Antonio Calcedo Araque	Ayudante de obra	
22	Isidro Camacho Casanova	BOAL	
23	Jhon freddy Sánchez Cuadros	Oficial civil	
24	German Montoya Castro	Ayudante de obra	
25	Jhonier Pérez Serrano	Ayudante de obra	
26	Belisario Mendoza Meneces	Ayudante de obra	
27	Yovanni Rios Prato	Ayudante de obra	
28	Daniel Eduardo Angarita Jaimes	Ayudante de obra	
29	Melkis Calderón Mejía	Ayudante de obra	
30	Willinton Guillermo Ortega Valencia	Ayudante de obra	
31	Antonio Hipólito Galvis Rodríguez	Bodega	
32	Juan Carlos Carmona Bueno	Ayudante	
33	Jairo Fidel Cuadros Delgado	Ayudante	
34	Luis Hernando Prada Ochoa	Oficial electricista	
35	Joel Enrique Visbal Pacheco	Ayudante de obra	
36	Pedro Amaya Rivera	Oficial Civil	
37	Santiago Romero Almeida	Oficial Civil	
38	William Fernández	Ayudante de obra	
39	Mijaiz Josue Maita Martínez	Ayudante de obra	
40	Francisco José Castillo González	Ayudante de obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004 REVISIÓN: 007

TEMA: Lección aprendida "levantamiento cargas"

FECHA: 29/11/2023 **HORA:** 7:00 am

LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España

CAPACITADOR: Nancy Hernandez

OBJETIVO: Divulgar Lección aprendida

No	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	Andrés Felipe Gualdrón Anaya	Ayudante de obra	
2	Delvison Centeno Toloza	Ayudante de obra	
3	Enrique Beltran Beleño	Ayudante de obra	
4	Jesus ramón Hernadez Pernia	Oficial Electricista	
5	Jhon Jairo Domico Fernia	Ayudante de obra	
6	Nelson Mendoza Meneces	Ayudante de obra	Nelson Mendoza
7	Pastor Rangel	Oficial Civil	
8	Angie Melisa Cascavita Ortiz	Controladora de tráfico	
9	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
10	Omar Arias Molgado	Ayudante de obra	
11	Oscar Fabian Estupiñan	Ayudante de obra	
12	Carlos Mauricio Bautista	Operador de maquinaria	
13	Edinson Javier Lizcano Ruiz	Ayudante de obra	EDINSON
14	Juan Alonso Castellanos Florez	Oficial Civil	Alonso Castellanos
15	Alfonso Correa Parra	Oficial Civil	Alfonso C
16	Juan David Guerrero Baez	Ayudante de obra	Juan Guerrero
17	Gerardo Tovar Ramos	Ayudante de obra	
18	Evaristo Pinilla Linares	Ayudante de obra	
19	Carlos Eduardo Solano Barrios	Ayudante de obra	Carlos E Solano
20	Evelio Cárdenas Becerra	Ayudante de obra	Evelio C

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA: PAUSAS ACTIVAS			
FECHA: 28/11/2023		HORA: 7:00AM	
LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España			
CAPACITADOR: Nancy Hernández G.			
OBJETIVO: PRECALENTAMINTO			
No	***NOMBRE***	***CARGO***	***FIRMA***
1	Juan Alonso Castellanos	Maestro Obra	Incapacidad.
2	Jesús Rojas	Ayudante obra	Oficial
3	José Gabriel Tarazona	Ayudante obra	
4	Juan David Guerrero	Ayudante obra	Juan Guerrero
5	Jesús Ramon Hernández	Electricista	
6	Lisandro Pérez Mora	Oficial	
8	Mijaiz Martínez	Ayudante obra	
9	Melkis Calderón	Oficial	
10	Pastor Rangel	Oficial	
11	Pedro Amaya	Ayudante obra	
12	Rafael Carcamo	Ayudante obra	
13	Ronal Corzo	Inspector Obra	
14	Susana Maritza Pinzón Durán	Controladora de tráfico	
15	Yovanni Rios Prato	Ayudante obra	
16	Alexander Ochoa	Operador	
17	Amilcar Sepúlveda	Maestro	
18	Ariel Rodriguez	Oficial	
19	Joel Bisbal	Ayudante obra	
20	Gabriel Bueno	Ayudante obra	
21	Rodolfo José Castro	Ayudante de Obra	
22	Uriel Flórez	Oficial	
23	William Alberto Fernández	Ayudante obra	

COINOBRAS	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÓDIGO: RH-004
		REVISIÓN: 007

TEMA.: PAUSAS ACTIVAS			
FECHA: 28/11/2023		HORA: 7:00AM	
LUGAR DE LA CAPACITACION: Bodega Paseo España			
CAPACITADOR: Nancy Hernández G.			
OBJETIVO: PRECALENTAMINTO			
No	*NOMBRE*	*CARGO*	*FIRMA*
1	Hipólito Galvis	Bodeguero	
2	Alfonso Correa	Maestro Obra	
3	Luz Yhon Ribera	Topógrafo	
4			
5			
6			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
4			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			

ANEXO 3. INFORME DE GESTIÓN SOCIAL N°11

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 420 DE 2022
CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022

Contrato de Interventoría No.420 de 2022.
Objeto: "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER.

INFORME FINAL COMPONENTE SOCIAL No. 12
Consolidado febrero a Diciembre 2023

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

BUCARAMANGA., ENERO DE 2024

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Contrato No.	420-2022	**Fecha:**	Febrero a Diciembre de 2023
Título del Documento	INFORME SOCIAL No. 12		



Control Interno		
Elaboró:	**Revisó:**	**Aprobó**
 Nombre de quien elabora Mayerly Alejandra Medina	 Director de Interventoria	Iván Olivares Algarín Director de Interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. Generalidades 4
2. Información contratos de obra e interventoría 4
3. Localización del proyecto 5
4. Introducción 6
5. Objetivos 6
6. Marco Normativo 7
7. Actividades Desarrolladas 8
8. Programas de componente de dialogo y comunicación estratégica 10
9. Programa de dialogo y participación ciudadana 16
12. Programa de gobernanza para la movilidad 27
13. Línea estratégica: Comunicación estratégica 28
14. Reporte, seguimiento y coordinación durante la ejecución del contrato 28
15. Relación comunicación enviadas y recibidas 29
16. Conclusiones 34

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen N° 1. Localización General 5
Imagen N° 2. Localización Específica 5
Imagen N° 3. Atención comunitaria 13
Imagen N° 4. Verificación PAC 13
Imagen N° 5. Socialización inicial 15
Imagen N° 6. Socialización inicial 15
Imagen N° 7. Acciones de divulgación 16
Imagen N° 8. Acompañamiento levantamiento actas de vecindad 17
Imagen N° 9. Recorrido revisión inventario de predios 21
Imagen N° 10. Asistencia comités técnicos 24

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Información general de contratos de obra de interventoría 4
Tabla 2 Relación levantamiento actas de vecindad y entrega notificación 17

1. Generalidades

Conforme se indica en los documentos que forman parte del proceso de Contratación SI-SI-CMA-020-2022, la Alcaldía de Bucaramanga, como parte de uno de los ejes articuladores del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER", contempló la intervención del Corredor Ambiental Carrera 26, el cual busca por medio de la recuperación de infraestructura, biótica y social, rehabilitar la Carrera 26 entre Calles 32 a 37 y realizar un pasaje urbanístico que le da prelación al peatón y conecte el Parque de los Niños, ubicado entre carreras 25 y 27 y entre calles 30 y 32, con el Museo de Arte Moderno ubicado en la Cl. 37 No.26-16 de la ciudad, corredor también conocido como Paseo España.

El proyecto a desarrollar, busca en general recuperar un espacio que está invadido por bahías de parqueo, para esto se eliminarán todas las barreras arquitectónicas en dicho corredor, el cual se nivelará. Será adoquinado, y se realizará una reestructuración total desde el componente arquitectónico, de redes, espacio público y paisajístico, todo esto conforme lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial, el Manual de Espacio Público de Bucaramanga y las normas técnicas vigentes.

Así las cosas, mediante el Contrato de Obra 387 de 2022 fue adjudicatario el Consorcio Ambiental Urbano, luego se surtió un proceso de cesión por parte de la entidad donde se cede a COINOBRAS para la ejecución del ya mencionado contrato. En el Caso de la interventoría, la adjudicataria y continua corresponde a la firma TECNUMEC S.A.S.

2. Información contratos de obra e interventoría

En la siguiente tabla se resumen los datos correspondientes a los contratos de obra e interventoría

Tabla 1. Información general contratos de obra e interventoría

Descripción	Contrato de Obra	Contrato de Interventoría
No. De contrato	387 de 2022	420 de 2022
Nombre de la empresa	Consorcio Ambiental Urbano	TECNUMEC S.A.S.
Fecha de contrato	16/12/2022	28/12/2022
Objeto	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER
Fecha acta de inicio	21/02/2023	21/02/2023
Plazo	10 meses	10 meses
Fecha de vencimiento actual	20/12/2023	20/12/2023
Valor	$9.072.944.903	$751.918.904

Fuente. Propia

3. Localización del proyecto

El contrato de obra e interventoría se desarrolla en la ciudad de Bucaramanga, sobre la carrera 26 entre calles 32 y 37 y sobre la calle 37 entre carreras 25 y 27.

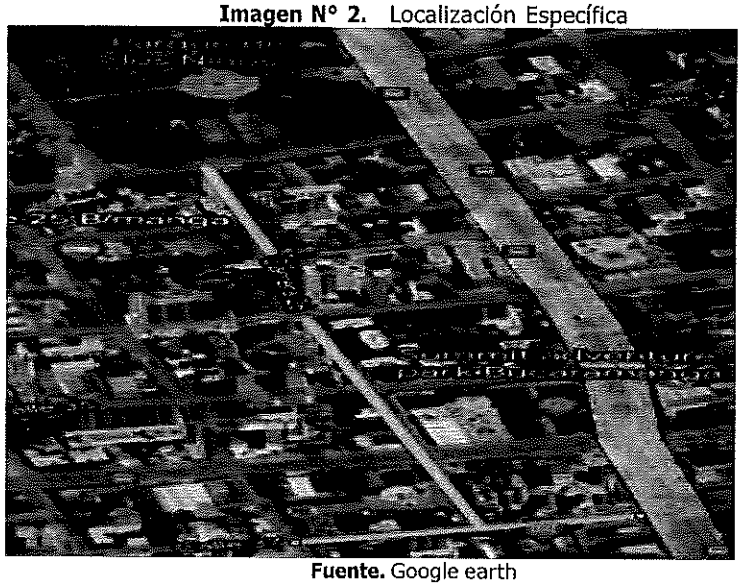
En la siguiente imagen se ilustra la ubicación general del proyecto.

Imagen N° 1. Localización General



Fuente. Google earth

Imagen N° 2. Localización Específica



Fuente. Google earth

4. Introducción

El presente informe hace parte del reporte de seguimiento a las actividades del componente social. Para este caso corresponde al consolidado final de febrero a diciembre de 2023, con el fin de completar el informe número 12 de interventoría.
Siendo así se realiza la presentación de cumplimiento en el desarrollo del proceso, y la relación de acciones llevadas a cabo por interventoría, al igual como la calificación de los indicadores expuestos en el apéndice J.
Este informe comprende las actividades realizadas del **FEBRERO A DICIEMBRE DE 2023** En este sentido, actividades reportadas se estructuran de acuerdo a los programas establecidos en el apéndice y el estado general de cada uno hasta la fecha de finalización del contrato 20 de dic de 2022. Según los requerimientos de la entidad contratante, de igual forma se plasmará los comunicados enviados y las recomendaciones generales del componente para que se continúe desarrollando de manera satisfactoria y en beneficio de la comunidad del área de influencia.
Por tanto, este informe orientado a referir a la entidad contratante lo solicitado de cada ítem.

5. Objetivos

Realizar estrategias en el ámbito social para mitigación de impactos y fortalecimiento de comunicación y apropiación en aras a la obra en ejecución.

- ✓ Dar información a la entidad contratante sobre las acciones realizadas por interventoría en el componente social;
- ✓ Presentar información sobre la articulación con la profesional social de la secretaria de infraestructura en lo pertinente al seguimiento del proceso de obra del contrato 387 de 2022.
- ✓ Presentar relación de las solicitudes hechas al contratista
- ✓ Dar a conocer la calificación de acuerdo a lo establecido por la entidad contratante según el apéndice J y los respectivos porcentajes.
- ✓ Presentar las recomendaciones del área social y la identificación de posibles riesgos, lo cual será de ayuda para la entidad contratante.

6. Marco Normativo

- Constitución Política de Colombia.
- Ley 99 de 1993: Gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables.
- Ley 134 de 1994: Mecanismos de participación ciudadana.
- Ley 80 de 1993: Estatuto General de contratación de la Administración pública.
- Ley 489 de 1998: Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional.
- Decreto 448 de 2007 en relación con el sistema de participación ciudadana.
- Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- Ley 1755 de 2015: Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición.
- Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
- Apéndice J otorgada como lineamientos de plan de dialogo y comunicaciones alcaldía de Bucaramanga.

7. Actividades Desarrolladas

Este informe comprende el consolidado general de las actividades realizadas de febrero a diciembre de 2023. En este sentido, las actividades estuvieron orientadas a:

ASISTENCIA A COMITÉS TÉCNICOS:

Número de comités desarrollados	36

Desde el componente social se asistió a la totalidad de comités de seguimiento convocados, en cada uno de ellos se presentaba lo relacionado al componente social y se presentaba el estado de actividades y pendientes por parte del contratista. el contratista tuvo (3) profesionales sociales vinculadas. Al inicio CONSORCIO AMBIENTAL URBANO y COINOBRAS 2 de agosto a diciembre. (En el informe técnico reposan los soportes de las actas de comités) todos liderados por el municipio de Bucaramanga con el fin de realizar seguimiento a la ejecución del contrato número 387 de 2022 y el contrato 420-2022 "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- SANTANDER.


ASISTENCIA A REUNIONES INTERNAS DE INTERVENTORIA:

Durante la ejecución del contrato de interventoría se asistió y participó de las reuniones convocadas por el director de obra, en las cuales se reúnen las distintas áreas profesionales (técnico, SST, eléctrico y social), En dichas reuniones se realiza coordinación de lineamientos, seguimiento a compromisos de cada área, organización de temas y lectura de actas de cada comité con el fin de llevar cada miércoles los temas claros para seguimiento a contratista y clarificar objetivos semanales. Desde el área social se otorgó la información correspondiente y se dio cumplimiento semanal a las tareas otorgadas. Lo anterior, es parte metodológica de trabajo de la interventoría y se deja constancia de comunicación constante en dichas reuniones y mediante los correos electrónicos enviados con copia respectiva y comunicados enviados, y presentados para revisión respectiva y envío al contratista.

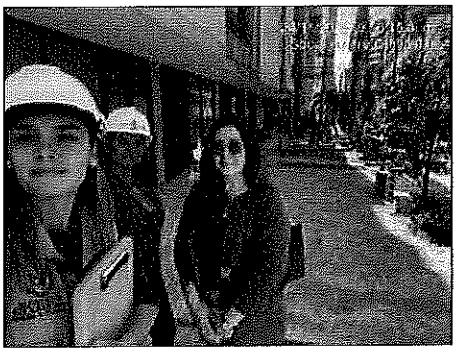
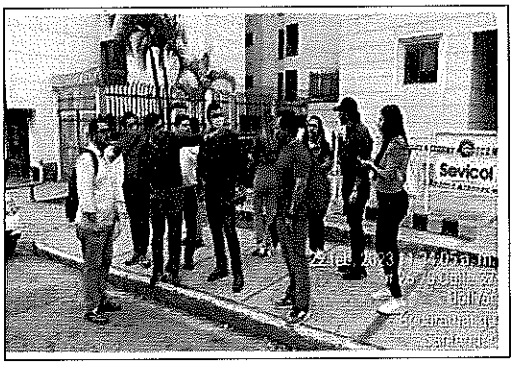
ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A ACTIVIDADES SOCIALES POR PARTE DE CONTRATISTA

De febrero a diciembre el componente social de interventoría dio cumplimiento con este aparte, de acompañamiento y supervisión de las actividades desarrolladas por contratista. Se debe tener en cuenta que el contratista no siempre mantuvo rigurosidad en su programación de actividades; sin embargo a todas aquellas que fueron informadas a interventoría, se brindó el respectivo acompañamiento. A continuación se presenta la generalidad de las mismas.

ACTIVIDAD	MES	FOTOGRAFIA
Levantamiento de actas de vecindad	Marzo- Abril	 

		
Convocatoria e inscripción de comité de participación	Abril	
Entrega de piezas de comunicación y divulgación	Abril	
Reuniones con JAC	Transversal	

Reuniones con residentes del AID		
Comités de participación ciudadana		
Acompañamiento en Punto de atención comunitario.		 
Entrega volantes informativos y circulares		
Reunión de atención unidades residenciales		

Articulación con entidad contratante componente social		
Acompañamiento recorridos urbanos		
Articulación con entidades		
Recorridos de reconocimiento área de intervención		

Se anexa registro fotográfico.

SOLICITUD DE INFORMACIÓN A PROFESIONAL SOCIAL DE CONTRATISTA SEGÚN APENDICE J

Este ítem fue trasversal durante todos los meses del contrato. Ante esto los requerimientos hecho a contratista reposan en:

-Bitácora de obra (anexo. Bitácora de obra – 10 pdf)
-Correos electrónico con copia a entidad contratante (anexo correos electrónicos-archivo pdf)
-Comunicados oficiales (anexo. Comunicados enviados 102 pdf)
-Reuniones de articulación

La cual surge a partir del apéndice J, para su cumplimiento, situaciones evidenciadas en campo y requerimientos en aras al desarrollo exitoso, mitigación de situaciones de riesgo para los grupos poblacionales, mitigación de problemáticas que alteran el orden y ejecución de la obra, y fortalecimiento de relaciones comunitarias frente al proyecto lo cual incide en el buen desarrollo de las obras, pero también impactan en la confianza ciudadana ante lo público y a futuro en la apropiación del corredor ambiental de la carrera 26.

(Anexo 2. Solicitud de información a contratista)

Los temas generales solicitados al contratista giraron entorno a:

-Recorridos urbanos para dar atención en campo a cualquier duda e inquietud presentada.

- solicitud y seguimiento entrega de volantes informativos sobre restricciones de paso que estén programadas desde el área técnica

-Soportes de acciones de divulgación de actividades a desarrollar por parte del contratista.

-Se envía solicitud a profesional sobre articulación y refuerzo de medidas de seguridad. Teniendo en cuenta que hay alta población en el sector y se debe prevenir accidentes.

-Se solicita se realicen las visitas solicitadas por los habitantes para revisión de posibles daños causados por la obra.

-Acompañamiento y seguimiento del plan de dialogo ciudadano.

-Elaboración, desarrollo y socialización de plan de acceso a parqueaderos teniendo en cuenta el impacto en el sector.

-Se solicita envío de soporte de invitación a comité de participación ciudadana

-Seguimiento a solicitudes que realizaba la entidad contratante

-Documentación referente a soportes de actas, consolidado PQRS, formatos de atención, archivo físico y digital.

-Interventoría reitera a contratista cumplimiento con el % de contratación de personal en condición de vulnerabilidad.

-Seguimiento a los programas del apéndice J

-Elaboración formatos a manejar

-Soportes de actas de entorno

-Acciones de divulgación con la comunidad e instituciones

-Solicitud de entrega de informes semanales, mensuales y cronogramas de actividades.

-Envío de comunicados solicitando franjas seguras para tránsito peatonal y cumplimiento de lo solicitado por entidad contratante

-Envio de comunicado con observaciones de los informes presentados

-Solicitud de atención y cierre de PQRS

-Solicitud informe mes de diciembre mediante comunicado REG-BUC-420-2022-525.

- Seguimiento a los programas de apéndice J REG-BUC-420-2022-510

-Solicitudes de hallazgos y evidencias en campo para dar atención y solución.

-Envio de solicitudes y registro mediante correo electrónico y bitácora.

8. Programas de componente de dialogo y comunicación estratégica

Para este programa el lineamiento dado por parte de la entidad, fue indicar al contratista que daría inicio en el año 2024, teniendo en cuenta que este plan este aunado al avance de actividades técnicas para que con base a esto se genera el proceso de articulación con las dependencias de la entidad contractual. Sin embargo de parte de interventoría se dejó evidencia en comités técnicos, en los comunicados enviados a contratista y se evidencia directriz en acta por parte de la entidad (18 d dic).

A continuación se presentan las actividades referente a los distintos programas del

apéndice.

a. Etapa preliminares:

Las actividades referente a la etapa preliminar por parte de interventoría estuvieron orientadas a:

1. Solicitud de elaboración plan de gestión social por parte del contratista.
2. Revisión y aprobación de los formatos sociales que implementará el contratista.
3. Remisión oficio de solicitud de información del componente social a la entidad contratante.
4. Remisión de solicitud base de datos de los actores de la zona para el proceso comunitario.
5. Acompañamiento contacto contratista con presidente de la JAC

-Durante el periodo contractual se realizó el debido Seguimiento al plan de dialogo y comunicación estratégica (plan de gestión social) elaborado por parte de la profesional social de contratista. Se ha desarrollado a través de acciones de divulgación sin embargo se está a la espera de lineamientos de la comunicadora social de la entidad contratante; se ha solicitado a través del equipo social de la secretaria de infraestructura. Para lo cual se solicita en los comités técnicos y reunión de seguimiento del componente. Para el informe del mes de diciembre se tiene que el lineamiento dado por la secretaria de infraestructura fue que este plan se ejecutaria en el año 2024, ya que muchas de las líneas a implementar en materia de (salud, seguridad, sostenibilidad, manual de uso, actividades culturales y demás)giran entorno a los programas y directrices que generará el nuevo gobierno (periodo 2024-2027). Se deja constancia en acta de reunión.

-Articulación con la secretaria de infraestructura a través de los comités técnicos semanales donde se mantiene al tanto e informada a la entidad sobre los avances respectivos del componente social en el marco de la obra al igual que las reuniones y mesas de trabajo convocada por el área social de la entidad donde se hace reporte y seguimiento a los avances sociales del contratista.
(Se adjunta registro fotográfico de estas mesas de trabajo).

En la última mesa de seguimiento llevada a cabo en el mes de diciembre hubo reunión y recorrido con la profesional social de entidad, contratista e interventoría donde se evidencia el estado de la obra, se hace seguimiento por parte de la entidad de los diferentes programas del plan de gestión social, interventoría deja constancia de los pendientes y faltantes del área. Y de igual forma se pactan compromisos de entregas a cargo del contratista. interventoría deja constancia en acta de lo solicitado y envía comunicados formales con las peticiones correspondientes.

-Verificación, instalación y funcionamiento del punto de atención comunitario por parte del contratista. Esta actividad fue transversal durante todo el proceso.
Sin embargo no se recibió informe final del estado de cierre de las PQRS abiertas.
A continuación se listan los comunicados sobre este tema enviado y solicitado por interventoria a contratista.

CUADRO DE COMUNICADOS

Por parte del componente social se enviaron 116 comunicados al contratista de cada uno de los programas y seguimiento respectivo al cumplimiento contractual.

hoja de vida topografo	Fecha	ASUNTO	DIRECCIONAMIENTO	No Radicado
REG-BUC-420-2022-020	24/02/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- SOLICITUD DE FORMATOS GESTIÓN SOCIAL	SOCIAL	1-WEB-202302-00029057
REG-BUC-420-2022-033	03/03/2023	TRASLADO COMUNICADO CAU-CTO387-2022-0010 SOLICITUD INFORMACIÓN SOCIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	SOCIAL	1-WEB-202303-00035398
REG-BUC-420-2022-041	06/03/2023	SOLICITUD DE INICIO DE CONVOCATORIA COMUNITARIA Y REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA	SOCIAL	1-WEB-202303-00041149
REG-BUC-420-2022-045	08/03/2023	OBSERVACIONES REVISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL-COMUNICADO CAU-CTO 387-2022-021	SOCIAL	1-WEB-202303-00043427
REG-BUC-420-2022-065	15/03/2023	CONTRATO DE OBRA No.387-2022- RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO-387-2022-0029 REVISIÓN VERSIÓN 2-PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	SOCIAL	1-WEB-202303-00055162
REG-BUC-420-2022-072	17/03/2023	CONTRATO DE OBRA No.387-2022- SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA ACCESO A PARQUEADEROS DE EFICIOS Y VIVIENDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA	SOCIAL	1-WEB-202303-0005936
REG-BUC-420-2022-073	17/03/2023	CONTRATO DE OBRA No.387-2022- SOLICITUD SOPORTES CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO Y ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVO DE INICIO DE OBRA	SOCIAL	1-WEB-202303-00059376
REG-BUC-420-2022-078	23/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL COMPONENTE SOCIAL	SOCIAL	1-WEB-202303-00066253
REG-BUC-420-2022-079	23/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 – SOLICITUD REPORTE PROGRAMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS /ACTAS DE VECINDAD	SOCIAL	1-WEB-202303-00066260

REG-BUC-420-2022-090	24/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 – SOLICITUD REUNIÓN DE ATENCIÓN COMUNITARIA RESIDENTE CASTILLA DE LA MANCHA	SOCIAL	1-WEB-202303-00067973
REG-BUC-420-2022-095	27/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 – SOLICITUD SOCIALIZACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	SOCIAL	1-WEB-202303-00069791
REG-BUC-420-2022-102	30/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 - RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO 387-2022-036 INVENTARIO DE PREDIOS	SOCIAL	1-WEB-202303-00071858
REG-BUC-420-2022-104	31/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 - RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO 387-2022-061. RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD	SOCIAL	1-WEB-202304-00072990
REG-BUC-420-2022-108	31/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 - RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO 387-2022-060. ATENCIÓN COMUNITARIA RESIDENTES CASTILLA DE LA MANCHA	SOCIAL	1-WEB-202303-00072437
REG-BUC-420-2022-116	05/04/2023	CONTRATO DE OBRA No.387-2022- RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO-387-2022-074- RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2023	SOCIAL	1-WEB-202304-00073525
REG-BUC-420-2022-128	12/04/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO-387-2022-078- OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.2 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- COMPONENTE SOCIAL	SOCIAL	1-WEB-202304-00075003
REG-BUC-420-2022-131	12/04/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO-387-2022-091- RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2023	SOCIAL	1-WEB-202304-00076518 14/04/2023
REG-BUC-420-2022-133	12/04/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- TRASLADO COMUNICADO CAU-CTO-387-2022 PQRS PALOS DE MOGUER	SOCIAL	1-WEB-202304-00075403
REG-BUC-420-2022-138	14/04/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 – ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PROGRAMA GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD-MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y VULNERABLE	SOCIAL	1-WEB-202304-00076471
REG-BUC-420-2022-142	18/04/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 –TRASLADO COMUNICADO CAU - CTO 387 - 2022 – 101 PQRS 001 SEÑORA FANNY DUEÑEZ, RESIDENTE DE LA URBANIZACIÓN CASTILLA DE LA MANCHA	SOCIAL	1-WEB-202304-00079122
REG-BUC-420-2022-148	20/04/2023	TRASLADO COMUNICADO CAU - CTO 387 - 2022 – 0103 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA VALLA INFORMATIVA	SOCIAL	1-WEB-202304-00081670
REG-BUC-420-2022-165	03/05/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO 387-2022-131- INFORME MENSUAL SV2 COMPONENTE SOCIAL	SOCIAL	No aplica
REG-BUC-420-2022-166	03/05/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- REMISIÓN COMUNICADO 2-SdIB2-202304-00036120- PQRS No.3 PALOS DE MOGUER	SOCIAL	No aplica
REG-BUC-420-2022-178	08/05/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Traslado comunicado CAU - CTO 387 - 2022 – 149. Respuesta PQRS palos de Moguer.	SOCIAL	1-WEB-202305-00088421
REG-BUC-420-2022-180	08/05/2023	Contrato de obra No.387-2022 – Reporte seguimiento área social	SOCIAL	1-WEB-202305-00088429
REG-BUC-420-2022-181	09/05/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Traslado de correspondencia comunicado CAU – CTO 387 – 2022 – 158 del 08/05/2023 "Envió observaciones de la revisión de estudios y diseños entregados por la entidad"	SOCIAL	1-WEB-202305-0008850
REG-BUC-420-2022-188	12/05/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta al comunicado CAU-CTO-2022-157 Notificación de retiro de personal	SOCIAL	No aplica
REG-BUC-420-2022-200	23/05/2023	Contrato de obra No.387-2022 - Aprobación Informe mensual 3 componente social- Abril V2.	SOCIAL	No aplica
REG-BUC-420-2022-202	23/05/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Ampliación a la respuesta del oficio CAU - CTO 387 - 2022 – 158 del 08/05/23 con asunto "Envío observaciones de la revisión de Estudios y Diseños entregados por la Entidad."	SOCIAL	No aplica

REG-BUC-420-2022-204	24/05/2023	Contrato de obra No.387-2022 – Traslado respuesta PQRS Palos de Moguer y plano de mobiliario ajustado.	SOCIAL	No aplica
REG-BUC-420-2022-206	26/05/2023	Contrato de obra No.387-2022 – Situación Social Contrato Consorcio Andenes Santander.	SOCIAL	1-WEB-202305-00098719
REG-BUC-420-2022-207	29/05/2023	Contrato de obra No.387-2022 –Traslado comunicados articulación temas sociales con administración municipal.	SOCIAL	1-WEB-202305-00098924
REG-BUC-420-2022-247	15/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-223. Observaciones informe mensual social No. 4 V2.	SOCIAL	No aplica
REG-BUC-420-2022-251	15/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Remisión respuesta comunicados CAU-CTO 387-2022-191, CAU-CTO 387-2022-192, CAU-CTO 387-2022-193, CAU-CTO 387-2022-194, CAU-CTO 387-2022-195, CAU-CTO 387-2022-196 por parte de entidad contratante.	SOCIAL	No aplica
REG-BUC-420-2022-261	16/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Reiteración presentación plan de contingencia accesos vehiculares	SOCIAL	No aplica
REG-BUC-420-2022-262	16/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Trazabilidad atención y gestión sobre plan de contingencia para mitigar afectación a parqueaderos.	SOCIAL	1-WEB-202306-00108487
REG-BUC-420-2022-268	21/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud de cumplimiento compromisos componente social.	SOCIAL	No aplica
REG-BUC-420-2022-270	22/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Traslado acción de tutela edificio parque central.	SOCIAL	1-WEB-202306-00110820
REG-BUC-420-2022-275	26/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-234 aprobación informe mensual 4 componente social	SOCIAL	No aplica
REG-BUC-420-2022-279	29/06/2023	Contrato de Interventoría 420 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387 – 2022 – 230. Petición señora Tania Medarda – edificio María Elena.	SOCIAL	No aplica
REG-BUC-420-2022-288	05/07/2023	Contrato de Interventoría 420 de 2022. Solicitud respuesta Derecho de Petición PC Transportes S.A.S.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-290	06/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitudes componente social.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-291	06/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-242. Observaciones informe mensual No 5 V1 componente social – junio de 2023.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-297	12/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-233. Plan de contingencia parqueaderos.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-298	12/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Traslado comunicado CAU - CTO 387 - 2022 – 233. Solicitud de información.	SOCIAL	1-WEB-202307-00118210
REG-BUC-420-2022-305	13/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387 -2022 -248. Solicitudes sociales.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-309	14/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387 – 2022 – 247. Aprobación de informe mensual social No. 5.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-317	19/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO-387-2022-25	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-318	19/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Remisión comunicado 2-SdIB2- 202307-00064357 Respuesta comunicado -CTO-387-2022-233.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-325	31/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitudes componente social mes julio y continuidad desarrollo actividades apéndice J.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-348	15/08/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-270. Plan de manejo vial para ingreso a parqueaderos.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-355	24/08/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-277 Informe mensual N° 6 periodo 01 al 31 de julio de 2023 componente social	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-358	25/08/2023	Contrato de obra No.387-2022 -223 Respuesta volante informativo 11 Inicio de obras en calle 32 con carrera 26.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-363	29/08/2023	Contrato de obra No.387-2022 Solicitud entrega cronograma e informes sociales.	SOCIAL	

REG-BUC-420-2022-380	08/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud instalación valla informativa PAC.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-381	08/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Observaciones presentación comité de participación ciudadana.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-382	08/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-290. Observaciones informe mensual social No 7. Periodo agosto de 2023.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-383	08/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-289. Informe mensual social No 6. Periodo julio de 2023.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-387	12/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud soportes convocatoria comité de participación ciudadana.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-388	12/09/2023	Sensibilización comunitaria recolección y manejo de basuras	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-392	14/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Reiteración atención de observaciones informes sociales julio y agosto de 2023.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-394	18/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Remisión actas de vecindad.	SOCIAL	1-WEB-202309-00150345
REG-BUC-420-2022-395	18/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-299. Aprobación informe social julio de 2023.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-396	18/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Soportes gestión e información unidad residencial El Castillo.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-397	19/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Remisión informe social de obra No. 6 mes de julio de 2023.	SOCIAL	1-WEB-202309-00151454
REG-BUC-420-2022-406	22/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU - CTO 387 - 2022 – 301 Informe mensual 7 V2 agosto 2023. Observaciones.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-409	27/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Remisión comunicado 2-SdIB2-202309-00087954 derecho de petición de interés general - daños y perjuicios ocasionados por las obras en el proyecto -Radicado 1-SA-202309-00153055 y solicitud cierre PQRS.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-417	03/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta correo electrónico del 29 de septiembre de 2023. Solicitud reparaciones vehículo GHP219	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-418	03/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Traslado petición correo electrónico del 29 de septiembre de 2023. Solicitud reparaciones vehículo GHP219	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-419	03/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud cumplimiento compromisos mesa de trabajo componente social	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-423	06/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud cumplimiento compromisos reunión comerciantes.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-428	09/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud entrega informe mensual agosto y septiembre-componente social.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-434	09/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-320. Compromisos comerciantes.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-444	18/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Reiteración solicitud de compromisos componente social comunicados REG-BUC-420-2022-419 y REG-BUC-420-2022-428	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-446	21/10/2023	Contrato de obra No.387-2022. Observaciones informe mensual 8 (mes de septiembre) componente social	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-460	27/10/2023	Contrato de obra No.387-2022. Recomendaciones sociales (tránsito de peatones)	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-465	03/11/2023	Contrato de obra No.387-2022.Reiteración entrega actas de vecindad zona 4	Social	
REG-BUC-420-2022-470	09/11/2023	Contrato de obra No.387-2022.REG-BUC-420-2022-Reiteracion informe mensual 9 social	Social	1-SA-202311-00173718-1-SA-202311-00173763
REG-BUC-420-2022-476	14/11/2023	Contrato de obra No.387-2022.REG-BUC-420-2022-Observaciones informe mensual septiembre.	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-479	15/11/2023	Contrato de obra No.387-2022.REG-BUC-420-2022-ACTAS DE VECINDAD	SOCIAL	

REG-BUC-420-2022-480	16/11/2023	Contrato de obra No.387-2022.REG-BUC-420-2022-APROBACIÓN INFORME AGOSTO CONTRATISTA	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-489	24/11/2023	Contrato de obra No.387-2022-remision oficio peticion clara ines	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-495	29/11/2023	Contrato de obra No.387-2022 -Reiteración Solicitud informe mensual #9 mes de octubre	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-499	01/12/2023	Contrato de obra No.387-2022 -Solicitudes franjas transitables 20 de	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-501	05/12/2023	Contrato de obra No.387-2022 -OBERVACIONES REVISIÓN INFORME 9	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-502	05/12/2023	Contrato de obra No.387-2022 -OBSERVACIONES INFORME SEPTIEMBRE CONTRATSTA	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-508	06/12/2023	Contrato de obra No.387-2022 Solicitud de informe mensual mes de noviembre	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-510	11/12/2023	Contrato de obra No.387-2023 -SEGUIMIENTO SOCIAL APENDICE J	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-511	11/12/2023	Contrato de obra No.387-2023 -Relación pendientes componente social a 20 de diciembre de 2023	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-517	18/12/2023	Contrato de obra No.387-2023 Aprobacion informe septiembre	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-519	18/12/2023	Contrato de obra No.387-2023 Aprobacion informe octubre social	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-520	19/12/2023	Contrato de obra No.387-2023 Aprobacion informe noviembre social	SOACIAL	1-SA-202312-00195076
REG-BUC-420-2022-525	20/12/2023	Contrato de obra No.387-2023-Solicitud de informe diciembre	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-528	22/12/2023	Contrato de obra No.387-2023- CIERRE PQRS	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-529	22/12/2023	Contrato de obra No.387-2023- ESTADO ACTUAL INFORMES SOCIALES	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-530	22/12/2023	Contrato de obra No.387-2023- PROYECCION OFICIO REITERACIÓN SEGUIMIENTO SOCIAL APENDICE J	SOCIAL	
REG-BUC-420-2022-531	26/12/2023	Contrato de obra No.387-2023-Acta de entorno y compromisos sociales	SOCIAL	1-SA-202312-00197819
REG-BUC-420-2022-534	11/01/2024	Contrato de obra No.387-2023--REITERACION ENTREGA INFORME DIC Y DEMAS COMPORMISOS COMPONENTE SOCIAL	SOCIAL	1-SA-202401-00003299,

LINEA ESTRATEGICA DE DIALOGO CIUDADANO

b. Programa servicio a la ciudadanía

Alcance: Este programa hace parte de la línea estratégica de dialogo ciudadano y de los pilares de mitigación, apropiación y sostenibilidad del apéndice de gestión del dialogo ciudadano y comunicación estratégica y está enfocado a la atención y servicio a la ciudadanía.

Objetivo: Atender, gestionar y tramitar la solicitudes, peticiones, quejas y reclamos de la ciudadanía de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la ciudadanía y promover mecanismos adecuados de dialogo y conversación en torno al proyecto.

-Recorridos urbanos

Durante los meses de febrero a diciembre se realizaron recorrido urbanos diarios desde el componente social; algunos llevados a cabo con el contratista, otros con entidad contratante y otros solo interventoría.
Estos recorridos tuvieron como objetivo verificar en campo las acciones llevadas a cabo por parte del contratista, atender dudas por parte de la comunidad frente a la obra y también identificar situaciones de prevención o alerta en el proceso (tales como avisar con anterioridad de cierres, mantener al área aledaña informado con antelación para evitar situaciones problemáticas en cuanto a la comunicación, articular situaciones evidenciadas en campo, toma de medidas del componente SST para mitigar riesgos para el tránsito de los peatones, al igual que cumplimiento de acuerdos previos que haya realizado el componente.

El último recorrido urbano llevado a cabo por esta interventoría. Se llevó a cabo el 20 de diciembre de 2023 para evidenciar el estado de la obra, en el presente informe se adjuntan las respectivas imágenes y las recomendaciones dadas a contratista principalmente en áreas de seguridad para las personas, se envía comunicado y se deja constancia en bitácora.



Imagen N.3. Recorridos urbanos febrero a diciembre

-Atención a veedurías ciudadanas
Durante los meses de febrero a diciembre; no se recibió reporte o información sobre las peticiones o seguimiento de veedurías como tal por parte del contratista.

En los informes mensuales del contratista se evidencia el cuadro de relación de PQRS recepcionadas; sin embargo para el mes de diciembre no se recibe informe de parte del contratista y a fecha de enero en la cual se entrega el presente consolidado No se recibió cuadro de relación de PQRS por parte del contratista, antes de la entrega del presente informe. Se dió notificación mediante comunicado por correo electrónico y comités técnicos. Es importante como lo ha reiterado esa interventoría que se ha solicitado a contratista cierre de PQRS y debe consignarse en el informe de diciembre, el cual no ha sido allegado. (Se hizo petición mediante comunicado REG-BUC-420-2022-528)

Comunicados enviados sobre solicitud de PQRS.

-REG-BUC-420-2022-551 Incumplimiento cierre de PQRS

- REG-BUC-420-2022-548 Reiteración peticiones componente social Reiteración componente social
- REG-BUC-420-2022-544 Remisión PQRS Clara Inés Garcia

- REG-BUC-420-2022-543 Remisión respuesta PQRS

- REG-BUC-420-2022-528 Reiteración cierre PQRs

- REG-BUC-420-2022-510 Seguimiento social cumplimiento apéndice J

Estado de PQRS
Es importante indicar que a continuación se presenta una relación del estado de las PQRS, sin embargo es necesario que el área técnica del contratista apoye a la profesional social para el cierre de las pendientes.

Verificación instalación y puesta en marcha de punto de atención comunitario.

En cuanto al Punto de atención comunitaria. En un primer momento consorcio ambiental urbano tuvo un PAC en la dirección Carrera 26 No. 35-30 ofi.203 , cuando se surte el proceso de cesión del contrato el punto es ubicado por COIONBRAS en la Calle 34 #26-37. Se verificó por parte de interventoría su funcionamiento, según los horarios establecidos.

A diciembre el contratista se contó con línea de atención telefónica y WhatsApp al 316 694 41 72 y correoelectrónico cau387.23@gmail.com con el fin de generar los canales de comunicación con la comunidad.

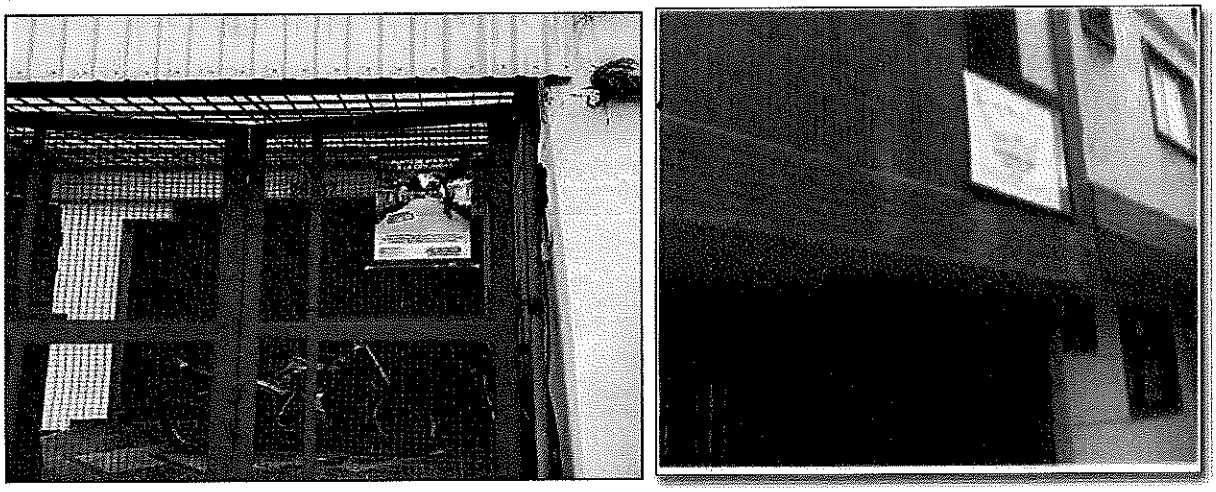


Imagen N.04. Verificación PAC.

Se debe mencionar que en el PAC se han recepcionado por parte de contratista distintas PQRS, Este tema Se ha solicitado insistentemente en comités, correos y comunicados el cierre y gestión de PQRS abiertas. Para el mes de diciembre no se cuenta reporte. Sin embargo se hizo reunión con profesional social alcaldía para tratar este tema y trasmitiendo información para seguimiento por parte de la alcaldía (se adjunta acta de reunión de 18 de dic de 2023).

# PQRS	ABIERTAS	OBSERVACIÓN
40	9	Contratista no hizo entrega de consolidado final de PQRS. Solicitudes hechas mediante comunicados relacionados en matriz.

Tabla N.5 relación general PQRS.

La matriz de PQRS no se encuentra en el informe anexo, ya que no se recibió por parte del contratista. se anexará cuando se allegue a esta interventoria. En los informes semanales profesional social de contratista indica que dio atención a PQRS sin embargo se requieren los soportes y consolidado respectivo. Lo cual se solicito mediante los comunicados entes relacionados, y en este mes mediante el comunicado REG-BUC-420-2022-55.

En comités técnicos del mes de diciembre y mediante comunicados se solicita por parte de interventoría tramitar y cerrar PQRS respectivas, se reitera que en los informes presentados se debe incluir la información que ha sido solicitada sobre porcentaje de contratación según el requerimiento.

9. Programa de dialogo y participación ciudadana

Alcance: Este programa hace parte de la línea estratégica de dialogo ciudadano y de los pilares de mitigación, apropiación y sostenibilidad del apéndice de la gestión del dialogo ciudadano y la comunicación estratégica.

Objetivo: Generar los espacios de encuentro, dialogo y atención a la ciudadanía para promover el conocimiento, la apropiación y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto. Además, busca minimizar los efectos y externalidades negativas del mismo, contemplando factores sociales, económicos, ambientales y problemáticas inherentes a la implantación de proyectos urbanos en espacios consolidados.

-Reuniones participativas
-Reunión de inicio, avance y finalización
-Comité

Durante este periodo se encuentra el avance presentado a continuación:

- ✓ **Reunión de socialización de inicio**

Se desarrollaron 2 reuniones de socialización.

-10 de Marzo de 2023

-24 de abril de 2023

Para lo cual el contratista realizó las acciones de elaboración de piezas comunicativas, volanteo, invitaciones, revisión de presentaciones. La información presentada:

Se presentan las generalidades del contrato relacionadas a continuación:

DATOS DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIO	21/02/2023
FECHA DE FINALIZACION	20/12/2023
PRESUPUESTO DE OBRA	$ 9.072.944.902,77
NUMERO CONTRATO DE OBRA	387/2022

Tabla N.6 Relación de datos del contrato general.

Durante las reuniones de socialización, se lleva a cabo la presentación del equipo de los profesionales de interventoría, la socialización de los programas del plan de dialogociudadano por parte del área social, se precisan los avances que se han llevado a cabo por parte del área social, se extienden los canales de comunicación, además de la explicación de los programas de cada área de contratista e interventoría (SST, TÉCNICO, AMBIENTAL).con base a esto se surtio la etapa de socialización y conto con el acompañamiento respectivo de la interventoria.

Logrando así la socialización en todo el corredor.



Imagen N. 05 Reunión de socialización



Imagen N. 06 Reunión de socialización

A continuación, se relaciona cuadro general de notificaciones enviadas por parte del contratista a la comunidad del AID según las actividades programadas mes a mes. Se debe tener en cuenta que en el mes de julio el contratista no contó con profesional social para lo cual se dejó evidencia en la bitácora.

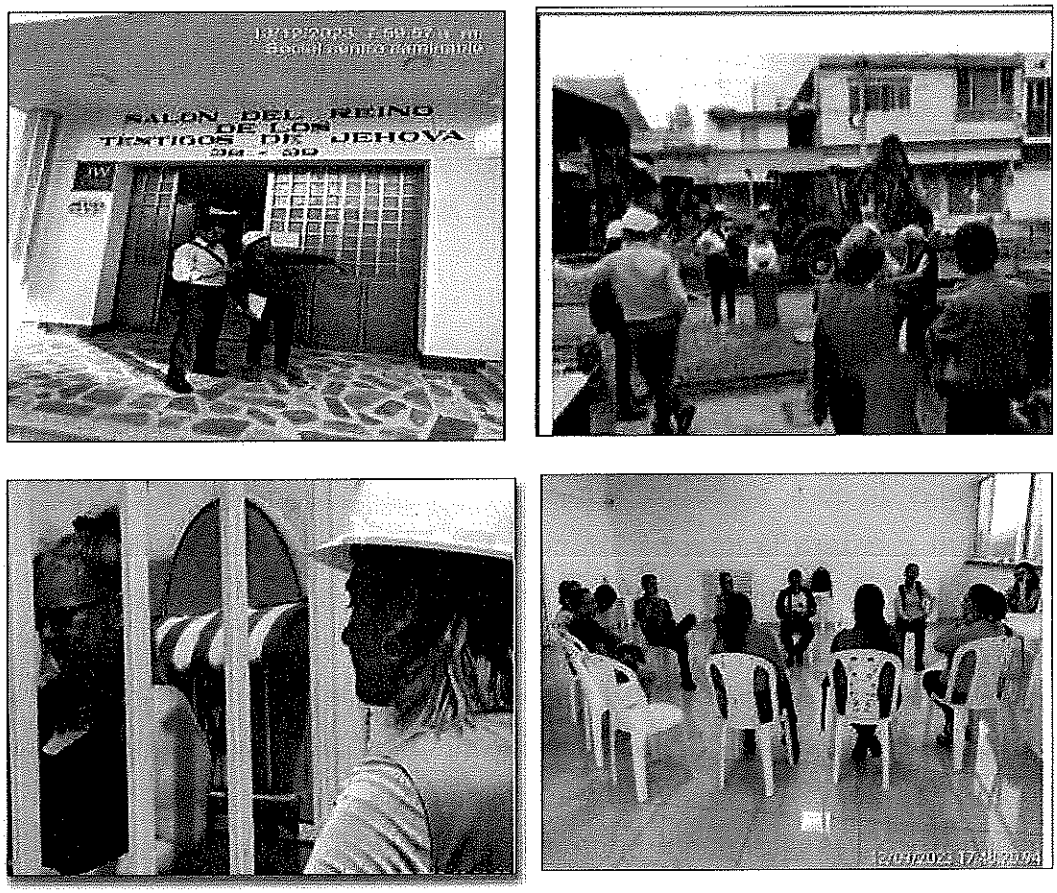


Imagen N. 07. Acompañamiento acciones de divulgación

Reunión de Socialización de Avance

Durante la supervisión del contrato de obra 387 de 2022; no se suplió esta actividad. teniendo en cuenta que según el apéndice J (lineamiento social de la entidad contratante) se establece que se realiza cuando la obra se encuentre en un 50 %de avance. Por tanto el contratista no presento desarrollo de dicha actividad ya que aún no han completado dicho avance. Sin embargo se realizaron los comités de participación en la cual se presentaron avances de los distintos componentes a la comunidad y los integrantes del comité.

Reunión de Socialización de cierre

Esta actividad no fue desarrollada por el contratista, por ende no se brindó acompañamiento de interventoría, ya que se lleva a cabo Una vez finalizadas las actividades de obra, se realizará una reunión de socialización de cierre; En este ítem e reitera la información contenida en el informe del mes de diciembre donde es importante mencionar que la obra se encuentra gestionando un adicional en tiempo para la revisión y aprobación de la entidad. A esta interventoría no le corresponde la revisión y acompañamiento de las reuniones de avance y final ya que el contrato de interventoría finaliza el 20 de dic de 2022. Por lo cual se recomienda que la entidad realice las gestiones respectivas para que el contratista cuente con la veeduría, control y seguimiento.

Comité

Respecto a los comités de participación ciudadana, se desarrollaron por parte del contratista los siguientes:

NÚMERO DE COMITÉ	**FECHA**
1	Mayo 29 de 2023
2	Septiembre 15 de 2023
3	Diciembre 6 de 2023

Y se presenta solicitud por parte de interventoria de desarrollo de los comités mensuales mediante correo electrónico, comunicados y en los respectivos comités de seguimiento.

Se presenta el registro fotográfico del desarrollo de los comités de participación ciudadana y se adjuntan actas presentadas por el contratista. A fecha de terminación del contrato se recibieron 2 actas de las 3. No se recibió por parte del contratista el acta del comité de participación realizado el 5 de diciembre de 2023. Se sugiere a la entidad realizar la solicitud para contar con el contexto.



Imagen n.8 Comités de participación ciudadana

Comerciantes : 12 de septiembre (acta reposa en : carpeta actas de reunión)
JAC: reposa en carpeta soportes contratista diciembre.
Administradores conjuntos residenciales: reposa en carpetas soportes mensuales contratista
Parque central: reposa en carpetas soportes mensuales contratista
Residente castilla de la mancha:
Miembros concejo de administración edificio el castillo
Predio I.E Caro y Cuervo

Registro fotográfico.

REUNIONES COMUNITARIAS

#	TEMA	DIRIGIDA A
1	Atención a comerciantes zona 1 para tratar inconformidades sobre afectaciones comerciales	Comerciantes
2	Atención y respuesta a JAC sobre petición de tema demoras en instalación de la piedra royal veta a contratista.	Junta de acción comunal
3	Información sobre cierres , suspensiones de accesos, informativos roturas de tubos, programación de obra.	Administradores de conjuntos residenciales
4	Reunión para socialización plan de acceso a parqueaderos	Residentes edificio castilla de la mancha
5	Reunión para presentar propuesta de cerramiento por parte de la entidad	Miembros de concejo de administración edificio el castillo
6	Reunión para atender inconformidad sobre construcción de caja electrica	Predio I.E Caro y Cuervo



Imagen N. 09 Atención el castillo.

10. Programa acompañamiento a actividades técnicas

Alcance: Teniendo en cuenta que existen varias actividades que son responsabilidad del área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad, se hace necesaria la intervención de los profesionales de dialogo ciudadano y comunicación estratégica para las siguientes actividades.

Objetivo: Establecer previo a la intervención, las condiciones físicas originales de cada uno de los predios ubicados en el área del proyecto como base para determinar las variaciones que se den en el tiempo por efectos del proceso constructivo.

-Actas de vecindad
-Actas de rampas y acceso vehicular a predios (garajes)
-Actas de compromiso
-Registro fílmico y fotográfico de andenes, fachadas y vías de desvío

A continuación, se presenta el cuadro de relación de las actas de vecindad levantadas por parte de contratista, Se fue reiterado constantemente que están pendientes 5 actas de la zona 4 (carrera 25 a carrera 27). Como se ha ido informando en los respectivos informes anteriores. Se presenta el registro fotográfico del acompañamiento por parte de interventoría al levantamiento de las actas de vecindad (68)del corredor ambiental y de igual forma se presenta anexo correspondiente.

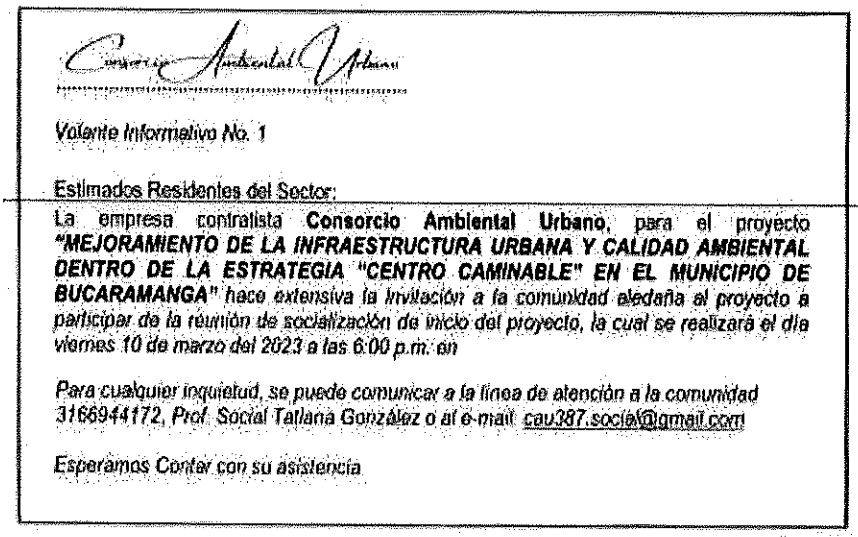
(anexo actas de vecindad)



Imagen N. 11 Levantamiento actas vecindad

Convocatoria socialización de inicio:

Como se indicó anteriormente la reunión se llevó a cabo en el mes de marzo y abril. Se realizó acompañamiento respectivo a las actividades de divulgación mediante metodología puerta a puerta, en lo concerniente a la zona 2, 3 y 4. Por tanto se verifica y apoya en la entrega de volanteinformativo y contratista deja constancia respectiva. Se hace mediante volante 007 que encontrará en el anexo informe contratista.



Consorcio Ambiental Urbano

Volante Informativo No. 1

Estimados Residentes del Sector:

La empresa contratista **Consorcio Ambiental Urbano**, para el proyecto ***"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"*** *hace extensiva la invitación a la comunidad aledaña al proyecto a participar de la reunión de socialización de inicio del proyecto, la cual se realizará el día viernes 10 de marzo del 2023 a las 6:00 p.m. en*

Para cualquier inquietud, se puede comunicar a la línea de atención a la comunidad 3166944172, Prof. Social Tatiana González o al e-mail cau387.social@gmail.com



Esperamos Contar con su asistencia


Inventario de predios:



Esta actividad fue desarrollada por parte del contratista y verificación respectiva del área técnica y social de interventoría en el mes de marzo.




A continuación se relaciona el cuadro con la información correspondiente de las zonas



del área de intervención.



ZONA No. 2 CARRERA 26 ENTRE CALLE 34 Y CALLE 36					
No.	**PREDIO**	**DIRECCIÓN**	**MÁRGEN**	**OBSERVACIONES**	**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
1	Uñas Bella	Cra 26 #34-02	MI	NA	
2	Autoservicio Merca Avícola	Cra 26 #34-04	MI	NA	
3	Local	Cra 26 #34-03	MD	NA	
4	Uz Nails	Cra 26 #34-10	MI	NA	
5	Edificio Terzetto Condominio	Cra 26 #34-18	MI	Acceso a parqueaderos subterráneos	
6	Local de manualidades	Cra 26 #34-34	MI	NA	
7	Unidad residencial el castillo	Cra 26 #34-29	MD	Tiene acceso a Parqueaderos	



8	Condominio Fuerteventura	Cra 26 #34-38	MI	Acceso a parqueaderos subterráneos	
9	Inmobiliaria Paseo España	Cra 26 #34-53	MD	Tiene acceso a Parqueadero	
10	Casa	Cra 26 #34-54	MI	Tiene acceso a garaje	
11	Edificio Akary	Cra 26 # 34	MI	Tiene acceso a parqueaderos por la calle 35	


12	Panadería Le Croissant	Cra 26 # 34	MD	NA	
13	Casa	Cra 26 #34-79	MD	NA	
14	Edificio	Cra 26 #35-12	MI	Acceso a parqueadero por la calle 35	
15	Edificio	Cra 26 #35-30	MI	Acceso a parqueadero	

16	Parqueadero Comercial	Cra 26 #35-42	MI	Acceso a Parqueadero	
17	Spa Elena Olarte	Cra 26 # 35-58	MI	NA	
18	Tiendas	Cra 26 #35-60	MI	NA	
19	Deportivos Carvajal	Cra 26 #35-72	MI	NA	
20	Supermercado Mas x Menos	Cra 26 #35-63	MD	Zona de cargue, descargue y acceso a parqueadero por la Cll 36	
ZONA No. 3 CARRERA 26 ENTRE CALLES 36 Y 37					
21	Fenix Business Center	Cra 26 #36-14	MI	Acceso a parqueadero por la Cra 26	
22	Drosan	Cra 26 #36-32	MI	Acceso a garajes por la Cra 26	

23	Centro de negocios suramericana	Cll 36 #26-14	MD	Acceso a parqueaderos por la Cra 26	
ZONA No. 4 CALLE 37 ENTRE CARRERAS 25 Y 27					
24	Unidad Preescolar Personitas	Cll 37 #25-70	MD	NA	
25	Unidad Residencial Zarzamora	Cll 37 #25-48	MD	NA	
26	Muscular Old Scholl Bodybuilding	Cll 37 #25-28	MD	NA	
27	Droguería El Boticario	Cll 37 #25-22	MD	Acceso a garaje por la calle 37	
28	Centro Terapéutico SAS - IPS	Cll 37 #25-14	MD	NA	
29	Tienda	Cra 25 #37-05	MD	NA	

30	Edificio	Cll 37 #25-09	MI	NA	
31	Lineas Especializadas	Cll 37 #25-19	MI	Acceso a parqueadero	
32	Colegio Acoandes	Cll 37 #25-39	MI	NA	
33	Restaurante Casa Gaox	Cll 37 #25-55	MI	NA	

34	Casa	Cll 37 #25-63	MI	Acceso a garaje	
35	Casa Abandonada	Cll 37 #25-67	MI	NA	
36	Unidad Residencial Parque Central	Cll 37 #26-15	MI	Acceso a parqueaderos	
37	Centro de negocios suramericana	Cll 36 #26-14	MI	Acceso a parqueaderos	

38	Estación de Servicio Primax	Calle 37 # 26-70	MD	Acceso Vehicular	
39	Embellecimiento Automotriz Daytona	Cll 37 #26-28	MD	Acceso Vehicular	
40	Museo de Arte Moderno	Cll 37 #26-16	MD	NA	

Acompañamiento a Levantamiento de Actas de Vecindad:

Como se referencia en el ítem anterior, se presenta cuadro de las actas de vecindad levantadas por parte de contratista.

En este ítem es importante tener en cuenta que están pendientes las actas de cierre, las cuales deben elaboradas al finalizar la obra. Ante este tema se hizo la consulta a la entidad teniendo en cuenta que la zona 1 se habilitaría en diciembre. Sin embargo indicaron que se solicitaba únicamente el acta de entorno, y las actas deben ser finalizadas cuando ya no haya actividad constructiva pues se debe garantizar al contratista En el siguiente cuadro se relaciona el avance en cuanto a la actividad de acompañamiento levantamiento actas de vecindad, por lo cual se encuentra en relación a los predios resultantes del inventario de predios y las actas llevadas a cabo

Consorcio Ambiental Urbano

Volante Informativo **No. 002**

Estimados Residentes del Sector:
El **Consorcio Ambiental Urbano** como Contratista, se complace en comunicar que se dio inicio a la ejecución de la obra ***"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"*** *por lo tanto, se informa a los propietarios y arrendatarios del área de influencia directa que se estará haciendo el levantamiento de Actas de Vecindad*
Es necesario que esté presente el propietario o encargado del predio para la firma del Acta de Vecindad.

Para cualquier inquietud, se puede comunicar a la línea de atención a la comunidad 3166944172, Prof. Social Tatiana González o al e-mail: cau387.social@gmail.com

Esperamos Contar con su colaboración.

Relación entrega actas de vecindad a propietarios

Se hizo entrega de las actas de vecindad levantadas por parte del contratista. a continuación se relaciona el cuadro con la información correspondiente de las mismas

ZONA	NÚMERO DE ACTAS ENTREGADAS
1	31
2	22
3	3
4	17

Por parte de interventoría se deja como recomendación que el contratista debe dar cumplimiento a la elaboración de las actas faltantes de la zona 4 ya que el corredor está en su custodia y para esto cumplir con el protocolo solicitado de información, notificaciones y demás, al igual que la entrega de las copias de dichas actas a los propietarios. Y de igual forma atender a los requerimientos que surjan. Contando con los registros y videos del estado inicial. Se ha solicitado mediante comunicados:

Acompañamiento actividad levantamiento acta de entorno:

Durante los meses de febrero a diciembre; el contratista presentó las siguientes actas de entorno.

Acta de entorno inicial	14 de abril de 2023
Acta vial inicial	14 de abril de 2023

Acta de entorno avance intervención	28 de diciembre

Al momento de entrega de este informe se solicitó el registro fotografico y fílmico de las zonas.

Relación de comunicado final sobre actas de entorno; REG-BUC-420-2022-531 Acta de entorno y compromisos sociales; REG-BUC-420-2022-547 Recomendaciones y ajustes acta de entorno. Se recibió acta el 28 de diciembre y se dio respectiva respuesta con sugerencia de ajustes.

Se reitera solicitud de levantamiento de actas ya que el contratista esta en custodia de dicho tramo. Y se deja en este informe recomendación al municipio para la revisión, vigilancia y control de dicha actividad levantamiento de actas de la zona 4 al igual que el seguimiento de todos los programas del apéndice J que seguirán siendo parte al avance de las actividades constructivas .ante este ítem, se hace la recomendación de hacer un cierre de acta de entorno para verificar el estado de las zonas de influencia , y el registro de las afectaciones que hayan surgido al igual que la constancia de finalización de actividades. Mediante bitácora, mail y comunicados REG-BUC-420-2022-465 y el dia 20 de octubre se reciben actas de zona 1,2,3.

12. Programa de gobernanza para la movilidad

Alcance: Con el desarrollo del programa se estima un proceso de coordinación interinstitucional, con el cual se favorezca la puesta en marcha de todas las acciones sociales durante el desarrollo del contrato, las cuales contaran con e acompañamiento permanente del municipio de Bucaramanga, a través de la secretaria de infraestructura y la interventoría al contratista. Es importante precisar que la ejecución del programa será permanente, toda vez que las acciones a desarrollar son de corto, mediano y largo plazo.

Objetivo: garantizar las acciones necesarias para la coordinación y el trabajode articulación interinstitucional antes, durante y después de la ejecución delproyecto.

-Gestión y articulación interinstitucional

En el marco de este programa, durante el mes de diciembre las actividades giran entorno:

Se presenta el registro fotográfico de los comités de tráfico, en los cuales interventoría realizo su asistencia y participación. El componente técnico presenta en su informe las actas correspondientes.

-Mano de obra no calificada y vulnerable

En cuanto a este tema, se anexan los comunicados por parte de interventoría donde se extienden las solicitudes y se reitera el cumplimiento con el porcentaje de mano de obra vulnerable, según lo solicitado en apéndice J.

El último reporte recibido por parte de contratista frente a este ítem se presenta a continuación.

- REG-BUC-420-2022-480
- REG-BUC-420-2022-446
- REG-BUC-420-2022-501
- REG-BUC-420-2022-138

- REG-BUC-420-2022-180
- REG-BUC-420-2022-406

En el informe de noviembre el contratista presenta a la interventoría la siguiente relación de acuerdo a este ítem:

FECHAS DE REPORTE	Total, Personal Empleado por el Proyecto		Mano de Obra calificada		Población Vulnerable		Población víctima del conflicto		Población cabeza de familia		Población con Discapacidad	
	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%	CANT	%
A NOVIEMBRE DE 2023	64	100	20	31.25	22	34.37	5	7.81	16	25	1	1.57

De igual forma, el contratista también realizo las capacitaciones al personal se deja solicitud en bitácora y en comunicados sobre donde se solicita reporte de cumplimiento de los programas del plan, entre estos el correspondiente a la contratación de personal, capacitación y cumplimiento de porcentajes respectivos. del ultimo reporte recibido del mes de noviembre se evidencia los días 1,7, y 8 de noviembre la prof social acompaño esa actividad con el área SST.

Manejo de servicios públicos:

De este ítem, por parte de interventoría se hizo acompañamiento a las acciones de articulación, principalmente del componente eléctrico. Ya que hasta la finalización del contrato a fecha de diciembre no se hicieron acciones de divulgación por parte de la ESSA O EMPAS.

La entidad que mantuvo presencia en la intervención fue EMPAS, quienes se encargaban de la difusión e información del predio a predio ya que no era una actividad del resorte del contratista. sin embargo de parte de interventoría se recomendó al contratista articular estas acciones con EMPAS para atender cualquier duda o inquietud por parte de la comunidad. Se recomienda que se fortalezcan dichas acciones para mantener informada a la comunidad del área de influencia. Por parte de interventoría se realizaron recorridos a la zona que iba

interviniendo EMPAS.

Ante este tema se recomienda que se de continuidad a la articulación y principalmente en el tema de soterrado para que los equipo sociales de la ESSA realicen la gestión respectiva.

13. Línea estratégica: Comunicación estratégica

En el presente informe, se reitera lo concerniente a esta línea ya expuesto con anterioridad, se solicito a la entidad los lineamientos respectivos y en reunión sostenida en diciembre el lineamiento dado por parte de la entidad corresponde a que esta línea se desarrollará en el año 2024, ya que se requiere realizar las mesas de trabajo y articulación con las diferentes dependencias de la entidad contratante. En este punto, esta interventoría recomienda que la entidad y la interventoría que continué con este proceso de seguimiento a la obra, retomen este programa y se articule con la entidad para dar cumplimiento a los programas faltantes. al igual que la articulación con la profesional social de la secretaria de infraestructura, comunicaciones y lo demás según la entidad requiera y solicite.

Sin embargo, esto va aunado al cronograma del COINOBRAS y las mesas institucionales que el municipio desarrolle.

14. Reporte, seguimiento y coordinación durante la ejecución del contrato

-Soportes de gestión
-Reporte periódico
-Informe mensual
-Comités de seguimiento

En este ítem,. Se adjuntan presenta la relación general de los componentes e indicadores del contratista y los soportes de gestión realizada por parte de interventoría.

Interventoría	**Contratista**
Solicitud de cronogramas e informes semanales	Hizo entrega de cronogramas e informes semanales. Completando 43 informes.
Solicitud y revisión informes mensuales	Hizo entrega de 10 informes mensuales. Pendiente de entrega informe diciembre número 11. Mediante comunicados REG-

	BUC-420-2022-538, REG-BUC-420-2022-534, REG-BUC-420-2022-529.y mediante correos. Y apuntes en bitácora da 20 de dic de 2023.
Recorridos urbanos; se brindó acompañamiento, se presentaron anotaciones en bitácora y mediante comunicados	Contratista realizó los recorridos urbanos. Está pendiente por realizar los recorridos comunitarios cuando haya mayor avance de ejecución.
Solicitud de soportes y evidencias de actividades de información y divulgación	Soportes entregados en informes; aquellos sin soporte se dejó trazabilidad en bitácora y mediante correo electrónico. Contratista tiene pendiente enviar soportes del mes de diciembre y consolidado de soportes general. Comunicados REG-BUC-420-2022-529
-Envío y gestión de compromisos del componente social mediante correo electrónico	A fecha de diciembre no se recibió por parte de contratista reporte final de los compromisos pendientes. Se solicitaron por interventoría por comunicados REG-BUC-420-2022-548 Se recibió acta de entorno zona 1, de la cual se enviaron observaciones en comunicado REG-BUC-420-2022-547 Se recibió scanner de carpetas para radicación contratista e informe 43 Remisión PQRS clara ines garcia y Mireya Rodriguez siendo enviadas a la entidad por esta interventoria.
-Asistencia y acompañamiento de mesas de articulación con profesional social	Se realizaron 3 reuniones de sgeuimiento del componente social por

entidad contratante.	parte de la entidad, reposan las actas en anexos. Y la ultima se desarrollo el 18 de diciembre (se adjunta acta) donde se evidencia el seguimiento a los programas, y se hace recorrido evidenciándose el estado actual a 20 de dic.
-Seguimiento plan de gestión social	Se adjunta cuadro de calificación de los indicadores componente social.
Solicitud cierre pqrs	9 pqrs pendientes mediante comunicado final REG-BUC-420-2022-551 REG-BUC-420-2022-528 REG-BUC-420-2022-510 REG-BUC-420-2022-548

-De febrero a diciembre se enviaron las comunicaciones respectivas al contratista sobre el seguimiento a los diferentes programas y situaciones sociales que haya tenido lugar durante el periodo en que esta interventoria realizo la supervisión correspondiente. (anexo comunicados enviados 106)

-Se recibieron por parte del contratista los siguientes comunicados (anexo correspondencia recibida por contratista) Es importante mencionar que a finalización del contrato de interventoría de 20 de dic de 2022; el contratista tiene correspondencia pendiente de responder; para lo cual se solicita se tenga en cuenta para la solicitud por parte de la entidad y así contar con la trazabilidad respectiva y los comunicados formales de los diferentes temas y realizar las entregas a la entidad.

En este aparte, también se encuentra la articulación con la entidad contratante a través de los comités de seguimiento llevados a cabo los días miércoles de cada semana. Espacio donde se transmite la información de avance del proyecto y los distintos temas que se presentan en campo para concertaracciones y demás. Por lo cual desde el componente social de interventoría se realizaron los recorridos urbanos, gestión documental, solicitudes oficiales y por vía correo electrónico y seguimiento registrado en bitácora, la cual se adjunta.

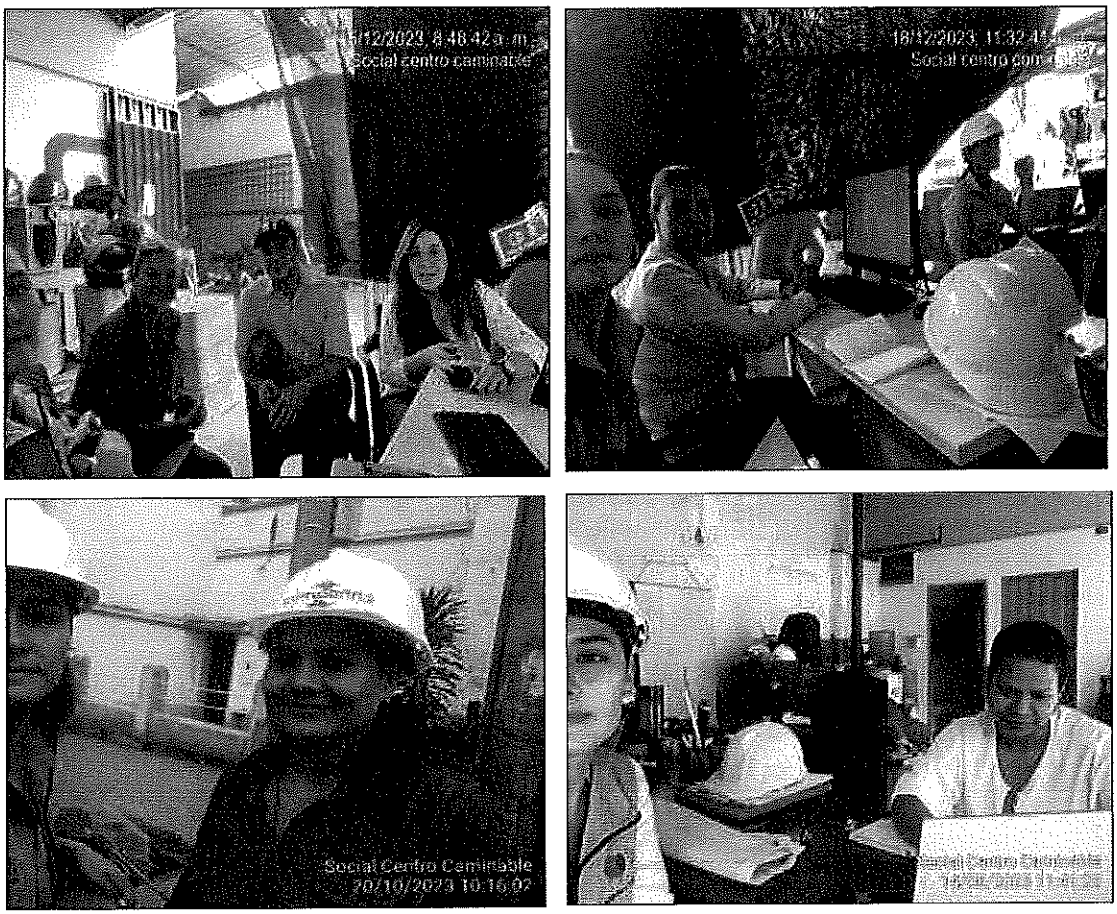


Imagen 10. Seguimiento componente social febrero a diciembre.

15. Relación comunicación enviadas y recibidas

A continuación, se presenta la matriz de relación de las comunicaciones que han hecho parte del seguimiento a la gestión y avances de cada solicitud; lo cual permite la trazabilidad de cada tema tratado.

-COMUNICACIONES RECIBIDAS DEL CONTRATISTA

Consecutivo	FECHA	Consecutivo Empresa	ASUNTO	DIRECCIONAMIENTO
11	2/03/2023	CAU-CTO 387-2022-0010	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOCIAL	SOCIAL
14	2/03/2023	CAU-CTO 387-2022-013	RESPUESTA COMUNICACIÓN REG-BUC-420-2022-020- SOLICITUD FORMATOS DE GESTIÓN SOCIAL	SOCIAL
23	7/03/2023	CAU-CTO 387-2022-021	RESPUESTA COMUNICACIÓN REG-BUC-420-2022-022- REG-BUC-420-2022-040 ENTREGA PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	SOCIAL
26	8/03/2023	2-SdIB-202303-00017903	RESPUESTA RADICADO No.1-WEB-202303-00035398- 03 DE MARZO DE 2023- TRASLADO COMUNICADO CAU-CTO387-2022-0010 SOLICITUD INFORMACIÓN SOCIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	SOCIAL
32	9/03/2023	CAU-CTO 387-2022-027	CONVOCATORIA A REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN	SOCIAL
34	13/03/2023	CAU-CTO 387-2022-029	RESPUESTA AL COMUNICADO REG-BUC-420-2022-045- OBSERVACIONES REVISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	SOCIAL
-	17/03/2023	CAU-CTO 387-2022-036	INVENTARIO PREDIOS ZONA 1	SOCIAL
43	18/03/2023	CAU-CTO 387-2022-038	RESPUESTA COMUNICAO REG-BUC-420-2022-073 SOLICITUD SOPORTES CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO Y ENTREGA DE	SOCIAL

			VOLANTES INFORMATIVOS DE INICIO DE OBRA	
50	22/03/2023	CAU-CTO 387-2022-044	ENTREGA COMPROMISO – AJUSTE CRONOGRAMA SOCIAL (ACTA ENTORNO, VOLANTEO CRA 26 Y CALLE FALTANTE – METODOLOGIA ACTAS DE VECINDAD.	SOCIAL
51	23/03/2023	CAU-CTO 387-2022-045	ENTREGA COMPROMISO – AJUSTE CRONOGRAMA SOCIAL	SOCIAL
60	27/03/2023	CAU-CTO 387-2022-055	RADICACIÓN INFORME SEMANAL No.4 SOCIAL DEL 20 AL 26 DE MARZO DE 2023	SOCIAL
61	27/03/2023	CAU-CTO 387-2022-056	RADICACIÓN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO DE 2023	SOCIAL
64	27/03/2023	CAU-CTO 387-2022-060	RESPUESTA OFICIO REG-BUC-420-2022-090 SOLICITUD REUNIÓN ATENCIÓN COMUNITARIA RESIDENTE CONJUNTO CASTILLA DE LA MANCHA	SOCIAL
66	28/03/2023	CAU-CTO 387-2022-061	RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2023	SOCIAL
67	28/03/2023	CAU-CTO 387-2022-054	ALCANCE AL COMUNICADO REG-BUC-420-2022-078 DE ASUNTO "OBSERVACIONES INFORME SEMANAL COMPONENTE SOCIAL"	SOCIAL
73	29/03/2023	CAU-CTO 387-2022-060	R ESPUESTA OFICIO REG-BUC-420-2022-090 SOLICITUD REUNIÓN ATENCIÓN COMUNITARIA RESIDENTE CONJUNTO CASTILLA DE LA MANCHA	SOCIAL
74	29/03/2023	CAU-CTO 387-2022-066	RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS DEL 28 Y 29 DE MARZO DEL 2023	SOCIAL

77	30/03/2023	CAU-CTO 387-2022-068	**FOLLETO DE DIVULGACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO**	**SOCIAL**
80	30/03/2023	CAU-CTO 387-2022-070	**SOLICITUD DIRECTRICES DE TRATAMIENTO Y MANEJO DE BIENES DE INTERÉS CULTURAL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**	**TECNICO - SOCIAL**
84	4/04/2023	CAU-CTO 387-2022-074	**RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2023**	**SOCIAL**
87	5/04/2023	CAU-CTO 387-2022-078	**REMISIÓN INFORME MENSUAL No.2 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- COMPONENTE SOCIAL**	**SOCIAL**
91	10/04/2023	CAU-CTO 387-2022-083	**INFORME SEMANAL NO. 6 Y RADICACIÓN DEL INFORME SEMANAL NO. 5 EN SU V-2 AJUSTADO**	**SOCIAL**
92	10/04/2023	CAU-CTO 387-2022-084	**ENTREGA INVENTARIO DE PREDIOS**	**SOCIAL**
93	10/04/2023	CAU-CTO 387-2022-085	**ENVÍO DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL**	**SOCIAL**
95	11/04/2023	CAU-CTO 387-2022-087	**TRASLADO DE PQRS 003 RESIDENTE PALOS DE MOGUER**	**SOCIAL**
98	11/04/2023	CAU-CTO 387-2022-091	**RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2023**	**SOCIAL**
106	15/04/2023	CAU-CTO 387-2022-101	**TRASLADO PQRS 001 SEÑORA FANNY DUEÑEZ RESIDENTE DE LA URBANIZACIÓN CASTILLA DE LA MANCHA**	**SOCIAL**
109	17/04/2023	CAU-CTO 387-2022-0104	**INFORME SEMANAL SOCIAL No 7 Y CRONOGRAMA SOCIAL**	**SOCIAL**
110	18/04/2023	CAU-CTO 387-2022-0105	**ALCANCE DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ACTAS DE VECINDAD**	**SOCIAL**
117	21/04/2023	CAU-CTO 387-2022-116	**CONVOCATORIA REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN**	**SOCIAL**

			CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 387 DE 2022	
125	25/04/2023	CAU-CTO 387-2022-130	ENVÍO PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES SEMANA 24 AL 29 DE ABRIL DE 2023	SOCIAL
129	25/04/2023	CAU-CTO 387-2022-131	RESPUESTA A OFICIO REG-BUC-420-2022-128-INFORME SOCIAL 2V2	SOCIAL
135	28/04/2023	2-SdlB2-202304-00036120	RESPUESTA RADICADO No.1-WEB-202304-00075403- 12 DE ABRIL DE 2023- TRASLADO COMUNICADO CAU-CTO-387-2022-087 PQRS PALOS DE MOGUER	SOCIAL
139	28/04/2023	CAU-CTO 387-2022-137	SOLICITUD REUNIÓN CON LAS ENTIDADES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BUCARAMANGA	SOCIAL
141	1/05/2023	CAU-CTO 387-2022-139	ENVIO SEMANAL No.9 Y DEL INFORME SEMANAL No8 AJUSTADO COMPONENTE SOCIAL	SOCIAL
144	2/05/2023	CAU-CTO 387-2022-142	TRASLADO DE SOLICITUD DE PARQUE CENTRAL	SOCIAL
149	5/05/2023	CAU-CTO 387-2022-149	RESPUESTA A OFICIO REG-BUC-420-2022-166 RTA PQRS PALOS DE MOGUER	SOCIAL
150	5/05/2023	CAU-CTO 387-2022-148	INFORME SOCIAL MENSUAL No. 3 V1 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	SOCIAL
159	8/05/2023	CAU-CTO 387-2022-160	INFORME SEMANAL SOCIAL No. 10 V-1	SOCIAL
163	9/05/2023	2-SdlB2-202305-00040687	RESPUESTA RADICADO No. 1-WEB-202304-00079122-18 DE ABRIL DE 2023- Traslado comunicado CAU-CTO-387-2022-101 PQRS Sra. Fanny Dueñez, residente Urbanización Castilla de la Mancha	SOCIAL

172	11/05/2023	CAU-CTO 387-2022-169	**Respuesta a correo recibido el 09 de mayo de 2023, relacionado con Radicado No. 1-WEB-202304-00079122 – 18 de abril de 2023 PLAN DE CONTINGENCIA para garantizar el ingreso vehicular de los parqueaderos residenciales y comerciales existentes en la zona en intervención**	**TECNICO - SOCIAL**
173	11/05/2023	2-SdIB2-202305-00038525	**traslado concepto propiedad horizontal y estacionamienyos calle 37 con carrera 26 unidad residencial parque central**	**SOCIAL**
174	11/05/2023	2-SdIB2-202305-00040687	**PQRS Fanny Dueñez**	**SOCIAL**
175	12/05/2023	e-mail	**Informe de gestión social No. 3. Abril**	**SOCIAL**
177	15/05/2023	CAU-CTO 387-2022-175	**Radicación Informe social semanal No. 11 V1**	**SOCIAL**
182	18/05/2023	CAU-CTO 387-2022-182	**Solicitud préstamo de la oficina de la Bicicleta ubicada en el parque de los niños.**	**SOCIAL**
184	17/05/2023	E-MAIL CERRAMIENTO EL CASTILLO	**Correo electrónico solicitud cerramiento conjunto el castillo**	**SOCIAL**
187	19/05/2023	2-SdIB2-202305-00044027	**RESPUESTA RADICADO No. 1-WEB-202305-00088421- 8 de mayo de 2023- Traslado comunicado CAU-CTO-387-2022-149 Respuesta PQRS Palos de Moguer**	**SOCIAL**
188	23/05/2023	CAU-CTO 387-2022-187	**Radicación Informe social semanal No. 12 V1**	**SOCIAL**
189	23/05/2023	2-SIGRD-202305-00045893	**Radicado Respuesta: 1-WEB-202304-00083099, - 4/24/2023 , - Oficio REG-BUC-420-2022-152, Muro carrera 26 riesgo de colapso**	**SOCIAL**

194	26/05/2023	CAU-CTO 387-2022-191	SOLICITUD DE JAIME BAUTISTA EDIFICIO AKARY	TECNICO - SOCIAL
195	26/05/2023	CAU-CTO 387-2022-192	AFECTACIÓN A TRABAJADORES INFORMALES	SOCIAL
196	26/05/2023	CAU-CTO 387-2022-193	NOTIFICACIÓN OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	SOCIAL
197	26/05/2023	CAU-CTO 387-2022-194	SOLICITUD DE TANIA MEDARDA RUEDA ARDILA RESIDENTE DEL EDIFICIO MARIA HELENA	SOCIAL
198	26/05/2023	CAU-CTO 387-2022-195	NOTIFICACIÓN SITUACIÓN EMPRESA DROSAN	SOCIAL
199	26/05/2023	CAU-CTO 387-2022-196	INCONVENIENTE PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD CALLE 37 ENTRE CARRERAS 25 Y 26.	SOCIAL
201	30/05/2023	CAU-CTO 387-2022-199	Radicación Informe Semanal Social No. 13 V-1	SOCIAL
202	30/05/2023	CAU-CTO 387-2022-201	Radicación Informe Semanal Social No. 12 V-2	SOCIAL
210	5/06/2023	CAU-CTO 387-2022-210	Radicación Informe Social mensual No.4 V-1 Correspondiente al mes de mayo.	SOCIAL
213	8/06/2023	CAU-CTO 387-2022-216	Radicación actas de vecindad levantadas el día 06 de junio del 2023	SOCIAL
214	8/06/2023	CAU-CTO 387-2022-212	Radicación Informe Semanal Social No. 14 V-1 y ajustes del Informe semanal No. 13 V1	SOCIAL
216	13/06/2023	CAU-CTO 387-2022-221	ALCANCE AL COMUNICADO CAU – CTO 387 – 2022 – 194 DE ASUNTO "SOLICITUD DE TANIA MEDARDA RUEDA ARDILA RESIDENTE DEL EDIFICIO MARIA HELENA".	SOCIAL
217	13/06/2023	CAU-CTO 387-2022-223	INFORME MENSUALSOCIAL No. 4 V2	SOCIAL

219	13/06/2023	CAU-CTO 387-2022-225	**RADICACIÓN INFORME SEMANAL SOCIAL No. 15 V1 E INFORME SEMANAL SOCIAL No. 14 V2.**	**SOCIAL**
224	14/06/2023	2-SdIB2-202306-00049871	**Invasión espacio público corredor carrera 26**	**SOCIAL**
225	14/06/2023	2-SdIB2-202306-00050120	**Levantamieno actas de vecindad**	**SOCIAL**
226	14/06/2023	2-SdIB2-202306-00049871 - 49944 - 52743 - 49958 - 50120	**Respuestas PQRS**	**SOCIAL**
234	21/06/2023	CAU-CTO 387-2022-233	**Respuesta a comunicados: - REG-BUC-420-2022-215 Respuesta plan de contingencia vehicular - REG-BUC-420-2022-261 Reiteración presentación plan de contingencia accesos vehiculares Plan de contingencia parqueaderos**	**SOCIAL**
237	21/06/2023	N/A	**Acción de tutela**	**TECNICO y SOCIAL**
239	22/06/2023	CAU-CTO 387-2022-230	**Concepto Social sobre solicitud de Tania Rueda**	**SOCIAL**
240	22/06/2023	CAU-CTO 387-2022-234	**Respuesta a los comunicados "REG-BUC-420-2022-247 Respuesta Informe Mensual 4 V2" y "REG-BUC-420-2022-268 Solicitud cumplimiento componente social"**	**SOCIAL**
246	26/06/2023	CAU-CTO 387-2022-235	**RADICACIÓN INFORME SEMANAL SOCIAL No. 17 V1 E INFORME SEMANAL SOCIAL No. 17 V1.**	**SOCIAL**
253	1/07/2023	N/A	**Derecho de petición pago de servicio de maquinaria y transporte e información**	**SOCIAL**
262	11/07/2023	CAU-CTO 387-2022-247	**RESPUESTA A COMUNICADO REG-BUC-420-2022-291 "Observaciones informe social No. 5"**	**SOCIAL**

263	11/07/2023	CAU-CTO 387-2022-249	**RADICACIÓN INFORME SEMANAL SOCIAL No. 18 V2 E INFORME SEMANAL SOCIAL No. 19 V1**	**SOCIAL**
264	11/07/2023	CAU-CTO 387-2022-248	**RESPUESTA AL COMUNICADO REG – BUG – 420 – 2022 – 290 "SOLICITUDES COMPONENTE SOCIAL".**	**SOCIAL**
271	18/07/2023	2-SdIB2-202307-00064357	**Respuesta radicado 1-WEB-202307-00118210 12 julio de 2023. Traslado CAU 233, Solicitud de información**	**SOCIAL**
272	18/07/2023	CAU-CTO 387-2022-254	**Respuesta comunicado REG-BUC-420-2022-315. Cumplimiento de plantilla mínima**	**SOCIAL**
297	14/08/2023	CAU-CTO 387-2022-269	**Información Punto de Atención a la Comunidad del contratista.**	**SOCIAL**
300	15/08/2023	CAU-CTO 387-2022-270	**Plan de manejo vial para ingreso a parqueaderos.**	**SOCIAL**
306	18/08/2023	CAU-CTO 387-2022-277	**Radicación Informe Social mensual No.6. Correspondiente al mes de julio.**	**SOCIAL**
316	28/08/2023	E-MAIL	**Respuesta y cierre de PQRS N° 001 - Consorcio Ambiental Urbano**	**SOCIAL**
332	8/09/2023	CAU-CTO 387-2022-289	**Radicación Informe Social mensual No.6. Correspondiente al mes de julio.**	**SOCIAL**
333	8/09/2023	CAU-CTO 387-2022-290	**Informe Social mensual No.7. agosto**	**SOCIAL**
336	11/09/2023	CAU-CTO 387-2022-293	**INVITACIÓN A REUNIÓN DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**	**SOCIAL**
338	11/09/2023	CAU-CTO 387-2022-294	**Respuesta oficio REG-BUC-420-2022-380. PAC**	**SOCIAL**
341	15/09/2023	CAU-CTO 387-2022-299	**Radicación Informe corregido de componente social correspondiente al mes de julio.**	**SOCIAL**

347	18/09/2023	CAU-CTO 387-2022-301	**Informe Social corregido No.7, período del mes de agosto.**	**SOCIAL**
348	19/09/2023	CAU-CTO 387-2022-303	**Respuesta oficio REG-BUC-420-2022-396.**	**SOCIAL**
352	26/09/2023	2-SdlB2-202309-00087954	**derecho de petición de interés general - daños y perjuicios ocasionados por las obras en el proyecto - Radicado 1-SA-202309-00153055**	**SOCIAL**
363	29/09/2023	N/A	**SOLICITUD REPARACIÓN**	**SOCIAL**
372	9/10/2023	CAU-CTO 387-2022-320	**Respuesta comunicado REG- BUC-420-2022-423. Incumplimientos comerciantes.**	**SOCIAL**
391	20/10/2023	CAU-CTO 387-2022-336	**Relación y scanner actas de vecindad Paseo España.**	**SOCIAL**
396	3/11/2023	CAU - CTO 387 - 2022 – 344	**Respuesta oficio REG-BUC-420-2022-465**	**SOCIAL**
405	24/11/2023	CAU - CTO 387 - 2022 – 352	**INFORME MENSUAL SOCIAL AGOSTO**	**SOCIAL**
406	24/11/2023	2-SdlB2-202311-00106042	**Solicitud Derecho de Petición - cita con contratista obra carrera 26**	**SOCIAL**
411	27/11/2023	CAU - CTO 387 - 2022 – 357	**– RESPUESTA A OFICIO REG-BUC-420-2022-487. Inactividad en zona 1 y 2**	**TECNICO- SOCIAL**
415	28/11/2023	CAU - CTO 387 - 2022 – 361	ENTREGA INFORME MENSUAL SEPTIEMBRE CORREGIDO	**SOCIAL**
416	29/11/2023	CAU - CTO 387 - 2022 – 362	**INVITACIÓN A REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**SOCIAL**
419	1/12/2023	CAU - CTO 387 - 2022 – 365	**ENTREGA INFORME MENSUAL OCTUBRE**	**SOCIAL**
420	1/12/2023	CAU - CTO 387 - 2022 – 366	**INVITACIÓN A REUNIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA**	**SOCIAL**

431	14/12/2023	CAU - CTO 387 - 2022 – 377	**SUBSANACION INFORME SOCIAL OCTUBRE**	**SOCIAL**
442	29/12/2023	CAU - CTO 387 - 2022 – 389	**Rta. Derecho de Petición Clara Ines García**	**SOCIAL**
443	29/12/2023	CAU - CTO 387 - 2022 – 390	**Rta. Derecho de Petición Claudia Mireya Suarez**	**SOCIAL**
461	29/12/2023	CAU - CTO 387 - 2022 – 388	**ACTA DE ENTORNO**	**SOCIAL**

-COMUNICACIONES ENVIADAS AL CONTRATISTA

Consecutivo	Fecha	ASUNTO	DIRECCIONAMIENTO
REG-BUC-420-2022-020	24/02/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- SOLICITUD DE FORMATOS GESTIÓN SOCIAL	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-033	03/03/2023	TRASLADO COMUNICADO CAU-CTO387-2022-0010 SOLICITUD INFORMACIÓN SOCIAL POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-041	06/03/2023	SOLICITUD DE INICIO DE CONVOCATORIA COMUNITARIA Y REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-045	08/03/2023	OBSERVACIONES REVISIÓN PLAN DE GESTIÓN SOCIAL-COMUNICADO CAU-CTO 387-2022-021	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-065	15/03/2023	CONTRATO DE OBRA No.387-2022- RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO-387-2022-0029 REVISIÓN VERSIÓN 2-PLAN DE GESTIÓN SOCIAL	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-072	17/03/2023	CONTRATO DE OBRA No.387-2022- SOLICITUD PLAN DE CONTINGENCIA ACCESO A PARQUEADEROS DE EFICIOS Y VIVIENDAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-073	17/03/2023	CONTRATO DE OBRA No.387-2022- SOLICITUD SOPORTES CONVOCATORIA REUNIÓN DE INICIO Y ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVO DE INICIO DE OBRA	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-078	23/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 – OBSERVACIONES INFORME SEMANAL COMPONENTE SOCIAL	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-079	23/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 – SOLICITUD REPORTE PROGRAMA: ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS /ACTAS DE VECINDAD	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-090	24/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 – SOLICITUD REUNIÓN DE ATENCIÓN COMUNITARIA RESIDENTE CASTILLA DE LA MANCHA	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-095	27/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 – SOLICITUD SOCIALIZACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-102	30/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 - RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO 387-2022-036 INVENTARIO DE PREDIOS	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-104	31/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 - RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO 387-2022-061. RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD	SOCIAL

REG-BUC-420-2022-108	31/03/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 - RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO 387-2022-060. ATENCIÓN COMUNITARIA RESIDENTES CASTILLA DE LA MANCHA	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-116	05/04/2023	CONTRATO DE OBRA No.387-2022- RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO-387-2022-074- RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS DEL 22 AL 27 DE MARZO DEL 2023	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-128	12/04/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO-387-2022-078- OBSERVACIONES INFORME MENSUAL No.2 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023- COMPONENTE SOCIAL	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-131	12/04/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO-387-2022-091- RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS DEL 22 AL 27 DE MARZO DE 2023	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-133	12/04/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- TRASLADO COMUNICADO CAU-CTO-387-2022 PQRS PALOS DE MOGUER	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-138	14/04/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 – ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PROGRAMA GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD-MANO DE OBRA NO CALIFICADA Y VULNERABLE	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-142	18/04/2023	CONTRATO DE OBRA NO.387-2022 –TRASLADO COMUNICADO CAU - CTO 387 - 2022 – 101 PQRS 001 SEÑORA FANNY DUEÑEZ, RESIDENTE DE LA URBANIZACIÓN CASTILLA DE LA MANCHA	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-148	20/04/2023	TRASLADO COMUNICADO CAU - CTO 387 - 2022 – 0103 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA VALLA INFORMATIVA	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-165	03/05/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- RESPUESTA COMUNICADO CAU-CTO 387-2022-131- INFORME MENSUAL SV2 COMPONENTE SOCIAL	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-166	03/05/2023	CONTRATO DE OBRA 387 DE 2022- REMISIÓN COMUNICADO 2-SdIB2-202304-00036120- PQRS No.3 PALOS DE MOGUER	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-178	08/05/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Traslado comunicado CAU - CTO 387 - 2022 – 149. Respuesta PQRS palos de Moguer.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-180	08/05/2023	Contrato de obra No.387-2022 – Reporte seguimiento área social	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-181	09/05/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Traslado de correspondencia comunicado CAU – CTO 387 – 2022 – 158 del 08/05/2023 "Envió observaciones de la revisión de estudios y diseños entregados por la entidad"	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-188	12/05/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta al comunicado CAU-CTO-2022-157 Notificación de retiro de personal	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-200	23/05/2023	Contrato de obra No.387-2022 - Aprobación informe mensual 3 componente social- Abril V2.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-202	23/05/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Ampliación a la respuesta del oficio CAU - CTO 387 - 2022 – 158 del 08/05/23 con asunto "Envío observaciones de la revisión de Estudios y Diseños entregados por la Entidad."	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-204	24/05/2023	Contrato de obra No.387-2022 – Traslado respuesta PQRS Palos de Moguer y plano de mobiliario ajustado.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-206	26/05/2023	Contrato de obra No.387-2022 – Situación Social Contrato Consorcio Andenes Santander.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-207	29/05/2023	Contrato de obra No.387-2022 –Traslado comunicados articulación temas sociales con administración municipal.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-247	15/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-223. Observaciones informe mensual social No. 4 V2.	SOCIAL

REG-BUC-420-2022-251	15/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Remisión respuesta comunicados CAU-CTO 387-2022-191, CAU-CTO 387-2022-192, CAU-CTO 387-2022-193, CAU-CTO 387-2022-194, CAU-CTO 387-2022-195, CAU-CTO 387-2022-196 por parte de entidad contratante.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-261	16/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Reiteración presentación plan de contingencia accesos vehiculares	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-262	16/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Trazabilidad atención y gestión sobre plan de contingencia para mitigar afectación a parqueaderos.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-268	21/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud de cumplimiento compromisos componente social.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-270	22/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Traslado acción de tutela edificio parque central.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-275	26/06/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-234 aprobación informe mensual 4 componente social	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-279	29/06/2023	Contrato de Interventoría 420 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387 – 2022 – 230. Petición señora Tania Medarda – edificio María Elena.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-288	05/07/2023	Contrato de Interventoría 420 de 2022. Solicitud respuesta Derecho de Petición PC Transportes S.A.S.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-290	06/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitudes componente social.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-291	06/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-242. Observaciones informe mensual No 5 V1 componente social – junio de 2023.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-297	12/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-233. Plan de contingencia parqueaderos.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-298	12/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Traslado comunicado CAU - CTO 387 - 2022 – 233. Solicitud de información.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-305	13/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387 -2022 -248. Solicitudes sociales.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-309	14/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387 – 2022 – 247. Aprobación de informe mensual social No. 5.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-317	19/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO-387-2022-25	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-318	19/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Remisión comunicado 2-SdIB2- 202307-00064357 Respuesta comunicado -CTO-387-2022-233.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-325	31/07/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitudes componente social mes julio y continuidad desarrollo actividades apéndice J.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-348	15/08/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-270. Plan de manejo vial para ingreso a parqueaderos.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-355	24/08/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-277 Informe mensual N° 6 periodo 01 al 31 de julio de 2023 componente social	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-358	25/08/2023	Contrato de obra No.387-2022 -223 Respuesta volante informativo 11 Inicio de obras en calle 32 con carrera 26.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-363	29/08/2023	Contrato de obra No.387-2022 Solicitud entrega cronograma e informes sociales.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-380	08/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud instalación valla informativa PAC.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-381	08/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Observaciones presentación comité de participación ciudadana.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-382	08/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-290. Observaciones informe mensual social No 7. Periodo agosto de 2023.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-383	08/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-289. Informe mensual social No 6. Periodo julio de 2023.	SOCIAL

REG-BUC-420-2022-387	12/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud soportes convocatoria comité de participación ciudadana.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-388	12/09/2023	Sensibilización comunitaria recolección y manejo de basuras	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-392	14/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Reiteración atención de observaciones informes sociales julio y agosto de 2023.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-394	18/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Remisión actas de vecindad.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-395	18/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-299. Aprobación informe social julio de 2023.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-396	18/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Soportes gestión e información unidad residencial El Castillo.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-397	19/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Remisión informe social de obra No. 6 mes de julio de 2023.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-406	22/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU - CTO 387 - 2022 – 301 Informe mensual 7 V2 agosto 2023. Observaciones.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-409	27/09/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Remisión comunicado 2-SdIB2-202309-00087954 derecho de petición de interés general - daños y perjuicios ocasionados por las obras en el proyecto -Radicado 1-SA-202309-00153055 y solicitud cierre PQRS.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-417	03/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta correo electrónico del 29 de septiembre de 2023. Solicitud reparaciones vehículo GHP219	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-418	03/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Traslado petición correo electrónico del 29 de septiembre de 2023. Solicitud reparaciones vehículo GHP219	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-419	03/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud cumplimiento compromisos mesa de trabajo componente social	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-423	06/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud cumplimiento compromisos reunión comerciantes.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-428	09/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Solicitud entrega informe mensual agosto y septiembre-componente social.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-434	09/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Respuesta comunicado CAU-CTO 387-2022-320. Compromisos comerciantes.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-444	18/10/2023	Contrato de Obra 387 de 2022. Reiteración solicitud de compromisos componente social comunicados REG-BUC-420-2022-419 y REG-BUC-420-2022-428	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-446	21/10/2023	Contrato de obra No.387-2022. Observaciones informe mensual 8 (mes de septiembre) componente social	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-460	27/10/2023	Contrato de obra No.387-2022. Recomendaciones sociales (tránsito de peatones)	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-465	03/11/2023	Contrato de obra No.387-2022.Reiteración entrega actas de vecindad zona 4	Social
REG-BUC-420-2022-470	09/11/2023	Contrato de obra No.387-2022.REG-BUC-420-2022-Reiteracion informe mensual 9 social	Social
REG-BUC-420-2022-476	14/11/2023	Contrato de obra No.387-2022.REG-BUC-420-2022-Observaciones informe mensual septiembre.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-479	15/11/2023	Contrato de obra No.387-2022.REG-BUC-420-2022-ACTAS DE VECINDAD	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-480	16/11/2023	Contrato de obra No.387-2022.REG-BUC-420-2022-APROBACIÓN INFORME AGOSTO CONTRATISTA	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-487	24/11/2023	Contrato de obra No.387-2022-INACTIVIDAD DE OBRA ZONA 1 Y 2	TECNICO -SOCIAL
REG-BUC-420-2022-489	24/11/2023	Contrato de obra No.387-2022-remision oficio peticion clara ines	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-495	29/11/2023	Contrato de obra No.387-2022 -Reiteración Solicitud informe mensual #9 mes de octubre	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-499	01/12/2023	Contrato de obra No.387-2022 -Solicitudes franjas transitables 20 de	SOCIAL

REG-BUC-420-2022-501	05/12/2023	Contrato de obra No.387-2022 -OBERVACIONES REVISIÓN INFORME 9	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-502	05/12/2023	Contrato de obra No.387-2022 -OBSERVACIONES INFORME SEPTIEMBRE CONTRATSTA	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-508	06/12/2023	Contrato de obra No.387-2022 Solicitud de informe mensual mes de noviembre	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-510	11/12/2023	Contrato de obra No.387-2023 -SEGUIMIENTO SOCIAL APENDICE J	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-511	11/12/2023	Contrato de obra No.387-2023 -Relación pendientes componente social a 20 de diciembre de 2023	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-517	18/12/2023	Contrato de obra No.387-2023 Aprobacion informe septiembre	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-519	18/12/2023	Contrato de obra No.387-2023 Aprobacion informe octubre social	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-520	19/12/2023	Contrato de obra No.387-2023 Aprobacion informe noviembre social	SOACIAL
REG-BUC-420-2022-525	20/12/2023	Contrato de obra No.387-2023-Solicitud de informe diciembre	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-528	22/12/2023	Contrato de obra No.387-2023- CIERRE PQRS	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-529	22/12/2023	Contrato de obra No.387-2023- ESTADO ACTUAL INFORMES SOCIALES	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-530	22/12/2023	Contrato de obra No.387-2023- PROYECCION OFICIO REITERACIÓN SEGUIMIENTO SOCIAL APENDICE J	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-531	26/12/2023	Contrato de obra No.387-2023-Acta de entorno y compromisos sociales	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-534	11/01/2024	Contrato de obra No.387-2023--REITERACION ENTREGA INFORME DIC Y DEMAS COMPORMISOS COMPONENTE SOCIAL	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-538	17/01/2024	Contrato de obra No.387-2023- Reiteración Solicitud de informe diciembre y demás compromisos área social.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-543	22/01/2024	Contrato de obra No.387-2023- Remisión respuesta PQRS	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-544	22/01/2024	Contrato de obra No.387-2023- Remisión respuesta PQRS #37 Sra Clara Inés Garcia.	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-547	22/01/2024	Contrato de obra No.387-2023- Observaciones y recomendaciones acta de entorno allegada 28 de dic de de 2022	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-548	22/01/2024	Contrato de obra No.387-2023- Reiteración componente social	SOCIAL
REG-BUC-420-2022-551	25/01/2024	Contrato de obra No.387-2023- RELACION PQRS ABIERTAS PARA CIERRE	SOCIAL

INFORME SEMANAL

Se adjunta los (43) informes semanales correspondientes recibidos por parte del contratista.

INFORME MENSUAL

Se adjuntan los 12 informe mensuales de la interventoría y los 10 entregados por parte del contratista, hasta el mes de noviembre.

CRONOGRAMAS SEMANALES

Se realiza revisión de los cronogramas del área social, los cuales fueron solicitados a la profesional social de contratista para llevar a cabo el acompañamiento a las distintas actividades.

16. CONCLUSIONES

Durante el periodo comprendido entre febrero a diciembre de 2023 el profesional residente social de interventoría realizó actividades en cumplimiento a los lineamentos instaurados en el apéndice 1.

- Se realizó revisión y aprobación de los informes semanales respectivos, y emitiendo los ajustes y observaciones a realizar para complementar por parte de la profesional social de contratista. se recibió 43 informes semanales.*(anexo 1. Informes semanales)*
- Se realizó revisión de los cronogramas de actividades de la profesional social. a fecha de hoy se ha contado con 40 cronogramas semanales *(anexo 2. Cronogramas semanales)*
- Se realizó acompañamiento a las actividades del componente social haciendo seguimiento respectivo y acompañamiento en campo*(anexo 3.fotografias acompañamiento contratista)*
- *Se realizó acompañamiento a las actividades de revisión de PPT e información para los comités de participación ciudadana*
- *Se asistió a los (3) comité de participación ciudadana (anexo 5. Acta de comités de participación y listado de asistencia)*
- Se realiza diligenciamiento de bitácora de obra (anexo 6 . bitácora consolidado febrero a diciembre)
- Se asistió a reunión entre contratista, entidad e interventoría seguimiento social. se realizaron 36 comités de seguimiento.
- Se adjuntan actas de vecindad levantadas por el contratista (anexo 8. 68 Actas de vecindad)
- Se remite actas de entorno enviada por contratista (Anexo 8, actas de entorno)
- A la fecha no se ha recibido reporte de cierre total de PQRS abiertas y

consolidado (anexo 9 comunicado solicitando cierre de pqrs, y 40 PQRS.)

- Se enviaron las comunicaciones respectivas al contratista sobre el seguimiento a los diferentes programas y situaciones sociales que haya tenido lugar durante este mes de noviembre. principalmente los relacionados en los comunicados *(Anexo 10. Comunicaciones enviadas y relación correspondencia social Excel)*

- En los anexos se envían la relación de los comunicados enviados vía mail al contratista haciendo solicitudes respectivas de las actividades. *Anexo 11. (pdf comunicaciones enviadas por correo electrónico)*

- Se envió correo electrónico a entidad contratante pro parte de interventoría, con el fin de solicitar reunión de seguimiento para hacer reporte y dejar evidencia del estado actual de los programas y la obra a nivel social. Anexo 12. (solicitudes seguimiento con entidad contratante)

- Se realiza acompañamiento a actividades técnicas de interventoría, para garantizar información a los peatones de zonas habilitadas y prohibidas. Principalmente en fundición de terreno, seguimiento a la información a dar a 20 de dic frente dudas comunitarias sobre fechas de inicio en 2024 y enlace con entidad *Anexo 14. (registro fotográfico)*

- Recorridos urbanos anexo 15 (registro fotográfico mensual)

- Se hace solicitud y seguimiento de temas compromiso del componente social.

- Seguimiento compromisos comités técnicos de seguimiento

- Envío de solicitud sobre tránsito peatonal en época decembrina, orientado a mantener el corredor en orden, seguro y a la comunidad informada de actividades a desarrollar y estado de la obra.

- Se adjunta archivo de scanner de carpetas presentadas por parte del contratista

a la entidad contratante.

- Se verifica que desde el componente social se ha prestado atención en PAC con constancia.

- Se deja constancia mediante bitácora de las recomendaciones a nivel social por parte de interventoría en cuanto a (reporte de actividades de los programas del apéndice J con sus respectivos comunicado, las medidas de seguridad para el transito de los peatones durante la suspensión del contrato y la reanudación del contrato 387 de 2022, se indica a contratista que tiene pendientes principalmente cierre de pqrs, respuesta comunicados enviados por interventoría que deben enviar para que interventoría realice remisión respectiva a entidad. A día de hoy de entrega del presente informe no se ha recibido información total.

- Se hizo recorrido final a la obra en compañía de profesional social entidad contratante y contratista. se solicita envío de registro fotográfico por parte de contratista. se hace registro fotográfico por parte de interventoría y se anexara al informe final de interventoría y remisión respectiva a entidad.

- Se solicita a entidad lineamiento de información, se deja constancia en comité, reunión con ts social alcaldía y bitácora. Lo anterior se solicita con el fin de mantener los canales de comunicación con el área de influencia y mitigar posibles problemáticas sociales y desinformación. Ante esto se recomienda que la entidad al inicio de 2024 también genere estrategias de fortalecimiento para resolver y realizar acompañamiento requerido por las personas de la comunidad , al igual que el plan de sostenibilidad articulado al plan de comunicación del apéndice.

- Se brinda acompañamiento a ts sobre situación presentada con residente quien ingreso a zona prohibida que aun no cumplía el tiempo de fundida. Se recomienda circular. Contratista hace envío respectivo a unidad residencial.

- Se realiza mesa de trabajo con contratista para revisión de subsanación de informes de septiembre , octubre y noviembre. Se da aprobación mediante mail, se solicita comunicado formal. El cual aun no ha sido allegado.

- Se observa que a dia de hoy no se realizó acción por parte de contratista ni entidad contratante frente a presencia de parque de motos en espacio público (zona de intervención). Lo cual según el último comité de participación se acordó que el contratista y la JAC harían comunicado a transito solicitando apoyo respectivo.

- Se recomienda continuar con acompañamiento constante del componente social y las acciones de divulgación de cada actividad a realizar a nivel técnico para evitar eventualidad y mantener relación asertiva con el área de influencia.

- Se indaga a la entidad sobre el requerimiento de cierre de actas de vecindad finales de zona 1, ante lo cual indica el apoyo a la supervisión y la profesional social de la secretaria que no deben ser presentadas, que el contratista las deberá realizar cuando este las zonas terminadas al 100% teniendo en cuenta que aun seguirá ingresando maquinaria, instalación de mobiliario urbano, acciones de paisajismo y demás. Se reitera recomendación de acta de entorno y actualización de intervención en zonas. Se recibió el 28 de dic y se dio respuesta con recomendaciones.

- Se trasmite a contratista peticiones expuestas por predios OLAM, MUEBLERIA. Ante lo cual se solicita que la profesional social realice el acercamiento pertinente y tomen las acciones.

- Para el caso de la mueblería (predio) se recomienda y solicita a contratista recopilar y organizar los soportes de todas las acciones de intervención hechas con este predio, ya que interventoría no las he recibido y es fundamental para que la entidad contratante cuente con dicha información; teniendo en cuenta las reiteradas quejas de la arrendataria del predio. Y que aún no se han finalizado las actividades técnicas en dicho predio.

- Se evidencia que No se acató la indicación de entidad contratante e interventoría sobre articulación con más por menos (calle 36) y situación de parqueo en espacio público. Sobre adecuación de la lona para continuar actividades técnicas.

- Se hace solicitud registrada en bitácora sobre acciones de divulgación con antelación para que la comunidad esté enterada y se eviten problemáticas.

- Se reitera obligatoriedad por parte del contratista del cumplimiento de %mano de obra no calificada, condición de vulnerabilidad, discapacidad etc. Como se solicita por parte de entidad en apéndice. Se recibe información en el mes de noviembre, el cuadro de relación de dicho ítem.

- Como conclusión importante de este informe- periodo 1 al 20 de dic por parte de esta interventoria se dio cumplimiento al seguimiento según el apéndice, se brindó el acompañamiento a contratista y se hicieron las recomendaciones y revisiones pertinentes, se atendió la articulación con el municipio, Se hizo envío de los comunicados correspondientes a la solicitud de información, se realizaron los recorridos, remisión de información según lo establecido.

- El presente informe contiene la evaluación de indicadores será consignado en el informe consolidado que se entrega a la entidad, con los porcentajes respectivos de acuerdo al cumplimiento de cada programa y teniendo en cuenta que hay varios que tendrán continuidad aunados a los avances técnicos.

- A la fecha de entrega de este informe se encuentra pendiente el informe de diciembre del contratista. se requiere para revisar las gestiones realizadas y actualización respectiva de información.

- Es fundamental que el contratista haga entrega de lo faltante en materia de (informe mensual de diciembre, cierre de PQRS, reporte del desarrollo de los programas del apéndice J, respuesta a los oficios emitidos por interventoría, entrega de soportes de las actividades llevadas a cabo en diciembre que hacen parte del informe, y demás solicitado y lo correspondiente a las exigencias de la entidad contratante. Es importante mencionar, que COINOBRAS desarrolló las actividades de comunicación y atención comunitaria, los recorridos urbanos, participación en comités, articulación con entidad contratante e interventoría. Se requiere que finalicen la entrega de información relacionada en el informe y que

por parte del municipio se dé lineamiento en cuanto a la estrategia de comunicación e información para los días finales de diciembre y el reinicio de las obras, ya que es una situación prioritaria dar atención para una continuidad optima de las actividades de obra. Por lo cual también se requieren la entrega de información faltante, y cierre de peticiones y demás programas que aplica para este periodo. Las demás recomendaciones se encuentran en el informe, y se recomienda sea consultado para contextualización del proceso al igual que la bitácora como documento de campo.

- Se adjuntan los anexos en medio digital, organizados asi:

Actas de entorno
Actas de vecindad (registro fotográfico y scanner)
Bitácora social
Comités de participación ciudadana
Comunicados enviados por interventoría
Comunicados recibidos
Correspondencia vía correo electrónico
Informes semanales
Inventario de predios
Oficios de aprobación de informes
Oficios radicado de informes contratista
Registro fotográfico obra
Registro fotográfico 20 de dic- recorrido social
Cuadro de relación correspondencia componente social

- La profesional social del contratista muestra compromiso con el desarrollo del componente social, y su relación con los atores comunitarios, lo cual es positivo para el proceso.
- Se recomienda que la entidad y próxima interventoría continúen con el acompañamiento a las actividades del componente, seguimiento y articulación en pro a la intervención, y su impacto comunitario. además de la finalización de actividades.

ANEXOS INFORME FINAL COMPONENTE SOCIAL.

ACTAS DE ENTORNO

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

REG-BUC-420-2022-547

Recomendaciones y ajustes acta de entorno.

Bucaramanga, enero 23 de 2024

Señores:
COINOBRAS
Atn. Ing. Juan Felipe Montaño
e-mail: paseoespana@coinobras.com
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No.420 de 2022. Objeto: "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"

ASUNTO: Contrato de obra No.387-2022 observaciones acta de entorno recibida 28 de dic de 2023

Estimados señores:

En atención al acta de entorno recibida vía correo electrónico, el día 28 de diciembre se indica lo siguiente:

1. El contratista debe realizar la radicación formal del acta con copia a la entidad, ya que hasta el día 20 de diciembre esta interventoría realizó el seguimiento al contrato 387 de 2022.
2. No se evidencia registro fotográfico detallado de la totalidad de zonas de intervención
3. No se evidencia registro fílmico solicitado
4. En el acta no se evidencia firma de la interventoría, ya que el contrato de interventoría se realizó el día 20 de dic de 2023. Y el requerimiento de acta de entorno fue realizada con anterioridad.
5. Se solicita se realicen los ajustes al acta y se amplie la información incluida que se haya recopilado en campo el día de su levantamiento.

Cordialmente;

IVAN DARIO OLIVARES ALGARIN
Director de Interventoría

Proyectó: MAMC
Revisó: IDOA
Copia a: Ing. Julio Giovanni Peña. E-mail: jgpenab@bucaramanga.gov.co
Ing. Camilo Rueda. E-mail: crueda@bucaramanga.gov.co
Archivo.

Anexo: no tiene

Cra 15 No 93 A-84 Of. 604
(+57) 1 – 745 1419 745 6392
(+57) 321 214 4738
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá – Colombia

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

REG-BUC-420-2022-531
Acta de entorno y compromisos sociales

Bucaramanga; diciembre 26 de 2023

Señores:
COIONBRAS
Atn. Ing. Juan Felipe Montaño
Carrera 34#37-07 el prado
e-mail: paseoespana@coionobras.com
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No.420 de 2022. Objeto: "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"

ASUNTO: Contrato de obra No.387-2022 Solicitud acta de entorno

Estimados señores:

Teniendo en cuenta el estado de suspensión de obra del contrato 387, Se solicita se realice envió de las actas de entorno correspondientes del área de intervención de acuerdo a la solicitud realizada por la profesional social de la entidad en mesa de seguimiento del componente social.

De igual forma, se adjunta acta de reunión donde se registran los compromisos pactados del componente para su debido cumplimiento y reporte.

Cordialmente;

Iván Olivares Algarín
Director de Interventoría

Proyectó: MAMC
Revisó: IDOA
Copia a: Ing. Julio Giovanni Peña. E-mail: japenab@bucaramanga.gov.co
Ing. Camilo Rueda. E-mail: crueda@bucaramanga.gov.co
Archivo.

Anexo: Acta de reunión seguimiento componente social (1 PDF)

Cra 15 No 93 A-84 Of. 604
(+57) 1 – 745 1419 745 5392
(+57) 321 214 4738
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá – Colombia

TECNUMEC
Diseño, Diagnóstico y Gestión de pavimentos

REG-BUC-420-2022-094
Cronograma social

Bogotá D.C., marzo 24 de 2023

Señores:
CONSORCIO AMBIENTAL URBANO
Atn. Ing. Juan Pablo Ricci Ruiz
Av. Carrera 7 No. 127-48 ofi 1006
e-mail: cau3872022@gmail.com
Representante Legal
Ciudad

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No.420 de 2022. Objeto: "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA CENTRO CAMINABLE EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER"

ASUNTO: Contrato de obra No.387-2022 - Respuesta comunicado CAU - CTO 387 - 2022 - 0044 entrega compromiso – ajuste cronograma social (acta entorno, volanteo cra 26 y calle faltante – metodología actas de vecindad.

Estimados señores:

En atención al comunicado del asunto, en que realizan envío de información sobre el plan de levantamiento de actas de vecindad y cronograma de las actividades de volanteo informativo se tiene lo siguiente:

La respuesta recibida no se encuentra a satisfacción, se solicita favor profundizar la respuesta de acuerdo a lo solicitado.

1. No se presenta cronograma claro del desarrollo de las actividades. Por tanto, agregar cronograma respectivo de cada predio.

   -Actas de vecindad
   -Acta de entorno
   Volanteo de la carrera 26
   Volanteo de la calle 34

   Ejemplo:

   Edificio arboreto: día "xxx"
   Volanteo carrera 26: día "xxx"

Cra 15 No 93 A-84 Of. 604
(+57) 1 - 745 1419 745 6392
(+57) 321 214 4738
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá - Colombia

Lo anterior, es de vital importancia para identificar avance, programar acompañamiento por parte del equipo de interventoría y dar celeridad al proceso de inicio de actividades de obra.

2. En cuanto al plan presentado de levantamiento de actas de vecindad, no se incluye la información solicitada mediante oficio y en comité técnico, en el cual se requiere conocer el alcance técnico y abordaje para dicho ejercicio. De acuerdo a esto se requiere esta información detallada que relacione los predios totales del área de intervención objeto de levantamiento de acta de vecindad de acuerdo al análisis realizado.

   Ejemplo :

   -Edificio arboreto: se levantara acta de xxx apartamentos, xxx zonas y con la debida argumentación, esto es importante por cuanto el levantamiento adecuado de actas de vecindad (cantidad de predios) evita y/o previene futuras reclamaciones de predios del área de influencia, motivo por el cual en caso de no realizar un adecuado levantamiento expone al mismo contratista de obra a tener que asumir daños que puedan no haberse generado a causa de la ejecución del contrato ya que una muestra insuficiente lo expone a no tener argumentos para determinar si ante una reclamación los daños fueron producto de la obra o no.

3. En cuanto al acta de entorno no se evidencia la inclusión de los aspectos tratados en el comité, los cuales hacen alusión al registro fotográfico, fílmico, evidencia total del área aferente a la intervención, las evidencias de lo encontrado en el espacio público, el registro del antes y después del área de intervención.

Con base en lo anterior, se solicita atender las observaciones y presentar los documentos debidamente ajustados para revisión correspondiente, en un plazo máximo de 2 días a partir de la presente.

Cordialmente,

OSCAR A. LIZARAZO ARÉVALO
Director de Interventoría

Proyectó: MAM
Revisó: OALA
Copia a: Ing. Julio Giovanni Peña. E-mail: japenab@bucaramanga.gov.co
Ing. Camilo Rueda. E-mail: crueda@bucaramanga.gov.co
Archivo.

Anexo: 0 folio

Cra 15 No 93 A-84 Of. 604
(+57) 1 – 745 1419 745 5392
(+57) 321 214 4738
tecnumec.pavimentos@gmail.com
tecnumec@tecnumec.com
www.tecnumec.com
Bogotá – Colombia

Consorcio Ambiental Urbano

ACTA VIAL DE INICIO

FECHA: DD 14 | MM Abril | AA 23

ACTA No.: 103

FICHA TÉCNICA DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

Entidad contratante: Municipio de Bucaramanga

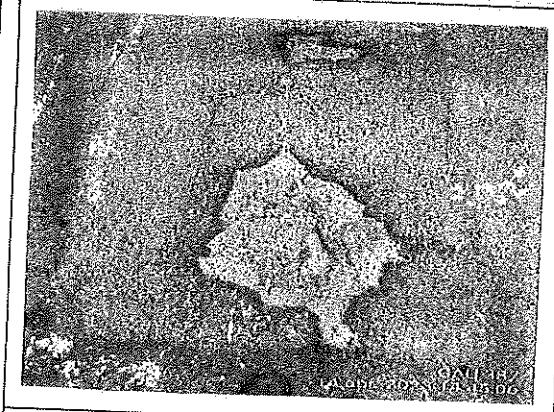
Entidad Interventora: TECNIMEC

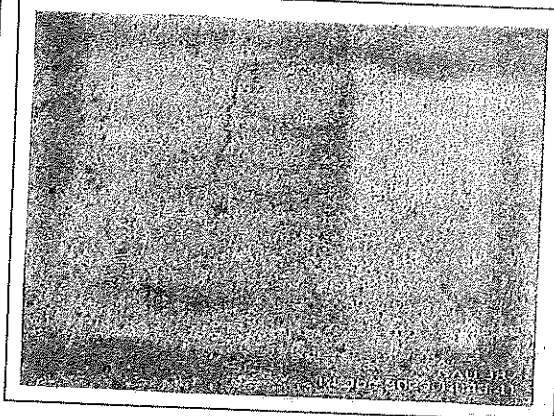
Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Ambiental Urbano

Comuna: 13

Barrio: Antonia Santos

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





1. TRAMO

Dirección: Carrera 25 entre calle 33 a 32

Long. Aprox (mts): 100 mts

2. OBSERVACIONES ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR

En la esquina de la cra 25 con cll 33 margen derecha se observan fisuras por socavación de juntas en el pozo de válvulas de acueducto.

Se observa fisura en bloque frente al predio de la carrera 25 # 32-33.

Se observa hundimiento en la margen derecha de la vía frente a la sede del Sindicato Minero.

Se observa descascaramiento en la MTI de la vía frente al edif. El ensueño.

Se presenta Bache en la MTI frente al edificio El ensueño.

General → se observa desgaste superficial y pérdida de agregado en toda la vía.

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico y/o fílmico)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR")

FIRMAS

Firma Representante Espacio Público o Líder comunitario

Nombre: Claudines Garcia M.

C.C 63301281 de Bga

Firma Representante de la Interventoría

Nombre: Segundo Valencia R.

C.C

Representante de la entidad ejecutora

Nombre: Rosi Cano

C.C 1098777381 Bga

Consorcio Ambiental Urbano

ACTA VIAL DE INICIO

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

FECHA DD	MM	AA
14	04	23

ACTA No.: 52

Entidad contratante: Alcaldía de Bucaramanga Entidad interventora: TECNIMEC

Entidad ejecutora de la Obra: Consorcio Ambiental Urbano Comuna: 13 Barrio: Antonia Santos

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





1. TRAMO

Dirección: Cll 32 entre carrera 25 y 27

Long. Aprox (mts):

2. OBSERVACIONES ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR

Se presenta desgaste en el pavimento y perdida en el agregado descascaramiento, huecos, fisuras longitudinales, fisuras en bloque, corrimiento vertical y separación de la vereda.

Tramo Cra 26 a Cra 27. Se observa fisura longitudinal, fisuras de borde, fisuras en bloque, descascaramiento, baches, parches, desplazamiento vertical y separación de la vereda. En general se observan de manera general desgaste superficial del pavimento, perdida de agregados y cabezas duras (presencia de agregados expuestos fuera del pavimento).

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotografico y/o filmico)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR")

FIRMAS

Firma Representante Espacio Público o Líder comunitario
Nombre: Clara J. Garcia U.
C.C. 63341281 de B/ga

Firma Representante de la Interventoría
Nombre: Fernando Valencia C
C.C. 79504848

Ronal Cortes
Representante de la entidad ejecutoria
Nombre: Ronal Cortes
C.C. 1098733361 B/ga

Consorcio Ambiental Urbano

ACTA VIAL DE INICIO

FECHA		
26	04	23
DD	MM	AA

ACTA No.: 03

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

Entidad contratante: MUNICIO DE BUCARAMANGA

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO AMBIENTAL URBANO

Entidad Interventora TECNUMEC

Comuna 13 Barrio Antonia Santos

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





1. TRAMO

Dirección Cra 27 entre cll 32 a cll 34

Long Aprox (mts) 84 mts cra 27 entre cll 32 a cll 33; 118,7 mts cll 33 a 34.

2. OBSERVACIONES ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR

-Cra 27 entre cll 32 a cll 33: Se presenta fisuras en la margen izquierda frente al Gimnasio en todo el tramo se observa desgaste superficial de la estructura de pavimento, perdida del agregado, cabezas duras en el eje de la vía llegando al semáforo de la cll 33 y hundimiento vertical de la berma en todos los accesos vehiculares a los predios de la carrera 27.

-Cra 27 entre cll 33 a cll 34: Se presenta un hundimiento y fisuras en la tapa de valvula del acueducto ubicado en la margen izquierda frente a casa búho, en el tramo se presenta desgaste de la capa de rodamiento, perdida del agregado cabezas duras, hundimiento de berma vertical y segregación de la berma de los accesos vehiculares en los predios de la cra 27. Se observa fisuras en la margen derecha de la vía frente a yamaha y se observa surco transversal en la vía frente a envía.

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotografico y/o filmico)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR")

FIRMAS

Firma Representante Espacio Público o Líder comunitario
Nombre:
C.C.

Firma Representante de la Interventoría
Nombre:
C.C.

Representante de la entidad ejecutora
Nombre: Ruth Y Cuello Bellido
C.C. 1098337560

Consorcio Ambiental Urbano

ACTA VIAL DE INICIO

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

FECHA		
27	04	23
DD	MM	AA

ACTA No.: 09

Entidad Interventora TECNUMEC

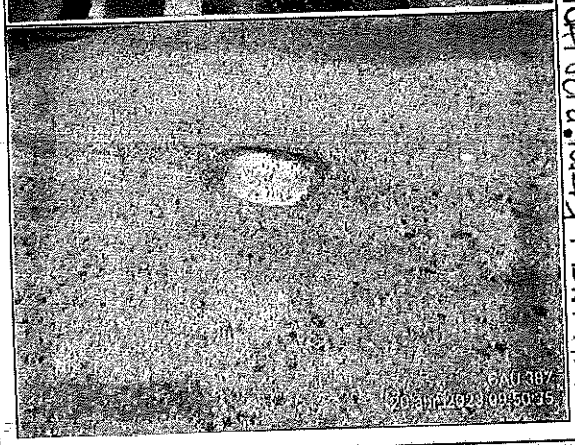
Entidad contratante: MUNICIO DE BUCARAMANGA

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO AMBIENTAL URBANO

Comuna: 13 Barrio: Antonia Santos

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





1. TRAMO

Dirección: cll 34 entre Cra 27 a cra 24

Long. Aprox (mts): 298,9 mts.

2. OBSERVACIONES ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR

Calle 34 entre cra 27 a Cra 26: Se observa fisura transversal frente a CDA la 27 Se presentan undimientos y fisuras en la margen izquierda frente al CDA la 27, se observa piel de cocodrilo en la misma zona. Fisura longitudinal frente a Terzetto 27. Se observa parche frente al acceso del parqueadero de Terzetto 27. Se observa piel de cocodrilo y fisura en toda el ancho de calzada fisuras frente a alcantarillado público. En general en este tramo se observa desgaste superficial del pavimento, perdida del agregado cabezas duras, separación de la berma y carrimiento vertical de la berma a los costados de la vía

• cll 34 entre cra 26 a cra 25: En este tramo se presentan fisuras longitudinales, fisuras en bloque, parches, undimientos carrimiento vertical de la berma, separación de la berma, desgaste general de toda la carpeta de asfalto, exfoliamiento del agregado y cabezas duras.

• cll 34 entre cra 26 y 24. En este tramo se presenta fisuras transversales, undimiento, fisuras en bloque descascaramiento, piel de cocodrilo parches, carrimiento vertical de la berma, separación de berma, desgaste en toda la superficie de asfalto, exfoliamiento del agregado

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotografico y/o filmico)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR")

exfoliamiento del agregado, cabezas duras y en las sumideros que llegan a la cra 24, se presenta fisuras y undimientos en las tapas rimlizadas cheques y fisuras en la tapa del pozo de inspección ubicado en el eje de la vía.

FIRMAS

Firma Representante Espacio Público o Líder comunitario

Nombre:

C.C.

Firma Representante de la Interventoría

Nombre:

C.C.

Representante de la entidad ejecutoria

Nombre: Ronal Y. Cuajo Beltrán

C.C. 1098432380 B/ga

Consorcio Ambiental Urbano

ACTA VIAL DE INICIO

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR
20	04	23	PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER
DD	MM	AA	
ACTA No.:	015		

Entidad contratante: MUNICIO DE BUCARAMANGA — Entidad Interventora: TECNUMEC

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO AMBIENTAL URBANO — Comuna: 13 — Barrio: Antonia Santos

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





1. TRAMO

Dirección: Cra 24 entre Cll 34 a Cll 36

Long Aprox (mts): 188,7

2. OBSERVACIONES ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR

Cra 24 entre calles 34 y 35: Se observa fisura transversal al inicio de la cra 24 donde la mayor parte de la vía se encuentra reforchada, se presenta desgaste de la estructura de pavimento, deformación del concreto, fisuras en bloque, piel de cocodrilo, hundimiento, abellamientos, parches, descascaramiento, agrietamiento vertical de forma y desgaste en la junta de unión entre losas.

Cra 24 entre Cll 35 y 36 En este tramo se presentan fisuras transversales longitudinales, piel de cocodrilo, fisuras en bloque, parches, desgaste superficial en la capa de asfalto, hundimiento del agregado cabezas duras, asentamiento vertical de forma, descascaramiento, fisuras alrededor de las tapas de los pozos de inspección de alcantarillado.

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotografico y/o filmico)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR")

FIRMAS

Firma Representante Espacio Público o Líder comunitario
Nombre
C.C

Firma Representante de la Interventoría
Nombre
C.C.

Ronal Conu
Representante de la entidad ejecutoria
Nombre: Ronal Y. Conu Beltrán
C.C. 1098732380 B/ga

Consorcio Ambiental Urbano

ACTA VIAL DE INICIO

FECHA		
20	04	23
DD	MM	AA

ACTA No.: 06

FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y CALIDAD AMBIENTAL DENTRO DE LA ESTRATEGIA "CENTRO CAMINABLE" EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER

Entidad contratante: MUNICIO DE BUCARAMANGA — Entidad Interventora: TECNOMEC

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO AMBIENTAL URBANO — Comuna: 13 — Barrio: Antonio Santos

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO





1. TRAMO

Dirección: Calle 36 entre carreras 24 y 27

Long. Aprox (mts): 276,6

2. OBSERVACIÓNES ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR

Cll 36 entre carreras 24 y 25. Se observan fisuras longitudinales, en bloque, piel de cocodrilo, parches, corrimiento vertical de la berma, pulimiento del agregado, cabezas duras, fisuras por junta de materiales, descascaramientos, ahuellamientos y en el vertice de la carrera 26 con calle 36 se observa hundimiento y fisuras en las tapas de los sumideros.

Calle 36, entre carreras 25 y 26. Se observan fisuras longitudinales y transversales, fisuras en bloque, descascaramiento, parches, corrimiento de la junta vertical, desgaste en las juntas de materiales, abultamientos, en todo el tramo de la vía se observa pulimiento del agregado, cabezas duras y desgaste de toda la capa asfaltica.

Cll 36 entre cra 26 y cra 27. en este tramo se presenta fisuras longitudinales, transversales, piel de cocodrilo, fisuras en bloque, parches, abultamientos, desgaste en las juntas de materiales, corrimiento de la berma vertical, desgaste en la berma, descascaramiento en el eje de la via. →

3. ANEXOS

Fotografías (archivo fotográfico y/o fílmico)

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO DE LA VÍA ANTES DE INTERVENIR")

→ En general, todo el tramo vial presenta desgaste en la capa de asfalto, perdida del agregado, pulimiento del agregado y cabezas duros

FIRMAS

Firma Representante Espacio Público o Líder comunitario
Nombre:
C.C.

Firma Representante de la Interventoría
Nombre:
C.C.

Representante de la entidad ejecutora
Nombre: Ruth Y. Cano Bermúdez
C.C. 1098732780 B/ga.

1de1
