INFORME No. 002

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

NÚMERO DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CI 0060 DE 2025		VALOR DEL CONTRATO: $ 409.937.150,00	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF		PERSONA NATURAL [ ] PERSONA JURÍDICA [X]	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901941657-4	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 20243218000007			
FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2025		FECHA DE VENCIMIENTO: 13 DE MARZO DE 2026	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.:		FECHA DE CONSTITUCIÓN:	FECHA DE TERMINACIÓN:
46-44-101013376		09-05-2025 14/05/2025	30-08-2026 13/09/2026
46-40-101006756		09-05-2025 14/05/2025	28-02-2026 14/03/2026
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 0051 DE 2025	VALOR DEL CONTRATO: $ 5.656.614.670,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN AGUA LUNA		PERSONA NATURAL [ ] PERSONA JURÍDICA [X]	
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 900345569-4	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20243218000007			
FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2025		FECHA DE VENCIMIENTO: 13 DE MARZO DE 2026	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.:		FECHA DE CONSTITUCIÓN:	FECHA DE TERMINACIÓN:
47-44-101030695		14/05/2025	20/07/2026
47-40-101009486		14/05/2025	22/03/2026
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

2. **RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)**

Este informe corresponde a las actividades desarrolladas en función a las tareas de supervisión del Contrato de obra pública número 0051 del 2025 y el contrato de Interventoría CI 0060 del 2025, del periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2025. A continuación, se describen las labores principales de vigilancia y control realizadas en el periodo señalado con relación a las funciones de supervisor designadas.

3. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

Contrato de obra

En virtud de las funciones de seguimiento y control concedidas sobre el contrato de obra pública 0051 de 2025, se desarrollan actividades como:

Administrativas:

a. Durante este periodo no se realizaron actividades administrativas

Técnicas:

- Seguimiento a la actividad de construir de estufa fija ecoeficiente (0.73m x 1.05m) h=0.83m. Durante este periodo se construyeron 70 estufas distribuidas de la siguiente manera: 24 en Distracción, 2 en Barrancas, 30 en Villanueva, 6 en Uribia y 8 en Hatonuevo.
- Acompañamiento a la actividad de socialización del proyecto en los municipios de Uribia (Nazareth), Riohacha (Nuevo mundo y Monguí), La Jagua del Pilar (2 socializaciones), Manaure (Urina) y Maicao.
- Seguimiento a la actividad de Divulgación del proyecto.
- Revisión del informe de avance de ejecución del proyecto.

Contrato de interventoría

En virtud de las funciones de seguimiento y control concedidas sobre el contrato de interventoría CI 0060 de 2025, se desarrollan actividades como:

Administrativas:

a. Se realizó comité con el equipo de interventoría para aclarar dudas de su parte sobre la ejecución del contrato.


b. La interventoría presento solicitud del pago del anticipo

Técnicas:

- Revisión del informe de avance de ejecución del contrato de interventoría No. CI 0060 de 2025.

4. LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto a intervenir se encuentra localizado en la Zona rural de 9 municipios del departamento de la Guajira, A continuación, se relaciona la localización de los sitios donde se ejecutará el proyecto. Uribia, Riohacha, Maicao, Hatonuevo, Barrancas, Distracción, Manaure, Villanueva y La Jagua del Pilar.

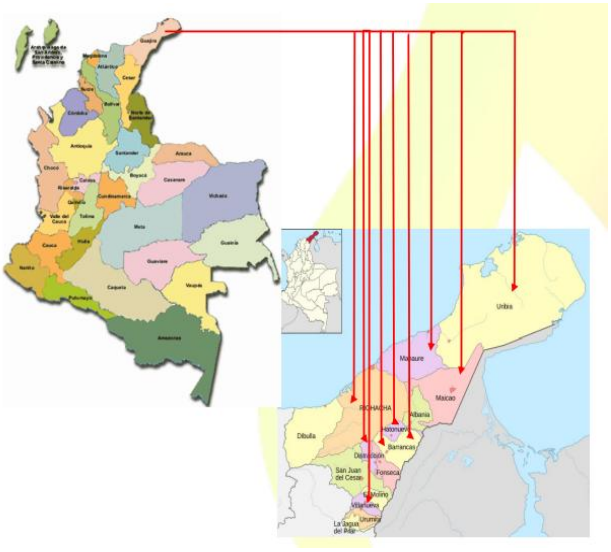

Localización geográfica del proyecto.

5. ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

CRONOGRAMA FÍSICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓNCONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 2024321800007

Producto MGA	Actividad MGA	Detalle Actividad	Unidad	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Valor o Cantidad Total	Valor Total	% Ponderación	Aporte Especie	2025 / 05	2025 / 06	2025 / 07	2025 / 08	2025 / 09	2025 / 10	2025 / 11	2025 / 12	2026 / 01	2026 / 02	2026 / 03
Documentos de lineamientos técnicos para la gestión del cambio climático y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Realizar apoyo a la supervisión	2.1.1 REALIZAR APOYO A LA SUPERVISIÓN	und	######	13/03/2026	10	140000000	0	N		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Documentos de lineamientos técnicos para la gestión del cambio climático y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Realizar interventoria técnica, administrativa y financiera	2.3.1 REALIZAR INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	und	######	13/03/2026	11	403937150	0	N	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Documentos de lineamientos técnicos para la gestión del cambio climático y un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Realizar monitoreo a los impactos del uso de las estufas ecoeficientes	2.2.1 REALIZAR MONITOREO A LOS IMPACTOS DEL USO DE LAS ESTUFAS ECOEFICIENTES	und	2/02/2026	28/02/2026	1	206288302	0	N										1	
Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (Producto	Construir estufa fija ecoeficiente (0.73 m x 1.05 m) h=0.83 m.	1.1.1 CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (0.73 M X 1.05 M) H0.83 M.	und	9/06/2025	30/01/2026	1156	5045146274	0	N		70	150	150	165	165	156	150	150		
Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático (Producto	Construir estufa fija ecoeficiente (1.00 m x 3.00 m) h=0.40 m.	1.2.1 CONSTRUIR ESTUFA FIJA ECOEFICIENTE (1.00 M X 3.00 M) H0.40 M.	und	######	28/10/2025	44	182752712	0	N					22	22					
Servicio de educación informal en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Realizar la divulgación del proyecto	3.3.1 REALIZAR LA DIVULGACIÓN DEL PROYECTO	und	3/06/2025	19/02/2026	1	16554000	0	N		0,2			0,4					0,4	
Servicio de educación informal en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Realizar talleres de capacitación a los beneficiarios sobre la operación y mantenimiento del sistema de cocción eficiente.	3.2.1 REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS SOBRE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COCCIÓNEFICIENTE.	und	4/08/2025	19/02/2026	34	129747400	0	N				5	10		10			9	
Servicio de educación informal en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima	Realizar talleres de socialización del proyecto a la comunidad y familias beneficiadas.	3.1.1 REALIZAR TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LACOMUNIDAD Y FAMILIAS	und	######	6/03/2026	28	76470000	0	N	7	7									14

Contrato de obra:

Durante este periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2025 se ejecutó la actividad “Realizar talleres de socialización del proyecto a la comunidad y familias beneficiadas”, realizando 7 socializaciones y “Construir estufa fija ecoeficiente (0.73m x 1.05m) h=0.83m”, construyendo 70 estufas. Además, también se realizó un avance en la divulgación del proyecto. El porcentaje de avance físico ejecutado durante este periodo fue del 5,80%, cumpliendo con el avance programado. El avance físico acumulado es de 6,14%.

Contrato de interventoría:

Durante este periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2025 La interventoría realizó un avance físico del 10% del valor del contrato, correspondiente a gastos de personal y oficina y un avance financiero del 0,00%. El avance físico acumulado es de 16,25%.

El porcentaje de avance del total del proyecto en este periodo fue de 6,11%, y va de acuerdo a lo programado. El porcentaje de avance del proyecto acumulado es de 7,02%.

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha del contrato de obra pública 0051 de 2025, es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	5.656.614.670,00	
MENOS ANTICIPO:		0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:		0,00
VALOR PRESENTE PAGO:		$ 0,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO:		0,00
SALDO POR EJECUTAR		5.656.614.670,00
SUMAS IGUALES	$ 5.656.614.670,00	$ 5.656.614.670,00

El resumen del Balance hasta la fecha del contrato de interventoría CI 0060 de 2025, es el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO:	409.937.150,00	
MENOS ANTICIPO:		0,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:		$ 0,00
VALOR PRESENTE PAGO:		$ 0,00
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO:		0,00
SALDO POR EJECUTAR		$ 409.937.150,00
SUMAS IGUALES	$ 409.937.150,00	$ 409.937.150,00

Aportes Parafiscales

Se relaciona el personal que integra el equipo de trabajo del contratista, en el marco de la ejecución del contrato No. 0051 de 2025.

NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL	ROL EN EL PROYECTO
Daniel Quintero Manotas	Ing. Civil	Director de proyecto
Luisa Fernanda Guerra	Ingeniero ambiental	Residente de obra
María Fernanda Vargas	Trabajadora social	Trabajadora social

Tabla 6. Relación del personal del contrato No 0051 de 2025.

Se anexa pago de seguridad social todo el periodo contractual tomando como IBC el valor del salario mensual del contrato correspondiente a cada profesional.

Se relaciona el personal que integra el equipo de trabajo del contratista, en el marco de la ejecución del contrato de interventoría No. CI 0060 de 2025.

PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

NOMBRE	CEDULA	CARGO
Samir Jose Cardozo Solano	1118806268	DIRECTOR
Bielca Silena Pimienta Padilla	40.928.933	RESIDENTE
Zunilda Amaya Uriana	40951297	PROFESIONAL SOCIAL
Carlos Antonio Brito Avila	84090164	CONTADOR
Loranis Maxiel Diaz Mercado	1118838660	TECNICO DE CAMPO
Yenifer Soto Vargas	1124409653	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Marianne Mejia Cardozo	1118800355	AUXILIAR DE OFICINA

Se anexa pago de seguridad social todo el periodo contractual tomando como IBC el valor del salario mensual del contrato correspondiente a cada profesional.

Jurídicas:

6. INDICADOR DE EFICACIA:

Con el contrato de obra pública No. 0051 de 2025, cuyo objeto es: CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA BPIN 20243218000007 se logró que el contratista cumpliera con las obligaciones dispuestas en la cláusula novena del citado contrato.

Con el contrato de interventoría No. CI 0060 de 2025, cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES COMO MEDIDA DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. BPIN 2024321800000, se logró que el contratista cumpliera con las obligaciones dispuestas en la cláusula novena del citado contrato.

7. EVALUACIÓN O RE-EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor de interventoría N°. CI 0060 de 2025.
Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo comprendido desde el 1 de junio hasta el 30 de junio de 2025, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: UNIÓN TEMPORAL INTER ECOESTUF		
Contrato u Orden de Compra 0060 de 2025		
Informe Nº. 2		
Fecha de Seguimiento: 07/07/2025		
CRITERIOS NECESARIOS	**PORCENTAJE**	**CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO**

● Cumplimiento del objeto del contrato	**30%**	30%
● Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	**30%**	30%
● Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	**25%**	25%
● Personal idóneo	**10%**	10%
● Valor Agregado	**3%**	3%
● Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	**2%**	2%
● Proveedor cumple con criterios:	**SI** **NO**	
SUMATORIA CALIFICACIÓN:		100%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Como supervisora del Contrato de interventoría CI 0060 de 2025:

Certifico que las actividades asignadas al contratista del contrato de interventoría CI 0060 de 2025, fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Clausula 09 del contrato, por esta razón se procede a aprobar el informe.

FIRMA:

SUPERVISOR
Profesional E.
CON ANEXOS:

ESPACIO PARA CARGUE DE EVIDENCIAS

Lista de asistencia e imágenes de la reunión con la interventoría





URIBIA



Foto. Taller de socializaciÓn Uribia



Foto. Taller de socializacion Uribia



Foto. Taller de socializaciÓn Uribia



Foto. Taller de socializaciÓn Uribia

RIOHACHA



Foto. Taller de socializacion Mongui



Foto. Taller de socializacion Mongui



Foto. Taller de socializacion Mongui



Foto. Taller de socializacion Mongui

	
Foto. Taller de socializacion Mundo Nuevo	Foto. Taller de socializacion Mundo Nuevo
	
Foto. Taller de socializacion Mundo Nuevo	Foto. Taller de socializacion Mundo Nuevo

LA JAGUA DEL PILAR



Foto. Taller de socializacion La Jagua del pilar



Foto. Taller de socializacion La Jagua del pilar



Foto. Taller de socializacion La Jagua del pilar



Foto. Taller de socializacion La Jagua del pilar

	
Foto. Taller de socializacion La Jagua del pilar	Foto. Taller de socializacion La Jagua del pilar
	
Foto. Taller de socializacion La Jagua del pilar	Foto. Taller de socializacion La Jagua del pilar

MAICAO



Foto. Taller de socializaciÓn Maicao



Foto. Taller de socializaciÓn Maicao



Foto. Taller de socializaciÓn Maicao



Foto. Taller de socializaciÓn Maicao

MANAURE



Foto. Taller de socialización Manaure



Foto. Taller de socialización Manaure



Foto. Taller de socialización Manaure



Foto. Taller de socialización Manaure

CONSTRUCCION DE ESTUFA ECOEFICIENTE FIJA










24 jun 2025 11:50:16 a. m.
10°49'41.322"N 72°53'56.394"W
Distraccion
Altitud:244.0m
Velocidad:0.0km/h
camilo
distraccion
Arminda apushana
24 jun 2025 12:06:16
Yaneth uriana
24 jun 2025 2:55:37
Yaneth uriana
21 jun 2025 8:22:50 a. m.
Distraccion
Velocidad:0.0km/h
camilo
distraccion
Nerida epinay
21 jun 2025 10:43:47 a. m.
10°49'33.72"N 72°53'58.914"W
Distraccion
Altitud:192.3m
Velocidad:0.0km/h
camilo
distraccion
Nerida epinay


Municipio: HATO NUEVO
Dpto: LA GUAJIRA
Municipio: HATO NUEVO
Dpto: LA GUAJIRA
11°7'28.942"N 72°42'5.05"W
Vereda: LAS LOMITAS
Municipio: HATO NUEVO
Dpto: LA GUAJIRA
MARÍA ALEJANDRA GUILLOT
Vereda: LAS LOMITAS
Municipio: HATO NUEVO
Dpto: LA GUAJIRA
Vereda: LAS LOMITAS
Municipio: HATO NUEVO
Dpto: LA GUAJIRA


26 jun 2025 9:35:40 a. m.
Distracción
Josefa Maria apushana
carnito
distracción
26 jun 2025 4:06:41 p. m.
Distracción
zandi Ariza
carnito
distracción
26 jun 2025 1:25:40 p. m.
Distracción
zandi Ariza
carnito
distracción
