Doctor

MANUEL DE JESUS ZULETA BENITEZ

DIRECTOR (E) REGIONAL-CESAR

Carrera 19 calle 14 y 15
Valledupar

209521
Valledupar

Asunto:
Informe final Supervisión Contrato No. **CO1.PCCNTR.8333221 de 2025**

Cordial Saludo

Me permito presentar informe final de ejecución de las actividades del presente contrato:

CONTRATANTE: SENA REGIONAL CESAR

CONTRATISTA: Consorcio Perimetral CBC **NIT. 901.989.709-5**

OBJETO: Contratar la adecuación del cerramiento perimetral del Centro Biotecnológico del Caribe - CBC Regional Cesar.

PLAZO INICIAL: 43 días.

PRORROGA: N/A

PLAZO TOTAL: 43 días.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $1.936.936.294 (MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, Incluido IVA)
VALOR PARCIAL A PAGAR: $968.466.147,00 (NOVECIENTOS SECENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SECENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS, Incluido IVA)
ADICION: N/A
VALOR FINAL CONTRATO: $1.936.936.294 (MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, Incluido IVA)
Por medio del presente certifico que: Recibí a satisfacción todas las actividades contratadas y ejecutadas hasta el momento del objeto contractual.

Recibí las facturas electrónicas: FV- 1, FV-2

Firmado digitalmente por ALEXANDER COSTA SIERRA
Fecha: 2025.12.22 09:59:05 -05'00'

ALEXANDER COSTA SIERRA
Instructor G16.

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	

INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8333221

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	SENA REGIONAL CESAR
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8333221
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/09/2025
OBJETO	Contratar la adecuación del cerramiento perimetral del Centro Biotecnológico del Caribe - CBC Regional Cesar.
CONTRATISTA	Consorcio Perimetral CBC
CC o NIT	901.989.709-5
LUGAR DE EJECUCIÓN	Valledupar-Cesar
FECHA DE INICIO	18/11/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	42 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.936.936.294
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$1.936.936.294
FORMA DE PAGO	El SENA pagará al contratista, dentro de los treinta (30) días siguientes al recibo a satisfacción de las obras objeto de la contratación, mediante tres actas parciales por avance de obra del 25% cada una y el saldo para el Acta de Recibo Final de obra ejecutada, previo cargue de la factura en la plataforma SIIF NACION y aprobación y certificación del interventor y/o supervisor donde conste el cumplimiento a satisfacción del objeto contractual, que asegure el avance de los trabajos.
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Desde el 18/11/2025 al 09/12/2025

1.1. Garantías contractuales

2.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S. A
NRO. DE PÓLIZA	65-44-101243038

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
CERTIFICADO O ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	02/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	05/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	24/09/2025	30/04/2026	$200.000.000
Salarios y prestaciones sociales	24/09/2025	31/12/2028	$100.000.000
Estabilidad y calidad de la obra	5 años a partir de la terminación del contrato		$400.000.000


GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
NRO. DE PÓLIZA	65-40-101084074		
CERTIFICADO O DE ANEXO			
FECHA EXPEDICIÓN	02/10/2025		
FECHA APROBACIÓN	05/11/2025		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**15/09/2025**	**31/12/2025**	$427,050,000.00

3. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	¿CUMPLIÓ?	PRODUCTO O EVIDENCIA
1. Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de áreas de trabajos, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de	SI	El contratista cumplió los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de áreas de trabajos, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).

los elementos de protección personal (EPP).		
2. Conocer el diseño entregado por la Entidad, contrato CO1.PCCNTR.6578984 y con objeto Contratar la consultoría general para los estudios, diseños y presupuesto de la modernización de infraestructura física del Despacho Regional, Centro de Innovación y de Gestión Empresarial y Cultural, Centro Agroempresarial y Centro Biotecnológico del Caribe de la Regional Cesar, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad.	SI	El contratista conoce el diseño de la obra entregado por la entidad.
3. El contratista declara haber revisado y comprendido exhaustivamente el diseño, estudios y condiciones del sitio de la obra, aceptando que el diseño entregado es adecuado para la ejecución del contrato. Cualquier cambio en el personal	No se requirió el cumplimiento	

<table>
<tr><td>aprobado deberá ser solicitado previamente y cumplir con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4. Entregar el cronograma de ejecución de la obra, documento que será elaborado en el aplicativo que se acuerde y sea aprobado por la Interventoría. Este cronograma será de estricto cumplimiento por parte del contratista y la interventoría y la entidad contratante realizará el control y seguimiento sobre el mismo. El cronograma de ejecución de la obra deberá contener la totalidad de los ítems establecidos en la propuesta económica, indicando fecha de inicio de la actividad, fecha de terminación y la programación de las inversiones de cada uno de los ítems. En la elaboración del flujo de inversión del contrato, el contratista deberá tener en cuenta que en cada uno de los meses del plazo de ejecución del contrato se debe garantizar la ejecución de obra civil.</td><td>Si</td><td>El contratista entregó el cronograma de ejecución de obra
RELACIÓN DE AVANCE PROGRAMADO VS EJECUTADO CON AIU Y PLANES
<table><tr><th>PERIODOS INICIO DE OBRA</th><th>PERIODOS ENTRE SEMANAS</th><th>PROGRAMADO ACUMULADO</th><th>EJECUTADO ACUMULADO</th><th>% PROGRAMADO ACUMULADO</th><th>% EJECUTADO ACUMULADO</th></tr><tr><td></td><td></td><td>$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>SEMANA 1</td><td>18/11/2025
23/11/2025</td><td>$ 50.279.788</td><td>$ 54.168.511,71</td><td>2,60%</td><td>2,80%</td></tr><tr><td>SEMANA 2</td><td>24/11/2025
30/11/2025</td><td>$ 112.219.619</td><td>$ 199.438.733,76</td><td>5,79%</td><td>10,30%</td></tr><tr><td>SEMANA 3</td><td>1/12/2025
7/12/2025</td><td>$ 183.895.711</td><td>$ 393.132.363,16</td><td>9,49%</td><td>20,30%</td></tr><tr><td>SEMANA 4</td><td>8/12/2025
9/12/2025</td><td>$ 444.260.015</td><td>$ 484.234.073,50</td><td>22,94%</td><td>25,00%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>5. Constituir la garantía única que ampare el cumplimiento del contrato incluyendo los amparos de cumplimiento, el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, la calidad de los suministros y obras, la estabilidad de la obra, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos establecidos en el pliego de condiciones, incluyendo como asegurado</td><td>si</td><td>El contratista constituyó garantías.</td></tr>
</table>

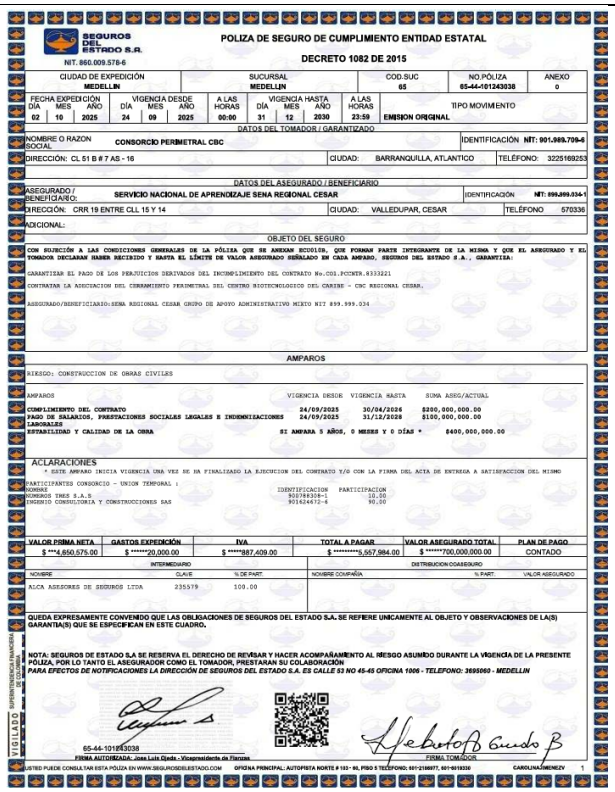y beneficiario al SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA.		 SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT. 860.009.578-6 **POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL** **DECRETO 1082 DE 2015** CIUDAD DE EXPEDICIÓN: MEDELLIN | SUCURSAL: MEDELLIN | COD.SUC: 65 | NO.PÓLIZA: 65-44-101243038 | ANEXO: 0 FECHA EXPEDICION: 02 10 2025 | VIGENCIA DESDE: 24 09 2025 A LAS HORAS 00:00 | VIGENCIA HASTA: 31 12 2030 A LAS HORAS 23:59 | TIPO MOVIMIENTO: EMISION ORIGINAL DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO NOMBRE O RAZON SOCIAL: CONSORCIO PERIMETRAL CBC | IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.989.709-6 DIRECCIÓN: CL 51 B # 7 AS - 16 | CIUDAD: BARRANQUILLA, ATLANTICO | TELÉFONO: 3225169253 DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO ASEGURADO / BENEFICIARIO: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR | IDENTIFICACIÓN: NIT: 899.999.034-1 DIRECCIÓN: CRR 19 ENTRE CLL 15 Y 14 | CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR | TELÉFONO: 570336 ADICIONAL: OBJETO DEL SEGURO CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ACEPTA, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.8333221 CONTRATAR LA ASOCIACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - CBC REGIONAL CESAR. ASEGURADO/BENEFICIARIO:SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO NIETO NIT 899.999.034 AMPAROS RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 24/09/2025 30/04/2026 $200,000,000.00 PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 24/09/2025 31/12/2028 $100,000,000.00 ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * $400,000,000.00 ACLARACIONES * ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL : | IDENTIFICACION | PARTICIPACION CONSAS NUMEROS TRES S.A.S | 900786308-1 | 10.00 EMBERO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS | 901624672-4 | 90.00 VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO $ ***4,650,575.00 | $ ******20,000.00 | $ *****887,409.00 | $ *********5,557,984.00 | $ ********700,000,000.00 | CONTADO INTERMEDIARIO | DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA 235519 100.00 QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN *PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN* 65-44-101243038 FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas FIRMA TOMADOR VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 86, PISO 5 TELÉFONO: 601-2180077, 601-6019230 CAROLINA MENCEV 1
6.Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementar todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra.	Si	El contratista ha ejecutado la obra adecuadamente hasta la fecha. 
7. Instalar vallas informativas sobre la obra, de acuerdo con lo establecido por el área de comunicaciones del SENA.	Si	Se cumplió con la instalación de vallas informativas.

		    
8. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de máquina.	Si	El contratista ha garantizado el cumplimiento de las normas de seguridad. 
9. Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos y realizar modificaciones sin la autorización escrita de la Entidad y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones.	Si	

10. Obtener y pagar por su cuenta los costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra.	Si	El contratista pagó por su cuenta los costos de traslado instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra
11. Tramitar y obtener las licencias que correspondan y en caso de que aplique, por lo cual, se determinará con la Entidad las condiciones, responsabilidad y demás aspectos que sobrevengan durante la ejecución.	Si	Si, se tramitó la licencia de construcción ante la curaduría N2 urbana de Valledupar cesar
12. El contratista deberá proporcionar a los trabajadores, durante el plazo de ejecución de la obra, elementos distintivos de identificación y equipos de protección personal que garanticen su seguridad en el desarrollo de las actividades laborales.	si	El contratista ha cumplido con proporcionar los elementos distintivos de identificación y equipos de protección personal de los trabajadores 
13 asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato.	Si	
14. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución	Si	
15. Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.	si	

16. Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados y obras ejecutadas si se requiere, registro fotográfico. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.	si	**INFORME TECNICO AVANCE DE OBRA N°1** **PERIODO: Del 18 de Noviembre al 9 de Diciembre de 2025** **OBJETO:** ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE – CBC REGIONAL CESAR **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8333221** CONSORCIO PERIMETRAL CBC CONSORCIO PERIMETRAL CBC **10 DE DICIEMBRE DE 2025** **INFORME TECNICO AVANCE DE OBRA N°2** **PERIODO: Del 10 de Diciembre al 16 de Diciembre de 2025** **OBJETO:** ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE – CBC REGIONAL CESAR **CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8333221** CONSORCIO PERIMETRAL CBC CONSORCIO PERIMETRAL CBC **16 DE DICIEMBRE DE 2025**
17. El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programación	Si	

de la obra dentro de los recursos presupuestales disponibles del contrato y serán responsables en caso de que finalizado el contrato queden obras inconclusas. En tal caso, no se pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas.		
18. El contratista debe socializar con anticipación a la interventoría y al supervisor, la intervención en áreas comunes o ambientes de formación, para que se active plan de contingencia y no sean interrumpidas las labores académicas y/o administrativas de la entidad.	si	El contratista socializó con interventoría y supervisor de la obra. 
19. El contratista acepta el manual de interventoría del SENA, y aquel que lo sustituya, modifique o adicione durante la vigencia del contrato, cada Análisis de Precios Unitarios presentado por el adjudicatario en su propuesta, debe contener todo lo indispensable y necesario para llevar a cabo el ítem correspondiente: equipos, materiales, transportes, mano de obra y costos indirectos.	Si	Cumplió
20. El control de tráfico temporal y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del proponente y/o contratista. Esta señalización debe colocarse desde la orden de iniciación del contrato.	si	cumplió

21. Celebrar de manera semanal, mínimo un comité de obra con la interventoría, del cual se levantará la respectiva acta.	Si	El contratista cumplió con esta obligación 
22. El contratista deberá construir y/o instalar, y mantener de manera provisional un espacio adecuado para el almacenamiento seguro de los materiales y herramientas de trabajo. Este espacio deberá cumplir con las normativas de seguridad y estar ubicado en un lugar que no interfiera con el desarrollo de las actividades del proyecto.	No se requirió el cumplimiento	
23. Las demás que se estimen de acuerdo con el objeto y ejecución del contrato.	Si	Ha cumplido a cabalidad la ejecución del contrato
24. Durante la ejecución del contrato, el CONTRATISTA observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato, relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene industrial y salubridad y en general las normas que a este respecto tenga las entidades oficiales.	si	Cumplió
25. Durante la ejecución del contrato el Supervisor o Interventor con el apoyo del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, le podrán ordenar al CONTRATISTA cualquier	No se requirió el cumplimiento	

medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del CONTRATISTA existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad e higiene industrial y salubridad, éste podrá acordar planes de contingencia en cualquier momento o sugerir la suspensión de la ejecución de lo contratado de cualquier parte de ellas en caso de desatención de dichas recomendaciones, sin que el CONTRATISTA tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.		
26. En el caso de peligro inminente para las personas, obras o bienes, el supervisor o Interventor podrá obviar la notificación escrita y ordenar que se ejecuten inmediatamente las acciones correctivas que considere necesarias. El CONTRATISTA en estos casos no tendrá derecho a reconocimiento o indemnización alguna.	No se requirió el cumplimiento	
27. El CONTRATISTA tendrá baños portátiles instalados en el sitio para uso exclusivo del personal de obra mientras dure la ejecución.	No se requirió el cumplimiento	
28. Los gastos en que incurra el CONTRATISTA para el cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene industrial y prevención de accidentes serán por cuenta de éste y no tendrá derecho a pago por separado ya que estos costos deben estar	No se requirió el cumplimiento	

incluidos como costos indirectos dentro de cada uno de los precios unitarios del contrato		
29. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente.	No se requirió el cumplimiento	
30. Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.	Si	
31. Certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días. Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	si	
32. Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021.	No se requirió el cumplimiento	
33. Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos Químicos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de	No se requirió el cumplimiento	

2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años).		
34. Declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019.	No se requirió el cumplimiento	
35. Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo.	No se requirió el cumplimiento	
36. Supervisor para trabajo en espacios confinados: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo en espacios confinados, capacitación en el nivel de supervisor en espacios confinados. (SI APLICA).	N/A	
37. Vigía para trabajo en espacios confinados: Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada relacionada con trabajo en espacios confinados, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo	N/A	

en espacios confinados, capacitación en el nivel de vigía. (SI APLICA).		
38. Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en espacios confinados, con su respectivo Certificado vigente de Trabajador entrante en espacios confinados acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (SI APLICA).	N/A	
39. Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya: *Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad. *Acta de entrega de elementos de protección personal. *Charlas preoperacionales. *Gestión del SISO de la obra. *Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra. *Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo.	SI	
40. Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación (SI APLICA).	N/A	
41. Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento.	No se requirió el cumplimiento	

42. Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización.	SI	
43. Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.	SI	

a. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

CRITERIO AMBIENTAL, SST/ TÉCNICO	**¿CUMPLIÓ?**	SOPORTE/ EVIDENCIA
Listado de trabajadores que desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente. (SI APLICA).	N/A	
Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.	Si lo relacionó	Relación del personal que ingresa a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL.
Presentar copia de pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.	Si lo presentó	Certificados de afiliación vigente de Seguridad Social no mayor a 30 días. Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización

		al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada
Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021.	No se requirió el cumplimiento	
Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos Químicos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Decreto 1496 de 2018 y resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)	No se requirió el cumplimiento	
Allegar las fichas técnicas de las pinturas arquitectónicas, tuberías, accesorios y soldaduras empleados en la instalación o reparación de cualquier sistema de distribución de agua para uso humano, animal o de riego, que migren al agua no podrán presentar concentraciones de plomo superiores al 0,0005 mg por litro de agua, con el objetivo de soportar que se encuentran dentro de los niveles permitidos de plomo.	No se requirió el cumplimiento	
Presentar un informe de gestión de manera mensual los primeros 5 días del mes que incluya: * Estadísticas de accidentalidad de acuerdo a resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de accidentalidad de la	Cumplió	

ARL del personal que desarrolla las actividades al interior de la entidad * Acta de entrega de elementos de protección personal * Charlas preoperacionales *Gestión del SISO de la obra * Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra * Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo		
Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con su respectiva certificación (SI APLICA)	N/A	
Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento.	Si	Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento.
Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización.	Cumplió	Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización.
Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas ambientales y de seguridad y salud	si	Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas ambientales y de seguridad y salud
Matriz de peligros y riesgos actualizada y acorde a las actividades a desarrollar	si	Matriz de peligros y riesgos actualizada y acorde a las actividades a desarrollar
Matriz Legal actualizada.	si	Matriz Legal actualizada.
Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las actividades a desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de elemento, normas técnicas.	si	Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las actividades a desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de elemento, normas técnicas.
Presentar soportes de cumplimiento legal en la obra en temas tales como: - manejo de RCD (residuos de construcción y demolición) y certificados de disposición de los escombros generados durante la obra. -	si	Certificados de disposición de los escombros generados durante la obra. Certificado de Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera)

Procedencia legal de los materiales (arena, grava, arcilla, madera)		
Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. NOTA: Se deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según aplique.	si	Entregar informe de programa de manejos de residuos, especificando las cantidades de residuos gestionados y anexar los respectivos certificados de disposición final. Garantizar los puntos ecológicos y centros de acopio temporal para los residuos generado por el oferente
Allegar una declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto de cualquier variedad- Ley 1968 de 2019.	si	Declaración expedida por el Representante Legal en la cual se certifique que durante el mantenimiento NO se utilizarán y/o adquirirán productos elaborados o que contengan asbesto
Residuos Peligrosos RESPEL: entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final de los RESPEL generados durante el mantenimiento, adecuación y/o construcción indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos.	si	Certificados de disposición de los residuos peligrosos

9. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
16/12/2025	**FE 3**	$484,234,073.50	$484,234,073.50	**$1.452.702.221**	**25%**
16/12/2025	**FE 4**	$484,234,073.50	$484,234,073.50	**$966.531.210**	**25%**

10. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado NOVIEMBRE	Planilla nro. 9496592217 del 18 de diciembre de 2025 Planilla nro. 9496615018 del 18 de diciembre de 2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado NOVIEMBRE	Planilla nro. 9496592217 del 18 de diciembre de 2025 Planilla nro. 9496615018 del 18 de diciembre de 2025
SALUD, PENSIÓN Y ARL	Periodo reportado NOVIEMBRE	Planilla nro. 9496592217 del 18 de diciembre de 2025 Planilla nro. 9496615018 del 18 de diciembre de 2025

11. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

12. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.

13. OBSERVACIONES

ENTREGA DE PRODUCTO:

- INFORME TECNICO AVANCE DE OBRA N°1
- INFORME TECNICO AVANCE DE OBRA N°2

Para constancia se firma 16 de diciembre de 2025

ALEXANDER COSTA SIERRA
Supervisor(a) del contrato

JHOAN FELIPE SALAZAR
Apoyo a la supervisión

revisó: Alexander costa Sierra instructor g16

elaboró: Andrés Armesto abogado apoyo de infraestructura

CONSORCIO PERIMETRAL CBC

CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.8333221
CONTRATISTA	CONSORCIO PERIMETRAL CBC
OBJETO	ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE – CBC REGIONAL CESAR.
PLAZO INICIAL	43 DIAS
FECHA DE INICIO	18/11/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.936.936.294,00
SUPERVISOR	ALEXANDER COSTA SIERRA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CBC
PERIODO DEL ACTA	18/11/2025 - 9/12/2025

CONTROL DE PÓLIZAS

AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$200.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$100.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$400.000.000,00	65-44-101243038	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$427.050.000,00	65-40-101084074	24/09/2025	31/12/2025

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA:	10/12/2025

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
ITEM No	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR.UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
					$ 1.448.474.783,00		**$ 372.501.117,20**		**$ 372.501.117,20**		**$ 1.075.973.665,80**
1	**PRELIMINARES**				**$ 75.303.663,37**		**$ 46.908.939,15**		**$ 46.908.939,15**		**$ 28.394.724,22**
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	522,80	$ 5.748,00	$ 3.005.054,40	419,36	$ 2.410.452,54	419,36	$ 2.410.452,54	103,45	$ 594.601,86
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10M	ML	1.045,60	$ 38.495,00	$ 40.250.372,00	762,57	$ 29.355.132,15	762,57	$ 29.355.132,15	283,03	$ 10.895.239,85
1.3	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA ESP .15 MT	M2	522,80	$ 6.538,00	$ 3.418.066,40	419,36	$ 2.741.742,99	419,36	$ 2.741.742,99	103,45	$ 676.323,41
1.4	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMUN	M3	334,13	$ 50.430,00	$ 16.850.175,90	150,46	$ 7.587.822,05	150,46	$ 7.587.822,05	183,67	$ 9.262.353,85
1.5	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	230,01	$ 28.031,00	$ 6.447.410,31	64,67	$ 1.812.761,97	64,67	$ 1.812.761,97	165,34	$ 4.634.648,34
1.6	CORTE DE ARBOL PORTE BAJO SACADO DE RAIZ, HASTA 0.20 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR	UN	5,00	$ 305.755,00	$ 1.528.775,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.528.775,00
1.7	RETIRO SOBRANTES	M3	109,33	$ 34.792,00	$ 3.803.809,36	86,26	$ 3.001.027,45	86,26	$ 3.001.027,45	23,07	$ 802.781,91
2	**CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS**				**$ 754.035.900,43**		**$ 325.592.178,06**		**$ 325.592.178,06**		**$ 428.443.722,37**
2.1	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI	M3	10,58	$ 799.365,00	$ 8.457.281,70	8,58	$ 6.861.049,72	8,58	$ 6.861.049,72	2,00	$ 1.596.231,98
2.2	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	61,63	$ 858.311,00	$ 52.897.706,93	22,66	$ 19.445.894,02	22,66	$ 19.445.894,02	38,97	$ 33.451.812,91
2.3	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	104,56	$ 1.095.638,00	$ 114.559.909,28	38,46	$ 42.134.950,57	38,46	$ 42.134.950,57	66,10	$ 72.424.958,71
2.4	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS	M3	74,93	$ 1.572.540,00	$ 117.830.422,20	19,16	$ 30.123.183,11	19,16	$ 30.123.183,11	55,77	$ 87.707.239,10

CONSORCIO PERIMETRAL CBC

CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.8333221
CONTRATISTA	CONSORCIO PERIMETRAL CBC
OBJETO	ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE – CBC REGIONAL CESAR.
PLAZO INICIAL	43 DIAS
FECHA DE INICIO	18/11/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.936.936.294,00
SUPERVISOR	ALEXANDER COSTA SIERRA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CBC
PERIODO DEL ACTA	18/11/2025 - 9/12/2025

CONTROL DE PÓLIZAS

AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$200.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$100.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$400.000.000,00	65-44-101243038	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$427.050.000,00	65-40-101084074	24/09/2025	31/12/2025

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA:	10/12/2025

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
ITEM No	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR.UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
2.5	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGA AEREA	M3	63,05	$ 1.463.268,00	$ 92.259.047,40	-	$ -	-	$ -	63,05	$ 92.259.047,40
2.6	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	42.759,56	$ 8.607,00	$ 368.031.532,92	26.377,03	$ 227.027.100,65	26.377,03	$ 227.027.100,65	16382,53	$ 141.004.432,27
3	**MUROS Y PAÑETES**				**$ 216.163.459,20**		**$ -**		**$ -**		**$ 216.163.459,20**
3.1	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO SPLIT 0.15X0.19X0.39-MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA POR UNA CARA Y RANURADO	M2	2.268,48	$ 95.290,00	$ 216.163.459,20	-	$ -	-	$ -	2268,48	$ 216.163.459,20
4	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 402.971.760,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 402.971.760,00**
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PHC ø=60.2 mm X 2.5 mm (2 " X 2.5mm) PARA CERRAMIENTO FRONTAL	KG	18.468,00	$ 21.820,00	$ 402.971.760,00	-	$ -	-	$ -	18468,00	$ 402.971.760,00

TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES		**$ 1.448.474.783,00**	**$ 372.501.117,20**	**$ 372.501.117,20**	**$ 1.075.973.665,80**
ADMINISTRACION	24,00%	$ 347.566.370,00	$ 89.382.889,26	$ 89.382.889,26	$ 258.183.480,74
IMPREVISTO	1,00%	$ 14.484.748,00	$3.725.011,22	$3.725.011,22	$10.759.736,78
UTILIDAD	5,00%	$ 72.423.739,00	$18.625.055,82	$18.625.055,82	$53.798.683,18
TOTAL COSTO INDIRECTO A.I.U.	**30,00%**	**$ 434.474.857,00**	**$ 111.732.956,30**	**$ 111.732.956,30**	**$ 322.741.900,70**
TOTAL COSTO NETO OBRAS CIVILES		**$ 1.882.949.640,00**	**$ 484.234.073,50**	**$ 484.234.073,50**	**$ 1.398.715.566,50**

CONSORCIO PERIMETRAL CBC	**CONTRATO DE OBRA No.:**	CO1.PCCNTR.8333221	**CONTROL DE PÓLIZAS**					
	CONTRATISTA	CONSORCIO PERIMETRAL CBC	**AMPARO**	**VALOR ASEGURADO**	**PÓLIZA No.:**	**DESDE**	**HASTA**	
	OBJETO	ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE – CBC REGIONAL CESAR.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$200.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026	
			SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$100.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026	
	PLAZO INICIAL	43 DIAS	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$400.000.000,00	65-44-101243038	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		
	FECHA DE INICIO	18/11/2025						
	FECHA DE TERMINACION	31/12/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL	$427.050.000,00	65-40-101084074	24/09/2025	31/12/2025	
	VALOR DEL CONTRATO	$ 1.936.936.294,00						
	SUPERVISOR	ALEXANDER COSTA SIERRA						
	INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CBC	**FECHA DE ELABORACION DEL ACTA:**	10/12/2025				
	PERIODO DEL ACTA	18/11/2025 - 9/12/2025						

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADO TOTAL**		**POR EJECUTAR**	
ITEM No	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR.UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
6	**PMT + PMA**				**$ 53.986.654,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 53.986.654,00**
6,1	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)	UN	1,00	$ 20.986.654,00	$ 20.986.654,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 20.986.654,00
6,2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	UN	1,00	$ 33.000.000,00	$ 33.000.000,00		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 33.000.000,00

TOTAL COSTO NETO PMT + PMA	**$ 53.986.654,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.986.654,00**
VALOR TOTAL PROYECTO	**$1.936.936.294,00**	**$484.234.073,50**	**$484.234.073,50**	**$1.452.702.220,50**

Nombre: HEBERTO ALFONSO GARRIDO BARRAZA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

Nombre: YAVIDIS ROMERO GOENAGA
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

ALEXANDER COSTA SIERRA
SUPERVISIOR
SENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

1	**PRELIMINARES**

CAPITULO	PRELIMINARES				**UND**	M2
DESCRIPCION	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO					
ITEM	1.1					
UBICACIÓN		**L (m)**	**A (m)**	**H (m)**	**CANT.**	**TOTAL**
TRAMO 1		64,57	1,50		1,00	96,86
TRAMO 2		215,00	1,50		1,00	322,50
				TOTAL ITEMS 1.1		**419,36**





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

1	**PRELIMINARES**

CAPITULO	PRELIMINARES				**UND**	ML
DESCRIPCION	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10M					
ITEM	1.2					
UBICACIÓN		**L (m)**	**A (m)**	**H (m)**	**CANT.**	**TOTAL**
TRAMO 1		64,57			1,00	64,57
TRAMO 2		468,00			1,00	468,00
TRAMO 3		230,00			1,00	230,00
				TOTAL ITEMS 1.2		**762,57**





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

1	**PRELIMINARES**

CAPITULO	PRELIMINARES				**UND**	M2
DESCRIPCION	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA ESP .15 MT					
ITEM	1.3					
UBICACIÓN		**L (m)**	**A (m)**	**H (m)**	**CANT.**	**TOTAL**
TRAMO 1		64,57	1,50		1,00	96,86
TRAMO 2		215,00	1,50		1,00	322,50
				TOTAL ITEMS 1.3		**419,36**





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

1	**PRELIMINARES**

CAPITULO	PRELIMINARES				**UND**	M3
DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMUN					
ITEM	1.4					
UBICACIÓN		**L (m)**	**A (m)**	**H (m)**	**CANT.**	**TOTAL**
TRAMO 1	ZAPATAS	0,80	0,80	1,32	20,00	16,90
	VIGA	64,57	0,25	0,40	1,00	6,46
TRAMO 2	ZAPATAS	0,80	0,80	1,32	110,00	92,93
	VIGA	341,81	0,25	0,40	1,00	34,18
				TOTAL ITEMS 1.4		**150,46**





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

1	**PRELIMINARES**

CAPITULO	PRELIMINARES				**UND**	M3
DESCRIPCION	RELLENO CON MATERIAL COMUN					
ITEM	1.5					
UBICACIÓN		**L (m)**	**A (m)**	**H (m)**	**CANT.**	**TOTAL**
TRAMO 1	ZAPATAS	0,80	0,80	0,97	20,00	12,42
	DESCUENTO COLUMNA	0,30	0,25	0,97	- 20,00	-1,46
TRAMO 2	ZAPATAS	0,80	0,80	0,97	98,00	60,84
	DESCUENTO COLUMNA	0,30	0,25	0,97	- 98,00	-7,13
				TOTAL ITEMS 1.5		**64,67**





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

1	**PRELIMINARES**

CAPITULO	PRELIMINARES				**UND**	M3
DESCRIPCION	RETIRO SOBRANTES					
ITEM	1.7					
UBICACIÓN		**L (m)**	**A (m)**	**H (m)**	**CANT.**	**TOTAL**
TRAMO 1	DESCAPOTE	64,57	1,50	0,15	1,00	14,53
TRAMO 2		215,00	1,50	0,15	1,00	48,38
TRAMO 1	ZAPATAS	0,80	0,80	1,32	20,00	16,90
	VIGA	64,57	0,25	0,40	1,00	6,46
				TOTAL ITEMS 1.7		**86,26**



REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

CAPITULO	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				**UND**	M3
DESCRIPCION	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI					
ITEM	2.1					
UBICACIÓN		**L (m)**	**A (m)**	**H (m)**	**CANT.**	**TOTAL**
TRAMO 1	ZAPATAS	0,80	0,80	0,05	20,00	0,64
	VIGAS	64,57	0,25	0,05	1,00	0,81
TRAMO 2	ZAPATAS	0,80	0,80	0,05	98,00	3,14
	VIGAS	320,00	0,25	0,05	1,00	4,00
				TOTAL ITEMS 2.1		**8,58**





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

2	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

CAPITULO	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				UND	M3
DESCRIPCION	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS					
ITEM	2.2					
UBICACIÓN		L (m)	A (m)	H (m)	CANT.	TOTAL
TRAMO 1	ZAPATAS	0,80	0,80	0,30	20,00	3,84
TRAMO 2	ZAPATAS	0,80	0,80	0,30	98,00	18,82
				TOTAL ITEMS 2.2		22,66





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

2	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

CAPITULO	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				UND	M3
DESCRIPCION	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION					
ITEM	2.3					
UBICACIÓN		L (m)	A (m)	H (m)	CANT.	TOTAL
TRAMO 1	VIGAS	64,57	0,25	0,40	1,00	6,46
TRAMO2	VIGAS	320,00	0,25	0,40	1,00	32,00
				TOTAL ITEMS 2.3		38,46





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

2	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

CAPITULO	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				UND	M3
DESCRIPCION	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS					
ITEM	2.4					
UBICACIÓN		L (m)	A (m)	H (m)	CANT.	TOTAL
TRAMO 1	PEDESTALES	0,30	0,25	0,57	20,00	0,86
	COLUMNAS	0,30	0,25	2,65	20,00	3,98
TRAMO 2	PEDESTALES	0,30	0,25	0,57	98,00	4,19
	COLUMNAS	0,30	0,25	2,65	51,00	10,14
				TOTAL ITEMS 2.4		19,16





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

CAPITULO	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				**UND**	KG
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI					
ITEM	2.6					
UBICACIÓN	**Ø**	**L (m)**	**CANTIDAD**	**#VECES**	**KG/ML**	**KG**
TRAMO 1 ZAPATAS	1/2	1,00	8,00	20,00	0,994	159,04
TRAMO 1 COLIMNAS	5/8	4,50	4,00	20,00	1,552	558,72
	3/8	1,00	52,00	20,00	0,560	582,40
TRAMO 1 VIGA DE CIMENTACION	5/8	6,00	12,00	4,00	1,552	446,98
	5/8	5,40	1,00	4,00	1,552	33,52
	3/8	1,20	28,00	17,00	0,560	319,87
	3/8	1,20	31,00	1,00	1,560	58,03
	3/8	1,20	39,00	1,00	2,560	119,81
TRAMO 2 ZAPATAS	1/2	1,00	8,00	142,00	0,994	1129,18
TRAMO 2 COLIMNAS	5/8	4,50	4,00	142,00	1,552	3966,91
	3/8	1,00	43,00	142,00	0,56	3419,36
TRAMO 2 VIGA DE CIMENTACION	5/8	6,00	93,00	4,00	1,552	3464,06
	5/8	3,40	1,00	4,00	1,552	21,11
	3/8	1,20	28,00	142,00	0,560	2671,87
TRAMO 3 ZAPATAS	1/2	1,00	8,00	145,00	0,994	1153,04
TRAMO 3 COLIMNAS	5/8	4,50	4,00	145,00	1,552	4050,72
	3/8	1,00	52,00	145,00	0,56	4222,40
				TOTAL ITEMS 2.6		**26377,03**





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2

CONSORCIO PERIMETRAL CBC

CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.8333221
CONTRATISTA	CONSORCIO PERIMETRAL CBC
OBJETO	ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE – CBC REGIONAL CESAR.
PLAZO INICIAL	43 DIAS
FECHA DE INICIO	18/11/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.936.936.294,00
SUPERVISOR	ALEXANDER COSTA SIERRA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CBC
PERIODO DEL ACTA	10/12/2025 - 16/12/2025

CONTROL DE PÓLIZAS

AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$200.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$100.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$400.000.000,00	65-44-101243038	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$427.050.000,00	65-40-101084074	24/09/2025	31/12/2025

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA: 16/12/2025

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
ITEM No	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR.UNITARIO**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**	**CANT.**	**VR. TOTAL**
					$ 1.448.474.783,00		**$ 372.501.117,20**		**$ 745.002.234,40**		**$ 703.472.548,60**
1	**PRELIMINARES**				**$ 75.303.663,37**		**$ 6.918.174,08**		**$ 53.827.113,22**		**$ 21.476.550,15**
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	522,80	$ 5.748,00	$ 3.005.054,40	-	$ -	419,36	$ 2.410.452,54	103,45	$ 594.601,86
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10M	ML	1.045,60	$ 38.495,00	$ 40.250.372,00	110,13	$ 4.239.522,52	872,70	$ 33.594.654,67	172,90	$ 6.655.717,33
1.3	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA ESP .15 MT	M2	522,80	$ 6.538,00	$ 3.418.066,40	-	$ -	419,36	$ 2.741.742,99	103,45	$ 676.323,41
1.4	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMUN	M3	334,13	$ 50.430,00	$ 16.850.175,90	39,71	$ 2.002.706,42	190,18	$ 9.590.528,47	143,95	$ 7.259.647,43
1.5	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	230,01	$ 28.031,00	$ 6.447.410,31	24,11	$ 675.945,14	88,78	$ 2.488.707,11	141,23	$ 3.958.703,20
1.6	CORTE DE ARBOL PORTE BAJO SACADO DE RAIZ, HASTA 0.20 MT DE DIAMETRO, INCL. RETIRO AL BOTADERO OFICIAL, RELLENO DE HUECO Y PERMISO DE CORPOCESAR	UN	5,00	$ 305.755,00	$ 1.528.775,00	-	$ -	-	$ -	5,00	$ 1.528.775,00
1.7	RETIRO SOBRANTES	M3	109,33	$ 34.792,00	$ 3.803.809,36	-	$ -	86,26	$ 3.001.027,45	23,07	$ 802.781,91
2	**CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS**				**$ 754.035.900,43**		**$ 156.211.691,73**		**$ 481.803.869,78**		**$ 272.232.030,65**
2.1	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI	M3	10,58	$ 799.365,00	$ 8.457.281,70	1,41	$ 1.125.505,92	9,99	$ 7.986.555,64	0,59	$ 470.726,06
2.2	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	61,63	$ 858.311,00	$ 52.897.706,93	8,45	$ 7.251.011,33	31,10	$ 26.696.905,34	30,53	$ 26.200.801,59
2.3	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION	M3	104,56	$ 1.095.638,00	$ 114.559.909,28	14,86	$ 16.281.180,68	53,32	$ 58.416.131,25	51,24	$ 56.143.778,03
2.4	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS	M3	74,93	$ 1.572.540,00	$ 117.830.422,20	19,97	$ 31.399.299,32	39,12	$ 61.522.482,42	35,81	$ 56.307.939,78
2.5	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGA AEREA	M3	63,05	$ 1.463.268,00	$ 92.259.047,40	-	$ -	-	$ -	63,05	$ 92.259.047,40

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2

CONSORCIO PERIMETRAL CBC

CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.8333221
CONTRATISTA	CONSORCIO PERIMETRAL CBC
OBJETO	ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE – CBC REGIONAL CESAR.
PLAZO INICIAL	43 DIAS
FECHA DE INICIO	18/11/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.936.936.294,00
SUPERVISOR	ALEXANDER COSTA SIERRA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CBC
PERIODO DEL ACTA	10/12/2025 - 16/12/2025

CONTROL DE PÓLIZAS

AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$200.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$100.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$400.000.000,00	65-44-101243038	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$427.050.000,00	65-40-101084074	24/09/2025	31/12/2025

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA: 16/12/2025

						CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL		PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
ITEM No	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
2.6	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	KG	42.759,56	$ 8.607,00	$ 368.031.532,92	11.636,42	$ 100.154.694,48	38.013,45	$ 327.181.795,14	4746,11	$ 40.849.737,78		
3	**MUROS Y PAÑETES**				**$ 216.163.459,20**		**$ 109.472.963,60**		**$ 109.472.963,60**		**$ 106.690.495,60**		
3.1	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO SPLIT 0.15X0.19X0.39-MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA POR UNA CARA Y RANURADO	M2	2.268,48	$ 95.290,00	$ 216.163.459,20	1.148,84	$ 109.472.963,60	1.148,84	$ 109.472.963,60	1119,64	$ 106.690.495,60		
4	**CARPINTERÍA METÁLICA**				**$ 402.971.760,00**		**$ 99.898.287,80**		**$ 99.898.287,80**		**$ 303.073.472,20**		
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PHC ø=60.2 mm X 2.5 mm (2 " X 2.5mm) PARA CERRAMIENTO FRONTAL	KG	18.468,00	$ 21.820,00	$ 402.971.760,00	4.578,29	$ 99.898.287,80	4.578,29	$ 99.898.287,80	13889,71	$ 303.073.472,20		
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS CIVILES				**$ 1.448.474.783,00**		**$ 372.501.117,20**		**$ 745.002.234,40**		**$ 703.472.548,60**		
	ADMINISTRACION	24,00%			$ 347.566.370,00		$ 89.382.889,26		$ 178.765.778,52		$ 168.800.591,48		
	IMPREVISTO	1,00%			$ 14.484.748,00		$3.725.011,22		$7.450.022,43		$7.034.725,57		
	UTILIDAD	5,00%			$ 72.423.739,00		$18.625.055,82		$37.250.111,64		$35.173.627,36		
	TOTAL COSTO INDIRECTO A.I.U.	**30,00%**			**$ 434.474.857,00**		**$ 111.732.956,30**		**$ 223.465.912,60**		**$ 211.008.944,40**		
	TOTAL COSTO NETO OBRAS CIVILES				**$ 1.882.949.640,00**		**$ 484.234.073,50**		**$ 968.468.147,00**		**$ 914.481.493,00**		

ACTA PARCIAL DE OBRA N°2

CONSORCIO PERIMETRAL CBC

CONTRATO DE OBRA No.:	CO1.PCCNTR.8333221
CONTRATISTA	CONSORCIO PERIMETRAL CBC
OBJETO	ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE – CBC REGIONAL CESAR.
PLAZO INICIAL	43 DIAS
FECHA DE INICIO	18/11/2025
FECHA DE TERMINACION	31/12/2025
VALOR DEL CONTRATO	$ 1.936.936.294,00
SUPERVISOR	ALEXANDER COSTA SIERRA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CBC
PERIODO DEL ACTA	10/12/2025 - 16/12/2025

CONTROL DE PÓLIZAS

AMPARO	VALOR ASEGURADO	PÓLIZA No.:	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$200.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$100.000.000,00	65-44-101243038	24/09/2025	30/04/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	$400.000.000,00	65-44-101243038	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS	
RESPONSABILIDAD CIVIL	$427.050.000,00	65-40-101084074	24/09/2025	31/12/2025

FECHA DE ELABORACION DEL ACTA: 16/12/2025

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						PRESENTE ACTA N°2		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR	
ITEM No	DESCRIPCION	UND	CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL
6	**PMT + PMA**				**$ 53.986.654,00**		**$ -**		**$ -**		**$ 53.986.654,00**
6,1	PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT)	UN	1,00	$ 20.986.654,00	$ 20.986.654,00	-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 20.986.654,00
6,2	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	UN	1,00	$ 33.000.000,00	$ 33.000.000,00	-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 33.000.000,00

TOTAL COSTO NETO PMT + PMA	**$ 53.986.654,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 53.986.654,00**
VALOR TOTAL PROYECTO	**$1.936.936.294,00**	**$484.234.073,50**	**$968.468.147,00**	**$968.468.147,00**

Nombre: HEBERTO ALFONSO GARRIDO BARRAZA
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

Nombre: YAVIDIS ROMERO GOENAGA
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

ALEXANDER COSTA SIERRA
SUPERVISIOR
SENA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

1	**PRELIMINARES**

CAPITULO	PRELIMINARES				**UND**	ML
DESCRIPCION	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.10M					
ITEM	1.2					
UBICACIÓN		**L (m)**	**A (m)**	**H (m)**	**CANT.**	**TOTAL**
TRAMO 3		110,13			1,00	110,13
				TOTAL ITEMS 1.2		**110,13**





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

1	PRELIMINARES

CAPITULO	PRELIMINARES				UND	M3
DESCRIPCION	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO COMUN					
ITEM	1.4					
UBICACIÓN		L (m)	A (m)	H (m)	CANT.	TOTAL
TRAMO 2	ZAPATAS	0,80	0,80	1,32	32,00	27,03
	VIGA	126,79	0,25	0,40	1,00	12,68
				TOTAL ITEMS 1.4		39,71





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

1	**PRELIMINARES**

CAPITULO	PRELIMINARES				**UND**	M3
DESCRIPCION	RELLENO CON MATERIAL COMUN					
ITEM	1.5					
UBICACIÓN		**L (m)**	**A (m)**	**H (m)**	**CANT.**	**TOTAL**
TRAMO 2	ZAPATAS	0,80	0,80	0,97	44,00	27,32
	DESCUENTO COLUMNA	0,30	0,25	0,97	- 44,00	-3,20
				TOTAL ITEMS 1.5		**24,11**





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

2	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

CAPITULO	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				UND	M3
DESCRIPCION	SOLADO CONCRETO 2.500 PSI					
ITEM	2.1					
UBICACIÓN		L (m)	A (m)	H (m)	CANT.	TOTAL
TRAMO 2	ZAPATAS	0,80	0,80	0,05	44,00	1,41
				TOTAL ITEMS 2.1		1,41





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

2	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

CAPITULO	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				UND	M3
DESCRIPCION	CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS					
ITEM	2.2					
UBICACIÓN		L (m)	A (m)	H (m)	CANT.	TOTAL
TRAMO 2	ZAPATAS	0,80	0,80	0,30	44,00	8,45
				TOTAL ITEMS 2.2		8,45





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

2	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

CAPITULO	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				UND	M3
DESCRIPCION	CONCRETO 3000 PSI PARA VIGAS DE CIMENTACION					
ITEM	2.3					
UBICACIÓN		L (m)	A (m)	H (m)	CANT.	TOTAL
TRAMO2	VIGAS	148,60	0,25	0,40	1,00	14,86
				TOTAL ITEMS 2.3		14,86





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

2	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

CAPITULO	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				UND	M3
DESCRIPCION	CONCRETO 3000 PSI PARA COLUMNAS					
ITEM	2.4					
UBICACIÓN		L (m)	A (m)	H (m)	CANT.	TOTAL
TRAMO 2	PEDESTALES	0,30	0,25	0,57	44,00	1,88
	COLUMNAS	0,30	0,25	2,65	91,00	18,09
				TOTAL ITEMS 2.4		19,97





REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

2 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

CAPITULO	CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS				UND	KG
DESCRIPCION	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI					
ITEM	2.6					
UBICACIÓN	Ø	L (m)	CANTIDAD	#VECES	KG/ML	KG
TRAMO 1 VIGA VI-1	5/8	3,50	4,00	9,00	1,552	195,55
	3/8	1,00	28,00	145,00	0,560	2273,60
TRAMO 1 VIGA VI-1	1/2	3,90	4,00	1,00	0,994	15,51
	3/8	1,00	31,00	1,00	0,560	17,36
	1/2	3,50	4,00	8,00	0,994	111,33
	3/8	1,00	28,00	8,00	0,560	125,44
	1/2	5,40	4,00	1,00	0,994	21,47
	3/8	1,00	41,00	1,00	0,560	22,96
TRAMO 2 VIGA VI-2	1/2	93,00	4,00	1,00	0,994	369,77
	1/2	3,40	4,00	1,00	0,994	13,52
	3/8	1,00	28,00	142,00	0,560	2226,56
TRAMO 3 VIGA DE CIMENTACION	5/8	6,00	95,00	4,00	1,552	3538,56
	3/8	1,20	28,00	143,00	0,560	2690,69
	3/8	1,20	21,00	1,00	0,560	14,11
				TOTAL ITEMS 2.6		11636,42






REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC


REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

3	**MUROS Y PAÑETES**

CAPITULO	MUROS Y PAÑETES				**UND**	M2
DESCRIPCION	MURO DE .15 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO SPLIT 0.15X0.19X0.39- MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA POR UNA CARA Y RANURADO					
ITEM	3.1					
UBICACIÓN		**L (m)**	**A (m)**	**H (m)**	**CANT.**	**TOTAL**
TRAMO 1	MODULO COMPLETO	3,40		2,65	1,00	9,01
		3,00		2,65	8,00	63,60
		4,87		2,65	1,00	12,91
	MODULO PEQUEÑO	3,00		0,81	9,00	21,87
TRAMO 2	MODULO COMPLETO	3,00		2,65	131,00	1041,45
				TOTAL ITEMS 3.1		**1148,84**

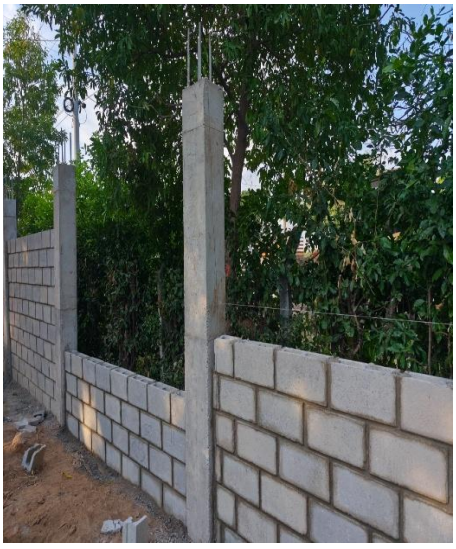

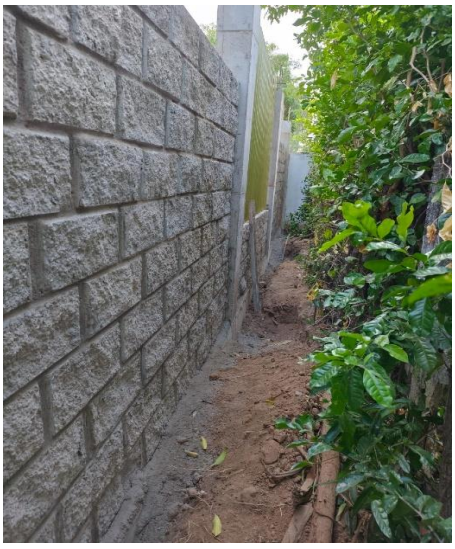

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC


REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES

4	CARPINTERIA METALICA

CAPITULO	CARPINTERÍA METÁLICA				UND	KG
DESCRIPCION	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PHC Ø=60.2 mm X 2.5 mm (2 " X 2.5mm) PARA CERRAMIENTO FRONTAL					
ITEM	4.1					
UBICACIÓN	Ø	L (m)	CANTIDAD	#VECES	KG/ML	KG
TRAMO 1	TUBO	2,00	27,00	9,00	3,60	1749,60
	VARILLA 5/8"	3,00	1,00	9,00	1,55	41,90
TRAMO 3	TUBO	2,00	27,00	14,00	3,60	2721,60
	VARILLA 5/8"	3,00	1,00	14,00	1,55	65,18
				TOTAL ITEMS 4.1		4578,29



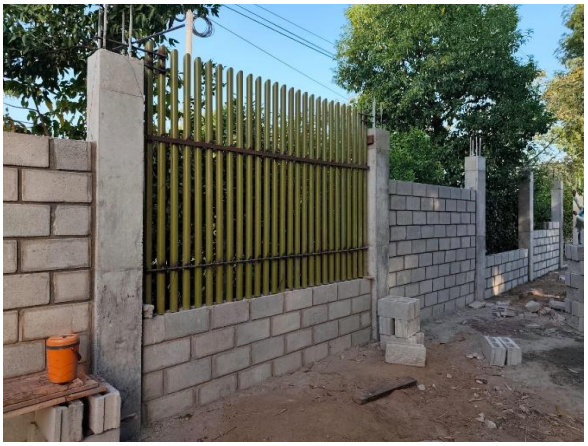

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO PERIMETRAL CBC

REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER CBC

Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.8333221
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16/09/2025 4:51:27 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.8333221
Objeto del contrato	Contratar la adecuación del cerramiento perimetral del Centro Biotecnológico del Caribe - CBC Regional Cesar.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	106 Días
Fecha de inicio de contrato	18/11/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	18/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	8 días para terminar *(31/12/2025 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL CESAR Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Consorcio Perimetral CBC

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 901989709

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Consorcio Perimetral CBC			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Heberto Alfonso Garrido Barraza* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2025 8:21:42 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Eudes de Jesus Zapata Sanjuan* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2025 10:26:55 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_8333221_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8333221_En ejecución

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION DESPACHO REGIONAL ok
Proceso de Contratación	LP_CSR_DIR_06_2025
Título de la oferta	Consorcio Perimetral CBC
Cuantía del contrato	1.936.936.294 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	

Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	300		

Fecha límite para entrega de garantías: 23/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 4/11/2025 3:37:26 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.18306745	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	427.050.000,00 COP	Seguros Del Estado SA	9 días para terminar *(31/12/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.18306549	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	700.000.000,00 COP	Seguros Del Estado SA	31/12/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.17916817	Seriedad de la oferta	-	200.000.000,00 COP	-	3 días para terminar *(25/12/2025 11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8333221
Proveedor Consorcio Perimetral CBC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15
Ubicación CO-CES-20001 - Valledupar
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio Valledupar
Dirección CARRERA 19 ENTRE CALLE 14 Y 15
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ciurcuito de valledupar	COLOMBIA > Cesar > Valledupar

Bienes y servicios

1 CO1.PCONTR.8333221

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	1.936.936.294,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	"Contratar la adecuación de cerramiento perimetral del Centro Biotecnológico del Caribe de la Regional Cesar."	1,00	UN		1.936.936.294,00	0,00	1.936.936.294,00

2 CO1.PCONTR.8333221

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	1.936.936.294,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	"Contratar la adecuación de cerramiento perimetral del Centro Biotecnológico del Caribe de la Regional Cesar."	1,00	UN		1.936.936.294,00	0,00	1.936.936.294,00

3 CO1.PCONTR.8333221

3.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00	1.936.936.294,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81101500	"Contratar la adecuación de cerramiento perimetral del Centro Biotecnológico del Caribe de la Regional Cesar."	1,00	UN		1.936.936.294,00	0,00	1.936.936.294,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐

Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
CAMARA DE COMERCIO CONSORCIO	☑	☐
CEDULA DE CIUDANIA DE LOS REPRESENTANTE LEGALES	☑	☐
CERTIFICADO BANCARIO CONSORCIO	☑	☐
RUT COSORCIO	☑	☐
Soporte de publicación CONSTANCIA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS (Ley 2013 de 2019)	☑	☐

Documentos del contrato

Documento	Nombre del documento	Detalle	Solicitud de confidencialidad?	Confidencial
CAMARA DE COMERCIO CONSORCIO	Camara De Comercio.pdf	Detalle	No	☐
CEDULA DE CIUDANIA DE LOS REPRESENTANTE LEGALES	Representantes Legales.pdf	Detalle	No	☐
CERTIFICADO BANCARIO CONSORCIO	Cuenta.pdf	Detalle	No	☐
RUT COSORCIO	RUT - Consorcio Perimetral CBC.pdf	Detalle	No	☐
Soporte de publicación CONSTANCIA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y REGISTRO DE CONFLICTOS DE INTERÉS (Ley 2013 de 2019)	Declaracion Conflicto De Interes (2).pdf	Detalle	No	☐

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 22/09/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 24/09/2025 8:21:38 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
3. PAA - CERRAMIENTO PERIMETRAL CBC.pdf	3. PAA - CERRAMIENTO PERIMETRAL CBC.pdf	(detalle)
5. CDP 9225 ADECUACION CERRAMIENTO DESP (2).pdf	5. CDP 9225 ADECUACION CERRAMIENTO DESP (2).pdf	(detalle)
4. ESTUDIO DE MERCADO - CERRAMIENTO PERIMETRAL.pdf	4. ESTUDIO DE MERCADO - CERRAMIENTO PERIMETRAL.pdf	(detalle)
7. ANÁLISIS DE SECTOR - CERRAMIENTO PERIMETRAL.pdf	7. ANÁLISIS DE SECTOR - CERRAMIENTO PERIMETRAL.pdf	(detalle)
GCCON-F-046-EstudiosPreviosV03 Definitivos.pdf	GCCON-F-046-EstudiosPreviosV03 Definitivos.pdf	(detalle)
6. 14. Consepto Tecnico.pdf	6. 14. Consepto Tecnico.pdf	(detalle)
8. . Anexo Técnico - Contratar la adecuación del cerramiento perimetral en el CBC.pdf	8. . Anexo Técnico - Contratar la adecuación del cerramiento perimetral en el CBC.pdf	(detalle)
12. GCCON-F-022-AnexoalPliegodeCondicionesV03 (2).pdf	12. GCCON-F-022-AnexoalPliegodeCondicionesV03 (2).pdf	(detalle)
9. Presupuesto Cerramiento.pdf	9. Presupuesto Cerramiento.pdf	(detalle)
10 . ACTA DE COMITE Y LISTA DE ASISTENCIA-14 DE JULIO.pdf	10 . ACTA DE COMITE Y LISTA DE ASISTENCIA-14 DE JULIO.pdf	(detalle)
544 RESOLUCIÓN DE APERTURA CERRAMIENTO (1).pdf	544 RESOLUCIÓN DE APERTURA CERRAMIENTO (1).pdf	(detalle)
594 ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACION COMITE EVALUADOR - CERRAMIENTO.pdf	594 ACTO ADMINISTRATIVO DESIGNACION COMITE EVALUADOR - CERRAMIENTO.pdf	(detalle)
ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION .pdf	ACTA DE AUDIENCIA DE ADJUDICACION .pdf	(detalle)
LISTA DE ASISTENCIA.pdf	LISTA DE ASISTENCIA.pdf	(detalle)
3.AUDIENCIA DE ADJUDICACION CERRAMIENTO LP_CSR_DIR_006_2025.mp4	3.AUDIENCIA DE ADJUDICACION CERRAMIENTO LP_CSR_DIR_006_2025.mp4	(detalle)
2. AUDIENCIA DE ADJUDICACION CERRAMIENTO LP_CSR_DIR_006_2025.mp4	2. AUDIENCIA DE ADJUDICACION CERRAMIENTO LP_CSR_DIR_006_2025.mp4	(detalle)
ACTA ASIGNACION DE RIESGOS LP.pdf	ACTA ASIGNACION DE RIESGOS LP.pdf	(detalle)
Audiencia de asignacion de Riesgos Cerramiento CBC-20250814_111340-Grabación de la reunión.mp4	Audiencia de asignacion de Riesgos Cerramiento CBC-20250814_111340-Grabación de la reunión.mp4	(detalle)
693 Resolucion de adjudicacion revisada.pdf	693 Resolucion de adjudicacion revisada.pdf	(detalle)
Oferta Economica (Final).pdf	Oferta Economica (Final).pdf	(detalle)
AUDIENCIA 1.mp4	AUDIENCIA 1.mp4	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Eudes de Jesus Zapata	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77025149	Guardar y notificar
Supervisor	Alexander Costa Sierra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77027504	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Ordenador del Gasto	Eudes de Jesus Zapata Sanjuan	24/09/2025 10:26:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eudes de Jesus Zapata Sanjuan
Supervisor	Alexander Costa Sierra	24/09/2025 10:26:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Eudes de Jesus Zapata Sanjuan

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	1.936.936.294
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		1.936.936.294

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202300000000147	2025	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 36-02-00-020-000000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9225	CDP	Con Compromiso	2.000.000.000 COP	1.936.936.294 COP	36-02-00-020-000000	Validado	Editar

Saldo de CDP 2.000.000.000 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.936.936.294 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 17/10/2025 6:55 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	94225	Presupuestal (CDP)	15/10/2025 12:00 AM	Generado	1.936.936.294 COP	1.936.936.294 COP	1.936.936.294 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.936.936.294 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 1.936.936.294 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 17/10/2025 6:55 PM

Modificaciones del Contrato

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.21101138		30/11/2025 11:06 AM *(UTC -5 horas)*	-	En edición	-	-	Editar

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101243038	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	10	2025	24	09	2025	00:00	31	12	2030	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO PERIMETRAL CBC	NIT: 901.989.709-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CL 51 B # 7 AS - 16	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3225169253

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA REGIONAL CESAR	NIT: 899.999.034-1

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CRR 19 ENTRE CLL 15 Y 14	VALLEDUPAR, CESAR	570336

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.8333221

CONTRATAR LA ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - CBC REGIONAL CESAR.

ASEGURADO/BENEFICIARIO:SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO NIT 899.999.034

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**24/09/2025**	**30/04/2026**	**$200,000,000.00**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**24/09/2025**	**31/12/2028**	**$100,000,000.00**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS ***		**$400,000,000.00**

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
NUMEROS TRES S.A.S	900788308-1	10.00
INGENIO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	901624672-6	90.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***4,650,575.00	$ ******20,000.00	$ *****887,409.00	$ *********5,557,984.00	$ ******700,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO

NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	235579	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101243038

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101243038, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 02 días del mes de OCTUBRE de 2025

65-44-101243038

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101084074	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	10	2025	24	09	2025	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PERIMETRAL CBC	NIT: 901.989.709-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 51 B # 7 AS - 16	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3225169253

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PERIMETRAL CBC	NIT: 901.989.709-6

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 51 B # 7 AS - 16	BARRANQUILLA, ATLANTICO	3225169253

BENEFICIARIO: 901989709 - CONSORCIO PERIMETRAL CBC

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.8333221

CONTRATAR LA ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - CBC REGIONAL CESAR.

ASEGURADOS: SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO NIT 899.999.034-1 Y CONSORCIO PERIMETRAL CBC NIT 901989709-6.

BENEFICIARIOS: SENA REGIONAL CESAR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO NIT 899.999.034-1 Y/O TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2025	31/12/2025	$427,050,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2025	31/12/2025	$128,115,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2025	31/12/2025	$128,115,000.00

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
NUMEROS TRES S.A.S	900788308-1	10.00
INGENIO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	901624672-6	90.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****229,320.00	$ *******3,000.00	$ ******44,140.00	$ **********276,460.00	$ ******427,050,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	235579	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101084074

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-40-101084074	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
02	10	2025	24	09	2025	00:00	31	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PERIMETRAL CBC		**NIT: 901.989.709-6**
DIRECCIÓN: CL 51 B # 7 AS - 16	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELÉFONO:**	3225169253

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PERIMETRAL CBC		**NIT: 901.989.709-6**
DIRECCIÓN: CL 51 B # 7 AS - 16	**CIUDAD:** BARRANQUILLA, ATLANTICO	**TELÉFONO:**	3225169253

BENEFICIARIO: 901989709 - CONSORCIO PERIMETRAL CBC

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2025	31/12/2025	$128,115,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2025	31/12/2025	$128,115,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	24/09/2025	31/12/2025	$128,115,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-40-101084074

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CAROLINAJIMENEZV

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101241976	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	08	2025	25	08	2025	00:00	25	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PERIMETRAL CBC		NAD: 444.905-0
DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 5-02	CIUDAD: LA PAZ, CESAR	TELÉFONO:	3234478262

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		NIT: 899.999.034-1
DIRECCIÓN: CL 57 8 69	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	5927626

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA LICITACION PUBLICA-LP-CSR-DIR-006-2025

CONTRATAR LA ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - CBC REGIONAL CESAR.

LA PRESENTE POLIZA EN TODO CASO ESTARA VIGENTE HASTA LA APROBACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
LA PRESENTE GARANTIA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015:
1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATORIO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	25/08/2025	25/12/2025	$200,000,000.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 15/09/2025

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
NUMEROS TRES S.A.S	900788308-1	10.00
INGENIO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	901624672-6	90.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****200,000.00	$ *******8,000.00	$ ******39,520.00	$ **********247,520.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	235579	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101241976

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101241976	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	08	2025	25	08	2025	00:00	25	12	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PERIMETRAL CBC		**NAD: 444.905-0**
DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 5-02	**CIUDAD:** LA PAZ, CESAR	**TELÉFONO:**	3234478262

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: CL 57 8 69	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5927626

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

LA PRESENTE POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SE EXPIDE EN UN TODO DE ACUERDO A LOS TERMINOS Y REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION ARRIBA INDICADA Y SE AJUSTA ESTRICTAMENTE A LA VIGENCIA Y PLAZOS ESTIPULADOS EN DICHO PLIEGO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101241976

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101241976, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 15 días del mes de AGOSTO de 2025

65-44-101241976

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101241976	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	08	2025	25	08	2025	00:00	25	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO PERIMETRAL CBC	NAD: 444.905-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
Carrera 7 No. 5-02	LA PAZ, CESAR	3234478262

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	NIT: 899.999.034-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 57 8 69	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	5927626

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPUESTA DE LA LICITACION PUBLICA-LP-CSR-DIR-006-2025

CONTRATAR LA ADECUACION DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO BIOTECNOLOGICO DEL CARIBE - CBC REGIONAL CESAR.

LA PRESENTE POLIZA EN TODO CASO ESTARA VIGENTE HASTA LA APROBACION DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.
LA PRESENTE GARANTIA CUBRE LA SANCION DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTCULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015:
1. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATORIO.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	25/08/2025	25/12/2025	$200,000,000.00	

FECHA ADJUDICACIÓN : 15/09/2025

ACLARACIONES

MEDIANTE ANEXO SE ACLARA:

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) ES 899.999.034-1

CARRERA 19 NO 14-78 REGIONAL CESAR - VALLEDUPAR - TELS (95) 5703105/06.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ******200,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALCA ASESORES DE SEGUROS LTDA	235579	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101241976

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101241976	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	08	2025	25	08	2025	00:00	25	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PERIMETRAL CBC		**NAD: 444.905-0**
DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 5-02	**CIUDAD:** LA PAZ, CESAR	**TELÉFONO:**	3234478262

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: CL 57 8 69	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5927626

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

LA PRESENTE POLIZA DE SERIEDAD DE OFERTA SE EXPIDE EN UN TODO DE ACUERDO A LOS TERMINOS Y REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACION ARRIBA INDICADA Y SE AJUSTA ESTRICTAMENTE A LA VIGENCIA Y PLAZOS ESTIPULADOS EN DICHO PLIEGO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101241976

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
MEDELLIN	MEDELLIN	65	65-44-101241976	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
19	08	2025	25	08	2025	00:00	25	12	2025	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO PERIMETRAL CBC		**NAD: 444.905-0**
DIRECCIÓN: Carrera 7 No. 5-02	**CIUDAD:** LA PAZ, CESAR	**TELÉFONO:**	3234478262

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		**NIT: 899.999.034-1**
DIRECCIÓN: CL 57 8 69	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	5927626

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
NUMEROS TRES S.A.S	900788308-1	10.00
INGENIO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	901624672-6	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN

65-44-101241976

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101241976, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 19 días del mes de AGOSTO de 2025

65-44-101241976

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

SENA		Código: GIL-F-029
		Versión: 10

PROCESO
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA
NOMBRE DEL FORMATO
FORMATO CERTIFICACIÓN CONTRATO PARA INTERVENCIONES A INMUEBLES

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública		Pública Clasificada		Pública Reservada	X

FECHA DILIGENCIAMIENTO	18/12/25

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO PRINCIPAL	CO1. PCCNTR.8333221	FECHA SUSCRIPCIÓN	24/09/25
CONTRATO DERIVADO		FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO DERIVADO	
REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	SENA REGIONAL CESAR DIRECCION REGIONAL	POSICIÓN CATÁLOGO INSTITUCIONAL REGIONAL O CENTRO DE FORMACIÓN	36-02-00-020-000000
CONTRATISTA	CONSORCIO PERIMETRAL CBC	NIT	901989709-5
OBJETO:	Contratar la adecuación del cerramiento perimetral del Centro Biotecnológico del Caribe-CBC Regional Cesar		
LINK DEL CONTRATO EN SECOP II			
REPRESENTANTE LEGAL	Heberto Alfonso Garrido Barraza		
CONCEPTO DEL CONTRATO	ADECUACIONES		
ORDENADOR DEL GASTO	MANUEL DE JESÚS ZULETA BENITEZ	CARGO	DIRECTOR (E.)
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ORDENAR EL GASTO	36-02-00-020-000000	DEPARTAMENTO / CIUDAD / MUNICIPIO EXENTO DE IVA?	
SUPERVISIÓN DESIGNADO DEL SENA	ALEXANDER COSTA SIERRA	APOYO SUPERVISIÓN	JHOAN FELIPE SALAZAR VIERA
INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER CBC	CONTRATO No	CO1.PC CNTR. 8522803
FECHA DE INICIO	18/11/25	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	31/12/25

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS

TIPO DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVO	FECHA	NO. REFERENCIA SECOP II	CONCEPTO

VALOR DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	ANTICIPO DISCRIMINADO		TOTAL ANTICIPO
				VALOR	PORCENTAJE (%)	
	$ 1.627.677.557,98	$ 309.258.736,02	$ 1.936.936.294,00	$ -	0,00%	$ -
			$ -	$ -	0,00%	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.627.677.557,98	309.258.736,02	$ 1.936.936.294,00	VALOR TOTAL ANTICIPO		$ -

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS		VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO	VALOR	PORCENTAJE (%)	TOTAL ANTICIPO
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ -
SUBTOTAL ADICIONES		$ -	$ -	$ -	SUBTOTAL ADICIONES ANTICIPO		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO + VR INICIAL + ADICIONES				$ 1.936.936.294,00	VALOR TOTAL ANTICIPO ACUMULADO		$ -
% AVANCE FINANCIERO		DATOS CONTABLES	VALOR TOTAL DEL IVA	$ 309.258.736,02	VR TOTAL ANTICIPO	0,00%	$ -
			VALOR CONTRATO SIN IVA	$ 1.627.677.557,98			
TOTAL PAGADO	0,00%	TOTAL PAGADO	-	-	TOTAL AMORTIZADO		$ -
SALDO EN TRAMITE DE PAGO	50,00%	SALDO EN TRAMITE DE PAGO	$ 968.468.147,00	SALDO TRAMITE X AMORTIZA			$ -
SALDO POR PAGAR	50,00%	SALDO POR PAGAR	$ 968.468.147,00	SALDO POR AMORTIZAR			$ -

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

VIGENCIA	FECHA	No. COMPROMISO	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	% PAGADO	SALDO X PAGAR	% POR PAGAR	ESTADO	SALDO PERDIDA APROPIACION / POR OBLIGAR
2025	15/10/25	94225	C-3609-1300-15-0-1300138-3109111-02	PROPIOS	$ 1.936.936.294,00	$ 484.234.073,50	400,00%	$ 1.452.702.220,50	75,00%	EJECUCIÓN	$ 1.452.702.220,50
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ -
					$ 0,00			$ 0,00			$ 0,00
TOTAL					$ 1.936.936.294,00	$ 484.234.073,50		$ 1.452.702.220,50			
% EJECUCION					400,00%	25,00%		75,00%			

FACTURA - CORTE O PAGO A REALIZAR

CONCEPTO	DETALLE	DETALLE DE LA FACTURA		CUENTA CONTABLE AFECTAR
PAGO 1	1	VALOR ACTA 1	$ 968.468.147,00	
		VALOR ADMINISTRACION	0,00% $ -	
FACTURA No.	FE3 - FE4	UTILIDAD	0% $ -	
TIPO DE PAGO	PARCIAL	IVA	0% $ 7.025.923,94	161501001
FECHA FACTURA	22/12/2025 - 22/12/2025	SUBTOTAL SIN IVA	$ 961.442.223,06	
CONCEPTO DEL PAGO	ADECUACIONES	SUB TOTAL CON IVA	$ 968.468.147,00	
		AMORTIZACION	0,0000% $ -	
		TOTAL A PAGAR	$ 968.468.147,00	
	$ 968.468.147,00 50,00%	$		

INFORMES EN TRAMITE DE PAGO

CONCEPTO	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR ACTAS DE AVANCE	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO
ACTA 1	$ 480.721.111,53	$ 3.512.962	$ 484.234.073,50	25,00%	$ 0,00
ACTA 2	$ 480.721.111,53	$ 3.512.962	$ 484.234.073,50	25,00%	$ 0,00
-	$ -	$ -	$ -	0,00%	$ 0,00
-	$ -	$ -	$ -	0,00%	
-	$ -	$ -	$ -	0,00%	
VALOR EN TRAMITE DE PAGO			$ 968.468.147,00	50,00%	$ 0,00
TOTAL EJECUTADO			$ 968.468.147,00	100,00%	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR			$ 968.468.147,00	50,00%	
	$ 484.234.073,50	$ 3.512.961,97	$ 480.721.111,53		0,00

CONTROL DE LA SUPERVISIÓN CONSTRUCCIONES - SEGUIMIENTO FINANCIERO

CONCEPTO	NUMERO DE FACTURA	TIPO DE PAGO	VALOR ACTAS DE AVANCE FACTURA	% AVANCE DE OBRA	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	% AMORTIZACION X PAGO	SALDO POR AMORTIZAR	% X AMORTIZAR	VALOR ANTES DE IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL + A NETO PAGADO	NO. COMPROMISO	obligacion	orden de pago	FECHA
PAGO Nº 1	013	AVANCE DE OBRA	$ 484.234.073,50	25,00%	$ -	0,00%	0,00		480.721.111,53	3.512.961,97	$ 484.234.073,50	94225			
PAGO Nº 1	014	AVANCE DE OBRA	$ 484.234.073,50	25,00%	$ -	0,00%	0,00		480.721.111,53	3.512.961,97	$ 484.234.073,50	94225			
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
				0,00%	$ -	0,00%	0,00				$ -				
TOTAL CONTABILIZADO			$ 968.468.147,00	50,00%	$ 0,00		-		$ 961.442.223,06	$ 7.025.923,94	$ 968.468.147,00				

MOBILIARIO

NÚMERO NOTA DE	FECHA NOTA DE ENTRADA ALMACEN	TIPO DE NOTA DE ENTRADA ALMACEN	VALOR NOTA DE ENTRADA ALMACEN

RELACION DE COMPONENTES BIENES INMUEBLES OBJETO DE CONSTRUCCION, ADICION O MEJORA

REGIONAL DONDE SE REALIZA EL PROYECTO	POSICION CATALOGO INSTITUCIONAL REGIONAL	DIRECCION DEL INMUEBLE	CUIDAD	¿OBRA TERMINADA Y EN CONDICIONES DE USO?	¿INCREMENTA LA CAP. PRODUCTIVA Y EFICIENCIA OPERATIVA DEL INMUEBLE?, Y/O ¿MEJORA LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS?, Y/O ¿REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LOS COSTOS?	¿AUMENTA VIDA ÚTIL?	AUMENTO DE VIDA ÚTIL (MESES)	¿ENTREGADO A SATISFACCIÓN?	FECHA ENTREGA Y/O RECIBO A SATISFACCION	¿INCLUYE ENTREGA DE BIENES MUEBLES?	VALOR RECONOCIDO
CESAR DESPACHO REGIONAL	36-02-00-020-000000	KM 7 VÍA A LA PAZ	VALLEDUPAR	NO	N/A	SI	300	SI	16/12/25	NO	$ 968.468.147,00

OBSERVACIONES:	COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE INFORME HA SIDO VERIFICADA Y CONFIRMADA, Y RECOMIENDO AUTORIZAR EL DESEMBOLSO REQUERIDO.		
FIRMAS:		FIRMAS:	
SUPERVISOR	ALEXANDER COSTA SIERRA	PROFESIONAL APOYO TECNICO	JHOAN FELIPE SALAZAR VIERA
CEDULA DE CIUDADANIA	77027504	CEDULA DE CIUDADANIA	1064117881
FIRMAS:		FIRMAS:	
REVISION FINACIERA (NOMBRE)		COORDINACION (NOMBRE)	
CEDULA DE CIUDADANIA		CEDULA DE CIUDADANIA	
