...segundo piso edificio [illegible]

04-11-2025 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Residente SST, 1 oficial + 1 ayudante

Clima: Nublado se presenta lluvias leves de 2:45 a 3:15 PM.

Actividades en ejecucion:

Se realiza jornada de orden y aseo en el segundo piso de la JAL

05-11-2025 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoria, 1 Residente SST de interventoria, 1 Residente de obra, 1 Residente ambiental, 1 Residente SST de obra, 1 inspector de obra, 2 oficiales + 2 Ayudantes.

Clima: Mañana Soleado Tarde Soleada.
Actividades en ejecución:
- Se continua con la actividad de instalación de ventanas en el edificio de la JAL.
- Se inicio con la actividad de enchape sobre muro en baño del primer piso de la alcaldía
- Se continua con la actividad de pañete de filos de vanos de ventana edificio JAL.

06-11-2025 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoría 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, Residente SST, 3 oficiales y 2 Ayudant
Clima: Soleado
Actividades en ejecución:
- Se continua con la actividad de instalación de ventanería en aluminio en el edificio de la JAL.
- Se continua con la actividad de enchape de 60x60 en piso de los baño piso 1 Alcaldía

07-11-2025 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 Inspector de interventoría 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, Residente SST, 3 oficiales y 3 Ayudantes.
Clima: Soleado.
Actividades en ejecución.
- Se continua con la instalación de los vidrios de las ventanas en el edifio de la JAL.
- Se continua con la actividad de enchape sobre muros y piso en el baño de mujeres y hombres piso 1 Alcaldía.
- Se continua con la instalación de orinales en baño del segundo piso JAL.

8-11-2025 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, Inspector de interventoría 1 Residente SST interventoría, Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Residen SST obra, 1 Residente ambiental, 3 oficiales y 3 Ayudantes.
Clima: Soleado.
Actividades Ejecutadas:
- Se continua con la instalación de Vidrios para la ventaneria

Norma

Scanned with CamScanner

en el edificio de la JAL.
- Se continua con instalación de aparatos sanitarios en piso 1 baños alcaldía.
- Se evidencua llegada de divisiones en acero inoxidable para baños.
- Se continua con la ~~actividad~~ de enchape.

10-11-2025 Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Residente SST, 1 Residente ambiental, 3 oficiales y 2 Ayudantes
Clima: Nublado.
Actividades en ejecución
- Se continua con la instalación de aparatos sanitarios (orinales, sanitarios) baño hombres y mujeres JAL.
- Se continua con la instalación de vidrios para ventanas JAL
- Se realiza inspección por parte del personal que ejecutara la actividad de anclaje para trabajo seguro en altura, la inspección realizada es con el fin de verificar punto de acceso a la cubierta de los edificios y posterior a ello iniciar actividades.

11-11-2025. Personal de obra: 1 Residente interventoría, 1 Residente de obra 1 Residente SST, inspector de obra, 1 inspector interventoria, 3 oficiales y 3 Ayudantes.
Clima: Nublado.
Actividades en ejecución.
- Se continua con la actividad de instalación de ventanería en aluminio
- Se continua con la instalación de aparatos sanitarios en el edificio de la JAL
- Se continua con la actividad de enchape en muro de baños.
- Se inicio con la instalación de la escalera metalica en cuarto de archivo segundo piso de la alcaldía

Scanned with CamScanner

12-11-2025 Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Residente SST, 1 residente de interventoría, 1 inspector de interventoría 4 oficiales y 3 Ayudantes.
Clima Soleado Tarde Nublada.
Actividades en ejecución.
- Se continua con la instalación de la escalera metalica en el cuarto de archivo en el segundo piso alcaldía.
- Se continua con la actividad de enchape sobre muro en baño mujeres primer piso alcaldía.
- Se evidencia llegado de mesones para baños.
- Se evidencia de llegada de puertas para zona de vestier.
- Se continua con la instalación de Ventaneria

David Alonso.

13-11-2025 Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventora, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Residente SST, 3 oficiales y 4 Ayudantes
Clima: Soleado Tarde Nublada.
Actividades en ejecución:
- Se realiza actividad de enchape sobre muro banos segundo y tercer piso en baños de hombres y mujeres en edificio JAL.
- Se continua con la instalación de escalera metalica en zona de archivo en segundo piso alcaldía.
- Se realiza instalación de sanitarios baño JAL Segundo piso.
- Se realiza instalación de divisiones de baños en acero inoxidable en baños de la alcaldía primer piso.
- Se realiza instalación de orinales en acero inoxidable baño primer piso alcaldía.

David Alonso.

14-11-2025 Personal en obra: 1 Residente interventoría, 1 inspector interventoria, 1 Residente de obra, 1 Residente ambiental, 1 inspector de obra, 4 oficiales y 4 Ayudantes
Clima: Nublado.
Actividades en ejecución.
- Se realiza instalación ~~(para)~~ de sensor para pusho de orinal baño de primer piso alcaldia
- Se realiza instalación divisiones baño de mujeres primer piso alcaldía.
- Se realiza enchape muro baños tercer piso JAL

Scanned with CamScanner

- Se continua con la actividad de la instalación de escalera metalica en archivo segundo piso alcaldía

15-11-25 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoría 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Residente SST, 3 oficiales y 3 Ayudantes
Clima: Soleado.
Actividades en ejecución:
- Se realiza instalación de orinal y sanitarios en baños de primer piso edificio JAL
- Se continua con la actividad de instalación de escalera metalica
- Se realizo instalación de escalera de gato para acceso a la cubierta del edificio JAL

18-11-2025 Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Residente SST 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 3 oficiales y 3 Ayudantes.
Clima: Soleado tarde Nublada.
Actividades en ejecución:
- Se continua con la instalación de escalera metalica en cuarto archivo segundo piso alcaldía
- Se finaliza la actividad de enchape muro en los baños del edificio JAL.
- Se inicia con la actividad de instalación de anclaje en edificio JAL para trabajo seguro en altura

19-11-2025 Personal de obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría 1 residente SST de interventoría, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra 1 Residente ambiental de obra, 1 Residente SST obra, 3 oficiales y 3 Ayudantes
Clima: Nublado.
Actividade en ejecución.
- Se realiza instalación de anclajes sobre placa en cubierta del edificio JAL para trabajo seguro en altura, se inicia con la actividad de anclaje en la alcaldía
- Se continua con la instalación escalera metalica en cuarto de archivo en segundo piso alcaldía.
- Se solicita al contratista de obra realizar la entrega de planillas de seguridad social.


Scanned with CamScanner

16


19-11-25. • Se realiza actividad de anclajes, se identifica que dentro de la viga canal hay un flanche metalico lo cual, si se perfora genera filtraciones cada que llueve, por lo tanto, se realiza la actividad por la cara externa de la viga canal en el edificio de Alcaldia. La actividad se ejecuta con escalera y sin pasarela movil, haciendo uso de elementos no autorizados para la actividad; se deja la constancia de recomendación, de hacer la aplicación al procedimiento seguro en altura.

14 Aplicación al procedimiento seguro en al

INSTALACION PUNTO DE ANCLAJE EN VIGA CANAL EN CONCRETO

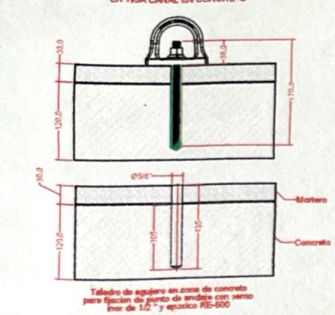

Tablero de aguilero en zona de concreto para fijacion de punto de anclaje con cemento inox de 1/2 " y epoxico RS-500



Señalizacion Preventiva



Señalizacion informativa





43 - Puntos de anclaje en acero inox marca Dipall con ref: dpa 2105 instalados en la zona de viga canal de la estructura

Plano montaje solo Informativo







SEINTEG HSEQ S.A.S	CLIENTE: ALCALDIA PUENTEARANDA	MATERIAL: ACERO INOX 316 L	T.TERMICO.	PLANO N° 1 DE 1	DIBUJANTE: EFREN DIAZ ACOSTA	REVISO: EDWIN MONTENEGRO M.
	PROYECTO: SISTEMA PROTECCION ANTICAIDAS	REF.PRODUCTO: DPA - 2105	DUREZA: N/A	ESCALA LINEAL 0.25 mm	FIRMA ING. CALIFICADO: INGENIERO CIVIL LUIS FERNADO SIERRA LEON C.C. 2986208 MATRICULA PROFESIONAL N° 25202195659 UND	EMPRESA REVISORA: SEINTEG HSEQ S.A.S. E-MAIL : comercial@seinteghseq.com TEL FIJO: (601)4041376 CELULAR : (601) 311-2336637 (601) 313-8705450 https/www.seinteghseq.com
	PRODUCTO: PUNTOS DE ANCLAJE EN INOX	CANTIDAD : 43 puntos	PESO: N/A	FECHA: DICIEMBRE / 01 / 2025		

Scanned with CamScanner

20-11-25 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 residente de obra, 1 inspector de interventoria, 1 inspector de obra, 4 operarios de la empresa SINTEC, 2 vidrieros y 1 ayudante.

Clima: Parcialmente soleado - lluvia al medio dia - lluvia desde las 2:30pm

Actividades en ejecución:

- El dia 19 en horas de la tarde se ejecuto la acometida de gas al exterior de la alcaldia (edificio), conexión al contador, se recomendo dejar plastico para cubrir la acometida, lo cual no se llevo a cabo, y se solicito colocarle punto de soldadura a la tapa ya que por la oxidacion, esta se desprendio, lo cual el contratista cumplio. Se recomienda dejar aseado por toda la perimetral, revisando hoy 20 de noviembre no se ve una zona aseada. Se deja constancia de cumplir con los parametros.
- Se realiza la labor en los baños del primer piso en el edficio de la Alcaldia, de hacer las conexiones electricas para los baños e instalar el meson de lavamanos.
- Se continúan con las actividades de instalación de los anclajes en la cara externa de la viga canal.
- Se hacen los detalles de ventaneria en el primer piso del edficio IAL, retirando el exceso de espuma en la parte superior para los lucas.
- Se sigue adelante con las adecuaciones en los baños del edficio IAL, tanto en segundo como en primer piso.
- Se recomienda al contratista limpiar la perimetral del edficio de la alcaldía, donde el 19 de noviembre se instalo la acometida de la red de gas.
- Se le solicita al contratista entregar documentacion de asistencia y permisos de trabajo para todos los puntos de trabajo. Esta solicitud se ha reiterado durante la jornada. Además, le recordamos que la documentacion debe presentarse de forma diaria a interventoria antes de iniciar labores, garantizando un trabajo seguro y cumpliendo la normativa.

21-11-25 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 Inspector de interventoria 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 residente SST, 1 instalador hidraulico 1 oficial, 2 ayudantes, 1 instalador de pelicula frost y 3 instaladores de puntos de anclaje.

Clima: Mañana Soleada, despues de la 1 pm llovia

Actividades en ejecución:

- Se continua con la instalacion de puntos de anclaje sobre la perimetral del Edificio de la alcaldia cara exterior del edificio.
- Se continua con acabados de actividades de baños en el Edificio de la alcaldia primer piso, enchape, instalación de espejos, luces led.
- Se realizan actividades en baños de 2 (segundo) piso del Edificio JAL, como registros para puntos electricos de cinta led.

22-11-25. Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 inspector de interventoria 1 Residente de obra, 1 residente SST, 2 oficiales y 2 ayudantes.

Clima: Mañana Soleado.

Actividades en ejecución:

- Se continua con actividades de acabados de baño: piso 2 en el Edificio de la alcaldia, se ejecutan sondeos e instalacion de sanitarios.
- Se continua con actividades de baño del primer piso en el Edificio de la alcaldia con extractores y mesones de los baños, adicional de ajustes electricos para la iluminación.

24-11-25. Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 1 Inspector de interventoria, 1 Residente de obra, 1 Residente de SST, 1 Inspector de obra, 1 Residente ambiental, 1 instalador hidráulico, 1 Oficial de obra, 1 ayudante de obra y 3 instaladores punto de anclaje certificado.

Clima: Parcialmente nublado.

- Se continua con actividades de acabados de baño piso 1 en el Edificio de la Alcaldia, instalación de mesones de lavamanos y llaves de agua.

Norma

Scanned with CamScanner

- Se continua con actividades en el edificio IAL de pintura en el segundo Piso, haciendo resanes, filos y dilataciones en oficinas de ediles.
- Se avanza para culminar la actividad de instalación de puntos de anclaje sobre la perimetral del Edificio de la Alcaldía sobre la cara externa, para proceder con pruebas despues de secado de la resina que es mínimo de 8 horas.
- Se solicita al contratista de obra la entrega de acta de entrega de la escalera metalica con registro fotografico de la oficina de archivo segundo piso edificio alcaldia

25-11-25 Personal en obra: 1 Residente de interventoria, 2 inspectores de interventoria, 1 Residente de obra, 1 residente SST, 1 Inspector de obra, 2 oficiales, 1 ayudante y 3 instaladores de puntos de anclaje certificados.
Clima: Soleado

- Se continua con actividades de pintura de segundo piso del edificio IAL, en oficinas de los ediles.
- Asi mismo se continua con acabados de cielo raso de baño de segundo piso
- Se realiza la instalación de placas de puntos de anclaje sobre la cara externa de la viga canal del Edificio de la Alcaldia.
- Se solicita al contratista parar actividades del oficial Wilson Hernandez quien no cuenta con el aval para ejecutar actividades en sitio. No se acató la indicación, se solicito al profesional SST del contratista adjuntar documentación para revisión, se verifico y se dio continuidad. Se deja la constancia de la novedad presentada con el contratista.
- El contratista entrega parcialmente baños del primer piso del edificio de la alcaldia, quedando con observaciones por parte de interventoria.
- Se solicita al contratista entrega de actas con registro fotograficos, de las zonas recibidas con observaciones

26-11-2025 Personal de obra: 1 Residente de interventoría, 2 Inspectores de interventoría, 1 Residente de SST de interventoría, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 Residente SST, 1 Residente ambiental, 2 oficiales y 2 ayudantes.
Clima: Parcialmente soleado.
· Se realiza el desmonte de metales de baños y conexiones de lavamanos del segundo piso del Edificio de la alcaldía
· Se realiza la instalación del cielo raso en la cocineta del segundo piso del edificio JAL (Junta administrativa local)
· Se continua con actividades de pintura del segundo piso en oficinas del edificio de la JAL
· Se continua con instalación de luminarias del segundo piso del edificio de la JAL en el baño.
· Se solicita al contratista de obra entrega de actas de obra, con registro fotográfico. debidamente diligenciado.

27-11-2025 Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 oficial, 1 ayudante, 1 Residente SST.
Clima: Soleado.
· Se continua con pintura en el segundo piso en el edificio de junta administrativo local
· Se continua con la instalación de drywall de cielo raso en cocineta del segundo piso del edificio de junta administrativa local
· Se solicita al contratista de obra entrega de actas de obra, con registro fotográfico, debidamente diligenciado.

28-11-2025 Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 oficial, 1 ayudante, 2 instaladores de vidrios, 1 Residente SST.
Clima: En la mañana parcialmente soleado. y en la tarde despejado.
· Se realiza la actividad de instalación de espejos en baños de piso 1, 2 y 3 del Edificio de la Junta (de) administrativa local

Norma

Scanned with CamScanner

- Se continua con actividad de pintura del segundo piso de la junta administrativa local
- Se realiza la instalación de puntos electricos ide para iluminación LED detrás del espejo de los baños en piso 1, 2 y 3 del edifico de la Junta administrativa local

29-11-25. Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interventoría, 1 Residente de obra, 1 inspector de obra, 1 instalador de vidrio y 1 ayudante de obra.
Clima: Parcialmente soleado.
- Se realiza la actividad de desmonte de reja y ventana en el edifico de la Junta administrativa local en el auditorio, y a su vez se hace la instalación de la nueva ventana en aluminio y la reja nueva.

1-12-25. Personal en obra: 1 Residente de interventoría, 1 inspector de interven-
