INFORME PAGO PARCIAL NO.1

CONTRATO No. 234 DE 2025

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ

CONTRATISTA:

PROVYCON S.A.S
NIT 900.324.001-3

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:

UN (01) MES

PERIODO DEL PRESENTE INFORME

03 DE DICIEMBRE DE 2025 – 19 DE DICIEMBRE DE 2025

MUNICIPIO DE MIRAFLORES – BOYACA

INFORME DE CONTRATISTA

CONTRATISTA: PROVYCON S.A.S

NIT N°: 900.324.001-3

REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER RAMIREZ MEDINA

C.C.: 4.166.493 DE MIRAFLORES

C.D.P: 754 (05/11/2025)

REGISTRO PRESUPUESTAL: 2009 (06/12/2025)

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE MIRAFLORES BOYACÁ

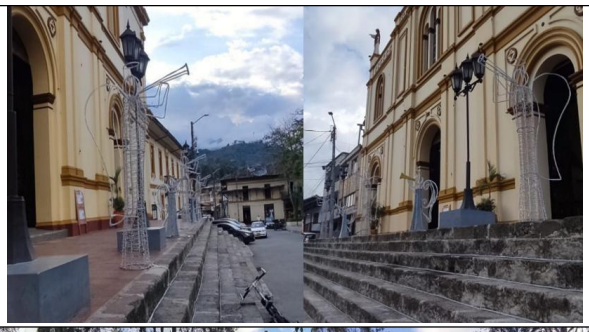
PLAZO DEL CONTRATO: UN (01) MES

VALOR CONTRATO: CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($174.496.357,66) MCTE


FECHA DEL CONTRATO: 02 DE DICIEMBRE DE 2025

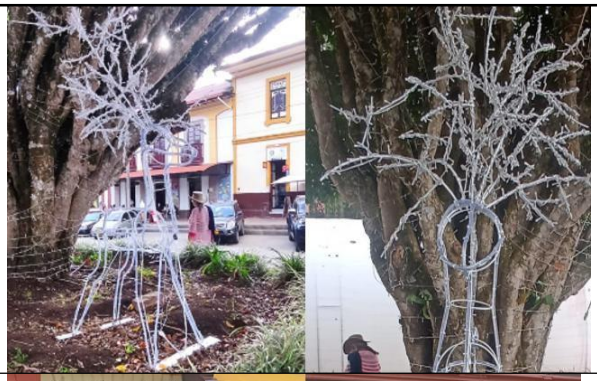
ACTA DE INICIO: 03 DE DICIEMBRE DE 2025

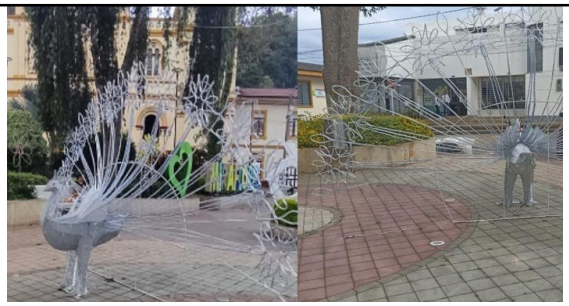
REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

ÍTEM	ACTIVIDAD	EVIDENCIA (IMÁGENES)
1.	**ALUMBRADO NAVIDEÑO**	
1.2	Suministro e instalación de figuras decorativas tipo ángel 3D en estructura metálica iluminada con manguera LED, de altura aproximada de 2,0 m y ancho de alas de 1,5 m.	
1.4	Suministro e instalación de túnel de luces en estructura metálica tipo arco iluminado con manguera LED (para el número 0 de la estructura 2026). Arco en 2D con dimensiones aproximadas: 3,0 m x 3,0 m. Incluye elementos lineales para unión visual entre arcos.	

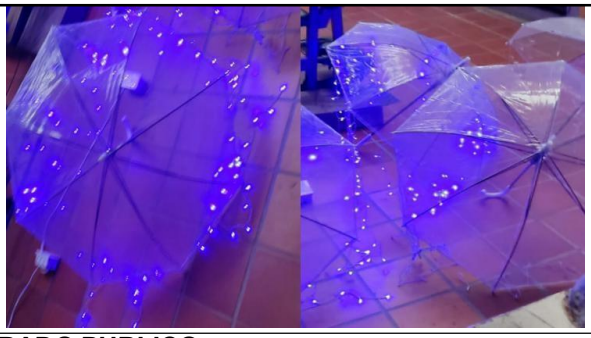
1.5	Suministro, adecuación e instalación de estructura metálica iluminada con manguera LED (Adecuación del número 5 a número 6). Dimensiones aproximadas: 3,0 m x 3,0 m.	
1.6	Instalación de estructura metálica iluminada con manguera LED (Número 2). Dimensiones aproximadas: 3,0 m x 3,0 m.	
1.8	Suministro e instalación de arco decorativo tipo venados en estructura metálica 2D, iluminado con manguera LED. Dimensiones aproximadas: 4,0 m de ancho x 3,0 m de altura (Inc. 3 Venados y 1 Arco).	
1.9	Suministro e instalación de flores decorativas tipo Poinsetia 3D en estructura metálica iluminada con LED, en tamaño de 1,0 m. Incluye cableado.	
1.10	Suministro e instalación de flores decorativas tipo Poinsetia 3D en estructura metálica iluminada con LED, en tamaño de 0,7 m. Incluye cableado.	

1.11	Suministro e instalación de lineal cable LED verde 100 Led.	
1.12	Suministro e instalación de espiral luminosa decorativa en manguera led y estructura metálica para palmas de altura aproximada de 4,0 m y diámetro de 0,4 m.	
1.13	Suministro e instalación de marco decorativo metálico iluminado con LED para fotografías. Dimensiones: 2,0 m de altura x 2,0 m de ancho. Incluye sistema de anclaje o base metálica de soporte.	
1.14	Suministro, adecuación e instalación de elementos decorativos para caja de regalo existente. Incluye 4 ventanas cuadradas y 2 redondas de 0,6 m x 0,6 m y 4 árboles laterales metálicos iluminados con manguera LED.	

1.15	Suministro e instalación de figuras decorativas tipo reno con cachos de árbol en estructura metálica e iluminación LED, conforme a imagen de referencia.	
1.16	Suministro e instalación de cortinas luminosas LED tipo cascada y figuras decorativas de moños metálicos 2D de 1,5 m x 1,5 m, iluminados con manguera LED.	
1.17	Suministro e instalación de faroles decorativos tipo aplique metálico para ventanas, en versiones 2D (70 cm x 40 cm), con iluminación LED integrada.	
1.18	Suministro de manguera LED de 32 luces por metro, en rollo de 100 m, para conexión e instalación de elementos decorativos.	

1.19	Suministro e instalación de figura decorativa tipo pavo real en estructura metálica tridimensional, iluminada con manguera LED multicolor. Dimensiones aproximadas: 2,0 m de altura x 5,0 m de ancho x 1,0 m de fondo.	
1.21	Suministro e instalación de figura decorativa tipo bola colgante en estructura metálica conformada por tres aros, con iluminación LED en diferentes colores. Diámetro aproximado: 1,50 m. Instalación suspendida en árboles.	
1.22	Suministro e instalación de figura decorativa tipo bola colgante en estructura metálica conformada por tres aros, con iluminación LED en diferentes colores. Diámetro aproximado: 1,00 m. Instalación suspendida en árboles.	
1.23	Suministro e instalación de figura decorativa metálica para poste, con varilla de extensión de 30 cm y sistema de iluminación LED conforme a diseño existente.	
1.24	Instalación de manguera con luces tipo led (light-emitting diode).	

1.25	Instalación de extensiones navideñas con luces tipo spark litled (light-emitting diode), de 220v / 110v.	
1.26	Instalación de reflector led (light-emitting diode) de 200w.	
1.27	Instalación de reflector led (light-emitting diode) de 100w.	
1.28	Instalación de reflector led (light-emitting diode) de 50w.	
1.29	Instalación de figuras volumétricas tridimensionales de tamaño grande (alguna de sus dimensiones superior a 3 metros), estructura metálica recubierta, silueteadas por luces tipo led (light-emitting diode), con conexión a corriente 110v. Inc reparaciones.	

1.30	Instalación de sombrillas somolices transparente grandes.	
2	**ALUMBRADO PUBLICO**	
2.3	Suministro e instalación de balastro sodio 70 W – 208/220/240V.	
2.4	Suministro e instalación de arrancador sodio 100/400W 208–240V – paralelo.	
2.5	Suministro e instalación de condensador 10 UF 250 VAC.	
2.6	Suministro e instalación de base de ojo fotocelda con platina para fotocelda.	

2.7	Suministro e instalación de fotocelda de tres pines 120/277V.	
2.8	Suministro e instalación de conector bimetálico CG-3 C. 1/0–4/0.	
2.9	Suministro e instalación de conector hermético DP 7 4–4/0.	
2.10	Suministro e instalación de bombillo tubular de sodio 70.	

2.11	Suministro e instalación de cable de cobre aislado No. 14 AWG.	
2	**ITEM NO PREVISTO**	
	Suministro, adecuación e instalación de figura decorativa tipo bola de adorno. Dimensiones aproximadas: 3,0 m de altura x 2,0 m de ancho. Incluye iluminación con manguera LED blanca para la base.	

VALOR A CANCELAR AL CONTRATISTA

PAGO NÚMERO	VALOR ACTAS ANTERIORES	VALOR PRESENTE PAGO	VALOR POR EJECUTAR
1	**$0,00**	**$156.459.145,22**	**$18.037.212.44**

CONTRATISTA

PROVYCON S.A.S
R/L ALEXANDER RAMIREZ MEDINA
Contratista de Obra
