
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM 411 de 2023

INFORME DE INTERVENTORIA

PARCIAL [ ] **FINAL** [x]

Objeto Contrato:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL Huila

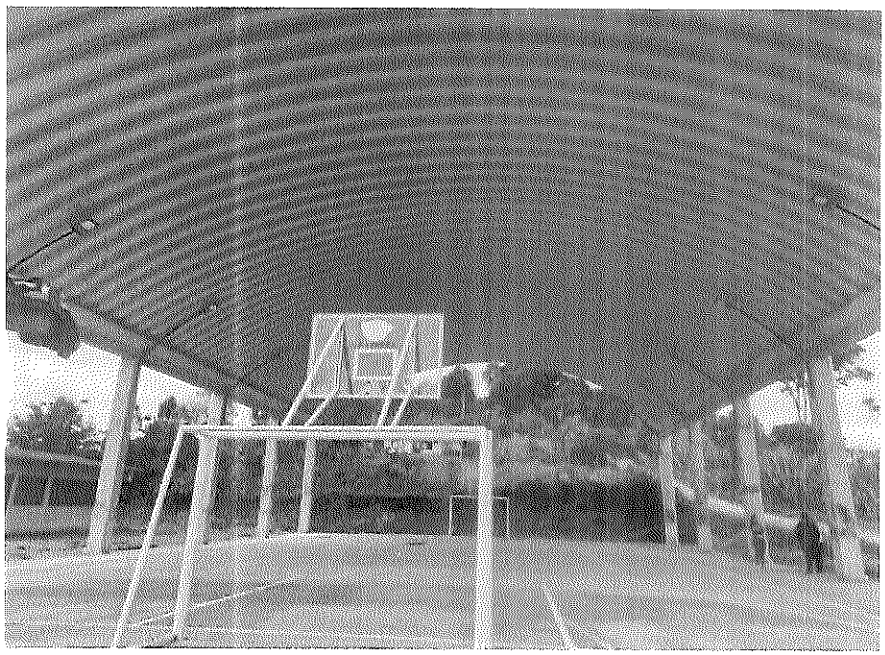

CONTRATO DE OBRA No CLPIH392 DE 2023 VEREDA LA ESPERANZA

MUNICIPIO: LA ARGENTINA.

DEPARTAMENTO: HUILA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.


APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. Daniel Felipe Molina Tafur.	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CIHCM411 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 23 de noviembre de 2023 al 28 de diciembre de 2023; y desde el 20 de junio de 2024 hasta el 13 de noviembre de 2024
CONTRATISTA	SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	**NIT:**	891.101.100-5
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER BARRERO MOSSOS	**C.C:**	7685694

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01 / NOVIEMBRE / 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A):	09 / NOVIEMBRE / 2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
OTRO SÍ No. 1 30/05/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO – VIGENCIA FISCAL
OTRO SÍ No. 2 10/07/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO-PRÓRROGA DE TRES (03) MESES Y 10 DIAS
OTRO SÍ No. 3 18/10/2024	MODIFICACIÓN CLÁUSULA 4 -PLAZO DEL CONTRATO-PRÓRROGA DE 27 DIAS
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES Y 37 DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTI Y UN PESOS ($85.798.121) M/CTE
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A
VALOR TOTAL:	OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTI Y UN PESOS ($85.798.121) M/CTE.
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	

CONTRATO No.	CLPIH392 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA	CONSORCIO INDER A & S.	**NIT:**	901767134-9
REPRESENTANTE LEGAL:	MIGUEL ALEXANDER CERÓN MOLINA	**C.C:**	1.182.774.968
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	01 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	23 DE NOVIEMBRE DE 2023		
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
OTRO SÍ No. 1 20/06/2024	MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA CUARTA – PLAZO DEL CONTRATO – PARA PRORROGAR TREINTA (30) DÍAS AL PLAZO CONTRACTUAL		
OTRO SÍ No. 2 12/09/2024	MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA CUARTA – PLAZO DEL CONTRATO – PARA PRORROGAR UN (01) MES AL PLAZO CONTRACTUAL		
OTRO SÍ No. 3 10/10/2024	MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA CUARTA – PLAZO DEL CONTRATO – PARA PRORROGAR UN (01) MES AL PLAZO CONTRACTUAL		
PLAZO TOTAL:	SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.		
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS. ($ 488.701.732,00) M/CTE		
OTRO SI No. 4 (24/10/2024)	MODIFICACIÓN A LA CLAUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO – SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL VEINTE PESOS ($ 74.813.020,00) M/CTE		
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS. ($ 563,514,752.00) M/CTE		

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

VEREDA LA ESPERANZA – LA ARGENTINA – DEPARTAMENTO DEL HUILA.

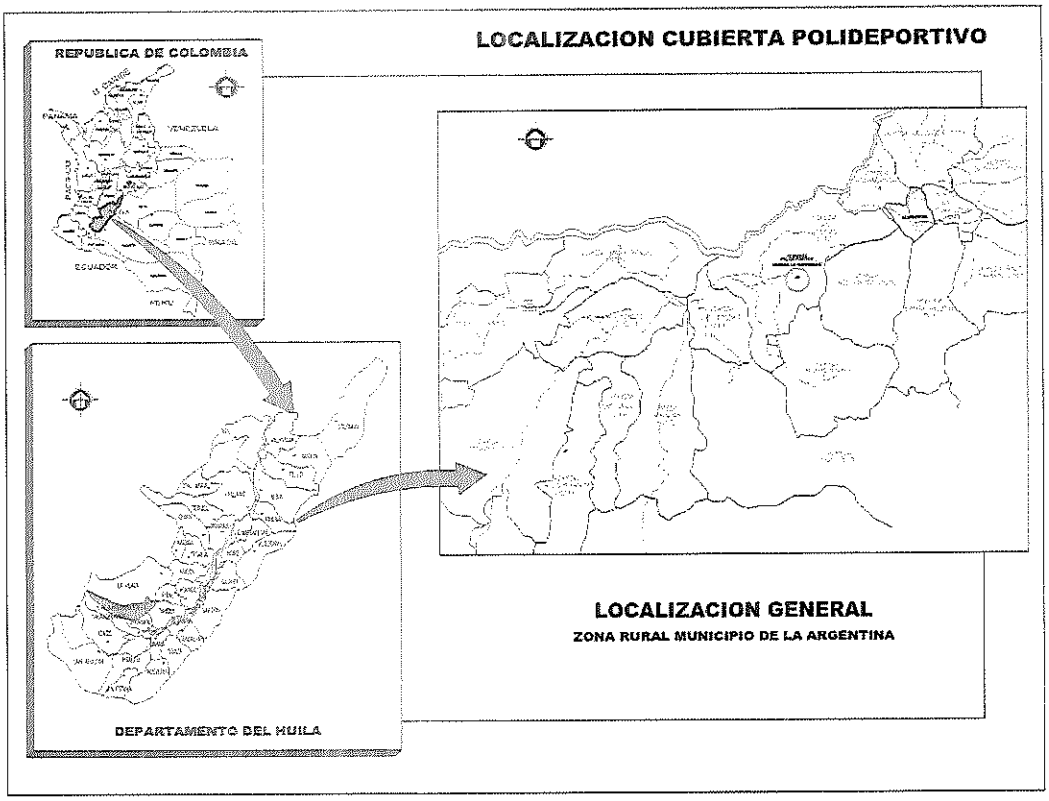

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En atención a las necesidades de inversión en infraestructura con destino al mejoramiento y construcción integral para toda la comunidad, generando oportunidades de crecimiento y mejora en la calidad de vida para la ciudadanía, El Instituto Departamental de Deportes, la Educación Física, la Recreación y el Aprovechamiento del tiempo libre del Huila "INDERHUILA"; han considerado pertinente realizar inversiones en la infraestructura que permitan el desarrollo de actividades para fortalecer los proyectos de vida, las habilidades socioemocionales, la innovación y el liderazgo. Con lo anterior busca el cumplimiento de metas físicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, favoreciendo en conexiones estratégicas entre la niñez, la adolescencia y la familia esta región de Colombia.

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 723.02 m2 por cubierta aproximadamente, en la que se encuentra contemplada la construcción de la cubierta autoportante con teja metálica cal. 22 para el polideportivo ubicado en la vereda La Esperanza de la zona rural del municipio de La Argentina – Huila.

La cubierta será con un sistema autoportante, sostenida con columnas en concreto de 3.000 PSI. El sistema estructural propuesto consiste en columnas y vigas aéreas en concreto reforzado en 3.000 PSI y una cimentación tipo zapatas, vigas de cimentación y viga canal. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMO RESISTENTE de 2010 – NSR-10.

Las obras objeto del proyecto se localizan la vereda la Esperanza, en el municipio de La Argentina, departamento del Huila, el alcance del Proyecto contiene las siguientes actividades.

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- ACTIVIDADES PRELIMINARES
  * Localización y replanteo.
  * Corte de Placa de concreto e= 0.10 mts.
  * Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.
  * Desmonte marcos canchas existentes.
  * Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
  * Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.

- CIMENTACIÓN
  * Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts
  * Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga
  * Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.
  * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas.
  * Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.
  * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación

- ESTRUCTURAS EN CONCRETO
  * Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.
  * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas
  * Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.
  * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal
  * Suministro e instalación de manto zetal viga canal.

- CUBIERTA
  * Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliéster estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.

- ACABADOS - PLACAS EN CONCRETO
  * Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.
  * Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Futbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1,8 * 1,05 M. Incluye: aro, malla, demarcado, logos, anticorrosivo y pintura
  * Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0,10 cm.
  * Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.

- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
  * Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.
  * Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.
  * Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS

289

* Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto.
* Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lámina alfajor.
* Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
* Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.
* Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"
* Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"
* Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.
* Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.
* Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.
* Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.
* Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.
* Suministro e instalación de reflector led de 150 w
* Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.
* Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.
* Instalación de templete cuerda guitarra en baja tensión
* Vestida de estructura de retención en baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y percha de gancho abierto.
* Vestida de estructura de retención doble en baja tensión con dos grapas de retención para cable trenzado con perno de gancho abierto y percha de gancho abierto para sujeción de la red trenzada.
* Vestida de estructura de retención de baja tensión con grapa de retención para cable trenzado y perno de gancho abierto.
* Tendido y tensionado en conductor trenzado de aluminio aislado 2x35 mm + 50 mm tipo PE-XLPE-600 VAC

- TRANSPORTE
  * Transporte de materiales pétreos

- ITEMS NO PREVISTOS
  * Cerramiento perimetral con polisombra
  * Rejilla prefabricada para cuentas concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo. (40cm * 50cm * 0,05m)
  * Construcción placa en concreto de 3000 PSI. Incluye formaleta, malla electrosoldada 5mm, corte y dilataciones
  * Suministro, transporte e instalación de Medidor bifásico
  * ACOMETIDA AEREA EN CABLE CONCENTRICO 2*8+8 600V
  * Demolición de cuneta en concreto existente, hasta, ANCHO= 0.20 mt. Incluye retiro de material sobrante
  * Mantenimiento de marcos de canchas futbol sala, suministro e instalación de accesorios incluye tablero acrílico cal 10mm, aro para baloncesto, mallas para canchas de futbol sala

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DIAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	23/11/2023			22/02/2024
Suspensión No. 1	28/12/2023	35		
Reiniciación No. 1	20/06/2024		173	13/09/2023
Otro si prorroga No. 1	20/06/2024			13/09/2023

Otro si prorroga No. 2	12/09/2024	85		
Otro si prorroga No. 3	10/10/2024	27		13/11/2024
TERMINACIÓN Cto.	13/11/2024	33		13/11/2024
TOTAL, DÍAS		**180**	173	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

ACTA	FECHA OBRA	ACTA	FECHA INTERVENTORIA
Inicio	23/11/2023	INICIO	09/11/2023
Justificación de Suspensión	28/12/2023	JUSTIFICACION DE SUSPENSION No. 1	28/12/2023
Suspensión	28/12/2023	SUSPENSION No.1	28/12/2023
Justificación para el Reinicio	20/06/2024	JUSTIFICACIÓN PARA EL REINICIO No. 2	30/05/2024
Reinicio	20/06/2024	REINICIO No. 1	30/05/2024
Justificación para otro si prórroga	20/06/2024	OTRI SI 1 En sentido de romper la vigencia fiscal	30/05/2024
Otro si Prorroga No. 01	20/06/2024	OTRI SI 2 PRORROGA N.1	10/07/2024
Justificación para otro si prórroga No. 2	12/09/2024	OTRI SI 3 PRORROGA N.3	10/07/2024
Otro si otro si Prorroga No. 2	12/09/2024		
Justificación para otro si prórroga No 3	10/10/2024		
Otro si otro si Prorroga No. 3	10/10/2024		
Justificación para otro si modificatorio de Adición No 4	24/10/2024		
Otro si otro si modificatorio de Adición No 4	24/10/2024		
Acta de Recibo final de obra	13/11/2024		

7. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO (Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Obligaciones de Carácter General.	1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratación 2. Ejecutar de acuerdo con los precios establecidos en la propuesta y con sus propios medios, materiales, equipo y personal en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación. 3. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente contrato, y de la ejecución de este, de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1.993 4. Cumplir el objeto del contrato, ejecutar y entregar los productos contratados en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones técnicas. 5. Adaptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución de la consultoría. 6. Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de la Ley 90 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la

	Ley 1150 de2007, LA AFILIACIÓN Y EL PAGO DE LOS APORTES AL Sistema De Seguridad Social integral, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la interventoría. 7. Velar porque el INDERHUILA se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución de la interventoría. 8. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993. 9. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 10. Asumir el pago de los tributos y demás gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 11. Verificar y aprobar la localización e los trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el contrato, igualmente constatar según el caso la existencia de planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la ejecución del objeto. 12. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos por parte del contratista de la consultoría al momento de iniciación del contrato respectivo. 13. Realizar la inspección y el control con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras cuando no cumplan con la calidad exigida, esta labor comprenderá los análisis de laboratorio que sean necesarios. 14. Conocer y analizar el diseño, las especificaciones y los anexos del contrato de obra respectivo; en el desarrollo de esta función deberá presentar oportunamente las observaciones a los planos y especificaciones, diseños et., realizar las correcciones del caso y verificar que posee los conocimientos técnicos necesarios para cumplir cabalmente con sus funciones en el respectivo contrato. 15. Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal. 16. Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el documento base y anexo técnico y presupuesto, en los plazos acordados con la entidad. 17. Ordenar la suspensión de los trabajos que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el contratista realice los ajustes del caso para cumplir con las especificaciones adecuadas para su ejecución. 18. Entregar Planos récord. 19. En ningún caso deberá permitirse la ejecución de obras o trabajos no previstos inicialmente sin la aprobación del instituto. 20. Inspeccionar los trabajos, vigilando el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, para ello exigirá al contratista entre otras: La señalización de seguridad apropiada, la observancia de las normas de seguridad y manejo adecuado de explosivos y materiales inflamables, prudencia en la utilización de los equipos y vehículos, y las medidas de higiene indispensables para la conservación de la salud de los trabajadores. 21. Mantener el equipo de trabajo propuesto en la interventoría el cual debe ser el mismo ofertado en la propuesta técnica y el exigido por la discriminación de la interventoría, en caso de cambios estos deberán ser notificados al supervisor donde para su aprobación el personal a proponer deberá cumplir con los mismos requisitos plasmados en el pliego de condiciones y/o superar lo consignado. 22. Presentar informes mensuales y cuando la entidad lo requiera, estableciendo cómo va su ejecución y cumplimiento, y si es del caso, solicitar las sanciones correspondientes a que hubiere lugar, lo cual deberá hacerse con la debida antelación al vencimiento del plazo de ejecución del contrato acompañada de la correspondiente justificación. 23. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento, por parte del contratista, de todas las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato, las especificaciones, así como conocer la propuesta del contratista de obra y las normas y reglamentaciones aplicables en la ejecución del contrato. El respetivo supervisor y/o ordenador del gasto debe enviar copia al interventor del contrato con todos sus anexos. 24. Colaborar con la entidad en la solución de las reclamaciones sugeridas por perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato

	25. Informar al gestor del proyecto y/o supervisor de manera inmediata, la ocurrencia de cualquier hecho constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, que implica el cumplimiento del contrato. 26. Colaborar con la entidad en la solución de las reclamaciones surgidas por perjuicios causados a terceros con ocasión de la ejecución del respectivo contrato. 27. Informar oportunamente la ocurrencia de hechos imputables al contratista que puedan causar perjuicio a la entidad, en razón de la ejecución del contrato y colaborar en la solución de los mismos. 28. Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas de los contratistas, y cuando se pertinente dar traslado de ellas a la entidad, a través del supervisor y/o ordenador del gasto y emitir su respectivo concepto. 29. Presentar y elaborar los informes mensuales sobre avance de los trabajos, entregas, inversiones, problemas presentados durante la ejecución y posibles causas de los mismos, resultados de los ensayos y controles de calidad, cuando haya lugar. Estos informes serán enviados al respectivo supervisor y/o ordenador del gasto, dentro de los primeros cinco (5) días calendario de cada mes. 30. Informar inmediatamente en caso de que se presenten hechos de fuerza mayor ocaso fortuito debidamente comprobados. 31. Someter a consideración y aprobación a través del ordenador del gasto lo siguiente: a. Las solicitudes de prórroga del plazo y ampliaciones al valor del contrato por lo menos con veinte (20) días hábiles de antelación a la fecha de terminación del contrato debidamente sustentadas. 32. Suscribir con el contratista todas las actas, incluidas las de suspensión y reiniciación del contrato y tramitarlas para la aprobación. 33. Exigir que las pólizas del contratista se mantengan actualizadas y se tramite su aprobación. 34. Requerir al contratista por escrito cuando los trabajos no marchen de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones, los avances de las metas físicas sean inferiores a lo programado, las entregas acordades no se cumplan en su oportunidad o cuando se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados. Del requerimiento deberá enviar copia al INDERHUILA y dejar una en el archivo de la interventoría. 35. Elaborar y suscribir con el contratista las actas para el recibo final de la consultoría, de conformidad con lo establecido en el contrato y en las disposiciones legales vigentes. 36. Llevar en forma ordenada el archivo de la Interventoría de la consultoría para ser entregado a la entidad cuando esta lo requiera. En todo caso dicho archivo deberá ser entregado en el momento de la liquidación del contrato. 37. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las especificaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidación del contrato de la consultoría, garantizando que entregables y cifran correspondan a la consultoría. 38. Elaborar junto con el contratista las modificaciones en caso de que hubiere lugar y someterla a aprobación para lo cual deberá emitir concepto de viabilidad, quien deberá cuidar que no se validen atrasos imputables al contratista de obra Igualmente la interventoría, deberá dentro de los tres (03) días siguientes a su recepción enviar el Acta de Modificación y/o adición al ordenador del gasto. 39. Proyectar los documentos necesarios para que la entidad pueda desarrollar los procesos sancionatorios de conformidad a la constitución y a la ley, igualmente deberá proyectar las respuestas pertinentes a las solicitudes del contratista de la consultoría respecto a la ecuación económica. 40. El interventor deberá contar con una oficina que brinde soporte de orden técnico, administrativo, contable, jurídico y financiero. 41. Obtener la aprobación del supervisor, con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos; la solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, que deberá cumplir con el perfil profesional exigido en el pliego de condiciones. 42. Proyectar respuesta a los requerimientos efectuados por el supervisor, en término no mayor a tres (3) días hábiles, los cuales deberán ser entregados en forma física y/o correo electrónico de la entidad.

	43. Después de la suscripción del contrato la interventoría deberá realizar los pagos correspondientes a la legalización del contrato y estampillas correspondientes a la Gobernación del Huila. 44. Velar porque la ejecución del contrato de obra no se interrumpa injustificadamente. 45. Impartir instrucciones al contratista de obra sobre el cumplimiento de sus obligaciones. 46. Realizar la inspección técnica final para la entrega de las obras y elaborar y presentar el informe técnico respectivo. 47. Todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de estas.
b). Actividades Administrativas.	1. Se verifica el cumplimiento durante el desarrollo del contrato por parte de la interventoría los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de los mismos al contrato, así mismo se exigió la afiliación a la EPS, AFP y ARL de la totalidad del personal que intervino en la obra. El pago de las planillas de seguridad social se registró de manera extemporánea, no se realizó en los tiempos debidos. 2. Se realizó un Comité de Obra en cada período con el contratista, para evaluar el desarrollo del contrato, los cuales las respectivas actas fueron entregadas en los informes periódicos del contratista. 3. Elaborar, revisar, revisar y suscribir las actas y demás documentos necesarios para la ejecución del contrato como son: Actas de iniciación, actas de reuniones que se celebren en la interventoría o en las instalaciones de la entidad, actas de suspensiones, de terminación, de recibo final y liquidación de la interventoría, las cuales deberán ser firmadas por la entidad, la interventoría y el contratista, según el caso. 4. No se realizaron solicitudes de adición. Se realizaron solicitudes de prórroga del plazo de ejecución del contrato, se emitió el respectivo concepto técnico al respecto a la entidad. Se elaboraron los documentos de justificación de suspensión y reinicio. 5. Revisar la vigencia de las pólizas del contrato y cuando sea necesario ampliarlas en plazo, requerir en efecto al contratista antes del vencimiento, en un tiempo no menor de cinco (5) días hábiles, para que se adopten las medidas que se consideren pertinentes. 6. Asistir a todas las reuniones programadas que sean necesarias para lograr la debida ejecución de los trabajos y elaborar las respectivas actas a que haya lugar. 7. Exigir y controlar la permanencia den los frentes de obra, del residente de obra y demás profesionales del contratista. 8. Permanecer en la obra en horas nocturnas, festivos y domingos programados o en horas no laborales comúnmente, y se exigirá la presencia del residente del contratista, así como de todos los profesionales que se requieran en la ejecución de dichos trabajos. 9. Exigir al contratista el estricto cumplimiento de las normas de seguridad industrial con el fin de salvaguardar la integridad física de los operarios y de todas las personas que transitan por la zona de ejecución de la obra. 10. Realizar evaluaciones periódicas sobre el avance del proyecto, en relación con el cronograma, con el fin de prever incumplimientos parciales o definitivos del contrato. Efectuar los requerimientos a que haya lugar al contratista. 11. Elaborar el proyecto de liquidación del contrato y remitirlo a la entidad para su revisión y aprobación final, junto con la totalidad de los soportes. 12. Revisar y aprobar las hojas de vida y demás documentos de los profesionales que intervendrán en el contrato y/o cuando se requiera nuevo personal. 13. En los casos en que amerite, ordenar la suspensión temporal de la respectiva ejecución hasta tanto no se tomen las medidas correctivas del caso a satisfacción de la interventoría y/o del INDERHUILA, cuando el contratista utilice procedimientos inaceptables u operaciones que presenten riesgos para el personal, para los trabajos, para el contratista o para la entidad o terceros. 14. Exigir al contratista el cambio de procedimiento o equipos de construcción y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución de las obras. 15. Exigir verificadas e implementadas las medidas correctivas de las actividades incorrectamente ejecutadas, para que el contratista, a su costo, las realice correctamente sin derecho a remuneración adicional, las obras de acuerdo con las especificaciones, técnicas, planos de referencia y demás condiciones del contrato.

	16. Verificar que el contratista mantenga a tiempo durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos. Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el correcto desarrollo de los trabajos; todas las instrucciones que impartan al contratista serán por escrito y con copia al INDERHUILA.
c). Actividades Operativas.	ACTIVIDADES PRELIMINARES - Localización y replanteo: Se realiza toda la actividad, constatando la información actualizada existente en los planos de diseño. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. - Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante: Se realizó la demolición de cerramiento perimetral existente, una vez realizada la actividad se retiraron los escombros hasta el sitio de disposición. - Desmonte marcos canchas existentes: Se realiza el desmonte de dos marcos de canchas existentes. - Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada: Se realiza la excavación de la cimentación (zapatas y vigas de cimentación) de acuerdo a planos actualizados de diseño. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. - Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente: se realizó relleno para vigas zapatas de cimentación, constituido con materiales de recebo, se instaló y compacto por capaz horizontal no mayor a 15 cm de espesor. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. CIMENTACIÓN - Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts: Se ejecuta toda la actividad que incluye solado de vigas de cimentación. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. - Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI: Se realiza la fundición de todas las zapatas, teniendo en cuenta los planos estructurales y especificaciones técnicas. - Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas: Se ejecuta toda la actividad de instalación de acero, teniendo en cuenta los detalles presentados en los planos estructurales definitivos. - Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.: Se ejecuta toda la actividad de fundición de vigas de cimentación, teniendo en cuenta los planos estructurales y especificaciones técnicas. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. - Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación: Se ejecuta toda la actividad de acero para vigas de cimentación, teniendo en cuenta los detalles presentados en los planos estructurales definitivos. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. - Concreto ciclópeo - 2500 PSI (140 KG/CM2) 60% Concreto 2.000 PSI + 40% Piedra media zonga: Se ejecuta la totalidad de la actividad, teniendo en cuenta los detalles presentados en los planos estructurales definitivos, la cantidad se mantiene constante respecto a la contractual. - ESTRUCTURA EN CONCRETO - Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.: Se realiza la fundición de la totalidad de las columnas, teniendo en cuenta los detalles presentados en los planos estructurales definitivos. - Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas: Se ejecuta la totalidad el ítem de acuerdo a lo establecido en los planos de diseño. - Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización: Se ejecuta toda la actividad, teniendo en cuenta los detalles presentados en los planos estructurales definitivos. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. - Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal: Se realiza la instalación del refuerzo, teniendo en cuenta los detalles en los planos definitivos. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas.

	- Suministro e instalación de manto zetal viga canal: Se realizó la instalación de una membrana impermeabilizante multicapa fabricada con asfaltos no oxidados modificados con refuerzo central de fibra de vidrio y con acabado en foil de aluminio gofrado. CUBIERTA - Suministro, fabricación e instalación de respectiva cubierta autoportante, el material es a base de lámina de acero calibre 22, en acabado pinto poliéster estándar en color blanco, a un 20% de flecha con respecto a la luz, se realizó respecto a las dimensiones establecidas, pendientes y detalles incluidos en los planos estructurales y arquitectónicos ACABADOS – PLACA EN CONCRETO - Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto: Se realizó la correspondiente demarcación de la cancha multifuncional como lo especifica los planos de diseño. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. - Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.: Se ejecuta la totalidad, cumpliendo las dimensiones, secciones y detalles señalados en los planos estructurales, la cual no presentó variación respecto a las condiciones contractuales. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.: Se realiza la instalación de la totalidad de la tubería contemplada en este ítem, dichos colectores descargan en las cunetas existentes que son recibidos por dos cajas de inspección. - Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.: Se realiza la instalación de la tubería que recoge para las aguas lluvias que trae las cunetas. Se instala como está estipulado en el plano, manejando la pendiente establecida. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. - Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para desagües.: Se realiza la instalación de la tubería que recibe aguas desde las cajas de inspección para transpórtalas a su disposición final, se instala como está estipulado en el plano, manejando la pendiente establecida. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. - Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. según diseño.: Se ejecuta la totalidad del ítem, sin que se presenten variaciones en las condiciones contractuales. INSTALACIONES ELÉCTRICAS - Desmonte de Postes de iluminación; Incl. Retiro de luminarias, cableado y demolición de machón en concreto: Se realiza el desmonte de los postes existentes.: Se realiza el desmonte de 1 poste existente, y se realiza su respectiva reubicación, la cual se encontraba contratado en las condiciones contractuales. - Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor: Se realizó las cajas de inspección eléctricas, como lo muestra en los planos eléctricos. - Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada: Se realizó la correspondiente excavación para realizar las cajas de inspección y conectar la red principal de la conexión eléctrica. - Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2", para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts: Se realizó la instalación de ductos para la red subterránea principal. - Transición Aérea: Se realizó la instalación aérea en tubería IMC 11/2" Y 1", para dar cumplimiento al diseño eléctrico.

	- Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna: Se realizó la instalación de la caja de distribución con todos sus accesorios. - Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu: La red principal se instaló en los ductos, cumpliendo ubicación que brinda los planos eléctricos. - Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector: se Instalaron 12 brazos en tubo galvanizado, con las dimensiones especificadas en los diseños. - Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores: La instalación de la acometida se realizó en cable de cobre aislado No. 12 AWG, como se especifica en el diseño. - Suministro e instalación de reflector led de 150 w: Se realizó la instalación de 12 reflectores LED 150W CW 60", con todos los accesorios, para un buen funcionamiento, como lo exige las especificaciones técnicas. - Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v: se instaló 01 toma corriente a 120 v, y 01 toma corriente a 240v, con todos los elementos necesarios para dar funcionamiento a un punto eléctrico. TRANSPORTE - Transporte de materiales pétreos: Se realiza el transporte de materiales como gravilla, arena, de las actividades de concreto ejecutadas dentro del período (Solado, Zapatas, Vigas de Cimentación, muro en concreto ciclópeo, placa) ITEMS NO PREVISTOS - Cerramiento perimetral con polisombra: Se realizó la correspondiente instalación de polisombra con soportes en madera para dar estabilidad al cerramiento perimetral. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. - Rejilla prefabricada para cuentas concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo. (40cm * 50cm * 0,05m): Se realizó la correspondiente instalación de rejillas prefabricadas. Se ejecutaron todas las cantidades de acuerdo a las modificaciones efectuadas. - Construcción placa en concreto de 3000 PSI. Incluye formaleta, malla electrosoldada 5mm, corte y dilataciones: Se realiza la fundición de la placa de contrapiso con sus respectivas dilataciones, teniendo en cuenta los planos estructurales y especificaciones técnicas. - Suministro, transporte e instalación de Medidor bifásico: Se realiza la instalación del medidor bifásico con sus respectivos accesorios, teniendo en cuenta especificaciones técnicas y plano eléctrico. - ACOMETIDA AEREA EN CABLE CONCENTRICO 2"8+8 600V: La red principal se instaló teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y cumpliendo ubicación y diseño que brinda los planos eléctricos. - Demolición de cuneta en concreto existente, hasta, ANCHO= 0.20 mt. Incluye retiro de material sobrante: Se realizo demolición de cuenta existente, teniendo en cuenta, los planos estructurales y especificaciones técnicas. - MANTENIMIENTO DE MARCOS DE CANCHAS FUTBOL SALA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS INCLUYE TABLERO ACRÍLICO CAL 10MM, ARO PARA BALONCESTO, MALLAS PARA CANCHAS DE FUTBOL SALA: Se realizo la instalación de 02 tableros acrílicos con sus respectivos accesorios, además se realizó mantenimiento de marcos correspondientes a las dos canchas multifuncionales.
d). Actividades Logísticos.	1. Bitácora o libro de obra: llevar con el contratista una bitácora de obra, en donde se registrarán diariamente todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Exigir las firmas de las personas directamente implicadas en la ejecución de la obra. 2. Mediciones de obra: Efect5ura las mediciones de cada uno de los ítems ejecutados por el contratista de acuerdo con las unidades de medida estipuladas en las especificaciones técnicas y siguiendo planos de referencia. La interventoria revisará a fondo el formato diligenciado por el

	contratista en donde se registrará diariamente la ejecución de la obra. Aprobará las actividades ejecutadas y el contenido del formato elaborando actas de corte de obra. 3. Comité de obra: Programar una reunión de comité de Obra semanal con el contratista, el supervisor del contrato y demás personal que intervenga en la ejecución de los trabajos. Se llevarán actas de comité de los puntos tratados, los problemas que se hayan presentado y las soluciones adoptadas. 4. Inspección de obra: Evaluar e inspeccionar los trabajos ejecutados por el contratista con la programación presentada por el mismo. Controlar y vigilar la correcta construcción de cada una de las actividades que componen el contrato. 5. Suministros: Ejercer control permanente de los suministros de los diferentes materiales de construcción que se requieran para ejecutar las obras y exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Vigilar controlar y rechazar la totalidad o parte de los suministros y de la obra ejecutada por el contratista, que no cumpla con las especificaciones técnicas y los planos, o si en su construcción no se emplearon materiales o procedimientos adecuados. 6. Control de calidad de los materiales: Exigir al contratista el suministro de las muestras de los materiales a utilizar antes de iniciar las obras o en el transcurso de la ejecución de las mismas. Así mismo solicitar los ensayos y/o pruebas de calidad establecidas en las especificaciones técnicas y las necesarias y convenientes de acuerdo con el desarrollo de la obra. 7. Informes a presentar: Realizar los siguientes informes en donde se consignará el avance de la obra de acuerdo con la programación y ejecución del contrato, atrasos entiempo, costos, observaciones generales, cuadros comparativos, gráficos, fotografías, anexos, etc.1) Informe mensual; y 2) Informe final.
e). Obligaciones de Carácter Ambiental.	- El interventor velará por el cumplimiento de la normatividad ambiental legal vigente establecida para este tipo de obras, al igual que el acatamiento de las condiciones y estipulaciones generales y particulares estipuladas en el respectivo contrato. Entre otras, el interventor realizará los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o planes de manejo ambiental y de disposición de residuos sean implementados para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos de acuerdo con la normatividad aplicable y las directrices dicten las entidades competentes.
f). Actividades Financieras.	- Presentar un balance económico de ejecución del contrato, así como la concertación de cantidades para la liquidación final para efectos de la liquidación del contrato. - Efectuar el control de la administración y desarrollo financiero del contrato, velando porque se cumplan las condiciones de salubridad, seguridad industrial, vinculación del personal contratista a los sistemas generales de seguridad social y que se encuentre a paz y salvo con dichas entidades; así mismo que el contratista de obra se encuentre a pasa y salvo con los aportes parafiscales al SENA, ICBF y Cajas de Compensación, en los términos de Ley, si a ello hay lugar. - Efectuar un control detallado de inversión en el contrato. - Realizar mensualmente, en el respectivo informe un análisis del avance financiero de las obras, a fin de prever con la suficiente anticipación eventuales necesidades de modificaciones de reserva, de disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que INDERHUILA tome para asegurar el flujo de fondos del contrato. - En la ejecución de las actividades de la obra realizada por el contratista y relacionadas en las actas parciales de obra, Los pagos de la interventoría estarán dadas por las actas parciales de la interventoría y serán realizados de acuerdo con los porcentajes de ejecución de obra. - Se entrega el aval de las cantidades finales dadas en el balance de mayores y menores cantidades e ítem no previsto con su respectiva acta de justificación a la entidad contratante Inderhuila el 17 de julio del 2024 para la revisión y aprobación de adicionales.

g). Actividades Jurídicos	- Constatar de manera permanentes el estado de las pólizas y garantía constituidas por el contratista, en virtud de las estipulaciones contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el contrato de obra, sus anexos y modificaciones, prórroga y adiciones y exigir el cumplimiento de sus obligaciones al respecto. - En general asesorar, apoyar y mantener informado al INDERHUILA, en todos los asuntos jurídicos que se susciten en desarrollo de las obras objeto del Contrato, para resolver las peticiones y reclamos jurídicos del contratista, respecto a la ejecución de las obras objeto de esta interventoría, dándoles respuesta, en primera instancia, para luego someterlas a aprobación del INDERHUILA que hará el seguimiento al contrato de interventoría. - En caso e en un eventual incumplimiento por parte del contratista de la obra el interventor deberá apoyar jurídicamente el proceso investigativo y sancionatorio que la administración adelante en contra de este. - Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyude el personal o los subcontratistas contra EL INDERHUILA, por causa o con ocasión del contrato.

DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE OBRA – CONSORCIO

	OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE 27 DE DICEIMBRE DE 2023, Y DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE NOVIEMBRE 2024.
1	Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al treinta por ciento (30%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
2	Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad, la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional: víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros definidos así por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
3	Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
4	Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
5	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.

6	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024. No existieron reclamaciones que afectaran directa o indirectamente el objeto el contrato.
7	Abstenerse de utilizar elementos y productos que contengan la fibra asbesto y/o sus derivados. El Contratista promoverá el uso de materias primas que no atenten contra la salud pública de conformidad con la Ley Aplicable	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
8	Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
9	Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024
10	Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
11	Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
12	Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el Contrato.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, no existieron situaciones que implicara la modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer op celebrar el contrato.
13	Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del Contrato.	El Consorcio INDER A&S no ha presentado circunstancias que puedan afectar la ejecución del contrato entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
14	Durante la ejecución del Contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
15	Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, no se generaron cambios de representante legal u accionistas del Consorcio INDER A&SW
16	Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, las tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
17	Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.	El Consorcio INDER A&S no ha presentado investigaciones penales, imposición de medidas de aseguramiento o condenas en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.

18	Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento de la notificación del auto de iniciación de procesos concursales, de reorganización o liquidación del Contratista [o de alguno de sus integrantes en caso de Proponentes Plurales].	El Consorcio INDER A&S no ha presentado inicio de procesos concursales, de reorganización o liquidación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
19	El Contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto elaborado conforme con las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los diez (10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
20	Conocer el diseño entregado por la Entidad, analizarlo exhaustivamente y ejecutar la obra conforme al mismo. A tales efectos, el Contratista declara que el diseño entregado es idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la Entidad	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
21	Cumplir los criterios sostenibles que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en el numeral 7 del Anexo 1 – Anexo técnico.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
22	El Contratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.4.1 del documento base. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se encuentren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.	Durante el periodo entre el entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, el Consorcio INDER A&S no aplicó para la adquisición de bienes nacionales relevantes.
23	Informar al interventor o al supervisor del contrato, según corresponda, la fecha de adquisición de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, el Consorcio INDER A&S no aplicó para la adquisición de bienes nacionales relevantes.
24	Incorporar como mínimo el cuarenta (40%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano para el cumplimiento de contrato.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.

		OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE 27 DE DICEIMBRE DE 2023, Y DEL 20 DE JUNIO AL 13 DE NOVIEMBRE 2024
1	GENERAL	Cumplir el objeto del contrato, ejecutar y entregar las obras contratados en el plazo estipulado, conforme a los criterios de calidad exigibles, los diseños, los planos y las especificaciones de construcción.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
2	GENERAL	Adoptar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para evitar poner en peligro a las personas, a las cosas o al medio ambiente, durante la ejecución de la obra.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
3	GENERAL	Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 – adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, la afiliación y el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del servicio nacional de aprendizaje - SENA, instituto colombiano de bienestar general - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra.	El CONSORCIO INDER A&S cumplió con la obligación en el período entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
4	GENERAL	Velar por que EL INDERHUILA se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.

5	GENERAL	Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad de acuerdo con la Ley 80 de 1993.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, El Consorcio INDER A&S no le fueron imputados cargos que generaran daño o perjuicio a la entidad INDERHUILA
6	GENERAL	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024
7	GENERAL	Asumir el pago de los tributos y los demás gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, no se generaron pagos de tributos ni gastos adicionales que se causasen por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.
8	GENERAL	Incluir en sus costos indirectos el costo de la valla de obra de acuerdo a los parámetros establecidos por INDERHUILA	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024
9	GENERAL	Previo a la suscripción del acta de inicio y al otorgamiento del anticipo, presentar a la Interventoría y Supervisión, el análisis de precios unitarios y el desglose del AIU, suscrito y debidamente firmado por el Representante Legal.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, el Consorcio INDER A&S solicitó la renuncia al anticipo, la cual fue debidamente aprobada y avalada por la presente interventoría; además, posterior a la suscripción del acta de inicio, se avalaron los documentos correspondientes al análisis de precios unitarios y el desglose de AIU.
10	GENERAL	El contratista deberá desarrollar teniendo en cuenta los lineamientos técnicos expuestos en el procedimiento contractual de obra pública y las normas técnicas que la regulan as: "Reglamente Técnico de Instalaciones Eléctricas" - RETIE; norma NSR 2010 "Reglamento Colombiano de Construcciones Sismorresistentes"; Normatividad de protección contra caídas en Trabajo en Alturas - Resolución No 1178 de 2017; NTC 1700 Higiene y seguridad "Medidas de Seguridad en Edificaciones - Medios de evacuación"; Reglamento Técnico para el sector de agua potable y Saneamiento Básico - RAS	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, ejecutando la obra conforme al procedimiento contractual de obra públicas y las normas técnicas que la regulan como: la NSR-10
11	GENERAL	Constituir una fiducia o un patrimonio autónomo dentro de los diez (10) diez días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, requisito indispensable para el desembolso de los recursos que constituyen el Anticipo.	El CONSORCIO INDER A&S solicitó la renuncia al anticipo y fue debidamente revisado y avalado por la interventoría
1	PERSONAL	Suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y especifica exigida por el INDEHUILA. En todo caso, El contratista deberá garantizar el tiempo de dedicación de los profesionales o técnicos requeridos para cumplir con el objeto contractual.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
2	PERSONAL	Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.

3	PERSONAL	Vincular a la ejecución de la obra, como mínimo en un 100% del personal no calificado a personas de la región.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
4	PERSONAL	Mantener permanentemente al frente de las obras al director de obra propuesto para decidir, con el Interventor, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del proyecto	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024
5	PERSONAL	Presentar las hojas de vida del personal solicitado en los estudios previos y documento base para la aprobación de la interventoría previo a la suscripción del acta de inicio del contrato. De presentarse cambios en el personal durante la ejecución del contrato estos deberán contar con las justificaciones correspondientes y estar acompañadas con los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, condiciones que serán avaladas y aprobadas por parte de la interventoría	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
6	PERSONAL	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra y garantizar que la celebración de los subcontratos necesarios no dará lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el Inderhuila	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024
7	PERSONAL	Cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social Integral, así como los propios al servicio nacional de aprendizaje - SENA, instituto colombiano de bienestar general - ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
8	PERSONAL	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyude el personal o los subcontratistas contra el Inderhuila, por causa o con ocasión del contrato.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, no se presentaron reclamaciones de tipo judicial o extrajudicial del personal o los subcontratistas en contra del Inderhuila.
9	PERSONAL	Afiliar a todo el personal directo al nivel de riesgo que corresponda (I, II, III, VI, V) según su ocupación en la obra y verificar la afiliación y el nivel de riesgo de todos los subcontratistas que se requieran durante la ejecución de la obra.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
1	ADECUACION DEL LUGAR DE OBRA	Obtener la prestación de los servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra y mantener su provisión durante el tiempo necesario	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024
2	ADECUACION DEL LUGAR DE OBRA	Responder por el pago de los servicios públicos producto del consumo necesario para la ejecución del objeto del contrato., así como por las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024
3	ADECUACION DEL LUGAR DE OBRA	Ubicar la señalización preventiva necesaria para la segura circulación de los personales de obra, vecinos y terceros.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024

1	EQUIPO, HERR, MAQ Y MAT DE CONST	Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
2	EQUIPO, HERR, MAQ Y MAT DE CONST	Suministrar todos los equipos, maquinarias, herramienta, materiales e insumos en las fechas indicadas en la programación detallada del proyecto, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con él envió y recepción de los mismos en el sitio de la obra.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
3	EQUIPO, HERR, MAQ Y MAT DE CONST	Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
1	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Entregar a satisfacción y en funcionamiento y de acuerdo a las especificaciones técnicas de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada la obra objeto del contrato.	El CONSORCIO INDER A&S entregó a satisfacción y en funcionamiento la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas de conformidad con los estudios previos, el pliego de condiciones y la propuesta presentada. La cual fue debidamente recibida, avalada y cuantificada por la presente interventoría el día 13 de noviembre de 2024 con la suscripción del acta de recibo final de obra.
2	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Poner en práctica procedimientos adecuados de construcción y protección de la obra contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad o acabados. Así mismo deberá tener las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales y subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras o instalaciones.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024
3	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Aceptar las ordenes impartidas por el interventor, relacionada con el cambio de procedimientos o equipos de construcción y la imposición de medidas que este considere necesarias para garantizar la buena calidad y correcta ejecución de las obras.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024
4	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Cumplir con todas las normas vigentes en cuanto manejo ambiental se refiere, como lo es el manejo de escombros de acuerdo a normatividad de la autoridad ambiental respectiva, señalización de seguridad para el área de influencia de la obra y planes de manejo tráfico requeridos por la secretaria de movilidad correspondiente.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024
5	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Cumplir con la normatividad vigente a nivel nacional y departamental y municipal para la movilización de maquinaria y equipo pesado impuesta en este tipo de obras por la entidad competente	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024
6	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Garantizar que sus subcontratistas y proveedores de materiales y servicios cuentan con todas las licencias y permisos exigidos según la normatividad vigente.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024

7	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Realizar semanalmente el costo financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobrepase el presupuesto pactado por parte y total del contrato	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024
8	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y/o documentos necesarios para el desarrollo del contrato proyectado por la interventoría	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024
9	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del interventor, el Inderhuila o la comunidad, se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024
10	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Suministrar muestras de materiales a utilizar para realizar los análisis de laboratorio antes de iniciar las obras y en el transcurso de ejecución de las mismas	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024
11	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Adelantar todas las gestiones necesarias ante las autoridades respectivas para la obtención de los permisos requeridos en la ejecución de obra, diferentes a los previamente obtenidos por el Inderhuila, tales como: cruce de vías, cierre temporal de vías, accesos a cada área, ingresos de personal, horarios de trabajo, excavaciones o cualquier intervención del espacio público, entre otros.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024, el Consorcio INDER A&S no requirió de permisos para la ejecución de la obra.
12	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024
13	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Mantener tanto el personal de vigilancia como las medidas de seguridad en las áreas de intervención donde se ejecute las obras	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024
14	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Reparar las vías de acceso en los lugares de obra concernientes al presente contrato de obra, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024
15	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Efectuar las reparaciones necesarias a las áreas intervenidas como consecuencias de los defectos de estabilidad, y a las áreas contiguas que presenten deterioro, incluso dentro del término de garantía de estabilidad de la obra.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024, no se generaron daños en las áreas aledañas de la ejecución de la obra, por lo tanto, no se efectuaron reparaciones.
16	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Demoler y reemplazar por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o el Inderhuila, toda obra ejecutada que resulte defectuosa según el análisis de calidad o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa de insumos o de la mano de obra	Durante el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024, el Consorcio INDER A&S no tuvo la necesidad de demoler y/o reemplazar obras ejecutadas, ya que estas dieron cumplimiento con las normas de calidad requeridas para la ejecución de la misma.
17	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial en relación con los elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra; manipulación de equipos herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual y, dotación de calzado y vestido de labor y documento de	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024

		identificación para todo el personal utilizado en la ejecución del objeto contractual	
18	EJECUCIÓN DE LA OBRA	El contratista deberá acogerse a los lineamientos establecidos en el plan de implantación, insumo fundamentas para la funcionalidad y manejo del espacio público y en general del proyecto con su entorno.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024
19	EJECUCIÓN DE LA OBRA	Una vez la obra se encuentre ejecutada, el contratista deberá gestionar todas las actividades conducentes a la obtención del RETIE, garantizando su estado y funcionalidad	De acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE resolución 90708 del 30 de agosto de 2013, Artículo 34.4.1 Construcciones Nuevas en el literal: e. Instalaciones comerciales de capacidad instalable igual o superior a 10 kVA
20	EJECUCIÓN DE LA OBRA	El contratista garantizará los estudios y gestionará las actividades conducentes a la obtención del RETILAD, los estudios que se planteen se harán de acuerdo a las lámparas y/o suministros relacionados en la propuesta de los diseños; para su respectiva modificación deberá contar con el aval de Inderhuila, del profesional del diseño y de los profesionales competentes en la materia.	De acuerdo al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas- RETIE resolución 90708 del 30 de agosto de 2013, Artículo 34.4.1 Construcciones Nuevas en el literal: e. Instalaciones comerciales de capacidad instalable igual o superior a 10 kVA
1	AMBIENTAL	Es responsabilidad de los promotores del proyecto, pero también de los particulares que lo ejecutan contribuir al desarrollo sostenible, por lo tanto, reconocen que un adecuado dimensionamiento de los componentes ambientales y sociales, contribuyen a mejorar la calidad de las obras y al cumplimiento y metas nacionales con este propósito	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
2	AMBIENTAL	El objeto del proyecto analizado se llevará a cabo con las tecnologías a nivel nacional para la construcción de obras, deberá ceñirse a las especificaciones que para el caso amerita.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
3	AMBIENTAL	Si en el desarrollo de las actividades propias de los procesos constructivos se requiere el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, se debe solicitar permiso, concesiones, autorizaciones licencias a que haya lugar, acorde con la normatividad vigente, ante las autoridades competentes.	El CONSORCIO INDER A&S, durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, no tuvo la necesidad de hacer uso y aprovechamiento de recursos naturales del sector.
4	AMBIENTAL	Es obligación del interventor realizar el control y seguimiento a la obra, la normatividad aplicable y las obligaciones derivadas de la obtención de permisos, la ejecución de medidas de compensación, programas y obras, debe ser simultaneas a la ejecución de las obras del contrato.	El Consorcio INDER A&S no requirió de permisos adicionales para la ejecución del contrato durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
5	AMBIENTAL	La entidad se obliga a exigir el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras, bajo criterio de respeto al entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.


6	AMBIENTAL	Es su responsabilidad exigir el estricto cumplimiento de los aspectos ambientales que debe corresponder al objeto y alcance de la obra y se convierte en el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte de la interventoría.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre de 2023 y el 13 de noviembre de 2024
7	AMBIENTAL	La ejecución del proyecto se obliga a utilizar procesos, practicas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar reducir o controlar, la generación emisión o descargas de cualquier tipo de contaminante o residuo con el fin de reducir impactos ambientales adversos.	El CONSORCIO INDER A&S cumplió con la obligación en el período entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, sin generar un impacto ambiental adverso por emisiones o descargas de tipo contaminante o residuos
8	AMBIENTAL	Cuando se pretenda trabajar en horarios adicionales se deberá tramitar permiso para operación de equipos de construcción, demolición, y reparación de vías generadores de ruido ambiental- Si se requiere la instalación de vallas publicitarias adicionales a las reglamentarias se deberá tramitar el permiso para la instalación de publicidad visual exterior	El CONSORCIO INDER A&S, durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, no realizó trabajo en horarios adicionales ni tampoco la instalación de vallas publicitarias adicionales, por lo tanto, no se requirió la expedición de estos permisos.
9	AMBIENTAL	Se requiere que el ejecutor del proyecto tenga en cuenta los lineamientos de la autoridad ambiental competente en el manejo de recurso arbóreo, en la descripción de las técnicas a emplear para la reforestación y/o vegetación de la zona intervenida, indicando las especies a utilizar, método y características de siembre, tamaño de las plantas	El Consorcio INDER A&S no requirió implementar técnicas para la reforestación y/o vegetación de la zona intervenida durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
10	AMBIENTAL	El manejo ambiental de la obra, incluye la articulación especial y temporal de las medidas de manejo de cada uno de los impactos a ser generados por el desarrollo de la misma, así como los costos de ejecución y un cronograma de actividades articulado con el de ejecución general de obra. El manejo ambiental debe consultarse con los grupos de interés y la comunidad involucrada a fin de precisar las medias y demás acciones o proyectos inherentes.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
11	AMBIENTAL	las directrices del manejo ambiental de la obra tendientes a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos ambientales, deben considerar los siguientes aspectos: Gestión Social; Manejo de las excavaciones y control de la sedimentación, manejo de residuos sólidos, materiales de obra y sobrantes de construcción, volumen, transporte, almacenamiento y disposición final, Protección de ecosistemas, aprovechamiento forestal; Control de vertimientos	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
12	AMBIENTAL	La entidad exigirá la colocación de la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna, y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación del Plan de Manejo de transito	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
1	INFORMACIO N	Absolver las observaciones y requerimientos realizados por el supervisor delegado por el INDERHUILA, las que realicen los órganos de control y las autoridades locales.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, no se efectuaron requerimientos por los órganos de control y/o las autoridades locales.
2	INFORMACIO N	Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría, el avance de cada uno de los frentes de trabajo, de cada una de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutada, registros fotográficos, resultados de los ensayos de material y	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.

		demás pruebas realizadas, fotocopia de la bitácora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el período relación de personal empleado en la ejecución de la obra, informe de seguridad industrial, informe de manejo ambiental, informe de manejo de inversión del anticipo con los respectivos soportes, actualización del programa de ejecución de obra, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social	Según el certificado emitido por la presente interventoría en el cual se manifiesta que: En calidad de Interventor del contrato de la referencia, me permito manifestar que durante la ejecución de las actividades de CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA, no se realizaron actividades que generaran impactos ambientales de carácter significativo. Por lo anterior, y conforme a la naturaleza de los trabajos realizados, no se requería la implementación de un Plan de Manejo Ambiental (PMA), ya que las labores no implicaron afectaciones directas a los componentes bióticos, abióticos ni sociales que ameritaran la adopción de dicho instrumento. Cabe resaltar que, en todo momento, se dio cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable y se adoptaron las medidas básicas de prevención, control y manejo de residuos propias de la actividad, garantizando el desarrollo responsable de las obras.
3	INFORMACION	Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría que contenga un resumen de actividades y desarrollo de la obra junto con la documentación técnica.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la entrega del informe final y fue debidamente aprobado por la presente interventoría.
4	INFORMACION	Llevar una bitácora de obra en el que se registren todos los acontecimientos ocurridos y decisiones adoptadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la vista de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc. de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra, Este registro debe encontrarse debidamente foliado y firmado por el director de obra, el residente y el director de interventoría, al cual tendrán acceso cuando así lo requieran los delegados del INDERHUILA.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
5	INFORMACION	Elaborar y presentar conjuntamente con el Interventor, las actas de entrega mensual de obra, de entrega final de obra y de liquidación	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
6	INFORMACION	Dar respuesta a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del interventor, el Inderhuila o la comunidad, se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de los mismos.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.
7	INFORMACION	Presentar para aprobación por parte del Interventor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato y previo a la suscripción del acta de inicio, los documentos relacionados con el AIU, fiducia o patrimonio autónomo para la correcta inversión o manejo del anticipo, plan de inversión del anticipo y Cronograma de trabajo.	Durante el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024, el Consorcio INDER A&S solicitó la renuncia al anticipo, la cual fue debidamente aprobada y avalada por la presente interventoría; además, posterior a la suscripción del acta de inicio, se avalaron los

			documentos correspondientes al análisis de precios unitarios y el desglose de AIU.
8	INFORMACION	Asumir el pago de los tributos y los demás gastos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato.	El Consorcio INDER A&S cumplió con la obligación en el periodo entre el 23 de noviembre al 27 de diciembre del 2023 y del 20 de junio al 13 de noviembre de 2024.


8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Durante el período comprendido entre el 23 al 30 de noviembre, se presentaron constantes lluvias.

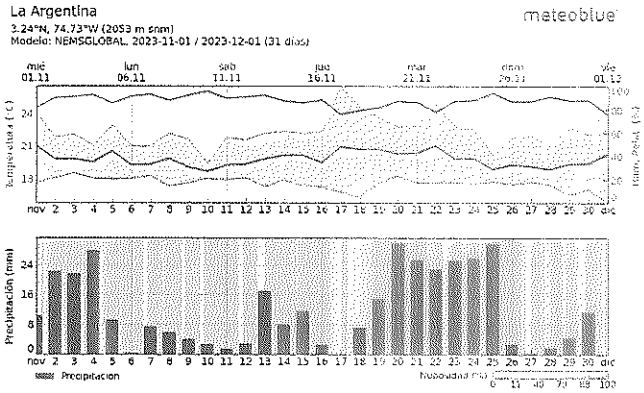


Noviembre 2023

Durante el período comprendido entre el 01 al 27 de diciembre de 2023, se presentaron días de lluvia considerables, que ocasionaron retrasos y demoras en la ejecución normal de las actividades programadas. En el caso de la excavación, se presentaron derrumbes, que fue necesario retirar, lo que generó demoras en dicha actividad.

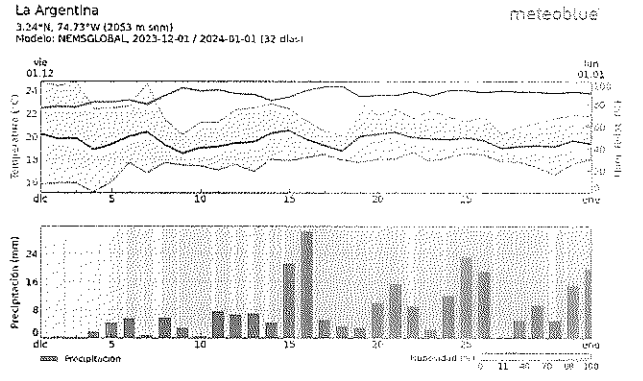


Diciembre 2023

Durante el período comprendido entre el 20 de junio y el 30 de junio, se presentaron algunos días de lluvia, con mayores y menores intensidades, los cuales fueron registrados en la bitácora, que generaron retrasos en la ejecución de algunas actividades, correspondientes a excavaciones y rellenos con recebo seleccionado.

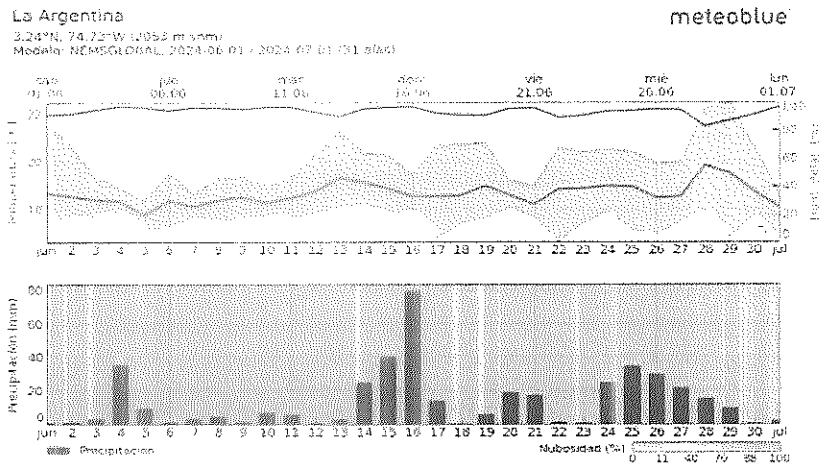


Junio 2024

Durante el mes de Julio se presentaron lluvias de diferentes intensidades, que generaron retrasos en la fundición de las estructuras de concreto incluidas en el período.

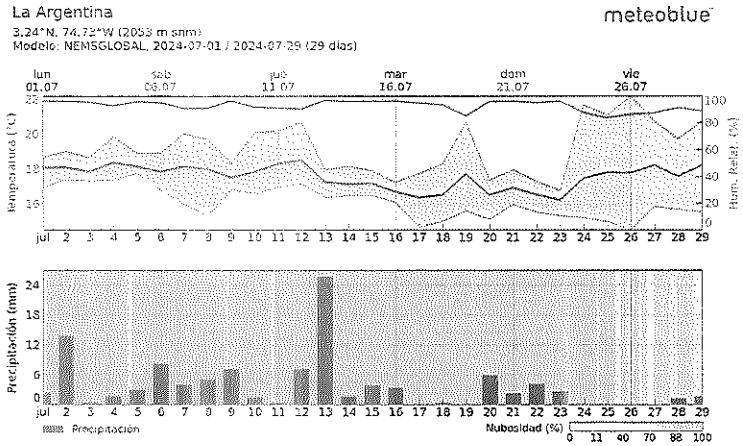


Julio 2024

Durante los días de ejecución del mes de agosto se presentaron lluvias de diferentes intensidades, que generaron algunas dificultades en la ejecución de las actividades del período.

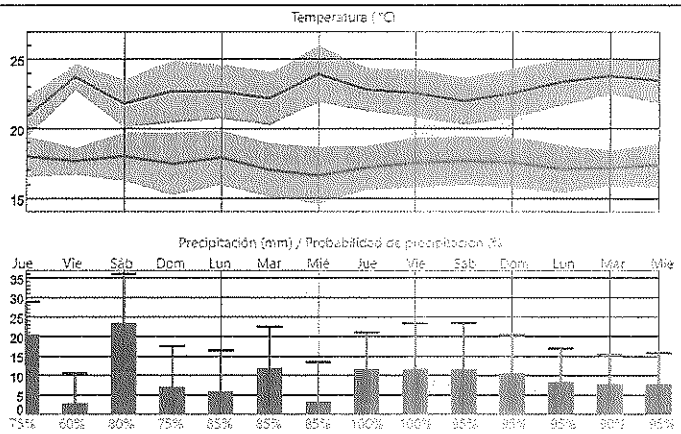


Agosto 2024

Durante los días de ejecución del mes de agosto se presentaron lluvias de diferentes intensidades, que generaron algunas dificultades en la ejecución de las actividades del período.

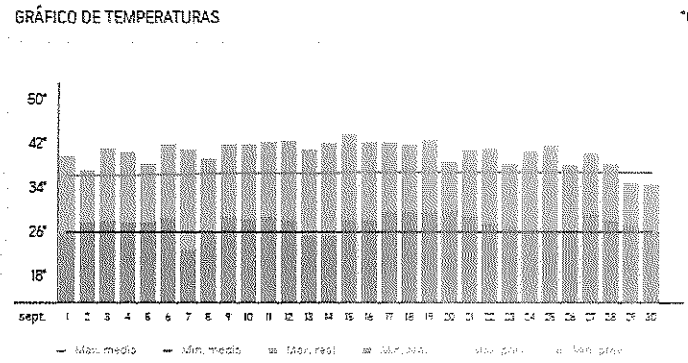


Septiembre 2024

Durante los días de ejecución del mes de septiembre que fueron desde el día 01 hasta el 13 de septiembre, se presentaron lluvias leves, no generaron dificultades en la ejecución de las actividades del período.

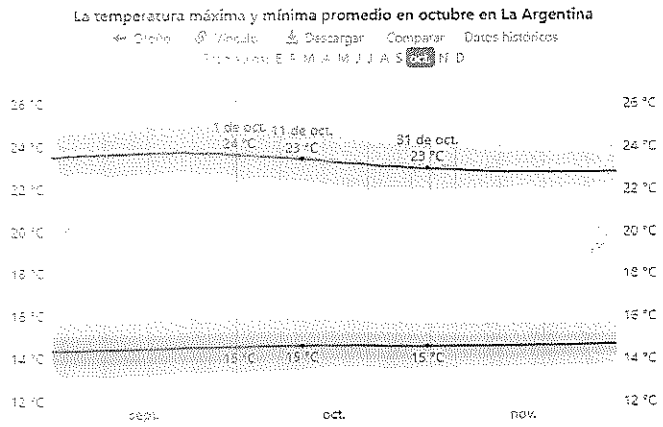

Octubre 2024

Durante los días de ejecución del mes de septiembre que fueron desde el día 24 hasta el 31 de octubre, se presentaron lluvias leves, no generaron dificultades en la ejecución de las actividades del período.

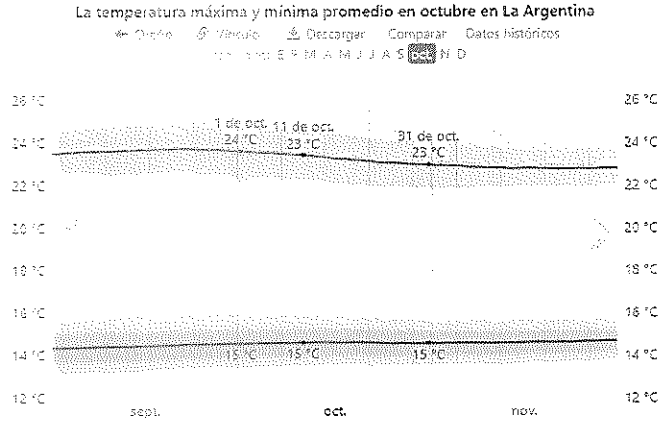

Noviembre 2024

Durante los días de ejecución del mes de septiembre que fueron desde el día 01 hasta el 13 de noviembre, se presentaron lluvias leves, no generaron dificultades en la ejecución de las actividades del período.

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	3.000 PSI	1: 1.6: 3.3
Diseños de mezcla para base.	*N.A.*	N.A.
Compresión simple al concreto.	3.000 PSI	1: 1.6: 3.3

Ensayo de compactación de campo	*N.A.*	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
ZAPATAS EJE A	05/07/2024	12/07/2024	X			3000 PSI	2180	CUMPLE
		02/08/2024			X	3000 PSI	3270	CUMPLE
VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE B	13/07/2024	20/07/2024	X			3000 PSI	2150	CUMPLE
		10/08/2024			X	3000 PSI	3261	CUMPLE
PEDESTALES EJE A	09/07/2024	16/07/2024	X			3000 PSI	2240	CUMPLE
		06/08/2024			X	3000 PSI	3230	CUMPLE
COLUMNAS EJE B	30/07/2024	06/08/2024	X			3000 PSI	2765	CUMPLE
		27/08/2024			X	3000 PSI	3453	CUMPLE
VIGA CANAL EJE B	02/08/2024	05/08/2024	X			3000 PSI	2268	CUMPLE
		30/08/2024			X	3000 PSI	3316	CUMPLE

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
ZAPATAS EJE B	02/07/2024	09/07/2024	X			3000 PSI	75.12%	CUMPLE
	02/07/2024	16/07/2024		X		3000 PSI	101.01	CUMPLE
	02/07/2024	30/07/2024			X	3000 PSI	112.59%	CUMPLE
ZAPATAS EJE A	05/07/2024	12/07/2024	X			3000 PSI	72.17%	CUMPLE
	05/07/2024	19/07/2024		X		3000 PSI	95.23%	CUMPLE
	05/07/2024	02/08/2024			X	3000 PSI	108.38%	CUMPLE
PEDESTALES EJE B	06/07/2024	13/07/2024	X			3000 PSI	78.69%	CUMPLE
	06/07/2024	20/07/2024		X		3000 PSI	80,08%	CUMPLE
	06/07/2024	03/08/2024			X	3000 PSI	107.02%	CUMPLE
PEDESTALES EJE A	09/07/2024	16/07/2024	X			3000 PSI	73.98%	CUMPLE
	09/07/2024	23/07/2024		X		3000 PSI	96.69%	CUMPLE
	09/07/2024	06/08/2024			X	3000 PSI	106.73%	CUMPLE
VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE B	13/07/2024	20/07/2024	X			3000 PSI	71.46%	CUMPLE
	13/07/2024	27/07/2024		X		3000 PSI	92.83%	CUMPLE
	13/07/2024	10/08/2024			X	3000 PSI	108.36%	CUMPLE
VIGAS DE CIMENTACIÓN EJE A	16/07/2024	23/07/2024	X			3000 PSI	72.17%	CUMPLE
	16/07/2024	30/07/2024		X		3000 PSI	93.19%	CUMPLE
	16/07/2024	13/08/2024			X	3000 PSI	105.64%	CUMPLE

COLUMNAS EJE A	18/07/2024	25/07/2024	X			3000 PSI	72.16%	CUMPLE
	18/07/2024	01/08/2024		X		3000 PSI	95.25%	CUMPLE
	18/07/2024	15/08/2024			X	3000 PSI	103.04%	CUMPLE
COLUMNAS EJE A	20/07/2024	27/07/2024	X			3000 PSI	77.06%	CUMPLE
	20/07/2024	03/08/2024		X		3000 PSI	93.74%	CUMPLE
	20/07/2024	17/08/2024			X	3000 PSI	114.28%	CUMPLE
COLUMNAS EJE B	30/07/2024	06/08/2024	X			3000 PSI	92.74%	CUMPLE
	30/07/2024	13/08/2024		X		3000 PSI	109.09%	CUMPLE
	30/07/2024	27/08/2024			X	3000 PSI	116.10%	CUMPLE
VIGA CANAL EJE B	02/08/2024	05/08/2024	X			3000 PSI	75.73%	CUMPLE
	02/08/2024	09/08/2024		X		3000 PSI	82.92%	CUMPLE
	02/08/2024	30/08/2024				3000 PSI	110.78%	CUMPLE
VIGA CANAL EJE A	18/08/2024	21/08/2024	X			3000 PSI	66.71%	CUMPLE
	18/08/2024	25/08/2024		X		3000 PSI	98.33%	CUMPLE
	18/08/2024	15/09/2024			X	3000 PSI	108.30%	CUMPLE

10. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (%)	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor del contrato	01/11/2023	$ 488.701.732		
Adicional	24/10/2024	$ 74.813.020		
Acta Parcial No. 1	N/A	N/A	N/A	N/A
Acta final de obra.	13/11/2024	$ 563.514.752.00	N/A	$ 563.514.752.00
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 488,701,732	$ 74.813.020	$ 563.514.752.	$ 563.514.752	$ 00

11. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
Noviembre 2023			

JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	REPRESENTANTE LEGAL	TERMINO FIJO
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JUAN CARLOS ANGARITA	7.695.985	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ	1075312759	SECRETARIO	TERMINO FIJO
Diciembre 2023			
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	REPRESENTANTE LEGAL	TERMINO FIJO
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JUAN CARLOS ANGARITA	7.695.985	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ	1075312759	SECRETARIO	TERMINO FIJO
Mayo 2024			
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	REPRESENTANTE LEGAL	TERMINO FIJO
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JUAN CARLOS ANGARITA	7.695.985	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ	1075312759	SECRETARIO	TERMINO FIJO
Junio 2024			
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	REPRESENTANTE LEGAL	TERMINO FIJO
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JUAN CARLOS ANGARITA	7.695.985	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ	1075312759	SECRETARIO	TERMINO FIJO
GABRIEL GUZMAN GOMEZ	12123525	TOPOGRAFO	TERMINO FIJO
CENON RICARDO CASTAÑO ORTIZ	7710775	CADENERO	TERMINO FIJO
Julio 2024			
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	REPRESENTANTE LEGAL	TERMINO FIJO
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JUAN CARLOS ANGARITA	7.695.985	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ	1075312759	SECRETARIO	TERMINO FIJO
Agosto 2024			
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	REPRESENTANTE LEGAL	TERMINO FIJO
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JUAN CARLOS ANGARITA	7.695.985	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JULIAN ALBERTO SUAZA CORTES	1075309108	SECRETARIO	TERMINO FIJO
Septiembre 2024			
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	REPRESENTANTE LEGAL	TERMINO FIJO
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JUAN CARLOS ANGARITA	7.695.985	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JULIAN ALBERTO SUAZA CORTES	1075309108	SECRETARIO	TERMINO FIJO
Octubre 2024			
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	REPRESENTANTE LEGAL	TERMINO FIJO
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JUAN CARLOS ANGARITA	7.695.985	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JULIAN ALBERTO SUAZA CORTES	1075309108	SECRETARIO	TERMINO FIJO
Noviembre 2024			
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	REPRESENTANTE LEGAL	TERMINO FIJO
JAVIER BARRERO MOSSOS	7.685.694	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JUAN CARLOS ANGARITA	7.695.985	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	TERMINO FIJO
JULIAN ALBERTO SUAZA CORTES	1075309108	SECRETARIO	TERMINO FIJO

12. RELACIÓN DE PAGOS OBRA

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	N.A	N.A
ACTA PARCIAL DE OBRA No.1	N.A	N.A

13. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO
Noviembre 2023							

JAVIER BARRERO MOSSOS	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	28404079	12/12/2023
JUAN CARLOS ANGARITA	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$	28004527	12/12/2023
MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ	$320.000	$80.000	$10.500	$80.000	$	28004527	12/12/2023
Diciembre 2023							
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JAVIER BARRERO MOSSOS	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	28766644	19/01/2024
JUAN CARLOS ANGARITA	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$	28818588	19/01/2024
MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ	$320.000	$80.000	$10.500	$80.000	$	28818588	19/01/2024
Mayo 2024							
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JAVIER BARRERO MOSSOS	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	30128247	31/07/2024
JUAN CARLOS ANGARITA	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$	30202546	31/07/2024
MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ	$320.000	$80.000	$10.500	$80.000	$	30202546	31/07/2024
JUNIO 2024							
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JAVIER BARRERO MOSSOS	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	30559993	31/07/2024
JUAN CARLOS ANGARITA	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$	30559926	31/07/2024
JULIAN ALBERTO SUAZA CORTES	$320.000	$80.000	$10.500	$80.000	$	30559926	31/07/2024
MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ	$320.000	$80.000	$10.500	$80.000	$	30559926	31/07/2024
GABRIEL GUZMAN GOMEZ	$368.000	$92.000	$160.100	$92.000	$	30559926	31/07/2024
CENON RICARDO CASTAÑO ORTIZ	$361.600	$90.400	$11.800	$90.400	$	30559926	31/07/2024
Julio 2024							
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JAVIER BARRERO MOSSOS	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	30629336	10/10/2024
JUAN CARLOS ANGARITA	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$	31090103	08/11/2024
MARIA CAMILA LOZADA RAMIREZ	$320.000	$80.000	$10.500	$80.000	$	30671253	16/08/2024
Agosto 2024							
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JAVIER BARRERO MOSSOS	$960.000	$240.000	$417.600	$240.000	$	30819847	10/10/2024
JUAN CARLOS ANGARITA	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$	31292876	08/11/2024
JULIAN ALBERTO SUAZA CORTES	$320.000	$80.000	$10.500	$80.000	$	30826808	10/09/2024
Septiembre 2024							
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JAVIER BARRERO MOSSOS	$2.240.000	$560.000	$974.400	$560.000	$	34830765	10/10/2024
JUAN CARLOS ANGARITA	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$	31402413	08/11/2024
JULIAN ALBERTO SUAZA CORTES	$213.400	$53.400	$0.00	$0.00	$	31111757	10/10/2024
Octubre 2024							
PERSONAL	**PENSIÓN**	**SALUD**	**ARL**	**CCF**	**PARAFISCALES**	**No. PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
JAVIER BARRERO MOSSOS	$ 1.920.000	$480.000	$ 835.200	$480.000	$	31787285	10/10/2024
JUAN CARLOS ANGARITA	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$	31405514	08/11/2024

JULIAN ALBERTO SUAZA CORTES	$320.000	$80.000	$0.00	$0.00	$	31405514	08/11/2024

Noviembre 2024

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	No. PLANILLA	FECHA DE PAGO
JAVIER BARRERO MOSSOS	$ 2.352.000	$1.837.500	$ 1.023.200	$588.000	$735.000	31787543	27/12/2024
JUAN CARLOS ANGARITA	$560.000	$140.000	$243.600	$140.000	$	31811987	19/12/2024
JULIAN ALBERTO SUAZA CORTES	$320.000	$80.000	$10.500	$80.000	$	31811987	19/12/2024

14. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	0	07/11/2023	Cumplimiento del contrato	01/11/2023	01/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/11/2023	01/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	01/02/2024	01/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	0	07/11/2023	01/11/2023	01/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	1 y 2	01/01/ 2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	1 y 2	01/01/2024	09/11/2023	09/02/2024

Poliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	3	01/01/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	3	01/01/2024	09/11/2023	09/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	4	05/07/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	10/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	13/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	4	05/07/204	09/11/2023	12/07/2024

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1 (OTRO SÍ No. 2)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	5	19/07/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	20/04/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	23/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	5	19/07/2024	09/11/2023	22/10/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE

			(dd/mm/aaaa)		(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	6	30/08//2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	30/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	01/02/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	6	30/08/2024	09/11/2023	22/10/2024

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	7	30/08/2024	09/11/2023	01/02/2025

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1 (OTRO SÍ No. 3)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	7	07/11/2024	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	30/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	01/03/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-40-101018843	8	07/11/2024	09/11/2023	01/03/2025

Póliza actualizada x TERMINACION

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)


ASEGURADORA	No.	ENDOSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	61-44-101051738	8	28/02/2025	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	30/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	01/03/2028
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	16/11/2029


15. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	16. REGISTRO FOTOGRÁFICO




PRELIMINARES

- Localización y replanteo

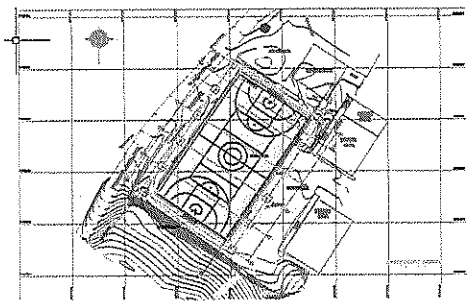

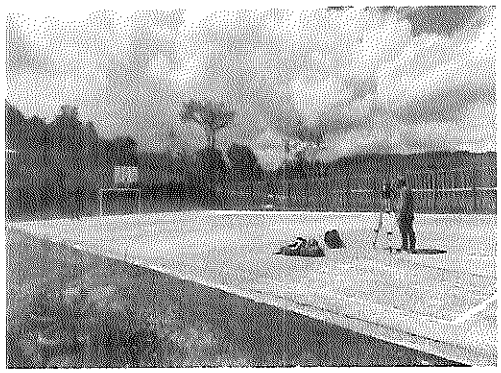



- Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.

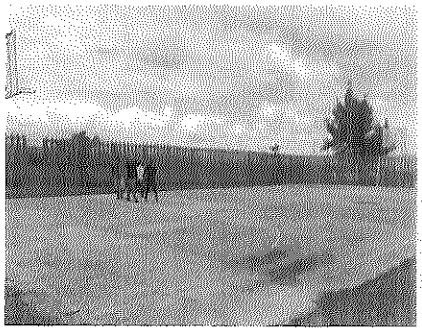




- Desmonte marcos canchas existentes.

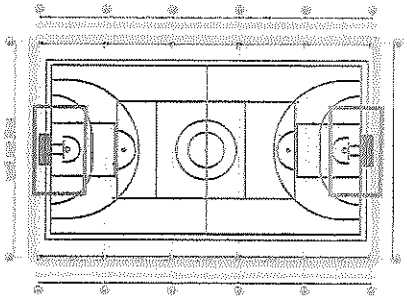

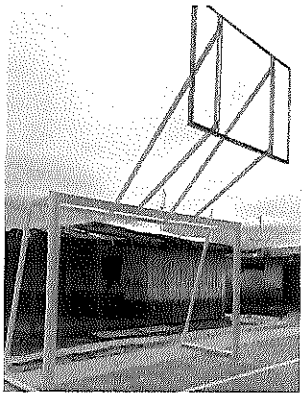


- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.

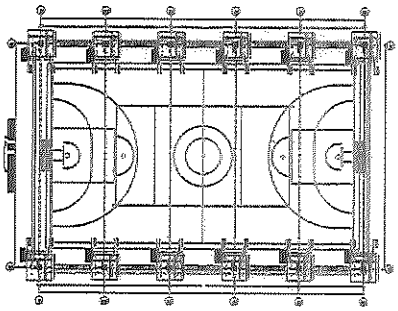




- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.

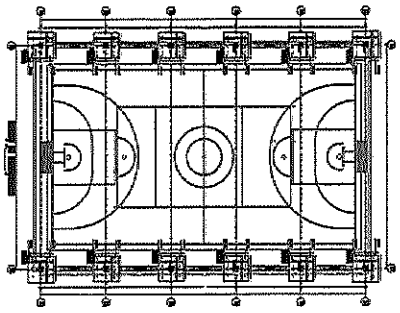




- Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.

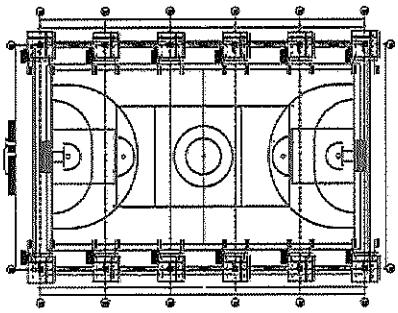




CIMENTACIÓN


- Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts







- Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.



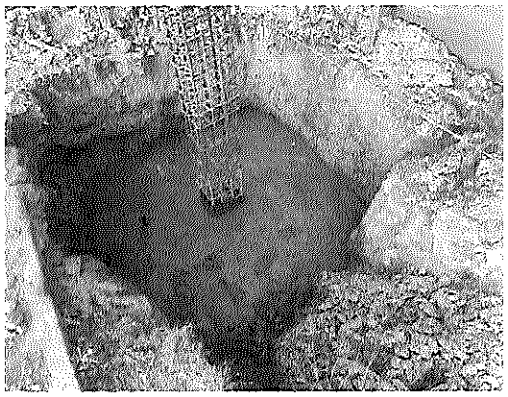


- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas

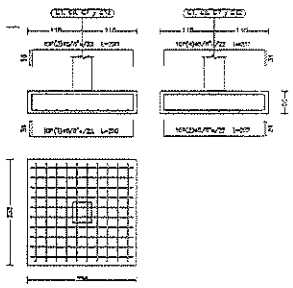

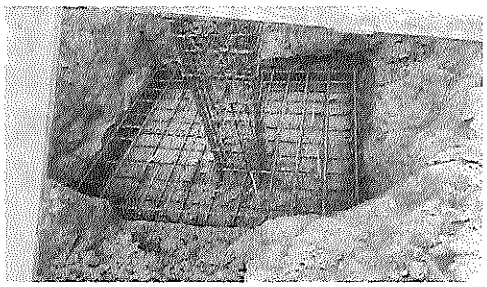


- Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño







- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación






- Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media Zonga.




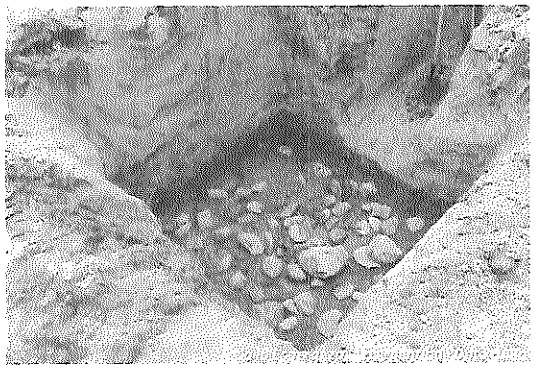


ESTRUCTURA

- Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.
-

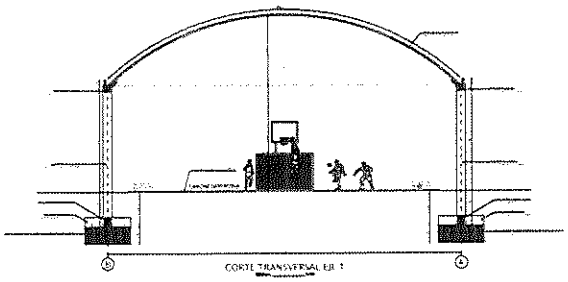

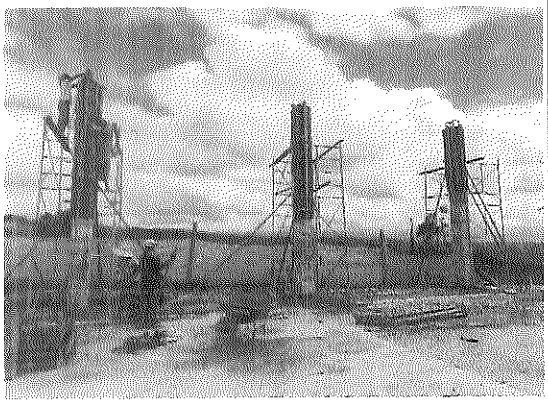


- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. COLUMNAS

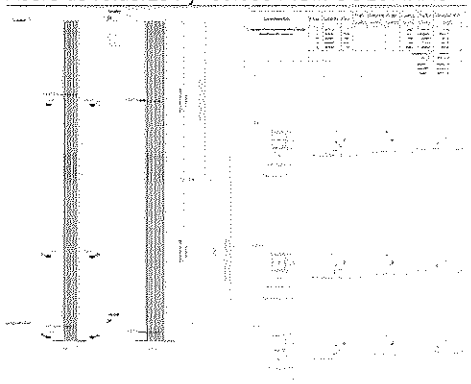




- Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Incluye impermeabilización.

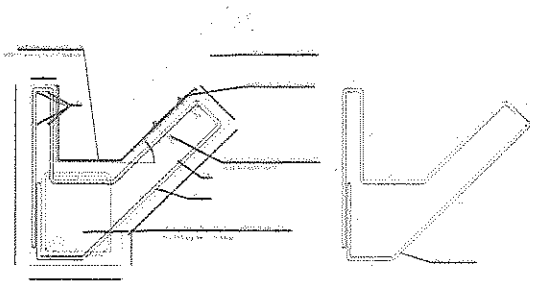

DETALLE VIGA CANAL




- Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal




DETALLE VIGA CANAL




- Suministro e instalación de manto zetal viga canal.

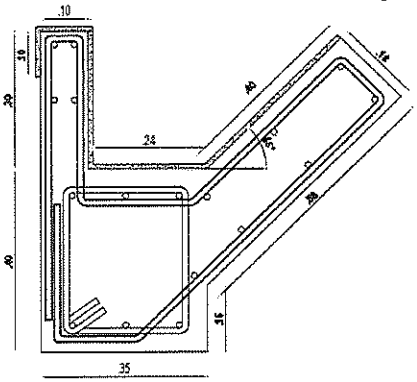


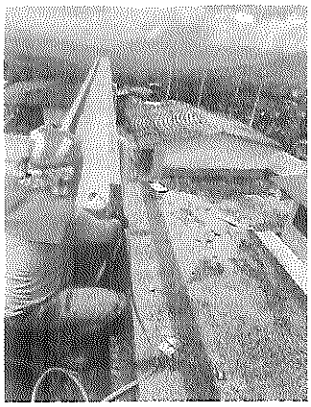

CUBIERTA


- Suministro, fabricación e instalación de cubierta auto soportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.




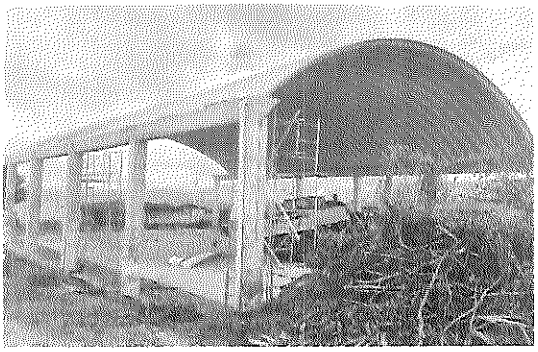


ACABADOS – PLACA EN CONCRETO

Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.



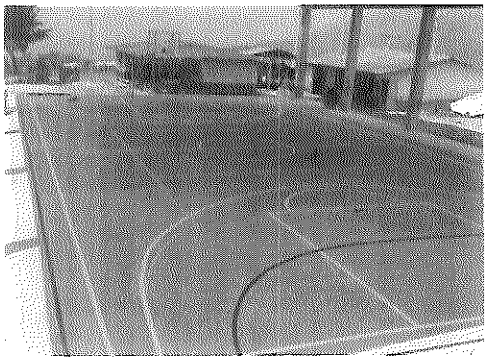


- Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.

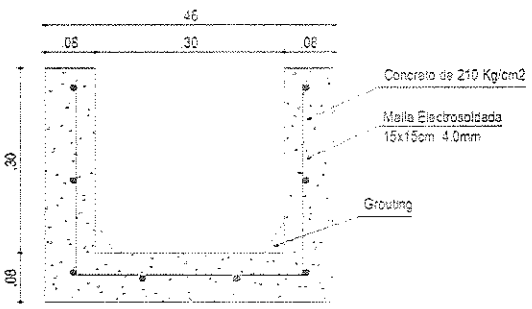





INSTALACIONES HIDROSANTIARIAS


- Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.

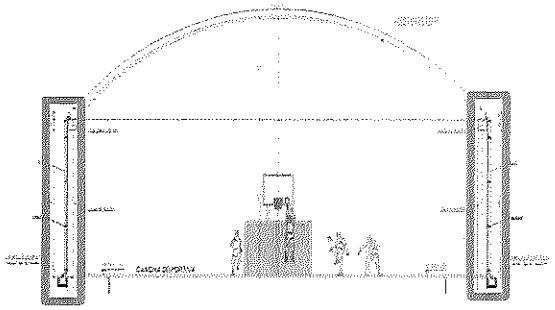

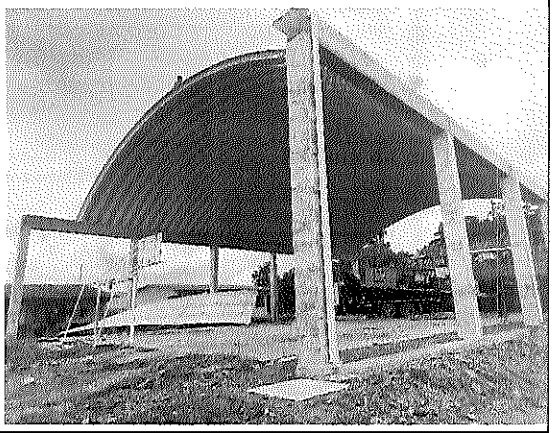



- Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües

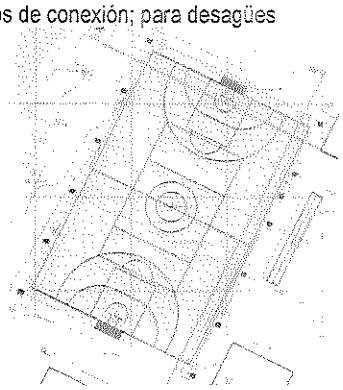

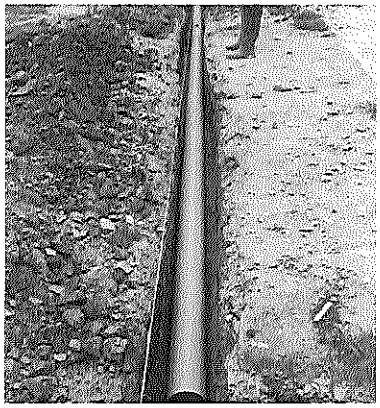


- Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para desagües

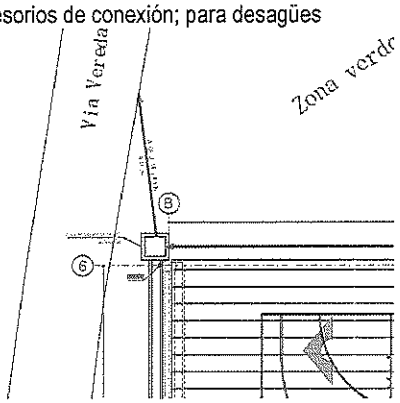

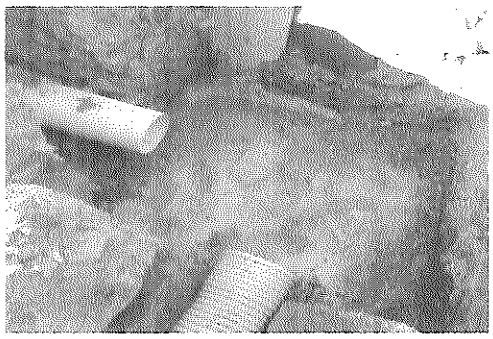

- Caja de inspección en concreto de F´c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño




DETALLE CAJA DE INSPECCION




INSTALACIONES ELÉCTRICAS

- Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.


DETALLE DE LA
CAJA DE INSPECCIÓN

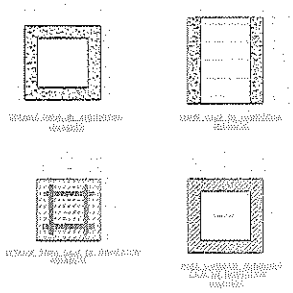




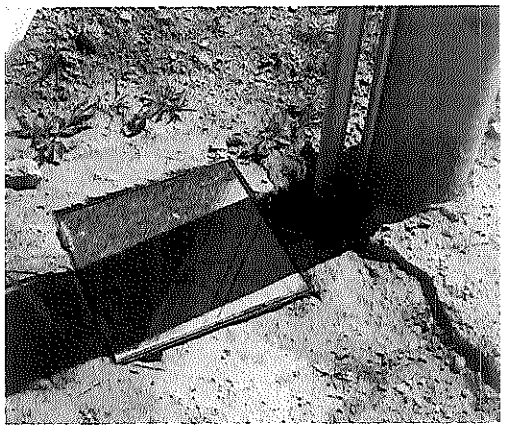


- Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.


-

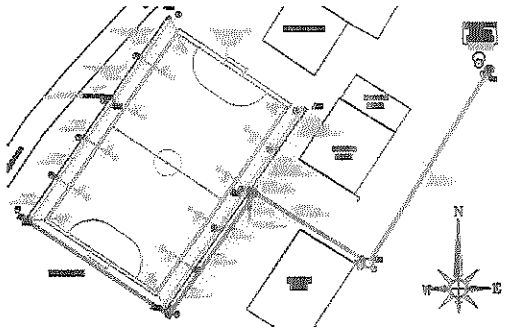


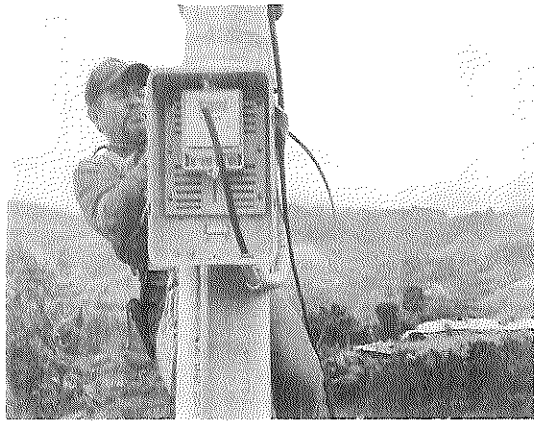


- Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"  	
- Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna. 	


- Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.



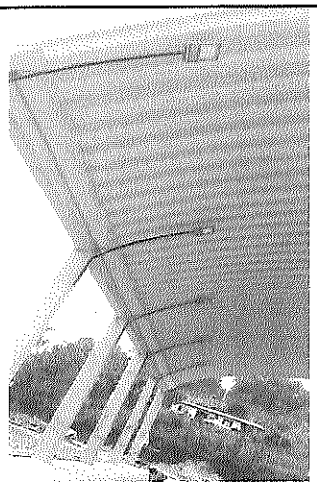


- Excavacion, Hincada y plomada de poste de concreto de 8 MTS X 510 KG armado y centrifugado.

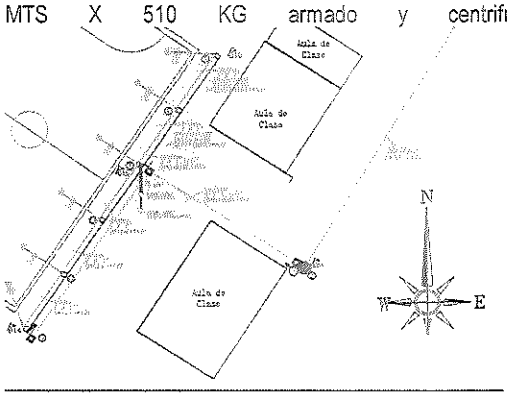

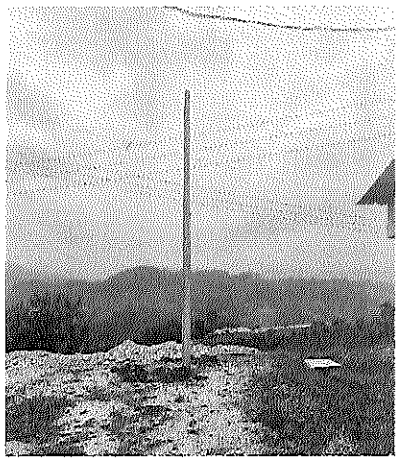

TRANSPORTE


- Transporte de materiales pétreos

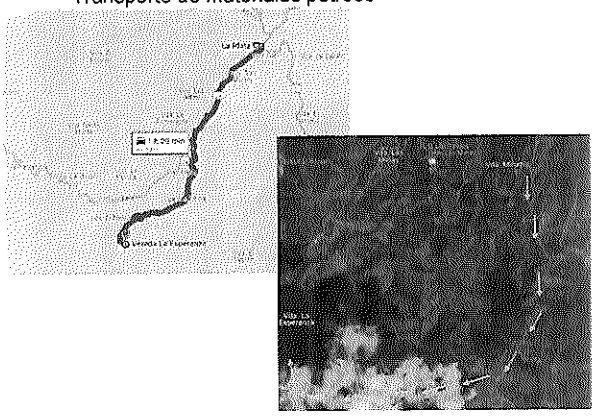




ITEMS NO PREVISTOS.


- Cerramiento perimetral con polisombra.

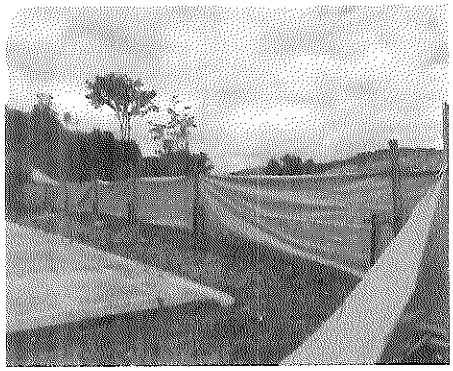


ITEMS NO PREVISTOS.

- Rejilla prefabricada para cuentas concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo. (40cm * 50cm * 0,05m)




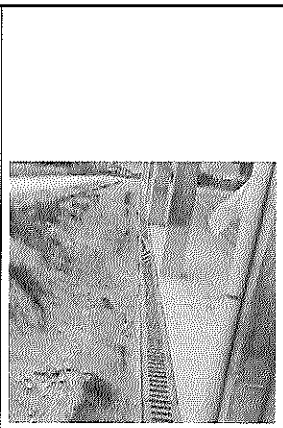




ITEMS NO PREVISTOS.

- Construcción placa en concreto de 3000 PSI. incluye formaleta, malla electrosoldada 5mm, corte y dilataciones.

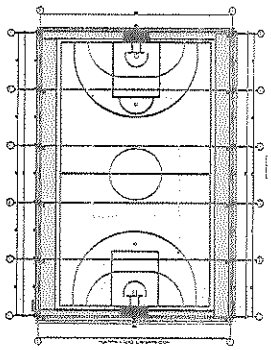

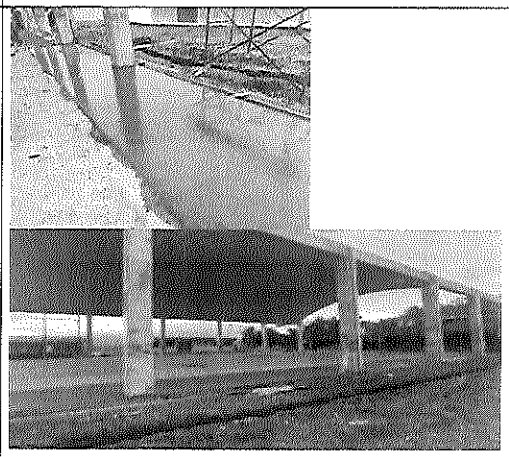


ITEMS NO PREVISTOS.


- Suministro, transporte e instalación de Medidor bifásico.



ITEMS NO PREVISTOS.


- Demolición de cuneta en concreto existente, hasta, ANCHO= 0.20 mt. incluye retiro de material sobrante.

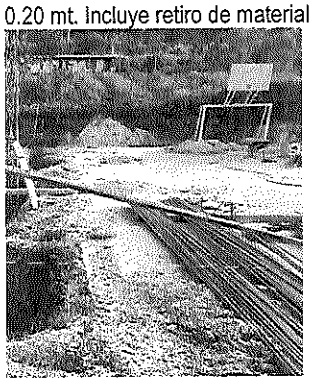


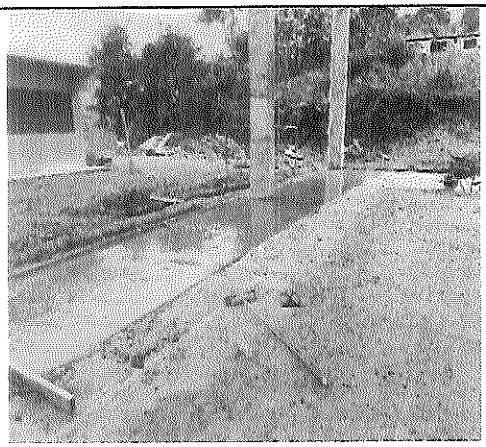

ITEMS NO PREVISTOS.

- MANTENIMIENTO DE MARCOS DE CANCHAS FUTBOL SALA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS INCLUYE TABLERO ACRÍLICO CAL 10MM, ARO PARA BALONCESTO, MALLAS PARA CANCHAS DE FUTBOL SALA

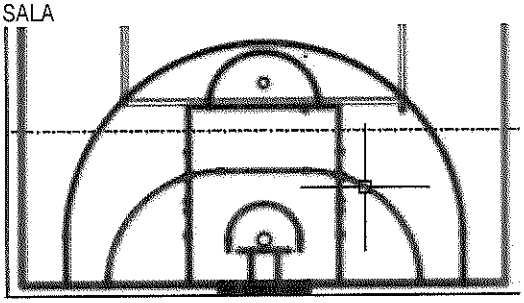

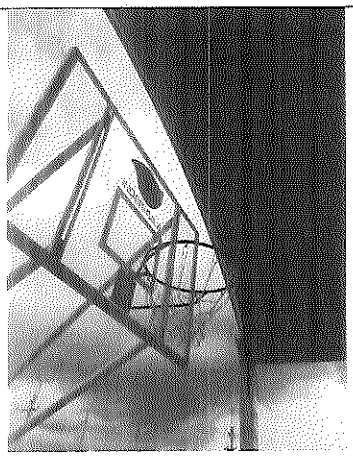

17. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG						
	ACTA DE RECIBO DE OBRA						
CONTRATO DE OBRA:	No:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CLPIH 392 DE 2023					
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA.						
VALOR CONTRACTUAL:	$ 488.701.732,00	ACTA DE INICIO:	23 DE NOVIEMBRE DE 2023			ACTA DE RECIBO	
VALOR ADICIONAL 1:	$ 74.813.020,00	ACTA DESUSPENSION 01:	28 DE DICIEMBRE DE 2023				
VALOR TOTAL:	$ 563.514.752,00	ACTA DE REINICIACION 01:	20 DE JUNIO DE 2024				
PLAZO:	3 MESES	PRORROGA No. 01	20 DE JUNIO DE 2024				
PRORROGA No. 01	1 MES	PRORROGA No. 02	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024			1	
PRORROGA No. 02	1 MES	PRORROGA No. 03	10 DE OCTUBRE DE 2024				
PRORROGA No. 03	1 MES	FECHA DE PRESENTE ACTA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024				
PLAZO TOTAL:	6 MESES						
CONTRATISTA:	CONSORCIO INDER A & S.	R.L	MIGUEL ALEXANDER CERON MOLINA	VALOR PRESENTE ACTA:	$ 563.514.752		
INTERVENTOR:	SOTA LTDA	R.L	JAVIER BARRERO MOSSOS	VALOR POR PAGAR:	$ 563.514.752		

			CONDICIONES CONTRACTUALES			MODIFICACION No. 1 FECHA: 24/10/2024			ACTA No. 1 PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VR/TOTAL
1.	ACTIVIDADES PRELIMINARES											
1.01	Localización y replanteo.	M2	700,7	$ 3.533	$ 2.475.573,00	723,02	$ 3.533	$ 2.554.438	723,02	$ 2.554.438	723,02	$ 2.554.438
1.02	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta. H= 3 mt. Incluye retiro de material	ML	30,00	$ 20.713	$ 621.390,00	30,00	$ 20.713	$ 621.390	30,00	$ 621.390	30,00	$ 621.390
1.03	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2,00	$ 115.932	$ 231.864,00	2,00	$ 115.932	$ 231.864	2,00	$ 231.864	2,00	$ 231.864
1.04	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	341,44	$ 45.680	$ 15.596.979,00	454,90	$ 45.680	$ 20.779.832	454,90	$ 20.779.832	454,90	$ 20.779.832
1.05	Relleno en recebo seleccionado y compactado	M3	174,57	$ 83.261	$ 14.534.873,00	248,54	$ 83.261	$ 20.693.689	248,54	$ 20.693.689	248,54	$ 20.693.689
				Sub Total Capitulo	$ 33.460.679,00			$ 44.881.213		$ 44.881.213		$ 44.881.213
2.	CIMENTACIÓN											
2.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	15	$ 33.774	$ 503.908	22,40	$ 33.774	$ 756.538	22,40	$ 756.538	22,40	$ 756.538
2.02	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	31,30	$ 614.716	$ 19.240.611,00	31,30	$ 614.716	$ 19.240.611	31,30	$ 19.240.611	31,30	$ 19.240.611
2.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. zapatas	KG	2.190,00	$ 7.066	$ 15.474.540,00	2.190,00	$ 7.066	$ 15.474.540	2190,00	$ 15.474.540	2190,00	$ 15.474.540
2.04	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	7,46	$ 736.831	$ 5.496.759,00	11,20	$ 736.831	$ 8.252.507	11,20	$ 8.252.507	11,20	$ 8.252.507
2.05	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1.106,00	$ 7.066	$ 7.814.996,00	1.269,00	$ 7.066	$ 8.966.754	1269,00	$ 8.966.754	1269,00	$ 8.966.754

2.06	Concreto Ciclopeo - 2500 PSI (175 KG/CM2) 60% Concreto 2500 PSI + 40% Piedra media Zonga.	M3	31,30	$ 357.476	$ 11.187.211,00	31,30	$ 357.476	$ 11.187.211	31,30	$ 11.187.211	31,30	$ 11.187.211
				Sub Total Capitulo	$ 59.718.025,00			$ 63.878.161		$ 63.878.161		$ 63.878.161
3.	ESTRUCTURA EN CONCRETO											
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.	M3	16	$ 914.363	$ 14.629.808	16,00	$ 914.363	$ 14.629.808	16,00	$ 14.629.808	16,00	$ 14.629.808
3.02	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas	KG	5.093,00	$ 7.066	$ 35.987.138,00	4.691,92	$ 7.066	$ 33.153.129	4691,92	$ 33.153.129	4691,92	$ 33.153.129
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	24,00	$ 997.820	$ 23.947.680,00	17,00	$ 997.820	$ 16.962.940	17,00	$ 16.962.940	17,00	$ 16.962.940
3.04	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. Viga Canal	KG	1.984,00	$ 7.066	$ 14.018.944,00	2.085,00	$ 7.066	$ 14.732.610	2085,00	$ 14.732.610	2085,00	$ 14.732.610
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60,80	$ 40.064	$ 2.435.891,00	69,31	$ 40.064	$ 2.776.916	69,31	$ 2.776.916	69,31	$ 2.776.916
				Sub Total Capitulo	$ 91.019.461,00			$ 82.255.403		$ 82.255.403		$ 82.255.403
4.	CUBIERTA											
4,01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en páneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pintro poliester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	670,93	$ 210.073	$ 140.944.278	670,93	$ 210.073	$ 140.944.278	670,93	$ 140.944.278	670,93	$ 140.944.278
				Sub Total Capitulo	$ 140.944.278,00			$ 140.944.278		$ 140.944.278		$ 140.944.278
5.	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO											
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307,11	$ 14.694	$ 4.512.674,00	398,72	$ 14.694	$ 5.858.792	398,72	$ 5.858.792	398,72	$ 5.858.792
5.02	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	60,80	$ 83.263	$ 5.062.390,00	60,80	$ 83.263	$ 5.062.390	60,80	$ 5.062.390	60,80	$ 5.062.390
				Sub Total Capitulo	$ 9.575.064,00			$ 10.921.182		$ 10.921.182		$ 10.921.182
6.	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											
6.01	Bajantes en tuberia PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagues y bajantes de aguas lluvias.	ML	49,60	$ 79.582	$ 3.947.267,00	51,20	$ 79.582	$ 4.074.598	51,20	$ 4.074.598	51,20	$ 4.074.598
6.02	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagues.	ML	20,26	$ 106.339	$ 2.154.428,00	20,26	$ 106.339	$ 2.154.428	20,26	$ 2.154.428	20,26	$ 2.154.428
6.03	Suministro e instalacion de tuberia PVC-S de 8", con accesorios de conexión; para salida.	ML	6,00	$ 217.515	$ 1.305.090,00	12,00	$ 217.515	$ 2.610.180	12,00	$ 2.610.180	12,00	$ 2.610.180
6.04	Caja de inspeccion en concreto de F'c=2500 PSI, de seccion 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.segun diseño	UND	2,00	$ 347.532	$ 695.064,00	2,00	$ 347.532	$ 695.064	2,00	$ 695.064	2,00	$ 695.064
				Sub Total Capitulo	$ 8.101.849,00			$ 9.534.270		$ 9.534.270		$ 9.534.270
7.	INSTALACIONES ELECTRICAS											
7.01	Desmonte de Postes de iluminación; incl. Retiro de luminarias, clabeado y demolición de machón en concreto.	UND	1	$ 291.293	$ 291.293	1,00	$ 291.293	$ 291.293	1,00	$ 291.293	1,00	$ 291.293
7.02	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alfajor.	UND	4	$ 634.417	$ 2.537.668	4,00	$ 634.417	$ 2.537.668	4,00	$ 2.537.668	4,00	$ 2.537.668
7.03	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	20,38	$ 45.680	$ 930.958	20,38	$ 45.680	$ 930.958	20,38	$ 930.958	20,38	$ 930.958
7.04	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0,40 mts.	ML	51,6	$ 48.995	$ 2.528.142	56,40	$ 48.995	$ 2.763.318	56,40	$ 2.763.318	56,40	$ 2.763.318
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2	$ 302.365	$ 604.730	2,00	$ 302.365	$ 604.730	2,00	$ 604.730	2,00	$ 604.730
7.06	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2	$ 280.294	$ 560.588	2,00	$ 280.294	$ 560.588	2,00	$ 560.588	2,00	$ 560.588
7.07	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1	$ 1.009.687	$ 1.009.687	1,00	$ 1.009.687	$ 1.009.687	1,00	$ 1.009.687	1,00	$ 1.009.687
7.08	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1	$ 4.668.206	$ 4.668.206	1,00	$ 4.668.206	$ 4.668.206	1,00	$ 4.668.206	1,00	$ 4.668.206

7.09	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	39	$ 87.914	$ 3.428.646	44,00	$ 87.914	$ 3.868.216	44,00	$ 3.868.216	44,00	$ 3.868.216
7.10	Instalación brazo sencillo según diseño de 3,5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12	$ 366.378	$ 4.396.536	12,00	$ 366.378	$ 4.396.536	12,00	$ 4.396.536	12,00	$ 4.396.536
7.11	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60	$ 57.744	$ 3.464.640	95,00	$ 57.744	$ 5.485.680	95,00	$ 5.485.680	95,00	$ 5.485.680
7.12	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12	$ 1.011.636	$ 12.139.632	12,00	$ 1.011.636	$ 12.139.632	12,00	$ 12.139.632	12,00	$ 12.139.632
7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 120 v.	UND	1	$ 968.169	$ 968.169	1,00	$ 968.169	$ 968.169	1,00	$ 968.169	1,00	$ 968.169
7.14	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1	$ 1.028.098	$ 1.028.098	1,00	$ 1.028.098	$ 1.028.098	1,00	$ 1.028.098	1,00	$ 1.028.098
7.15	Excavación, Hincada y plomada de poste de concreto de 8 MTS X 510 KG armado y centrifugado.	UND	1	$ 2.237.089	$ 2.237.089	1,00	$ 2.237.089	$ 2.237.089	1,00	$ 2.237.089	1,00	$ 2.237.089
				Sub Total Capitulo	$ 40.794.082,00			$ 43.469.868		$ 43.469.868		$ 43.469.868
8.	TRANSPORTE											
8.01	Transporte de materiales petreos	M3-Km	6.728,89	$ 1.092	$ 7.347.948	9.840,42	$ 1.092	$ 10.745.739	9840,42	$ 10.745.739	9840,42	$ 10.745.739
				Sub Total Capitulo	$ 7.347.948,00			$ 10.745.739		$ 10.745.739,000		$ 10.745.739,00
9	ITEMS NO PREVISTOS											
9,01	Cerramiento perimetral con polisombra.	ML	0,00	$ 28.009	$ -	112,00	$ 28.009	$ 3.137.008	112,00	$ 3.137.008	112,00	$ 3.137.008
9,02	Rejilla prefabricada para cuentas concreto de 3000 PSI, incluye acero de refuerzo. (40cm * 50cm * 0,05m)	ML	0,00	$ 199.689	$ -	60,80	$ 199.689	$ 12.141.091	60,80	$ 12.141.091	60,80	$ 12.141.091
9,03	Construcción placa en concreto de 3000 PSI,incluye formaleta,malla electrosoldada 5mm,corte y dilataciones.	M2	0,00	$ 131.831	$ -	127,56	$ 131.831	$ 16.816.362	127,56	$ 16.816.362	127,56	$ 16.816.362
9,04	Suministro, transporte e instalacion de Medidor bifasico.	UND	0,00	$ 973.100	$ -	1,00	$ 973.100	$ 973.100	1,00	$ 973.100	1,00	$ 973.100
9,05	ACOMETIDA AEREA EN CABLE CONCENTRICO 2*8+8 600V	ML	0,00	$ 267.399	$ -	24,00	$ 267.399	$ 6.417.576	24,00	$ 6.417.576	24,00	$ 6.417.576
9,06	Demolición de cunetal en concreto existente, hasta, ANCHO= 0.20 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	0,00	$ 21.781	$ -	58,00	$ 21.781	$ 1.263.298	58,00	$ 1.263.298	58,00	$ 1.263.298
9,07	MANTENIMIENTO DE MARCOS DE CANCHAS FUTBOL SALA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS INCLUYE TABLERO ACRÍLICO CAL 10MM, ARO PARA BALONCESTO, MALLAS PARA CANCHAS DE FUTBOL SALA .	UND	0,00	$ 1.706.627	$ -	2,00	$ 1.706.627	$ 3.413.254	2,00	$ 3.413.254	2,00	$ 3.413.254
				Sub Total Capitulo	$ -			$ 44.161.689		$ 44.161.689		$ 44.161.689,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 390.961.386**			**$ 450.811.803**		**$ 450.811.803**		**$ 450.811.803**
	Administración	20%			$ 78.192.277			$ 90.162.360		$ 90.162.360		$ 90.162.360,00
	Imprevistos	1%			$ 3.909.614			$ 4.508.118		$ 4.508.118		$ 4.508.118,00
	Utilidad	4%			$ 15.638.455			$ 18.032.472		$ 18.032.472		$ 18.032.472,00
	TOTAL COSTO				**$ 488.701.732**			**$ 563.514.752**		**$ 563.514.752**		**$ 563.514.752**
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO			0%								
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO									**$ 563.514.752**		
	% AVANCE DE OBRA									**100,00%**		

ING. **NIXON GERMAN DÍAZ MUÑOZ**
DIRECTOR DE OBRA

ING. **JAVIER BARRERO MOSSOS**
DIRECTOR DE INTERVENTOR

18. ANEXOS

(actas de comités, registro de ensayos de laboratorio, copia de la bitácora de obra, soportes de pago a aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) y la correspondencia generada durante el periodo.

Entregar un CD con la copia digitalizada de todo el informe y sus anexos.

ING.JAVIER BARRERO MOSSOS	(12/03/2025)	ING. DANIEL FELIPE MOLINA TAFUR.
FIRMA ORIGINAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo. Bo APOYO SUPERVISION

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

CERTIFICACION ANEXA AL INFORME FINAL

La Interventoría SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS, deja constancia expresa de que el día 18 de Marzo del 2025, se reunieron el ingeniero JAVIER BARRERO MOSSOS, en calidad de Director de Interventoría; el ingeniero JUAN CARLOS ANGARITA PUERTO, en calidad de Residente de Interventoría; el ingeniero NIXON GERMAN DIAZ MUÑOZ, en calidad de Director de Obra; y el ingeniero PAOLA ANDREA JIMENEZ NARVAEZ, en calidad de Residente de Obra, con el propósito de realizar la verificación técnica en terreno de las cantidades ejecutadas, la calidad de los materiales empleados y la revisión ocular de los ítems construidos, para efectos de la aprobación del Acta de Recibo Final de Obra suscrita el día 13 de Noviembre de 2024.

Dicha verificación se efectuó confrontando la ejecución física de la obra CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACIÓN PARA LA VEREDA LA ESPERANZA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA, con los diseños, planos, especificaciones técnicas y alcance del objeto contractual, así como con los ítems registrados en el Acta de Recibo Final de Obra DIH-CGID-F21.

Como resultado de la inspección en campo, la Interventoría determinó que el contratista ejecutó integralmente el objeto contractual, las normas técnicas aplicables y a las especificaciones establecidas en el contrato de obra No. CLPIH 392 de 2023 que tiene por objeto. Asimismo, se constató que la obra se encuentra en óptimo estado, operativas y aptas para su puesta en funcionamiento, sin observaciones pendientes que afecten su calidad, funcionalidad o estabilidad.

En mérito de lo expuesto, la Interventoría verifica y aprueba las actividades ejecutadas en el Contrato de Obra No. CLPIH 392 de 2023.

Atentamente;

JAVIER BARRERO MOSSOS
CC No 7.685.694
Ing. Director de Interventoria

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA — FECHA: 2-08-24

OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA — NORMA: Art. 630

LOCALIZACION: LA ESPERANZA - LA ARGENTINA - HUILA — ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)		FECHA ROTURA	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
1	ZAPATAS EJE A	5/07/2024	7		12/07/2024	10.1	2180	153.52	72.66%	3000	
2				28	2/08/2024	10.1	3270	230.29	109%	3000	

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO - ENVIADAS POR EL CLIENTE

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 9BW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8730486 Celular: 315-3022860
NEIVA - HUILA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 325 725 – 2

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO


CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA — FECHA: 10-09-24

OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA — NORMA: Art. 630

LOCALIZACIÓN: LA ESPERANZA - LA ARGENTINA - HUILA — ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)		FECHA ROTURA	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
1	VIGAS DE CIMENTACION EJE B	13/07/2024	7		20/07/2024	10.1	2150	151.40	71.66%	3000	
2				28	10/08/2024	10.1	3261	229.64	108.7%	3000	

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO - ENVIADAS POR EL CLIENTE

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25A No. 9DW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8732456 Celular : 316-3622699
NEIVA - HUILA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 329 729 – 2

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO


CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA — FECHA: 06-08-24

OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA — NORMA: Art. 630

LOCALIZACIÓN: LA ESPERANZA - LA ARGENTINA - HUILA — ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)		FECHA ROTURA	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
1	PEDESTALES EJE A	9/07/2024	7		16/07/2024	10.1	2240	157.74	74.66%	3000	
2				28	6/08/2024	10.1	3230	227.46	107.66%	3000	

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO - ENVIADAS POR EL CLIENTE

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 9BW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax: 8750486 Celular: 310-3622089
NEIVA - HUILA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 320 725 – 2

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO


CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA — FECHA: 27-08-24

OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA — NORMA: Art. 630

LOCALIZACIÓN: LA ESPERANZA - LA ARGENTINA - HUILA — ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)		FECHA ROTURA	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
1	COLUMNAS EJE B	30/07/2024	7		6/08/2024	10.1	2765	194.71	92.16%	3000	
2				28	27/08/2024	10.1	3453	243.16%	115.1%	3000	

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO - ENVIADAS POR EL CLIENTE

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 9BW - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8720386 Celular : 315-3622889
NEIVA - HUILA

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.
NIT 901 320 729 – 2

COMPRESION SIMPLE AL CONCRETO

CLIENTE: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

OBRA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA

LOCALIZACIÓN: LA ESPERANZA - LA ARGENTINA - HUILA


FECHA: 30-08-24

NORMA: Art. 630

ENSAYO: E-410

CILINDRO No.	ELEMENTO FUNDIDO Y OBSERVACIONES	FECHA FUNDIDA	EDAD DE ROTURA (Dias)		FECHA ROTURA	DIAMETRO	RESISTENCIA PSI	RESISTENCIA Kg/cm²	% OBTENIDO	RESISTENCIA ESPECIFICADA	OBSERVACIONES
1	VIGA CANAL EJE B	2/08/2024	3		5/08/2024	10.1	2268	159.71	75.6%	3000	
2				28	30/08/2024	10.1	3316	233.52	110.53%	3000	

GRAFICA PORCENTAJES



CONCRETOS %	
EDAD (DIAS)	PORCENTAJE
7	50-70%
14	80%
21	90%
28	100%

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS SE RECIBIERON EN BUEN ESTADO - ENVIADAS POR EL CLIENTE

INGENSAYOS COLOMBIA S.A.S.

NATALIA OVIEDO VARGAS
INGENIERA CIVIL

Calle 25N No. 66W - 08 Barrio Villa del Rio - Telefax 8750480 Celular : 315-3022894
NEIVA - HUILA

316

Contrato de Obra
CLPIH 392 de 2023

"Construcción de cubierta autoportante con iluminación para la vereda La Esperanza de la zona rural del municipio de La Argentina departamento del Huila"

Fecha de inicio - 23-Noviembe de 2023

23-11-2023 * Actividades Realizadas

El personal del contratista e interventoria realizan la respectiva acta de inicio para poder realizar actividades contempladas en el contrato

* ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

* PERSONAL DE CONTRATISTA: Contratista de Obra - Director de Obra - Inspector de obra

* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Contratista de interventoria - Director de interventoria - Ing Residente de interventoria

* EQUIPO EN OBRA: Hora menor

Ing Obra — Juan Carlos Argueta Ing Interventoria

24-11-2023 * Actividades realizadas

El personal profesional del contratista realizo visita a obra para verificar el terreno donde se va a ejecutar el proyecto

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

* PERSONAL DE CONTRATISTA: Director de Obra - Inspector de Obra - maestro de Obra - 3 Ayudantes - SST.

* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Director de interventoria - Ing Residente de Interventoria

* Equipo en Obra: Hora menor

Ing Obra — Juan Carlos Argueta Ing Interventoria

25-11-2023 * ACTIVIDADES REALIZADAS

Se esta Organizando la logistica para iniciar labores el dia 29-11-2023

Personal Contratista: Director de Obra - Inspector de Obra - maestro de Obra

Personal Interventoria: Director de Interventoria - Ing Residente de Interventoria

* EQUIPO EN OBRA: Hta menor

Ing Obra — Juan Carlos Agapito Ing. Inspectora

27-11-2023 * ACTIVIDADES

Se inicio a realizar Localizacion y replanteo de los datos a intervenir, se obtuvo autorización total para el trabajo

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

* PERSONAL DE CONTRATISTA: Director de Obra - Inspector SST - Topografo - Inspector de Obra - maestro

* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Ing residente.

* EQUIPO EN OBRA: Hta menor - Estacion total de topografia

Ing Obra — Juan Carlos Agapito Ing Inspector

28-11-2023 * ACTIVIDADES

Se continua realizando Localizacion y replantes de los datos a intervenir

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

* PERSONAL CONTRATISTA: Inspector Obra - SST - Topografo - Maestro

* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing residente

* EQUIPO EN OBRA: Hta menor - Estacion total de topografia

Ing Obra — Juan Carlos Agapito Ing. Inspectora

29-11-2023 * Actividades:

En obra se reunieron Ing Residente de obra e interventoria para socializar información en comité el día 30-11-2023

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia fuerte
TARDE: Lluvia fuerte

* PERSONAL CONTRATISTA: Inspector de Obra - maestro - 3 Ayudantes

* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente

* Equipo en Obra: Mano de obra

Nota: No se realizan Actividades por lluvia fuerte

Juan Carlos Angarita
Ing Obra
Ing Interventoria

30-11-2023 * Actividades

Se realiza localización de zapata por parte del maestro para dar inicio a las excavaciones

Se realiza balance del presupuesto por parte del equipo profesional

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

* PERSONAL CONTRATISTA: Inspector de obra - maestro - 3 Ayudantes

* Personal INTERVENTORIA: Ing residente

* EQUIPO EN OBRA: Mano de obra

Juan Carlos Angarita
Ing Obra
Ing Interventoria

01-12-2023 * Actividades

Se realiza comité técnico en sitio donde se hizo presente delegado por parte del contratista de obra, delegado de la interventoria, delegado de la supervisión realizando recorrido se verifico los documentos y planos que hacen parte integral de los pactos presentes se evidencio algunas algunas anotaciones que se encuentran afectando negativamente la ejecución del proyecto. Nada

6

* ESTADO DEL CLIMA: MAÑANA - Lluvia fuerte
TARDE - Lluvia fuerte
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing residente - Director de Obra - maestro
1 Ayudante - SST
* Personal Interventoria - Ing residente - Director
* Equipo en obra: Hrra menor

Juan Carlos Angarita
Ing Obra — Ing Interventor

02-12-2023 * Actividad
Se inicio a realizar el cerramiento provisional con lona verde con una altura de 2.10m, para poder aislar la obra puesto que colinda con una escuela y puede generar peligro.
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia leve
TARDE: Lluvia fuerte
NOTA: En la tarde se suspende Actividades por lluvia
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing residente - maestro - 1 Ayudante
* Personal Interventoria: Ing residente
* EQUIPO EN OBRA: Hrra menor

Juan Carlos Angarita
Ing Obra — Ing Interventor

04-12-2023 * Actividad
Se continua actividad de cerramiento provisional con lona verde con una altura de 2.10m
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE Lluvia fuerte
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing residente - maestro - 1 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing residente
* EQUIPO EN OBRA: Hrra menor

Juan Carlos Angarita
Ing Obra — Ing Interventor

05-12-2023

* ACTIVIDADES:
Se inicia actividad de excavación para zapata de cimentación en el eje B.
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing Residente 1- SSO- Maestro- 4 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing. Residente
* EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventoria

06-12-2023

* Actividades:
Se continua actividad de excavación de zapatas de cimentación en el eje B.
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing Residente - SSO - 1 maestro - 4 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor

Ing. Obra — Juan Carlos Angarita Ing. Interventoria

07-12-2023

* Actividades:
Se continua actividad de excavacion de zapatas de cimentacion en el eje B
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing Residente 1 SSO - maestro - 4 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente

EQUIPO EN OBRA: Hta menor

Juan Carlos Angarita
Ing Obra — Ing Interventoría

08-12-2023 * Actividades:
Se continua actividad de excavación de zapatas de cimentación en el eje B
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing Residente - SST - maestro - 4 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Hta menor

Juan Carlos Angarita
Ing Obra — Ing Interventoría

09-12-2023 * Actividades:
Se continua actividad de excavación de zapata de cimentación en el eje B
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE - Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing Residente - SST - maestro - 4 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Hta menor

Juan Carlos Angarita
Ing Obra — Ing Interventoría

11-12-2023 * Actividades:
Se continua actividad de excavación de zapata de cimentación en el eje B
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing Residente - SST - maestro - 4Ayudantes

* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Mira menor

Juan Carlos Argueta
Ing Obra — Ing Interventoría

12-12-2023 * Actividades:
Se continua excavación de zapatas de cimentación en el eje B.
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvia leve.
TARDE: Soleado
* PERSONAL DE CONTRATISTA: Ing. Residente - SST - maestro - 9 Ayudantes.
* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Mira en Obra

Juan Carlos Argueta
Ing Obra — Ing Interventoría

13-12-2023 Actividades:
Se continua excavación de zapatas de cimentación en el eje B.
Se inicia excavación de vigas de cimentación en el eje B.
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing. Residente - SST - maestro - 9 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing. Residente
* EQUIPO EN OBRA: Mira menor

Juan Carlos Argueta
Ing Obra — Ing Interventoría
Observación: Al revisar el estudio del terreno se encontro incongruencias y se informara en obra al Ing Juan Argueta

14-12-2023 Actividades:

Se continua excavación de vigas de cimentación en el eje B

Se perfilan excavación y nivelan para los zapatas en Y se realiza perfilación de las mismas

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

* PERSONAL DE CONTRATISTA: Ing residente - SST - maestro - 4 Ayudantes

* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Ing Residente

* EQUIPO EN OBRA: Herramienta:

Ing Obra — Ing Interventoría

15-12-2023 Actividades:

Se continua excavación de vigas de cimentación en el eje B

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

* PERSONAL DE CONTRATISTA: Ing residente - SST - maestro - 4 ayudantes.

* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Ing Residente

* EQUIPO EN OBRA: Herramienta:

Ing Obra — Ing Interventoría

16-12-2023 Actividades:

Se termina de realizar la excavación y perfilación de zapatas y vigas de cimentación en el eje B.

Se inicia demolición de cerramiento perimetral existente

Se realiza retiro de excedente del material sobrante

MIER

a su disposición final en lugar autorizado

* Estado del clima: Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

* Personal contratista: Ing Residente - SST - maestro - 4 ayudantes

* Personal Interventoría: Ing Residente

* Equipo en obra: Mini menor

Ing. Obra — Ing. Interventor

Observación: Se programa para el día 18 de diciembre de 2024 mesa técnica para tratar información del proyecto.

18-12-2023 Actividades:

Se inicia excavación de tapatera de cimentación del eje A.

Se realiza mesa técnica con personal contratista interventoría y supervisión, donde estuvieron los ingenieros especialistas en estructuras de la entidad contratante.

Se realiza revisión de planos estructurales de la cubierta encontrando, donde se evidencia que la información entregada está incompleta y hay obstáculos al diseño.

* Estado del tiempo: Mañana: Lluvia fuerte

Tarde: Lluvia fuerte

* Personal contratista: Ing Residente - Ing Director - SST - maestro - 4 Ayudantes

* Personal Interventoría: Ing Director - Ing Residente

* Equipo en obra: Mini excavadora

Ing. Obra — Ing. Interventor

19-12-2023	Actividades: Se continua excavación de zapatas de cimentación del eje A * Estado del tiempo: Mañana: Lluvias fuertes Tarde: Soleado Nota: En la mañana no se pudo realizar actividades por lluvias fuertes * Personal contratista: Ing Director de obra- Ing Residente de Obra- maestro - SSI - 4 ayudantes * Personal Interventoria: Director de obra- Ing Residente * Equipo en obra: Mini mezc Ing Obra — Juan Carlos Angulo Ing Interventoria
20-12-2023	Actividades: Se continua excavación de zapatas de cimentación del eje A * Estado del tiempo: Mañana: Soleado Tarde: Soleado * Personal contratista: Ing residente - SSI maestro - 4 Ayudantes * Personal Interventoria: Ing Residente * Equipo en obra: Mini mezc Ing Obra — Juan Carlos Angulo Ing Interventoria
21-12-2023	Actividades: Se continua excavación de zapatas de cimentación del eje A * Estado del tiempo: Mañana - Soleado Tarde - Soleado * Personal contratista: Ing Residente - SSI maestro - 4

Ayudantes.
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Una menor.

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing. Interventoria

22-12-2023 Actividades.
Se continua excavación de zapatas de cimentación del eje A.
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvias leves
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing. Residente - SST - maestro - 4 Ayudantes.
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing. Residente
* EQUIPO EN OBRA: Una menor

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing. Interventoria

23-12-2023 Actividades:
Se continua excavación de zapatas de cimentación en el eje A.
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing Residente - SST - maestro - 4 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Una menor

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing. Interventoria

26-12-2023 Actividades:
Se continua excavando entre cimentación de zapatas de

cimentación en el EJE A

se inicia a realizar excavación de viga de cimentación en el EJE A

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
  TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing residente - SST - maestro - 4 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing residente
* EQUIPO EN OBRA: Una mezcladora

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

26-12-2023

Actividades:

Se continúa realizando excavación de viga y zapata de cimentación en el EJE A

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
  TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing residente - SST - maestro - 4 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Una mezcladora

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

27-12-2023

Actividades:

Se termina de realizar actividades correspondiente a la excavación de zapatas y vigas de cimentación en el EJE A

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
  TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing residente - SST - maestro - 4 Ayudantes

NOTA

* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing residente
* EQUIPO DE OBRA: Hora extra

Ing Obra — Juan Carlos Argueta
Ing. Interventoría

28-12-2023 Actividades

Se decide que se suspende el proceso hasta que se realice la entrega oficial de los documentos indispensables para poder proceder con la obra, así como los pagos que se encuentran dentro de los mismos? Esto es parte integral del contrato y que a la fecha están afectando el cumplimiento de la programación planteada, puesto que las obras con los daños estructurales de las cubiertas expuestos el día 18 de diciembre del 2023 no han sido subsanados. Por lo anterior se suspende el contrato por un término de 48 días.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing residente, 2 maestro, 4 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO DE OBRA: Hora extra

Ing Obra — Juan Carlos Argueta
Ing. Interventor

20-06-2024 Actividades:

Este día se dio reinicio de actividades, después de la Superar la suspensión del día 28-diciembre-2023.

- Se inicia a realizar la correspondiente localización y replanteo de todas las áreas a intervenir de acuerdo con los planos y diseños entregados.
- Una vez se dio inicio de obra, después de una semana de 5 días y 22 días, las excavaciones se vieron afectadas por fuertes lluvias, donde se evidencia sobre anchos y el contratista realizo mayores cantidades de excavación y relleno, actividades necesarias para dar cumplimiento a los diseños establecidos los trabajos fueron supervisados por la interventoría.
- Se realizo excavación de zapatas y vigas de cimentación en dos ejes en A y B.

* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
* Tarde: Soleado
* Personal en obra: Ing residente - SST - maestro - 1 oficial y 3 ayudantes - Topografo - cadenero.
* Personal interventoría: Ing residente
* Equipo en obra: Herramienta - Estación total de topografía.

Juan Carlos Angarita
Ing Interventoría

Ing Obra

21-06-2024 Actividades:

Se continua realizando excavación de zapatas y vigas de cimentación en el eje A y B.

Se realizo concreto de limpieza para las zapatas de cimentación y vigas de cimentación

Se realizo concreto y figurado de refuerzo para zapatas y vigas de cimentación, se acopio en el lugar de obra.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing Residente - SST - maestro - 1 oficial y 3 Ayudantes - Ing. Director de Obra
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente - Ing Director
* EQUIPO EN OBRA: Hilti mano

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventoria

22-06-2024 Se continua realizando excavación de zapata y viga de cimentación en eje A y B.
Se realiza cole y figuración de refuerzo para zapata, viga y columna.
- Se realiza fundición de concreto de limpieza para viga y zapata de cimentación.
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL DE CONTRATISTA: Ing Residente - SST - maestro - 1 oficial - 3 ayudantes
* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Hilti mano

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventoria

-9-06-2024 Actividades
Se continua realizando excavación de zapata y viga de cimentación en el eje A y B.
Se continua cole y figuración de refuerzo para zapata, viga y columna.
Se inicia actividad fundida concreto ciclopeo en las zapatas de cimentación
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado

Tarde: Soleado

- Personal contratista: Ing Residente - SST - maestro - Director de obra - 10 hab - 1 Ayudante
- Personal Interventoría: Ing Director - Ing Residente
- Equipo en obra: Hta menor

Juan Carlos Argenta
Ing Obra — Ing. Interventor

25-06-2024 Actividades:

Se continua realizando excavación en zapatas de cimentación eje A.
Se realiza fundición de solado de limpieza en viga y zapatas eje B, este eje esta listo para la instalación de cubierta.
Se continua con corte y figurado de acero para zapatas, vigas y columnas.

- Estado del tiempo: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
- Personal contratista: Ing residente - SST - maestro - 1 oficial - 3 Ayudantes
- Personal Interventoría: Ing Residente
- Equipo en obra: Hta menor

Juan Carlos Argenta
Ing Obra — Ing. Interventoría

26-06-2024 Actividades:

Se realiza concreto de solado en zapatas en el eje B.
Se realiza perforación de zapatas del eje A.

- Estado del tiempo: Mañana: Lluvia leve
  Tarde: Soleado

* PERSONAL CONTRATISTA: Ing Residente - SST - maestro - 1 oficial - 3 ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing residente
* EQUIPO EN OBRA: Hta menor

Juan Carlos Angarita
Ing Obra Ing Interventoria

29-06-2024 Actividades:
Se realiza fundición de concreto ciclopeo en los zapatas en eje A y B; interventoria realiza liberación.
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL DE OBRA: Ing residente - SST - maestro - 1 oficial - 3 ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Director - Ing residente
* EQUIPO EN OBRA: Hta menor - mezcladora de concreto.

Juan Carlos Angarita
Ing Obra Ing Interventor

28-06-2024 Actividades:
Se realiza liberación de refuerzo y localización por parte de interventoria posteriormente se funde ciclopeo sobre la zapata de cimentación en el eje A y B
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* Personal contratista: Ing residente - maestro - SST - 1 oficial - 3 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing residente
* EQUIPO EN OBRA: Hta menor - mezcladora concreto

Juan Carlos Angarita

20

29-06-2024 ACTIVIDADES

- Se inicia instalación de refuerzo para las zapatas de cimentación y pedestales en eje A y B.
- Se realiza retiro a lugar de disposición final del material de excavación.
- ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA : Soleado
  TARDE : lluvia leve
- PERSONAL CONTRATISTA: Ing Director - Ing Residente - SSI - maestro - 1 oficial - 3 Ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
- EQUIPO EN OBRA: Volqueta - Hta menor

Juan Carlos Argueta
Ing Obra — Ing Interventoría

30-06-2024 Actividades:

- Se continua instalación de refuerzo para las zapatas de cimentación y pedestales eje A y B.
- Se realiza retiro a lugar de disposición final del material de excavación
- ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA : Soleado
  TARDE : Soleado
- PERSONAL CONTRATISTA : Ing Residente SST - maestro 1 oficial - 3 ayudantes
- PERSONAL INTERVENTORIA: Ing residente
- EQUIPO en Obra: Volqueta - Hta menor

Juan Carlos Argueta
Ing Obra — Ing Interventoría

1-07-2024 ACTIVIDADES

- Se continua instalación de refuerzo para zapatas de cimentación y pedestales eje A y B.
- Se realiza corte y figuración de refuerzo de

columna y viga de cimentación en eje A-B.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

* PERSONAL CONTRATISTA: Ing. residente - SST - 1 maestro - 1 oficial - 5 ayudantes.

* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing. Director - Ing. Residente

* EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor

Ing. Obra — Ing. Interventor

02-07-2024 ACTIVIDADES.

Una vez se verifica con el ing. residente de interventoría el refuerzo instalado se procede a fundir las zapatas de cimentación en el eje B.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

* PERSONAL CONTRATISTA: Ing. Residente - SST - Maestro - 1 oficial - 5 ayudantes

* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing. Residente

* EQUIPO EN OBRA: Vibradores de concreto - Herramienta menor

Ing. Obra — Ing. Interventor

03-07-2024 ACTIVIDADES:

No se realizan actividades porque se presentaron lluvias fuertes en la zona en todo el día.

* ESTADO DEL TIEMPO: Lluvia fuerte todo el día

04-07-2024 ACTIVIDADES:

Se realizo instalación de refuerzo para zapata 4 Avanzando con el fundido en el eje A-B

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* Personal Contratista: Ing residente - SSI - 1 maestro
1 Oficial - 5 ayudante
* Personal Inventoria: Ing Residente
* Equipo en obra: Mano menor

Juan Carlos Argandoña
Ing Obra — Ing Interventor

05-07-2024 ACTIVIDADES
Se realiza por parte de inventoria liberado para proceder a fundir las zapatas de cimentación del eje A-B se realizaron los anclajes de concreto para fijar la columna
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE - Soleado
* Personal - contratista - Ing Residente - SSI - 1 maestro
1 Oficial - 5 Ayudantes
* Personal Interventoria: Ing Residente
* Equipo en obra: mezcladora de concreto - Mano menor

Juan Carlos Argandoña
Ing Obra — Ing Interventor

06-07-2024 Actividades
Se realiza por parte de interventoria liberado de reparto para proceder a fundir los pedestales del eje B. Se realizaron anclajes para fijar a compresión de concreto
Se realiza dovelas de madera utilizada en fundición de zapatas eje A
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Soleado
TARDE Soleado

NTB

* PERSONAL CONTRATISTA: Ing residente - SSI - 1 maestro - 1 oficial - 5 ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Mezcladora de concreto - Hta menor

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

08-07-2024 ACTIVIDADES

Se inicia relleno de tapatas en el eje B, realizando su respectiva compactación.
Se realiza encofrado de pedestales en el eje A.

* ESTADO DEL TIEMPO MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing Residente - SSI - 1 maestro - 1 Oficial - 5 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Director - Ing Residente.
* EQUIPO EN OBRA: Hta menor - Rana compactadora

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

09-07-2024 ACTIVIDADES

Se realiza por parte de interventoria liberación para proceder a fundir las tapatas de cimentación del eje B. Se realizan los cilindros de concreto a compresión.

* ESTADO DEL TIEMPO MAÑANA: lluvias leves
TARDE: lluvia fuerte
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing Residente - SSI - 1 maestro - 1 oficial - 5 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Hta menor - mezcladora concreto

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

10-07-2024 Actividades:

Se realiza desmontado de pedestales en el eje A.
Se realiza relleno con recebo seleccionado para las zapatas del eje A y B. Se realiza la respectiva compactación.

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado

* Personal contratista: Ing residente - SST - 1 maestro - 10 oficiales - 5 Ayudantes.
* Personal Interventoría: Ing residente
* Equipo en obra: Herramienta menor - rana compactadora

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

11-07-2024 Actividades:

Se realiza relleno con recebo seleccionado para las zapatas y vigas de cimentación del eje A y B, se realiza la correspondiente compactación.
Se realiza instalación de refuerzo para vigas de cimentación en el eje B.

* Estado del tiempo: Mañana: lluvia leve
Tarde: Soleado
* Personal Contratista: Ing residente - SST - 1 maestro - 1 oficial - 5 Ayudante.
* Personal Interventoría: Ing residente
* Equipo en Obra: Herramienta menor

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

12-07-2024 Actividades:

Se realiza instalación de refuerzo para vigas de cimentación para columnas en el eje B.

Se realiza demonte de poste de iluminación existente, para esta actividad se asegura que este interrumpido al servicio de energía eléctrica

Posteriormente se realiza excavación, hincada y plomada de poste de concreto de 8mts - 510 kg armado y centrifugado ubicado en donde los planos lo muestran, una vez instalado se procede a realizar la conexión aerea desde el transformador, en cable concentrico 2x8+8x con sus respectivos accesorios.

ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Lluvia

- Personal de contratista: Ing. Residente - SST - 1 maestro - 10 local - 5 Ayudantes
- Personal Interventoría: Ing. Residente
- Equipo en obra: Hta menor

Juan Carlos Angarita
Ing Obra
Ing Interventoría

13-07-2024

Actividades

Se realiza por parte de interventoría liberación y aprobación del refuerzo de viga de amentación del eje B, posteriormente se fundio la viga, se tomaron muestras para pruebas de compresión de concreto

Se inicia excavación para caja de inspección, con las dimensiones para cumplir la pendiente que marca el diseño

- Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
- Personal de contratista: Ing. director - Ing residente - SST - 1 maestro - 1 oficial - 5 Ayudantes
- Personal de Interventoría: Ing. Residente
- Equipo en obra: Mezcladora de concreto - Hta menor

Juan Carlos Angarita

14-02-2024 Actividades

Se realizo desencofrado de viga de amentación del eje B.

Se realizo instalación de refuerzo para viga de amentación en el eje A.

Se realiza instalación de refuerzo para columnas en el eje B, de acuerdo a planos entregados.

Se continua excavación para realizar cajas de inspección con las dimensiones correspondientes.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA lluvia
TARDE Soleado
* Personal de contratista: Ing. Director - Ing. Residente - 1 maestro - 1 oficial - 5 Ayudantes
* Personal de Interventoria: Ing Director - Ing residente
* Equipo en obra: Mini mezc

Ing Obra — Ing Interventor

15-02-2024 Actividades:

Se realizo instalación de refuerzo para viga de amentación en el eje A.

Se realizo instalación de refuerzo para columnas en el eje B.

Una vez el Ing residente de interventoria aprobo la excavación y encofrado, se procede a fundir 1 caja de inspección en el eje B.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA Soleado
TARDE Soleado
* Personal de contratista: Ing residente - SST - 1 maestro - 1 oficial - 5 Ayudante
* Personal de Interventoria: Ing Director - Ing residente
* Equipo en obra: Mezcladora de concreto - Mini mezc

Ing Obra — Ing Interventor

16-07-2024 Actividades:

Se realiza por parte de interventoría liberación y aprobación del refuerzo de viga de cimentación del eje A, despues se procede a fundir la viga. Se tomaron muestras para ensayos de compresión de concreto.

Se realizo instalación de refuerzo para columnas en el eje B.

Se realizo encofrado de cajas de inspección de aguas para el eje A.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
  TARDE: Soleado
* Personal de Contratista: Ing Residente - SSO - maestro - 1 Oficial - 5 Ayudantes
* Personal de Interventoría: Ing residente
* Equipo en Obra: Herramienta - mezcladora de concreto

Ing Obra — Ing Interventor

17-07-2024 Actividades:

Se realiza desencofrado de viga de cimentacion del eje A

Se realiza instalación de refuerzo y encofrado para columnas en el eje B.

Se realiza liberación de ubicación y encofrado por parte de interventoría de cajas de inspección posteriormente se fundio esta en el eje A.

Se realizo excavación para instalar tubería de 6 pulgadas desde eje A hasta el eje B. para conectar aguas lluvias.

Se inicia excavación para instalar tubería de 8 pulgadas para la disposición final de aguas lluvias.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
  TARDE: Soleado
* PERSONAL DE CONTRATISTA: Ing Residente - SSO - 1 maestro - 1 oficial - 5 ayudantes

* Personal de Intervención: Ing Residente
* Equipo en obra: Mini cargadora de concreto

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing. Interventoría

18-07-2024 Actividades

Se realiza por parte de interventoría Liberación y aprobación de refuerzo de columnas del eje B, posteriormente se procede a fundir las columnas. Se toman muestras para ensayo de asentamiento de concreto

Se realiza instalación de tubería sanitaria de 6 pulgadas en el tramo correspondiente con la pendiente de diseño

* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* Personal de contratista: Ing residente - SST - Ingeniero - 5 Ayudantes
* Personal de Interventoría: Ing residente
* Equipo en obra: Mezclador de concreto, Herramienta

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing Interventor

19-07-2024 Actividades:

Se realiza desencofrado de columnas del eje B.
Se continua realizando instalación de refuerzo del segundo nivel de columnas del eje B y posteriormente se realiza fundida de columnas.
Se realiza instalación de tubería sanitaria de 8 pulgadas en el tramo correspondiente con la pendiente de diseño

Estado del tiempo: Mañana: Lluvias leves
Tarde: Lluvias leves
* Personal de contratista: Ing Residente - SST -

1 maestro - 1 oficial - 5 Ayudantes

* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Ing. Residente

* EQUIPO EN OBRA: Herramienta menor

Ing Obra — Juan Carlos Argueta Ing Interventor

20-07-2024 ACTIVIDADES:

Se realiza por parte de interventoria liberación y aprobación de refuerzo de columnas del segundo nivel del eje B, posteriormente se procede a fundir las columnas, se tomaron muestras para ensayos de compresión de concreto.

Se realiza instalación de refuerzo de columnas en el eje A.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Lluvias

TARDE: Soleado

* PERSONAL DE CONTRATISTA: Ing. Residente - SSO - 1 maestro - 1 oficial - 5 Ayudantes

* PERSONAL DE INTERVENTORIA: Ing. Residente

* EQUIPO EN OBRA: Mezcladora de concreto - Herramienta menor

Ing Obra — Juan Carlos Argueta Ing Interventoria

22-07-2024 Actividades:

Se realiza instalación de refuerzo de columnas en el eje A.

Se realiza encofrado de las columnas en el eje A.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado

Tarde: Soleado

* PERSONAL CONTRATISTA: Ing. Residente - SSO - maestro - 1 oficial - 5 ayudantes

* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing. Residente

* Equipo en obra: Hira menor

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing. Interventor

23-07-2024 Actividades

Se realizo instalacion de refuerzo de columnas en el eje A, posteriormente se encofro las columnas. Se inicio a organizar la estructura para viga canal en el eje B.

* ESTADO DE TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* Personal contratista: Ing. Residente - SST - 1 maestro - 1 oficial - 5 ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* Equipo en Obra: Hira menor - Andamios - parales

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing. Interventor

24-07-2024 Actividades

Se continuo organizacion de la estructura para viga canal en el eje B.

* Estado de tiempo - Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista - Ing Residente - SST - 1 maestro - 1 oficial - 5 ayudantes
* Personal Interventoria: Ing Residente
* Equipo en obra: Hira menor - Estructura para A1 N°

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing. Interventor

25-07-2024 Actividades

Se realiza por parte de interventoria liberación y aprobación de refuerzo de columna del eje A, posteriormente se realiza fundida del primer nivel de las columnas, se toman muestras para ensayos de compresión de concreto.

Se continua realizando la estructura para la viga canal del eje B

Se inicia excavación para la conexión electrica principal subterranea.

* ESTADO DEL TIEMPO - MAÑANA - Soleado
TARDE - Soleado

* PERSONAL CONTRATISTA - Ing Director - Ing Residente - 1 maestro 1 oficial - 5 ayudantes

* PERSONAL - INTERVENTORIA - Ing Director - Ing Residente

* EQUIPO EN OBRA - Mini mezcladora de concreto - Estructura de alturas

Ing Obra — Ing Interventoria

26-07-2024 Actividades

Se suspendieron actividades por lluvias fuertes, es muy peligroso trabajar en alturas con lluvias.

27-07-2024 Actividades

Se realizo desencofrado de columnas nivel 1 eje A
Se continua instalando refuerzo para columnas nivel 2, posteriormente se realiza encofrado.
Se inicia instalación de red principal electrica

* Estado de tiempo: Mañana: Lluvias
Tarde: Lluvias

* PERSONAL CONTRATISTA - Ing residente - 1 maestro - 1 oficial - 3 ayudantes

32

* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Estructura de Altura - Hora menor

Ing Obra — Juan Carlos Argueta
Ing Interventor

29-07-2024 Actividades

Se inicio a realizar encofrados de viga canal con formaleta metalica segun los diseños y especificaciones, se continuo estructura en altura eje B se realizo encofrados de columnas del eje A se realizo excavacion para realizar las cajas de inspeccion electricas, se continua instalacion de la red principal electrica

* ESTADO DEL CLIMA: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* PERSONAL DE CONTRATISTA: Ing Residente - SSO - 1 maestro
1 oficial - 3 Ayudantes
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing Residente
* EQUIPO EN OBRA: Hora menor Estructura de Altura

Ing Obra — Juan Carlos Argueta
Ing Interventor

30-07-2024 Actividades

Se realiza por parte de interventoria ubicación y aprobacion de refuerzo de columnas de segundo nivel del eje A, posteriormente se procede a fundir las columnas se tomaron muestras para ensayos de cilindros de concreto se continua estructura a altura
* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana Soleado
Tarde: Soleado
* PERSONAL DE CONTRATISTA: Ing Residente - SSO - Inspector
1 oficial - 5 Ayudantes

JVCB

* Personal de intervención: Ing. Residente.
* Equipo en obra: Mezcladora de concreto - Herramienta menor

Ing. Obra — Juan Carlos Argueta, Ing. Interventor

01-08-2024

Actividades:

Se continuo la instalación de refuerzo y encofrado de la viga canal en el eje B. Asegurando zonas laterales.

* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing. Residente - Sit - Maestro - 1 oficial - 5 Ayudantes
* Personal Interventoría: Ing. Residente
* Equipo en Obra: Estructura en Alturas - Herramienta menor

Ing. Obra — Juan Carlos Argueta, Ing. Interventor

02-08-2024

Actividades:

Se realizo por parte de interventoría revisión - liberación y aprobación de refuerzo e instalación de formaleta de viga canal en el eje B, posteriormente se realiza fundición de viga canal completa, se colocó acelerante de concreto para poder avanzar en el otro eje lineal. Tanto se realizaron muestras de concreto para ensayos de compresión.
Se continuo instalación eléctrica, conexiones en caja de distribución.

* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing. Residente - SST - Maestro - 1 oficial - 5 ayudantes - 2 electricistas
* Personal Interventoría: Ing. Residente

	* Equipo en obra: Mezcladora de concreto - Vibradora menor
	Juan Carlos Argueta
	Ing Jefe Ing Inspector
03-08-2024	Actividades:
	Se realizo fundicion de tapas de concreto para las cajas de inspeccion de aguas lluvias en el eje N 4 eje B
	Se continua realizando instalaciones electricas, conexiones en cajas de distribucion
	* Estado del tiempo: Mañana: Lluvias leves
	Tarde: Soleado
	* Personal contratado: Ing Residente - SST - 1 maestro de obra - 5 Ayudantes - 2 electricos
	* Personal Interventoria - Ing Residente
	* Equipo en obra: Vibradora menor
	Juan Carlos Argueta
05-08-2024	Actividades
	Se hace la elaboracion de brazos metalicos, los cuales van a soportar los reflectores
	Se continua realizando instalaciones electricas de red principal desde el eje A al eje B4 por parte Subterranea
	* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
	Tarde: Soleado
	* Personal contratado: Ing Residente - SST - 1 maestro de obra - 5 Ayudantes - 2 electricos
	* Personal Interventoria: Ing Residente
	* Equipo en obra: Vibradora menor - Taladro
	Juan Carlos Argueta
	Ing Obra Ing Interventor

14-08-2024 Actividades

Una vez recibido los resultados de la muestra de concreto concluida a edad de 3 días, el concreto de la viga canal esta sobre el 70%, cumpliendo lo programado.

Se inicia a realizar desencofrado de la viga canal en zonas donde no se vea afectada la estabilidad de la viga canal, en zonas laterales sin intervenir la base de la estructura.

Se continua realizando instalaciones electricas en piso de la red principal

* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing. Residente - 1 maestro - 1 oficiales - 2 ayudantes - 2 electricos
* Personal supervisión: Ing. Residente
* Equipo en obra: Equipo en Alturas - Hilti menor

Ing Obra — Ing. Inspector

15-08-2024 Actividades

Se continua realizando desencofrado de la viga canal en zonas donde no se vea afectada la estabilidad de la viga canal solo en zonas laterales.

Se continua conexiones electricas se realiza la instalación del conduit con todos sus accesorios

Se realiza la observación en obra para dar cumplimiento a actividades no previstas para dar cumplimiento de la mejor manera el proyecto.

* Estado del tiempo: Mañana: Lluvia
Tarde: Lluvia
* Personal contratista: Ing. Residente - 1 maestro - 6 ayudantes - 1 oficial - 2 electricos

NYCR

* Personal Intervenido: Ing. Residente
* Equipo en Obra: Hora menor - Taladro

Juan Carlos Angeles
Ing. Obra

Juan Carlos Angeles
Ing. Inspector

08-08-2024

Actividades:

Se inicia instalación de estructura en altura para la viga canal en el eje A

Se continua retirando la estructura en el eje B.

* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

- Personal de contrata: Ing. residente - SST - 1 maestro 1 operario - 5 ayudantes
- Personal Intervenido: Ing. Residente.
- Equipo en obra: Hora menor - Estructura en Altura

Juan Carlos Angeles
Ing. Obra

Juan Carlos Angeles
Ing. Inspector

04-08-2024

Actividades:

Se continua la instalacion de estructura en Altura para la viga canal del eje A.

Se continua conexion electrica en viga canal, conexion de tuberia emt.

* Estado del tiempo: Mañana: Lluvias leves
Tarde: Lluvias leves
* Personal en obra: Ing. residente de obra - SST - 1 maestro - 1 operario - 3 ayudantes - 2 electricos
* Personal Intervenido: Ing. Residente
* Equipo en Obra: Hora menor - Taladro

Juan Carlos Angeles
Ing. Obra

Juan Carlos Angeles
Ing. Inspector

MKB

-08-2024 Actividades:
Se continua la instalación de estructura en alturas para la viga canal del eje A
Se continua conexión electrica en la viga canal del eje B, conexion tuberia EMT
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* Personal contratista: Ing Residente - SST - 1 maestro 1 oficial - 3 Ayudantes - 2 electricos
- Personal Interventoria: Ing Residente - Ing Director
* Equipo en obra: Hidrolavadora - Taladro.

Ing Obra — Juan Carlos Argento Ing Interventor.

-08-2024 Se continua la instalacion de estructura en alturas encofrado para la viga canal del eje A
Se instala acometida electrica para la viga canal del eje B
* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* Personal contratista: Ing residente - SST - 1 maestro - 1 oficial - 3 ayudantes
* Personal Interventoria: Ing residente
* Equipo en obra: Hidrolavadora - Taladro

Ing Obra — Juan Carlos Argento Ing Interventor.

-08-2024 Actividades:
Se continua la instalacion de la estructura en alturas encofrado para la viga canal del eje A
Se continua instalando la acometida electrica para el eje B (electrones)

* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing residente - SST - 1 maestro
1 oficial - 5 ayudantes - 2 electricos
* Personal Interventoría: Ing residente
* Equipo en obra: Hora mano - Taladro

Juan Carlos Angarita
Ing Obra — Ing. Interventor

19-08-2024 Actividades:
Se continua la instalación de la estructura en Altoreas, encontrado para la viga canal del eje
Se realiza con formaleta metalica.
* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: Lluvias fuertes
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing residente - SST - 1 maestro
1 oficial - 5 ayudantes
* Personal Interventoría: Ing residente
* Equipo en obra: Hora mano - Taladro

Juan Carlos Angarita
Ing Obra — Ing. Interventor

15-08-2024 Actividades
Se realiza encofrado e instalación de refuerzo de viga canal en el eje A
Se inicia instalación de muro actual en la viga canal del eje B.
* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: Lluvias leves
Tarde: Lluvias leves
* Personal contratista: Ing residente - SST - 1 maestro
1 oficial - 5 ayudantes

MCB

* Personal Interventoria: Ing Residente
* Equipo en obra: Mira menor compleat.

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing. Interventor

08-08-2024 Actividades:

Se realizo encofrado e instalación de refuerzo de viga canal del eje A.

Se continua instalación de manto zetal en la viga canal del eje B

* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing. Residente - SST - 1 maestro 1 oficial - 5 Ayudantes.
* Personal Interventoria: Ing. Residente
* Equipo en obra: Mira menor - Soplete de gas

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing. Interventor

09-08-2024 Actividades:

Se realiza encofrado e instalación de refuerzo de viga canal del eje A.

Se termina instalación de manto zetal en la viga canal del eje B

* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing. Residente - SST - 1 maestro 1 oficial - 5 Ayudantes.
* Personal Interventoria: Ing. Residente
* Equipo en obra: Mira menor

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing. Interventor

18-08-2014 Actividades:

Se realiza por parte de interventoría revisión - liberación y aprobación de refuerzo e instalación de formaleta de viga canal del eje A, posteriormente se realiza fundición de viga canal de forma monolítica, se utiliza vibrador de concreto para darle cumplimiento al proyecto, se realizaron muestras de concreto para ensayos de compresión.

* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing Residente - SST - 1 maestro y oficial - 5 Ayudantes.
* Personal Interventoría: Ing Residente
* Equipo en obra: Mezcladora de concreto - Mini mixer

Juan Carlos Argenis
Ing Obra — Ing Interventor

20-08-2014 Actividades:

Se inicio a realizar excavación de zanja en el eje B

Se continua instalación eléctrica para obra en el eje A

* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: Ilusion lluvia - fuerte
  Tarde: Soleado
* ESTADO DE TIEMPO: Area labores en la mañana se suspendieron actividades 2 horas.
* Personal contratista: Ing residente - SST - 1 maestro - 1 oficial - 5 ayudantes
* Personal Interventoría: Ing Residente
* Equipo en obra: Mini mixer - andamios

Juan Carlos Argenis
Ing Obra — Ing Interventor

NCE

21-08-2024 Actividades:

Se continúa realizando excavación de cuneta en el eje B

Se realiza instalación eléctrica parte aérea del eje A para tubería EMT

- Estado del tiempo: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
- Personal Contratista: Ing. Residente - SST - 1 maestro 1 oficial - 3 Ayudantes
- Personal Interventoría: Ing. Residente
- Equipo obra: Mini cargador

Ing. Obra — Juan Carlos Angarita Ing. Interventor

22-08-2024 Actividades:

Se realiza encofrado e instalación de malla electrosoldada para posteriormente fundir la cuneta en el eje B.

Se realiza instalación eléctrica de canaletas en la red de los reflectores en el eje A

Se inicia instalación de bajantes en tubería de 4 pulgadas que recojen agua de cubierta

- Estado del tiempo: Mañana: Lluvia
  Tarde: Lluvia
- Personal Contratista: Ing. Residente - SST - 1 maestro - 1 oficial - 3 Ayudantes - 2 electricos
- Personal Interventoría: Ing. Residente
- Equipo en Obra: Mini cargador - Taladro

Ing. Obra — Juan Carlos Angarita Ing. Interventor

23-08-2024 Actividades:

Se inicia a realizar excavación de cuneta en el eje A

42

Se inicio a realizar desencofrado de la viga cerea en el eje A, despues de retirar resultados de los ensayos sometidos a compresion de concreto ,de 3 dias, el retiro se hace sin afectar la estabilidad de la estructura.
Se termina instalacion de acometido electrico en eje A y B con sus respectivos accesorios.
Se continua excavacion y posteriormente encofrado de la viga en el eje A.
*Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing Residente -SST- 1 maestro - 1 oficial - 3 Ayudantes -
* Personal Interventoria - Ing residente - Ing Ducloy
* Equipo en Obra - Mini mezc - Andamios.

Ing Obra — Ing Interventor

29-08-2024

Actividades
Se realiza fundicion de concreto ubicado en el eje A
Se continua a realizar desencofrado y retiro de entrada en altura de viga canal en el eje A, teniendo en cuenta la estabilidad de la viga canal aerea.
Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Personal contratista: Ing residente - SST - 1 maestro - 1 oficial - 3 Ayudantes
Personal Interventoria: Ing residente
Equipo en Obra: Mini mezc.

Ing Obra — Ing Interventor

26-08-2024 Actividades

Se continuo a recibir desencofrado y retiro de estructura en altura de viga canal en el eje A, Teniendo en cuenta la estabilidad de la viga aerea.

- Estado del tiempo: Mañana: Lluvia, Fuerte
  Tarde: Lluvia, fuerte
- Personal contratista: Ing Residente - Ing. directo - 1 maestro - 1 oficial - 3 Ayudantes
- Personal Interventoria: Ing Residente
- Equipo en obra: Herramienta menor

Firmas

Ing Obra — Ing. Interventor

24-08-2024 Actividades

Se realizo retiro de estructura en altura y desencofrado total de viga canal en el eje A, dejando refuerzos con una separacion considerada para no afectar la estructura.
Se inicio a realizar instalacion de muro total en la viga aerea en el eje A.

- Estado del tiempo: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
- Personal contratista: Ing. Residente - SST - 1 maestro - 1 oficial - 3 Ayudantes
- Personal Interventoria: Ing. Residente
- Equipo en obra: Herramienta menor

Firmas

Ing Obra — Ing. Interventor

27-08-2024 Actividades

Se realizo instalacion de muro total en la viga aerea en el eje A.
Se inicio elaboracion de lamina en cubre [illegible]

	la elaboración la realiza un personal especializado y capacitado para la ejecución de esta actividad, utilizando el equipo necesario y adecuado para entregar un elemento de calidad como lo exige las especificaciones técnicas ESTADO DE TIEMPO: Mañana: Nubes leve Tarde: Nubes leve * Personal contratista: Ing Residente - SST - 1 maestro - cuadrilla 3 Ayudantes - Cuadrilla de cubierta * Personal Interventoría: Ing Residente * equipo en Obra: Grua - Mini mezc - Maquina soladora KOZ Juan Carlos Angarita Ing Obra Ing Interventor
29-08-2024	Actividades: Se continua elaboración de lamina en calibre 22, la realiza el personal especializado y capacitado para la ejecución de esta actividad, utilizando el equipo necesario y adecuado para entregar un elemento de calidad como lo exigen las especificaciones técnicas *ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: Soleado Tarde: Nubes leve * Personal contratista: Ing residente - SST - 1 maestro - cuadrilla de cubierta * Personal de Interventoría: Ing Residente * Equipo en obra: Grua - Mini mezc - maquina soladora KOZ Juan Carlos Angarita Ing Obra Ing Interventor
30-08-2024	Actividades: Una vez elaborada la totalidad de las laminas de material calibre 22, con un ancho de 60 cm y el largo correspondiente se procede a realizar la

Instalación de la cubierta autoportante, para esta actividad todo el personal esta capacitado y cuentan con la experiencia que se exige para ejecutar este tipo de actividad.

- Estado del tiempo: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
- Personal contratista: Ing Residente - SSO - 1 maestro - cuadrilla de cubierta
- Personal de Interventoria: Ing Residente
- Equipo en Obra: Grua - Hiab menor - maquina roladora kor

Juan Carlos Angarita
Ing Obra — Ing Interventor

31-08-2024

Actividades:

Se continua Instalación de la cubierta autoportante, con laminas de calibre 22, todo el personal esta capacitado y cuentan con la experiencia que se necesita para ejecutar este tipo de actividad se utilizo una grua para instalar las laminas de la cubierta

- Estado del tiempo: Mañana: Lluvias leves
  Tarde: Soleado
- Personal contratista: Ing Residente - SSO - 1 maestro - cuadrilla de cubierta
- Personal Interventoria: Ing Residente
- Equipo en Obra: Hiab menor, maquina roladora, kor

Juan Carlos Angarita
Ing Obra — Ing Interventor

01-09-2024

Actividades:

Se termina Instalación de la cubierta autoportante, con laminas de calibre 22, todo el personal esta capacitado y cuentan con la experiencia que se exige para ejecutar este tipo de actividad.

46

Una vez instalada se verifica por el Ing residente de Interventoria que se cumplan todas las condiciones de seguridad y el buen funcionamiento de la estructura de la cubierta auxiliar

* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
* Personal Contratista: Ing Residente - SST - 1 maestro - cuadrilla de cubierta
* Personal Interventoria: Ing Residente
* equipo en obra: Hta menor - grua - maquina roladora 14oz

Ing Obra

Juan Carlos Angarita
Ing Interventor

02-09-2019

Actividades:

Se inicia a instalar los largo mediante 12 soportes para rejilla en tubo redondo galvanizado de 1 1/2" y platinas con perforaciones para sujetar el soporte con los elementos que muestran los planos electricos el material cumple las especificaciones tecnicas del proyecto

* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: lluvias leves
  Tarde: Soleado
* Personal Contratista: Ing Residente - SST - 1 maestro - 2 electricos
* Personal Interventoria: Ing Residente
* equipo en obra: Hta menor - Taladro

Ing Obra

Juan Carlos Angarita
Ing Interventor

03-09-2024 Actividades:

Se continua realizando conexion electrica para los reflectores del eje A-1-3.

Se continua la instalacion de los brazos mediante los reflectores en tubo redondo galvanizado de 1 1/2" y placas con perforaciones para sujetar el soporte con las dimensiones que muestra los planos electricos

* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing residente-sistemas-maestro- 2 tecnicos electricos
* Personal Supervision: Ing residente
* Equipo en Obra: Una mesa-Taladro

Ing Obra — Juan Carlos Argueta Ing. Inspector

04-09-2024 Actividades:

Se continua realizando conexión electrica para los reflectores del eje A-1-3

Se continua instalacion de brazos en tubo redondo galvanizado de 1 1/2" con sus respectivos accesorios

* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing residente-sistemas-maestro-2 tecnicos electricos
* Personal Supervision: Ing residente
* Equipo en obra: Una mesa-Taladro

Ing Obra — Juan Carlos Argueta Ing. Inspector

05-09-2024 Actividades

Se continua realizando conexion electrica para la red de los reflectores en eje A y B

Se realiza instalacion de cableado en la caja de distribucion electrico

En la tarde se inicia a desencofrar la viga que se realizo en las partes laterales para asi cargar nuevamente la estructura, se deja los bases como sopite, Perdon de resolucion limpieza general

* Estado de tiempo: Mañana Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing residente - SST - Maestro
2 tecnicos electricos - 1 Ayudante
* Personal Interventoria: Ing Residente
* Equipo en obra: Hiab mini - Taladro

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

06-09-2024 Actividades

Se continua realizando conexion electrica para la red de los reflectores en el eje A y B

Se realiza instalacion de cableado en la caja de distribucion electrico

* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing residente - SST - Maestro
2 tecnicos electricos - 1 ayudante
* Personal Interventoria: Ing Residente
* Equipo en Obra: Hiab mini - Taladro

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

07-09-2024 Actividades:

Se continua realizando conexion electrica para la red de los reflectores en el eje A-B.

Se inicio conexion electrica para tomacorrientes ubicados en el eje A

- Estado del tiempo: MAÑANA: lluvias leves.
  TARDE: lluvias leves.
- Personal contratista: Ing residente - 1 maestro - 2 tecnicos electricos - 1 ayudante.
- Personal interventoria: Ing residente
- Equipo en obra: Hidrolavadora - taladro.

Ing Obra — Juan Carlos Agarita Ing Interventor.

09-09-2024 Actividades:

Se realiza comunicacion entre la entidad, la interventoria y el contratista, para dialogar de items no previstos que son necesarios para cumplir a satisfaccion el proyecto.

Se continua realizando conexion electrica, se inicio la instalacion de los reflectores.

Se continua la instalacion de bandejas en tubo galvanizado con sus accesorios.

- Estado del tiempo: MAÑANA: Soleado.
  TARDE: Soleado.
- Personal contratista: Ing residente - 1 maestro - 2 tecnicos electricos - 1 ayudante.
- Personal interventoria: Ing residente
- Equipo en obra: Hidrolavadora - taladro.

Ing Obra — Juan Carlos Agarita Ing Interventor.

10-09-2014 Actividades

Se continua realizando la conexion electrica para toma corrientes.

Se continua con la instalacion de los 12 reflectores.

En la actividad de la caseta sanitaria de 8" hace falta instalacion de 1 tubo, se realiza esta actividad en la pendiente correspondiente

* ESTADO DEL CLIMA: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

- Personal contratista: Ing residente - SSO - 1 maestro
2 tecnicos electricos - 1 ayudante
- Personal Intervencion: Ing residente
- Equipo en obra: Hta menor

Juan Carlos Argandoña
Ing Obra Ing Interventor

11-09-2014 Actividades

Se realiza instalacion de reflectores en los brazos instalados

Se realiza instalacion de toma corrientes, como lo muestra los diseños electricos

Se realiza desmonte de tablero de caseta multipropositos

* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: Lluvias leves
Tarde: Soleado
- Personal contratista: Ing residente - SSO - 1 maestro
2 tecnicos electricos - 1 Ayudante
- Personal Intervencion: Ing residente
- Equipo en Obra: Hta menor

Juan Carlos Argandoña
Ing Obra Ing Interventor

NC

12-09-2024 Actividades:

Se termino de instalar los reflectores en cada columna

Se inicia a realizar limpieza de cancha multipropósito

- EQUIPO EN OBRA: Hora menor
- ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
- Personal contratista: Ing. Residente - SSO - 1 maestro - 2 técnicos electricos - 1 ayudante
- Personal Interventoría: Ing. Residente

Ing Obra — Juan Carlos Argueta Ing. Interventor

13-09-2024 Actividades:

Se solicita información sobre los recursos adicionales para la cual la interventoría nos informa que el trámite esta en proceso de estudio.

Para poder realizar la demarcación se debe lavar la placa y dejar secar el mismo, 3 días, lo cual la hicieron ayer por lo anterior se realizo limpieza en la cancha funcional

- ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
- Personal contratista: Ing. Residente - SSO - 1 maestro - 1 ayudante - 1 Albañil
- Personal Interventoría: Ing. Residente
- EQUIPO EN OBRA: Hidrolavadora - Hora menor

Ing Obra — Juan Carlos Argueta Ing. Interventor

52

14-04-2024 Actividades:
Se realiza lavado de cocha multipropósito con hidrolavadora.
Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
Personal de Obra: Ing residente - 1 maestro - 2 ayudantes
Personal Interventoría: Ing Residente
Equipo en obra: Herramienta Hidrolavadora

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

16-04-2024 Actividades:
Se tapa la placa en los barales que son los expuestos a basura o mugre. Se debe cumplir 3 días de limpieza seca
* ESTADO DEL TIEMPO: Mañana: lluvia, leve.
Tarde: Soleado
* Personal contratista = Ing Residente - 1 maestro - 2 ayudantes
* Personal Interventoría: Ing residente
* Equipo en obra: Herramienta

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing. Interventor

17-04-2024 Se realiza constante vigilancia para que la placa este limpia y poder realizar la demarcación como lo indica la ficha técnica
Se acuerda a la entidad de gestionar los recursos para poder realizar los ultimos puntos y culminar el proyecto

NKA

18-09-2024 Actividades:

Se inicia a realizar la demarcación de cancha multifuncional - realizando demarcación de cancha de microfutbol - baloncesto - Voleibol

* Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

* Personal contratista: Ing Residente - 1 maestro - 1 ayudante

* Personal Interventoría: Ing Residente

* Equipo en Obra: Hiro menor

Ing Obra

Ing Interventor

19-09-2024 Actividades:

Se continua realizando la demarcación de la cancha multifuncional - microfutbol - baloncesto - voleibol

* Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

* Personal contratista: Ing Residente - 1 maestro - 1 ayudante

* Personal Interventoría: Ing Residente

* Equipo en obra: Hiro menor

Ing Obra

Ing Interventoría

20-09-2024 Actividades:

Se termina las actividades de demarcación de la cancha multifuncional - microfutbol - baloncesto - Voleibol

Estado del clima: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado

NKA

*Personal contratista: Ing Residente - 537- 4 meses
y ayudante
*Personal Interventoria: Ing Residente
*Equipo en Obra: Hira mesa

Juan Carlos Angarita
Ing Obra — Ing Interventor

21-09-2024 Se realiza solicitud verbal a interventoria por información de aprobación de recursos para realizar actividades que correspondan a los No pruebas la interventoria que esta en proceso de revisión de todos los documentos por parte de la entidad

24-10-2024 Este día informan por parte de la entidad Invox Avila, que el adicional de recursos ya se aprobo el recurso de adiciones presupuestales para el proyecto, con el cual ya se pueden ejecutar actividades de items no previstos.
Despues de la inpormación se realiza la compra de las rejillas prefabricadas, puesto que el distribuidor necesita 4 dias para elaborarlas.

* ESTADO DE TIEMPO MAÑANA: Soleado
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing residente - SST - Maestro - 1 ayudante
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing. Residente
* EQUIPO EN OBRA: Hora menor

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

25-10-2024 Actividades
Se inicia a realizar demolición de concreto existente posteriormente se realiza retiro de material sobrante a zona de disposición final.
Se inicia la instalación de acometida aereas en cable concentrico 2+8+8 600V desde el poste del transformador hasta el poste principal donde se encuentra el medidor.

* ESTADO DEL TIEMPO: MAÑANA: Nuves lueve
TARDE: Soleado
* PERSONAL CONTRATISTA: Ing. Residente - SST - Maestro - 2 Ayudantes - 2 tecnicos electricos.
* PERSONAL INTERVENTORIA: Ing. Residente
* EQUIPO EN OBRA: Hora mano - demoledor de concreto

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

56

26-10-2024 Actividades

Se continua realizando demolicion de concreto en aceras posteriormente se realiza disposicion de material sobrante

Se termina de realizar la colocacion de la tierra externa, con lo cual el colisco queda listo para la iluminacion

Se inicio a realizar excavacion para realizar la placa faltante

* Estado del clima: Mañana Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing residente - SSO - 1 maestro
4 Ayudantes - 3 techos, 1 colisco
* Personal Interventoria: Ing residente
* Equipo en Obra: Mini mezcladora

Juan Carlos Angarita
Ing Obra
Ing Interventor

28-10-2024 Actividades

Se continua realizando demolicion de concreto en concreto posteriormente se realiza disposicion de material sobrante

Se continua actividades de excavacion de tierra donde se va a realizar la placa de concreto

* Estado del clima: Mañana Soleado
Tarde: lluvia, lleva
* Personal contratista: Ing residente - SSO - 1 maestro
4 Ayudantes
* Personal Interventoria: Ing residente
* Equipo en Obra: Mini mezcladora

Juan Carlos Angarita
Ing Obra
Ing Interventor

29-10-2024 Actividades

Se termino de realizar la dendón de concreto en los ejes A-1 B

Se continua realizando excavación manual para fundir la placa de contrapiso en concreto.

Se inicio a instalar malla de refuerzo para placa de contrapiso.

- Estado del tiempo: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
- Personal contratista: Ing Residente - SST - 1 maestro - 4 Ayudantes
- Personal Interventoria: Ing Residente
- Equipo en obra: 1 Mezcladora - demoledor

Ing Obra — Ing Interventor

30-10-2024 Actividades

Se labro con el Ing interventor el refuerzo de mallas y el encofrado de la placa del eje B, posteriormente se procede a fundir la placa de concreto de 2000 psi.

- Estado del tiempo: Mañana: Soleado
  Tarde: Lluvia leve a fuerte,
- Personal contratista: Ing Residente - SST - 1 maestro - 4 Ayudantes
- Personal Interventoria: Ing Residente
- Equipo en Obra: 1 mezcladora de concreto - vibrador.

Ing Obra — Ing Interventor

31-10-2014 Actividades

Se realiza corrido de la placa huella en el eje B

Se continua realizando encuestas para realizar la placa de concreto

Se realiza entrega de cemento electrico y hidroejector donde se realiza su funcionalidad

* Estado del tiempo Mañana Soleado
Tarde Soleado
* Personal contratista Ing Residente - Sin Maestro
- 4 Ayudantes
* Personal Interventoria Ing Residente
* Equipo en obra Mezcladora

Ing Residente
Ing Obra

01-11-2014 Actividades

Se realiza corrido de la placa huella en el eje B

Se continua realizando pruebas realizando la placa de concreto en el eje B

* Estado del tiempo Mañana Soleado
Tarde Soleado
* Personal contratista Ing Residente - Sin Maestro
4 Ayudantes
* Personal Interventoria Ing Residente
* Equipo en Obra Mezcladora

Ing Residente
Ing Obra

02-11-2024 Actividades:

Se continua realizando excavacion y relleno para llegar a nivel y fundir placa faltante en el eje A.

Llego a obra las rejillas prefabricadas para las cunetas se realiza el respectivo descargue

-Estado del clima: Mañana - Soleado

Tarde - lluvias leves

* Personal de contratista: Ing residente - SSI - Maestro - 4 Ayudantes

* Personal Interventoria: Ing Residente

* Equipo en obra: Hira menor -

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

04-11-2024 Actividades:

Se continua excavación de terreno e instalación de malla electrosoldada para placa en el eje A.

Se realiza instalacion de rejillas prefabricadas para las cunetas, se realiza la instalacion como se habia diseñado

* Estados del clima: Mañana: Soleado

Tarde: Soleado

* Personal contratista: Ing Residente - SST - 1 maestro - 4 Ayudantes

* Personal Interventoria: Ing Residente

* Equipo en Obra: Hira menor.

Ing Obra — Juan Carlos Angarita Ing Interventor

08-11-2024 Actividades:

Se libera retiro y formaleta con el Ing Residente

de placa para fundir en el eje A posteriormente se realiza fundición de placa de contrapiso toda de la cancha multifuncional.

Se termino de instalar las rejillas perforadas en los ejes A y B.

- Estado del tiempo: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
- Personal contratista: Ing residente - SST - Maestro 4 ayudantes - Diseño
- Personal Interventoría: Director Obra - Residente
- Equipo en Obra: Mini retro - mezcladora - vibrador de concreto

Ing Obra — Juan Carlos Angarita, Ing Interventor

06-11-2024 Actividades

Se realizo curado correspondiente a la placa fundida en el eje A.

Se inicio actividad de instalación de los tableros y mallas para cancha multifuncional

- Estado del tiempo: Mañana: Soleado
  Tarde: Soleado
- Personal en Obra: Ing residente - SST - Maestro - 4 ayudantes
- Personal Interventoría: Ing Residente
- Equipo en Obra: Mini retro

Ing Obra — Juan Carlos Angarita, Ing Interventor

02-11-2024 Actividades

Se inicia a realizar con cortadora de concreto los juntas de dilatación correspondientes a

NKB

la placa de contrapiso fundida.
Se continua actividad de instalacion de los tableros y mallas para canchas multifuncionales.
- Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado - lluvias leves
- Personal contratista: Ing residente - SSO - 1 maestro - 4 Ayudantes
- Personal Interventoria: Ing Residente
- Equipo en Obra: Mini mezcladora de concreto.

08-11-2024

Actividades:
Se continua actividad de corte y sello de juntas de dilatación correspondiente a la placa externa fundida en el eje A y B.
Se termina de instalar los marcos y mallas en la cancha multifuncional.
Se inicia mantenimiento de limpieza para los marcos de la canchas.
- Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
- Personal contratista: Ing residente - SSO - 1 maestro - 3 Ayudantes
- Personal Interventoria: Ing residente
- Equipo en Obra: Mini mezcladora de concreto.

Luis Carlos Angarita
Ing Obra
Ing Interventor

09-11-2024

Actividades:
Se continua la actividad de corte y sello de juntas de dilatación correspondiente a la placa externa fundida en el eje A y B.
Se continua con mantenimiento de los marcos de la cancha multifuncional.

62

Estado del tiempo: Mañana: Soleado - Lluvias leves
Tarde: Soleado

* Personal contratista = Ing Residente - SST - 1 Maestro
1 Ayudante
* Personal Interventoría = Ing Residente
* Equipo en Obra = Hta menor = Retiro de cemento

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing Interventor

10-11-2024 Actividades

Se realiza el mantenimiento total de las estructuras de la cancha multifuncional contra de limpieza y pintura a toda la estructura.

Con lo anterior se da cumplimiento a las actividades contempladas en el proyecto.

* Estado del tiempo: Mañana: Soleado
Tarde: Soleado
* Personal contratista: Ing Residente - Director - SST
1 maestro - 1 Ayudante
* Personal Interventoría: Ing Residente
* Equipo en Obra = Hta menor

Ing Obra — Juan Carlos Angarita
Ing Interventor

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Certificado de paz y salvo

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

El Suscrito Representante Legal de la Compañía:

SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS
Nit No. 891.101.100-5

CERTIFICA QUE:

Que tiene bajo su propiedad y custodia los siguientes vehículos vehículo

1. CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA CHEVROLET, LINEA LUV DMAX DE PLACA TBY 298.
2. CAMIONETA CABINADA BMW , DE PLACA HKS 891

Los vehículos anteriormente descritos se utilizaron para la ejecución del contrato CIHCM411 DE 2023, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA LAS AGUILAS Y VEREDA LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA.".

La misma fue utilizada en el periodo comprendido del 09 de noviembre de 2023 al 27 de diciembre 2023 y de 30 mayo del 2024 al 12 de noviembre 2024.

La presente certificación se emite a solicitud del interesado

Dada en Neiva a los Diecisiete (17) días de octubre de 2025

Cordialmente;

JAVIER BARRERO MOSSOS
CC No 7.685.694 de Neiva
Rep. Legal SOTA SAS
Cel 3186081555
Email comercial@sotaic.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10006483233

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
HKS891	BMW	X3 XDRIVE20I	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.997	BLANCO ALPIN	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMPERO	CABINADO	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
A5610552	N	WBAWX3105E0G12918

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
******	N	WBAWX3105E0G12918	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)		IDENTIFICACIÓN
SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA	N	891101100

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
	*******	184

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	I/E	FECHA IMPORT.	PUERTAS
192013000079520	I	27/09/2013	5


LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD


******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
04/12/2013	04/12/2013	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SDM - BOGOTA D.C.





LT03000503274

350

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO	MES	DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO	MES	DÍA
2025	4	25	2025	4	26	2026	4	25

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91228789 - 611973397	HKS891	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	1997	2014

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	B M W	CABINADO

LÍNEA VEHÍCULO: X3xDrive20i

No. MOTOR	No. CHASIS o No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
A5610552	WBAWX3105E0G12918	WBAWX3105E0G12918	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	3176397051	NIT	891101100	BOGOTA D.C.

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91228789	11001


TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
22	$ 733.400	$ 381.300	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.116.800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluidas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.17 16:53:05 -05:00

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Civil Familiar
- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público de Pasajeros
- Crédito
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- Bogotá: (+601) 327 47 12/13
- Nacional: 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018248085

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TBY298	CHEVROLET	LUV D MAX	2011

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.000	BLANCO MAHLER	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	DOBLE CABINA	DIESEL	5

NÚMERO DE MOTOR
897992

REG N

VIN
8LBETF3E1B0059195

NÚMERO DE SERIE
****

REG N

NÚMERO DE CHASIS
8LBETF3E1B0059195

REG N

PROPIETARIO: APELLI D(S) Y NOMBRE(S)
SOCIEDAD TEC NICA SOTA LTDA

IDENTIFICACIÓN
NIT 891101100

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
372010000010060

I/E
I

FECHA IMPORT.
30/06/2010

PUERTAS
4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******



FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
15/07/2010	25/04/2019	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
UND MCPAL TTOYTTE PALERMO

LT01008027461

352

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA							
AÑO	MES	DÍA			AÑO	MES	DÍA		AÑO	MES	DÍA
2025	5	12		DESDE LAS 00 HORAS DEL	2025	5	13	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	2026	5	12

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91399898 - 612088603	TBY298	CAMPEROS Y CAMIONETAS	PARTICULAR	3000	2011

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	CHEVROLET	DOBLE CABINA
	LÍNEA VEHÍCULO: LUVDMAX	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
897992	8LBETF3E1B0059195	8LBETF3E1B0059195	0,00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SOCIEDAD TECNICA SOTA S.A.S.	3186081555	NIT	891101100	PALERMO

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91399898	11001


TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
23	$ 833.500	$ 433.400	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.269.000


FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VÍCTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?

Seguro Ter-cero



Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:
•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:
•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos
•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data
Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cual puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/politica-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos. Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos
[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022.
[3] Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1 4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1 4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.17 16:49:42 -05:00

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- SOAT
- Accidentes Personales
- Arriendos
- Disfruta Tranquilo
- Conduce Tranquilo
- Vida
- Responsabilidad Civil Familiar
- Cumplimiento
- Judiciales
- Ingeniería
- RCE Transporte Público de Pasajeros
- Crédito
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- Bogotá: (+601) 327 47 12/13
- Nacional: 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia
Contenido protegido por derechos de autor

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181178348

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA REIMAR LA TOMA NEIVA LTDA.

NIT:	900114915	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-OIN-041-003
Fecha de expedición:	2025/05/12	**Fecha de vencimiento:**	2026/05/12

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	TBY298	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2011
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3000	**NRO. MOTOR:**	897992
NRO. CHASIS:	8LBETF3E1B0059195	**VIN:**	8LBETF3E1B0059195
LÍNEA:	LUV D MAX		
COLOR:	BLANCO MAHLER		

NOMBRE PROPIETARIO: SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA

FIRMA DEL RESPONSABLE

ALVIN REINOSO MARTINEZ

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Certificado de paz y salvo Ministerio de Protección Social

Trabajo

No. Radicado: 08SE2025904139600005587
Fecha: 2025-09-08 02:48:37 pm
Remitente: Sede: D. T. HUILA
Depen: INSPECCIÓN LA PLATA
Destinatario SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS
Anexos: 0 Folios: 1
08SE2025904139600005587

EL SUSCRITO DIRECTOR TERRITORIAL DE HUILA DEL MINISTERIO DEL TRABAJO

HACE CONSTAR QUE:

Una vez verificado el sistema de información de reclamaciones, investigaciones administrativo-laborales y sanciones de la Dirección Territorial de Huila, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencio lo siguiente:

Radicado de la solicitud	05EE2025904139600004604
Nombre y/o Razón Social	SOCIEDAD TECNICA SOTA SAS
Identificación	891101100-5

En el periodo comprendido entre el 8/09/2024 al 7/09/2025 correspondiente al último año contado a partir de la fecha de expedición:

- **SANCIONES:** No. Registra
- **RECLAMACIONES:** No. Registra
- **INVESTIGACIONES**: No. Registra

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines legales pertinentes y tiene validez en los municipios de la Jurisdicción que le corresponden a la Dirección Territorial del Huila del Ministerio del Trabajo, de conformidad con lo estipulado en el artículo primero, numeral 20 de la Resolución 3455 del 16/11/2021 del Ministerio del Trabajo.

Neiva Huila, lunes 8 de septiembre de 2025

GUILLERMO MATEO MONROY GUTIERREZ
Director Territorial del Huila

Elaboro: mandradel
Reviso/ Aprobó: Gmonroy

Para verificar la validez de este documento escaneé el código QR, el cual lo redireccionará al repositorio de evidencia digital de Mintrabajo.

SOTA S.A.S.
SOCIEDAD TECNICA SOTA
INGENIEROS CIVILES

Certificado de Caja de Compensación Familiar

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

142736-891101100-2

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES DE COMFAMILIAR HUILA

CERTIFICA QUE:

La Empresa **SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA** identificada con Nit No. **891.101.100,** se encuentra en estado **Activo** en nuestro sistema y cancela Aportes Parafiscales por los periodos de 202311 a 202412 **CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA**, así:

Anexo: Kardex de aportes

"La expedición de este documento no impide que Comfamiliar Huila pueda realizar visitas de verificación de la correcta y oportuna liquidación de los aportes, bases de liquidación y el pago oportuno de los mismos. (Decreto 562/9)

'ESTE CERTIFICADO NO ES VALIDO PARA AFILICIACIÓN A OTRAS CAJAS DE COMPENSACION NI COMO SOPORTE DE PAGO DE PARAFISCALES POR CONTRATOS'.

Dicha certificación se expide a los 22 días del mes de Octubre del año 2025.

BRILLI YURANI CRUZ BARRETO

JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

LA SUSCRITA JEFE DEPARTAMENTO D DE APORTES
DE COMFAMILIAR HUILA

KARDEX DE APORTES

#	Comprobante	Recibo	Periodo	Nómina	Aporte	Mora	Indice	Empleados	Fecha Pago
1	L4	2159586	202311	$ 6.047.500	$ 240.000	$ 1.900	4	1	2023-12-12
2	L4	2159587	202311	$ 2.340.000	$ 92.800	$ 800	4	2	2023-12-12
3	L4	2159588	202311	$ 16.227.500	$ 644.000	$ 5.100	4	7	2023-12-12
4	L4	2168200	202311	$ 9.825.000	$ 384.000	$ 9.000	4	2	2023-12-28
5	L4	2181540	202311	$ 972.500	$ 37.200	$ 1.700	4	1	2024-01-19
6	L4	2180105	202312	$ 13.772.500	$ 544.000	$ 6.900	4	2	2024-01-17
7	L4	2181541	202312	$ 2.355.000	$ 92.800	$ 1.400	4	2	2024-01-19
8	L4	2181542	202312	$ 19.777.500	$ 779.800	$ 11.300	4	8	2024-01-19
9	L4	2181543	202312	$ 9.130.000	$ 360.000	$ 5.200	4	1	2024-01-19
10	L4	2192332	202401	$ 2.312.500	$ 91.900	$ 600	4	3	2024-02-09
11	L4	2194917	202401	$ 2.627.500	$ 104.000	$ 1.100	4	2	2024-02-13
12	L4	2194918	202401	$ 12.172.500	$ 482.100	$ 4.800	4	7	2024-02-13
13	L4	2195129	202401	$ 4.045.000	$ 160.000	$ 1.800	4	1	2024-02-14
14	L4	2198135	202401	$ 882.500	$ 34.700	$ 600	4	1	2024-02-20
15	L4	2213205	202402	$ 12.902.500	$ 511.200	$ 4.900	4	6	2024-03-15
16	L4	2213206	202402	$ 2.625.000	$ 104.000	$ 1.000	4	2	2024-03-15
17	L4	2213207	202402	$ 10.095.000	$ 400.000	$ 3.800	4	1	2024-03-15
18	L4	2213208	202402	$ 5.957.500	$ 236.000	$ 2.300	4	2	2024-03-15
19	L4	2222227	202402	$ 3.230.000	$ 125.700	$ 3.500	4	2	2024-04-05
20	L4	2236758	202402	$ 8.410.000	$ 320.000	$ 16.400	4	1	2024-05-03
21	L4	2228059	202403	$ 6.052.500	$ 240.000	$ 2.100	4	1	2024-04-12

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todos

#	Comprobante	Recibo	Periodo	Nómina	Aporte		ice	Empleados	Fecha Pago
22	L4	2228060	202403	$ 2.622.500	$ 104.000	$ 900	4	2	2024-04-12
23	L4	2228061	202403	$ 12.890.000	$ 511.200	$ 4.400	4	6	2024-04-12
24	L4	2228062	202403	$ 5.952.500	$ 236.000	$ 2.100	4	2	2024-04-12
25	L4	2236756	202403	$ 6.157.500	$ 240.000	$ 6.300	4	1	2024-05-03
26	L4	2236757	202403	$ 1.797.500	$ 70.000	$ 1.900	4	1	2024-05-03
27	L4	2239063	202404	$ 1.755.000	$ 70.000	$ 200	4	1	2024-05-06
28	L4	2244131	202404	$ 12.895.000	$ 511.200	$ 4.600	4	6	2024-05-14
29	L4	2244132	202404	$ 2.625.000	$ 104.000	$ 1.000	4	2	2024-05-14
30	L4	2244133	202404	$ 5.952.500	$ 236.000	$ 2.100	4	2	2024-05-14
31	L4	2244134	202404	$ 6.055.000	$ 240.000	$ 2.200	4	1	2024-05-14
32	L4	2257288	202404	$ 6.680.000	$ 260.000	$ 7.200	4	1	2024-06-06
33	L4	2257287	202405	$ 1.120.000	$ 44.700	$ 100	4	1	2024-06-06
34	L4	2264619	202405	$ 2.627.500	$ 104.000	$ 1.100	4	2	2024-06-18
35	L4	2274402	202405	$ 6.155.000	$ 240.000	$ 6.200	4	1	2024-07-08
36	L4	2286995	202405	$ 6.260.000	$ 240.000	$ 10.400	4	1	2024-07-31
37	L4	2286999	202405	$ 20.285.000	$ 777.900	$ 33.500	4	9	2024-07-31
38	L4	2280949	202406	$ 310.000	$ 12.200	$ 200	4	1	2024-07-16
39	L4	2286996	202406	$ 2.655.000	$ 104.000	$ 2.200	4	2	2024-07-31
40	L4	2286997	202406	$ 23.975.000	$ 939.200	$ 19.800	4	10	2024-07-31
41	L4	2286998	202406	$ 6.127.500	$ 240.000	$ 5.100	4	1	2024-07-31
42	L4	2292973	202406	$ 6.162.500	$ 240.000	$ 6.500	4	1	2024-08-08
43	L4	2292971	202407	$ 6.027.500	$ 240.000	$ 1.100	4	1	2024-08-08
44	L4	2292972	202407	$ 2.832.500	$ 112.700	$ 600	4	3	2024-08-08
45	L4	2298877	202407	$ 14.815.000	$ 586.400	$ 6.200	4	7	2024-08-16

Comfamiliar Huila
Por su progreso, suyo

#	Comprobante	Recibo	Periodo	Nómina	Aporte		ice	Empleados	Fecha Pago
46	L4	2300877	202407	$ 2.640.000	$ 104.000	$ 1.600	4	2	2024-08-22
47	L4	2319390	202407	$ 2.497.500	$ 96.000	$ 3.900	4	1	2024-09-25
48	L4	2319665	202407	$ 4.992.500	$ 192.000	$ 7.700	4	2	2024-09-25
49	L4	2330013	202407	$ 6.305.000	$ 240.000	$ 12.200	4	1	2024-10-10
50	L4	2344829	202407	$ 3.750.000	$ 140.000	$ 10.000	4	1	2024-11-08
51	L4	2311835	202408	$ 12.365.000	$ 492.000	$ 2.600	4	6	2024-09-10
52	L4	2319400	202408	$ 900.000	$ 35.400	$ 600	4	1	2024-09-25
53	L4	2319666	202408	$ 4.877.500	$ 192.000	$ 3.100	4	2	2024-09-25
54	L4	2320286	202408	$ 6.107.500	$ 240.000	$ 4.300	4	1	2024-09-27
55	L4	2320395	202408	$ 2.647.500	$ 104.000	$ 1.900	4	2	2024-09-27
56	L4	2320407	202408	$ 13.760.000	$ 540.800	$ 9.600	4	12	2024-09-27
57	L4	2329607	202408	$ 6.162.500	$ 240.000	$ 6.500	4	1	2024-10-10
58	L4	2344877	202408	$ 1.045.000	$ 39.900	$ 1.900	4	1	2024-11-08
59	L4	2329658	202409	$ 7.945.000	$ 315.900	$ 1.900	4	5	2024-10-10
60	L4	2329866	202409	$ 12.070.000	$ 480.000	$ 2.800	4	1	2024-10-10
61	L4	2330401	202409	$ 4.832.500	$ 192.000	$ 1.300	4	2	2024-10-11
62	L4	2330479	202409	$ 1.530.000	$ 60.800	$ 400	4	1	2024-10-11
63	L4	2330935	202409	$ 2.967.500	$ 117.900	$ 800	4	3	2024-10-11
64	L4	2361081	202409	$ 6.277.500	$ 240.000	$ 11.100	4	1	2024-12-06
65	L4	2361851	202409	$ 14.767.500	$ 564.700	$ 26.000	4	12	2024-12-06
66	L4	2344922	202410	$ 1.405.000	$ 56.000	$ 200	4	1	2024-11-08
67	L4	2344933	202410	$ 6.835.000	$ 272.800	$ 600	4	4	2024-11-08
68	L4	2345017	202410	$ 4.812.500	$ 192.000	$ 500	4	2	2024-11-08
69	L4	2354201	202410	$ 2.437.500	$ 96.000	$ 1.500	4	1	2024-11-26

Comfamiliar Huila
Por tu progreso, todo

#	Comprobante	Recibo	Periodo	Nómina	Aporte		ice	Empleados	Fecha Pago
70	L4	2360351	202410	$ 3.982.500	$ 156.000	$ 3.300	4	3	2024-12-05
71	L4	2366723	202410	$ 6.155.000	$ 240.000	$ 6.200	4	1	2024-12-12
72	L4	2366831	202410	$ 12.595.000	$ 491.100	$ 12.700	4	9	2024-12-12
73	L4	2366833	202410	$ 3.780.000	$ 147.400	$ 3.800	4	3	2024-12-12
74	L4	2370438	202410	$ 12.365.000	$ 460.000	$ 14.600	4	1	2024-12-19
75	L4	2366023	202411	$ 2.595.000	$ 103.100	$ 700	4	2	2024-12-12
76	L4	2366555	202411	$ 3.925.000	$ 156.000	$ 1.000	4	3	2024-12-12
77	L4	2366623	202411	$ 8.180.000	$ 325.200	$ 2.000	4	9	2024-12-12
78	L4	2366816	202411	$ 6.037.500	$ 240.000	$ 1.500	4	1	2024-12-12
79	L4	2370745	202411	$ 8.915.000	$ 352.800	$ 3.800	4	4	2024-12-19
80	L4	2373524	202411	$ 14.937.500	$ 588.000	$ 9.500	4	1	2024-12-27
81	L4	2378640	202411	$ 3.107.500	$ 121.400	$ 2.900	4	3	2025-01-08
82	L4	2390772	202411	$ 1.457.500	$ 56.000	$ 2.300	4	1	2025-02-03
83	L4	2390826	202411	$ 2.497.500	$ 96.000	$ 3.900	4	1	2025-02-03
84	L4	2378552	202412	$ 1.305.000	$ 52.000	$ 200	4	1	2025-01-08
85	L4	2381380	202412	$ 14.765.000	$ 588.000	$ 2.600	4	1	2025-01-10
86	L4	2381688	202412	$ 8.880.000	$ 352.900	$ 2.300	4	4	2025-01-13
87	L4	2387017	202412	$ 2.212.500	$ 87.500	$ 1.000	4	1	2025-01-21
88	L4	2388219	202412	$ 2.632.500	$ 104.000	$ 1.300	4	2	2025-01-23
89	L4	2389302	202412	$ 3.962.500	$ 156.000	$ 2.500	4	3	2025-01-28
90	L4	2389334	202412	$ 9.030.000	$ 355.600	$ 5.600	4	7	2025-01-28
91	L4	2389347	202412	$ 6.095.000	$ 240.000	$ 3.800	4	1	2025-01-28
92	L4	2391413	202412	$ 1.595.000	$ 62.500	$ 1.300	4	1	2025-02-03
93	L4	2391421	202412	$ 695.000	$ 27.200	$ 600	4	1	2025-02-03

BRILLI YURANI CRUZ BARRETO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDO DE APORTES
