6.6.4. MATERIAL GRANULAR FILTRANTE.

Como parte de la construcción del sistema de drenaje vial, se ejecutó la actividad correspondiente a la colocación del material granular filtrante, también conocido como piedra filtro, elemento esencial del filtro francés longitudinal que permite captar y conducir las aguas subsuperficiales fuera de la estructura del pavimento.

TRAMO	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	COSTADO	FECHA DE INICIO DE INTERVENCIÓN	ACTIVIDAD	CANTIDAD EJECUTADA MES	CANTIDAD PROGRAMADA TOTAL
3	K14+000	K14+418	BORDE IZQUIERDO	26/06/2025	INSTALACIÓN MATERIAL FILTRANTE	146.88 M3	430.56 M3

Tabla 12 Actividades Realizadas instalación material filtrante.

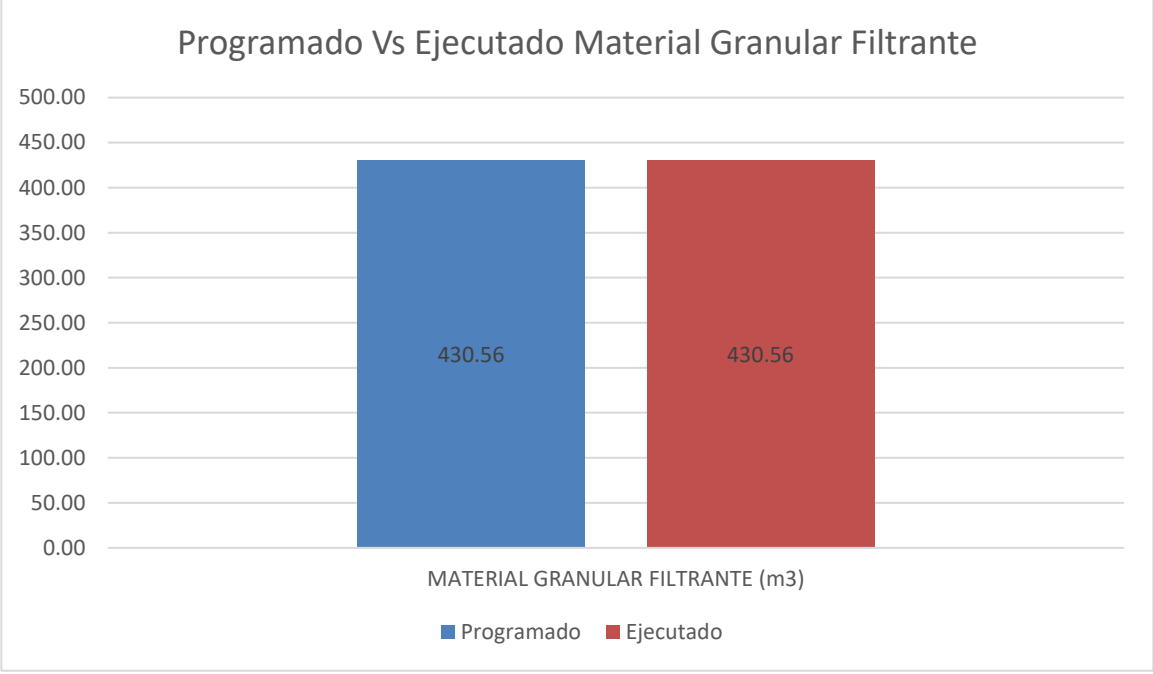


Figura. 7 Ejecutado vs Programado instalación material filtrante.

Calle 97 No. 16-00 Local 03, Edif. Palmas de Belmonte, Pereira - Risaralda
Celular: 3123106408 - Email: consorciojotayc@gmail.com Jeting.vias@outlook.com

CARBOQ SAS.

Carbones del Boquerón SAS.

Nit 800211706 - 9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

Actividad Económica ICA 4663 0.00 X 1000

Remision
REM No. 1023

Remision de materiales

CLIENTE	CONSORCIO JOTA & C			SUMINISTRO DESDE		SUMINISTRO HASTA	
NIT	901926980 6	**CIUDAD**	Pereira	15/06/2025		30/07/2025	
DIRECCIÓN			**TELÉFONO**	**FORMA DE PAGO**		CREDITO	
CL 97 16 00			6063455125	**VENDEDOR**	CARBONES DEL BOQUERON LIMITADA C		
POR CONCEPTO DE	Remision de materiales y factura credito						

Item	Descripción	Cantidad	J Medid				Total
1	SUMINISTRO DE MATERIALES TRITURADO 2 PULGADAS/ MATERIAL FILTRANTE	460	m³				460

KM 55 VIA ZIPAQUIRA UBATE Teléfono 8150002 Bogota D.C.
Correo Electrónico carboqltdaci@yahoo.es
