MUNICIPIO DE CALDAS- BOYACÁ
CONSTANCIA DE RADICACIÓN CUENTAS DE COBRO

Radicado No. 361 / 19/12/2025
Contrato No. SAMC-013-2025
Contratista: CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S.
Teléfono y Correo Electrónico: DAVICONSAS@GMAIL.COM
Periodo Informe Supervisión: 06 DE OCTUBRE 2025 AL 19 DE NOVIEMBRE de 2025
Certificación bancaria: BANCO DE BOGOTA Ahorros _ Corriente X No 21004356841

DOCUMENTO	DESTINO CENTRAL DE CUENTAS
Constancia de Radicación Contratos de Prestación de Servicios	
1. Certificación Bancaria, a nombre del contratista para Primer Pago o pago único. Nota: Anexar para el primer pago	X
2. Acta de Iniciación Contrato. primer pago o pago único.	X
Acta de aclaración (si aplica)	X
Actas de suspensión (si aplica)	N/A
Actas de reiniciación (si aplica)	NA.
3. Acta parcial Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos	X
4. Acta de Supervisión	X
5. Informe de Actividades	X falta.
6. Factura electrónica o Documento Equivalente (Articulo 617 y 618 de Estatuto Tributario)	X
Acta de Terminación (si aplica)	X
Acta de recibo final Nota: Dejar Claridad en observaciones cuando exista cesión de Derechos Económicos (si aplica)	X
Acta liquidación (si aplica)	X
Acta aclaratoria acta de liquidación Contrato de Prestación de servicios (si aplica)	NA
7. Planillas aportes en seguridad social del periodo autorizado a pagar	X
8. Carta Tesorería Para Personas Naturales Certificación por parte del contratista de aportes en seguridad social y para efectos de Retención en la fuente de acuerdo al Art. 18 de la Ley 1819 de 2016 que adiciona el Art. 388 del Estatuto Tributario; en lo que compete a Número de Empleados informando el régimen al que pertenece	NA.
Certificación de Pago Seguridad Social y Parafiscales para personas jurídicas, suscrito por el representante legal y/o revisor Fiscal, con tarjeta profesional y certificado de antecedentes emitido por la Junta Central de Contadores, cuando aplique.	falta
9. Registro Único Tributario. RUT. Impreso o con fecha de generación máximo 3 meses de vigencia y actualizado según la Normatividad vigente.	X

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

10. Certificación de Afiliación ARL	N A.

OBSERVACIONES:

1. Los datos consignados son tomados de los documentos originales que reposan en el expediente contractual suscrito por los intervinientes y bajo su absoluta responsabilidad.
2. Los datos registrados varían de acuerdo con la naturaleza del contrato.
3. Los soportes precontractuales reposan en el expediente, incluidos los estudios previos.
4. Los rendimientos que llegaren a producir los recursos entregados al contratista a título de anticipo pertenecerán al Tesoro.
5. Los documentos deben ser radicados en el orden relacionado en la Constancia de radicación.

Revisado y Aprobado:

Tesorero Municipal

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CONSTRUCTORA DAVICON SAS Identificado con NI 9018521295

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Corriente, radicado(a) en la oficina CHIQUINQUIRA, con las siguientes características:

Cuenta Corriente

Número:	21004356841
Fecha de apertura:	28 de Octubre de 2024
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta inactiva

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE****, realizada en la Oficina 0541 CHIQUINQUIRA de la ciudad de CHIQUINQUIRA, el día Lunes, 01 de Septiembre de 2025.

Cordialmente,

Banco Caja Social
CHIQUINQUIRA
01 SEP 2025

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRA PÚBLICAS
CONTRATO DE OBRA No. SAMC-013-2025
DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTA DE INICIO

En Caldas, a los seis (06) días del mes de Octubre del año 2025, se reunieron las siguientes personas: **JORGE IVAN OVALLE CASTILLO**, identificado con C.C No. 1.010.215.497 de Bogotá, quien se desempeña en el cargo de **SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS** del Municipio de Caldas – Boyacá, en su calidad de Supervisor y **CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. NIT. 901.852.129-5,** representada legalmente por **DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON** identificado con C.C N° 1.054.682.069 expedida en Moniquirá (Boyacá), en su condición de Contratista, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP	446 del 15 de septiembre de 2025
APROBACION DE GARANTÍA	BY-100056630 ANEXO 0 BY-100008999 ANEXO 0
OBJETO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. NIT. 901.852.129-5 R.L DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON CC. N°1.054.682.069 DE MONIQUIRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($103.274.795) M/CTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2025

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
C.C N° 1.010.215.497
Supervisor

CONSTRUCTORA DAVICON SAS
NIT. 901.852.129-5
R.L DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
CC. N°1.054.682.069 DE MONIQUIRA

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
ING JORGE OVALLE SPOP		ING JORGE OVALLE SPOP		Diego Alejandro Lancheros Ruiz Alcalde Municipal	
Nombre del documento	ACTA DE INICIO				Version
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

MODIFICATORIO DE ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC-013-2025

CONTRATO NÚMERO	**No. SAMC-013-2025**
CLASE	**CONTRATO DE OBRA**
CONTRATANTE	**Municipio de Caldas**
REPRESENTANTE LEGAL	**Diego Alejandro Lancheros Ruiz**
C.C.	**80.219.855 expedida en Bogotá D.C.**
CONTRATISTA	**CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S.**
N.I.T.	**NIT. 901.852.129-5**
	DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
C.C.	**1.054.682.069 de Moniquirá**
OBJETO	**ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. SAMC-013-2025 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA**
VALOR INICIAL	**CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($103.274.795,82)**
PLAZO INICIAL	**TREINTA (30) DIAS CALENDARIO**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO	**SEIS (06) DE OCTUBRE DE 2025**

Entre los suscritos a saber **DIEGO ALEJANDRO LANCHEROS RUIZ**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número **80.219.855** expedida en Bogotá, quien obra en nombre y representación del Municipio de Caldas departamento de Boyacá, identificado con el N.I.T. **891.801.796-4**, en calidad de Alcalde, debidamente posesionado con Acta No. 016 de diciembre 29 de 2023 y con facultades para contratar de conformidad con lo establecido en el artículo 314 de la Constitución Política de Colombia, y en ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 91, literal d), numeral 5 de la Ley 136 de 1994, y el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, y en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 11, numeral 3, literal b) de la Ley 80 de 1993, decreto 092 de 2017, y demás disposiciones

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

vigentes que regulen la contratación de la administración pública; quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**; por una parte y por la otra, la empresa **COSNTRUCTORA DAVICON SAS** con **NIT 901.852.129-5,** representado legalmente por el señor **DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON** identificado con cédula de ciudadanía **1.054.682.069 expedida en Moniquirá**, y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente modificatorio de ADICIÓN Y PRORROGA teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **PRIMERA**: Que las partes celebraron el Contrato No. SAMC-013-2025, cuyo objeto es CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA. **SEGUNDA:** Que el Contrato se pactó por un valor de CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($103.274.795,82) IVA INCLUIDO y demás impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y gastos que se generen y un plazo de TREINTA (30) días calendario. **TERCERA:** Que se suscribió acta de inicio con fecha de SEIS (06) DE OCTUBRE DE 2025 y en consecuencia el Contrato se encuentra vigente **CUARTA:** Que la Secretaria de Planeación y Obras Públicas de Caldas – Boyacá presentó estudios previos solicitando la Adición al Contrato con base en los siguientes argumentos: Mediante comunicación radicada el día treinta (30) de octubre de 2025 ante la secretaria de planeación y obras públicas, el contratista manifestó lo siguiente: "En este sentido, se requiere efectuar un ajuste de cantidades, conforme se detalla a continuación, con el fin de incluir ítems no previstos que resultan indispensables para garantizar la estabilidad estructural y funcional del cerramiento perimetral Dichos ítems corresponden a solados de limpieza y mejoramiento de suelo con recebo compactado, necesarios para la adecuada cimentación de las estructuras; zapatas y pedestales en concreto reforzado, que permiten conectar la viga de amarre de 30x40 cm, asegurando su correcta continuidad y estabilidad; concreto ciclópeo, empleado para compensar diferencias de nivel en el terreno y mantener un único nivel de apoyo de la viga, y finalmente, la construcción de un sumidero lateral en concreto, como medida para facilitar la evacuación de aguas lluvias que puedan acumularse en el área de intervención" **QUINTA:** Que para soportar la presente adición existe Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 2025000278. **SEXTA:** Que la presente modificación se efectúa con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil, en el entendido que cualquier contrato legalmente celebrado es ley para las partes, al igual el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece la posibilidad de celebrar contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad tendiente al cumplimiento de los fines del Estado. **SÉPTIMA:** Considerando lo anterior, y en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato ADICIONAR el valor del Contrato por CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($14.984.170,20) y PRORROGAR el plazo del contrato por termino de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. **OCTAVA:** De acuerdo a lo anterior, se hace importante precisar que de conformidad con la legislación vigente (EGCP) y la

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

jurisprudencia referida en el presente estudio previo, es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, con un carácter excepcional y solo "procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato. **NOVENA:** Que quienes suscriben el presente modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte de la presente modificación. Por lo anterior, las partes con base en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes acuerdan suscribir la presente **ADICIÓN Y PRORROGA** al **CONTRATO No. SAMC-013-2025** cuyo objeto es **CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÁ**, el cual se rige por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR** el valor del Contrato en **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($14.984.170,20) M/CTE AIU INCLUIDO,** de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en los estudios previos y con cargo al Certificado de disponibilidad Presupuestal 2025000278. **PARÁGRAFO:** Como consecuencia de lo anterior el valor total del presente Contrato será de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS. ($118.258.966,02) M/CTE. CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR** el plazo del contrato por termino de **QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO, PARÁGRAFO:** El plazo total del contrato será de **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO. CLÁUSULA TERCERA:** El CONTRATISTA debera ajustar las garantias suscritas que amparan el Contrato de conformidad al valor y al plazo pactado en el presente documento. **CLÁUSULA CUARTA:** Las demás cláusulas del Contrato No. SAMC-013-2025, continúan vigentes sin ninguna modificación.

Para constancia se firma en Caldas, a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2025

Contratante

Diego Alejandro Lancheros Ruiz
Alcalde Municipal

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

ADICIÓN Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. SAMC-013-2025 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA

Contratista

CONSTRUCTORA DAVICON SAS
DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
1.054.682.069 expedida en Moniquirá

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
Laura Carolina Gómez		Ing. Jorge Ovalle		Diego Alejandro Lancheros Ruiz	
Asesora Jurídica		Secretario De Planeación Y Obras Publicas		Alcalde municipal	

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

ACTA UNICO PAGO
(18/12/2025)

CONTRATO DE OBRA N° SAMC-013-2025

OBJETO	:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE CALDAS – BOYACÁ. NIT: 891.801.796 – 4
REPRESENTANTE LEGAL	:	DIEGO ALEJANDRO LANCHEROS RUIZ C.C. No. 80.219.855 de Bogotá D.C.
CONTRATISTA	:	CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. NIT. 901.852.129-5 R/L. DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON CC 1.054.682.069 DE MONIQUIRA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	:	ING. JORGE IVAN OVALLE CASTILLO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PEOS CON OCHENT Y DOS CENTAVOS ($103.274.795.82) M/CTE.
VALOR ADICION No. 1	:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($14.984.170.20) M/CTE.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECINTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS ($118.258.966.02) M/CTE.
VALOR ACTA UNICO PAGO	:	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECINTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS ($118.258.966.02) M/CTE.

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA No 1	:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	:	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO

En Caldas, a los dieciocho (18) días del mes de Diciembre del año DOS MIL VEINTICINCO (2025), nos reunimos **CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. NIT. 901.852.129-5**,representada legalmente por **DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON** identificado con Cedula No. 1.054.682.069 de Moniquira, en calidad de Contratista, por una parte y **JORGE IVAN OVALLE CASTILLO**, en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, como Supervisor del CONTRATO DE OBRA N° SAMC-013-2025, con el fin de cancelar la presente ACTA DE PAGO UNICO, por valor de CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECINTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS ($118.258.966.02) M/CTE. de acuerdo a las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 06 de Octubre de 2025 al 19 de Noviembre de 2025.

C O N S I D E R A N D O:

1. Que el señor Contratista solicita a la Supervisión y al Contratante el pago pactado en el CONTRATO DE OBRA N° SAMC-013-2025.
2. Que, aceptada la solicitud hecha por el contratista, se efectuó y revisó las actividades ejecutadas en el periodo comprendido entre el 06 de Octubre de 2025 al 19 de Noviembre de 2025.
3. Que de acuerdo a la factura de venta FE 3, se procedió a levantar acta de pago único la cual se encuentra anexa a la presente acta.
4. Que, de acuerdo con la forma de pago establecida en el contrato, y de acuerdo a las actividades ejecutadas el valor a pagar en la presente acta Único Pagó es de CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECINTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS ($118.258.966.02) M/CTE.
5. Afectar los siguientes rubros:

RUBRO	NOMBRE	VALOR REGISTRO	ACTAS ANTERIORES	ACTA N° 01	SALDO EN CAJA
2.3.2.02.02.005.07	Escenarios deportivos y recreativos mejorados	$ 118,258,966.02	0	$ 118,258,966.02	$ 0
TOTAL		$ 118,258,966.02	0	$ 118,258,966.02	$ 0

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

A C U E R D A N:

1. Aceptar el pago del Acta de Único Pago del mencionado contrato por la suma de CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECINTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS ($118.258.966.02) M/CTE

2. Cancelar el anterior valor mediante la presente acta de Único Pago.

Para constancia firman quienes intervienen.

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
CC 1.054.682.069 de Moniquira
R/L. CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S.
Contratista

Retención documental						
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**		
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	
Jorge Ivan Ovalle Secretario de Planeación y Obras Publicas		Jorge Ivan Ovalle Secretario de Planeación y Obras Publicas		Jorge Ivan Ovalle Secretario de Planeación y Obras Publicas		
Nombre del documento	ACTA PARCIAL				**Versión**	1.0
Dependencia		**TRD**		**Consecutivo**		
Proceso:			**Procedimiento:**			
Dimensión:			**Política:**			

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
ACTA UNICO PAGO

CONTRATO DE OBRA N° SAMC-013-2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO: DEL 06 DE OCTUBRE DE 2025 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

En Caldas, a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre del año DOS MIL VEINTICINCO (2025), se reunieron las siguientes personas: **JORGE IVAN OVALLE CASTILLO**, en calidad de Secretario de Planeación y Obras Públicas, como Supervisor y **CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. NIT. 901.852.129-5** representado legalmente por **DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON,** con Cedula No. 1.054.682.069 de Moniquira, en calidad de contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PEOS CON OCHENT Y DOS CENTAVOS ($103.274.795.82) M/CTE
VALOR ADICION	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($14.984.170.20) M/CTE
FORMA DE PAGO:	UN UNICO PAGO TOTAL CON LA EJECUCION DEL 100% CON REQUISITOS PARA LA LIQUIDACION
PLAZO INCIAL PACTADO:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

PLAZO PRORROGA No 1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	JORGE IVAN OVALLE CASTILLO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago Único, el cual corresponde a CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECINTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS ($118.258.966.02) M/CTE.

A la fecha el porcentaje de ejecución es 100.00 %.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
ING. Jorge Iván Ovalle Secretario de Planeación y Obras Publicas		**ING. Jorge Iván Ovalle** Secretario de Planeación y Obras Publicas		**Jimmy Torres** **Tesorero**	
Nombre del documento	ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS N° 04			**Versión**	1.0
Dependencia		**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:		**Procedimiento:**			
Dimensión:		**Política:**			

Constructora AVICON
Transformamos espacios

CONTRATO SAMC-013-2025

OBJETO:

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

ACTA FINAL

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

Constructora
AVICON
Transformamos espacios

INFORME EJECUTIVO

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

CONTRATO DE OBRA No. SAMC -0.13 – 2025

" CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"

INFORME MENSUAL DE OBRA, CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC -0.13 – 2025

No. DE INFORME: FINAL

PERIODO: 06 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FIRMA CONTRATISTA:

ING. DAVID HUMBERTO PNILLA

NOVIEMBRE DE 2025

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Dependencia	Destinatario	Documento
Secretario de planeación y obras públicas del municipio de Caldas - Boyacá	ING. JORGE IVAN OVALLE CASTILLO	Original
DAVID HUMBERTO PINILLA	Archivo	Copia

REGISTRO DE ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO



Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Firma: 		Firma: 		Firma: 	
Nombre:	DAVID HUMBERTO PINILLA	Nombre:	JORGE IVAN OVALLE CASTILLO	Nombre:	JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
Cargo:	Residente de obra	Cargo:	Secretario de planeación y obras publicas	Cargo:	Secretario de planeación y obras publicas
Fecha:	19 de noviembre 2025	Fecha:	19 de noviembre de 2025	Fecha:	19 de noviembre de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1 INTRODUCCION 4
2 INFORME MENSUAL FINAL 5
2.1 INFORMACION BASICA 5
2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 5
2.1.2 ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO 6
3 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS 6
3.1 CONTRATO DE OBRA 6
4 CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL 7
4.1 RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA 7
4.2 RELACIÓN DE EQUIPO MAYOR 7
4.3 ESTADO DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA 8
5 CONTROL TÉCNICO 9
5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 9
5.1.1 Del 06 de septiembre al 30 de octubre de 2025 9
5.2 PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR 10
5.3 SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA 10
5.4 SEGUIMIENTO CONDICIONES METEOROLÓGICAS 11
6 REGISTRO FOTOGRÁFICO 11
7 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO 13
7.1 RELACIÓN DE PAGOS 13
7.2 CONTROL DE INVERSIÓN 14
7.3 REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD 14
7.4 GESTION SOCIAL 14

1 INTRODUCCION

El presente informe relaciona las actividades realizadas por parte de la interventoría en el periodo de tiempo relacionado, con el fin de cumplir el objeto contractual previsto en el alcance para las áreas de referencia (Técnica, Administrativa y Financiera).

Dentro de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto contractual, la interventoría debe velar por realizar el seguimiento y control de las pólizas y garantías del contrato, aprobación de actas de corte parcial, elaboración y programación de comités técnicos de obra, aprobación de modificaciones de obra tanto en cantidad y/o especificaciones, elaboración y presentación de informes mensuales, control y reajuste de programación de obra, control de cantidades de obra, revisión y control de ajustes de diseños y aspectos técnicos, supervisión y control de compromisos contractuales del contratista.

Todas las actividades desarrolladas por la interventoría están enfocadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la calidad de las obras relacionadas, razón por la cual se implementó un programa de seguimiento y control de calidad de las obras ejecutadas a través de muestreo de campo, el cual será realizado directamente por la interventoría por medio de un laboratorio certificado que será el encargado de realizar los ensayos necesarios para garantizar el cumplimiento de especificaciones general y particulares de las obras ejecutadas.

2 INFORME MENSUAL FINAL

INFORME MENSUAL DEL CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC -0.13 – 2025 **CUYO OBJETO ES: " CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"**


2.1 INFORMACION BASICA

2.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

Dicho proyecto está localizado en la carrera 2 del municipio de Caldas -Boyacà a una altura de 2557 metros sobre el nivel del mar, A continuación, se muestran las coordenadas correspondientes al perímetro del predio objeto del levantamiento topográfico y las coordenadas de la localización exacta de la obra corresponden a Latitud 5.555366° y Longitud -73.864671.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO
BOYACÁ	CALDAS	**"CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"**

Ilustración. Localización Específica del Proyecto

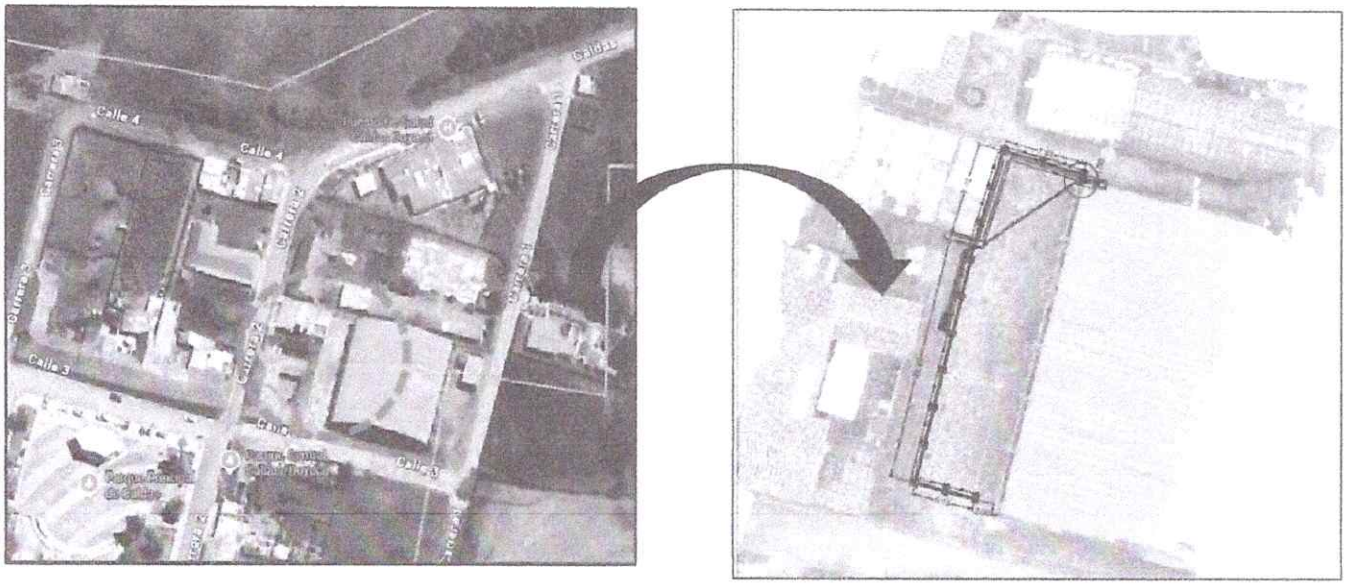

2.1.2 ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra es **"CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"**

El proyecto busca beneficiar a la población del municipio de Caldas, Boyacá. Con base en los informes recibidos por parte de la alcaldía se evaluaron aspectos técnicos generales, que permitan el beneficio de la población en el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas, sociales y culturales.

3 INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS

3.1 CONTRATO DE OBRA

A continuación, se muestra la información general del contrato de obra SAMC -0.13 –2025 suscrito entre la Alcaldía del Municipio de Caldas y la Constructora Davicon S.A.S.

CONTRATO DE OBRA	
Número del contrato:	CONTRATO DE OBRA No. SAMC – 013 de 2025
Objeto:	**"CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"**
Fecha de suscripción del contrato:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Contratante:	MUNICIPIO DE CALDAS (BOYACÁ)
Nombre Contratista:	CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S NIT: 901.852.129-5 R/L: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
Supervisor:	ING. JORGE IVAN OVALLE CASTILLO SECRETARIO DE PLANEACIÒN Y OBRAS PUBLICAS
Valor Fiscal Inicial:	CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUADRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS **($103.274.795.82.00)** MONEDA CORRIENTE
Valor Adicional N°1:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS **(14.984.170.20)** MONEDA CORRIENTE
Anticipo:	No tiene
Plazo Inicial:	30 DIAS
Fecha de Inicio:	06 DE OCTUBRE DE 2025

Fecha Prevista de Terminación Inicial:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo Prorroga Nº1	15 (DIAS)
Fecha Prevista de Terminación prorroga Nº1	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
Avance Físico Mensual:	100 %
Avance Físico Acumulado:	100 %
Avance Financiero Mensual final:	$ 118.258.966.02
ESTADO ACTUAL	
Valor Acumulado Periodos Anteriores	$ 0
Ejecutado Periodo Actual	$ 118.258.966.02
Reajustes (Según Actas)	
Imprevistos	
Total	$ 118.258.966.02

4 CONTROL ADMINISTRATIVO Y LEGAL

4.1 RELACIÓN DE PERSONAL DE OBRA

Para las actividades llevadas a cabo actualmente el personal dispuesto por el contratista es:

No.	Nombre	Cargo
1	ING. MANUEL ORLANDO MARTINEZ	DIRECTOR DE OBRA
2	ING. DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON	RESIDENTE DE OBRA
6	JEFERSON CASTELLANOS	MAESTRO GENERAL

4.2 RELACIÓN DE EQUIPO MAYOR

El contratista ha dispuesto del siguiente equipo en obra:

No.	Equipo	Cantidad	Observaciones
1	RETROEXCAVADORA CAT 416 E	1	Equipo suministrado por el Contratista

3	VOLQUETAS	2	Equipo suministrado por el Contratista
4	MEZCLADORA	1	Equipo suministrado por el Contratista

4.3 ESTADO DE PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA						
Tipo de Póliza	No. Póliza	Porcentaje Asegurado	Aseguradora	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
Cumplimiento	BY-100056630	20%	Compañía Seguros mundial Nit. 891801796-4	06/10/2025	23/03/2026	$ 23.651.793.20
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	BY-100056630	5%	Compañía Seguros mundial Nit. 891801796-4	06/10/2025	20/11/2028	$ 5.912.948.30
Estabilidad y calidad de la obra	BY-100056630	20%	Compañía Seguros mundial Nit. 891801796-4	19/11/2025	19/11/2030	$ 23.651.793.20
Responsabilidad civil y extracontractual	BY-100003111		Compañía Seguros mundial Nit. 891801796-4	06/10/2025	05/11/2025	$ 284.700.000,00

5 CONTROL TÉCNICO

5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

5.1.1 Del 06 de Octubre al 19 de Noviembre de 2025

Durante este periodo se llevaron a cabo las siguientes actividades, donde se evidencia el porcentaje de ejecución y el valor ejecutado de cada una de las actividades ejecutadas durante este mes.

1	PRELIMINALES				EJECUSIÒN
1.1.1	2.02.02	CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60X0.60X0.60. (NO INCLUYE TAPA)	UND	1	100%
1.1.2	2.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	5.92	100%
1.1.3	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	32.06	100%
1.1.4	5.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML	20	100%
1.1.5	2.02.35	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	802.56	100%
1.2	ESTRUCTURAS				
1.2.1	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	7.2	100%
1.3	CARPINTERIA METALICA				
1.3.1	COTI ZACI ÓN	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN CERRAMIENTO CALIDAD NTC 156, ANCLAJE EN PERFIL ANGULO ASTMA 572 Y VARILLA CORRUGADA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO), INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN CROMATO DE ZINC Y PUNTURA ESMALTE ACABADO.	M2	120.37	100%
1.3.2	COTI ZACI ÓN	SUMINISTRO E INSTACION DE PORTON METALICO DOS HOJAS EN TUBERIA CERRAMIENTO CALIDAD NTC156, APOYOS EN CHUMACERAS DE 1" 1/4" Y PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100 ASTM A500, PLATINA ACERO ASTM A-36 FALLEVAS EN PLATINA Y VARILLA D=1/2, INCLUYE PINTURA DE PROTECCION CROMATO DE ZINC Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO.	M2	5.2275	100%
1.4	PARQUES Y MOBILIARIO				
1.4.1	COTI ZACI ÓN	PARQUE PLÁSTICO COMPUESTO POR: 2 torres, 2 Ductos, 1 juego de 2 columpios, 1 rodadero Doble, 1 rodadero cerrado, 1 Muro de escalar, 1 Juego de pasamanos con argollas y trapecios, 1 triqui, 2 escaleras. Piezas del parque Fabricadas 100% en plástico: Vigas plásticas, postes plásticos, perfiles plásticos, vigetas plásticas, tablas plásticas. Anclado a piso con dado en concreto.	UND	1.00	100%
1.5	NO PREVISTOS				
1.5.1	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	40.82	100%

1.5.2	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	25.85	100%
1.5.3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	2.02	100%
1.5.4	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0.513	100%
1.5.5	5.02.14	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	UND	1.00	100%
1.5.6	1.02.09	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	3.043	100%

5.2 PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES A EJECUTAR

Las actividades que se plantean llevar a cabo en el transcurso del mes siguiente son las siguientes:

No se proyecta ninguna actividad debido a que la ejecución del proyecto según las actividades contratadas llego al 100% de ejecución, por ende, ya se cumplió con el objeto contractual.

5.3 SEGUIMIENTO PROGRAMACIÓN DE OBRA

La ejecución del proyecto se llevo a cabo en el tiempo de 1 mes, por lo cual el desarrollo del mismo llego al 100% de ejecución según la programación de obra y las cantidades de obra inicialmente contratadas.

5.4 SEGUIMIENTO CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Durante este periodo se presentaron lluvias en la región que llegaron a afectar en cierta forma la normal ejecución de las actividades programadas por el contratista.

6 REGISTRO FOTOGRÁFICO


Registro Fotográfico No.	1






Comentarios: Actividades Cajas de inspección

Registro Fotográfico No.	2

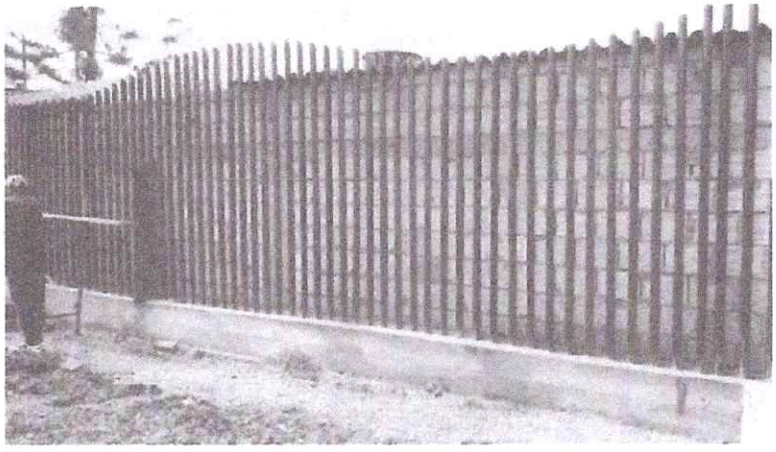



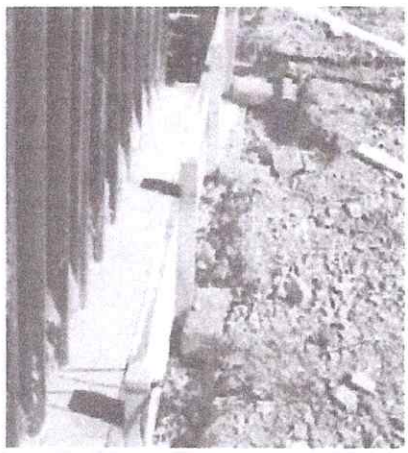


Comentarios: Actividades Instalación de cerramiento contra impacto

Registro Fotográfico No. 3






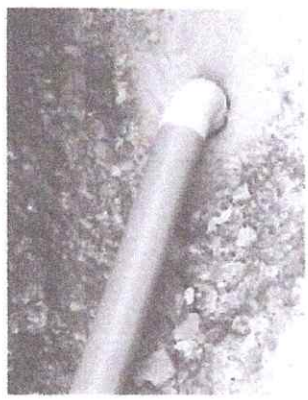

Comentarios: Actividades Instalación de tubería de 4 "


Registro Fotográfico No.	4

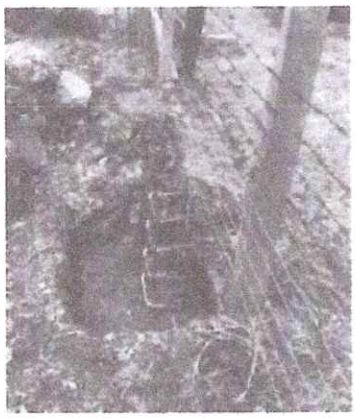
Comentarios: Actividades CIMENTACIÒN

Registro Fotográfico No.	5



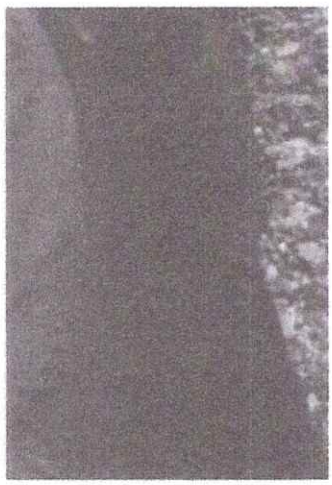

Comentarios: Actividades INTALACIÒN DE FILTRO

7 CONTROL PRESUPUESTAL Y FINANCIERO

7.1 RELACIÓN DE PAGOS

La relación de pagos para este contrato es como se evidencia a continuación.

PAGOS PARCIALES CONTRATO DE OBRA			
Nombre del componente	**Pago**	**%**	**Valor para pagar**

Ejecución de la obra	Pago 1	100%	$ 118.258.966.02
	Valor total de la obra		**$ 118.258.966.02**
	Valor Total del Contrato de Obra		**$ 118.258.966.02**

A la fecha de cierre del presente informe no se han generado actas parciales.

7.2 CONTROL DE INVERSIÓN

De acuerdo con el avance de obra, a la fecha se lleva una ejecución de $ 118.258.966.01 del presupuesto contractual.

7.3 REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD

Municipio:	Caldas, Boyacá
No. Contrato:	No. SAMC -0.13 – 2025
Proyecto:	"CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"
Dias trabajados:	42
No. Accidentes:	0
No. Incidentes:	0

7.4 GESTION SOCIAL

se verifica la afiliación del personal en obra a salud, ARL y pensiones, para lo cual se procede anexar el pago de las planillas de seguridad social del personal presente en la ejecución de la obra.

Anexo 1.Planillas de seguridad social




Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
[illegible]	[illegible]	CONSTRUCTORA [illegible]	[illegible]	CONSTRUCTORA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES	
No	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Centro de Trabajo: CONSTRUCTORA 3 (3 Afiliados)					$2.087.800	$334.200			$2.087.800	$83.600			$2.087.800	$83.600			$2.087.800	$11.100		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA - 3 Afiliados					$2.087.800	$334.200			$2.087.800	$83.600			$2.087.800	$83.600			$2.087.800	$11.100		$0	$0
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total	**Afiliados(3)**				$2.087.800	$334.200			$2.087.800	$83.600			$2.087.800	$83.600			$2.087.800	$11.100		$0	$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025	2025-12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2025-12-20	2025-12-15	BANCO de BOGOTA	1	[illegible]

RESUMEN DE PAGO

APORTES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR APLICADOS	VALOR A PAGAR
APF ADMINISTRADORAS [illegible]				3	$334.200	$1.100	$0	$335.300
PENSION	230301	800.224.808	3	3	$288.600	$1.100	$0	$289.700
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$45.600	$200	$0	$45.800
APL ADMINISTRADORAS [illegible]				1	$11.100	$300	$0	$11.400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	8	1	$11.100	$300	$0	$11.400
CCF ADMINISTRADORAS [illegible]				1	$83.600	$400	$0	$84.000
COMFABOY	CCF10	891.800.213	8	1	$83.600	$400	$0	$84.000
EPS ADMINISTRADORAS [illegible]				1	$83.600	$400	$0	$84.000
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$83.600	$400	$0	$84.000
TOTAL				5	$501.400	$2.200	$0	$503.600

DAVID HUMBERTO PINILLA
ING.CIVIL
C.C. 1.054.682.069

Constructora
AVICON
Transformamos espacios

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES N2

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

MUNICIPIO DE CALDAS DEPARTAMENTO DE BOYACA

SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	COTRATISTA	CONSTRUCTORA DAVICON SAS NIT: 901852129-5 RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON	Constructora DAVICON Transformamos espacios
OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	SUPERVISOR	JORGE IVAN OVALLE CASTILLO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	ACTA FINAL

ITEM No.	ITEM GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICATORIO N° 1		MODIFICATORIO N° 2		+ -	MODIFICACIONES (+/-)		MODIFICATORIO N° 1	
							CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL		CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1	PRELIMINALES														
1.1.1	2.02.02	CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60X0.60X0.60. (NO INCLUYE TAPA)	UND	1.00	$ 437,626.92	$ 437,626.92	2	$ 875,253.84	1	$ 437,626.92	-	1.00	$ 437,626.92	1.00	$ 437,626.92
1.1.2	2.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	5.37	$ 887,295.00	$ 4,764,774.15	6.0072	$ 5,330,158.52	5.92	$ 5,252,431.48	-	0.09	$ 77,727.04	5.92	$ 5,252,431.48
1.1.3	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	13.52	$ 70,577.63	$ 954,209.56	32.21	$ 2,273,305.46	32.06	$ 2,262,718.82	-	0.15	$ 10,586.64	32.06	$ 2,262,718.82
1.1.4	5.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML	12.74	$ 41,023.96	$ 522,645.25	16.98	$ 696,586.84	20	$ 820,479.20	+	3.02	$ 123,892.36	20.00	$ 820,479.20
1.1.5	2.02.35	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	567.03	$ 7,675.05	$ 4,351,983.60	715.732	$ 5,493,278.89	802.56	$ 6,159,680.45	+	86.83	$ 666,401.57	802.56	$ 6,159,680.45
1.2	ESTRUCTURAS														
1.2.1	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD. CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	5.85	$ 285,074.72	$ 1,667,687.11	6.24	$ 1,778,866.25	7.2	$ 2,052,537.98	+	0.96	$ 273,671.73	7.20	$ 2,052,537.98
1.3	CARPINTERIA METALICA														
1.3.1	COTI ZACI ÓN	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN CERRAMIENTO CALIDAD NTC 156, ANCLAJE EN PERFIL ANGULO ASTMA 572 Y VARILLA CORRUGADA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO), INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN CROMATO DE ZINC Y PUNTURA ESMALTE ACABADO.	M2	129.66	$ 323,000.00	$ 41,880,179.64	137.665	$ 44,465,795.00	120.37	$ 38,877,959.60	-	17.30	$ 5,587,835.40	120.37	$ 38,877,959.60
1.3.2	COTI ZACI ÓN	SUMINISTRO E INSTACION DE PORTON METALICO DOS HOJAS EN TUBERIA CERRAMIENTO CALIDAD NTC156, APOYOS EN CHUMACERAS DE 1" 1/4" Y PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100 ASTM A500, PLATINA ACERO ASTM A-36 FALLEVAS EN PLATINA Y VARILLA D=1/2, INCLUYE PINTURA DE PROTECCION CROMATO DE ZINC Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO.	M2	10.35	$ 353,917.33	$ 3,663,044.40	6	$ 2,123,503.98	5.2275	$ 1,850,102.84	-	0.77	$ 273,401.14	5.23	$ 1,850,102.84
1.4	PARQUES Y MOBILIARIO					$ -									
1.4.1	COTI ZACI ÓN	PARQUE PLÁSTICO COMPUESTO POR: 2 torres, 2 Ductos, 1 juego de 2 columpios, 1 rodadero Doble, 1 rodadero cerrado, 1 Muro de escalar, 1 Juego de pasamanos con argollas y trapecios, 1 triqui, 2 escaleras. Piezas del parque Fabricadas 100% en plástico: Vigas plásticas, postes plásticos, perfiles plásticos, vigetas plásticas, tablas plásticas. Anclado a piso con dado en concreto.	UND	1.00	$ 21,200,000.00	$ 21,200,000.00	1	$ 21,200,000.00	1	$ 21,200,000.00	=	0.00	$ -	1.00	$ 21,200,000.00
1.5	NO PREVISTOS													0	0
1.5.1	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	0.00	$ 140,393.81	$ -	4.74475	$ 666,133.53	40.82	$ 5,730,548.61	+	36.07	$ 5,064,415.08	40.82	$ 5,730,548.61

MUNICIPIO DE CALDAS DEPARTAMENTO DE BOYACA

SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	COTRATISTA	CONSTRUCTORA DAVICON SAS NIT: 901852129-5 RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	SUPERVISOR	JORGE IVAN OVALLE CASTILLO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Constructora DAVICON
Transformamos espacios

ACTA FINAL

ITEM No.	ITEM GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICATORIO Nº 1		MODIFICATORIO Nº 2		+ -	MODIFICACIONES (+/-)		MODIFICATORIO Nº 1	
							CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL		CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL
1.5.2	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	0.00	$ 33,431.73	$ -	18.979	$ 634,500.80	25.85	$ 864,043.06	+	6.87	$ 229,542.26	25.85	$ 864,043.06
1.5.3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0.00	$ 918,406.92	$ -	2.016	$ 1,851,508.35	2.02	$ 1,851,508.35	=	0.00	$ -	2.02	$ 1,851,508.35
1.5.4	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0.00	$ 1,136,574.77	$ -	0.63	$ 716,042.11	0.513	$ 583,062.86	-	0.12	$ 132,979.25	0.51	$ 583,062.86
1.5.5	5.02.14	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	UND	0.00	$ 1,458,509.51	$ -	1	$ 1,458,509.51	1	$ 1,458,509.51	=	0.00	$ -	1.00	$ 1,458,509.51
1.5.6	1.02.09	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	0.00	$ 515,026.63	$ -	2.728	$ 1,404,992.65	3.043	$ 1,567,226.04	+	0.32	$ 162,233.39	3.04	$ 1,567,226.04

COSTO DIRECTO	$ 79,442,150.63		$ 90,968,435.73		$ 90,968,435.72		$ -		$ 90,968,435.72
ADMINISTRACIÓN (22%)	$ 17,477,273.14		$ 20,013,055.43		$ 20,013,055.44		$ -		$ 20,013,055.44
IMPREVISTOS (2%)	$ 1,588,843.01		$ 1,819,368.71		$ 1,819,368.71		$ -		$ 1,819,368.71
UTILIDAD (6%)	$ 4,766,529.04		$ 5,458,106.14		$ 5,458,106.14		$ -		$ 5,458,106.14
VALOR TOTAL OBRA	$ 103,274,795.82		$ 118,258,966.02		$ 118,258,966.02		$ -		$ 118,258,966.02
PORCENTAJE (%)	100%		100%		100%				100%

CONSTRUCTORA DAVICON SAS
NIT: 901852129-5
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Constructora
AVICON
Transformamos espacios

MEMORIAS DE CALCULO

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS


Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.1.1	CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60X0.60X0.60. (NO INCLUYE TAPA)	UND	1.00





PRELIMINALES

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (UND)
CAJA DE INSPECCION				1.00	1.00





MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.1.2	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	5.92









PRELIMINALES

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (M3)
VIGA DE AMARRE DE 40 X 30	6.13	0.30	0.40	1.00	0.74
VIGA DE AMARRE DE 40 X 30	25.25	0.30	0.40	1.00	3.03
VIGA DE AMARRE DE 40 X 30	9.08	0.30	0.40	1.00	1.09
VIGA DE AMARRE DE 40 X 30	7.87	0.30	0.40	1.00	0.94
VIGA DE AMARRE DE 40 X 30	1.00	0.30	0.40	1.00	0.12
			TOTAL (M3):		5.92

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.1.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	32.06









PRELIMINALES

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (M3)
VIGA DE AMARRE DE 40 X 30	6.13	0.30	0.25	1.00	0.46
VIGA DE AMARRE DE 40 X 30	25.25	0.30	0.25	1.00	1.89
VIGA DE AMARRE DE 40 X 30	9.08	0.30	0.25	1.00	0.68
VIGA DE AMARRE DE 40 X 30	7.87	0.30	0.25	1.00	0.59
VIGA DE AMARRE DE 40 X 30	1.00	0.30	0.25	1.00	0.08
ZAPATAS	0.60	0.60	1.00	14.00	5.04
CAJAS DE INSPECCION	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
SUMIDERO 40X80	0.80	1.20	1.00	1.00	0.96
TUBERIA DE 4"	11.20	0.60	1.50	1.00	10.08
TUBERIA DE 4"	8.80	0.60	1.50	1.00	7.92
FILTRO	9.00	0.40	0.70	1.00	2.52
	3.00	0.40	0.70	1.00	0.84
TOTAL (M3):					32.06

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML	20.00





PRELIMINALES

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (ML)
TUBERIA PVC 4"	11.2				11.20
TUBERIA PVC 4"	8.80				8.80
				TOTAL (ML):	20.00

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.1.5	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	802.56



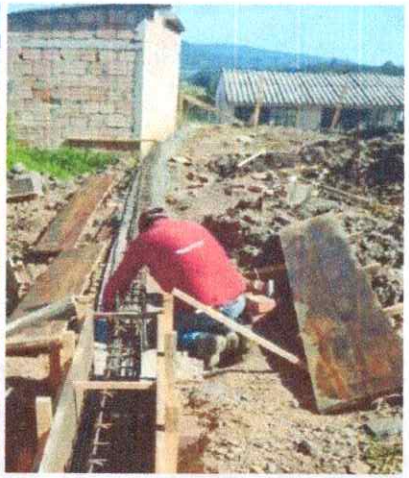






PRELIMINALES

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	CANT. DE VARILLAS	PESO kg/m	CANT. DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL (KG)
ZAPATAS SENTIDO A	0.75	5.00	1.00	14.00	52.50
ZAPATAS SENTIDO B	0.75	5.00	1.00	14.00	52.50
VIGA DE AMARRE REFUERZO LONG	55.09	6.00	1.00	1.00	330.51
REFUERZO TRANSVERSAL	1.00	493.30	0.56	1.00	276.25
COLUMNAS LONG	0.80	4.00	1.00	13.00	41.60
COLUMNAS FLEJES	1.00	2.00	1.00	13.00	26.00
COLUMNA ESQUINERA CONTENCION LONG	1.90	4.00	1.00	1.00	7.60
COLUMNA ESQUINERA CONTENCION FLEJES	1.20	13.00	1.00	1.00	15.60
TOTAL (KG):					802.56

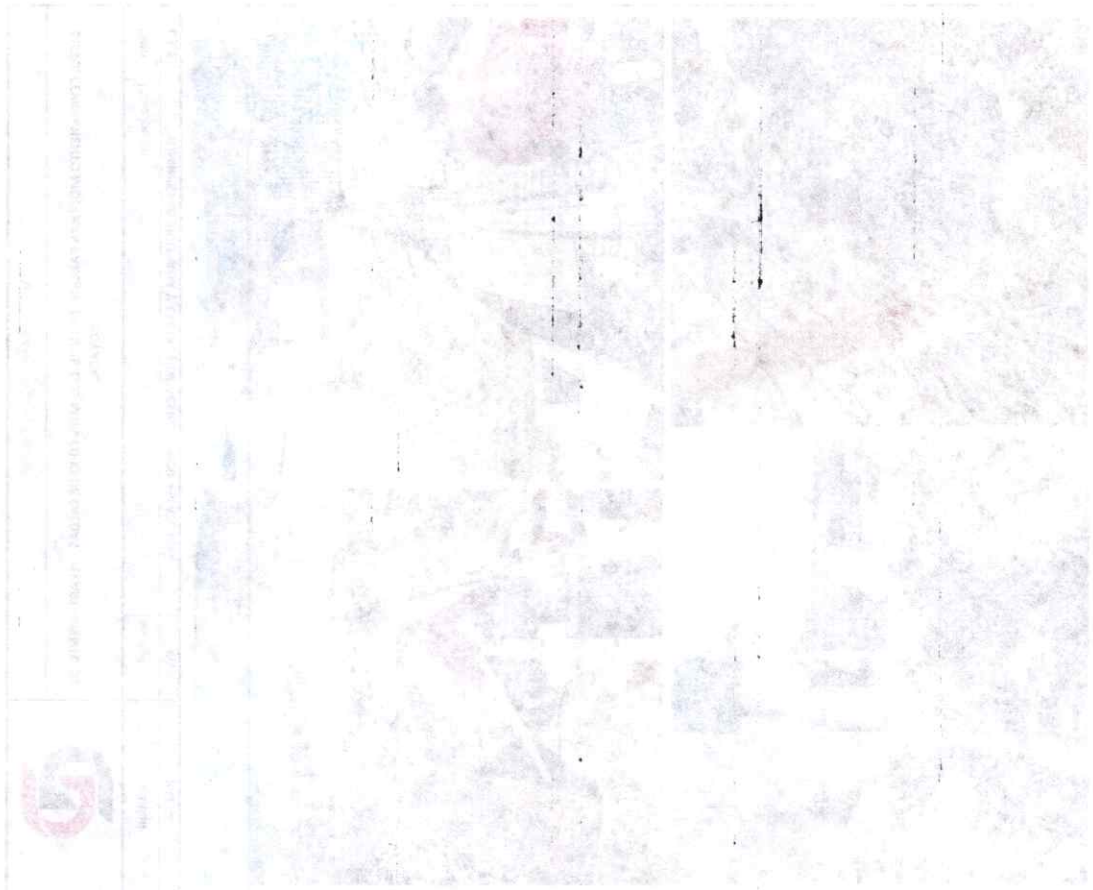

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS


Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.2.1	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	7.20






PRELIMINALES

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT. DE ELEMENTOS	PESO TOTAL (M3)
FILTRO 60X100	3.00	0.60	1.00	1.00	1.80
FILTRO 60X100	9.00	0.60	1.00	1.00	5.40
			TOTAL (M3):		7.20

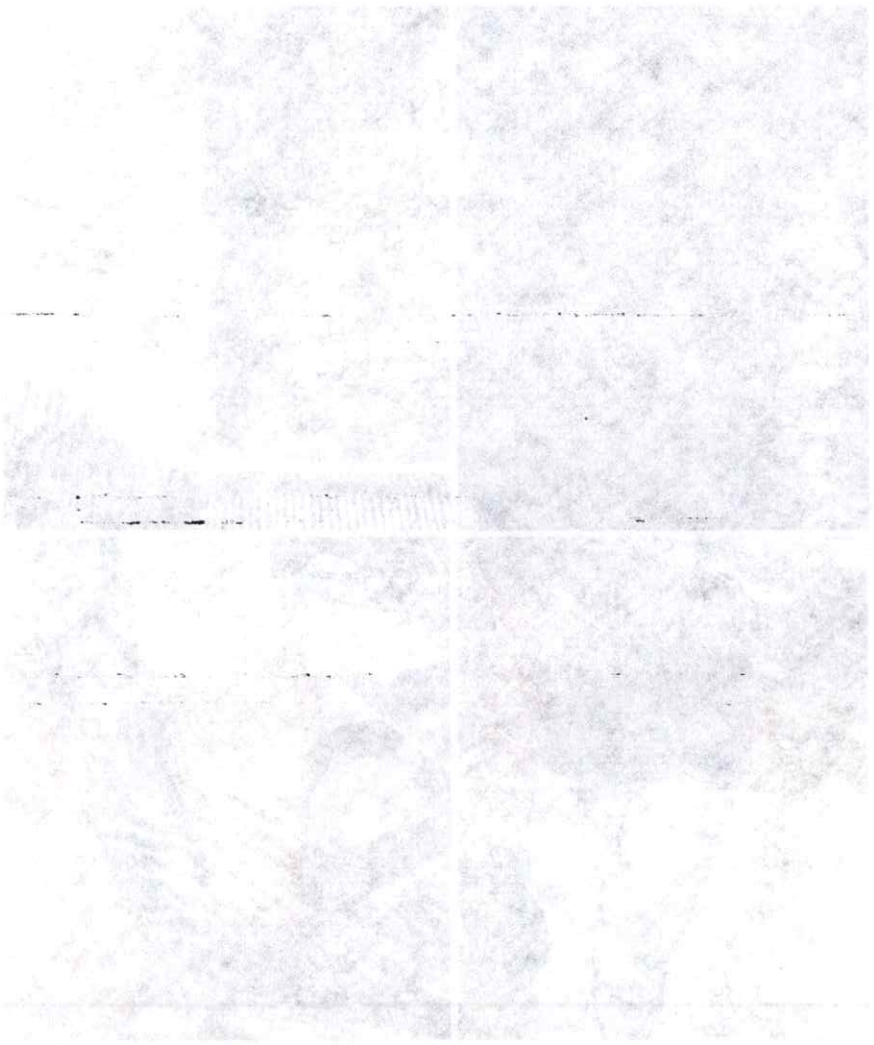

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS


Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.3.1	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN CERRAMIENTO CALIDAD NTC 156, ANCLAJE EN PERFIL ANGULO ASTMA 572 Y VARILLA CORRUGADA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO), INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN CROMATO DE ZINC Y PUNTURA ESMALTE ACABADO.	M2	120.37






MONTAJE STAP MODULAR INTEGRADO (CAPACIDAD MAXIMA = 0,5 LPS)

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT. DE ELEMENTOS	TOTAL (M2)
CERRAMIENTO TUEBRIA METALICA 2"	6.13		2.44		14.96
CERRAMIENTO TUEBRIA METALICA 2"	25.25		2.44		61.61
CERRAMIENTO TUEBRIA METALICA 2"	9.08		2.44		22.16
CERRAMIENTO TUEBRIA METALICA 2"	7.87		2.44		19.20
CERRAMIENTO TUEBRIA METALICA 2"	1.00		2.44		2.44
				TOTAL (M2):	120.37

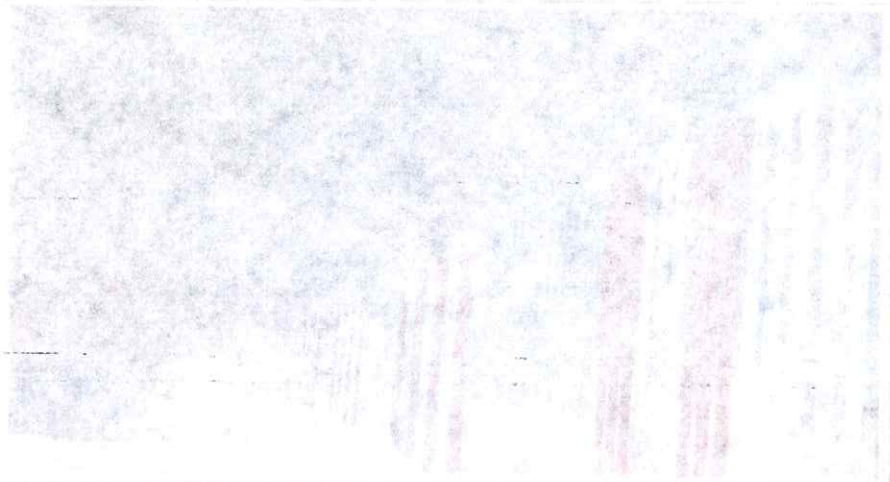

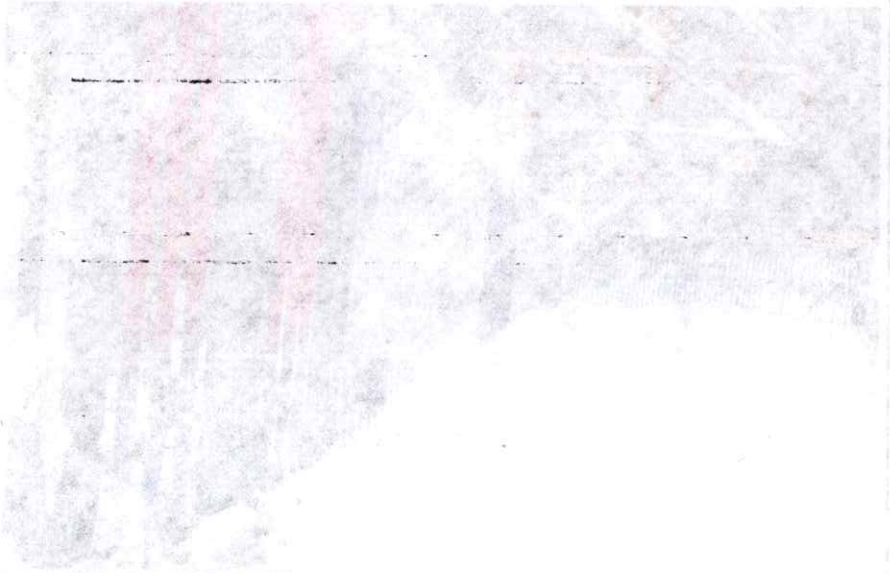

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.3.2	SUMINISTRO E INSTACION DE PORTON METALICO DOS HOJAS EN TUBERIA CERRAMIENTO CALIDAD NTC156, APOYOS EN CHUMACERAS DE 1" 1/4" Y PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100 ASTM A500, PLATINA ACERO ASTM A-36 FALLEVAS EN PLATINA Y VARILLA D=1/2, INCLUYE PINTURA DE PROTECCION CROMATO DE ZINC Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO.	M2	5.23



MONTAJE STAP MODULAR INTEGRADO (CAPACIDAD MAXIMA = 0,5 LPS)

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT. DE ELEMENTOS	TOTAL (M2)
PORTON METALICO 2 HOJAS		2.05	2.55		5.23

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.4.1	PARQUE PLÁSTICO COMPUESTO POR: 2 torres, 2 Ductos, 1 juego de 2 columpios, 1 rodadero Doble, 1 rodadero cerrado, 1 Muro de escalar, 1 Juego de pasamanos con argollas y trapecios, 1 triqui, 2 escaleras. Piezas del parque Fabricadas 100% en plástico: Vigas plásticas, postes plásticos, perfiles plásticos, vigetas plásticas, tablas plásticas. Anclado a piso con dado en concreto.	UND	1.00





MONTAJE STAP MODULAR INTEGRADO (CAPACIDAD MAXIMA = 0,5 LPS)

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT. DE ELEMENTOS	TOTAL (UND)
PARQUE INFANTIL					1.00
TOTAL (UND):					1.00



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.5.1	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	40.82









MONTAJE STAP MODULAR INTEGRADO (CAPACIDAD MAXIMA = 0,5 LPS)

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ALTO	CANT. DE ELEMENTOS	TOTAL (M3)
MEJORAMIENTO ZAPATAS	0.60	0.60	0.25	14.00	1.26
VIGA DE AMARRE	2.54	0.30	0.25	2.00	0.38
VIGA DE AMARRE	3.25	0.30	0.25	9.00	2.19
VIGA DE AMARRE	3.64	0.50	0.25	2.00	0.91
MEJORAMIENTO SUPERFICIAL FONDO	8.19	17.63	0.25	1.00	36.07
			TOTAL (M3):		40.82

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS


Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.5.2	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	25.85






MONTAJE STAP MODULAR INTEGRADO (CAPACIDAD MAXIMA = 0,5 LPS)

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT. DE ELEMENTOS	TOTAL (M2)
MEJORAMIENTO ZAPATAS	0.60	0.60		14.00	5.04
VIGA DE AMARRE	2.54	0.50		2.00	2.54
VIGA DE AMARRE	3.25	0.50		9.00	14.63
VIGA DE AMARRE	3.64	0.50		2.00	3.64
				TOTAL (M2):	25.85

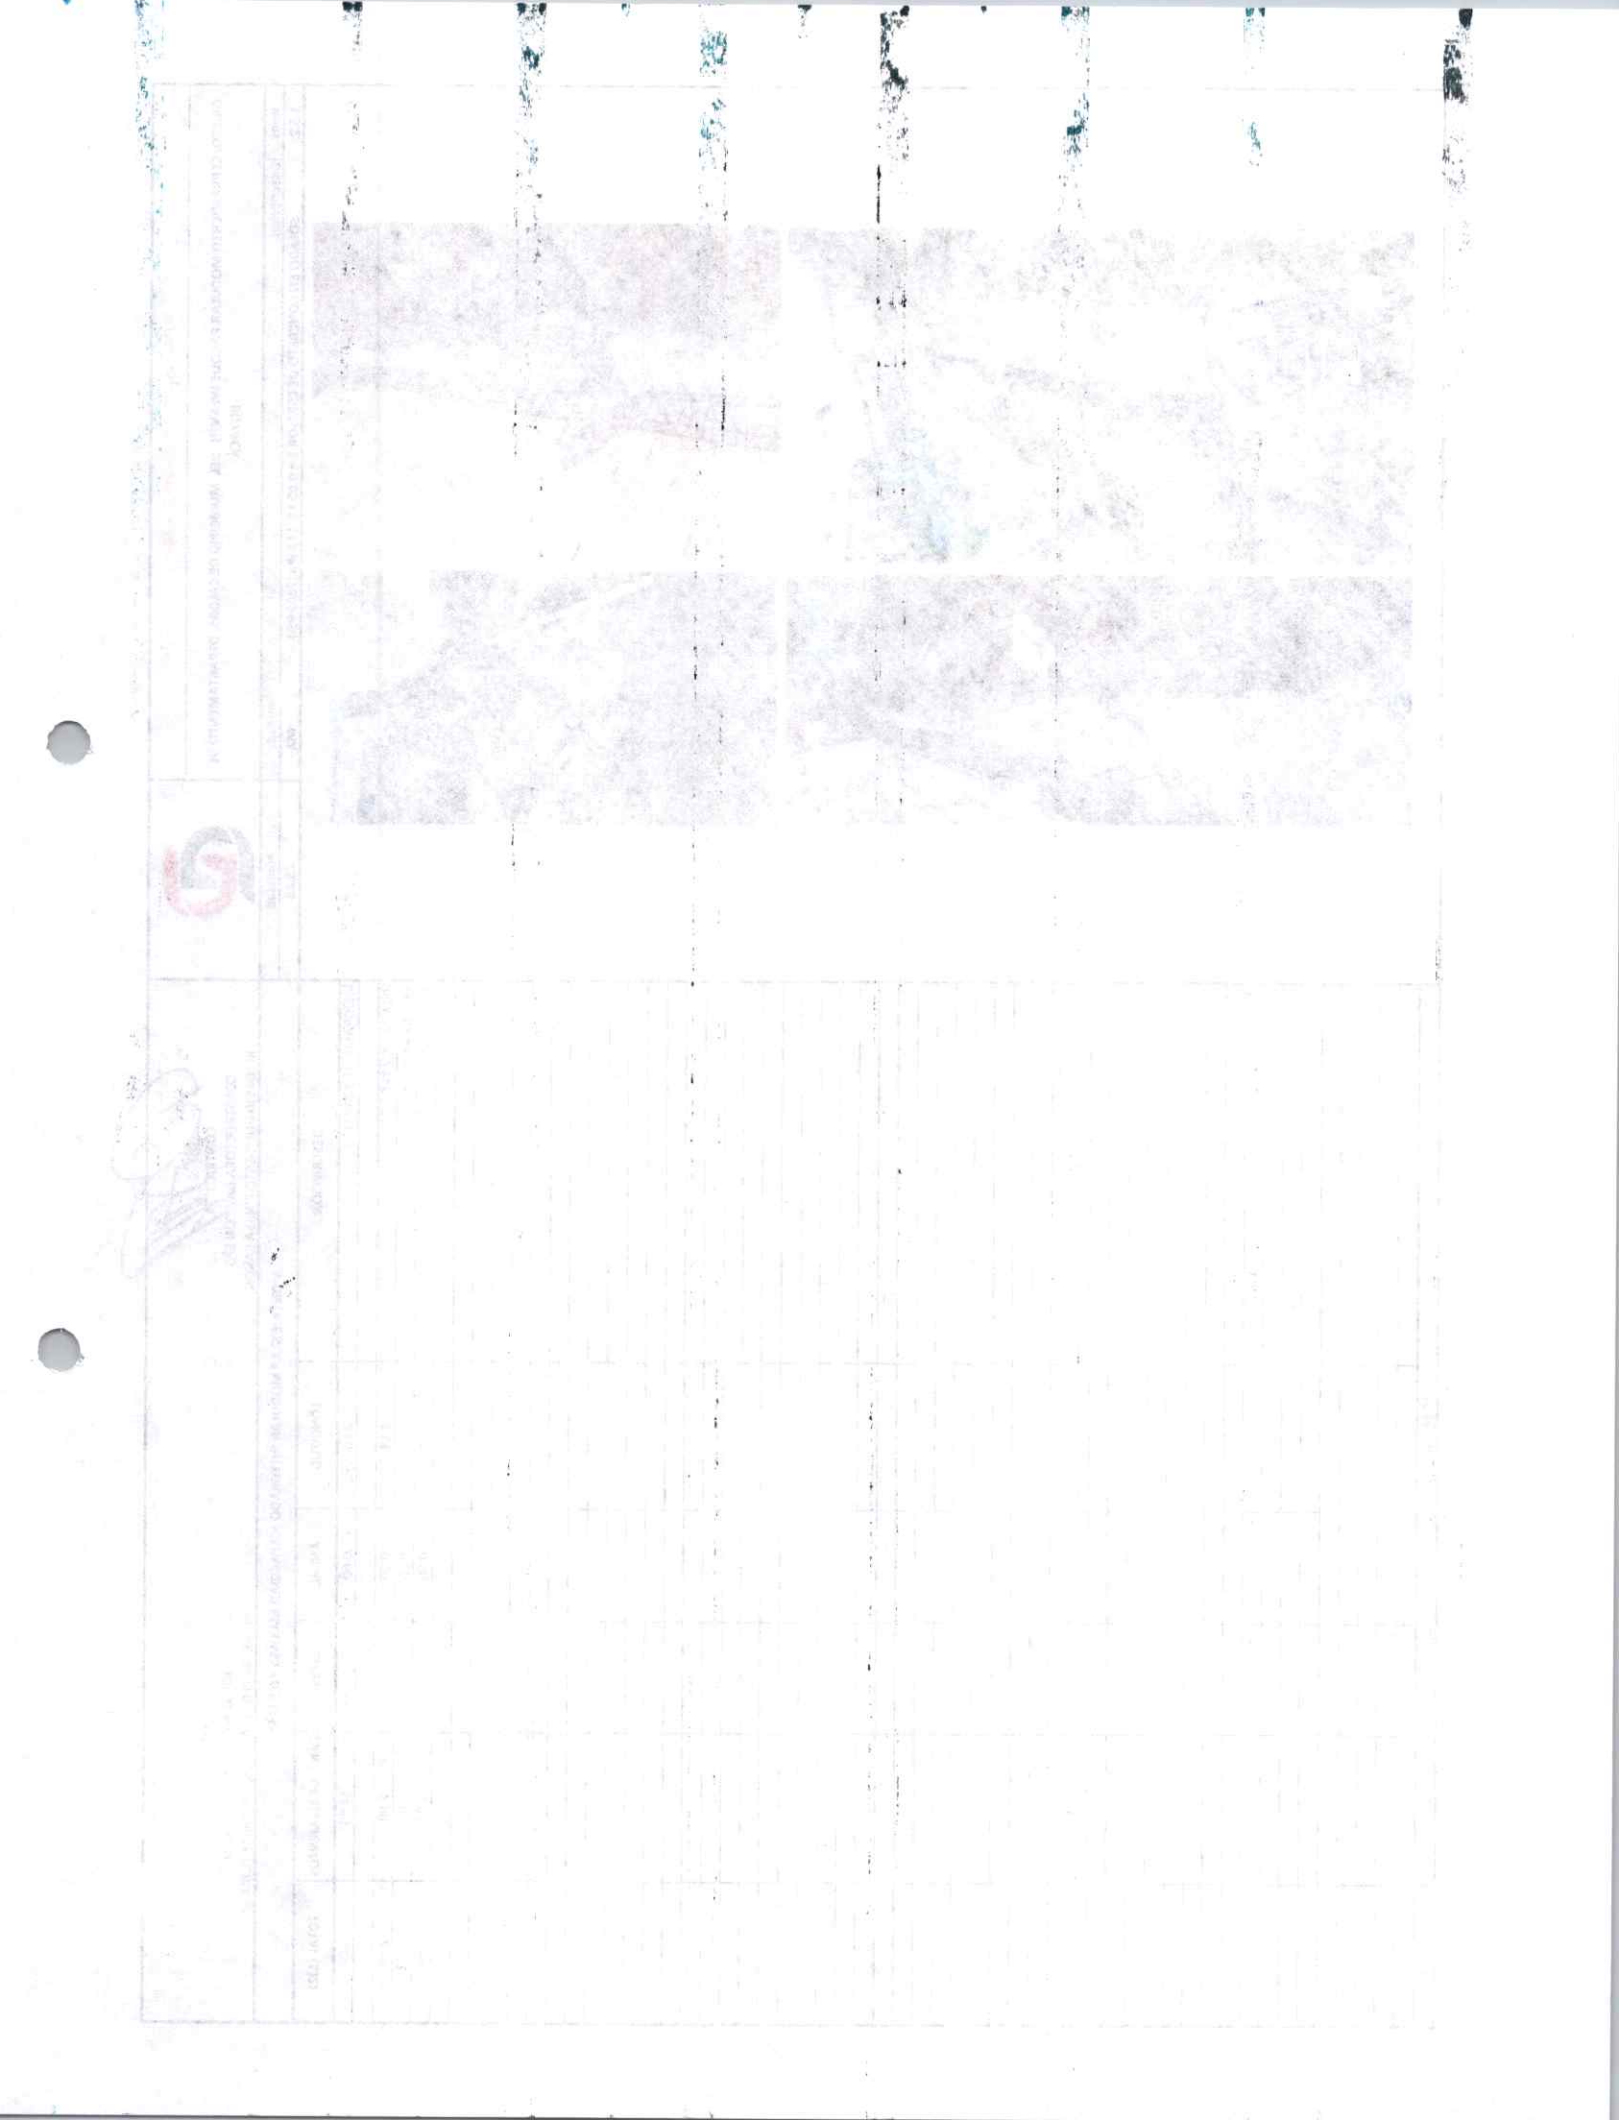

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.5.3	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	2.02



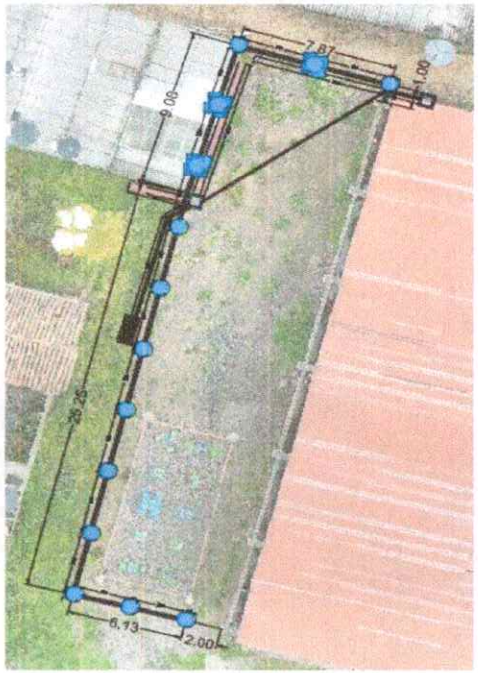

MONTAJE STAP MODULAR INTEGRADO (CAPACIDAD MAXIMA = 0,5 LPS)

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT. DE ELEMENTOS	TOTAL (M3)
ZAPATAS	0.60	0.60	0.40	14.00	2.02
				TOTAL (M3):	2.02

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.5.4	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0.51







MONTAJE STAP MODULAR INTEGRADO (CAPACIDAD MAXIMA = 0,5 LPS)

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT. DE ELEMENTOS	TOTAL (M3)
COLUMNAS EN CONCRETO	0.30	0.30	0.30	13.00	0.35
COLUMNAS EN CONCRETO ESQUINERA CONTENCION	0.30	0.30	1.80	1.00	0.16
				TOTAL (M3):	0.51



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.5.5	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	UND	1.00








MONTAJE STAP MODULAR INTEGRADO (CAPACIDAD MAXIMA = 0,5 LPS)

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT. DE ELEMENTOS	TOTAL (UND)
SUMIDERO				1.00	1.00

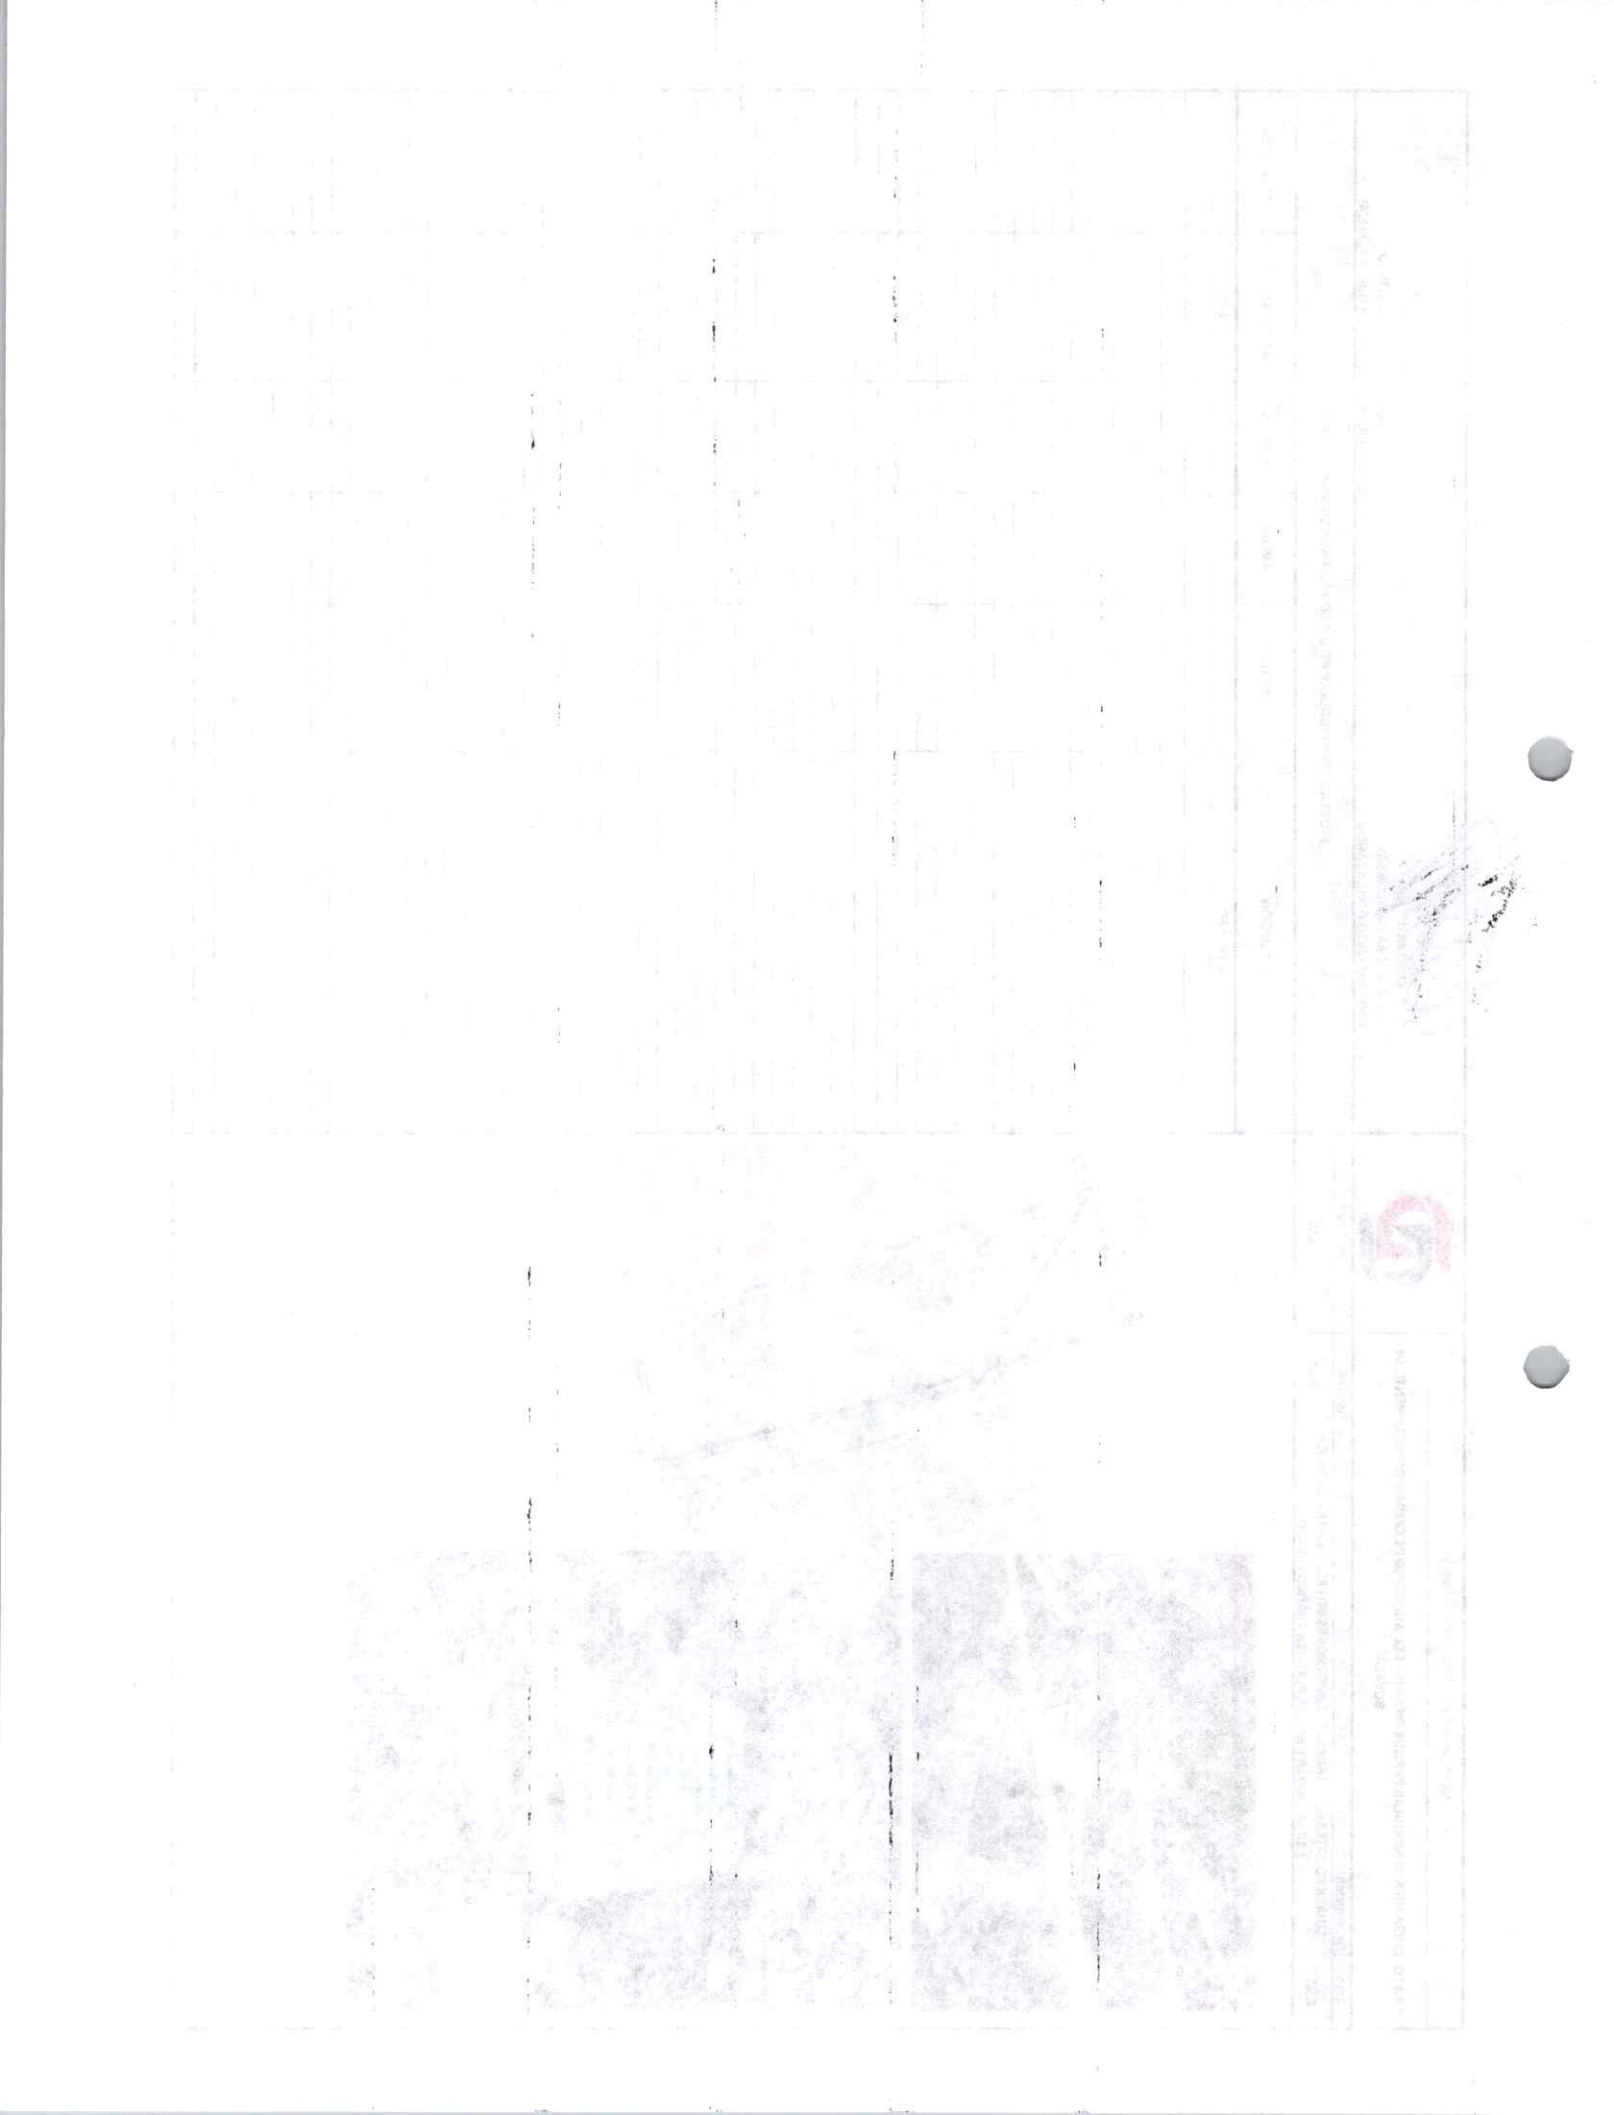


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Item	Descripcion	unidad	cantidad
1.5.6	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	3.04



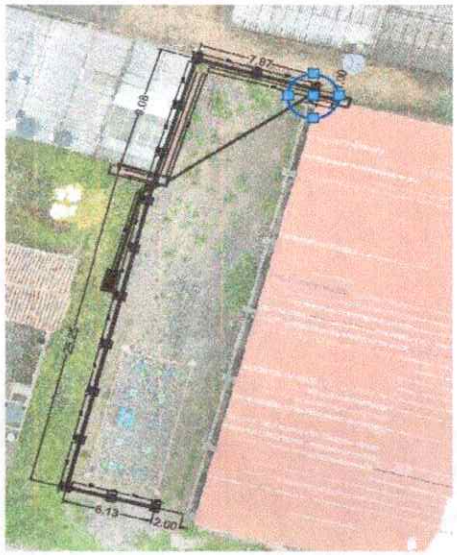






CONTRATISTA
CONSTRUCTORA DAVICON SAS
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

SUPERVISOR
JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

MONTAJE STAP MODULAR INTEGRADO (CAPACIDAD MAXIMA = 0,5 LPS)

DESCRIPCIÓN	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	CANT. DE ELEMENTOS	TOTAL (M3)
CICLOPEO	30.00	0.30	0.20	1.00	1.80
MURO CICLOPEO	1.15	0.30	1.80	1.00	0.62
	0.60	0.30	1.90	1.00	0.34
DADOS EN CONCRETO CICLOPEO	0.40	0.40	0.35	5.00	0.28
				TOTAL (M3):	3.04



Constructora
AVICON
Transformamos espacios

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

Constructora DAVICON
Transformamos espacios


CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CAPITULO	**1. PRELIMINALES**
ACTIVIDADES	**CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60X0.60X0.60. (NO INCLUYE TAPA)**
UNIDAD	**UND**

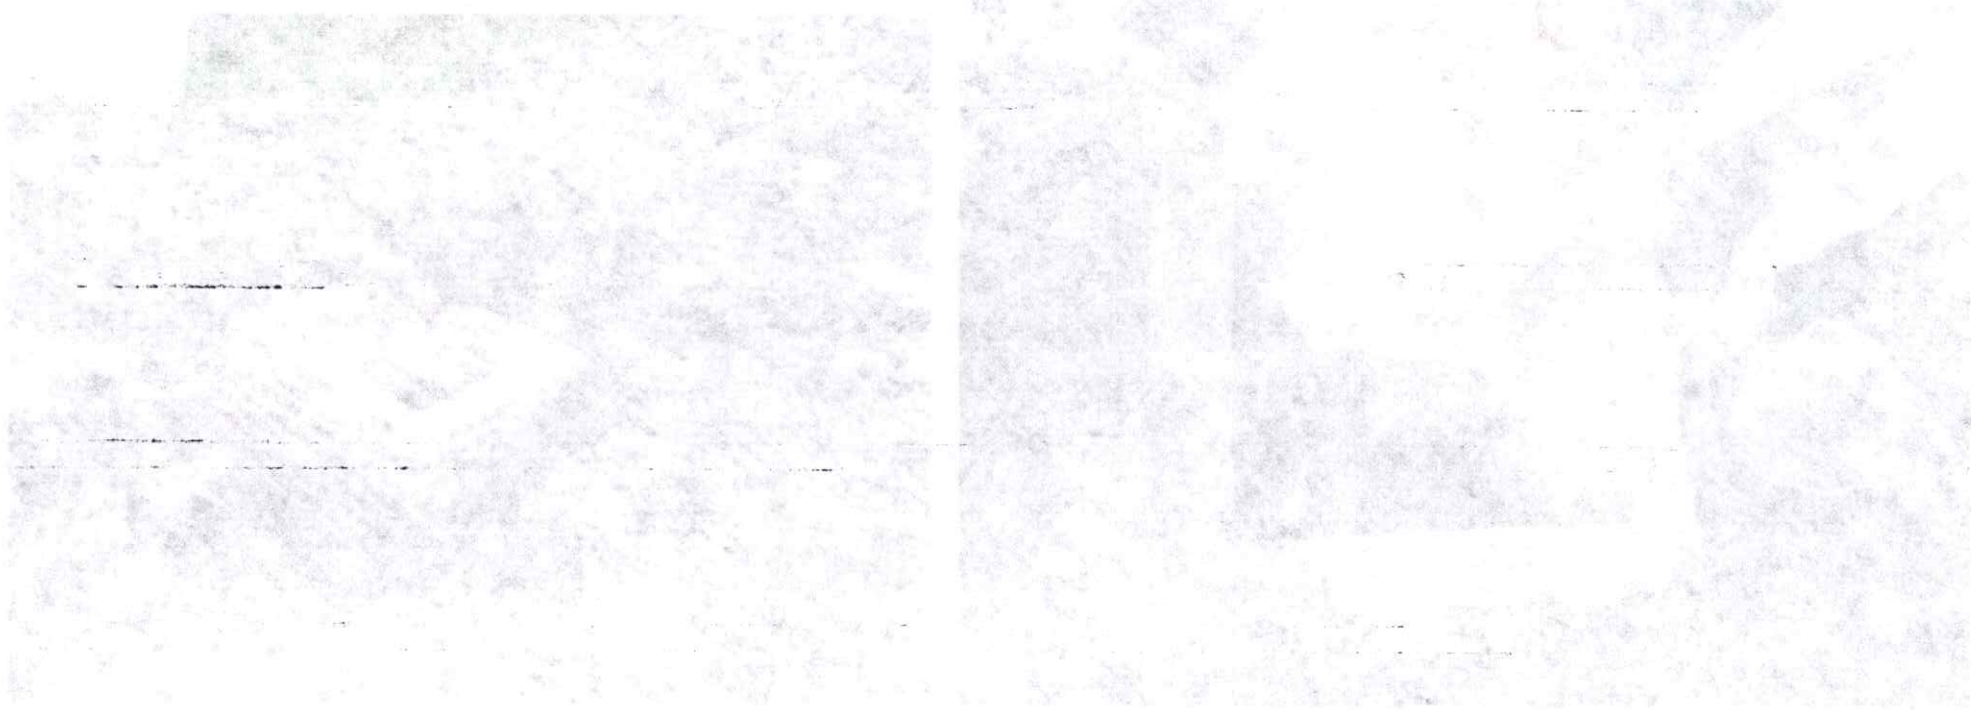

Constructora AVICON
Transformamos espacios


CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CAPITULO	**1. PRELIMINALES**
ACTIVIDADES	**CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR**
UNIDAD	M3

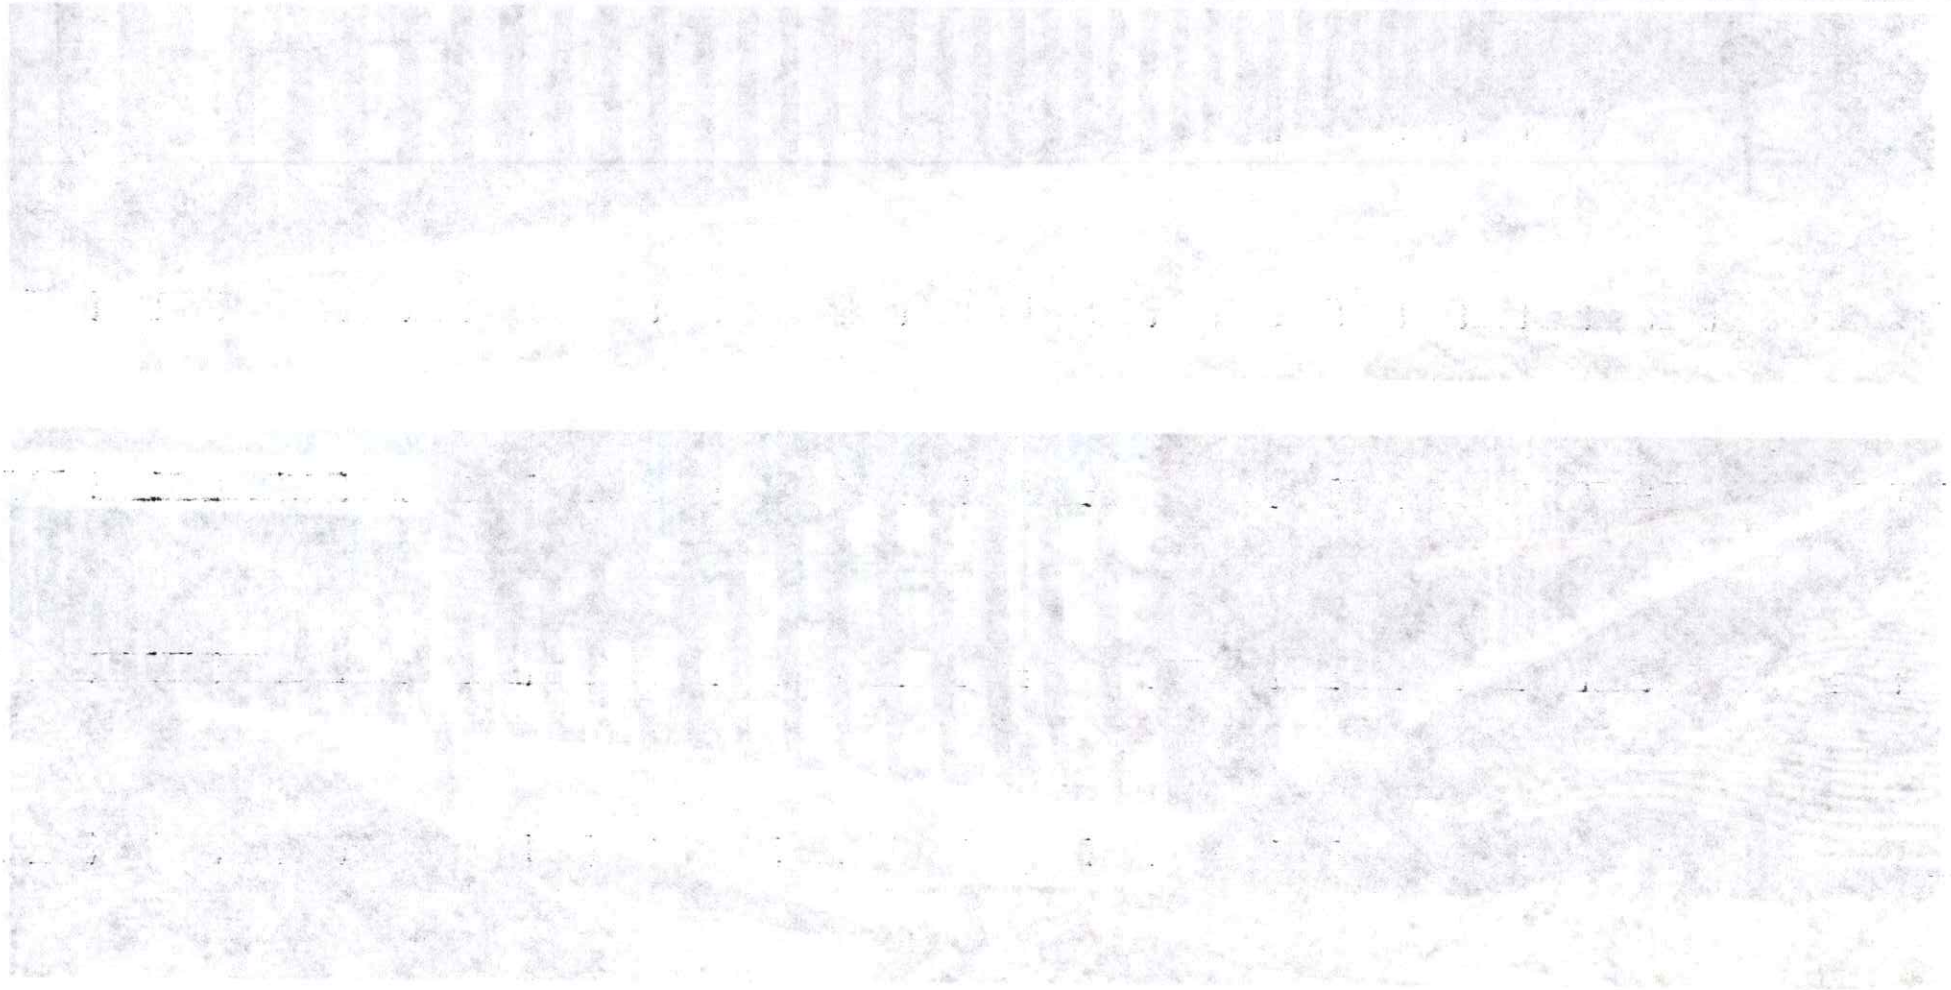


Constructora AVICON
Transformamos espacios

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





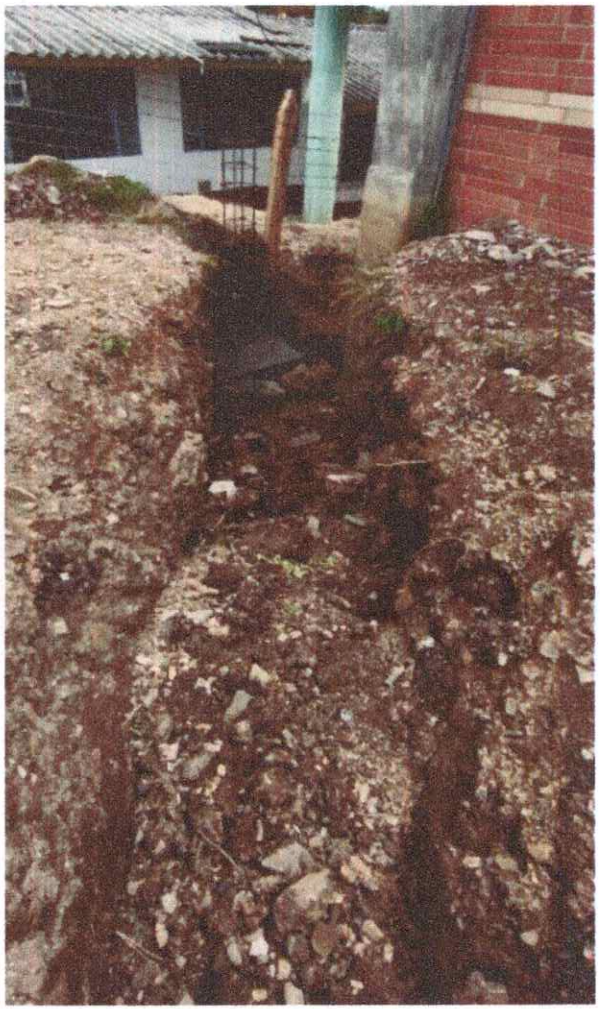

CAPITULO	**1. PRELIMINALES**
ACTIVIDADES	**EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN**
UNIDAD	M3

Constructora AVICON
Transformamos espacios

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CAPITULO	**1. PRELIMINALES**
ACTIVIDADES	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4**
UNIDAD	ML


Constructora AVICON
Transformamos espacios

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.


REGISTRO FOTOGRÁFICO







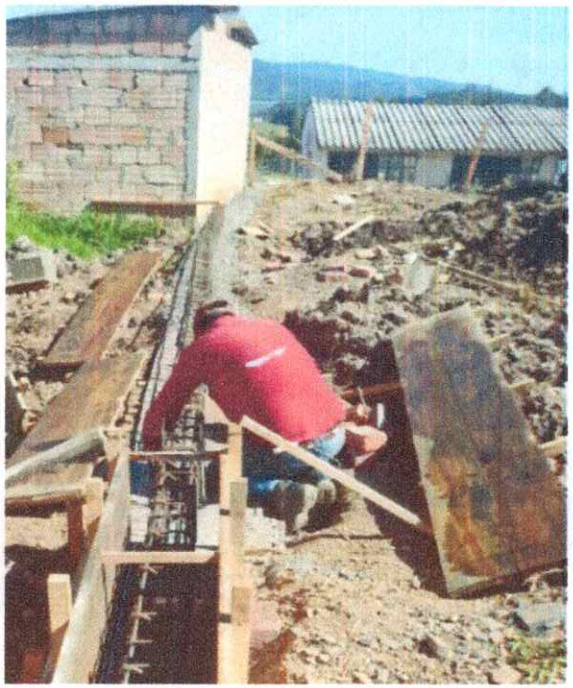

CAPITULO	**1. PRELIMINALES**
ACTIVIDADES	**SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa**
UNIDAD	KG

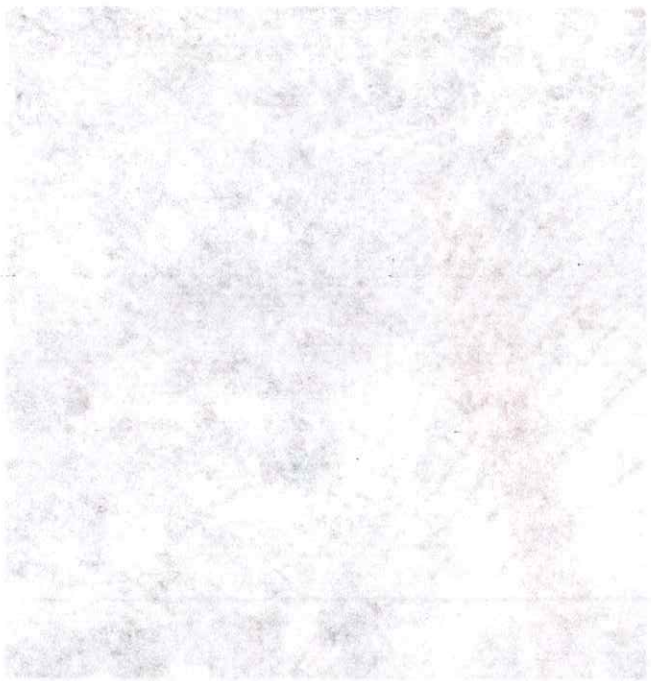

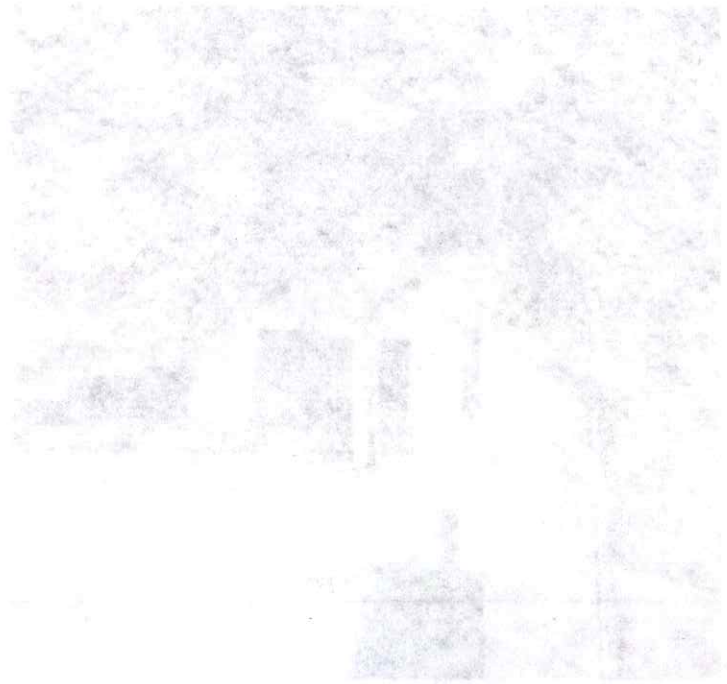

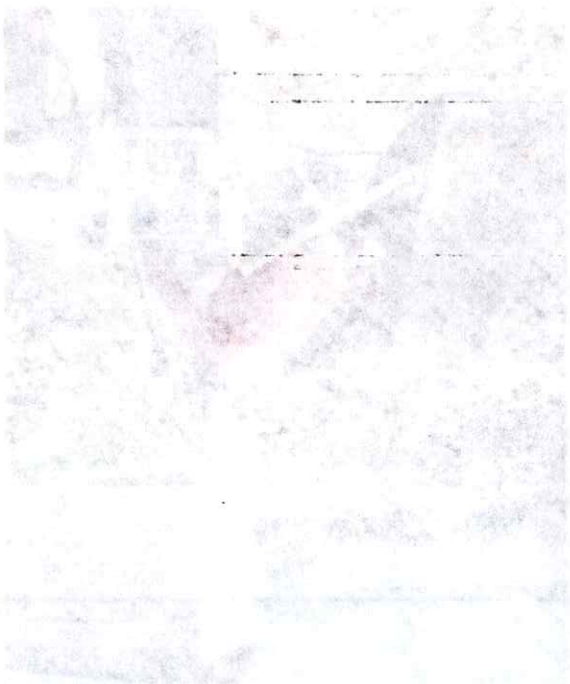

Constructora AVICON
Transformamos espacios

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CAPITULO	**1.2.ESTRUCTURAS**
ACTIVIDADES	**CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000**
UNIDAD	M3

Constructora DAVICON
Transformamos espacios

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CAPITULO	**1.3.CARPINTERIA METALICA**
ACTIVIDADES	**FABRICACIÓN E INSTALACIÓN CERRAMIENTO CALIDAD NTC 156, ANCLAJE EN PERFIL ANGULO ASTMA 572 Y VARILLA CORRUGADA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO), INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN CROMATO DE ZINC Y PUNTURA ESMALTE ACABADO.**
UNIDAD	M2


Constructora AVICON
Transformamos espacios

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CAPITULO	**1.3.CARPINTERIA METALICA**
ACTIVIDADES	**SUMINISTRO E INSTACION DE PORTON METALICO DOS HOJAS EN TUBERIA CERRAMIENTO CALIDAD NTC156, APOYOS EN CHUMACERAS DE 1" 1/4" Y PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100 ASTM A500, PLATINA ACERO ASTM A-36 FALLEVAS EN PLATINA Y VARILLA D=1/2, INCLUYE PINTURA DE PROTECCION CROMATO DE ZINC Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO.**
UNIDAD	M2

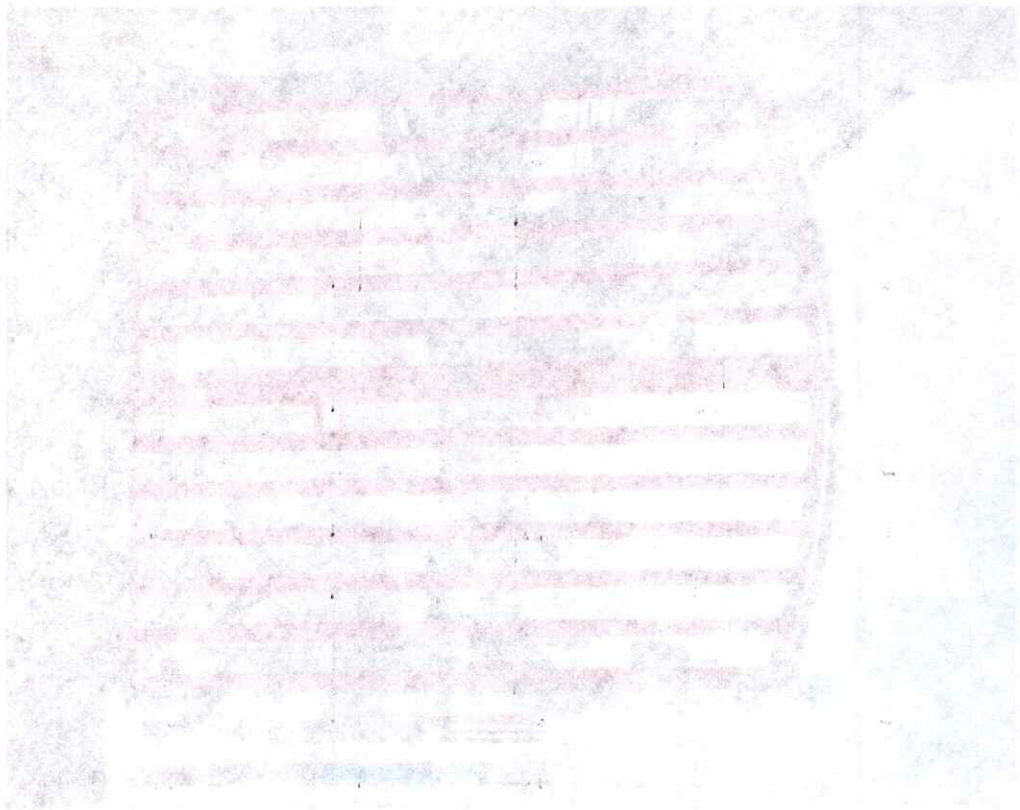

Constructora AVICON
Transformamos espacios


CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.


REGISTRO FOTOGRÁFICO





CAPITULO	**1.4.PARQUE Y MOBILIARIO**
ACTIVIDADES	**PARQUE PLÁSTICO COMPUESTO POR: 2 torres, 2 Ductos, 1 juego de 2 columpios, 1 rodadero Doble, 1 rodadero cerrado, 1 Muro de escalar, 1 Juego de pasamanos con argollas y trapecios, 1 triqui, 2 escaleras. Piezas del parque Fabricadas 100% en plástico: Vigas plásticas, postes plásticos, perfiles plásticos, vigetas plásticas, tablas plásticas. Anclado a piso con dado en concreto.**
UNIDAD	UND

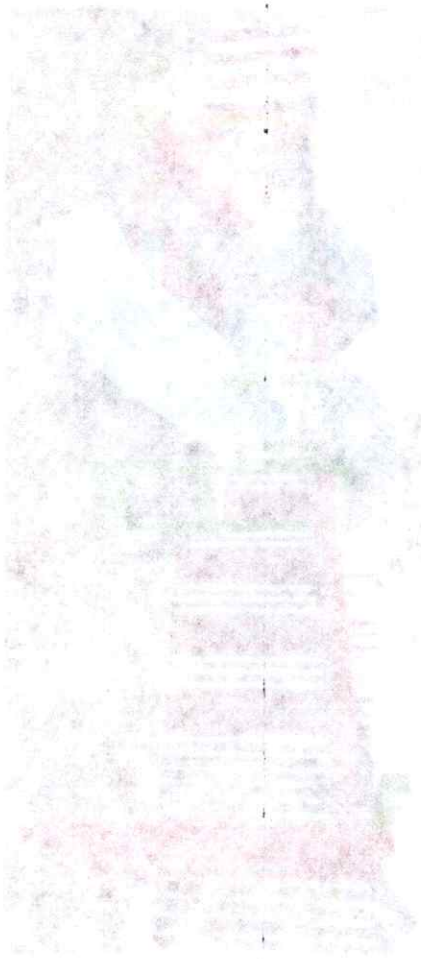

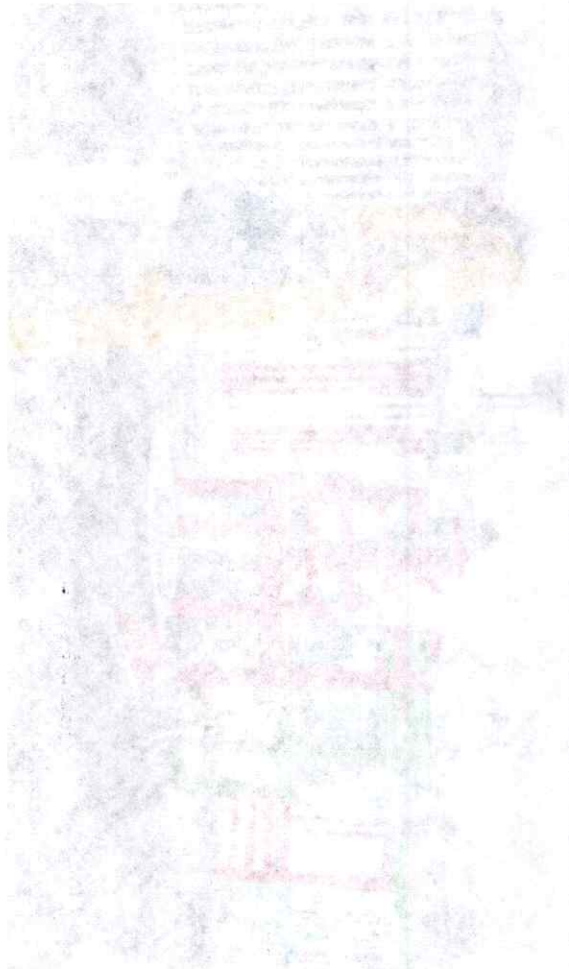

Constructora DAVICON
Transformamos espacios

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO








CAPITULO	**1.5.NO PREVISTOS**
ACTIVIDADES	**MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).**
UNIDAD	M3







Constructora AVICON
Transformamos espacios

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO







CAPITULO	**1.5.NO PREVISTOS**
ACTIVIDADES	**SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)**
UNIDAD	M2

Constructora AVICON
Transformamos espacios

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



CAPITULO	**1.5.NO PREVISTOS**
ACTIVIDADES	**CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA**
UNIDAD	M3

Constructora AVICON
Transformamos espacios

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CAPITULO	**1.5.NO PREVISTOS**
ACTIVIDADES	**COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)**
UNIDAD	M3

Constructora AVICON
Transformamos espacios


CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CAPITULO	**1.5.NO PREVISTOS**
ACTIVIDADES	**SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).**
UNIDAD	UND

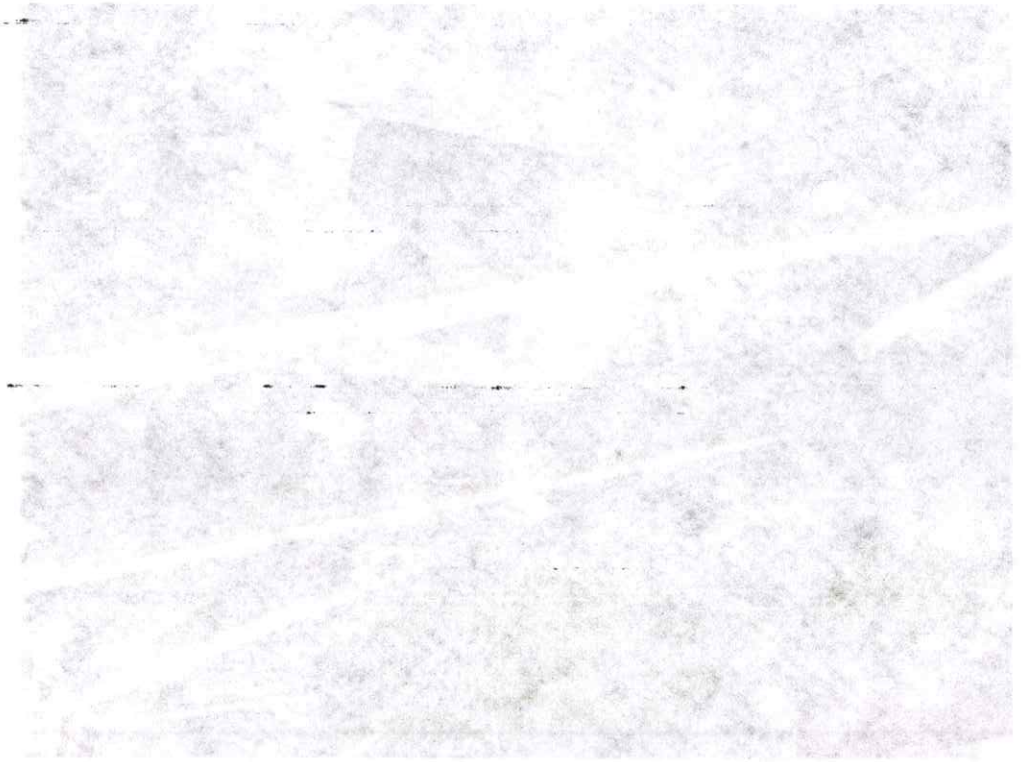


Constructora AVICON
Transformamos espacios

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



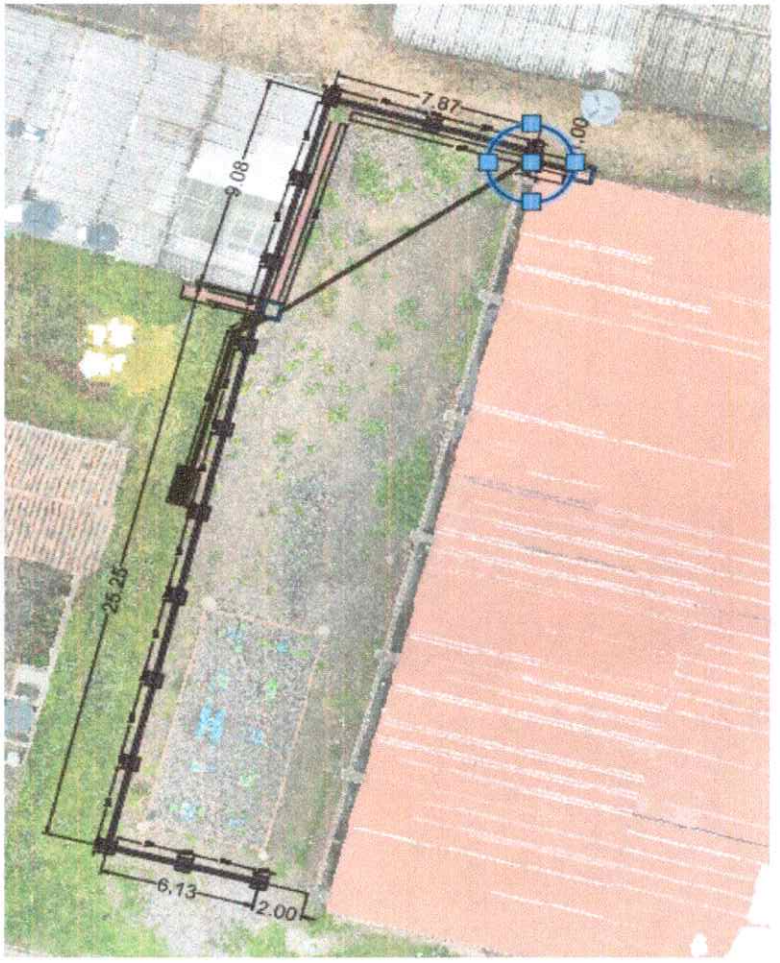

CAPITULO	**1.5.NO PREVISTOS**
ACTIVIDADES	**CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P**
UNIDAD	M3

Constructora
AVICON
Transformamos espacios

SABANA DE CANTIDADES

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

MUNICIPIO DE CALDAS DEPARTAMENTO DE BOYACA

SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	COTRATISTA	CONSTRUCTORA DAVICON SAS NIT: 901852129-5 RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	SUPERVISOR	JORGE IVAN OVALLE CASTILLO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Constructora DAVICON — Transformamos espacios

ACTA DE MODIFICACIONES N2

ITEM No.	ITEM GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICATORIO N° 1		+ -	MODIFICACIONES (+/-)		MODIFICATORIO N° 2		+ -	MODIFICACIONES (+/-)	
							CANTIDAD	V/TOTAL		CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL		CANTIDAD	V/TOTAL
1	PRELIMINALES															
1.1.1	2.02.02	CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60X0.60X0.60. (NO INCLUYE TAPA)	UND	1.00	$ 437,626.92	$ 437,626.92	2	$ 875,253.84	+	1.00	$ 437,626.92	1	$ 437,626.92	-	1.00	$ 437,626.92
1.1.2	2.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	5.37	$ 887,295.00	$ 4,764,774.15	6.0072	$ 5,330,158.52	+	0.64	$ 565,384.37	5.92	$ 5,252,431.48	-	0.09	$ 77,727.04
1.1.3	2.01.70	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	13.52	$ 70,577.63	$ 954,209.56	32.21	$ 2,273,305.46	+	18.69	$ 1,319,095.90	32.06	$ 2,262,718.82	-	0.15	$ 10,586.64
1.1.4	5.01.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML	12.74	$ 41,023.96	$ 522,645.25	16.98	$ 696,586.84	+	4.24	$ 173,941.59	20	$ 820,479.20	+	3.02	$ 123,892.36
1.1.5	2.02.35	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	567.03	$ 7,675.05	$ 4,351,983.60	715.732	$ 5,493,278.89	+	148.70	$ 1,141,295.29	802.56	$ 6,159,680.45	+	86.83	$ 666,401.57
1.2	ESTRUCTURAS															
1.2.1	3.03.02	CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	5.85	$ 285,074.72	$ 1,667,687.11	6.24	$ 1,778,866.25	+	0.39	$ 111,179.14	7.2	$ 2,052,537.98	+	0.96	$ 273,671.73
1.3	CARPINTERIA METALICA															
1.3.1	COTI ZACI ÓN	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN CERRAMIENTO CALIDAD NTC 156, ANCLAJE EN PERFIL ANGULO ASTMA 572 Y VARILLA CORRUGADA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO), INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN CROMATO DE ZINC Y PUNTURA ESMALTE ACABADO.	M2	129.66	$ 323,000.00	$ 41,880,179.64	137.665	$ 44,465,795.00	+	8.01	$ 2,585,615.00	120.37	$ 38,877,959.60	-	17.30	$ 5,587,835.40
1.3.2	COTI ZACI ÓN	SUMINISTRO E INSTACION DE PORTON METALICO DOS HOJAS EN TUBERIA CERRAMIENTO CALIDAD NTC156, APOYOS EN CHUMACERAS DE 1" 1/4" Y PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100 ASTM A500, PLATINA ACERO ASTM A-36 FALLEVAS EN PLATINA Y VARILLA D=1/2, INCLUYE PINTURA DE PROTECCION CROMATO DE ZINC Y PINTURA ESMALTE DE ACABADO.	M2	10.35	$ 353,917.33	$ 3,663,044.40	6	$ 2,123,503.98	-	4.35	$ 1,539,540.39	5.2275	$ 1,850,102.84	-	0.77	$ 273,401.14
1.4	PARQUES Y MOBILIARIO					$ -										
1.4.1	COTI ZACI ÓN	PARQUE PLÁSTICO COMPUESTO POR: 2 torres, 2 Ductos, 1 juego de 2 columpios, 1 rodadero Doble, 1 rodadero cerrado, 1 Muro de escalar, 1 Juego de pasamanos con argollas y trapecios, 1 triqui, 2 escaleras. Piezas del parque Fabricadas 100% en plástico: Vigas plásticas, postes plásticos, perfiles plásticos, vigetas plásticas, tablas plásticas. Anclado a piso con dado en concreto.	UND	1.00	$ 21,200,000.00	$ 21,200,000.00	1	$ 21,200,000.00	=	0.00	$ -	1	$ 21,200,000.00	=	0.00	$ -
1.5	NO PREVISTOS															
1.5.1	3.03.12	MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	0.00	$ 140,393.81	$ -	4.74475	$ 666,133.53	+	4.74	$ 666,133.53	40.82	$ 5,730,548.61	+	36.07	$ 5,064,415.08
1.5.2	2.02.25	SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	0.00	$ 33,431.73	$ -	18.979	$ 634,500.80	+	18.98	$ 634,500.80	25.85	$ 864,043.06	+	6.87	$ 229,542.26

MUNICIPIO DE CALDAS DEPARTAMENTO DE BOYACA

SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS	COTRATISTA	CONSTRUCTORA DAVICON SAS NIT: 901852129-5 RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	SUPERVISOR	JORGE IVAN OVALLE CASTILLO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Constructora DAVICON — Transformamos espacios

ACTA DE MODIFICACIONES N2

ITEM No.	ITEM GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICATORIO N° 1		+ -	MODIFICACIONES (+/-)		MODIFICATORIO N° 2		+ -	MODIFICACIONES (+/-)	
							CANTIDAD	V/TOTAL		CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL		CANTIDAD	V/TOTAL
1.5.3	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	0.00	$ 918,406.92	$ -	2.016	$ 1,851,508.35	+	2.02	$ 1,851,508.35	2.02	$ 1,851,508.35	=	0.00	$ -
1.5.4	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0.00	$ 1,136,574.77	$ -	0.63	$ 716,042.11	+	0.63	$ 716,042.11	0.513	$ 583,062.86	-	0.12	$ 132,979.25
1.5.5	5.02.14	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	UND	0.00	$ 1,458,509.51	$ -	1	$ 1,458,509.51	+	1.00	$ 1,458,509.51	1	$ 1,458,509.51	=	0.00	$ -
1.5.6	1.02.09	CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	0.00	$ 515,026.63	$ -	2.728	$ 1,404,992.65	+	2.73	$ 1,404,992.65	3.043	$ 1,567,226.04	+	0.32	$ 162,233.39

COSTO DIRECTO	$ 79,442,150.63		$ 90,968,435.73		$ 11,526,284.77		$ 90,968,435.72		$ -
ADMINISTRACIÓN (22%)	$ 17,477,273.14		$ 20,013,055.43		$ 2,535,782.65	0.22	$ 20,013,055.43		$ -
IMPREVISTOS (2%)	$ 1,588,843.01		$ 1,819,368.71		$ 230,525.70		$ 1,819,368.71		$ -
UTILIDAD (6%)	$ 4,766,529.04		$ 5,458,106.14		$ 691,577.09		$ 5,458,106.14		$ -
VALOR TOTAL OBRA	$ 103,274,795.82		$ 118,258,966.02		$ 14,984,170.20		$ 118,258,966.01		$ -
PORCENTAJE (%)	100%		100%				100%		

CONSTRUCTORA DAVICON SAS
NIT: 901852129-5
RL: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Constructora
AVICON
Transformamos espacios

ENSAYOS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

REPORTE DE CALIDAD: CEMENTO ESTRUCTURAL MAX
2021
Presentación: SACOS
Cementos Argos S.A. - Planta Sogamoso

ARGOS

FECHA	PARÁMETROS QUÍMICOS			PARÁMETROS FÍSICOS								RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, Mpa				FASES CALCULADAS BOGUE			
	MgO %	SO_3 %	Pérdida ignición %	Blaine cm^2/g	Retenido Tamiz 45 µ %	Densidad g/cm^3	Cont Aire %	Exp. autoclave %	Exp. Barras de mortero %	Fraguado inicial minutos	Fraguado final minutos	R1 día	R3 días	R7 días	R28 días	C_3S %	C_2S %	C_3A %	C_4AF %
4 -10 ene	0.93	2.91	4.39	5115	1.69					142	230	17.3	29.8	36.2	46.8	62.06	14.40	6.15	11.70
11 -17 ene	0.99	2.93	4.39	5083	2.23	3.06				133	220	16.8	29.4	36.9	47.1	55.12	11.36	5.46	10.31
18 - 24 ene	0.99	2.81	4.49	4770	2.09					131	210	15.7	29.1	35.0	44.3	56.92	9.70	5.30	10.23
25 31 ene	0.97	2.93	5.05	5177	2.03					133	220	15.3	27.3	33.9	43.8	52.72	13.49	4.91	11.72
1 - 7 feb	1.01	2.86	4.89	5069	1.86					134	220	16.5	29.3	37.5		54.04	13.31	5.61	10.41
8 - 14 feb	0.99	2.83	4.92	4827	2.31					134	220	15.3	29.4	35.6		53.80	13.21	5.66	10.26
15 - 21 feb	1.00	3.03	4.53	4840	2.61					150	220	15.5	27.3			57.12	10.39	5.53	10.44
22 - 28 feb	1.01	2.90	4.49	4770	2.54					145	220					53.21	13.61	6.01	10.65
PROMEDIO	0.99	2.90	4.64	4956	2.17	3.06	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	138	220	16.0	28.8	35.8	45.5	55.62	12.43	5.58	10.71
DESV EST	0.02	0.07	0.26	170	0.32	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	7	5	0.8	1.1	1.3	1.7	3.06	1.71	0.39	0.63
COEF VAR %	2.5	2.5	5.7	3.4	14.6	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	5.1	2.4	5.0	3.7	3.6	3.7	5.5	13.8	7.0	5.9
MAX	1.01	3.03	5.05	5177	2.61	3.06				150	230	17.3	29.8	37.5	47.1	62.06	14.40	6.15	11.72
MIN	0.93	2.81	4.39	4770	1.69	3.06				131	210	15.3	27.3	33.9	43.8	52.72	9.70	4.91	10.23
DATOS	8	8	8	8	8	1				8	8	7	7	6	4	8	8	8	8
CONTROL	**máx 6.0**	**máx 3.5**	**--**	**--**	**--**	**--**	**máx 12**	**máx 0.8**	**máx 0.02**	**mín 70**	**máx 330**	**mín 12.0**	**mín 24.0**	**--**	**mín 43.4**	**Cálculo según ASTM C150**			

Elaborado por: Mónica Gonzalez
Profesional de Calidad

Revisado por: Olga Lucía Díaz
Jefe de Calidad

Laboratorio de Suelos
GlobalCivil
Interventorias y Construccion

Página 1 de 4	ENSAYO
NORMA INV E – 123 –13	ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO INV E–123.

	CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÀ		
MUNICIPIO:	**MUNICIPIO DE CALDAS**	FECHA DE ENSAYO	10/11/2025
DIRIGIDO A :	DAVICON S.A.S	MATERIAL:	AFIRMADO
PROCEDENCIA:	**PAUNA**		
DESCRIPCIÓN MATERIAL:	Material compuesto por grava mal gradada con arcilla y arena de color amarillo		

ANTES DE LAVADO


No. PLATÓN	5
PESO PLATÓN (g)	203,1
PESO PLATÓN + MUESTRA (g)	2289
PESO MUESTRA (g)	2086

DESPUÉS DE LAVADO

PESO PLATÓN (g)	203,1
PESO PLATÓN + MUESTRA (g)	2163
PESO MUESTRA SECA (g)	1960
PASA TAMIZ Nº 200 (%)	6,04

TAMIZ Nº	DIÁMETRO (mm)	PESO RETENIDO (g)	PESO CORR. (g)	%RETENIDO. (g)	% RETENIDO ACUMULADO. (g)	% QUE PASA. (g)
21/2"	63,5	0	0,00	0,00	0,00	100,00
2"	50,8	0	0,00	0,00	0,00	100,00
11/2"	38,1	0,0	0,00	0,00	0,00	100,00
1"	25,4	359,0	359,14	17,22	17,22	82,78
3/4"	19,05	396,9	397,05	19,04	36,25	63,75
3/8"	9,51	264,3	264,40	12,68	48,93	51,07
4	4,76	222,0	222,09	10,65	59,58	40,42
10	2,00	323,2	323,32	15,50	75,08	24,92
40	0,425	329,8	329,93	15,82	90,89	9,11
200	0,074	52,40	52,42	2,51	93,41	6,59
FONDO		137,50	137,55	6,59	100,00	0,00
	Σ	2085,10	2085,90			

CURVA GRANULOMÉTRICA

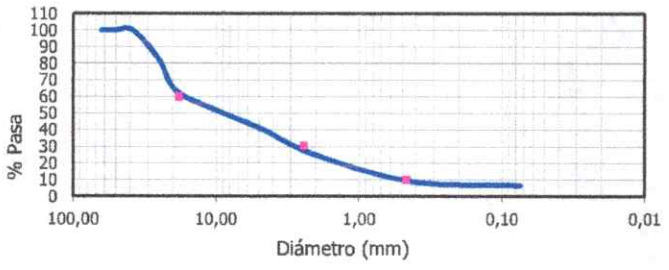

D60	18,00
D30	2,42
D10	0,46
Cu	38,8
Cc	0,7

% Gravas	***59,58***
% Arenas	***33,83***
% Finos	***6,59***


ING.JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC


Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e-mail: globalcivilsas@gmail.com

NORMA
INV E – 320 –13

ENSAYO
FRANJA GRANULOMETRICA – MATERIAL DE AFIRMADO

TAMIZ Nº	DIÁMETRO (mm)	PORCENTAJE PASA AFIRMADO				
		A-38		A-25		MATERIAL
2"	50,00	100	100			
1 ½"	37,50	70	95	100	100	100,00
1"	25,00	60	90	75	95	82,78
3/4"	19,00	45	75	55	85	63,75
3/8"	9,50	40	70	45	75	51,07
No.4	4,75	25	55	30	60	40,42
No.10	2,00	15	40	20	45	24,92
No.40	0,425	6	25	8	30	9,11
No.200	0,075	2	15	2	15	6,59

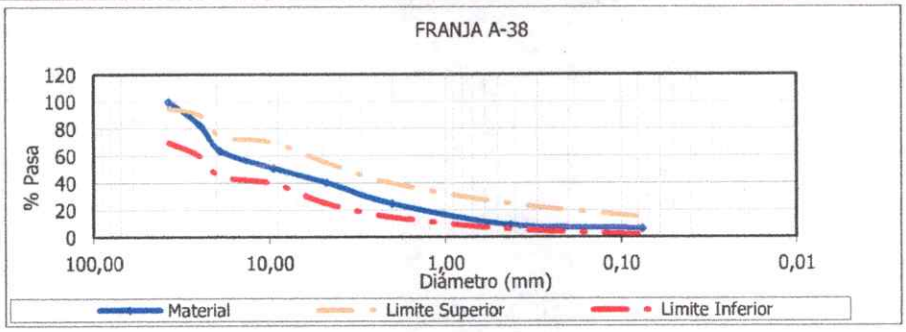

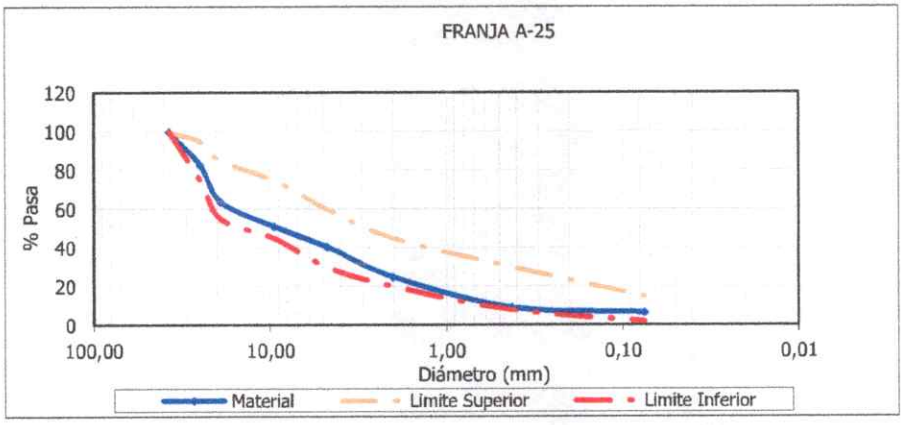

ING.JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e-mail: globalcivilsas@gmail.com


Página 3 de 4	ENSAYO
NORMA INV E – 125 –13 INV E – 126 –13	DETERMINACIÓN DEL LÍMITE LÍQUIDO, LÍMITE PLÁSTICO E ÍNDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS

PROYECTO:	**CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS,DEPARTAMENTO DE BOYACÀ**		
MUNICIPIO:	**MUNICIPIO DE CALDAS**		
DIRIGIDO A :	**DAVICON SAS**		
FECHA:	**10/11/2025**	CAPA:	AFIRMADO

DESCRIPCIÓN: Material compuesto por grava mal gradada con arcilla y arena de color cafe


LÍMITE LÍQUIDO

DETERMINACIÓN Nº	1	2	3
NÚMERO DE GOLPES	0	0	0
RECIPIENTE Nº	0	0	0
PESO RECIPIENTE +SUELO HÚMEDO (g)	0,00	0,00	0,00
PESO RECIPIENTE +SUELO SECO (g)	0,00	0,00	0,00
PESO RECIPIENTE (g)	0,00	0,00	0,00
CONTENIDO DE AGUA (%)	0,00	0,00	0,00



LÍMITE PLÁSTICO

DETERMINACIÓN Nº	1	2
RECIPIENTE Nº	0	0
PESO RECIPIENTE +SUELO HÚMEDO (g)	0,00	0,00
PESO RECIPIENTE +SUELO SECO (g)	0,00	0,00
PESO RECIPIENTE (g)	0,00	0,00
CONTENIDO DE AGUA (%)	0,00	0,00



LÍMITE LÍQUIDO:	***NLL***	% FINOS	***6,59***
LÍMITE PLÁSTICO:	***NLP***	% ARENAS	***33,83***
ÍNDICE DE PLASTICIDAD:	***NIP***	% GRAVAS	***59,58***
% PASA #4	***40,42***	% PASA #10	***24,92***
% PASA 40	***9,11***		

CLASIFICACIÓN

SUCS	AASHTO
GP-GC (Grava Mal Gradada con Arcilla y Arena)	***A-1-a (1)*** Fragmento de Roca Grava y Arena

ING.JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202-130100 BYC

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 – 7265804
e-mail: globalcivilsas@gmail.com


Laboratorio de Suelos
GlobalCivil
Interventorias y Construccion

Página 4 de 4	ENSAYO
NORMA INV E – 142 –13	ENSAYO DE COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO

PROYECTO:	**CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÀ**
LOCALIZACIÓN:	**PAUNA**
DIRIGIDO A :	DAVICON SAS
FECHA DE ENSAYO:	**10/11/2025**

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL :	Material compuesto por grava mal gradada con arcilla y arena de color cafe

DETERMINACIÓN Nº	1	2	3
NÚMERO DE GOLPES	56	56	56
PESO SUELO HÚMEDO (g)	5500	5500	5500
HUMEDAD HIGROSCÓPICA (%)	5,31	5,31	5,31
PESO SUELO SECO (g)	5223	5223	5223
HUMEDAD DESEADA (%)	5,3	6,0	9,0
HUMEDAD ADICIONAL (%)	0,0	0,7	3,7
VOLUMEN DE AGUA ADICIONAL (cc)	0	36	193
NÚMERO DE MOLDE	2	2	2
PESO DEL MOLDE (g)	2685	2685	2685
PESO DEL MOLDE + SUELO HÚMEDO (g)	7023	7312	7101
PESO DEL SUELO COMPACTO (g)	4338	4627	4416
VOLUMEN DEL MOLDE (cm^3)	2062	2062	2062
DENSIDAD HÚMEDA (g/cm^3)	2,10	2,24	2,14
HUMEDAD AL HORNO (%)	4,65	6,32	8,97
DENSIDAD SECA (Kg/m^3)	2010,3	2110,6	1965,3

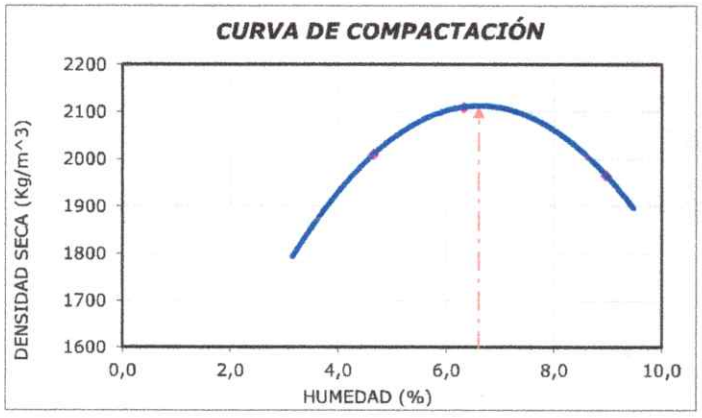

Humedad Óptima	***6,60%***


Densidad Seca Máxima	
Kg/m^3	***2100,0***
g/cm^3	***2,10***

OBSERVACIONES: _____

_____

ING. JIMMY VERGARA SILVA
MP 15202 - 130100 BYC

Carrera 9 Bis N° 0 – 36 Sur
Cel: 3138912400 - 7265804
e-mail: globalcivilsas@gmail.com

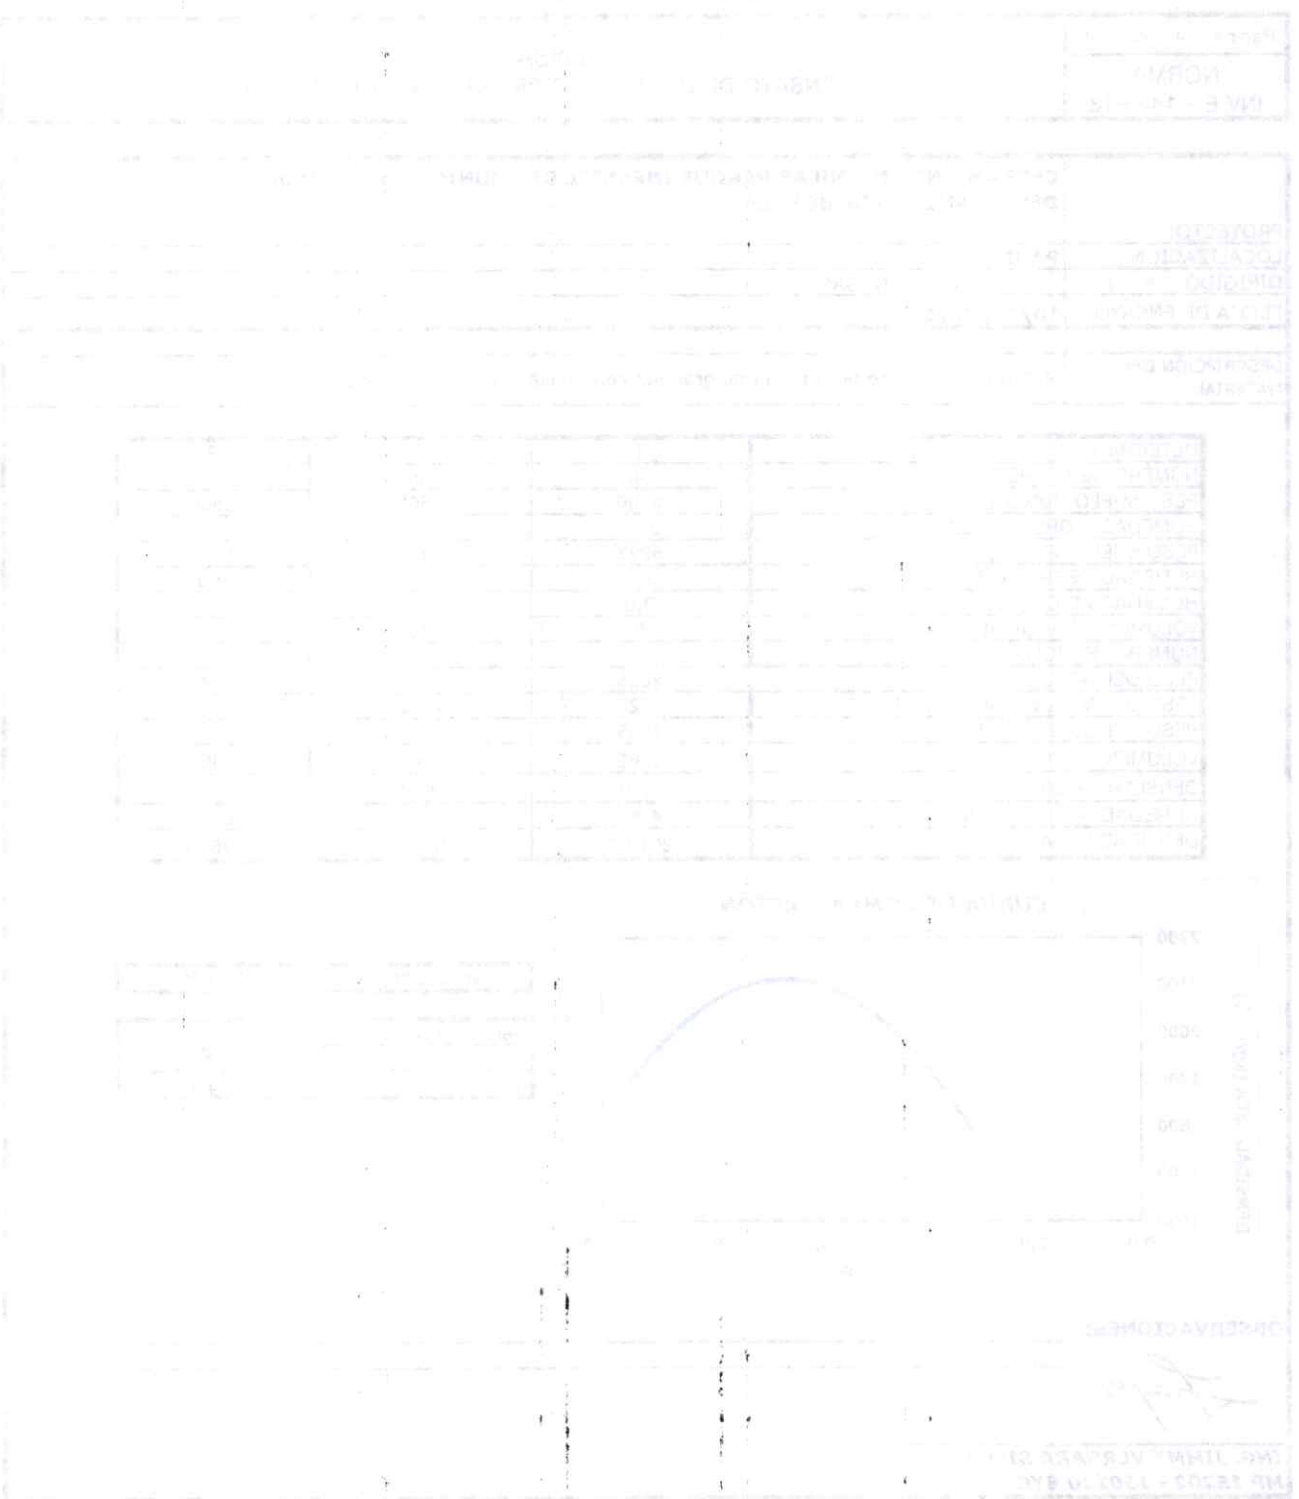

Constructora
AVICON
Transformamos espacios


PROGRAMACIÓN DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIÓN

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Predecesoras	Sucesoras	Costo
1		**CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**			**45 días**			**$ 118,358,966.02**
2		**PRELIMINARES**			**20 días**			**$ 19,413,617.02**
3		CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60X0.60X0.60. (NO INCLUYE TAPA)	UNO	1.00	1 día	5FC-5 días		$ 969,914.86
4		CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	5.99	5 días	7FC-2 días	11CC	$ 6,826,180.99
5		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	32.06	10 días		3FC-9 días,17CC+3 días	$ 2,941,334.43
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML	20.00	2 días	5FC-8 días		$ 1,008,602.53
7		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	899.56	7 días	17	18FC-3 días,19FC-3 días	$ 6,007,364.56
8		**ESTRUCTURAS**			**5 días**			**$ 7,668,299.34**
9		CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	7.20	3 días	12	21	$ 7,668,299.34
10		**CARPINTERIA METALICA**			**18 días**			**$ 52,946,481.11**
11		FABRICACION E INSTALACIÓN CERRAMIENTO CALIDAD NTC 156, ANCLAJE EN PERFIL ANGULO ASTMA 572 Y VARILLA CORRUGADA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO), INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN CROMATO DE ZINC Y PUNTURA ESMALTE	M2	220.37	13 días	4CC	13	$ 50,941,347.45
12		SUMINISTRO E INSTACION DE PORTON METALICO DOS HOJAS EN TUBERIA CERRAMIENTO CALIDAD NTC156, APOYOS EN CHUMACERAS DE 1" 1/4" Y PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100 ASTM A500, PLATINA ACERO ASTM A-36 FALLEVAS EN PLASMA Y VARILLA D=1/2, INCLUYE PINTURA DE	M2	5.23	5 días	11	9	$ 2,005,133.66
13		**PARQUES Y MOBILIARIO**			**6 días**			**$ 27,558,999.97**
14		PARQUE PLÁSTICO COMPUESTO POR: 2 torres, 2 Ductos, 1 juego de 2 columpios, 1 rodadero Doble, 1 rodadero cerrado, 1 Muro de escalar, 1 Juego de argollas y trapecios, 1 Wiqui, 2 escaleras. Pisaas del parque Fabricados 100% en plástico/ Vigas	UNO	1.00	6 días	21CC	16	$ 27,558,999.97
15		**NO PREVISTOS**			**42 días**			**$ 19,631,362.78**
16		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	40.82	3 días	14		$ 7,448,713.16
17		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	25.85	1 día	5CC+3 días	7	$ 1,121,755.33
18		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	2.02	2 días	7FC-3 días		$ 2,478,860.51
19		COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0.51	2 días	7FC-3 días		$ 757,881.99
28		SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	UND	1.00	1 día	5FC-1 día		$ 1,666,052.33
41		CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	3.04	6 días	9	14CC	$ 2,077,363.42

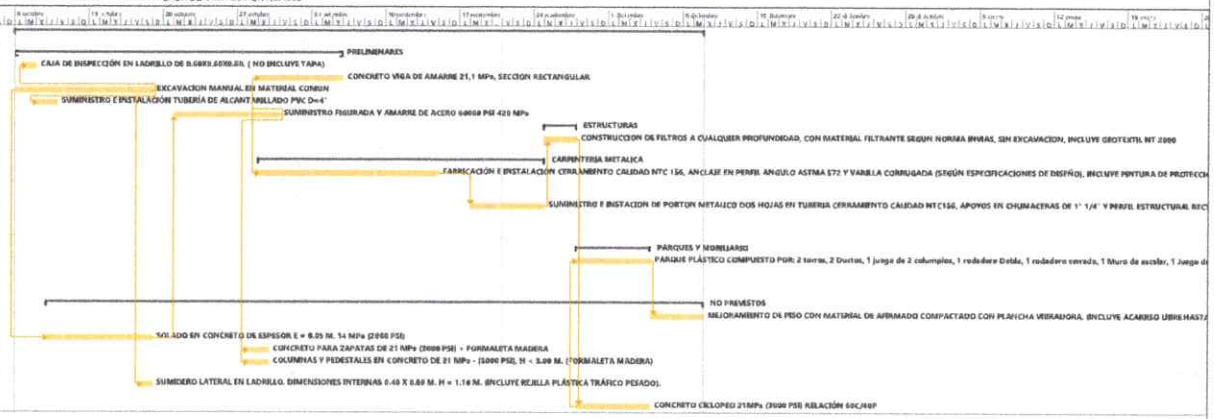

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mié 17/12/25

RUTA CRITICA


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad
1		**CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**		
2		**PRELIMINARES**		
3		CAJA DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60X0.60X0.60. (NO INCLUYE TAPA)	UND	1.00
4		CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3	5.97
5		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	32.06
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML	20.00
7		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG	802.96
8		**ESTRUCTURAS**		
9		CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2000	M3	7.20
10		**CARPINTERIA METALICA**		
11		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN CERRAMIENTO CALIDAD NTC 556, ANCLAJE EN PERFIL ANGULO ASTMA 572 Y VARILLA CORRUGADA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO), INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN CROMATO DE ZINC Y PUNTURA ESMALTE	M2	220.37
12		SUMINISTRO E INSTACION DE PORTON METALICO DOS HOJAS EN TUBERIA CERRAMIENTO CALIDAD NTC156, APOYOS EN CHUMACERAS DE 1" 1/4" Y PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100 ASTM A500, PLATINA ACERO ASTM A-36 FALLEVAS EN PLATINA Y VARILLA D=1/2, INCLUYE PINTURA DE	M2	5.23
13		**PARQUES Y MOBILIARIO**		
14		PARQUE PLÁSTICO COMPUESTO POR: 2 torres, 2 Ductos, 1 juego de 2 columpios, 1 rodadero Doble, 1 rodadero cerrado, 1 Muro de escalar, 1 Juego de pasamanos con argollas y trapecios, 1 trikpul, 2 escaleras. Piezas del parque Fabricados 100% en plástico: Vigas	UND	1.00
15		**NO PREVISTOS**		
16		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3	40.82
17		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2	25.85
18		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3	2.02
19		COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	0.51
20		SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	UND	1.00
21		CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60C/40P	M3	3.04

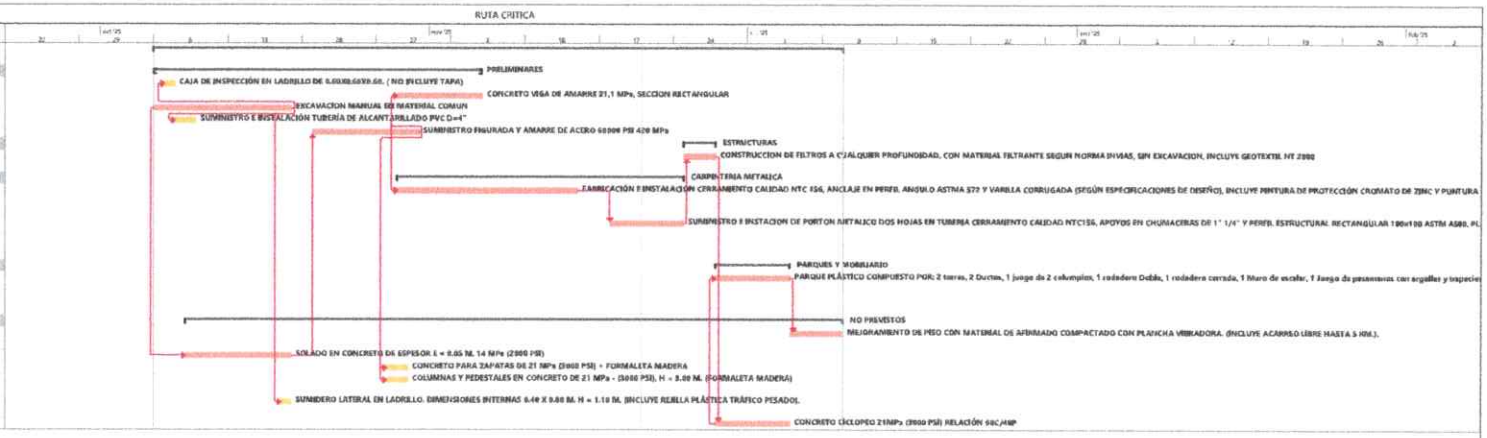

Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mié 17/12/25

DIAGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA

Nº	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad
1		**CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFACERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.NTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**	
2		**PRELIMINARES**	
3		CAJA DE INSPECCION EN LADRILLO DE 0.60X0.60X0.60. (NO INCLUYE TAPA)	UND
4		CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 MPa, SECCION RECTANGULAR	M3
5		EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3
6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=4"	ML
7		SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 MPa	KG
8		**ESTRUCTURAS**	
9		CONSTRUCCION DE PISTAS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS, SIN EXCAVACION, INCLUYE GEOTEXTIL NT 2030	M3
10		**CARPINTERIA METALICA**	
11		FABRICACIÓN E INSTALACIÓN CERRAMIENTO CALIDAD NTC 1516, ANCLAJE EN PERFIL ANGULO ASTMA 572 Y VARILLA CORRUGADA (SEGÚN ESPECIFICACIONES DE DISEÑO), INCLUYE PINTURA DE PROTECCIÓN CROMATO DE ZINC Y PUNTURA ESMALTE	M2
12		SUMINISTRO E INSTACION DE PORTON METALICO DOS HOJAS EN TUBERIA CERRAMIENTO CALIDAD NTC1516, APOYOS EN CHUMACERAS DE 1" 1/4" Y PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x100 ASTM A500, PLATINA ACERO ASTM A-36 FALLEVAS EN PLATINA Y VARILLA D= 1/2, INCLUYE PINTURA DE	M2
13		**PARQUES Y MOBILIARIO**	
14		PARQUE PLÁSTICO COMPUESTO POR: 2 torres, 2 Ductos, 1 juego de 2 columpios, 1 rodadero Doble, 1 trobadero cerrado, 1 Faro de escalar, 1 juego de pasamanos con argollas y trapecios, 1 trikia, 2 escaleras. Pinzas del parque Fabricadas 100% en plástico: Vigas	UND
15		**NO PREVISTOS**	
16		MEJORAMIENTO DE PISO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.).	M3
17		SOLADO EN CONCRETO DE ESPESOR E = 0.05 M. 14 MPa (2000 PSI)	M2
18		CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	M3
19		COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. [FORMALETA MADERA]	M3
20		SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 Y 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	UNO
21		CONCRETO CICLOPEO 21MPa (3000 PSI) RELACIÓN 60CA/0P	M3

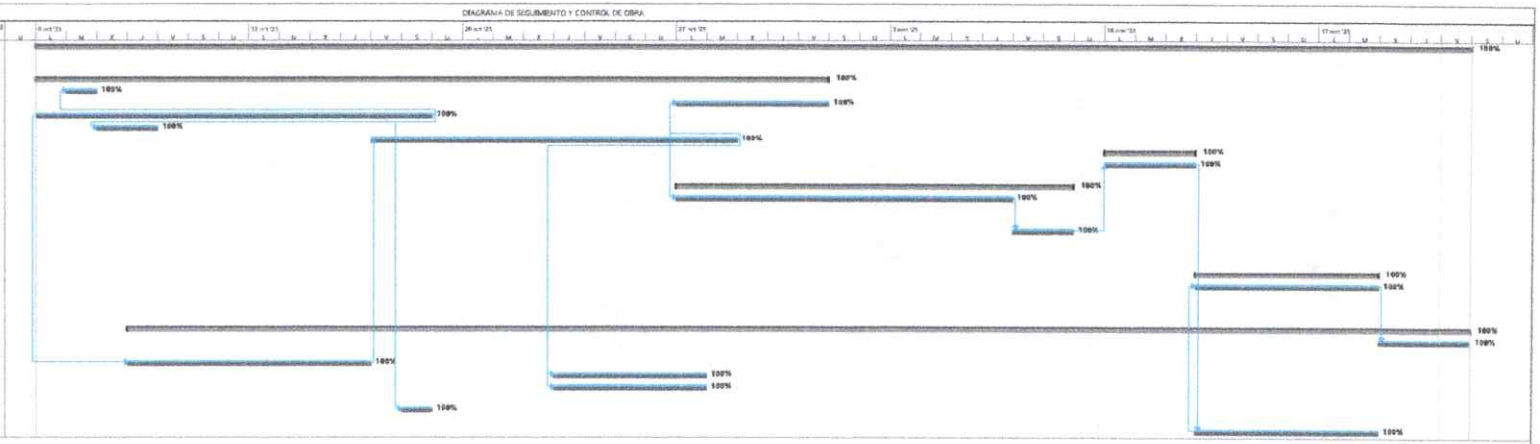

Página 1


FLUJO DE CAJA MENSUAL

Constructora
AVICON
Transformamos espacios

BITÀCORA

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

Constructora AVICON Transformamos espacios	BITÁCORA	VERSIÓN - 01

CONTRATO DE OBRA No. SAMC -0.13 – 2025

"CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"



BITÁCORA DE OBRA

PERIODO: 06 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025

CALDAS 2025


BITACORA DE OBRA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dicho proyecto está localizado en la carrera 2 del municipio de Caldas -Boyacá a una altura de 2557 metros sobre el nivel del mar, A continuación, se muestran las coordenadas correspondientes al perímetro del predio objeto del levantamiento topográfico y las coordenadas de la localización exacta de la obra corresponden a Latitud 5.555366° y Longitud -73.864671.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO
BOYACÁ	CALDAS	**"CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"**

Ilustración 1. Localización del proyecto

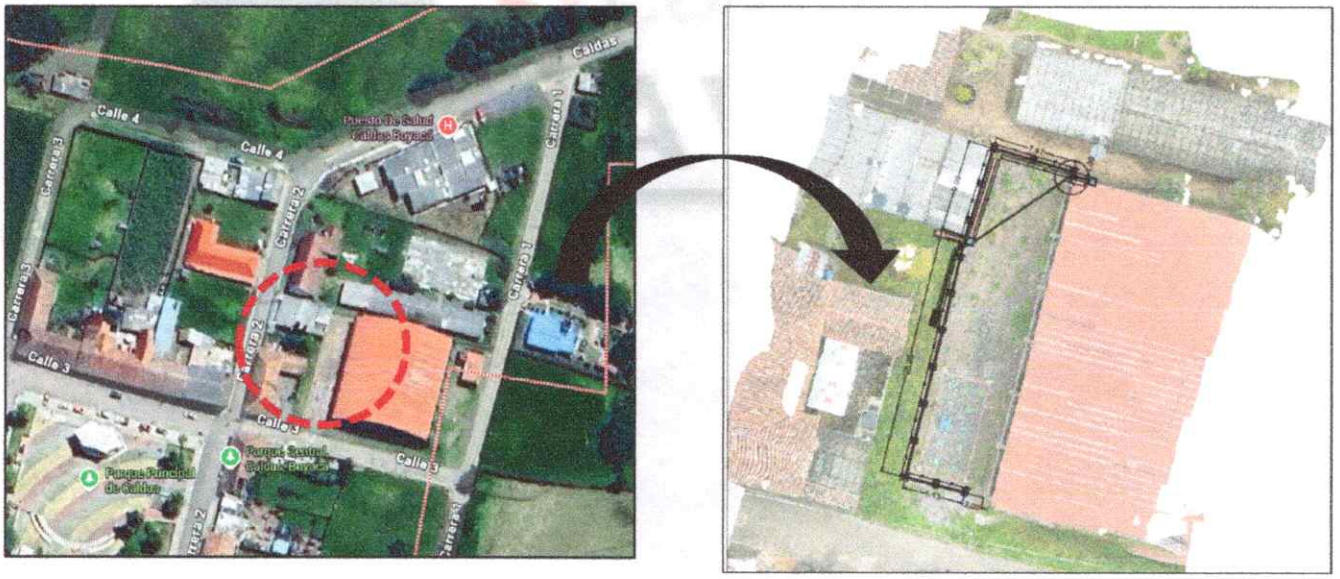

Fuente. Autor

Constructora AVICON Transformamos espacios	BITÁCORA	VERSIÓN - 01

FECHA: 06 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestros – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8.00 – 5.00 pm

ACTIVIDADES:

Se avanza con la limpieza de la zona de ejecución del proyecto, y el replanteo del cerramiento y cimentación del mismo.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 07 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestros – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8.00 – 5.00 pm

ACTIVIDADES:

Se avanza con la excavación manual para las cajas de inspección de 60 x 60 y tubería de 4”

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

Constructora AVICON Transformamos espacios	BITÁCORA	VERSIÓN - 01

FECHA: 08 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestros – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8.00 – 5.00 pm

ACTIVIDADES:

Se avanza con a la excavación manual para cimentación y viga de cerramiento

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 09 de octubre de 2025

CLIMA: Lluvioso

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

No se realiza ninguna actividad debido a fuertes lluvias en el municipio de caldas

OBSERVACIONES: las lluvias ocasionaron la suspensión periódica de los trabajos debido a que puede generar perdidas de material.

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 10 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8.00 – 5.00 pm

ACTIVIDADES:

Se realiza la construcción de las cajas de 60 x 60 para tubería de 4 pulgadas

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 11 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 12:00

ACTIVIDADES:

Se realiza la construcción de las cajas de 60 x 60 para tubería de 4 pulgadas

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 12 de octubre de 2025

CLIMA: N/A

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

Ninguna

OBSERVACIONES: No se trabaja este día por fin de semana

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 13 de octubre de 2025

CLIMA: N/A

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

Ninguna

OBSERVACIONES: No se realiza ningún trabajo dado que es día festivo no laborable

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 14 de octubre de 2025

CLIMA: Soleado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES:

Se Avanza con la instalación de tubería 4" y se conectan a las cajas de inspección

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 15 de octubre de 2025

CLIMA: Soleado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES:

Se realiza un mejoramiento con material granular para afirmado en los cimientos, además se procede a realizar la compactación del material granular con rana

OBSERVACIONES: Aproximadamente 7:00 am se recibe viaje de material granular el cual se recibe en completa normalidad.

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 16 de octubre de 2025

CLIMA: Soleado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES:

Se realiza un mejoramiento con material granular para afirmado en los cimientos, además se procede a realizar la compactación del material granular con rana

OBSERVACIONES: Aproximadamente 7:00 am se recibe viaje de material granular el cual se recibe en completa normalidad.

Constructora AVICON Transformamos espacios	BITÁCORA	VERSIÓN - 01

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 17 de octubre de 2025

CLIMA: Soleado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES:

Se avanza con la figurada y amarre de acero de 420 mpa, y la instalación de solado de 14 mpa con una altura de 0.05 metros.

OBSERVACIONES: Aproximadamente 7:00 am se recibe viaje de material cemento y varilla n°4 y n°3 el cual se recibe en completa normalidad.

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 18 de octubre de 2025

CLIMA: Soleado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 12:00 pm

ACTIVIDADES:

Se avanza con la figurada y amarre de acero de 420 mpa, y la instalación de solado de 14 mpa con una altura de 0.05 metros.

OBSERVACIONES: Aproximadamente 7:00 am se recibe viaje de material cemento y varilla n°4 y n°3 el cual se recibe en completa normalidad.

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 20 de octubre de 2025

CLIMA: Lluvioso

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

No se realiza ninguna actividad debido a fuertes lluvias en el municipio de caldas

OBSERVACIONES: las lluvias ocasionaron la suspensión periódica de los trabajos debido a que puede generar perdidas de material.

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 21 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 12:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la fundida de zapatas y columnas en concreto de 3000 psi.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 22 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 12:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la fundida de zapatas y columnas en concreto de 3000 psi.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 23 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 12:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la fundida de zapatas y columnas en concreto de 3000 psi.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 24 de octubre de 2025

CLIMA: Lluvioso

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

No se realiza ninguna actividad debido a fuertes lluvias en el municipio de caldas

OBSERVACIONES: las lluvias ocasionaron la suspensión periódica de los trabajos debido a que puede generar perdidas de material.

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 25 de octubre de 2025

CLIMA: Lluvioso

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

No se realiza ninguna actividad debido a fuertes lluvias en el municipio de caldas

OBSERVACIONES: las lluvias ocasionaron la suspensión periódica de los trabajos debido a que puede generar perdidas de material.

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 26 de octubre de 2025

CLIMA: N/A

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

No se ejecuta ninguna actividad

OBSERVACIONES: No se realiza ninguna actividad dado que es día de fin de semana, no laborable.

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 27 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con el figurado y amarre de acero de 60000 psi y concreto de solado de 14 Mpa para viga de amarre.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 28 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con el figurado y amarre de acero de 60000 psi y concreto de solado de 14 Mpa para viga de amarre, se avanza con la instalación de tubería estructural redonda.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

Construcora AVICON	BITÁCORA	VERSIÓN - 01

FECHA: 29 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la instalación de tubería estructural redonda de 2" para el cerramiento.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 30 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la instalación de tubería estructural redonda de 2" para el cerramiento.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 31 de octubre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la instalación de tubería estructural redonda de 2" para el cerramiento.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 1 de Noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la excavación y armado de acero de 60000 psi para sumidero.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 2 de Noviembre de 2025

CLIMA: N/A

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

Ninguna

OBSERVACIONES: No se realiza ningún trabajo dado que es día fin de semana no laborable

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 3 de Noviembre de 2025

CLIMA: N/A

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

Ninguna

OBSERVACIONES: No se realiza ningún trabajo dado que es día festivo de, no laborable

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 4 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la fundida de viga de amarre de 3000 psi, se avanza con la fundida de sumidero.

OBSERVACIONES: N/A

Constructora AVICON	BITÁCORA	VERSIÓN - 01

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 5 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la instalación de portón dos hojas en tubería estructural, se avanza con la pintura y alistado de cerramiento.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 6 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la instalación de portón dos hojas en tubería estructural, se avanza con la pintura y alistado de cerramiento.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

Constructora AVICON Transformamos espacios	BITÁCORA	VERSIÓN - 01

FECHA: 7 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la instalación de portón dos hojas en tubería estructural, se avanza con la pintura y alistado de cerramiento.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 8 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 12:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la instalación de portón dos hojas en tubería estructural, se avanza con la pintura y alistado de cerramiento.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 09 de Noviembre de 2025

CLIMA: N/A

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

Constructora AVICON Transformamos espacios	BITÁCORA	VERSIÓN - 01

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

Ninguna

OBSERVACIONES: No se realiza ningún trabajo dado que es día fin de semana no laborable

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 10 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la excavación para la instalación de filtro tubería para filtro y geotextil.

OBSERVACIONES: Se recibe viaje de material granular para filtro y tubería, geotextil para le mismo.

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 11 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la instalación se geotextil, tubería para filtro.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 12 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la instalación de material granular para filtro.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 13 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la instalación de material granular para filtro.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 14 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la instalación de material granular para filtro.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 15 de octubre de 2025

CLIMA: Lluvioso

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

No se realiza ninguna actividad debido a fuertes lluvias en el municipio de caldas

OBSERVACIONES: las lluvias ocasionaron la suspensión periódica de los trabajos debido a que puede generar perdidas de material.

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

Constructora AVICON Transformamos espacios	BITÁCORA	VERSIÓN - 01

FECHA: 16 de noviembre de 2025

CLIMA: N/A

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

Ninguna

OBSERVACIONES: No se realiza ningún trabajo dado que es día fin de semana no laborable

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 17 de noviembre de 2025

CLIMA: N/A

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: N/A

PERSONAL: N/A

HORARIO: N/A

ACTIVIDADES:

Ninguna

OBSERVACIONES: No se realiza ningún trabajo dado que es día festivo, no laborable

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 18 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la excavación para instalación de parque, se avanza con el suministro de concreto ciclópeo y se avanza con la instalación de parque infantil.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 19 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con la excavación para instalación de parque, se avanza con el suministro de concreto ciclópeo y se avanza con la instalación de parque infantil.

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 20 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes

HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con el mejoramiento y compactación de material de afirmado

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA

Constructora AVICON	BITÁCORA	VERSIÓN - 01

TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

FECHA: 21 de noviembre de 2025

CLIMA: Nublado

MAQUIRARIA Y EQUIPOS: Equipo y herramienta menor

PERSONAL: 1.00 maestro – 1.00 ayudantes


HORARIO: 8:00 – 5:00 pm

ACTIVIDADES: Se avanza con el mejoramiento y compactación de material de afirmado

OBSERVACIONES: N/A

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

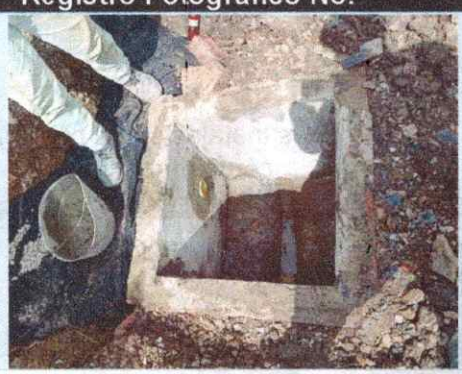Registro Fotográfico No.	1
	
Comentarios:	Actividades Cajas de inspección
Registro Fotográfico No.	**2**







Comentarios:	Actividades Instalación de cerramiento contra impacto
Registro Fotográfico No.	3







Comentarios:	Actividades Instalación de tubería de 4 “
Registro Fotográfico No.	4





Comentarios:	Actividades CIMENTACIÒN
Registro Fotográfico No.	5





Comentarios:	Actividades INTALACIÒN DE FILTRO
Registro Fotográfico No.	6

Constructora AVICON Transformamos espacios	BITÁCORA	VERSIÓN - 01





Comentarios:	Instalación de parques
Registro Fotográfico No.	7





Comentarios:	Construcción de sumidero

ING.DAVID HUMBERTO PINILLA
TP.68202-356778 STD
RESIDENTE

Concrelab MEDICIÓN CONFIABLE	DIVISIÓN DE ENSAYOS MECÁNICOS INFORME DE ENSAYO DE FLEXION EN ELEMENTOS PLASTICOS Y ESTRUCTURALES PROCEDIMIENTO SEGÚN NORMA ASTM B429 - E290	F - 333 ACTUALIZACIÓN 2015-11-23

CLIENTE	ECO MADERAS PLASTICAS	**FECHA RECEPCIÓN MUESTRA**	2016-04-26
OBRA	PLANTA	**FECHA EJECUCIÓN ENSAYO**	2016-04-27
CIUDAD	BOGOTA D.C.	**FECHA DE INFORME**	2016-04-27
ATENCIÓN	JAVIER ALEXANDER FORERO PINILLA	**REFERENCIA INFORME**	DEM 015-27892

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA


Producto	Poste	Referencia	Poste 14 x 14 cm	Lote	-
Material	Polímero Aglom. con refuerzo interno perfil 6x4cm	Id. Interna	Muestra N° 1	Colada	-
Fabricante	ECO MADERAS	Id. De Producto	-	N° Icontec	-

I. ENSAYO DE FLEXION

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR OBTENIDO
Longitud Muestra	mm	520,0
Carga Máxima	N	154,204,80
Carga Máxima	kgf	15,724,6
Carga Máxima	lbf	34,594,1





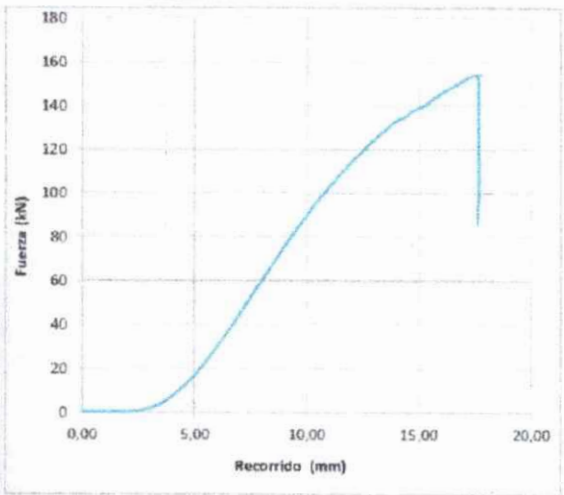

Copyright © 2013. Procuraduría General de la Nación / Todos los derechos reservados
Desarrollado por: CDK Software Colombia
V.1.0.1

Para ver este documento necesita Acrobat Reader. Si no lo tiene, haga clic aquí para descargarlo gratis.

El certificado de antecedentes especial, refleja todas las anotaciones que figuren en la base de datos, y se expide para acreditar requisitos de cuya elección, designación o nombramiento y posesión exige ausencia total o parcial de antecedentes.

El certificado de antecedentes ordinario, refleja las anotaciones de las sanciones impuestas en los últimos cinco (5) años, al cabo de los cuales, el sistema inactiva automáticamente el registro de sanción supere dicho término, caso en el cual el antecedente se reflejará hasta que dicho término expire.

OBSERVACIONES:

Señor(a) ciudadano(a): la expedición del certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación es gratuita en todo el país.
Fecha de consulta: miércoles, diciembre 17, 2025 - Hora de consulta: 10:03:49

La persona no presenta antecedentes

La Persona CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. Identificado(a) con NIT Número 9018521295.

Datos del ciudadano

Tipo de Identificación: NIT

Número Identificación: 9018521295

¿ Cual es la Capital de Colombia (sin tilde)? Barranquilla

Consultar

ING. DANIEL ALEJANDRO CELY V.
Jefe de División

Los resultados presentados corresponden exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.
El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de este documento sin la debida autorización escrita de la División de Ensayos Mecánicos.

Consulta de antecedentes

Permite consultar los antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura con solo digitar el número de identificación de la persona natural o jurídica.

CLIENTE	ECO MADERAS PLASTICAS	**FECHA RECEPCIÓN MUESTRA**	2016-04-26
OBRA	PLANTA	**FECHA EJECUCIÓN ENSAYO**	2016-04-27
CIUDAD	BOGOTA D.C.	**FECHA DE INFORME**	2016-04-27
ATENCIÓN	JAVIER ALEXANDER FORERO PINILLA	**REFERENCIA INFORME**	DEM 015-27892

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA


Producto	Poste	Referencia	Poste 6 x 19 cm	Lote	-
Material	Polímero Aglom. con refuerzo int. 4 tubos 1 1/4" y 1	Id. Interna	Muestra N° 2	Colada	-
Fabricante	ECO MADERAS	Id. De Producto	-	N° Icontec	-

I. ENSAYO DE FLEXION

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR OBTENIDO
Longitud Muestra	mm	520,0
Carga Máxima	N	65.745,67
Carga Máxima	Kgf	6.704,2
Carga Máxima	lbf	14.749,3





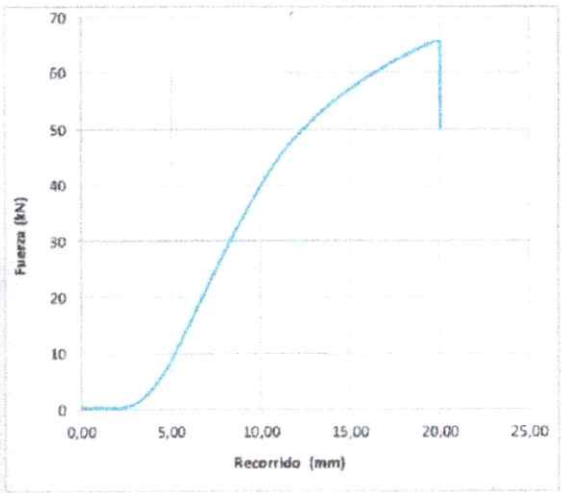

OBSERVACIONES:

ING. DANIEL ALEJANDRO CELY V.
Jefe de División

Los resultados presentados corresponden exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.
El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de este documento sin la debida autorización escrita de la División de Ensayos Mecánicos.

CLIENTE	ECO MADERAS PLASTICAS	**FECHA RECEPCIÓN MUESTRA**	2016-04-26
OBRA	PLANTA	**FECHA EJECUCIÓN ENSAYO**	2016-04-27
CIUDAD	BOGOTA D.C.	**FECHA DE INFORME**	2016-04-27
ATENCIÓN	JAVIER ALEXANDER FORERO PINILLA	**REFERENCIA INFORME**	DEM 015-27892


DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA


Producto	Poste	Referencia	Poste 14 x 14 cm	Lote	-
Material	Polimero Aglom. con refuerzo interno tubo de 2 1/4	Id. Interna	Muestra N° 1	Colada	-
Fabricante	ECO MADERAS	Id. De Producto	-	N° Icontec	-

I. ENSAYO DE COMPRESIÓN

PARÁMETRO	UNIDAD	VALOR OBTENIDO
Longitud Muestra	mm	400,0
Carga Máxima	N	356.843,60
Carga Máxima	kgf	36.388,1
Carga Máxima	lbf	80.053,7



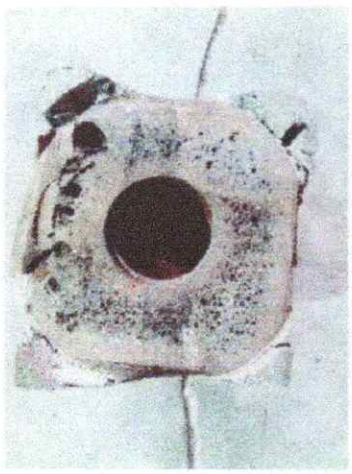

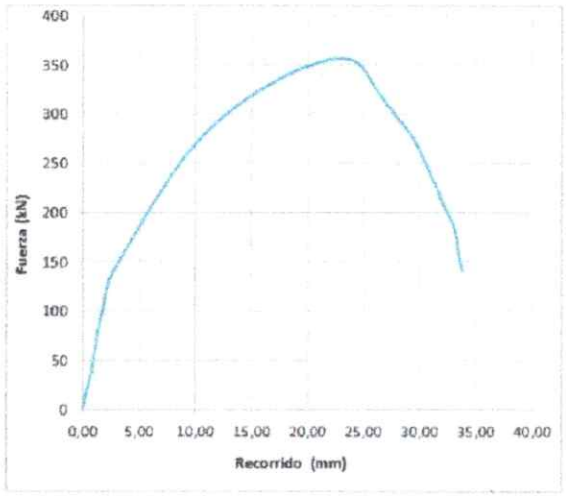

OBSERVACIONES:

ING. DANIEL ALEJANDRO CELY V.
Jefe de División

Los resultados presentados corresponden exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.
El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de éste documento sin la debida autorización escrita de la División de Ensayos Mecánicos.

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

DIVISIÓN DE ENSAYOS MECÁNICOS

INFORME DE ENSAYO

FECHA	: 14 de Agosto de 2015
REFERENCIA INFORME	: DEM 0400-25571-15
ORDEN DE TRABAJO	: OTE 0400-15
CLIENTE	: ECO MADERAS PLASTICAS
ATENCIÓN	: Javier Alexander Forero Pinilla
OBRA	: PLANTA
DIRECCIÓN	: Calle 63 F N° 72 – 55 In 2 Ap 302
TELÉFONO	: 6944108 – 3112322450
CIUDAD	: Bogotá D.C.

El presente informe consta de tres (3) páginas y contiene los resultados del ensayo de flexión y compresión en dos (2) muestras de poste plástico, las cuales fueron enviadas desde su planta. Los ensayos se realizaron el día 14 de Agosto de 2015.

Anexo a este informe se encuentran los resultados y las gráficas de Carga vs. Recorrido, obtenidas para los ensayos. Los ensayos se realizaron siguiendo el procedimiento descrito en la Norma Técnica Colombiana NTC 3353-97.

Los datos y resultados presentados corresponden exclusivamente a las muestras sometidas a ensayo. Con gusto atenderemos cualquier inquietud o duda relacionada con el contenido de este informe.

Nota: Sólo para los casos donde la cantidad de muestras enviadas permitan conservar testigos de ensayo o contra muestras, estas se almacenarán por un periodo máximo de 30 días luego de la emisión del informe. Lo anterior no dará lugar en ningún caso a reclamaciones adicionales por parte de nuestro cliente o contratante. Para situaciones especiales se nos deberá enviar de manera anticipada un escrito con instrucciones precisas de los ensayos adicionales que puedan requerirse.

Cordialmente,

Robinson Ortiz
Coordinador de Ensayos

Ing. Daniel Alejandro Cely V.
Jefe de División

Calle 63D No. 71A-70 PBX y Fax: 223 56 56 Ext. 124 Bogotá D.C. – Colombia
E-mail: emecanicos@concrelab.com www.concrelab.com

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

DIVISIÓN DE ENSAYOS MECÁNICOS
INFORME DE ENSAYO DE FLEXIÓN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

CLIENTE	ECO MADERAS PLASTICAS	**FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA**	2015-07-13
OBRA	PLANTA	**FECHA DE EJECUCIÓN ENSAYO**	2015-08-14
CIUDAD	BOGOTÁ D.C.	**FECHA DE ELABORACIÓN INFORME**	2015-08-14
ATENCION	JAVIER ALEXANDER FORERO PINILLA	**REFERENCIA INFORME DE ENSAYO**	DEM 0400-25571

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

Producto	Poste 14 x 14 cm	**Identificación Interna**	Muestra N° 1
Material	Polímero Aglomerado	**Identificación de producto**	N.A.
Fabricante	ECO MP	**N° Lote**	N.A.

ENSAYO DE FLEXIÓN

Muestra N° 1	Longitud (mm)	Carga Máxima (N)	Carga Máxima (kgf)	Carga Máxima (lbf)
Resultado obtenido	700,0	93.533,5	9.537,8	21.028,2

Observación Visual: La probeta ensayada presenta deformación cuando llega a 93,5 kN

GRÁFICA DE CARGA vs. RECORRIDO



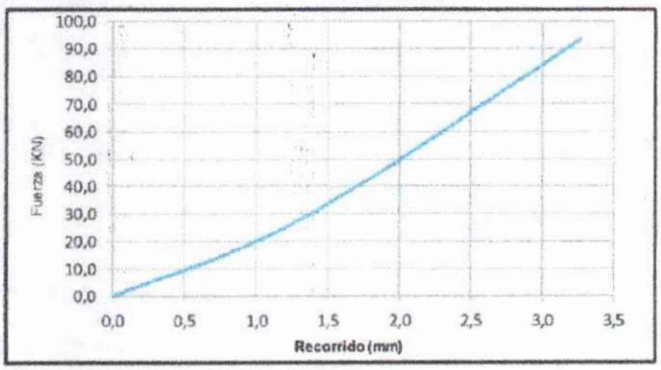





FOTO DE MONTAJE



ROBINSON ORTIZ
Coordinador de Ensayos

ING. DANIEL ALEJANDRO CELY
Jefe de División

Los resultados presentados corresponden exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.
El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de éste documento sin la debida autorización escrita de la División de Ensayos Mecánicos.

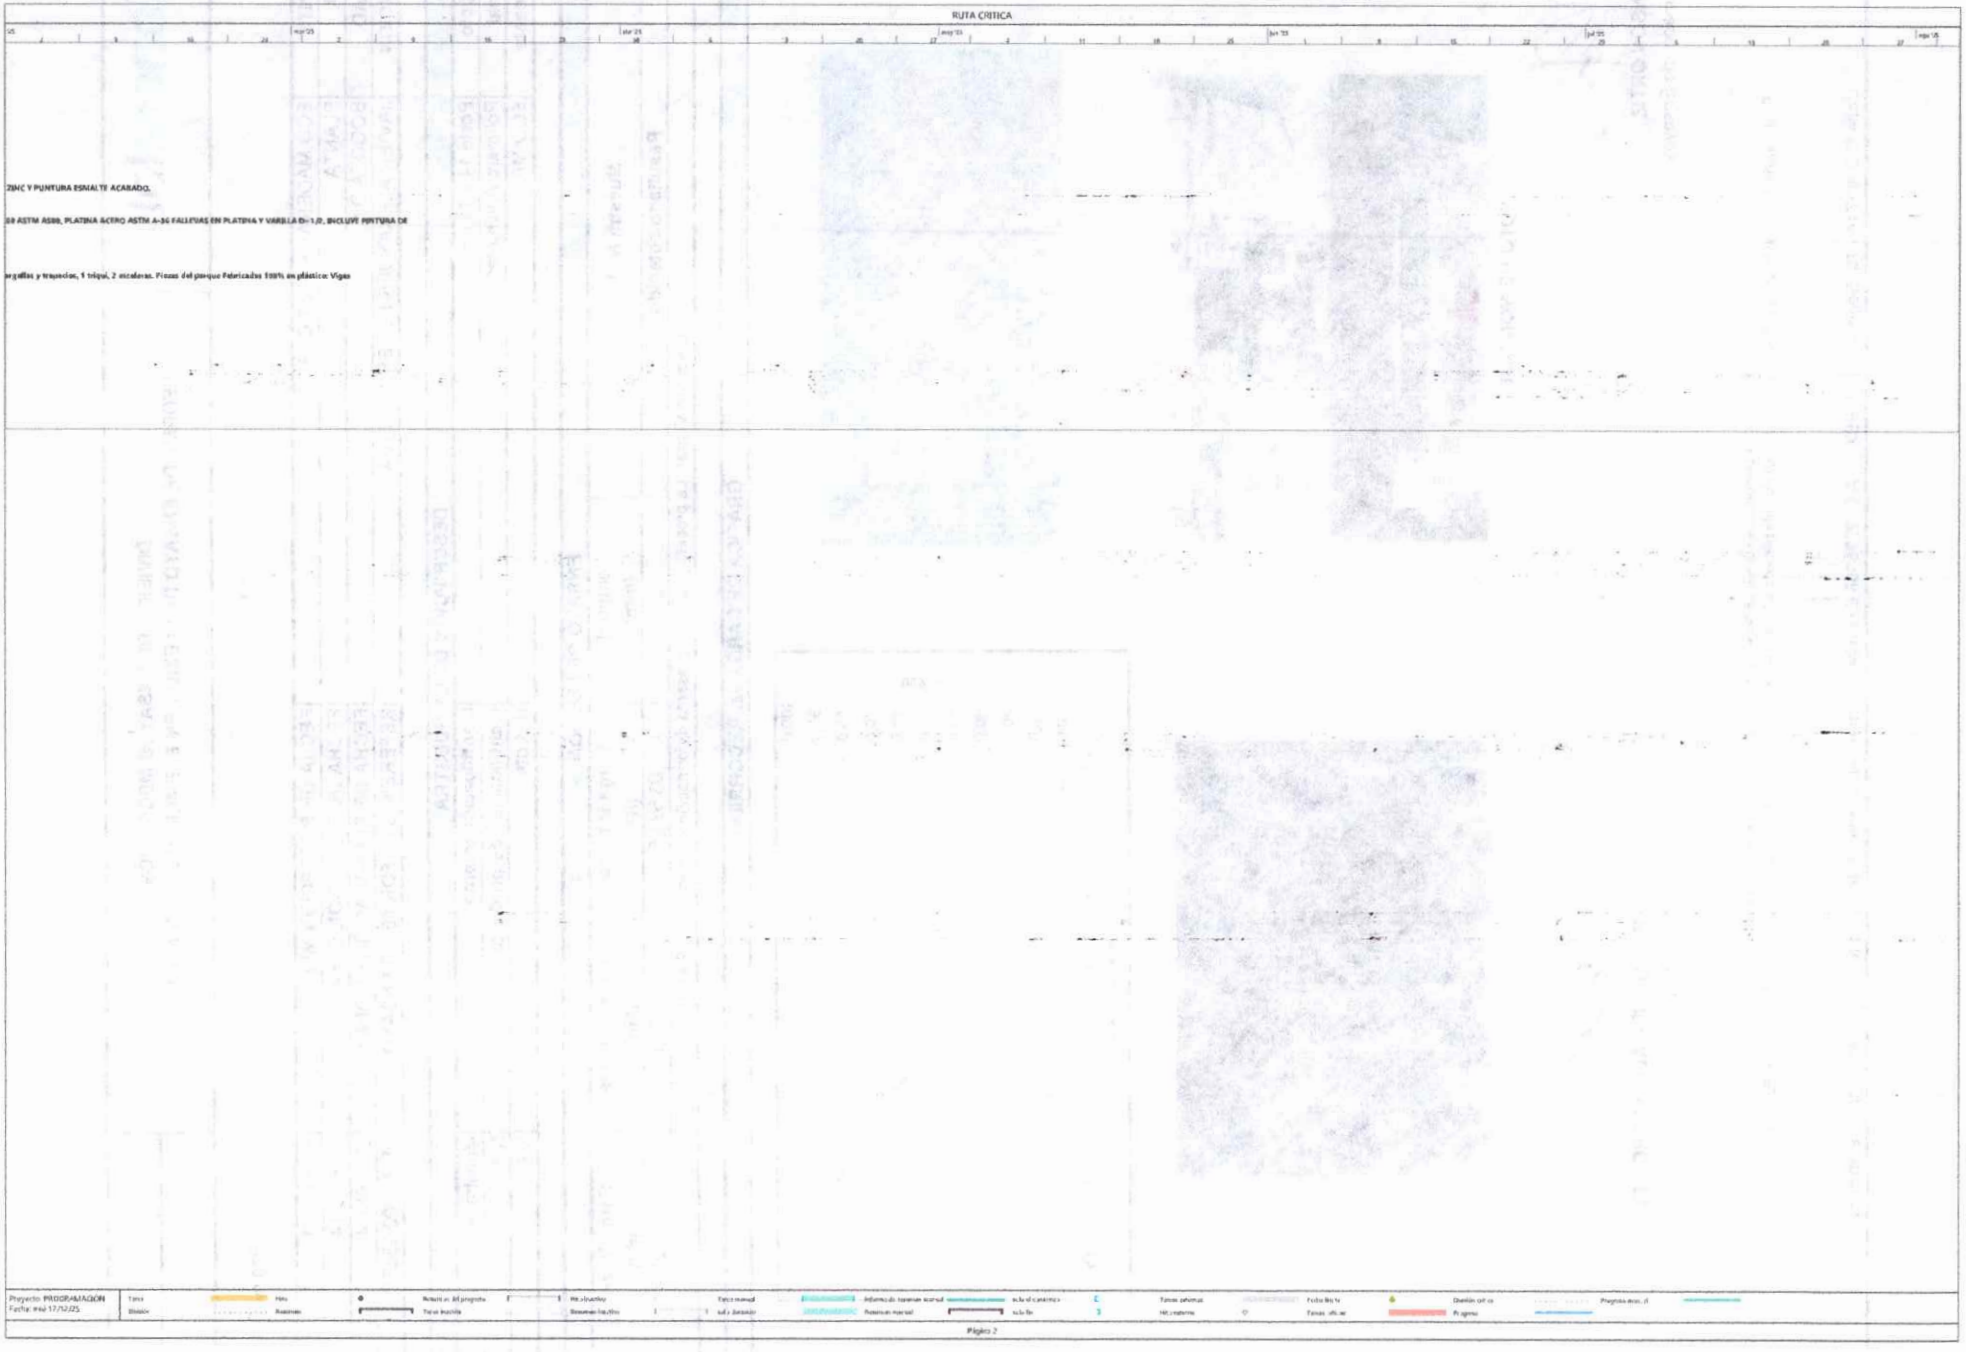
RUTA CRITICA
ZINC Y PUNTURA ESMALTE ACABADO.
39 ASTM A500, PLATINA ACERO ASTM A-36 FALLEVAS EN PLATINA Y VARILLA D=1/2. INCLUYE PINTURA DE
ergolitas y trapecios, 1 triqui, 2 escaleras. Piezas del parque Fabricadas 100% en plástico: Vigas
Proyecto: PROGRAMACION
Fecha: mié 17/12/25
Página 2

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

DIVISIÓN DE ENSAYOS MECÁNICOS
INFORME DE ENSAYO DE COMPRESIÓN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

CLIENTE	ECO MADERAS PLASTICAS	**FECHA DE RECEPCIÓN MUESTRA**	2015-07-13
OBRA	PLANTA	**FECHA DE EJECUCIÓN ENSAYO**	2015-08-14
CIUDAD	BOGOTÁ D.C	**FECHA DE ELABORACIÓN INFORME**	2015-08-14
ATENCION	JAVIER ALEXANDER FORERO PINILLA	**REFERENCIA INFORME DE ENSAYO**	DEM 0400-25571

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA


Producto	Poste 8 x 8 cm	**Identificación interna**	Muestra N° 2
Material	Polímero Aglomerado	**Identificación de producto**	N.A.
Fabricante	ECO MP	**N° Lote**	N.A.

ENSAYO DE COMPRESIÓN

Muestra N° 2	Longitud (mm)	Carga Máxima (N)	Carga Máxima (kgf)	Carga Máxima (lbf)
Resultado obtenido	120,0	116.461,8	11.875,8	26.183,0

Observación Visual: La probeta ensayada presenta deformación cuando llega a 116.4 kN

GRÁFICA DE CARGA vs. RECORRIDO

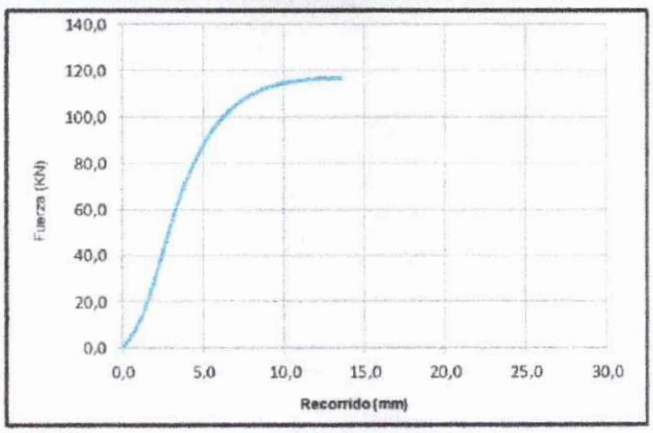



ROBINSON ORTIZ
Coordinador de Ensayos

ING. DANIEL ALEJANDRO CELY
Jefe de División

Los resultados presentados corresponden exclusivamente a la muestra sometida a ensayo.
El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de éste documento sin la debida autorización escrita de la División de Ensayos Mecánicos

Maderas Plásticas

FICHA TÉCNICA

PARQUE PLÁSTICO ECO 3

Características

Nuestros parques infantiles son elaborados en productos de madera plástica como postes redondos, postes cuadrados, tablas plásticas, entre otros. Los parques infantiles cuentan con diversas secciones de juegos que incluyen trapecio, argollas de gimnasio, rodaderos columpios, muros de escalar, pasamanos y telarañas. Estos fueron diseñados con el objetivo de contribuir al desarrollo y al crecimiento de los niños. Contamos con varios diseños de parques infantiles o se pueden armar de acuerdo con la necesidad de cada cliente.


Nuestro parque plástico infantil **ECO 3** consta de dos torres con techo, dos escaleras, un juego de pasamanos(incluye argollas y trapecios), un muro de escalar, un rodadero, un set de columpios (3columpios) , un ducto, un mata culin y un arenero.

Frontal



Dimensiones









Largo	Ancho	Alto	Area
7.30 m	4.0 m	2.70 mts	50m2

NOTA: Las medidas varían según la distribución que se le asigne a cada parque


Ventajas

- Inmunes a hongos bacterias, insectos y roedores.
- Fácil instalación
- No se astillan, no corroen, no se pudren, no oxidan.
- No poseen ningún aditivo tóxico en su producción.
- Buena resistencia mecánica.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Recibe pintura en aceite, tintilla, anticorrosivo.
- Resistente a cambios climáticos.
- Eco amigables

CERTIFIED RECYCLED CONTENT

Colores: varios (según necesidad del cliente)
Garantía: 3 Años en condiciones normales de uso, sujeto a políticas de Garantía.
Material: Polietileno, polipropileno de alta densidad post industrial (material recuperado)



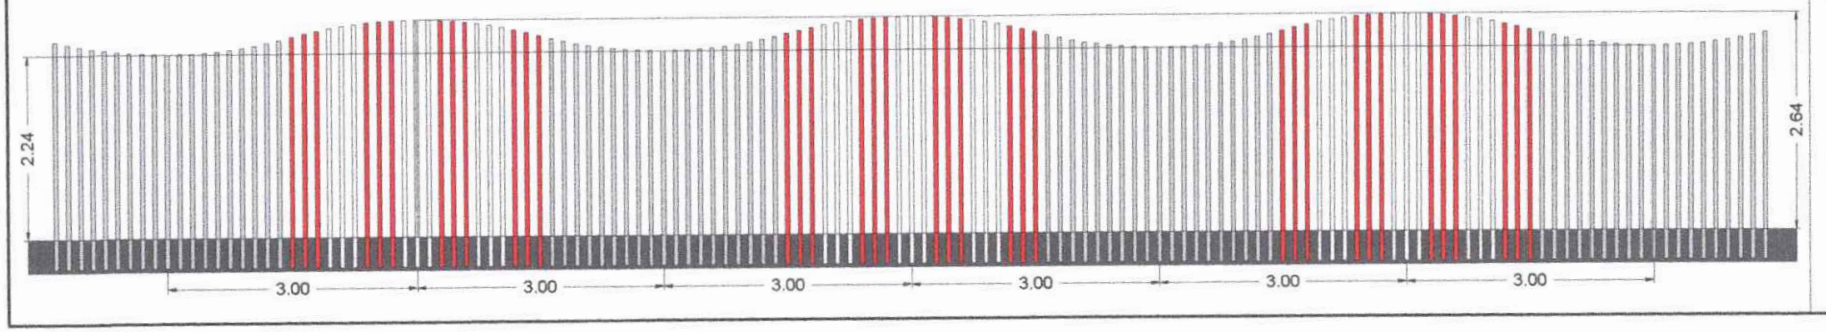

Constructora AVICON

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

MUNICIPIO DE CALDAS

PROYECTO:

CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:



PARAMETROS GEODESICOS

Datum:	MAGNA
Latitud:	4° 35' 46.3125" N
Longitud:	74° 04' 39.0285" W
Falso Este:	1000000
Falso Norte:	1000000
Factor de escala:	1.00000
Elipsoide:	WGS84 = GRS80
Proyección:	TM LOCAL
Zona:	Bogotá - Magna
Datum Vertical:	m.s.n.m.m
Modelo Geoidal:	EGM 96

DATOS DEL PREDIO

DISEÑO:

DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
INGENIERO CIVIL

REVISÓ:

Jorge Ivan Ortiz Castillo
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

PROPIETARIO:

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALDAS

CONTIENE:

Planta y detalle de cerramiento

OBSERVACIONES:

ARCHIVO:

FECHA	PLANO:
12/2025	01/01
ESCALA:	

Constructora
AVICON
Transformamos espacios

PÓLIZAS DEL CONTRATO

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.15 12:02:40 -05:00

Código de Seguridad: ziafdTgzywaj9bb2LMDEbw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100056630	**No. ANEXO**	4	**No. CERTIFICADO**	36213701	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	13/12/2025	**SUC. EXPEDIDORA**	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/10/2025	24:00 Horas Del	19/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S.	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.852.129-5
DIRECCIÓN	CALLE 16 NO 13 157	**TELÉFONO**	3227732504
ASEGURADO	MUNICIPIO DE CALDAS - BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.801.796-4
DIRECCIÓN	CRA 3 2-09	**TELÉFONO**	7265831
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE CALDAS - BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891.801.796-4
DIRECCIÓN	CRA 3 2-09	**TELÉFONO**	7265831

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA POLIZA DE ACUERDO CON ACTA DE TERMINACIÓN DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SAMC-013 DE 2025 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , CUYO OBJETO ES

CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 06/10/2025	24:00 Horas Del 23/03/2026	23.651.793,20	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 06/10/2025	24:00 Horas Del 20/11/2028	5.912.948,30	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 19/11/2025	24:00 Horas Del 19/11/2030	23.651.793,20	0,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas Del 06/10/2025	24:00 Horas Del 20/11/2026	23.651.793,20	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 76.868.327,90	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
ASESORIAS MILER COMPAÑIA LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 13/12/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADO A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PILA - APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100056630	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	36213701	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	13/12/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	06/10/2025	24:00 Horas Del	19/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.

seguros mundial®

Aliados

CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA

PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100056630** y endoso, **4** cuyo afianzado es: **CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S.** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE CALDAS - BOYACA / MUNICIPIO DE CALDAS - BOYACA** , expedida por la Compañía en **13/12/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **15** días del mes **DICIEMBRE** del año **2025**.

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PÓLIZAS QUE AMPARA TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SAMC 013 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE CALDAS Y CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. NIT. 901.852.129-5

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DE CALDAS - BOYACÁ.

HACE CONSTAR

En virtud del artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios, se procedió a la revisión de la póliza del contrato que continuación se describe:

GARANTÍA ÚNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

CONTRATO	SAMC-013-2025		
OBJETO:	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA		
Contratista / Tomador:	CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. NIT. 901.852.129-5		
Compañía aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA NIT. N°860.037.013-6		
Fecha De Expedición de la Póliza	13/12/2025		
Póliza Número	BY-100056630 ANEXO 4		
Tipo de aprobación	POLIZA DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL		
Amparo	**Vigencia Desde**	**Vigencia Hasta**	**Valor asegurado**
Cumplimiento	06/10/2025	23/03/2026	$ 23.651.793,20
Pago de Salario Prestaciones Sociales	06/10/2025	20/11/2028	$ 5.912.948,30
Estabilidad de la obra	19/11/2025	19/11/2030	$ 23.651.793,20
Calidad de los Bienes	06/10/2025	20/11/2026	$ 23.651.793,20

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

De conformidad con lo dispuesto en el Libro II, Parte II, Título I, Capitulo II Sección III, Subsección I del Decreto 1082 de 2015, se verificó que la citada póliza cumple con las condiciones generales previstas, según el objeto del contrato.

Por lo anterior se imparte la aprobación de las pólizas, en Caldas – Boyacá, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2025

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
Secretario de Planeación y Obras Pública
Caldas - Boyacá

CUMPLIMIENTO

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	ziafdTgzywaJ9bb2LMDEbw==		
Número de póliza	100056630	Número de anexo	4
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	13/12/2025
Inicio de vigencia Global	06/10/2025	Fin de vigencia Global	19/11/2030
Tomador	CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S.		
Asegurado	MUNICIPIO DE CALDAS - BOYACA	Valor asegurado	76.868.327,90
		Movimiento	PRORROGA
Objeto de póliza	GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SAMC-013 DE 2025 DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 , CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA POLIZA DE ACUERDO CON ACTA DE TERMINACIÓN DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 06/10/2025	24:00 Horas del 23/03/2026	$ 23.651.793,20	$ 0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 06/10/2025	24:00 Horas del 20/11/2028	$ 3.912.948,30	$ 0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas del 19/11/2025	24:00 Horas del 19/11/2030	$ 23.651.793,20	$ 0,00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	00:00 Horas del 06/10/2025	24:00 Horas del 20/11/2026	$ 23.651.793,20	$ 0,00

Imprimir

CONTRATO DE OBRA No. SAMC -0.13 – 2025

"CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"

INFORME IMPREVISTOS, CONTROL DEL CONTRATO DE OBRA No. SAMC -0.13 – 2025

No. INFORME FINAL DE IMPREVISTOS

PERIODO: 06 DE OCTUBRE AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FIRMA CONTRATISTA:

ING. DAVID HUMBERTO PNILLA

NOVIEMBRE DE 2025

1 INTRODUCCION

El presente informe relaciona las actividades realizadas por parte del contratista en el periodo de tiempo relacionado, desglosando los imprevistos que presento la obra en su ejecución con el fin de cumplir el objeto contractual previsto en el alcance para las áreas de referencia (Técnica, Administrativa y Financiera).

Dentro de las actividades desarrolladas para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe velar por el correcto desarrollo y calidad del contrato, elaboración y presentación de informes mensuales, control y reajuste de programación de obra, control de cantidades de obra, revisión y control de ajustes de diseños y aspectos técnicos, supervisión y control de compromisos contractuales del contratista.


Todas las actividades desarrolladas por el contratista están enfocadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la calidad de las obras relacionadas, razón por la cual se implementó un programa de seguimiento y control de calidad de las obras ejecutadas a través de muestreo de campo, el cual será realizado directamente por la interventoría por medio de un laboratorio certificado que será el encargado de realizar los ensayos necesarios para garantizar el cumplimiento de especificaciones general y particulares de las obras ejecutadas.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Dicho proyecto está localizado en la carrera 2 del municipio de Caldas -Boyacà a una altura de 2557 metros sobre el nivel del mar, A continuación, se muestran las coordenadas correspondientes al perímetro del predio objeto del levantamiento topográfico y las coordenadas de la localización exacta de la obra corresponden a Latitud 5.555366° y Longitud -73.864671.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO
BOYACÁ	CALDAS	**"CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"**

Ilustración. Localización Específica del Proyecto

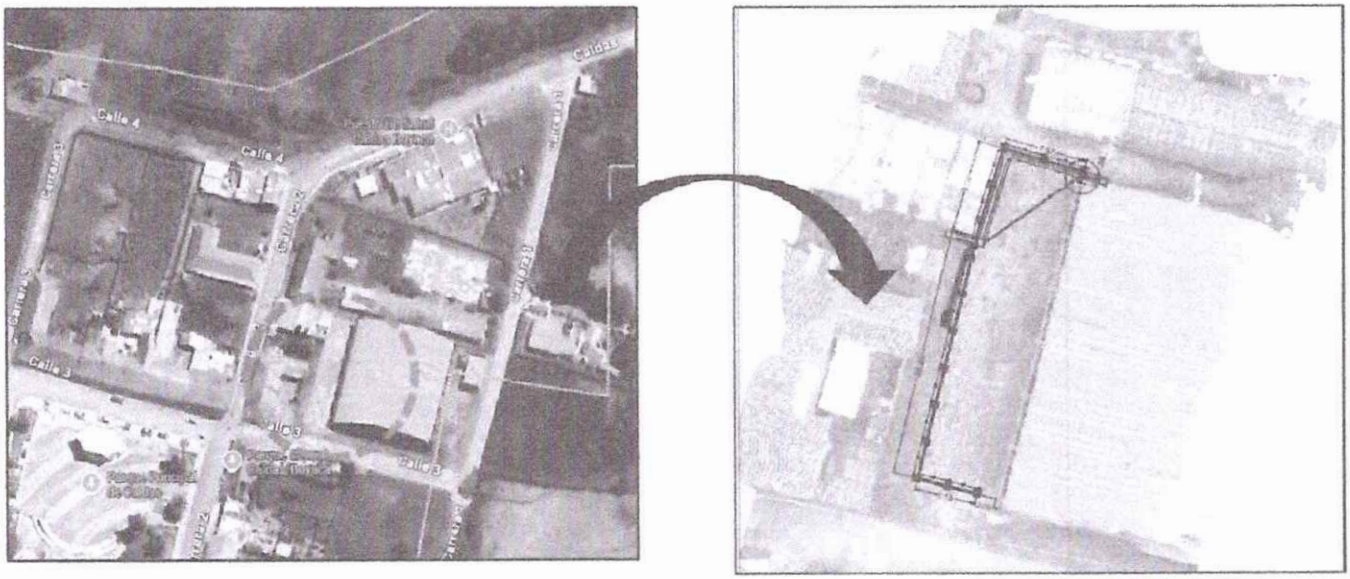

3. ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

El objeto del contrato de obra es **"CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"**

El proyecto busca beneficiar a la población del municipio de Caldas, Boyacá. Con base en los informes recibidos por parte de la alcaldía se evaluaron aspectos técnicos generales,

que permitan el beneficio de la población en el desarrollo de las actividades deportivas, recreativas, sociales y culturales.

4. INFORMACIÓN BÁSICA DE LOS CONTRATOS

4.1. CONTRATO DE OBRA

A continuación, se muestra la información general del contrato de obra SAMC -0.13 –2025 suscrito entre la Alcaldía del Municipio de Caldas y la Constructora Davicon S.A.S

CONTRATO DE OBRA	
Número del contrato:	CONTRATO DE OBRA No. SAMC – 013 de 2025
Objeto:	**"CONSTRUCCIÒN DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACÀ"**
Fecha de suscripción del contrato:	15 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Contratante:	MUNICIPIO DE CALDAS (BOYACÁ)
Nombre Contratista:	CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S NIT: 901.852.129-5 R/L: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
Supervisor:	ING. JORGE IVAN OVALLE CASTILLO SECRETARIO DE PLANEACIÒN Y OBRAS PUBLICAS
Valor Fiscal Inicial:	CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUADRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS **($103.274.795.82.00)** MONEDA CORRIENTE
Valor Adicional Nº1:	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS **(14.984.170.20)** MONEDA CORRIENTE
Anticipo:	No tiene
Plazo Inicial:	30 DIAS
Fecha de Inicio:	06 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha Prevista de Terminación Inicial:	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo Prorroga Nº1	15 (DIAS)
Fecha Prevista de Terminación prorroga Nº1	19 DE NOVIEMBRE DE 2025
Avance Físico Mensual:	100 %
Avance Físico Acumulado:	100 %
Avance Financiero Mensual final:	$ 116.439.597.31
ESTADO ACTUAL	
Valor de imprevistos	$ 1.819.368.71
Ejecutado Periodo Actual	$ 118.258.966.02
Reajustes (Según Actas)	
Imprevistos	
Total	$ 118.258.966.02

5. IMPREVISTOS

5. IMPREVISTOS

Los imprevistos en una obra son situaciones no contempladas en la etapa de planeación y diseño que pueden afectar el desarrollo normal del proyecto. Estos pueden estar relacionados con condiciones del terreno, cambios climáticos, interferencias con redes existentes, errores u omisiones en los planos, disponibilidad de materiales, o modificaciones solicitadas durante la ejecución.

La adecuada identificación y gestión de los imprevistos es fundamental, ya que permiten garantizar la continuidad de la obra, evitando paralizaciones, sobrecostos excesivos y retrasos significativos en el cronograma. Contar con un rubro de imprevistos en el presupuesto brinda flexibilidad financiera para atender estas situaciones sin comprometer la viabilidad económica del proyecto.

A continuación, se desglosan los imprevistos que se presentaron a lo largo de la ejecución del proyecto.

Descripción	Fuente	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Total
Cuadrilla de albañilería (AA1)	Gob. 1.01.02	Hc	17.50	40,914.57	716,004.98
Pintura sobre viga	Gob. 2.07.10	Glb	0.93	75,565.33	70,760.735
Alquiler de planta eléctrica (soldadura)	Gob 3.13.12	Hora	83.00	12,441.0	1.032.603
TOTAL		**1.819.368.71**			

DAVID HUMBERTO PINILLA
ING.CIVIL
C.C. 1.054.682.069

Gobernación de Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
1	CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES (BÁSICOS)	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
1.01	CONCRETOS	
REF. PRECIOS GOBERNACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
1.01.02		
'No. ÍTEM PRESUPUESTO	CONCRETO SIMPLE DE 14 Mpa. (2000 PSI)	M3
1.01.02		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
ARENA LAVADA Y/O TRITURADA	M3	$ 101,150.00	0.57	$ 57,655.50
CEMENTO GRIS	KG	$ 670.00	229.50	$ 153,765.00
GRAVILLA ¾, ½	M3	$ 103,133.33	0.94	$ 96,945.33
AGUA	L	$ 3.65	176.87	$ 645.58
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 309,011.41

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MEZCLADORA (INCLUYE COMBUSTIBLE)	DIA	$137,211	0.31	$ 42,535.41
			SUBTOTAL EQUIPO	$ 42,535.41

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)	HC	$ 40,914.57	2.50	$ 102,286.42
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 102,286.42

COSTO DIRECTO		$ 453,833.24
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	0%	$ 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA		$ 453,833.24
ADMINISTRACIÓN	0%	$ 0.00
IMPREVISTOS	0%	$ 0.00
UTILIDAD	0%	$ 0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		$ 0.00
TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)		$ 453,833.24

OBSERVACIONES:

Realizó

Aprobó

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Calle 20 N° 9-90 Casa de la Torre. Tunja - Boyacá
PBX: (57 608) 7420150 - (57 608) 7420222
contactenos@boyaca.gov.co www.boyaca.gov.co

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Calle 20 N° 9- 90. Tunja – Boyacá
PBX: (57 608) 7420150 Ext. 2254

mipg Modelo Integrado de planeación y gestión

Gobernación de Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2.07	PINTURAS Y ESMALTES	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.07.10		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2
2.07.10		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
YESO CORRIENTE	KG	$ 1,550.00	0.01	$ 15.50
ESTUCO GRIS EN POLVO X 25 KG	KG	$ 1,168.00	2.00	$ 2,336.00
CEMENTO GRIS	KG	$ 670.00	0.26	$ 174.20
LIJA DE AGUA No. 120	UND	$ 1,845.00	0.08	$ 147.60
PINTURA VINILO TIPO I	GL	$ 75,565.33	0.06	$ 4,533.92
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 7,207.22

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$13,747.29	5.0%	$ 687.36
			SUBTOTAL EQUIPO	$ 687.36

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)	HC	$ 49,097.48	0.28	$ 13,747.29
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 13,747.29
			COSTO DIRECTO	$ 21,641.87
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			*0%*	*$ 0.00*
			TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA	$ 21,641.87
ADMINISTRACIÓN			*0%*	*$ 0.00*
IMPREVISTOS			*0%*	*$ 0.00*
UTILIDAD			*0%*	*$ 0.00*
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 0.00
			TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	$ 21,641.87

OBSERVACIONES:

Realizó

Aprobó

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Calle 20 N° 9-90 Casa de la Torre, Tunja - Boyacá
PBX: (57 608) 7420150 - (57 608) 7420222
contactenos@boyaca.gov.co www.boyaca.gov.co

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Calle 20 N° 9- 90 Tunja – Boyacá
PBX: (57 608) 7420150 Ext. 2254

mipg Modelo Integrado de planeación y gestión

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
3	INFRAESTRUCTURA VIAL	
No. SUB-CAPÍTULO	**SUB-CAPÍTULO**	
3.13	VARIOS (VÍAS).	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**	**Unidad**
3.13.12		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	CONSTRUCCION JUNTAS ELASTOMERICAS DE 30 CMS DE ANCHO SEGUN INVIAS PRUEBA NORMA ASTM D-4014	ML
3.13.12		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
JUNTA ELASTOMÉRICA DE 30 CM DE ANCHO. (NORMA INVIAS).	KG	$ 6,244.77	40.00	$ 249,790.80
GRAVILLA ¾, ½	M3	$ 103,133.33	0.15	$ 15,470.00
JUNTA SELLANTE GOMAESPUMA	ML	$ 43,313.50	1.00	$ 43,313.50
PLACA DE ACERO	KG	$ 4,914.50	0.09	$ 442.31
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 309,016.61**

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$327,316.55	5.0%	$ 16,365.83
FUNDIDORA	HORA	$283,759	0.50	$ 141,879.50
PLANTA ELECTRICA	HORA	$12,441	2.80	$ 34,834.80
PLAQUETA VIBRATORIA	HORA	$76,266	0.50	$ 38,133.00
VIBROCOMPACTADOR RANA (HR)	HORA	$12,500	0.50	$ 6,250.00
PLANTA DE MEZCLA Y SECADO	HORA	$298,137	0.50	$ 149,068.50
			SUBTOTAL EQUIPO	**$ 386,531.63**

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA1)	HC	$ 40,914.57	8.00	$ 327,316.55
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 327,316.55**

	COSTO DIRECTO	**$ 1,022,864.79**
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)	*0%*	*$ 0.00*
	TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA	**$ 1,022,864.79**
ADMINISTRACIÓN	*0%*	*$ 0.00*
IMPREVISTOS	*0%*	*$ 0.00*
UTILIDAD	*0%*	*$ 0.00*
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 0.00**
	TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	**$ 1,022,864.79**

OBSERVACIONES:

Realizó

ACTA DE JUSTIFICACION IMPREVISTOS
CONTRATO DE OBRA N° SAMC-013-2025

FECHA PRESENTE ACTA	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO NUMERO	SAMC-013-2025
OBJETO	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PAQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNCIPIO DE CALDAS, BOYACA"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CALDAS NIT: 891.801796-4
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ALEJANDRO LANCHEROS RUIZ C.C. 80.219.855
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DAVCON SAS NIT 901.852.129-5 Representante Legal DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON CC 1.054.682.069 DE MONIQUIRA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PEOS CON OCHENT Y DOS CENTAVOS ($103.274.795.82) M/CTE
VALOR ADICION No 1	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($14.984.170,20) M/CTE
VALOR TOTAL	CIENTO DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECINTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DOS CENTAVOS ($118.258.966.02) M/CTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA (30) DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO PRORROGA No 1	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025

En Caldas, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la oficina de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS el ingeniero **JORGE IVAN OVALLE CASTILLO** en calidad de supervisor, y el señor DAVID HMBERTO PINLLA CAÑON identificado con cedula de ciudadanía No. 1.054.682.069 de Moniquira representante legal de CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. Hemos convenido dejar en constancia las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que, teniendo en cuenta la especial naturaleza de los contratos de obra pública, en los que generalmente se presentan riesgos, se incluyó en el contrato de obra un porcentaje de imprevistos (I) como

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

componente del AIU.

SEGUNDO: Que, durante el desarrollo de la obra se presentaron algunos imprevistos, los cuales no estaban contemplados en el contrato, y los cuales son expuestos a continuación:

Descripción	Unidad	Cantidad	V. Unitario	V. Total
Corte de Teja	Glb	1.00	$ 300.000	$ 300.000
Jornal adicional de maestro ayudante	Dia	4.00	$ 160.000	$ 640.000
Pintura sobre viga	M2	14.8	$ 10.000	$ 148.000
Limpieza de Obra	Glb	1.00	$ 200.000	$ 200.000
Alquiler de planta eléctrica (Soldadura)	Dia	2.00	$ 265.684,36	$ 531.368,71
TOTAL	$ 1.819.368,71			

Por lo tanto, el supervisor aprueba la afectación de la partida de Imprevistos (I) por el valor de, UN MILLON OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($1.819.368,71) M/CTE

Se firma por las partes, en caldas, Boyacá a los DIECIOCHO (18) dias del mes de diciembre de 2025

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
Supervisor

CONSTRUCTORA DAVICON SAS
NIT No. 901.852.129-5
DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
CC 1.054.682.069 de Moniquirá
Contratista

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
Jorge Iván Ovalle Castillo Secretario de planeación y obras publicas		Jorge Iván Ovalle Castillo Secretario de planeación y obras publicas		Diego Alejandro Lancheros Ruiz Alcalde municipal	
Nombre del documento	Acta de Modificación de cantidades			**Versión**	

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

Constructora
AVICON
Transformamos espacios

FACTURA ELECTRONICA

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S.
NIT 901852129-5
CL 16 13 157, Chiquinquirá, Boyacá,
Tel: +573132273014
daviconsas@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FE3
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE CALDAS		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	carrera 3 N° 2-09, Colombia, Caldas, Boyacá		10/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3219488825	**NIT** 891801796-4	10/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ACTA DE LIQUIDACION CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA	Servicio	$90.968.435,40	1		$90.968.435,40
2	Administracion	Servicio	$20.013.055,79	1		$20.013.055,79
3	Imprevistos	Servicio	$1.819.368,71	1		$1.819.368,71
4	Utilidad	Servicio	$5.458.106,12	1		$5.458.106,12

Moneda: COP
Generado: 2025-12-10 16:18:20-05:00
Validación DIAN: 2025-12-10 16:19:21-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito interbancario

CUFE: e10a992b0c9742f8f04be3a2c9bf4cf71278599c833399d25ce0c4e4093ec4c8b20c1479a42ac1dcbf3d7d029aee024f

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$118.258.966,02
Total	$118.258.966,02

Total de lineas: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764086294968 de 2024-12-28 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE1 hasta FE50 con vigencia hasta 2026-12-28

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO N° SAMC-013-2025

En Caldas, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en la oficina de la SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS el señor **DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.054.682.069 de Moniquirá, representante legal de CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. NIT. 901.852.129-5 en calidad de contratista, y el ingeniero **JORGE IVAN OVALLE CASTILLO** quien se desempeña como SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS en su calidad de Supervisor del contrato, quienes suscriben la presente acta de terminación por mutuo acuerdo, en los siguientes términos.

OBJETO	"CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA"
FECHA DE INICIO:	*SEIS (06) DE OCTUBRE DE 2025*
FECHA DE MODIFICATORIO ADICION Y PRORROGA No.1:	*CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2025*
VALOR DE ADICION No.1:	*CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($14.984.170,20) M/CTE*
PLAZO DE PRORROGA No.1:	*QUINCE (15) DIAS CALENDARIO*
FECHA DE TERMINACIÓN:	*DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025*

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$103.274.795,82	
VALOR ADICIÓN 1	$14.984.170,20	
VALOR PAGO ACTAS PARCIALES		$0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA		$118.258.966,02
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE **(MENOR OBRA EJECUTADA)**		$0
SUMAS IGUALES	$118.258.966,02	$118.258.966,02

El supervisor verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscal según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
Supervisor

DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
R/L CONSTRUCTORA DAVICON SAS
NIT 901.852.129-5
Contratista

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
Jorge Iván Ovalle Secretario de planeación		Jorge Iván Ovalle Secretario de planeación		Jorge Ovalle Secretario de planeación			
Nombre del documento	Acta de Terminación					Versión	
Dependencia		TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN

CONTRATO N. SAMC-013-2025 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

En Caldas, a los diecinueve (19) días del mes NOVIEMBRE del año DOSMIL VEINTICINCO (2025), entre los suscritos a saber JORGE IVAN OVALLE CASTILLO, secretario de Planeación y Obras públicas, en su calidad de Supervisor y DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON, identificado (a) con C.C. N.1.054.682.069 de MONIQUIRA, representante legal de CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. Nit 901.582.129-5, en su condición de contratista con el fin de suscribir la presente acta recibo final a satisfacción, en los siguientes términos.

I. DESCRIPCION GENERAL

OBJETO: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 103.274.795,82
VALOR ADICIONAL	$ 14.984.170,20
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 118.258.966,02
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$ 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 118.258.699,02
PLAZO INICIAL	TREINTA (30) DIAS
PLAZO PRORROGA	QUINCE (15) DIAS
PLAZO TOTAL	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE INICIO	SEIS (06) DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSION	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA REAL DE TERMINACION	DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2025
CAUSAL DE TERMINACIÓN	TERMINACION BILATERAL

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

II. BALANCE DEL CONTRATO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato o convenio	$ 103.274.795,82	
Valor del Adicional	$ 14.984.170,20	
Valor a pagar de la presente acta		$ 118.258.966,02
Valor total actas pagadas		$ 0
Saldo sin ejecutar a favor del Municipio		$ 0
Sumas iguales	$ 118.258.966,02	$ 118.258.966,02

OBSERVACIONES

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos del recibo final a satisfacción, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Nombre: JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACION

Nombre: DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
R/L. CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S.

Retención documental							
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:			
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma		
JORGE IVAN OVALLE		JORGE IVAN OVALLE		JORGE IVAN OVALLE			
Nombre del documento						Versión	
Dependencia		TRD			Consecutivo		
Proceso:			Procedimiento:				
Dimensión:			Política:				

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATO N°	**SAMC-013-2025**
FECHA PRESENTE ACTA	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CALDAS, BOYACA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CALDAS NIT: 891.801796-4
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ALEJANDRO LANCHEROS RUIZ C.C. 80.219.855
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. NIT. 901.852.129-5 R/L. DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON CC 1.054.682.069 DE MONIQUIRA

En Caldas, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron el Doctor **DIEGO ALEJANDRO LANCHEROS RUIZ** Alcalde Municipal en calidad de contratante, **JORGE IVAN OVALLE CASTILLO**, SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS y en calidad de contratista **DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON** identificado con C.C 1.054.682.069 expedida en moniquira, representante legal de **CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S.**, a fin de realizar de común acuerdo, la liquidación del **CONTRATO N° SAMC-013-2025**, con previa presentación de la factura y soportes correspondientes a los servicios de conforme a las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 60, prevé la liquidación de los contratos en relación con las circunstancias similares a la del objeto contractual pactado.

SEGUNDA: Que el contrato objeto de la liquidación tuvo el siguiente balance económico y financiero:

BALANCE DEL CONTRATO

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$103.274.795,82	
VALOR ADICIÓN 1	$14.984.170,20	
VALOR PAGO ACTAS PARCIALES		$0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA		$118.258.966,02
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE		$0
SUMAS IGUALES	$118.258.966,02	$118.258.966,02

TERCERA: Que las partes manifiestan que el balance económico y financiero se encuentran acorde con el contenido y cumplimiento de las obligaciones pactadas, por lo tanto, existe equilibrio económico del contrato en cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se desarrollaron efectivamente por las partes con base en la suscripción del presente acuerdo.

CUARTA: Liberar los saldos sin ejecutar a favor del Municipio de Caldas.

QUINTA: De conformidad con lo antes manifestado las partes contratantes imparten la aprobación a la presente liquidación.

CLAUSULA: El contratista manifiesta que el contratante si cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, por lo tanto manifiesta que renuncia a todas las acciones penales, contencioso administrativas, civiles, indemnizaciones, contractuales o extra contractuales, que se pudieren generar por causa del contrato en contra de la administración.

El Contratista está a Paz y Salvo con los pagos al sistema de seguridad social integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF)

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

En atención a lo dispuesto en la Presente Acta, las partes contratantes dan por liquidado CONTRATO **N° SAMC 013 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

Se suscribe por quienes en ella intervinieron.

DIEGO ALEJANDRO LANCHEROS RUIZ
Alcalde Municipal
Contratante

JORGE IVAN OVALLE CASTILLO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
Supervisor

DAVID HUMBERTO PINILLA CAÑON
R.L CONSTRUCTORA DAVICON SAS
Contratista

Retención documental					
Elaborado por:		**Revisado por:**		**Aprobado por:**	
Nombre	**Firma**	**Nombre**	**Firma**	**Nombre**	**Firma**
Ing. Jorge Ovalle SPOP		**Ing. Jorge Ovalle** SPOP		**Diego Alejandro Lancheros** Alcalde Municipal	
Nombre del documento	LIQUIDACION				**Versión**
Dependencia		**TRD**		**Consecutivo**	
Proceso:			**Procedimiento:**		
Dimensión:			**Política:**		

Alcaldía Municipal De Caldas Boyacá
Dirección: Carrera 3 No. 2-09
Palacio Municipal, Caldas Boyacá
E-mail: contactenos@caldas-boyaca.gov.co
Celular: (+57) 3219488825
Código postal:154660

Constructora
AVICON
Transformamos espacios

PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

Lugar y Fecha: Chiquinquirá, 23 de diciembre de 2025

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

Señores
MUNICIPIO DE CALDAS
La Ciudad

OBJETO: CERRAMIENTO MODULAR PARQUE INFANTIL DEL MUNICIPIO DE CALDAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Estimados Señores:

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

David Humberto Pinilla Cañón, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.054.682.069 de Moniquirá**, en mi condición de representante legal de **CONSTRUCTORA DAVICON SAS**, identificada con el NIT **901852129-5**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Aura Cristina Rojas Torres, identificada con cédula de ciudadanía No. **1.118.566.206 de Duitama**, y con tarjeta profesional No. **276634-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contadora de **CONSTRUCTORA DAVICON SAS** identificada con el NIT **901852129-5**, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Tunja, luego de examinar los estados financieros de la compañía de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y el artículo 3 del Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Chiquinquirá**, a los 23 días del mes de diciembre de 2025.

David Humberto Pinilla Cañón
Representante legal – CONSTRUCTORA DAVICON SAS
C.C. 1.054.682.069 de Moniquirá

Aura Cristina Rojas Torres
Contadora – CONSTRUCTORA DAVICON SAS
C.C. 1.118.566.206 de Duitama
T.P. No. **276634-T**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8100749139E19E71E0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **AURA CRISTINA ROJAS TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118566206 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 276634-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Diciembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

276634-T



AURA CRISTINA
ROJAS TORRES
C.C. 1118566206
RES. INSCRIPCION 2498 DEL 18/12/2020
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

298474 310486

Identificación Plásticos S.A. 180942/9139

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Escaneado con CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.118.566.206**

ROJAS TORRES
APELLIDOS

AURA CRISTINA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-OCT-1996**

DUITAMA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.63	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-OCT-2014 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-4600100-00674862-F-1118566206-20150304 **0043**401223A 4 43622154

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901852129	5	CONSTRUCTORA DAVICON SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTRUCTORA	cll 16 13 157	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3227732504	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRUCTORA (3 Afiliados)						$2,087,800	$334,200			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$11,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSTRUCTORA 2 (3 Afiliados)						**$2,087,800**	**$334,200**			**$2,087,800**	**$83,600**			**$2,087,800**	**$83,600**			**$2,087,800**	**$11,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						**$2,087,800**	**$334,200**			**$2,087,800**	**$83,600**			**$2,087,800**	**$83,600**			**$2,087,800**	**$11,100**		**$0**	**$0**
1	CC	7320243	CASTELLANOS JEFERSSON	230301	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$4,800	19	$0	$0
2	CC	7306922	MARTINEZ MANUEL	230201	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF16	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$1,500	6	$0	$0
3	CC	1054682069	PINILLA DAVID	230301	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF16	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$4,800	19	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			**$2,087,800**	**$334,200**			**$2,087,800**	**$83,600**			**$2,087,800**	**$83,600**			**$2,087,800**	**$11,100**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	96369716	9496369716	E	2025/12/09	2025/12/15	BANCO AV VILLAS	6	$514,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$334,200	$1,300	$0	$335,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$288,600	$1,100	$0	$289,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$45,600	$200	$0	$45,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$11,100	$100	$0	$11,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$11,100	$100	$0	$11,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$83,600	$400	$0	$84,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$83,600	$400	$0	$84,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$83,600	$400	$0	$84,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$83,600	$400	$0	$84,000
TOTAL				3	$512,500	$2,200	$0	$514,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901852129	5	CONSTRUCTORA DAVICON SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTRUCTORA	cll 16 13 157	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3227732504	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRUCTORA (3 Afiliados)						$2,087,800	$334,200			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$11,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSTRUCTORA 2 (3 Afiliados)						$2,087,800	$334,200			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$11,100		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$2,087,800	$334,200			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$11,100		$0	$0
1	CC	7320243	CASTELLANOS JEFERSSON	230301	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF10	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$4,800	19	$0	$0
2	CC	7306922	MARTINEZ MANUEL	230201	6	$284,700	$45,600	EPS005	6	$284,700	$11,400	CCF10	6	$284,700	$11,400	14-23	6	$284,700	$1,500	6	$0	$0
3	CC	1054682069	PINILLA DAVID	230301	19	$901,550	$144,300	EPS005	19	$901,550	$36,100	CCF10	19	$901,550	$36,100	14-23	19	$901,550	$4,800	19	$0	$0
Total Afiliados(3)						$2,087,800	$334,200			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$83,600			$2,087,800	$11,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12		9496369716	E	2025/12/09			3	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$334,200	$700	$0	$334,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$288,600	$600	$0	$289,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$45,600	$100	$0	$45,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$11,100	$100	$0	$11,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$11,100	$100	$0	$11,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$83,600	$200	$0	$83,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$83,600	$200	$0	$83,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$83,600	$200	$0	$83,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$83,600	$200	$0	$83,800
TOTAL				**3**	**$512,500**	**$1,200**	**$0**	**$513,700**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901852129	5	CONSTRUCTORA DAVICON SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONTRUCTORA	cll 16 13 157	CHIQUINQUIRA-BOYACA	3227732504	Si

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CONTRUCTORA (3 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSTRUCTORA 2 (3 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
Ciudad: CHIQUINQUIRA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0
1	CC	7320243	CASTELLANOS JEFERSSON	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF10	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$6,500	26	$0	$0
2	CC	7306922	MARTINEZ MANUEL	230201	8	$379,600	$60,800	EPS005	8	$379,600	$15,200	CCF10	8	$379,600	$15,200	14-23	8	$379,600	$2,000	8	$0	$0
3	CC	1054682069	PINILLA DAVID	230301	26	$1,233,700	$197,400	EPS005	26	$1,233,700	$49,400	CCF10	26	$1,233,700	$49,400	14-23	26	$1,233,700	$6,500	26	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$15,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11		9496369108	E	2025/11/11			31	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$455,600	$8,900	$0	$464,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$394,800	$7,700	$0	$402,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$60,800	$1,200	$0	$62,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$15,000	$300	$0	$15,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$15,000	$300	$0	$15,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$114,000	$2,300	$0	$116,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$114,000	$2,300	$0	$116,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$114,000	$2,300	$0	$116,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$114,000	$2,300	$0	$116,300
TOTAL				**3**	**$698,600**	**$13,800**	**$0**	**$712,400**

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S. identificado con el NIT 901852129, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
SAMC-013-2025	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y	CALDAS BOYACA	295,650	2025-11	12-DIC-2025	151956474
		Total	295,650			

Expedido por el SENA, a los diecinueve (19) dias del mes de Diciembre de 2025

"LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC."

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-12-19

Generado por : Sandra Milena Estepa Fonseca

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 2839305601 y el Número de Certificado: 450513

Recaudo exclusivo con Código de Barras No. de referencia 7809113

UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO O CON CHEQUE DE GERENCIA

Servicio Nacional De Aprendizaje
Ministerio de Trabajo
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto dia de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidacion y generar un nuevo cupón

REFERENCIA No.	151956474	
FECHA DE EXPEDICIÓN		
10	12	2025
FECHA VENCIMIENTO		
15	12	2025

Nombre Pagador CONSTRUCTORA **NIT o C.C.** 901852129

Dirección CALLE 16 13 **Teléfono** +57,322

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC 3-2-07-1-02-1-04-43 Boyaca		
DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS PESOS.	**SUBTOTAL**	$ 295,650.00
	IVA	
	TOTAL FACTURA	$ 295,650.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
La impresión de este cupón debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Si va a cancelar con Cheque, solo se recibe Cheque de Gerencia.
Al cancelar su pago se debe hacer solo por un medio de pago (todo en efectivo o todo con cheque de gerencia).
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la Sucursal o Corresponsal Bancario.
Si se presenta algún incidente con el cupón y/o la Plataforma de Pagos SENA escribanos al correo certiaportes@sena.edu.co
Términos y condiciones podrá encontrarlos en www.sena.edu.co

(415)7707012100010(8020)7809113(3900)000000295650(96)20251215

Bancolombia

CONVENIO No. 29232 **REFERENCIA No.** 151956474

Ciudad | D | M | A | NIT 901852129 | Telefono

Nombre del Pagador / Cliente: CONSTRUCTORA

Bco	CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos a verificación posterior Por el total indicado en la misma. El banco solo ampara el efectivo indicado en el original de la consignación. Si hubiere errores o faltantes, el banco hará los ajustes necesarios en la cuenta corriente del cliente. Sobre el valor de la consignación hecha en el cheque no puede girarse hasta dichos cheques sean corrientes.

CANTIDAD DE CHEQUES		
	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	

AREA PARA SELLO

Constructora
AVICON
Transformamos espacios

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT

Calle 16 N° 13-157
Chiquinquirá

Teléfono 322 773 2504
daviconsas@gmail.com

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141152571286

(415)7707212489984(8020) 000014115257128 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 2 1 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCTORA DAVICON S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Chiquinquirá 1 7 6

41. Dirección principal
CL 16 13 157

42. Correo electrónico DAVICONSAS@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 2 7 7 3 2 5 0 4	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 2 4 0 7 1 0	7 1 1 2	2 0 2 4 0 7 1 0	4 9 2 3			0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 1 4 4 2 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | **001**

Página 2 de 3 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141152571286

(415)7707212489984(8020) 000014115257128 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 2 1 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 2 4 0 2 1 4	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 7 1 8	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 2 2 3 9 6 0	
78. Departamento	1 5	
79. Ciudad/Municipio	1 7 6	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 4 0 7 1 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141152571286

(415)7707212489984(8020) 000014115257128 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 8 5 2 1 2 9	5	Impuestos y Aduanas de Tunja	2 0	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 0 7 1 8			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 4 6 8 2 0 6 9			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
PINILLA	CAÑON	DAVID	HUMBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 0 7 1 8			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan 1 3	2 3 4 9 3 3 8 9			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
CAÑON	INFANTE	LUZ	CONSUELO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO
