Aguazul, 23 de diciembre de 2025

Ingeniero:
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIÉRREZ
Secretario de Infraestructura
Supervisor contrato de prestación de servicios No. 0647-2025
Aguazul

Ref.: Contrato de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión No 0647-2025

Asunto: Informe de ejecución de actividades No 6 - ACTA No. 7 TERMINACION

Por medio de la presente me permito presentar informe No. 6 -acta 07 TERMINACION de ejecución de actividades, las cuales se desarrollaron durante el periodo de tiempo comprendido entre el 01/12/2025 al 20/12/2025, de acuerdo al contrato de la referencia, cuyo objeto contractual es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARGUE DE INFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, REPROGRAMACIÓN, GENERACIÓN DE REPORTES Y LAS ALERTAS EN LA PLATAFORMA GESPROY 3.0 DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR QUE SE ENMARQUEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE."

Sin otro particular,

GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
C.C. No. 47.442.426 de Yopal
Contratista

INFORME DE ACTIVIDADES
FINAL

Aguazul, 23 de diciembre de 2025

Señor(a)
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades Final del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0647 -17-07-2025. Proceso No.MA-CD-SI-636-2025

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

NUMERO	:	0647
TIPO CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SGR, EN EL MARCO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA EN LA PLATAFORMA GESPROY.
VALOR	:	$25.500.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 MCTE.
VALOR FINAL	:	$25.500.000,00 MCTE.
PLAZO	:	CINCO (5) MESES
PRORROGA	:	
FECHA INICIO	:	21-07-2025
FECHA TERMINACIÓN	:	20-12-2025

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/12/2025 hasta el 20/12/2025.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
Realizar la actualización de la información técnica y financiera de los proyectos de inversión del SGR en la plataforma GESPROY, desde la etapa de aprobación hasta el cierre del proyecto, garantizando la veracidad, oportunidad e idoneidad del reporte mensual, incluyendo la revisión de cronogramas, metas físicas y financieras, estados contractuales, de los proyectos generados en marco del PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	En atención al cumplimiento de la actividad relacionada con la actualización de la información técnica y financiera de los proyectos de inversión del SGR en la plataforma GESPROY, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025, se realizó el seguimiento desde la etapa de aprobación hasta el cierre de cada proyecto, garantizando la veracidad, oportunidad e idoneidad del reporte mensual. Esta labor incluyó la revisión de cronogramas, metas físicas y financieras, estados contractuales y demás aspectos asociados a los proyectos generados en el marco del Proceso de Gestión de la Infraestructura, con el fin de asegurar la correcta gestión y trazabilidad de la información reportada **BPIN 2019850100004** Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul

	BPIN 2020850100007 Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul. **BPIN 2022850100009** Construcción de obras de estabilización mitigación y control para la protección margen derecha aguas arriba rio cachiza del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal en la vereda únete del municipio de aguazul Casanare. BPIN 2022005850010 Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare Evidencia: Actividad 1 Medio: Medio físico: 6 folios Medio digital: Anexo 1
Efectuar el seguimiento a la trazabilidad de la información registrada en la plataforma GESPROY, con base en los datos suministrados por las áreas técnicas, financieras y jurídicas de los proyectos que se ejecutan en el marco de los procedimientos del Proceso de Gestión de la Infraestructura. Esta actividad comprende la verificación de la coherencia y consistencia de los reportes cargados, así como la revisión y análisis de las alertas generadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El profesional deberá elaborar y presentar un (1) informe mensual con el estado actualizado de dichas alertas, detallando las acciones correctivas adoptadas, los avances en su resolución y el impacto en la calificación del IGPR	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor del 01 al 20 de diciembre de 2025 se elaboró un informe con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la secretaria de infraestructura financiados con recursos del sistema general de regalías SGR, las alertas están en los proyectos en estado TERMINADO Evidencia: Actividad 2 Informe de alertas Medio: Medio físico: 2 folios Medio digital: Anexo 2
Elaborar documental y digitalmente según corresponda las respuestas a los requerimientos que realice el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), los entes de control y el representante legal para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades legales del municipio como entidad ejecutora.	En cumplimiento de la actividad asignada, y conforme a la designación realizada por el supervisor para el período comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025, no se presentaron requerimientos que exigieran respuesta por parte del municipio frente a las solicitudes formuladas por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), los entes de control ni el representante legal, relacionadas con el cumplimiento de las responsabilidades legales del municipio en su calidad de entidad ejecutora. Evidencia: Actividad 3 Medio: Medio físico: 1 folios Medio digital: Anexo 3
Elaborar un (1) informe mensual del estado de cada uno de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalias SGR, en el marco del PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA	En cumplimiento de la actividad asignada, y conforme a la designación realizada por el supervisor para el período comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025, Este informe presenta una actualización del estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 4 del Contrato CPS No.0224-2025 de " Elaborar un (1) informe mensual del estado de cada uno de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalías SGR, en el marco del PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA.

INFORME DE ACTIVIDADES
FINAL

	Evidencia: Informe estado de proyectos Medio: Medio físico: 7 folios Medio digital: Anexo 4
Realizar asistencia profesional a los profesionales de los proyectos de inversión relacionadas con el uso de la plataforma, reprogramaciones y/o la carga de información.	En cumplimiento de las funciones asignadas dentro de la asistencia profesional correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025, se aplicó control de cambios al proyecto BPIN 2022850100009, denominado "Construcción de obras de estabilización, mitigación y control para la protección de la margen derecha, aguas arriba del río Cachiza, del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal, en la vereda Únete, municipio de Aguazul – Casanare", con el fin de reprogramarlo conforme al acta de reinicio y prórroga, y así solicitar el levantamiento de la medida de suspensión de giros. Evidencia: Asistencia profesional Medio: Medio físico: 1 folio Medio digital: Anexo 5
Las demás designadas por el supervisor que sean inherentes al objeto contractual	En atención al cumplimiento de esta actividad, y de acuerdo con la designación otorgada por el supervisor para el período comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025, de acuerdo a la ejercicio de las competencias del municipio como entidad ejecutora, se proyectó resolución mediante la cual se da por terminado por no continuidad el proyecto **BPIN 2020850100007**, denominado "Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul, Casanare". La decisión se fundamenta en lo dispuesto en la Ley 2056 de 2020, que regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías, la cual establece que los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR deberán ser objeto de seguimiento permanente y podrán ser finalizados anticipadamente cuando se evidencie la imposibilidad de continuar su ejecución, el incumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas o financieras, o la pérdida de pertinencia frente a los objetivos inicialmente aprobados. En concordancia con lo anterior, y conforme a los lineamientos definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la gestión, seguimiento y cierre de proyectos del SGR, se determinó que el proyecto en mención no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar su continuidad, razón por la cual se procede a adelantar el trámite administrativo correspondiente para su terminación y cierre definitivo. Evidencia: Otras actividades Medio: Medio físico: 1 folios Medio digital: Anexo 6

Para una ejecución acumulada del contrato 0647 - MA-CD-SI-636-2025 de 2025-07-17 es del100%

OBSERVACIONES: ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL N. **7996377223** CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Atentamente,

GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
Contratista

ACTIVIDAD 1.

Realizar la actualización de la información técnica y financiera de los proyectos de inversión del SGR en la plataforma GESPROY, desde la etapa de aprobación hasta el cierre del proyecto, garantizando la veracidad, oportunidad e idoneidad del reporte mensual, incluyendo la revisión de cronogramas, metas físicas y financieras, estados contractuales, de los proyectos generados en marco del PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA."

En atención al cumplimiento de la actividad relacionada con la actualización de la información técnica y financiera de los proyectos de inversión del SGR en la plataforma GESPROY, correspondiente al periodo comprendido entre el **1 y el 20 de diciembre de 2025**, se realizó el seguimiento desde la etapa de aprobación hasta el cierre de cada proyecto, garantizando la veracidad, oportunidad e idoneidad del reporte mensual. Esta labor incluyó la revisión de cronogramas, metas físicas y financieras, estados contractuales y demás aspectos asociados a los proyectos generados en el marco del **Proceso de Gestión de la Infraestructura**, con el fin de asegurar la correcta gestión y trazabilidad de la información reportada

ITEM	BPIN	PROYECTO	OBSERVACIÒN
1	2019850100004	Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul	Los contratos se encuentran actualmente en estado de suspensión. El Contrato de Obra N.° 684 tiene prevista su reactivación el 8 de diciembre de 2025. De igual forma, el Contrato de Interventoría N.° 685-2019 está programado para reiniciarse en la misma fecha. La ejecución física del proyecto alcanza el 93,44 %, mientras que la ejecución financiera es del 93,96 %. Se ha identificado una duplicidad en el contrato de apoyo a la supervisión; no obstante, esta situación ya fue reportada a la mesa de ayuda del DNP y se encuentra pendiente de solución. Adicionalmente, está pendiente el registro de las actas de ampliación de la suspensión, correspondiente al Acta N.° 54 del 5 de diciembre de 2025, por un periodo de 30 días, con fecha prevista de reinicio el 6 de enero de 2026 para el contrato de interventoría. 

CONTRATO DE OBRA

Listado de contratos
Pagos del Contrato
Registro Audiovisual
Reintegros Recursos no Ejecutados del Contrato

Detalle información Contratos

Contrato No	585-2023	Tipo de Contrato	Obra pública	Modalidad de Contratación	Selección abreviada
Identificación del Contratista	901729737-CONSORCIO PASO ELEVADO	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901729737	Tipo Contratista	Consorcio
Objeto	CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MITIGACIÓN Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN, MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA, DEL ESTRIBO DEL PASO ELEVADO DE LA TUBERIA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LA VEREDA UMETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE"			Valor Contrato Para Proyecto	1.027.126.779,00
Fecha de Inicio	27/12/2023	Fecha Final Contractual	25/05/2025	Fecha Final Real	20/02/2026
Fecha Suscripción del Contrato	18/07/2023	Plazo Contractual	515,00 Días	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	MA-SI-SAM-084-2023	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	1.027.126.779,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

9	Acta de reinicio	22/05/2024	Acta n 9 del reinicio N. 3		0.00	26/06/2024	
10	Acta de suspensión	31/05/2024	Acta No 10 suspension bro 4 del 31/05/2024		0.00	12/06/2024	Condiciones Climáticas o de su fenomeno (imprevisibles)
11	Acta de suspensión	13/08/2024	Acta 11 Ampliacion 1 a la suspension N 4		0.00	13/09/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
12	Acta de reinicio	13/09/2024	ACTA 12 - REINICIO 4 (12 DE SEPTIEMBRE 2024)		0.00	13/09/2024	
13	Acta de suspensión	27/09/2024	SE SUSPENDE POR DOS 2 MESES . FECHA PREVISTA DE REINICIO 26 DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	02/12/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
14	Acta de suspensión	25/11/2024	ACTA 14 DE LA AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 5 NUEVA FECHA DE TERMINACION 04 DE ENERO 2025		0.00	11/12/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
15	Acta de reinicio	09/12/2024	ACTA DE REINICIO CONTRATO DE OBRA		0.00	26/12/2024	
16	Acta de suspensión	21/02/2025	ACTA N. 16 SUSPENSION 6		0.00	09/04/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
17	Acta de suspensión	12/03/2025	ACTA 17 AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 6		0.00	09/04/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
18	Acta de suspensión	26/03/2025	ACTA 18 AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 6 FECHA PREVISTA DE REINICIO 14 DE ABRIL DE 2025		0.00	09/04/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
19	Acta de suspensión	14/04/2025	ACTA NO. 19 DE AMPLIACION NO 3 LA SUSPENSION NO 6 DEL 14/04/2025		0.00	29/05/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
20	Acta de reinicio	14/05/2025	ACTA NO. 20 DE REINICIO 6 DEL 14 DE MAYO DE 2025		0.00	29/05/2025	
21	Acta de suspensión	03/06/2025	ACTA NO. 21 DE SUSPENSION NO. 7 DEL 3/06/2025		0.00	03/11/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
22	Acta de suspensión	01/08/2025	ACTA N. 22 AMPLIACION N. 1 A LA SUSPENSION 7 DEL 01 DE AGOSTO DE 2025 POR UN MES (FECHA PREVISTA DE REINICIO 1 DE NOVIEMBRE DE 2025)		0.00	03/11/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
23	Acta de reinicio	31/10/2025	ACTA 23 DE REINICIO 7 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	10/11/2025	


CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Detalle información Contratos

Contrato No	667-2023	Tipo de Contrato	Interventoría	Modalidad de Contratación	Concurso de méritos
Identificación del Contratista	901742868-UNION TEMPORAL PASO ELEVADO 2023	Número Del Documento De Identificación Del Contratista	901742868	Tipo Contratista	Unión temporal
Objeto	INTERVENTORIA PARA EL SEGUIMINETO TECNICO, ADMINISTRATIVO FINANCIERO, CONTABLE, JURIDICO Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE BRAS DE ESTABILIZACION, MITIGACION Y CONTROL PARA LA PROTECCION, MARGEN DERECHO AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA DEL ESTRIBO DEL PASO			Valor Contrato Para Proyecto	101.125.684,00
Fecha de Inicio	15/10/2023	Fecha Final Contractual	01/07/2025	Fecha Final Real	20/05/2026
Fecha Suscripción del Contrato	25/08/2023	Plazo Contractual	682,00 Días	Término Para Liquidación en Meses	4 Mes(es)
Proceso Precontractual	MA-SI-CMA-009-2023	Maneja Múltiples Proyectos	No	Contrato Valor Total	101.125.684,00
Estado Contrato	En Ejecución	Nuevo Multiproyecto	No		

09	Acta de suspensión	13/08/2024	Acta N. 9 Ampliacion N. 01 de la suspension 04 de 13 de agosto de 2024		0.00	13/09/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
10	Acta de reinicio	13/09/2024	Acta 10 - reinicio 4 del 13 de septiembre de 2024		0.00	12/10/2024	
11	Acta de suspensión	27/09/2024	ACTA 11 - SE SUSPENDE POR DOS (2) MESES. FECHA PREVISTA DE REINICIO 26S DE NOVIEMBRE DE 2024		0.00	02/12/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
12	Acta de suspensión	25/11/2024	ACTA 12 AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION 5		0.00	11/12/2024	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
13	Acta de reinicio	09/12/2024	ACTA DE REINICIO		0.00	26/12/2024	
14	Acta de suspensión	21/02/2025	ACTA 14 SUSPENSION 6		0.00	09/04/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
15	Acta de suspensión	12/03/2025	ACTA 15 AMPLIACION 1 A LA SUSPENSION 6		0.00	09/04/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
16	Acta de suspensión	26/03/2025	ACTA 16 AMPLIACION 2 A LA SUSPENSION 6		0.00	09/04/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
17	Acta de suspensión	14/04/2025	ACTA NO. 17 DE AMPLIACION NO. 3 DE LA SUSPENSION NO. 6 DEL 14/04/25		0.00	29/05/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
18	Acta de reinicio	14/05/2025	ACTA NO. 18 DE REINICIO 6 DEL 14 MAYO DE 2025		0.00	29/05/2025	
19	Acta de suspensión	03/06/2025	ACTA N. 19 SUSPENSION 7		0.00	03/11/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
20	Acta de suspensión	01/08/2025	ACTA 20 DE AMPLIACION N. 1 DE LA SUSPENSION 7 , POR 3 MESES- FECHA PREVISTA DE REINICIO 1 DE NOVIEMBRE DE 2025		0.00	03/11/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas
21	Acta de reinicio	31/10/2025	ACTA NO. 21 DE REINICIO 7 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.00	10/11/2025	

ITEM	BPIN	PROYECTO	OBSERVACIÒN

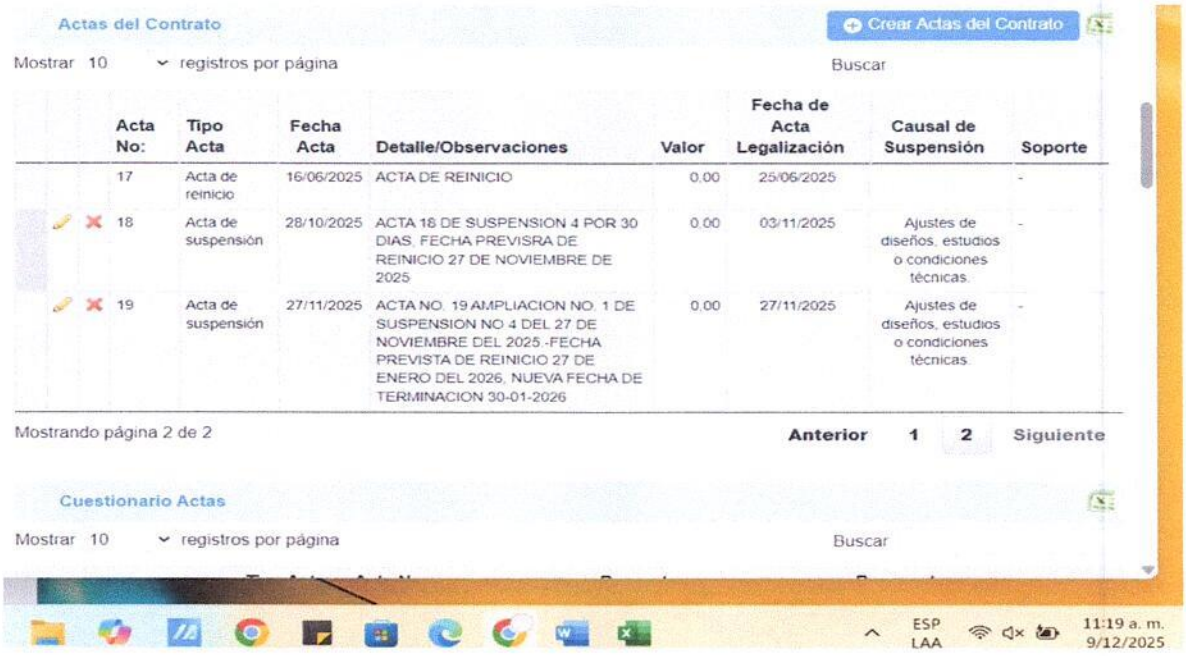

Actas del Contrato

Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar

	Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Soporte
	17	Acta de reinicio	16/06/2025	ACTA DE REINICIO	0.00	25/06/2025		-
	18	Acta de suspensión	28/10/2025	ACTA 18 DE SUSPENSION 4 POR 30 DIAS. FECHA PREVISRA DE REINICIO 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	0.00	03/11/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	-
	19	Acta de suspensión	27/11/2025	ACTA NO. 19 AMPLIACION NO. 1 DE SUSPENSION NO 4 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025.-FECHA PREVISTA DE REINICIO 27 DE ENERO DEL 2026, NUEVA FECHA DE TERMINACION 30-01-2026	0.00	27/11/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	-

Mostrando página 2 de 2 Anterior 1 2 Siguiente


Cuestionario Actas

Mostrar 10 registros por página

Buscar

ESP LAA 11:19 a. m. 9/12/2025

Registro de acta de ampliación a la suspensión al contrato de interventoría 335-2022

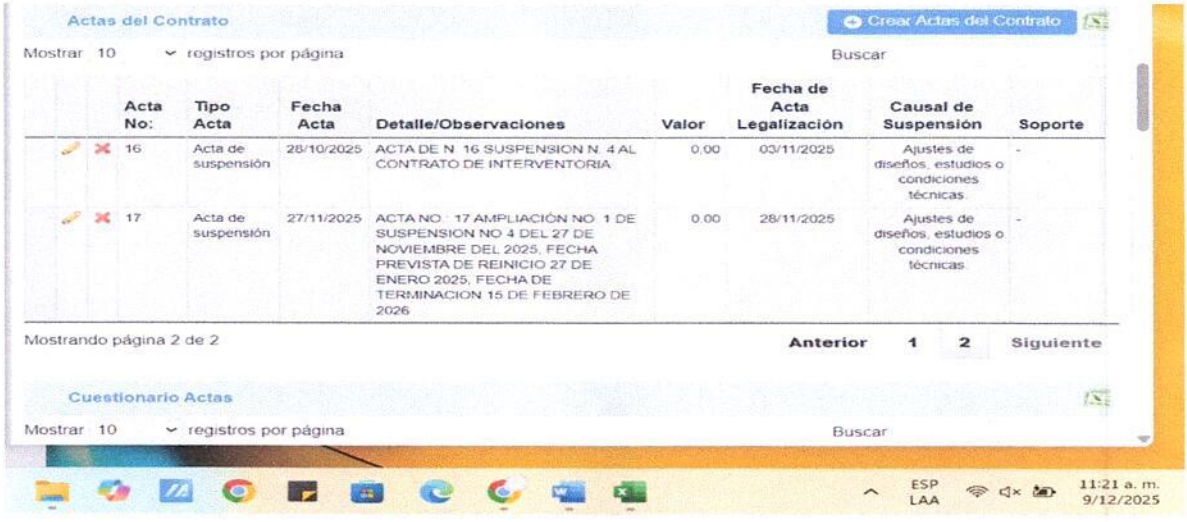

Actas del Contrato

Crear Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página

Buscar

	Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Soporte
	16	Acta de suspensión	28/10/2025	ACTA DE N 16 SUSPENSION N. 4 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA	0.00	03/11/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	-
	17	Acta de suspensión	27/11/2025	ACTA NO. 17 AMPLIACIÓN NO. 1 DE SUSPENSION NO 4 DEL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2025, FECHA PREVISTA DE REINICIO 27 DE ENERO 2025, FECHA DE TERMINACION 15 DE FEBRERO DE 2026	0.00	28/11/2025	Ajustes de diseños, estudios o condiciones técnicas.	-

Mostrando página 2 de 2 Anterior 1 2 Siguiente

Cuestionario Actas

Mostrar 10 registros por página

Buscar

ESP LAA 11:21 a. m. 9/12/2025

¿

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0647 del 17 de julio de 2025

ACTIVIDAD 2. -INFORME DE ALERTAS

Efectuar el seguimiento a la trazabilidad de la información registrada en la plataforma GESPROY, con base en los datos suministrados por las áreas técnicas, financieras y jurídicas de los proyectos que se ejecutan en el marco de los procedimientos del Proceso de Gestión de la Infraestructura. Esta actividad comprende la verificación de la coherencia y consistencia de los reportes cargados, así como la revisión y análisis de las alertas generadas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El profesional deberá elaborar y presentar un (1) informe mensual con el estado actualizado de dichas alertas, detallando las acciones correctivas adoptadas, los avances en su resolución y el impacto en la calificación del IGPR.

D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor del 01 al 20 de diciembre de 2025 se elaboró un informe con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la secretaria de infraestructura financiados con recursos del sistema general de regalías SGR, las alertas están en los proyectos en estado TERMINADO


ASUNTO:INFORME MENSUAL DE ESTADO DE ALERTAS.


PERIODO: 01 de DICIEMBRE al 20 DE DICIEMBRE de 2025

CÓDIGO ALERTA	OBSERVACIÓN	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
EJ-1-24	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 194 Alertas para el proyecto 2021005850074 Código: EJ-1-24 — Descripción: Proyecto terminado sin cerrar — Detalles: Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 194 — Valor Radicado: $194 — Fecha Radicado: — Plazo para ajuste: 6 meses desde la terminacion — Consecuencia: Reporte a órganos de control	2021005850074	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
EJ-1-24	Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 615 Alertas para el proyecto 2022850100011 Código: EJ-1-24 — Descripción: Proyecto terminado sin cerrar — Detalles: Proyectos terminados sin cerrar Nro dias: 615 — Valor Radicado: $615 — Fecha Radicado: — Plazo para ajuste: 6 meses desde la terminacion — Consecuencia: Reporte a órganos de control	2022850100011	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL URBANO DENOMINADO CONCHA ACÚSTICA ALBERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ALERTAS SIN SUBSANAR

NOTA: Las alertas se visualizan en el aplicativo GESPROY, en el menú izquierdo, en la sección de *"Reportes" -Alertas SMSCE*

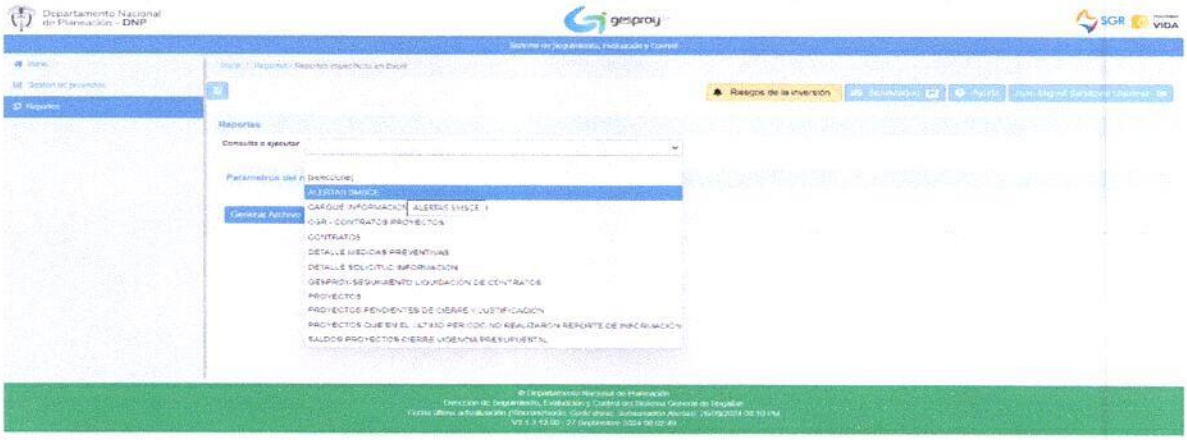

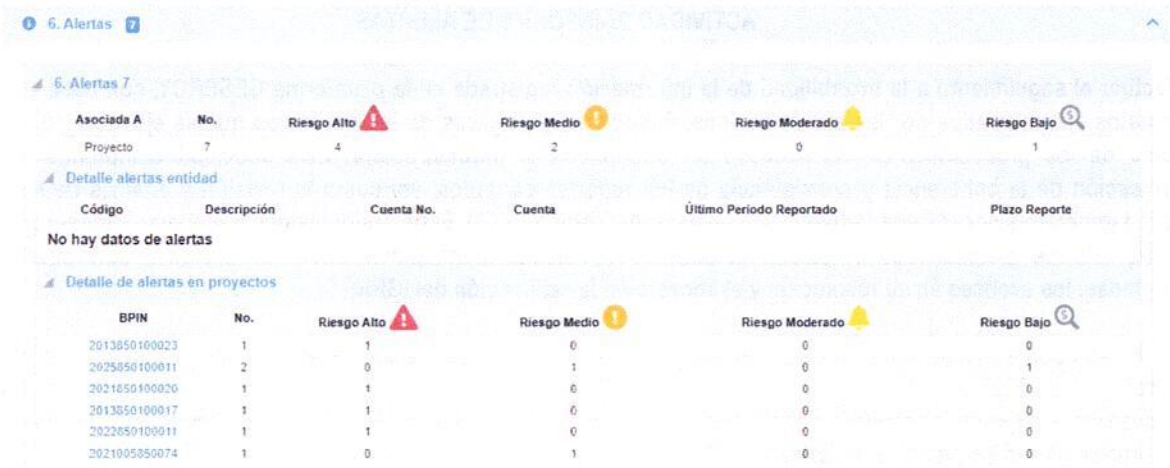

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO

CONTRATO 0647 DEL 17 JULIO DE 2025

ACTIVIDAD 3. Elaborar documental y digitalmente según corresponda las respuestas a los requerimientos que realice el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), los entes de control y el representante legal para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades legales del municipio como entidad ejecutora.

En cumplimiento de la actividad asignada, y conforme a la designación realizada por el supervisor para el período comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025, no se presentaron requerimientos que exigieran respuesta por parte del municipio frente a las solicitudes formuladas por el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control (SSEC), los entes de control ni el representante legal, relacionadas con el cumplimiento de las responsabilidades legales del municipio en su calidad de entidad ejecutora.

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0647 del 17 de julio de 2025

Yopal, 22 de diciembre de 2025

Ingeniero
Juan Miguel Sandoval Gutierrez
Secretario de Infraestructura
Municipio de Aguazul

ASUNTO: **INFORME ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - ACTIVIDAD 4**

PERIODO: 01 al 20 de diciembre de 2025

Este informe presenta una actualización del estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en la **actividad No. 4** del Contrato CPS No.0224-2025 de " Elaborar un (1) informe mensual del estado de cada uno de los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalias SGR, en el marco del PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA.

Actualmente el sistema GESPROY registra un total de OCHO (proyectos que se relacionan a continuación, en sus diferentes estados: en ejecución y terminado.

Proyectos en Estado en Ejecución:

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2019850100004	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL
2	2020850100007	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
3	2022005850010	CONSTRUCCIÓN PARADOR Y OBRAS DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
4	2022850100009	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MITIGACIÓN Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA DEL ESTRIBO DEL PASO ELEVADO DE LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LA VEREDA ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Proyectos en Estado Terminado y Para cierre

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2019850100002	CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
2	2022850100011	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL URBANO DENOMINADO CONCHA ACÚSTICA ALBERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
3	2021005850074	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROYECTOS EN EJECUCION

Proyecto 1.

BPIN: 2019850100004
PROYECTO: Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 93.44% a agosto de 2025
AVANCE FINANCIERO: 93,96% a agosto de 2025
ALERTA: Proyecto suspendido de fecha 24 de sep de 2025, Se registro ampliación, con fecha prevista de reinicio 8 de diciembre de 2025
SDO TRIMESTRE 2025: 90




Proyecto 2.

BPIN: 2020850100007
PROYECTO: Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul Casanare
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 77,24% a marzo 2024
AVANCE FINANCIERO: 72,51% a agosto de 2024
OBSERVACIÓN: La programación registrada esta de julio de 2021 a marzo de 2024, Presenta dos Planes administrativos de control por parte del Departamento nacional de planeación:
PAC 2581-24: "c) No ejecutar el proyecto de inversión en los términos de su aprobación sin justificación técnica o jurídica."

- ✓ "En la visita se observó que, aunque el contrato de obra tiene acta de terminación en octubre de 2023, están pendientes por desarrollar actividades para la funcionalidad del proyecto, tales como la sincronización del software para el cobro del servicio, instalación del sistema de cobro prepago y la creación de la entidad encargada de atender el servicio eléctrico prestado por los paneles instalados en cada beneficiario, careciendo así de la debida sostenibilidad del proyecto.
- ✓ Las actividades pendientes por desarrollar impiden que los beneficiarios tengan el debido soporte técnico del sistema, que garantice el correcto funcionamiento en el momento en que se presenten fallas en el servicio eléctrico.


- ✓ El proyecto no cuenta con acciones que permiten la continuidad y operación, situación que puede llegar a comprometer el uso eficiente de los sistemas fotovoltaicos instalado en los 137 beneficiarios los cuales pueden presentar posibles fallas irreparables que comprometen la estabilidad del proyecto.

PAC 1142-24: se registra programación vencida, siendo necesario que la entidad ejecutora rinda explicaciones al respecto, toda vez, que lo anterior configura una presunta situación irregular, que se enmarca en la causal c) del Artículo 174 de la Ley 2056 de 2020
Teniendo en cuenta que la actividad de interventoría no se ejecutó al 100 %, se va a realizar la solicitud ante el DNP para ajustar el porcentaje de ejecución de la interventora, la cuál va de acuerdo al avance de la obra.
ALERTA: No presenta alertas
SDO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO

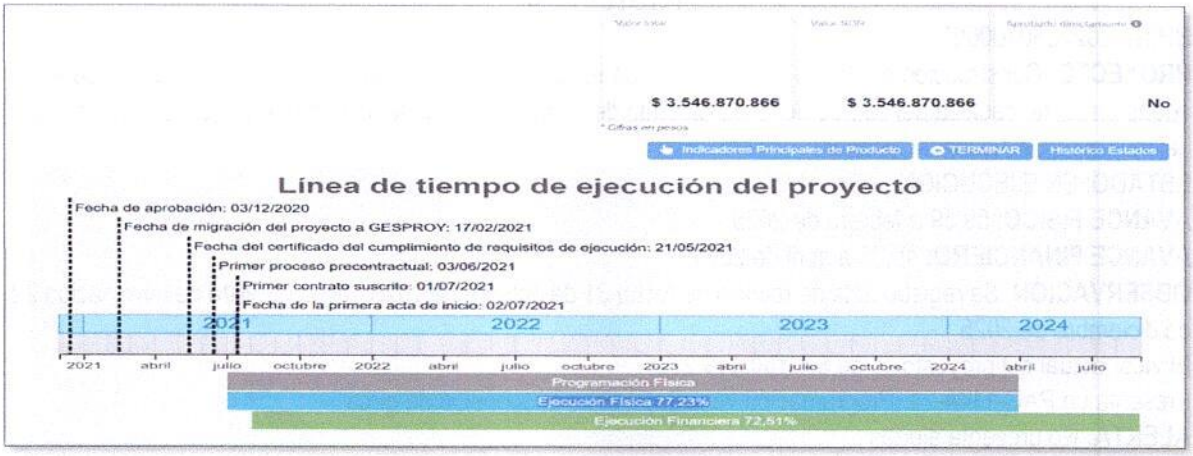

PROYECTO 3.

BPIN: 2022005850010
PROYECTO: Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 97,57 a septiembre de 2025
AVANCE FINANCIERO: 87,88 a julio de 2024
OBSERVACIÓN: Se registró la información correspondiente al mes de agosto de 2025, evidenciando una ejecución física del **97,57 %** a septiembre de 2025 y una ejecución financiera del **87,88 %** a julio de 2024. Asimismo, para el Contrato de Obra N.° 333-2022 se registró la **Prórroga N.° 6** por un periodo de **cuarenta (40) días** y el Acta N.° 18 correspondiente a la **Suspensión N.° 4** por **treinta (30) días**, estableciendo como **fecha prevista de reinicio** el **27 de noviembre de 2025**.
El valor actual del proyecto es de $11.354.926.038
ALERTA: No presenta alertas
SDO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO

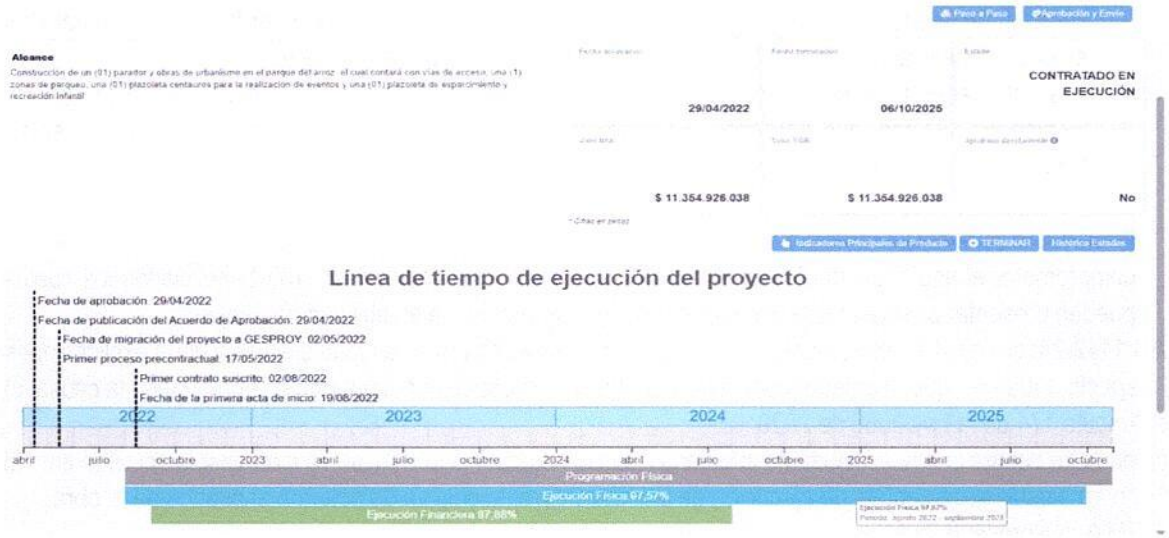

PROYECTO 4.

BPIN: 2022850100009
PROYECTO: Construcción de obras de estabilización mitigación y control para la protección margen derecha aguas arriba rio cachiza del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal en la vereda únete del municipio de Aguazul-Casanare.
ESTADO: EN EJECUCIÓN
AVANCE FISICO: 59,59 a febrero de 2025
AVANCE FINANCIERO: 45,35 a abril de 2024
OBSERVACIÓN: Se registro acta de reinicio de fecha 31 de octubre de 2025, fecha prevista de terminación 22 de diciembre de 2025
El valor actual del proyecto es de **$ 1.150.418.293**
Presenta un PAC-1144-24 (Programación vencida) – tiene suspensión de giros
ALERTA: No presenta alertas


SDO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO



PROYECTO PARA CIERRE

Proyecto 1


BPIN: 2019850100002
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
ESTADO: PARA CIERRE
AVANCE FISICO: 99,94 registrada a diciembre de 2022
AVANCE FINANCIERO: 99,94registrada a diciembre de 2022
IGPR SDO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO

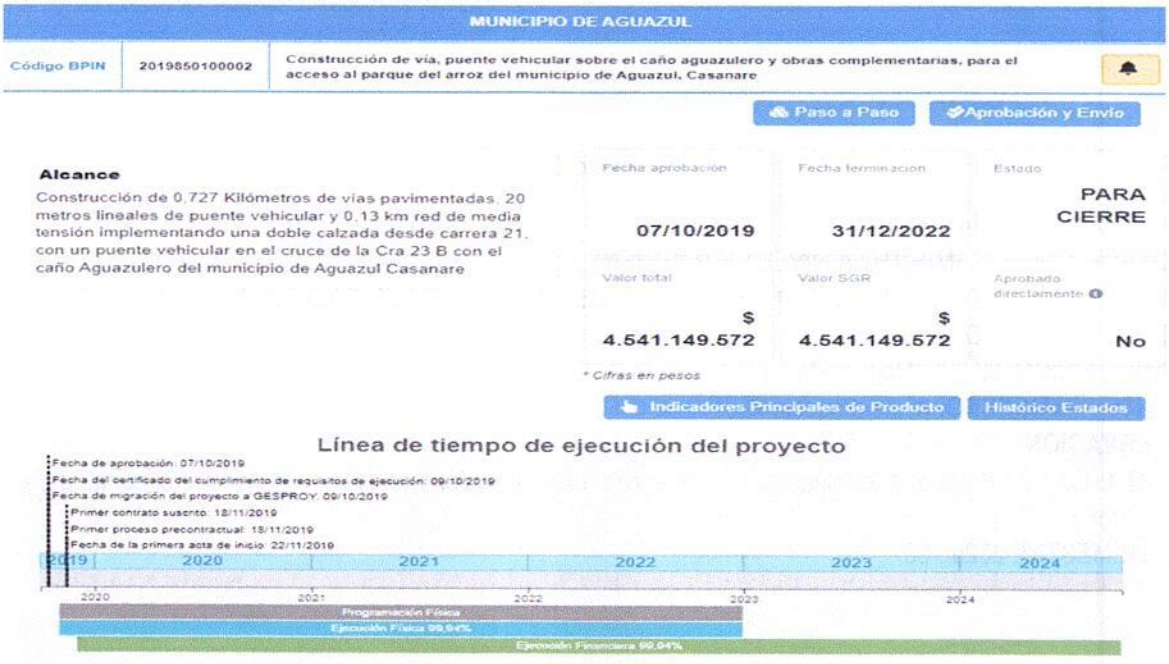

PROYECTOS TERMINADOS

Proyecto 1.

BPIN: 2022850100011
PROYECTO: Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López en el Municipio de Aguazul Departamento de Casanare
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 100% Registrada a octubre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 98,81 a diciembre de 2024
OBSERVACIÓN: El contrato de Interventoría N. 321-2022, no está liquidado. (le faltan pagos)
ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 595
IGPR SDO TRIMESTRE 2025: NO FUE CALIFICADO

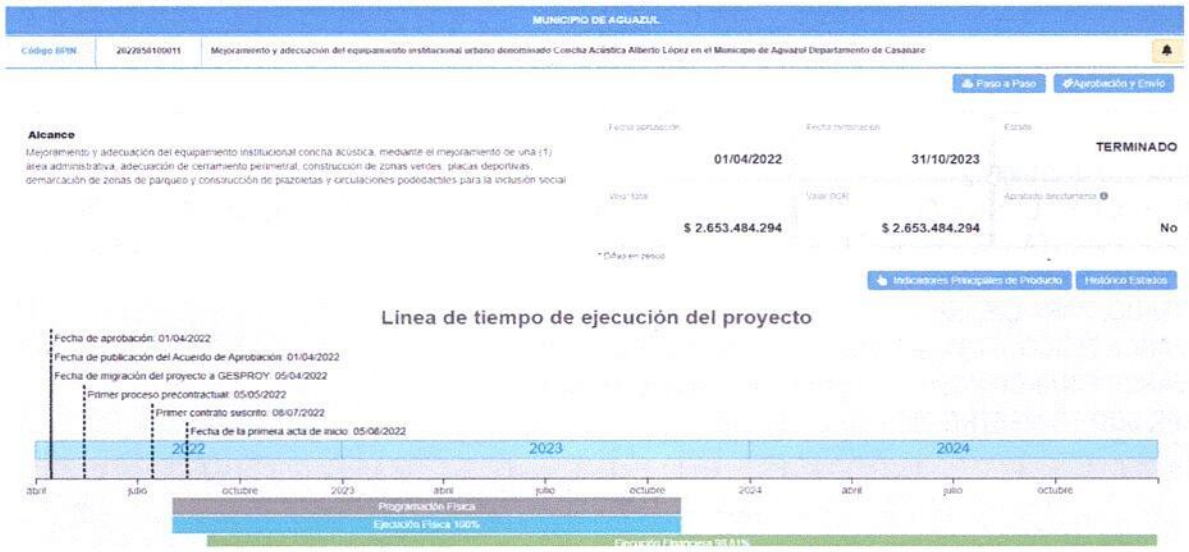

Proyecto 2

BPIN: 2021005850074
PROYECTO: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
ESTADO: TERMINADO
AVANCE FISICO: 99,09% Registrada a diciembre de 2023
AVANCE FINANCIERO: 89,58 a agosto 2025
OBSERVACIÓN:
ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 174, tiene pendiente de liquidar el contrato de interventoría
SDOTRIMESTRE 2025:: 90

MUNICIPIO DE AGUAZUL

Código BPIN	2021005850074	Mejoramiento A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE Casanare

Paso a Paso | Aprobación y Envío

Alcance


Realizar el mejoramiento a nivel de pavimento flexible y rigido de 7 9 km de la vía terciaria denominada "Anillo Vial Cupiagua - Cusiana" desde el PR 2+900 hasta el PR 10+900 en jurisdicción del Municipio de Aguazul, Departamento de Casanare

Fecha aprobación	Fecha terminación	Estado
22/10/2021	12/12/2024	TERMINADO
Valor total	**Valor SGR**	**Aprobado directamente**
$ 20.594.200.382	$ 10.453.195.014	No

* Cifras en pesos

Indicadores Principales de Producto | Histórico Estados

Linea de tiempo de ejecución del proyecto




ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0647 17 de julio de 2025

ACTIVIDAD 5. Realizar asistencia profesional a los profesionales de los proyectos de inversión relacionadas con el uso de la plataforma, reprogramaciones y/o la carga de información.

D/A: En cumplimiento de las funciones asignadas dentro de la asistencia profesional correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025, se aplicó control de cambios al proyecto BPIN 2022850100009, denominado *"Construcción de obras de estabilización, mitigación y control para la protección de la margen derecha, aguas arriba del río Cachiza, del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal, en la vereda Únete, municipio de Aguazul – Casanare"*, con el fin de reprogramarlo conforme al acta de reinicio y prórroga, y así solicitar el levantamiento de la medida de suspensión de giros.

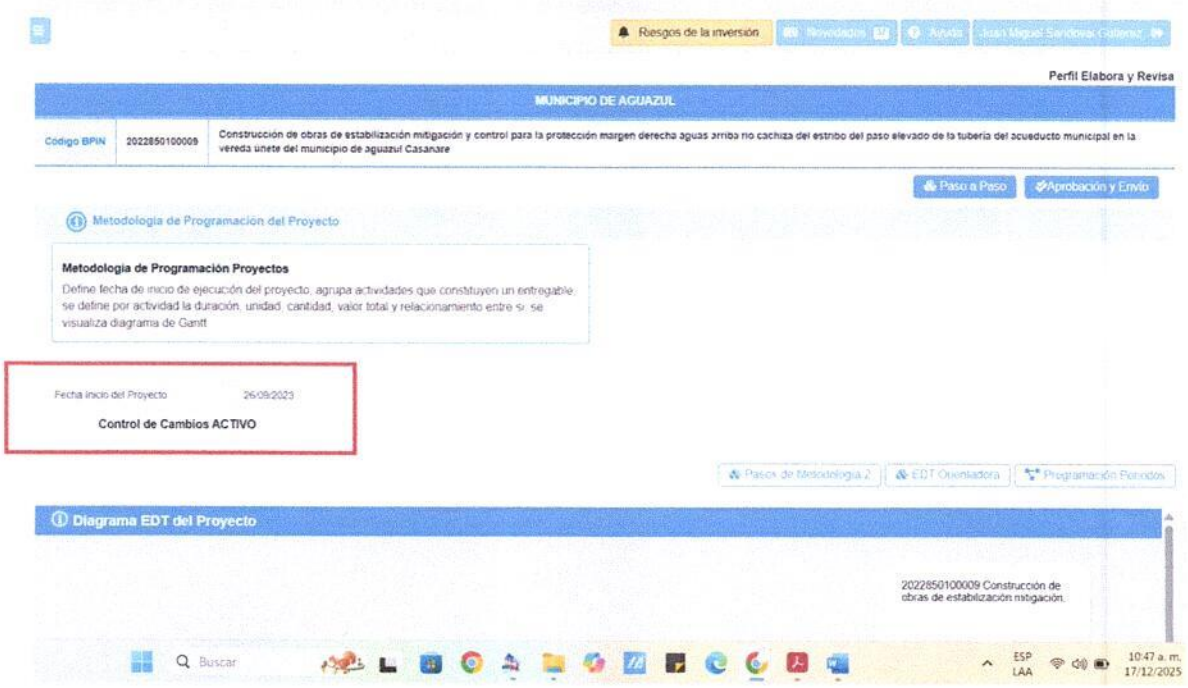

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0647 del 17 de julio de 2025

ACTIVIDAD 6.LAS DEMÁS DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR QUE SEAN INHERENTES AL OBJETO CONTRACTUAL

D/A: En atención al cumplimiento de esta actividad, y de acuerdo con la designación otorgada por el supervisor para el período comprendido entre el 1 y el 20 de diciembre de 2025, de acuerdo a la ejercicio de las competencias del municipio como entidad ejecutora, se proyectó resolución mediante la cual se da por terminado por no continuidad el proyecto BPIN 2020850100007, denominado "Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul, Casanare".

La decisión se fundamenta en lo dispuesto en la Ley 2056 de 2020, que regula la organización y funcionamiento del Sistema General de Regalías, la cual establece que los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR deberán ser objeto de seguimiento permanente y podrán ser finalizados anticipadamente cuando se evidencie la imposibilidad de continuar su ejecución, el incumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas o financieras, o la pérdida de pertinencia frente a los objetivos inicialmente aprobados.

En concordancia con lo anterior, y conforme a los lineamientos definidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la gestión, seguimiento y cierre de proyectos del SGR, se determinó que el proyecto en mención no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar su continuidad, razón por la cual se procede a adelantar el trámite administrativo correspondiente para su terminación y cierre definitivo.

Anexo pantallazo asistencia:

.

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0647 del 17 de julio de 2025

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	47442426
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 31B 43 21	TELÉFONO:	3212900
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de sistemas informático
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7996377223		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1964496638

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 178.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 7.500
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	

Radicación N° 2025121905624

Total días Del Recorrido: 3



Radicacion Aprobado

Fecha Entrada: 2025-12-19 a las 15:50:51
Fecha Salida: 2025-12-19 a las 15:50:51

Días por proceso: 0
Responsable: *YIBETH TORRES TORRES*
Observaciones: acta 7 terminación contrato 0647 de 2025.



Revision documental Aprobado

Fecha Entrada: 2025-12-19 a las 15:50:51
Fecha Salida: 2025-12-22 a las 11:07:02

Días por proceso: 3
Responsable: *YIBETH TORRES TORRES*
Observaciones: Sin Observaciones



Elaboración orden de pago Pendiente

Fecha Entrada: 2025-12-22 a las 11:07:02

Responsable: *KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY*
Observaciones: Sin Observaciones

