

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
1		**OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA, CONSISTENTE EN: 1. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES UBICADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO. 2.**	**75 días**	**jue 20/11/25**	**jue 19/02/26**		
2		INICIO	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		
3		**VEREDA SAMARIA PREDIO EL CARMEN**	**61 días**	**jue 20/11/25**	**mar 3/02/26**		**72**
4		**PRELIMINARES**	**5 días**	**jue 20/11/25**	**mar 25/11/2**		
5		CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	1 día	jue 20/11/25	jue 20/11/25		6;7
6		CAMPAMENTO 9 M2	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	5	
7		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA LINEAL	2 días	vie 21/11/25	sáb 22/11/25	5	8
8		DESMONTE DEL CERRAMIENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO)	2 días	lun 24/11/25	mar 25/11/25	7	9;71
9		LIMPIEZA Y PODA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	0 días	mar 25/11/25	mar 25/11/25	8	16
10		**CIMENTACION**	**33 días**	**mié 26/11/2**	**mar 6/01/26**		
11		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	8 días	vie 19/12/25	lun 29/12/25	50	12FC-5 días;14FC-6 días
12		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	3 días	mar 23/12/25	vie 26/12/25	11FC-5 días	13
13		VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	8 días	sáb 27/12/25	mar 6/01/26	12	23FC+3 días
14		ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	3 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25	11FC-6 días	15FC-2 días
15		PEDESTAL CONCRETO 3500 PSI 0.20X0.20 M	2 días	mar 23/12/25	mié 24/12/25	14FC-2 días	19
16		ACERO FIGURADO 60000 PS	5 días	mié 26/11/25	lun 1/12/25	9	20FC-2 días
17		**MAMPOSTERIA**	**53 días**	**sáb 29/11/2**	**mar 3/02/26**		

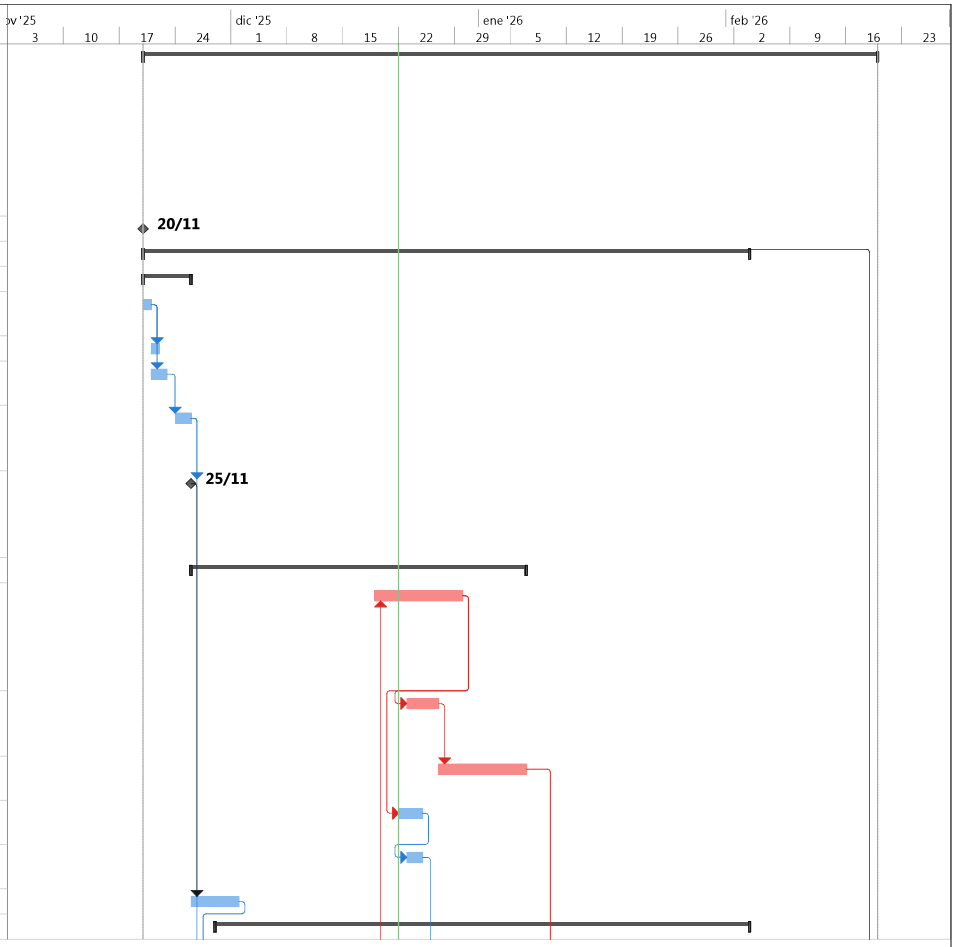

Proyecto: PROGRAMACION.mp
Fecha: lun 22/12/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
18		CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	15 días	mar 6/01/26	vie 23/01/26	19	
19		COLUMNAS 3500 PSI	8 días	vie 26/12/25	lun 5/01/26	20;15	18
20		ACERO FIGURADO 60000 PS	3 días	sáb 29/11/25	mar 2/12/25	16FC-2 días	19;21
21		PUERTA EN TUBO DE 2" CON MALLA ESLABONADA (VEHICULAR) INCLUYE PUERTA PEATONAL CON PASADOR Y CANDADO	3 días	mié 3/12/25	vie 5/12/25	20	
22		ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	5 días	jue 29/01/26	mar 3/02/26	23	
23		MURO EN LADRILLO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12M	15 días	sáb 10/01/26	mié 28/01/26	13FC+3 días	22;24FC-2 días
24		REMATE LINEAL MURO LADRILLO PRENSADO A LA VISTA	4 días	mar 27/01/26	vie 30/01/26	23FC-2 días	64
25		**VEREDA SAMARIA PREDIO VILLA PATRICIA**	**24 días**	**jue 20/11/25**	**jue 18/12/25**		**72**
26		**PRELIMINARES**	**6 días**	**jue 20/11/25**	**mié 26/11/2**		
27		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO OBRA LINEAL	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25		28;29;31
28		CAMPAMENTO 9 M2	1 día	mar 25/11/2	mar 25/11/2	27	
29		CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	2 días	mar 25/11/25	mié 26/11/25	27	
30		DEMOLICION DE VIGAS Y COLUMNAS	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		
31		DESMONTE DEL CERRAMIENTO EXISTENTE (INCLUYE RETIRO)	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	27	47;71
32		**CIMENTACION**	**0 días**	**jue 20/11/25**	**jue 20/11/25**		
33		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		

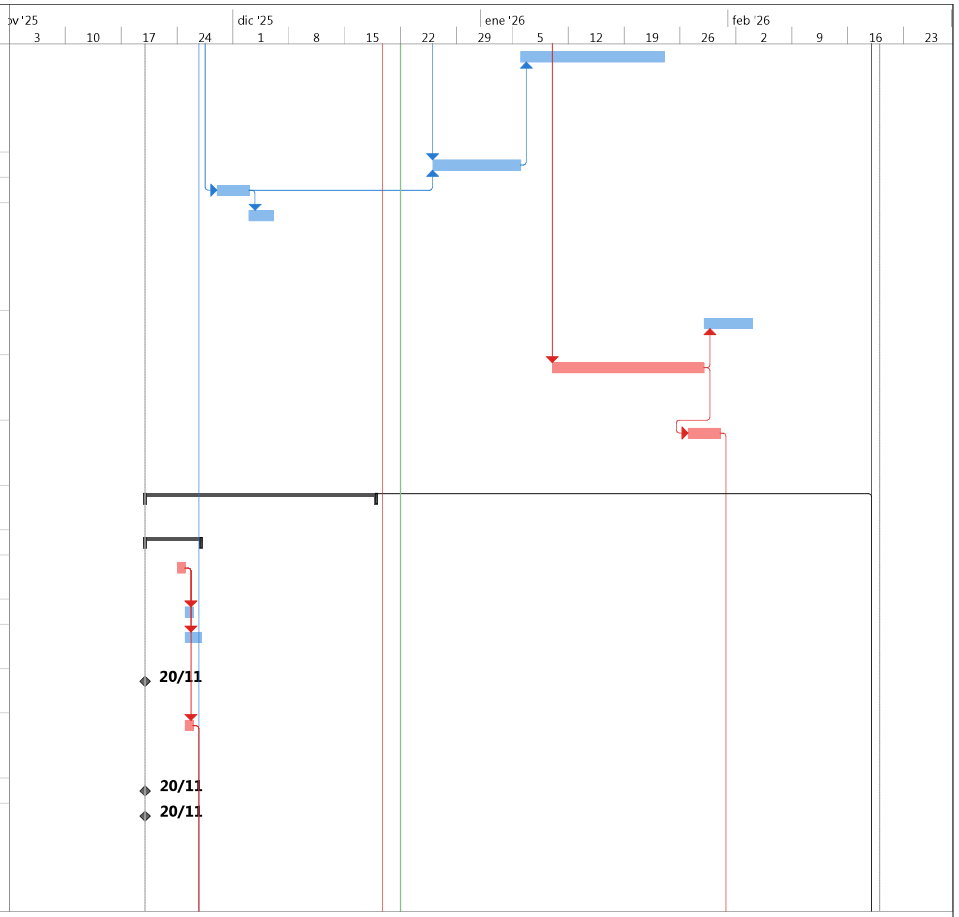

Proyecto: PROGRAMACION.mp
Fecha: lun 22/12/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
34		RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		
35		VIGA DE AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		
36		ZAPATAS EN CONCRETO 3500 PSI	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		
37		PEDESTAL CONCRETO 3500 PSI 0.20X0.20 M	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		
38		ACERO FIGURADO 60000 PS	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		70
39		**MAMPOSTERIA**	**19 días**	**jue 20/11/25**	**vie 12/12/25**		
40		CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	15 días	lun 24/11/25	jue 11/12/25	44FC-1 día	
41		CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10	10 días	jue 20/11/25	lun 1/12/25		
42		PUERTA EN TUBO DE 2" CON MALLA ESLABONADA INCLUYE PASADOR Y	6 días	mar 25/11/25	lun 1/12/25	44	
43		ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		
44		COLUMNAS 3500 PSI	4 días	jue 20/11/25	lun 24/11/25		40FC-1 día;42;46FC-2 d
45		MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		
46		ACERO FIGURADO 60000 PS	15 días	sáb 22/11/25	mié 10/12/25	44FC-2 días	
47		MURO EN LADRILLO PRENSADO TIPO SANTA FE E=0.12M	13 días	mié 26/11/25	jue 11/12/25	31	48FC-2 días;50FC-4 días
48		REMATE LINEAL MURO LADRILLO PRENSADO A LA VISTA	3 días	mié 10/12/25	vie 12/12/25	47FC-2 días	
49		**CERRAMIENTO**	**24 días**	**jue 20/11/25**	**jue 18/12/25**		
50		CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO DE ALTURA H=5.00M INCLUYE	10 días	sáb 6/12/25	jue 18/12/25	47FC-4 días	11
51		CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO DE ALTURA	0 días	jue 20/11/25	jue 20/11/25		
52		**PARQUES INFANTILES**	**16 días**	**sáb 31/01/2**	**mié 18/02/2**		**72**

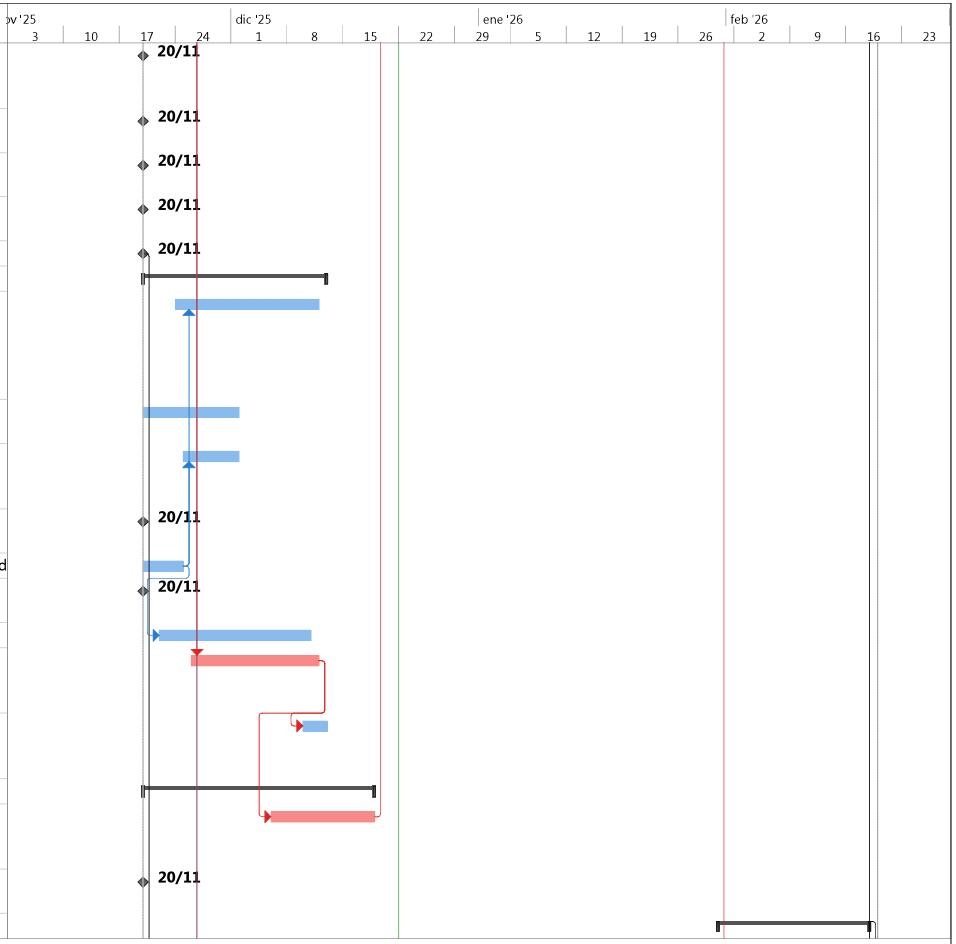

Proyecto: PROGRAMACION.mp
Fecha: lun 22/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
53		**ACTIVIADES**	**16 días**	**sáb 31/01/26**	**mié 18/02/26**		
54		PINTURA GENERAL TOTAL DOS COLORES VERDE Y AMARILLO (INCLUYE PLANTA ELECTRICA)	3 días	lun 2/02/26	mié 4/02/26	64FC-2 días	55;56;57;58
55		SUMINISTRO E INSTALALCIÓN COLUMPIOS COMPLETOS, CADENAS GALVANIZADAS, ACOPLES,	2 días	jue 5/02/26	vie 6/02/26	54	68
56		SUMINISTRO E INSTALACION MALLA MANILA	2 días	jue 5/02/26	vie 6/02/26	54	
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PELDAÑOS	3 días	jue 5/02/26	sáb 7/02/26	54	
58		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARALES	2 días	jue 5/02/26	vie 6/02/26	54	59
59		SUMINISTRO E INSTALCION DESLIZADERO DE 4.00 MTS EN FIBRA DE VIDRIO	3 días	sáb 7/02/26	mar 10/02/26	58	60;66
60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TRAPECIO	2 días	mié 11/02/26	jue 12/02/26	59	61
61		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAR DE	2 días	vie 13/02/26	sáb 14/02/26	60	62;63
62		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PAR DE	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	61	
63		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO GALVANIZADO PARA	2 días	lun 16/02/26	mar 17/02/26	61	65FC-3 días
64		DESMONTE ELEMENTOS VARIOS JUEGO MADERA	3 días	sáb 31/01/26	mar 3/02/26	24	54FC-2 días
65		REPARACIÓN MODULO JUEGOS MADERA SOLDADURAS	4 días	sáb 14/02/26	mié 18/02/26	63FC-3 días	
66		ACOPLES MODULO JUEGOS MADERA	4 días	mié 11/02/26	sáb 14/02/26	59	
67		**NO PREVISTOS**	**75 días**	**jue 20/11/25**	**jue 19/02/26**		
68		ANDÉN CONCRETO 3000 PSI EN SITIO E=0.1M (INTERNO-EXTERNO	10 días	sáb 7/02/26	mié 18/02/26	55	69FC-5 días
69		SARDINEL PREFABRICADO A-1	5 días	vie 13/02/26	mié 18/02/26	68FC-5 días	
70		ANCLAJE 1/2" L=50CM	5 días	jue 20/11/25	mar 25/11/25	38	

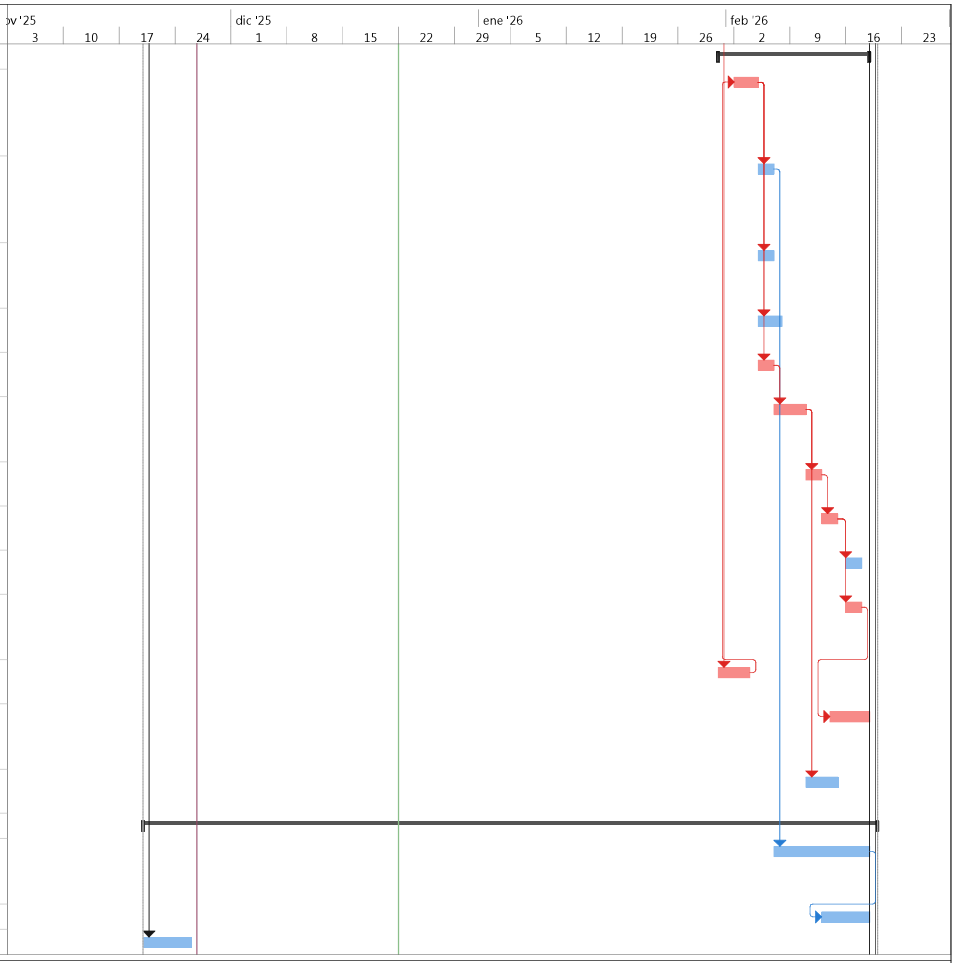

Proyecto: PROGRAMACION.mp
Fecha: lun 22/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Sucesoras
71		DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO E= 0.20 M APILE A 15	10 días	mié 26/11/25	sáb 6/12/25	8;31	
72		FIN	1 día	jue 19/02/26	jue 19/02/26	3;25;52	



Proyecto: PROGRAMACION.mp
Fecha: lun 22/12/25

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso	
