

Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
1				***CONTRATO 064 DEL 2025***	**122 día**	**vie 1/08/25**	**lun 19/01/26**	**$ 1.168.839.501...**	
2				***INICIO DE CONTRATO***	0 días	vie 1/08/25	vie 1/08/25		
3				***ACTIVIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA PALMIRA***	**105 días**	**mar 26/08/25**	**lun 19/01/26**	***$ 687.750.912,00***	
4				**Adecuación baño PMR**	**91 días**	**nar 26/08/25**	**nar 30/12/25**	**$ 32.511.983,00**	
5				INICIO DE ACTIVIDADES	0 días	nar 26/08/25	nar 26/08/25		
6	**2**	**PR-35**		Regatas en muros	1 día	jue 11/09/25	jue 11/09/25	$ 275.475,00	14CC-1 día
7	**3**	**IH-23**		Suministro e instalación de tapa registro de 15x15	1 día	nié 26/11/25	nié 26/11/25	$ 74.666,00	9
8	**4**	**PR-07**		Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	12 días	mar 26/08/25	mié 10/09/25	$ 3.006.484,00	5
9	**5**	**AC-1(**		Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	24 días	jue 23/10/25	mar 25/11/25	$ 6.131.121,00	8FC+30 días
10	**6**	**AC-11**		Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	3 días	mié 26/11/25	vie 28/11/25	$ 2.761.106,00	9
11	**7**	**PR-23**		Desmonte aparatos sanitarios	1 día	jue 11/09/25	jue 11/09/25	$ 570.368,00	8
12	**9**	**AP-03**		Suministro e instalación de lavamanos con pedestal Milano Blanco (incluye griferia)	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25	$ 370.168,00	
13	**10**	**AC-5(**		Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en	1 día	mié 17/12/25	mié 17/12/25	$ 383.890,00	12
14	**11**	**IH-01**		Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2"incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	1 día	vie 12/09/25	vie 12/09/25	$ 317.982,00	11
15	**12**	**IH-20**		Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2"incluye todos los elementos para su correcta instalación	1 día	mié 26/11/25	mié 26/11/25	$ 148.276,00	9

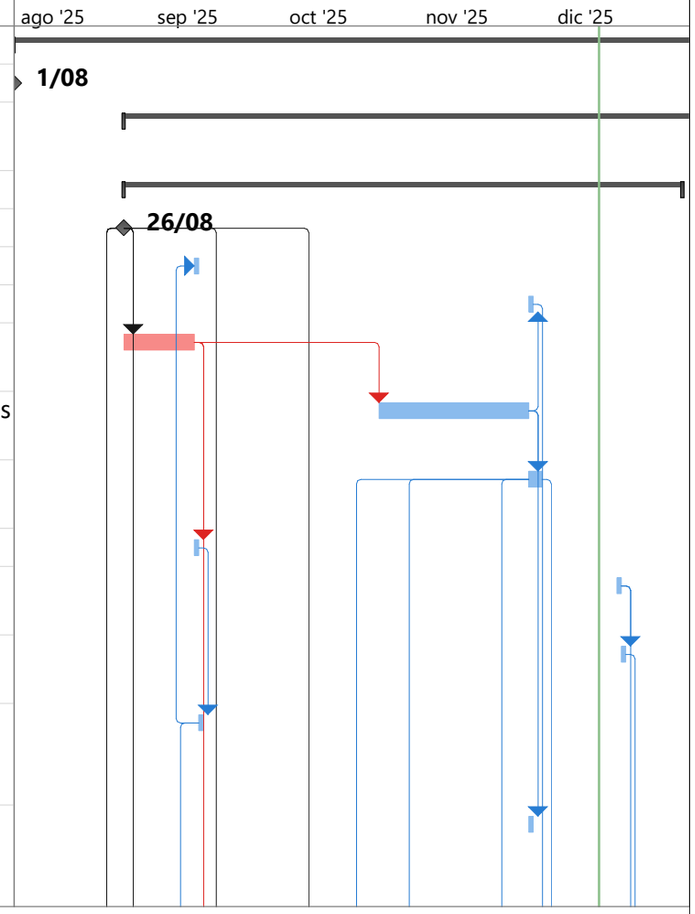

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
16	13	IH-06		Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2"incluye accesorios	1 día	vie 12/09/25	vie 12/09/25	$ 586.871,00	14CC
17	14	IH-07		Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1"incluye accesorios	0 días	vie 12/09/25	vie 12/09/25	$ 0,00	16CC
18	15	IH-12		Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	2 días	mié 10/09/25	jue 11/09/25	$ 353.115,00	16CC-2 días
19	16	AP-04		Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	1 día	mié 17/12/25	mié 17/12/25	$ 370.448,00	12
20	17	IH-19		Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	1 día	mié 26/11/25	mié 26/11/25	$ 108.686,00	7FC-1 día
21	18	IH-15		Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	1 día	jue 27/11/25	jue 27/11/25	$ 115.116,00	20
22	19	DI-22		Alistado piso 4cm mortero 1:3	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	$ 1.013.070,00	10CC-25 día
23	20	PR-31		Desmontar y retiro las divisiones de baño existentes	1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25	$ 431.148,00	22CC-15 días
24	21	PR-13		Corte de piso en concreto con pulidora	1 día	lun 20/10/25	lun 20/10/25	$ 328.720,00	22CC-2 días
25	23	VA-01		Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	1 día	jue 11/09/25	jue 11/09/25	$ 2.076.690,00	8
26	24	AC-47		suministro y aplicación estuco relleno muros	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$ 1.442.223,00	22
27	25	AC-50		suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	1 día	vie 28/11/25	vie 28/11/25	$ 991.188,00	21
28	26	AP-05		suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25	$ 1.337.014,00	27
29	27	AP-07		suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	1 día	jue 18/12/25	jue 18/12/25	$ 1.136.407,00	13

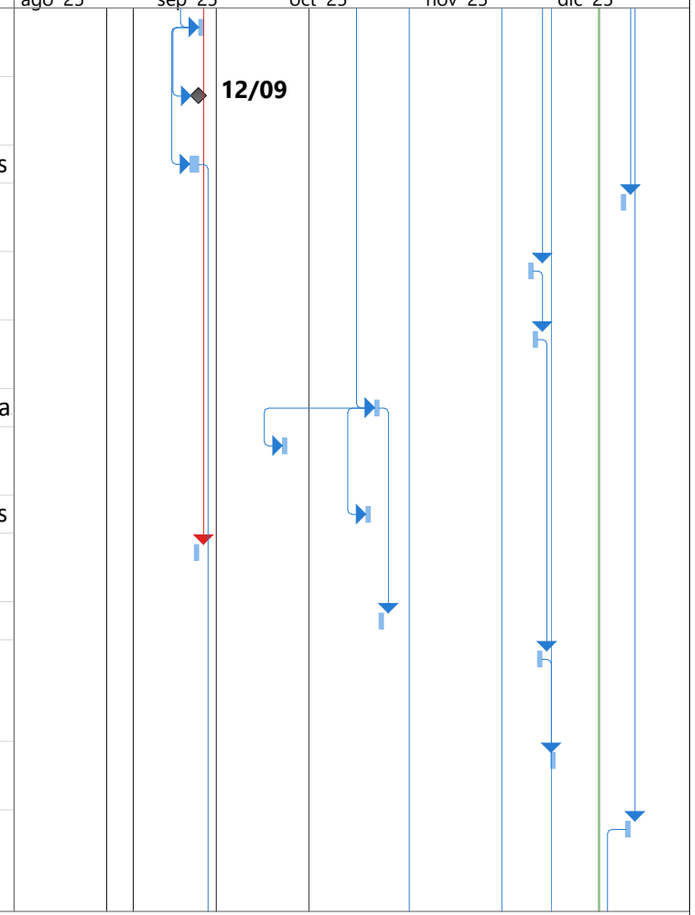

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
30	**28**	**AC-4**		Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	1 día	jue 18/12/25	jue 18/12/25	$ 276.297,00	29CC
31	**29**	**CA-2**		Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	2 días	vie 19/12/25	lun 22/12/25	$ 1.683.410,00	30
32	**30**	**CA-3**		Suministro e instalación de división en aluminio para baños de 1.21x2 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	3 días	mar 23/12/25	jue 25/12/25	$ 2.975.468,00	31
33	**31**	**CA-3**		suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	3 días	vie 26/12/25	mar 30/12/25	$ 2.993.848,00	32
34	**32**	**IH-11**		suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$ 252.728,00	10CC-2 días
35				FIN DE ACTIVIDADES	0 días	nar 30/12/25	nar 30/12/25		33
36				**Tratamiento impermeabilización terraza**	**105 día**	**nar 26/08/25**	**lun 19/01/26**	**$ 444.580.079,00**	
37				INICIO DE ACTIVIDADES	0 días	nar 26/08/25	nar 26/08/25		38CC
38	**33**	**PR-49**		Retiro de manto existente, incluye retiro de escombros	40 días	mar 26/08/25	lun 20/10/25	$ 31.875.000,00	5
39	**34**	**PR-47**		Lavada y destronque de terraza a máquina (para retirar material bituminoso)	59 días	lun 8/09/25	jue 27/11/25	$ 45.563.750,00	

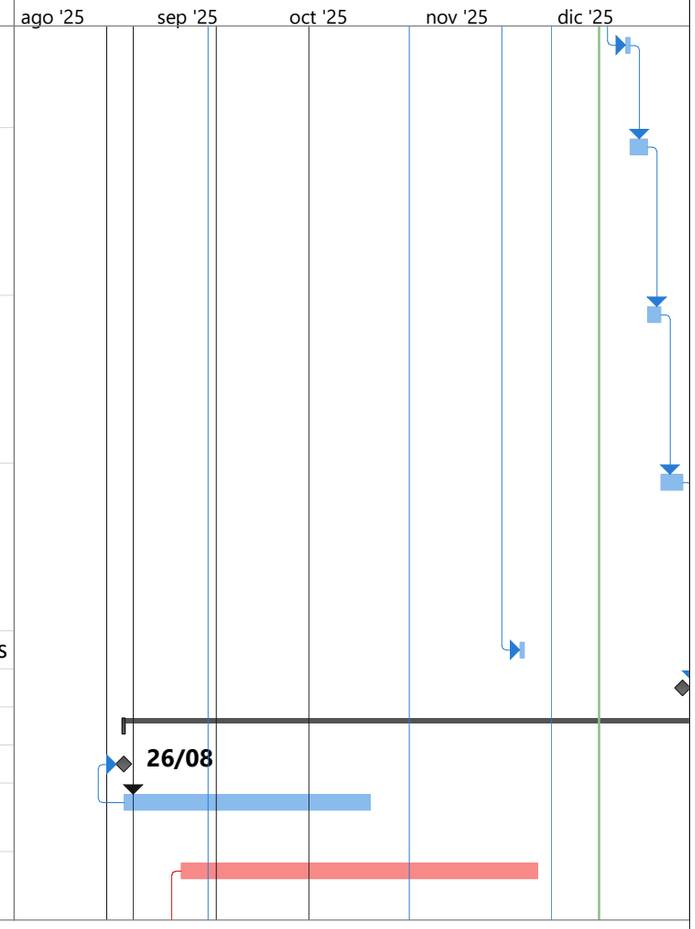

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
40	**35**	**DI-15**		Resane de superficie de losa, (agrietamiento y fisuras) con material sellador elástico de poliuretano	40 días	lun 3/11/25	vie 26/12/25	$ 14.643.000,00	39CC
41	**36**	**RI-24**		Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral altura 10cm (superficie con pendiente)	18 días	lun 8/12/25	mié 31/12/25	$ 15.419.950,00	40FC-15 días
42	**37**	**CC-2**		Suministro y aplicación de pintura sellante elongable autonivelante.	23 días	mié 10/12/25	vie 9/01/26	$ 0,00	41CC+2 días
43	**38**	**RI-08**		Suministro e instalación de membrana pvc (incluye perlines de fijación)	47 días	jue 16/10/25	vie 19/12/25	$ 284.311.755,00	39CC+28 días
44	**39**	**AC-1**		Suministro e instalación de enchape antideslizante	11 días	jue 25/12/25	lun 19/01/26	$ 52.766.624,00	43CC+50 día
45				FIN DE ACTIVIDADES	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26		44
46				**Arreglo y tratamiento de humedad en fachada Lateral**	**77 días**	**jue 2/10/25**	**vie 16/01/26**	**$ 74.255.147,00**	
47				INICIO DE OBRA	0 días	jue 16/10/25	jue 16/10/25		48
48	**40**	**PR-41**		Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	1 día	jue 16/10/25	jue 16/10/25	$ 0,00	49CC
49	**41**	**DI-26**		Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior	29 días	jue 16/10/25	vie 16/01/26	$ 26.665.980,00	43CC
50	**42**	**DI-27**		Suministro e instalación de placa en fibrocemento 10 mm, incluye masillada, filos, junta visible y pintura para exterior	41 días	jue 16/10/25	jue 11/12/25	$ 7.820.741,00	49CC
51	**43**	**VA-07**		Lavada de fachada con agua a chorro de aspersion con hipoclorito (incluye retiro de material extraño y piezas rotas)	7 días	jue 2/10/25	vie 10/10/25	$ 8.562.969,00	49CC-10 días

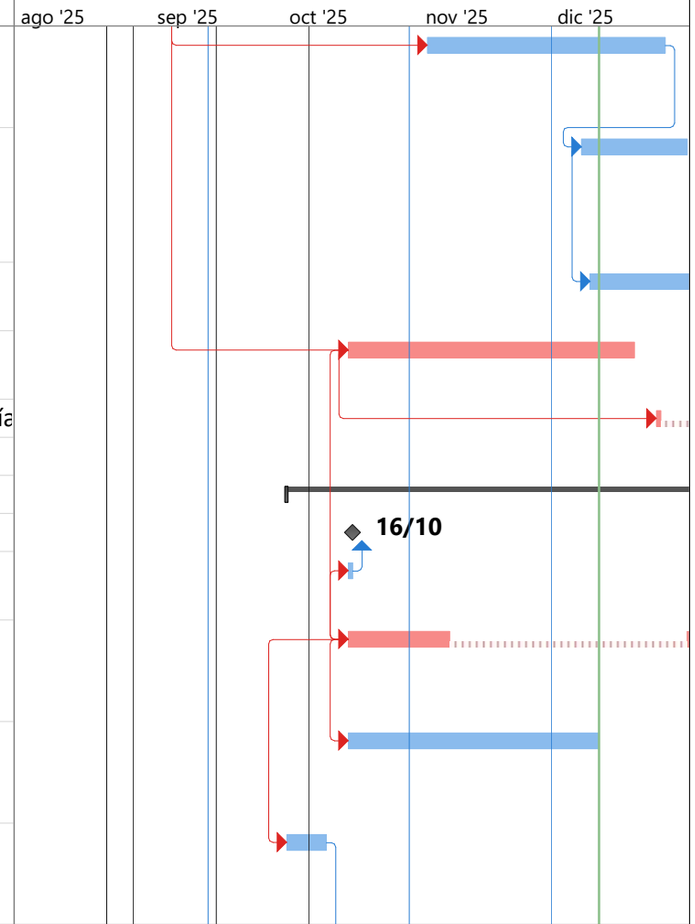

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
52	**44**	**AC-0**		Suministro y aplicación de pintura acrilica para exterior a 3 manos - tipo 1	4 días	lun 13/10/25	jue 16/10/25	$ 29.169.612,00	51
53	**45**	**RI-03**		Suministro e instalación de manto asfáltico con foil de aluminio (impermeabilización, incluye emulsión asfáltica)	8 días	mié 7/01/26	vie 16/01/26	$ 2.035.845,00	49FF
54				FIN DE OBRA	0 días	vie 16/01/26	vie 16/01/26		53
55				**Tratamiento humedades internas**	**24 días**	**nié 17/12/25**	**lun 19/01/26**	**$ 16.734.111,00**	
56				INICIO DE OBRA	0 días	nié 17/12/25	nié 17/12/25		57CC
57	**46**	**PR-01**		Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	14 días	mié 17/12/25	lun 5/01/26	$ 889.850,00	53CC-15 días
58	**47**	**RI-09**		Suministro y aplicación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	10 días	mar 6/01/26	lun 19/01/26	$ 4.254.216,00	57
59	**48**	**AC-0**		Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	6 días	mié 7/01/26	mié 14/01/26	$ 4.742.342,00	58CC+1 día
60	**49**	**AC-4**		Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)(Incluye filos y dilataciones)	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	$ 6.847.703,00	59
61				FINDE OBRA	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26		60
62				**otros**	**105 día**	**nar 26/08/25**	**lun 19/01/26**	**$ 75.723.386,00**	
63				INICIO DE OBRA	0 días	mar 4/11/25	mar 4/11/25		
64	**50**	**DI-28**		Suministro e instalación de fachaleta similiar a la existente, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y aplicación de hidrófugo	4 días	mar 4/11/25	vie 7/11/25	$ 3.202.980,00	63CC
65	**51**	**CA-0**		Desmonte de puerta metálica	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 331.477,00	

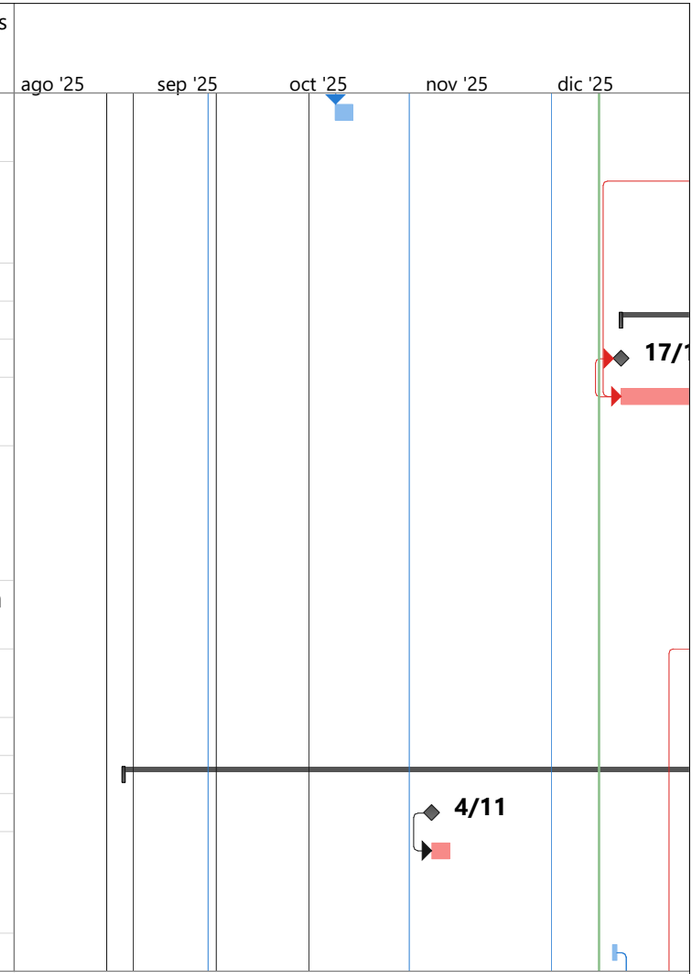

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
66	**52**	**SH-18**		Suministro e instalación de puerta corta fuego para la subestación eléctrica -Resistencia al fuego de 180 minutos bajo la norma americana norma UL10B-UL10C con Bisagra en acero de 4 ½" con balineras, manija de apertura exterior certificada UL, barra antip	3 días	mar 16/12/25	jue 18/12/25	$ 16.001.919,00	65
67	**53**	**CA-45**		Suministro e instalación de reja metalica (puerta) metálica tubular 1"x1"x 1,2mm con parales de en tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm x 6m estructural HR50, incluye marco, perforación de muro, resanes, base o platina para pared, cerradura argolla para canda	3 días	vie 12/09/25	mar 16/09/25	$ 779.663,00	18
68	**54**	**CA-1(**		Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir	11 días	mié 17/09/25	mié 1/10/25	$ 1.684.620,00	67
69	**55**	**PR-27**		Demolición muro en ladrillo (incluye retiro)	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25	$ 392.856,00	68
70	**56**	**AC-21**		Fundición de concreto estampado con color, espesor 10cm , incluye nivelación de piso y malla (color y diseño a definir en sitio)	13 días	jue 1/01/26	lun 19/01/26	$ 2.774.106,00	59FC-10 días
71	**57**	**CA-4(**		Mantenimiento de pasamanos existente, incluye lijada, masilla de relleno y acaabdo de pintura 3 en 1)	20 días	jue 2/10/25	mié 29/10/25	$ 12.544.266,00	68

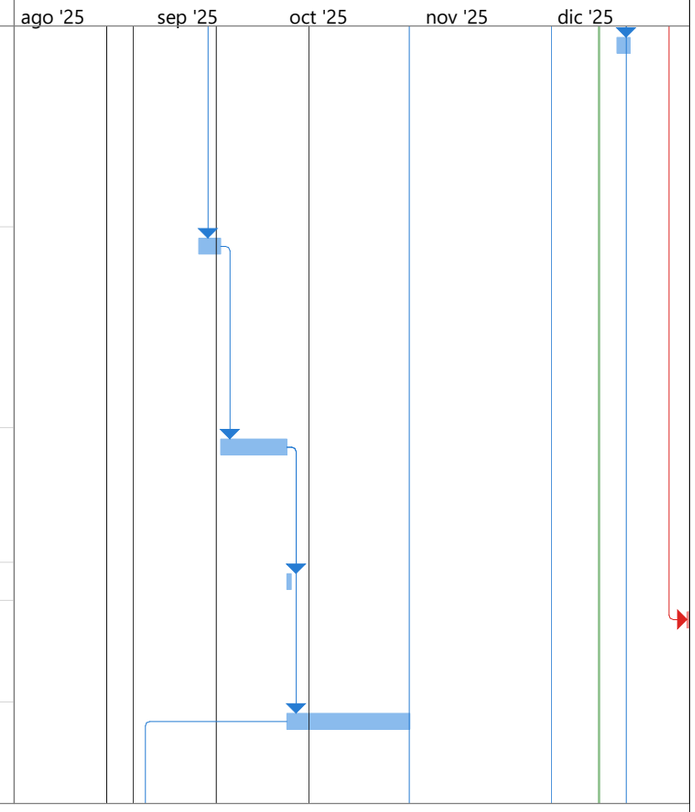

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
72	58	CA-20		Mantenimiento de reja metalica, incluye desmonte, cepillado, limpieza del elemento, cambio de partes afectadas, cambio de chapa donde se requiera, aplicación de pintura epóxica y todo lo necesario para su correcta instalación	12 días	jue 4/09/25	vie 19/09/25	$ 23.341.059,00	71CC-20 días
73	59	CA-47		Suministro e instalación de reja metálica tubular 1"x1"x 1,2mm con parales de en tubo rectangular 90 x 50 x 2.0mm x 6mestructural HR50, incluye soldadura, acabado con pintura 3 en 1 y todo lo necesario para su correcta instalación	0 días	jue 4/09/25	jue 4/09/25	$ 0,00	72CC
74	60	CA-48		Desmonte y retiro de vidrio existente	2 días	lun 22/12/25	mar 23/12/25	$ 181.421,00	
75	61	CA-49		Suministro e instalación de vidrio templado de seguridad 5 mm	2 días	mié 24/12/25	jue 25/12/25	$ 1.077.427,00	74
76	62	VA-05		Aseo general.	41 días	mar 26/08/25	mar 21/10/25	$ 8.824.974,00	5
77	63	PR-13		Corte de piso en concreto con pulidora	1 día	mié 22/10/25	mié 22/10/25	$ 98.616,00	76
78	64	PR-07		Demolición enchape de piso, incluye retiro de sobrantes	1 día	jue 23/10/25	jue 23/10/25	$ 403.360,00	77
79	65	PR-24		Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25	$ 745.964,00	78
80	66	PR-48		Relleno con rocamuerta 95% PM	1 día	lun 27/10/25	lun 27/10/25	$ 405.328,00	79
81	67	DI-09		Contrapiso en concreto e=0,10m	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 1.099.960,00	80
82	68	DI-22		Alistado piso 5cm mortero 1:3	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$ 559.650,00	81
83	69	AC-64		Suministro e instalación de piso en tableta de gress estoraque de 7cms x 24cms, incluye fragua en mortero y sellador de piso, según diseño similar en sitio	1 día	jue 30/10/25	jue 30/10/25	$ 1.273.740,00	82

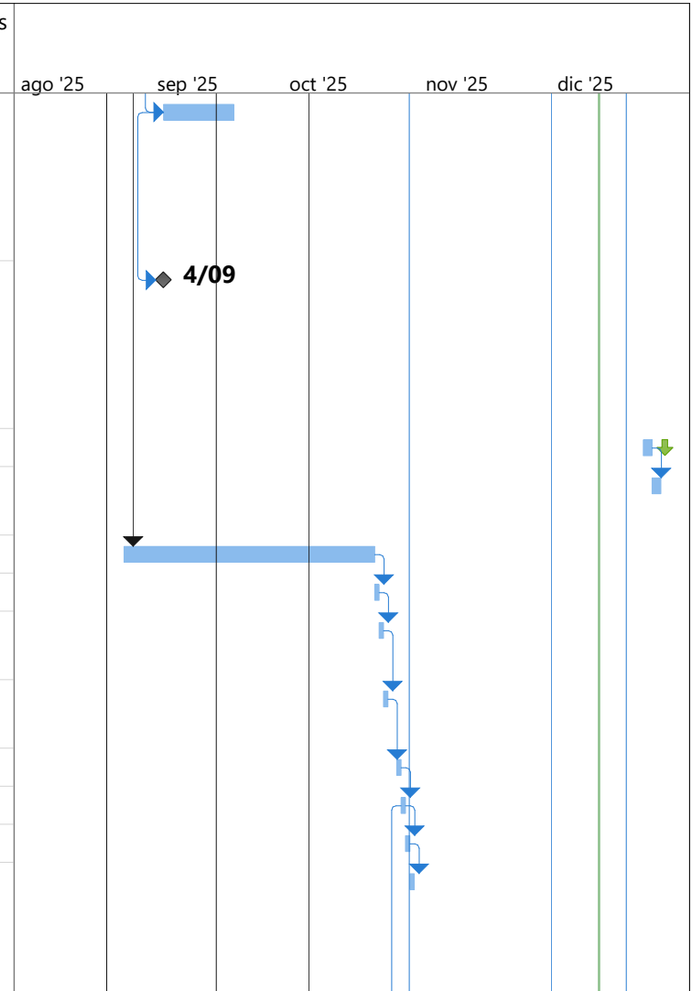

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
84				FIN DE OBRA	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26		70
85				**ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE**	**25 días**	**lun 3/11/25**	**vie 5/12/25**	**$ 43.946.206,00**	
86				INICIO DE OBRA	0 días	mar 4/11/25	mar 4/11/25		87
87	1,03	PR-26		Demolición mesones en concreto	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	$ 265.569,00	5CC+50 días
88	1,05	PR-28		Demolición de cielo raso	1 día	mié 5/11/25	mié 5/11/25	$ 734.475,00	87
89	1,18	DI-12		Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.	7 días	jue 6/11/25	vie 14/11/25	$ 1.994.174,00	88
90	3,05	DI-02		Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$ 595.333,00	89CC
91	1,14	DI-05		Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$ 855.620,00	90CC
92	1,15	DI-04		Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	1 día	jue 6/11/25	jue 6/11/25	$ 684.055,00	91CC
93	48;	IE-06		Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 720.455,00	92
94	49;	IE-01		Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos de Certificado_RETIE_	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 1.189.695,00	93CC

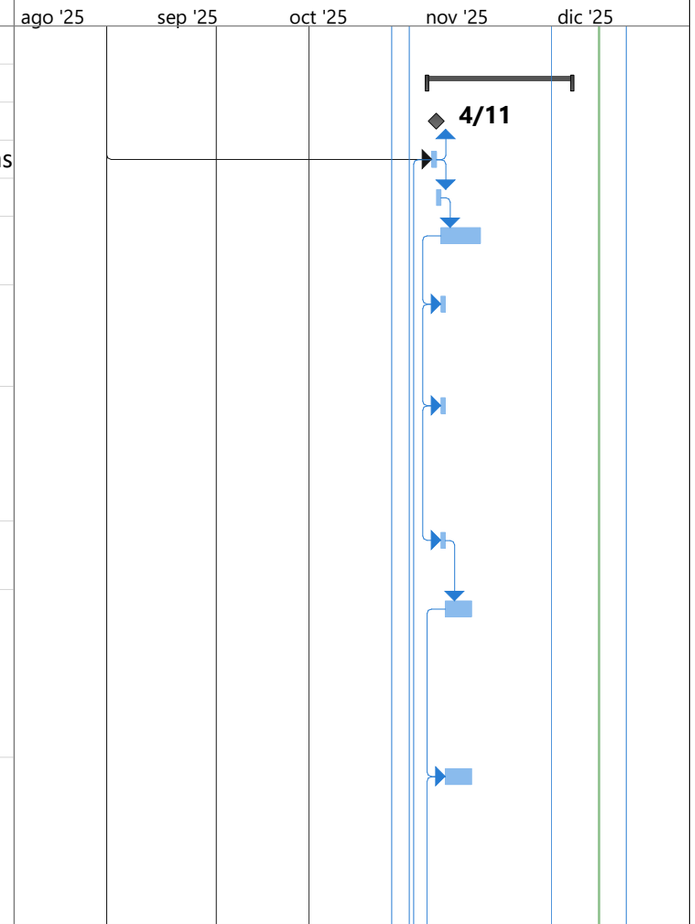

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
95	50;	IE-07		Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 174.840,00	94CC
96	51;	IE-02		Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 549.090,00	95CC
97	52;	IE-03		Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 1.808.468,00	96CC
98	53;	IE-50		Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 406.450,00	97CC
99	54;	IE-04		Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 110.255,00	98CC
100	55;	IE-22		Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 205.515,00	99CC
101	56;	IE-05		Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 610.220,00	100CC
102	57;	IE-16		Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	4 días	vie 7/11/25	mié 12/11/25	$ 3.195.955,00	101CC
103	58;	IE-23		Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	2 días	vie 7/11/25	lun 10/11/25	$ 554.127,00	102CC
104	1,4;	IE-11		Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de	2 días	mar 11/11/25	mié 12/11/25	$ 300.345,00	103

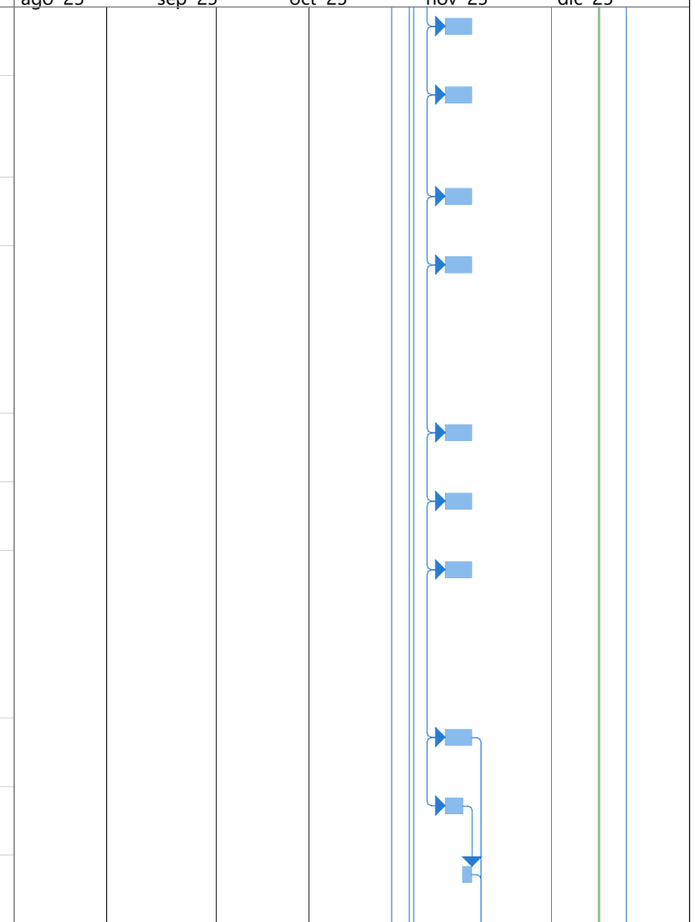

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
105	7;	CC-14		Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	2 días	jue 13/11/25	vie 14/11/25	$ 11.955.408,00	102
106	8;	CC-17		Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	1 día	lun 17/11/25	lun 17/11/25	$ 4.969.730,00	105
107	1,5(	IE-09		Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	1 día	jue 13/11/25	jue 13/11/25	$ 916.380,00	104
108	1,2	IH-09		suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	2 días	lun 3/11/25	mar 4/11/25	$ 434.824,00	81CC-22 día
109	1,3(	AP-02		Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	1 día	lun 1/12/25	lun 1/12/25	$ 719.169,00	10
110	23;	RI-04		Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	25 días	lun 3/11/25	vie 5/12/25	$ 9.996.054,00	10CC-20 días
111				FIN DE OBRA	0 días	vie 5/12/25	vie 5/12/25		110
112				***ACTIVIDADES SEDE FAMILIA - PALMIRA***	**103 día**	**nar 26/08/25**	**jue 15/01/26**	***$ 218.800.383,00***	
113				**Cubierta**	**81 días**	**nar 26/08/25**	**nar 16/12/25**	**$ 150.161.302,00**	
114				INICIO DE OBRA	0 días	nar 26/08/25	nar 26/08/25		
115	1	PR-62		Desmonte de teja en policarbonato , incluye estructura en mal estado y respectivo retiro	3 días	mar 9/09/25	jue 11/09/25	$ 2.901.627,00	5CC+10 días
116	2	PR-63		Desmonte de teja termoacustica , incluye retiro	1 día	mar 9/09/25	mar 9/09/25	$ 0,00	115CC
117	3	DI-16		Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	25 días	vie 12/09/25	jue 16/10/25	$ 956.480,00	115

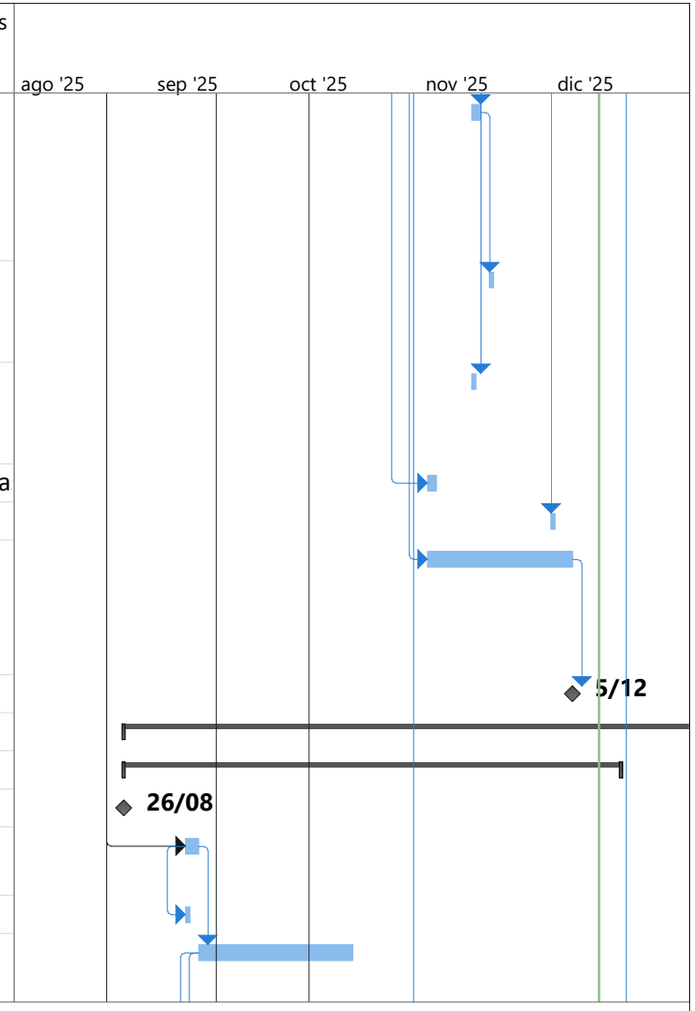

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
118	4	CC-2		Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 12cm a 15 cm de alto x 30 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos	25 días	mar 16/09/25	lun 20/10/25	$ 1.979.516,00	117CC+2 días
119	5	CC-2		Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x100 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	1 día	mar 16/09/25	mar 16/09/25	$ 0,00	118CC
120	6	CC-1		Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	20 días	vie 12/09/25	jue 9/10/25	$ 24.788.808,00	117CC
121	7	CC-1		Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	20 días	vie 12/09/25	jue 9/10/25	$ 47.744.208,00	120CC
122	8	CC-1		Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementosa de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	10 días	vie 10/10/25	jue 23/10/25	$ 39.659.474,00	121
123	9	PR-12		Demolición muro existente incluye retiro	1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25	$ 198.421,00	122CC
124	10	PR-46		Retiro de manto impermeabilizante foil	1 día	vie 19/09/25	vie 19/09/25	$ 626.868,00	123CC-15 dí
125	11	DI-24		Fabricación muro en mamposteria e:10cm	1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25	$ 1.993.242,00	124

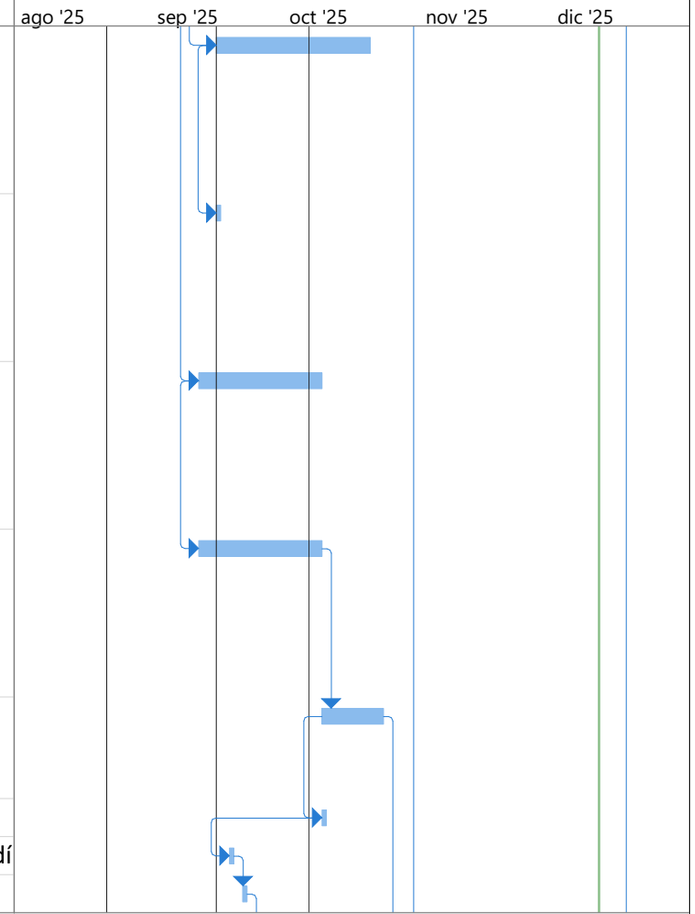

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
126	12	RI-01		Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm	1 día	mar 23/09/25	mar 23/09/25	$ 1.063.334,00	125
127	13	DI-22		Alistado piso 4cm mortero 1:3	1 día	mié 24/09/25	mié 24/09/25	$ 1.093.893,00	126
128	14	RI-24		Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)	1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25	$ 1.436.258,00	127
129	15	PR-64		Sumnistro e instalación de cubierta provisional en plastico o lona, incluye cuerda perimetral,alambre, bastidor y todo lo necesario para su correcta instalación y su posterior retiro.	1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25	$ 3.795.077,00	128CC
130	16	CC-1		Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, ancho entre 30 y 45 cm ,incluye platina para soporte cana y todo lo necesario para su correcta instalación	1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25	$ 0,00	129CC
131	17	CC-2		Suministro e instalación de caballete para teja upvc 2.5 mm, incluye accesorios para su correcta instalación	2 días	vie 24/10/25	lun 27/10/25	$ 1.646.441,00	122
132	18	PR-05		Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 4", incluye retiro	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 386.800,00	131
133	19	IH-03		Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$ 436.863,00	132
134	20	CC-2		Suministro e instalación de gárgolas prefabricadas cuyas medidas son 8 x12x 21 cm , incluye todo lo necesario correcta instalación)	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$ 0,00	133CC

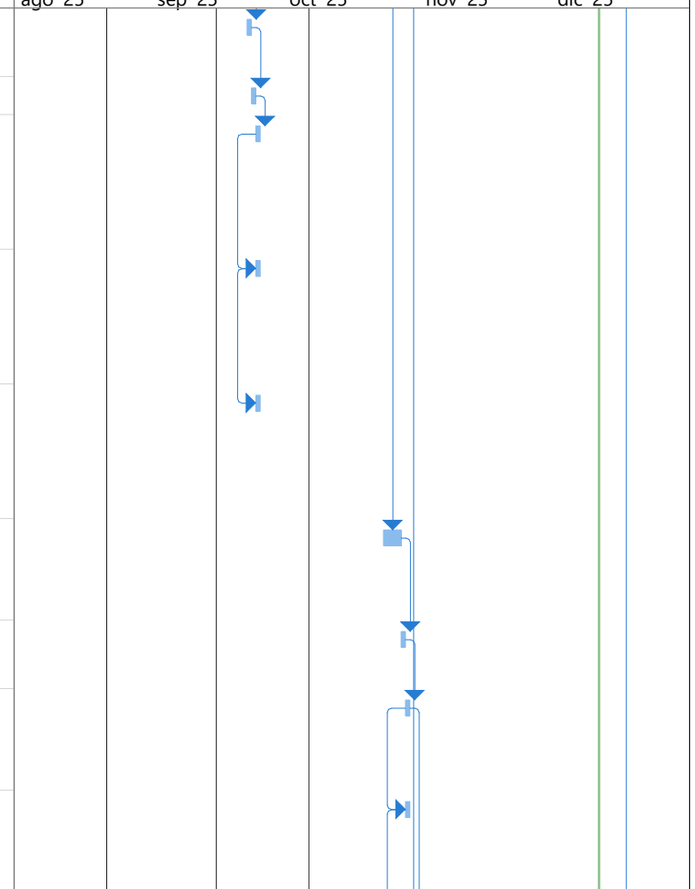

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
135	21	CC-2		Sumnistro e instalación de frescasa, incluye malla en alambre galvanizado de 20 cm x 20cm	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$ 0,00	134CC
136	22	RI-03		Suministro e instalación de manto asfáltica Foil de aluminio adhesivo	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25	$ 1.163.340,00	65
137	23	RI-04		Suministro e instalación de membrana líquida impermeabilizante para cubiertas y terrazas, con base en tecnología poliuretano acrílico base agua mejorado.	3 días	jue 30/10/25	lun 3/11/25	$ 18.290.652,00	133
138				FIN DE OBRA	0 días	nar 16/12/25	nar 16/12/25		136CC
139				**Arreglo Fachada (acceso)**	**50 días**	**mar 4/11/25**	**lun 12/01/26**	**$ 14.239.944,00**	
140				INICIO DE OBRA	0 días	mar 4/11/25	mar 4/11/25		141
141	24	PR-50		Malla sombra, elemento de protección perimetral para mitigar el riesgo de caída de herramientas o materiales.	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	$ 91.256,00	137
142	25	PR-41		Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	7 días	mié 5/11/25	jue 13/11/25	$ 67.140,00	141
143	26	PR-41		Desmonte de placa en fibrocemento (superboard)	7 días	mié 5/11/25	jue 13/11/25	$ 577.606,00	142CC
144	27	DI-21		Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y	30 días	mié 19/11/25	mar 30/12/25	$ 578.340,00	143FC+3 días
145	28	DI-21		Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye estructura, masillada, filos y pintura para exterior 2 manos	33 días	mié 19/11/25	vie 2/01/26	$ 6.157.111,00	144CC
146	29	AC-0		Suministro e instalación de perfil de dilatación tipo U	33 días	mié 19/11/25	vie 2/01/26	$ 410.790,00	145CC

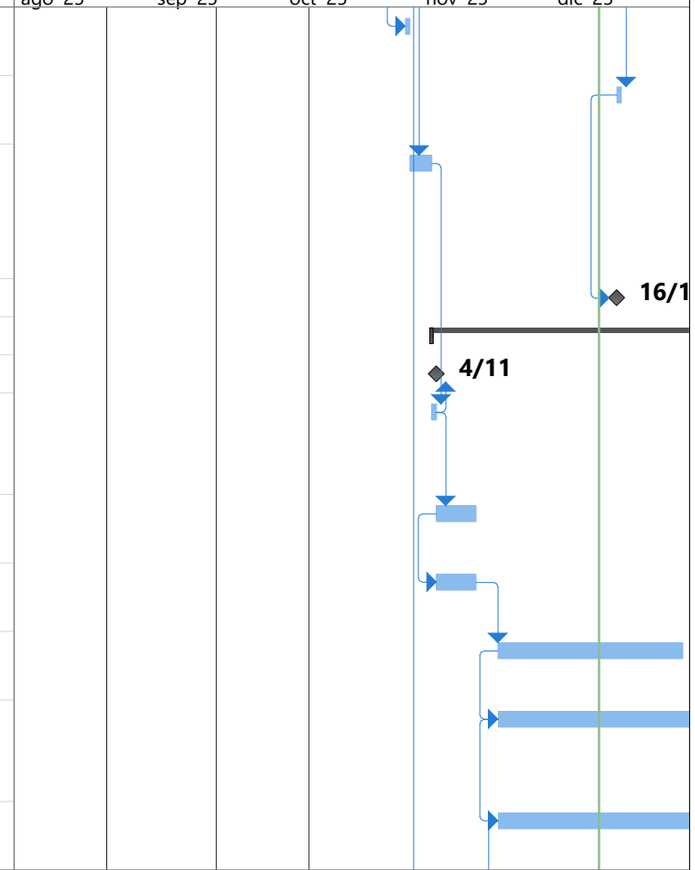

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
147	**30**	**CA-4**		Suministro e instalación de alfajía metálica, incluye desmonte de ventana, retiro de alfajia en mal estado, e instalación de nueva alfajia	5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25	$ 450.822,00	146CC
148	**31**	**VA-0**		suministro y aplicación de adhesivo y/o sellador para exterior para elemento metálica	10 días	lun 15/12/25	vie 26/12/25	$ 2.044.753,00	147CC
149	**32**	**PR-01**		Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	6 días	lun 15/12/25	lun 22/12/25	$ 232.552,00	148CC
150	**33**	**AC-0**		Suministro y aplicación de estuco plástico	14 días	nar 23/12/25	vie 9/01/26	$ 1.279.403,00	149
151	**34**	**VA-0**		Suministro y aplicación de pintura acrilica a tres manos para exterior Tipo 1 - incluye filos y dilataciones	14 días	mié 24/12/25	lun 12/01/26	$ 2.350.171,00	150CC+1 día
152				FIN DE OBRA	0 días	lun 12/01/26	lun 12/01/26		151
153				**Cuarto de residuos solidos**	**17 días**	**nié 24/12/25**	**jue 15/01/26**	$ 16.044.016,00	
154				INICIO DE OBRA	0 días	nié 24/12/25	nié 24/12/25		155
155	**35**	**DI-16**		Suministro e instalación de bases en concreto de 20 cm x 20 cm fundidos sobre losa de terraza	1 día	mié 24/12/25	mié 24/12/25	$ 136.640,00	151CC
156	**36**	**CC-2**		Suministro e instalación de platina 3/8 cuyas medidas oscilan entre 10cm a 15 cm de alto x 15 a 20 cm de ancho, incluye materiales complementarios de conexión, , corte, soldadura, anclajes, cartelas, tornillos	1 día	jue 25/12/25	jue 25/12/25	$ 396.912,00	155
157	**37**	**CC-1**		Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 100 cm x 50 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	2 días	vie 26/12/25	lun 29/12/25	$ 2.570.691,00	156

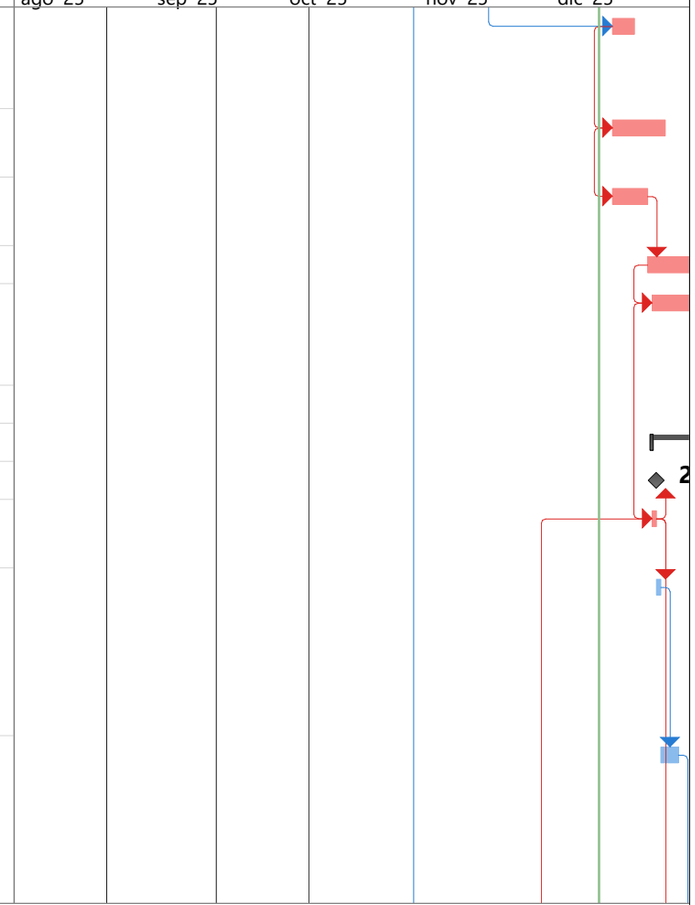

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
158	38	CC-1		Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta en tubería 80 cm x 40 cm calibre 2 mm, incluye soldadura, corte, tornillos pintura 3 en 1 y accesorios necesarios para su correcta instalación	2 días	mar 30/12/25	mié 31/12/25	$ 5.806.728,00	157
159	39	CC-1		Suministro e instalación de teja UPVC Translucida (Incluye elementos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)	1 día	jue 1/01/26	jue 1/01/26	$ 1.609.680,00	158
160	40	CC-1		Suministro e instalación de Canal en lamina galvanizada cal 22, incluye platina para soporte cana y todo lo necesario para su correcta instalación	1 día	jue 1/01/26	jue 1/01/26	$ 409.822,00	159CC
161	41	CC-0		Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	1 día	vie 2/01/26	vie 2/01/26	$ 387.568,00	160
162	42	IH-03		Suministro e instalación tubería sanitaria PVC 4", incluye accesorios para su correcta instalación y elementos de fijación	1 día	lun 5/01/26	lun 5/01/26	$ 187.227,00	161
163	43	RI-24		Suministro y aplicación de mortero 1:3 con aditivo impermeabilizante espesor 5cm incluye media caña en mortero perimetral (superficie con pendiente)	6 días	mar 6/01/26	mar 13/01/26	$ 766.592,00	162
164	44	AC-4		Suministro y aplicación de pintura epoxica (2 capas)	1 día	mié 14/01/26	mié 14/01/26	$ 2.411.276,00	163
165	45	CA-1		Instalación de puerta existente en aluminio 2,40 mt x2,80 mt), incluye todo lo necesario para su correcta instaalción	1 día	jue 15/01/26	jue 15/01/26	$ 163.434,00	164

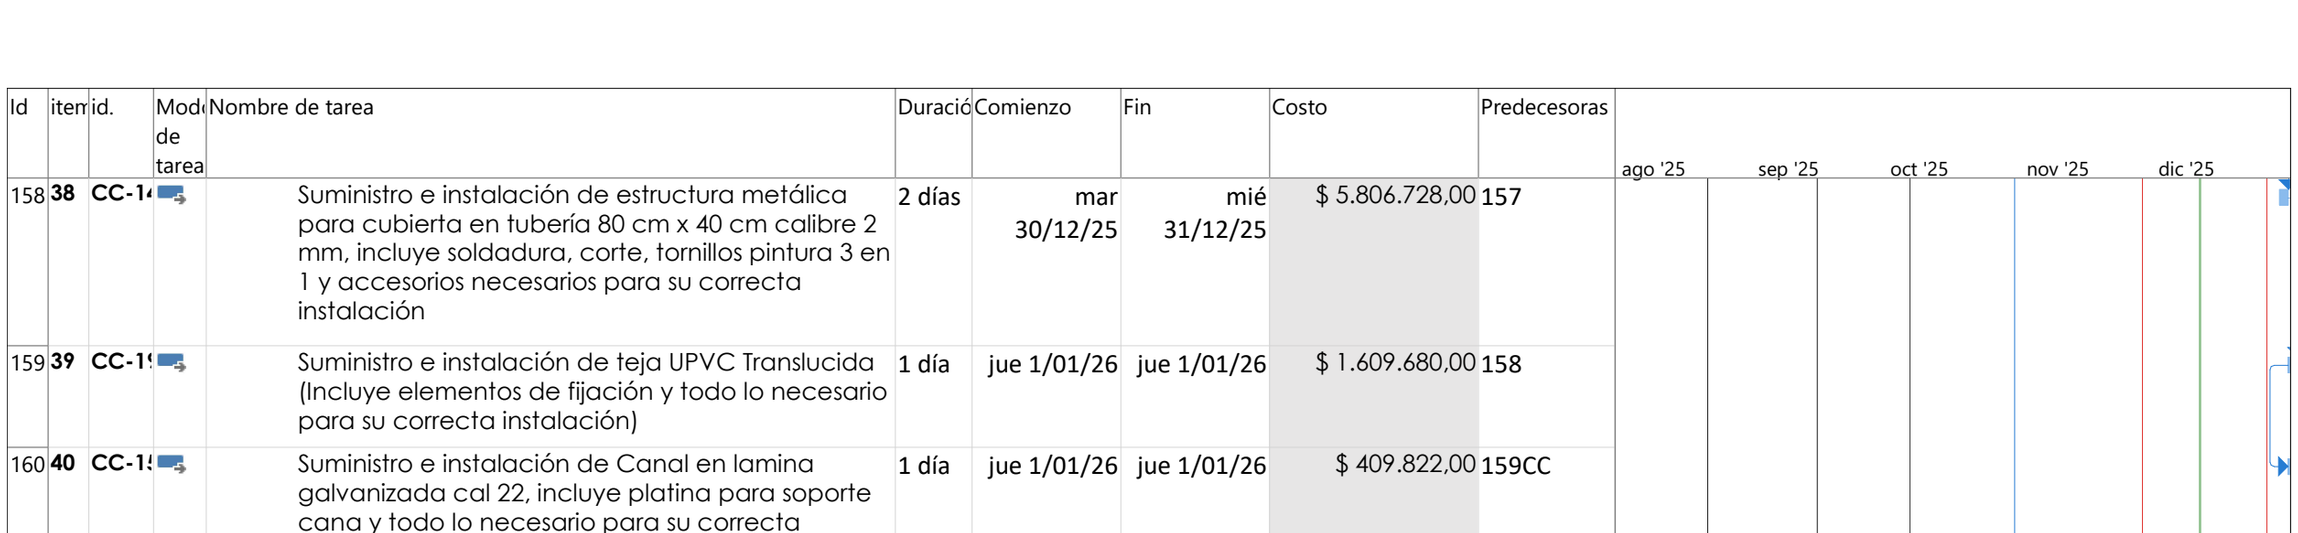

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
166	46	AC-1(		Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	1 día	jue 15/01/26	jue 15/01/26	$ 373.311,00	165CC
167	47	DI-21		Suministro e instalación de placa en fibrocemento 8mm, incluye masillada, filos y	1 día	jue 8/01/26	jue 8/01/26	$ 824.135,00	166CC-5 días
168				FIN DE OBRA	0 días	jue 15/01/26	jue 15/01/26		166CC
169				**Adecuaciones Electricas**	**10 días**	**jue 25/12/25**	**mié 7/01/26**	$ 11.346.514,00	
170				ANICIO DE OBRA	0 días	jue 25/12/25	jue 25/12/25		171CC
171	48	IE-06		Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 1.008.637,00	155
172	49	IE-01		Suministro e instalación Canaleta 100 mm x 45 mm Plástica con división. Blanco PVC auto extinguible y Resistente a impactos hasta de 1 kg, Humedad, Aceites y Químicos., con sus respectivos elementos deCertificado_RETIE_	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 1.189.695,00	171CC
173	50	IE-07		Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 874.200,00	172CC
174	51	IE-02		Suministro e instalación troquel para toma regulada, toma normal y toma de datos, incluye accesorios para su correcta instalación	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 768.726,00	173CC
175	52	IE-03		Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A libre de halógeno LSZH	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 1.808.468,00	174CC

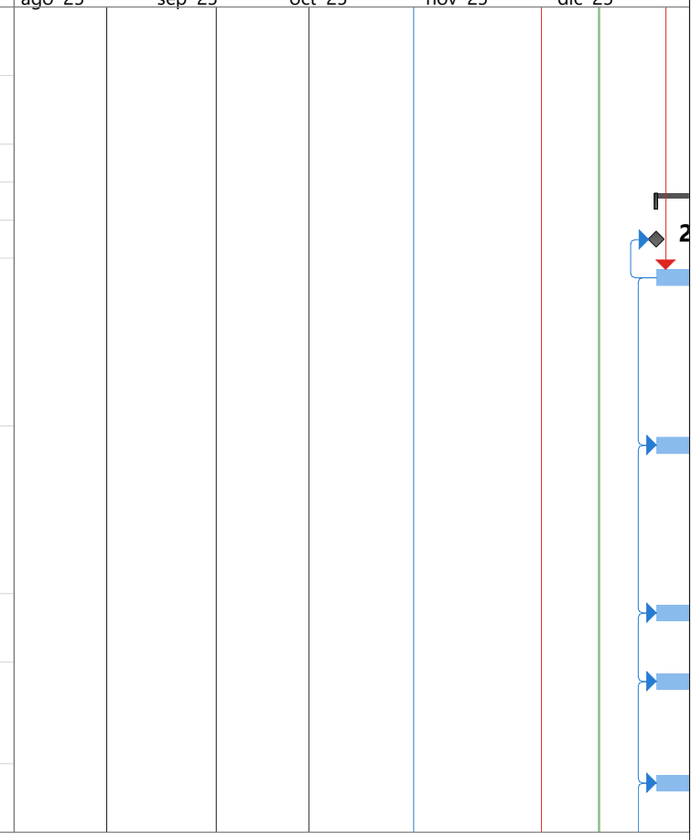

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
176	**53**	**IE-50**		Suministro e instalación de toma hembra tipo jack rj 45 cat 6ª, utp, para puesto de trabajo o herraje. (incluye jacks rj45 cat. 6a amp, ponchada, maquillado y accesorios necesarios para su instalación)	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 650.320,00	175CC
177	**54**	**IE-04**		Suministro e instalación de faceplate de 1 salida (SOLO DATOS)	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 154.357,00	176CC
178	**55**	**IE-22**		Suministro e instalación de patch cord 1.5mts CAT 6A	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 287.721,00	177CC
179	**56**	**IE-05**		Suministro e instalación de salida eléctrica red regulada en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 rojo, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra aislado	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 854.308,00	178CC
180	**57**	**IE-16**		Suministro, instalación y configuración de Switch 24 puertos 10Base-T/100Base-T/1000Base-T	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 3.195.955,00	179CC
181	**58**	**IE-23**		Suministro e instalación de patch panel de 24 puestos cat. 6a (incluye elementos de fijación)	10 días	jue 25/12/25	mié 7/01/26	$ 554.127,00	180CC
182				FIN DE OBRA	0 días	mié 7/01/26	mié 7/01/26		181
183				**Tratamiento de humedades internas**	**25 días**	**mié 3/12/25**	**mar 6/01/26**	$ 2.496.010,00	
184				INICIO DE OBRA	0 días	mié 3/12/25	mié 3/12/25		185CC
185	**59**	**PR-01**		Rasqueteada de pintura y retiro de mortero en mal estado	5 días	mié 3/12/25	mar 9/12/25	$ 50.578,00	155CC-15 días

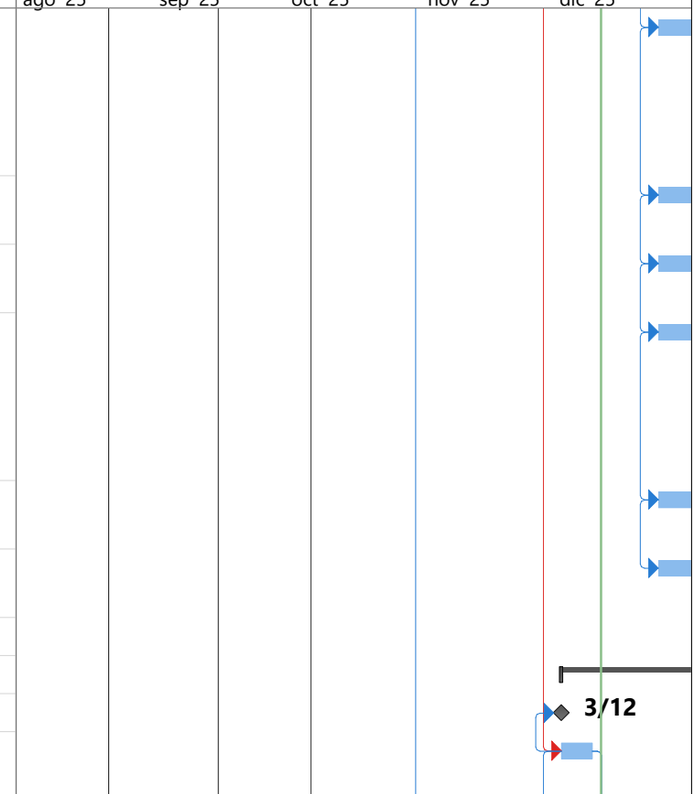

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
186	60	RI-09		Suministro e instalación de recubrimiento cementoso (Recubrimiento a base de cemento, arena y aditivos especiales), impermeable para muros color blanco	5 días	mié 10/12/25	mar 16/12/25	$ 223.176,00	185
187	61	AC-01		Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	5 días	mié 17/12/25	mar 23/12/25	$ 834.960,00	186
188	62	AC-04		Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (2 manos) (Incluye filos y dilataciones)	5 días	mié 24/12/25	mar 30/12/25	$ 1.176.144,00	187
189	63	AC-06		Suministro y aplicación de pintura cielo vinilo tipo 2	5 días	mié 31/12/25	mar 6/01/26	$ 0,00	188
190	64	PR-28		Desmonte y retiro de cielo en panel yeso	5 días	mié 10/12/25	mar 16/12/25	$ 211.152,00	185
191				FIN DE OBRA	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26		189
192				**Baño PMR**	**17 días**	**mié 3/12/25**	**jue 25/12/25**	$ 4.705.825,00	
193				INICIO DE OBRA	0 días	mié 3/12/25	mié 3/12/25	$ 0,00	194CC
194	65	PR-23		Desmonte aparatos sanitarios, incluye todos los accesorios existentes y el respectivo retiro	8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25	$ 71.296,00	185CC
195	66	PR-07		Demolición enchape de piso, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros.	8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25	$ 257.344,00	194CC
196	67	PR-08		Demolición enchape de muro, incluye retiro, empaque y trasiego de escombros.	8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25	$ 798.386,00	195CC
197	68	PR-61		Desmonte y retiro de espejo existente	8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25	$ 35.615,00	196CC
198	69	AP-05		suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25	$ 1.255.599,00	197CC
199	70	AP-07		suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25	$ 1.085.697,00	198CC

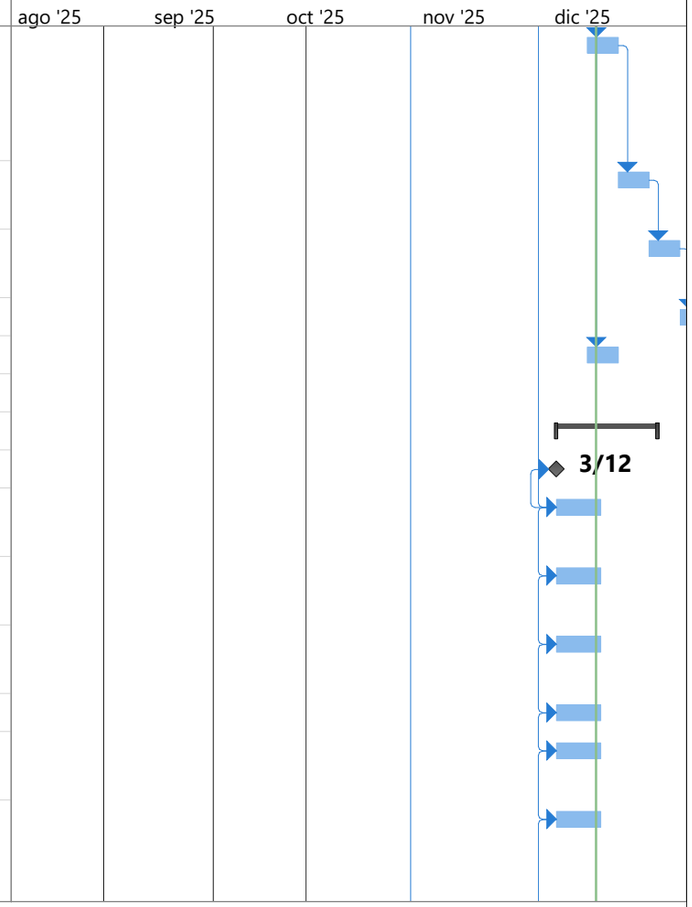

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
200	71	AC-44		Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	8 días	mié 3/12/25	vie 12/12/25	$ 276.297,00	199CC
201	72	AC-51		suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	9 días	lun 15/12/25	jue 25/12/25	$ 925.591,00	200
202				FIN DE OBRA	0 días	jue 25/12/25	jue 25/12/25		201
203				**Otros**	**8 días**	**vie 26/12/25**	**mar 6/01/26**	$ 12.755.671,00	
204				INICIO DE OBRA	0 días	vie 26/12/25	vie 26/12/25		205CC
205	73	SH-20		Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final	1 día	vie 26/12/25	vie 26/12/25	$ 285.756,00	202
206	74	SH-01		Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento	2 días	lun 29/12/25	mar 30/12/25	$ 5.268.020,00	205
207	75	VA-05		Aseo general.	1 día	lun 29/12/25	lun 29/12/25	$ 2.421.724,00	206CC
208	76	SH-03		Suministro e instalación de placa de identificación	1 día	nar 30/12/25	nar 30/12/25	$ 284.381,00	207
209	77	SH-06		Entrega de certificado según Resolución 4272 de 2021.	1 día	mar 30/12/25	mar 30/12/25	$ 2.752.740,00	208CC
210	78	SN		Empaque de escombros en fibra	1 día	nié 31/12/25	nié 31/12/25	$ 577.590,00	209
211	79	SN		Cargue material manual	1 día	jue 1/01/26	jue 1/01/26	$ 79.998,00	210
212	80	SN		Retiro acarreo material volqueta kilom	1 día	vie 2/01/26	vie 2/01/26	$ 14.100,00	211
213	81	SN		Disposición final de escombros y sobrantes	1 día	lun 5/01/26	lun 5/01/26	$ 27.468,00	212
214	82	SN		Movimiento vertical de materiales - escombros	1 día	mar 6/01/26	mar 6/01/26	$ 1.043.894,00	213

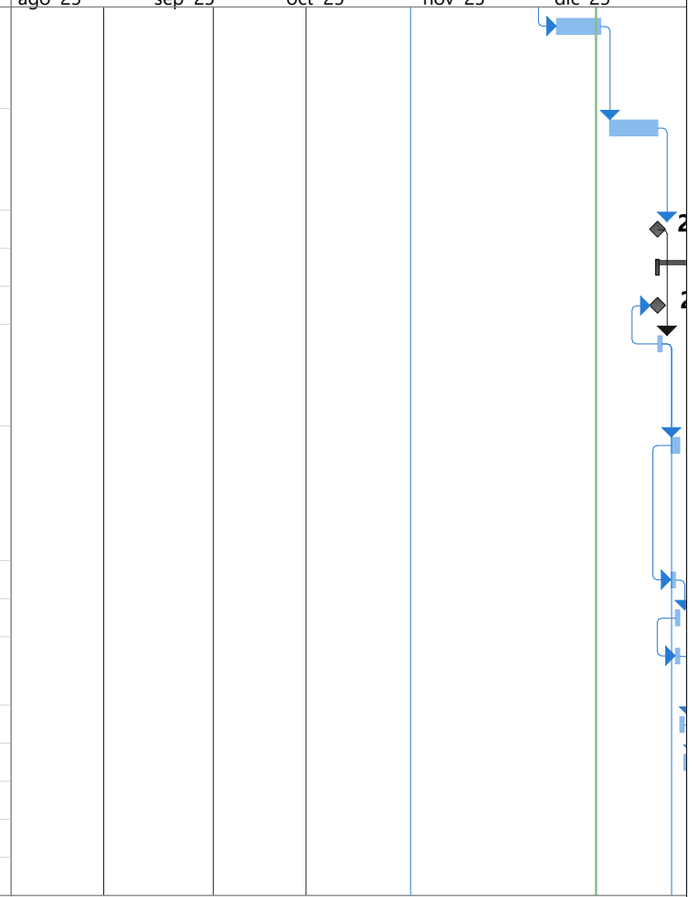

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
215				FIN DE OBRA	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26		214
216				**ACTIVIDADES CONTRACTUALES A EJECUTAR EN ESTE FRENTE**	**46 días**	**mar 4/11/25**	**mar 6/01/26**	$ 7.051.101,00	
217				INICIO DE OBRA	0 días	mar 4/11/25	mar 4/11/25		218
218	1,0	PR-28		Demolición de cielo raso	1 día	mar 4/11/25	mar 4/11/25	$ 3.941.424,00	87CC
219	48;	AC-01		Suministro y aplicación de estuco plástico (Incluye filos y dilataciones)	3 días	lun 29/12/25	mié 31/12/25	$ 2.020.857,00	205
220	1,1	DI-12		Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye estructura.	4 días	jue 1/01/26	mar 6/01/26	$ 1.088.820,00	219
221				FIN DE OBRA	0 días	mar 6/01/26	mar 6/01/26		220
222				***ACTIVIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE ROLDANILLO***	**90 días**	**mar 16/09/25**	**lun 19/01/26**	**$ 158.361.697,00**	
223				**1. Baterías sanitarias - cocineta**	**69 días**	**nar 16/09/25**	**vie 19/12/25**	$ 96.676.159,00	
224				INICIO DE OBRA	0 días	nar 16/09/25	nar 16/09/25		225CC
225	1,0	PR-24		Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	15 días	mar 16/09/25	lun 6/10/25	$ 4.054.425,00	5FC+15 días
226	1,0	PR-25		Desmonte de puertas enmadera	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 496.128,00	225
227	1,0	PR-26		Demolicion meson en concreto	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 280.478,00	226CC
228	1,0	PR-27		Demolición muros en ladrillo	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 139.948,00	227CC
229	1,0	PR-28		Demolición de cieloraso	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 0,00	228CC
230	1,0	PR-30		Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 3.191.042,00	229CC
231	1,0	PR-32		Corte de piso en concreto con pulidora	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 729.076,00	230CC
232	1,0	PR-33		corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 677.034,00	231CC

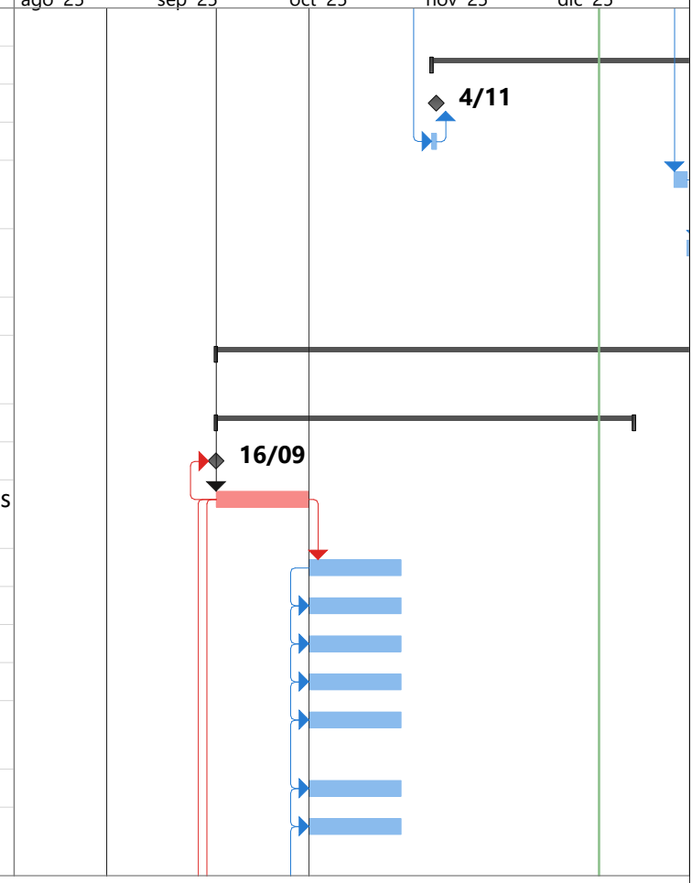

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
233	1,09	PR-35		regatas en muros para tubo de 1/2"a 2"incluye retiro	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 130.440,00	232CC
234	1,1	PR-23		Desmonte aparatos sanitarios	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 693.240,00	233CC
235	1,11	DI-09		Contrapiso en concreto e=0,10m	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 4.816.409,00	234CC
236	1,12	DI-22		Alistado piso 5cm mortero 1:3	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 2.657.616,00	235CC
237	1,13	RI-01		Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 5.241.758,00	236CC
238	1,14	DI-10		cajas de inspección de concreto reforzado 60x60	15 días	mar 7/10/25	lun 27/10/25	$ 4.423.810,00	237CC
239	1,15	DI-02		suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.	4 días	mar 7/10/25	vie 10/10/25	$ 2.678.328,00	238CC
240	1,16	DI-05		Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	4 días	mar 7/10/25	vie 10/10/25	$ 0,00	239CC
241	1,17	DI-04		Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	4 días	mar 7/10/25	vie 10/10/25	$ 0,00	240CC
242	1,18	DI-12		Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye estructura.	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$ 0,00	241
243	1,19	AC-10		Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	15 días	mar 14/10/25	lun 3/11/25	$ 16.346.399,00	242
244	1,2	AC-11		Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	15 días	mar 4/11/25	lun 24/11/25	$ 4.765.821,00	243
245	1,21	AC-19		Suministro e instalación de tableta de gress formato 30 x 30 (Aprox)	15 días	mar 4/11/25	lun 24/11/25	$ 1.163.866,00	244CC

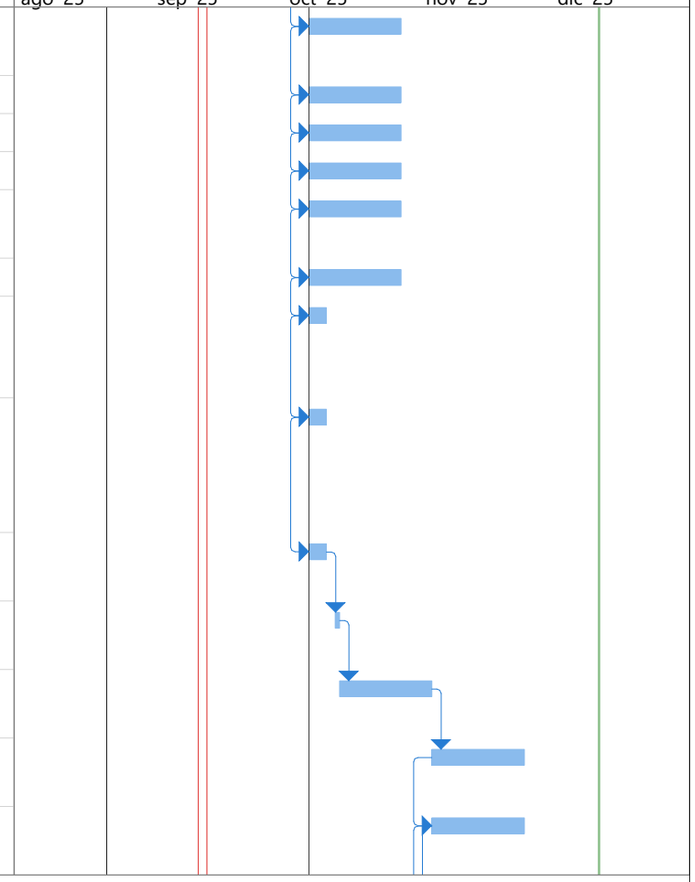

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
246	1,22	IH-01		Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2"incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	15 días	mar 4/11/25	lun 24/11/25	$ 306.624,00	245CC
247	1,23	IH-09		suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	15 días	mar 4/11/25	lun 24/11/25	$ 978.354,00	246CC
248	1,24	IH-20		Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2"incluye todos los elementos para su correcta instalación	15 días	mar 4/11/25	lun 24/11/25	$ 448.074,00	247CC
249	1,25	IH-10		suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 192.808,00	248
250	1,26	IH-03		suministro e instalación de tubería sanitaria de 4"incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 3.123.120,00	249CC
251	1,27	IH-11		suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 252.728,00	250CC
252	1,28	IH-06		Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2"incluye accesorios	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 344.808,00	251CC
253	1,29	IH-12		Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 494.361,00	252CC
254	1,3	IH-23		suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 174.575,00	253CC
255	1,31	IH-19		Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 869.488,00	254CC
256	1,32	AC-5		Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 3.853.700,00	255CC

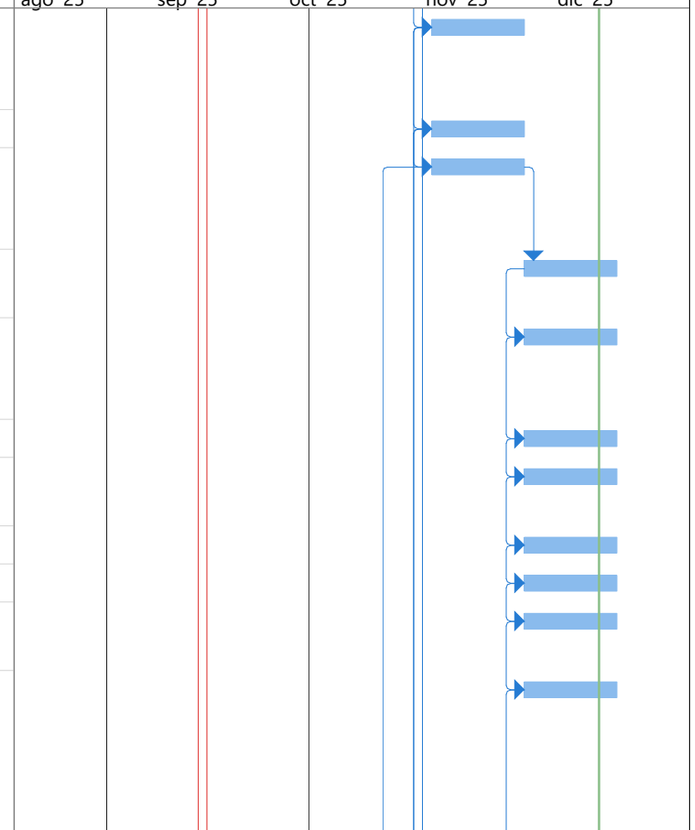

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
257	1,3	DI-07		suministro e instalación mesón o cubierta en aglomerado RH de 30mm, ancho de 50cm, incluye soportes de fijación	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 368.041,00	256CC
258	1,3	AP-03		Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 2.197.830,00	257CC
259	1,3	AP-07		suministro e instalación de Lavamanos, para personas en situación de discapacidad, incluye accesorios de soporte	15 días	mar 25/11/25	lun 15/12/25	$ 1.136.407,00	258CC
260	1,3	AP-02		Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	1 día	nar 16/12/25	nar 16/12/25	$ 3.595.845,00	259
261	1,3	AP-05		Suministro e instalación de sanitario para personas en situación de discapacidad	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25	$ 1.337.014,00	260CC
262	1,3	AP-08		Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25	$ 954.018,00	261CC
263	1,3	AC-4		Suministro e instalación de espejo de 4 mm biselado de 2 cm flotante incluye base en	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25	$ 1.224.195,00	262CC
264	1,4	AP-04		Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	1 día	mar 16/12/25	mar 16/12/25	$ 2.135.658,00	263CC
265	1,4	IH-15		Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	1 día	mié 17/12/25	mié 17/12/25	$ 345.348,00	264
266	1,4	AC-5		suministro e instalación de accesorios barra de seguridad abatible en acero inoxidable y barra de pared para baño de discapacitados	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 991.188,00	265CC-2 días
267	1,4	AC-4		Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 346.512,00	266CC

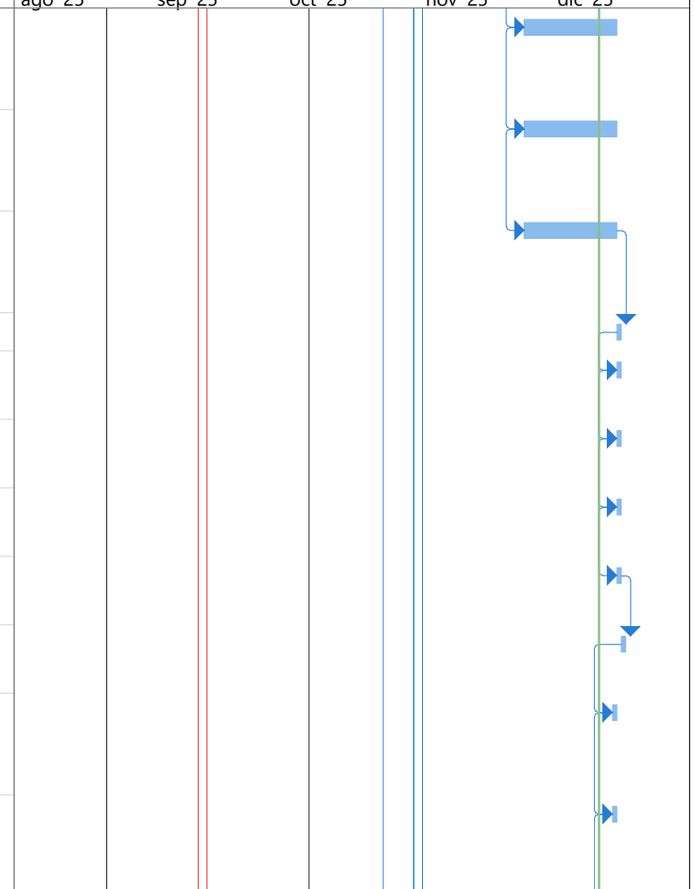

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
268	1,4	CA-3		Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalación y correcto funcionamien	2 días	lun 15/12/25	mar 16/12/25	$ 4.817.320,00	267CC
269	1,4	CA-3		Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25	$ 4.383.295,00	268CC
270	1,4	CA-3		suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25	$ 1.669.230,00	269CC
271	1,4	CA-3		suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	5 días	lun 15/12/25	vie 19/12/25	$ 1.115.292,00	270CC
272	1,4	IE-06		Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 627.680,00	271CC

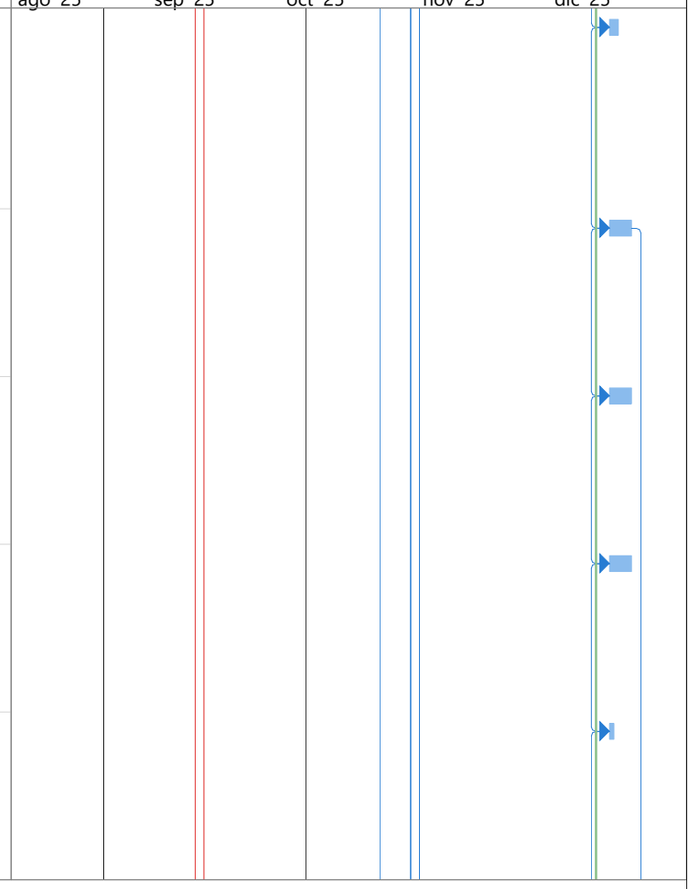

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
273	1,49	IE-11		Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 500.575,00	272CC
274	1,5	IE-09		Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 509.100,00	273CC
275	1,51	IE-07		Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 574.380,00	274CC
276	1,52	CA-15		suministro e instalacion de mueble inferior en melamina de 18mm, color a definir puertas con cierre lento, medidas ancho 0,55m x altura 0,60m, color similar al existente, incluye tapacantos rígido y sistema de instalación, accesorios para su correcto func	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 1.751.861,00	275CC
277	1,53	IE-45		Suministro e instalación toma electrico GFCI	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 352.209,00	276CC
278	1,54	VA-01		Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 1.267.085,00	277CC
279	1,55	AP-01		Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalación y correcto funcionamiento	1 día	lun 15/12/25	lun 15/12/25	$ 951.618,00	278CC
280				FIN DE BOBRA	0 días	vie 19/12/25	vie 19/12/25		269
281				**2. Losa tanques de agua**	**34 días**	**mar 28/10/25**	**vie 12/12/25**	$ 2.226.476,00	
282				INICIO DE OBRA	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25		283
283	2,01	CA-16		Suministro e instalación de pasamanos metálico tipo mueble 2", incluye elementos de fijación (platinas, anclajes, otros), pintura anticorrosiva y pintura de esmalte color a definir	1 día	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 206.520,00	245CC

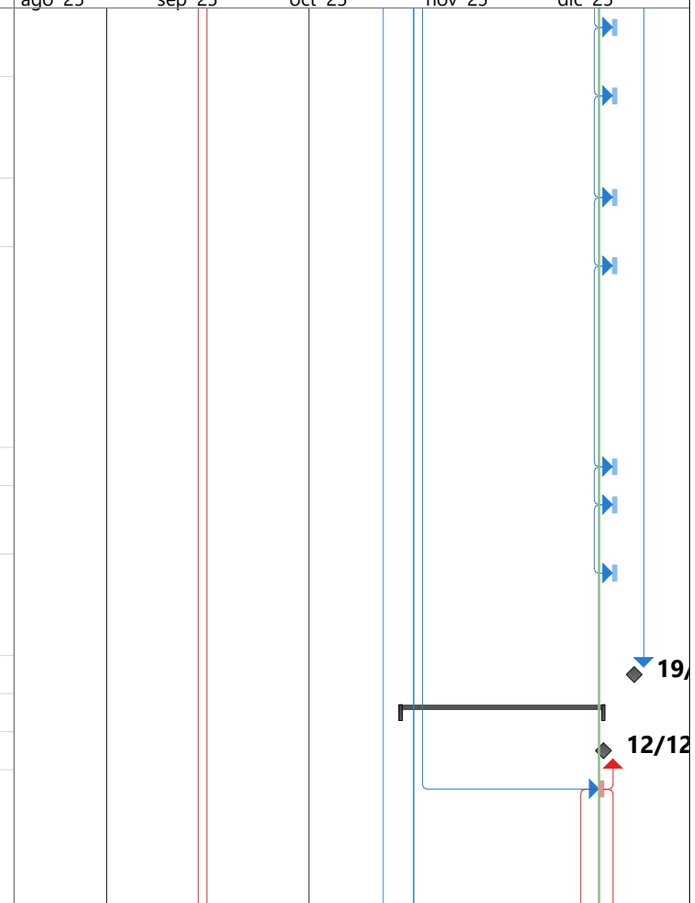

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
284	2,02	DI-22		Alistado piso 5cm mortero 1:3	6 días	mar 4/11/25	nar 11/11/25	$ 432.725,00	246CC
285	2,03	AC-11		Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	7 días	mar 4/11/25	mié 12/11/25	$ 1.078.251,00	247CC
286	2,04	IH-13		Desmonte y reinstalación tanques de almacenamiento de agua 500lts, incluye accesorios	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 508.980,00	248CC-5 días
287	2,05	AC-13		Suministro e instalación de enchape cerámico para pared formato 20 cm x 20 cm	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$ 0,00	286
288				FIN DE OBRA	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25		283
289				**3. Varios**	**75 días**	**mar 7/10/25**	**lun 19/01/26**	$ 13.027.841,00	
290				INICIO DE OBRA	0 días	vie 12/12/25	vie 12/12/25		291
291	3,01	CA-31		Adecuación dintel de madera 0,05x0,50x1,80, inmunnizado y pintado color negro mate, incluye alzaprimada de muro/cubierta, retiro dintel existente, resane y pintura 3 vinilo manos en muro	1 día	vie 12/12/25	vie 12/12/25	$ 481.980,00	283CC
292	3,02	CA-17		Cambio columna de madera 0,15x0,15x3,5, similar al existente inmunnizada y pintada color negro mate (similar al existente), incluye alzaprimada de cubierta, retiro de la columna existente y todo lo necesario para su correcta instalación	25 días	lun 15/12/25	vie 16/01/26	$ 9.181.696,00	291
293	3,03	CA-18		Suministro e instalación de cerradura de sobreponer acorazada, con cobertura adicional contra apertura forzosa, bulón cuadrado de 35mm y cerrojo de tres (3) golpes para puerta en madera	1 día	lun 19/01/26	lun 19/01/26	$ 1.063.120,00	292

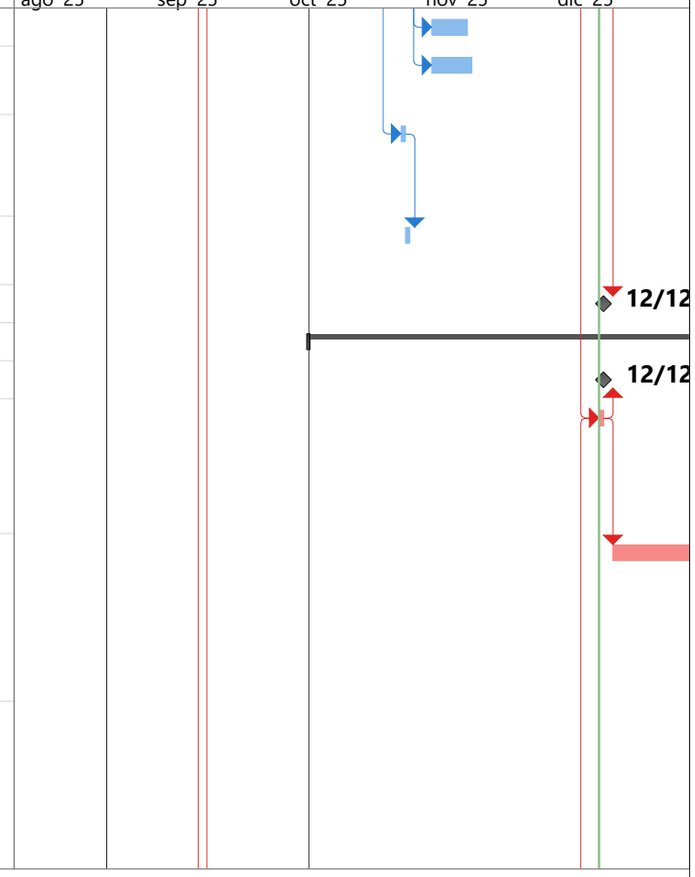

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
294	3,04	CA-40		Suministro e instalación de cerradura de doble cerrojo de 3 golpes con cilindro de llave plana reversibles, backset de 70Mm, para puerta de madera.	1 día	lun 19/01/26	lun 19/01/26	$ 219.712,00	293CC
295	3,05	DI-02		Suministro e instalación muro en perfilería de 90mm en panel yeso de 1/2 , doble cara insonorizado. Altura piso techo	1 día	lun 19/01/26	lun 19/01/26	$ 0,00	294CC
296	3,06	VA-05		Aseo general	20 días	mar 7/10/25	lun 3/11/25	$ 2.081.333,00	5FC+30 días
297				FIN DE OBRA	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26		294
298				**4. Cubierta**	**29 días**	**nar 16/09/25**	**vie 24/10/25**	$ 36.825.022,00	
299				INICIO DE OBRA	0 días	nar 16/09/25	nar 16/09/25		300
300	4,01			Desmonte teja de barro (incluye el respectivo almacenamiento para conservar su estado y posterior reinstalación)	1 día	mar 16/09/25	mar 16/09/25	$ 1.833.563,00	225CC
301	4,02			Suministro e instalación manto techfiel 4 mm (el cual se instalará sobre la estructura de cubierta y por debajo de la teja de barro)	1 día	mié 17/09/25	mié 17/09/25	$ 10.695.785,00	300
302	4,03			Reinstalación de teja de barro existente, con fijación	1 día	jue 18/09/25	jue 18/09/25	$ 0,00	301
303	4,04			Suministro e instalación de teja de barro	1 día	vie 19/09/25	vie 19/09/25	$ 0,00	302
304	4,05	10		Suministro e instalación caballete Colonial articulado rojo, similar a la teja de barro, incluye accesorios para su correcta instalación.	1 día	jue 18/09/25	jue 18/09/25	$ 3.142.750,00	301

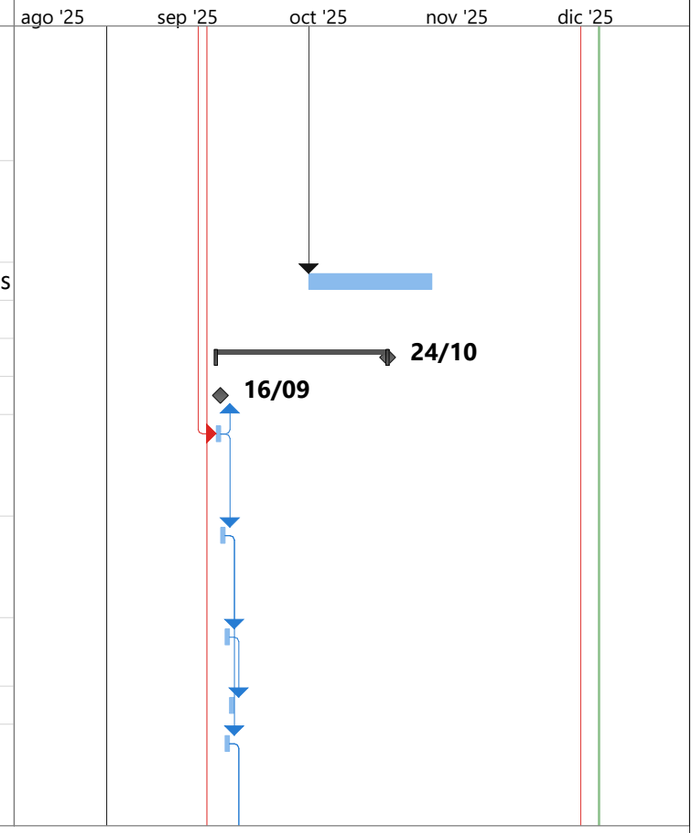

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
305	4,0	CC-1		Suministro e instalación de canal de aguas lluvias sección de 20 cm X 15 cm en lámina galvanizada calibre 22 (incluye los elementos de soporte y fijación)	1 día	vie 19/09/25	vie 19/09/25	$ 0,00	304
306	4,0	IH-04		Suministro e instalación bajante aguas lluvias en PVC de 3"con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento.	1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25	$ 0,00	305
307	4,0			mantenimiento general de cubierta tipo colonial, incluye cambio de tejas en mal estado, reacomodación y atraques nuevos para el área general de cubierta, incluir el retiro de escombros.	25 días	vie 19/09/25	jue 23/10/25	$ 21.152.924,00	304
308	4,0	CC-0		Suministro e instalación de Solapa en lamina galvanizada Cal 24, incluye sellador sobre muro	1 día	vie 24/10/25	vie 24/10/25	$ 0,00	307
309				FIN DE OBRA	0 días	vie 24/10/25	vie 24/10/25		308
310				**5. Seguridad Humana**	**27 día**	**vie 12/12/25**	**lun 19/01/26**	$ 9.606.199,00	
311				INICIO DE OBRA	0 días	nar 16/12/25	nar 16/12/25		312
312	5,0	SH-01		Suministro e instalación de Escalera tipo gato - certificada - con sus respectivos accesorios,anclajes y demas certificados, que garantices su optima instalación y funcionamiento	3 días	vie 12/12/25	mar 16/12/25	$ 4.865.044,00	291CC
313	5,0	SH-03		Suministro e instalación de Placa de Identificación	1 día	mié 17/12/25	mié 17/12/25	$ 284.381,00	312
314	5,0	SH-06		Entrega de Certificación según RESOLUCION 4272 DE 2021	1 día	jue 18/12/25	jue 18/12/25	$ 4.054.978,00	313

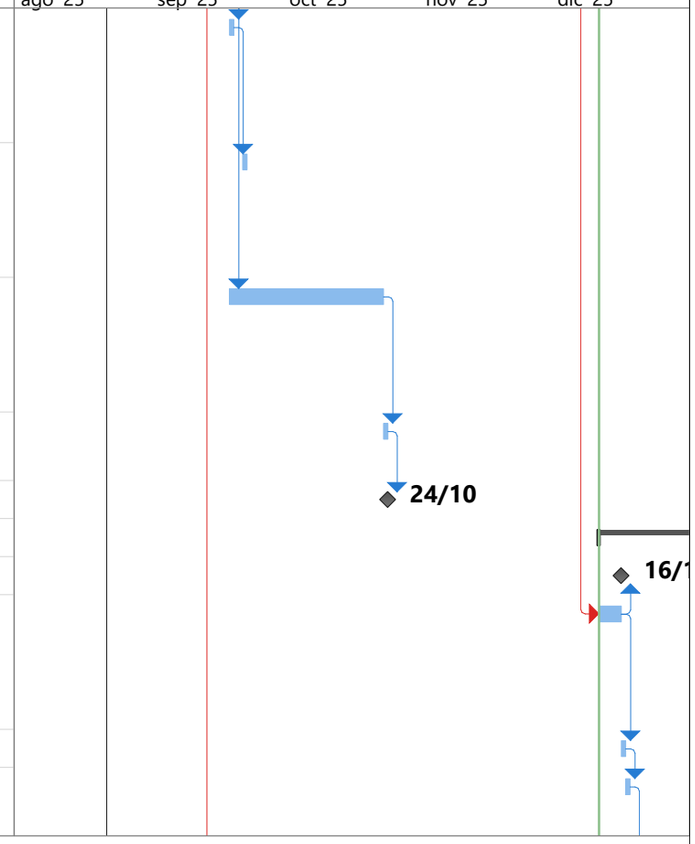

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
315	5,04	SH-20		Desmonte de escalera tipo gato existente - Incluye retiro de material sobrante y disposición final	1 día	vie 19/12/25	vie 19/12/25	$ 401.796,00	314
316				FIN DE OBRA	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26		293
317				***ACTIVIDADES SEDE PALACIO DE JUSTICIA DE CARTAGO***	**69 días**	**lun 22/09/25**	**jue 25/12/25**	**$ 103.926.509,00**	
318				**1. Baterías sanitarias**	**52 días**	**lun 22/09/25**	**mar 2/12/25**	$ 70.301.175,00	
319				INICIO DE OBRA	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25		320CC
320	1,01	PR-24		Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	9 días	lun 22/09/25	jue 2/10/25	$ 1.974.936,00	225CC+4 días
321	1,02	PR-25		Desmonte de puertas en madera	1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25	$ 62.016,00	320CC
322	1,03	PR-27		Demolición muros en ladrillo	2 días	nar 23/09/25	nié 24/09/25	$ 66.189,00	321
323	1,04	PR-30		Demolición enchape cerámico, incluye retiro de escombros	4 días	jue 25/09/25	mar 30/09/25	$ 680.085,00	322
324	1,05	PR-31		Desmontar y retirar las divisiones de baño existentes	2 días	mié 1/10/25	jue 2/10/25	$ 553.770,00	323
325	1,06	PR-32		Corte de piso en concreto con pulidora	10 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25	$ 85.508,00	324
326	1,07	PR-33		corte de muro, incluye demolición, retiro, empaque y trasiego de escombros.	10 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25	$ 254.688,00	325CC
327	1,08	PR-35		regatas en muros para tubo de 1/2"a 2"incluye retiro	10 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25	$ 45.913,00	326CC
328	1,09	PR-34		Regata en piso para tubo de 1/2"a 2"incluye retiro	10 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25	$ 323.442,00	327CC
329	1,1	PR-23		Desmonte aparatos sanitarios	10 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25	$ 323.512,00	328CC
330	1,11	PR-37		Reinstalación de aparatos sanitarios	10 días	vie 3/10/25	jue 16/10/25	$ 109.654,00	329CC
331	1,12	DI-09		Contrapiso en concreto e=0,10m	3 días	vie 17/10/25	nar 21/10/25	$ 2.269.355,00	330

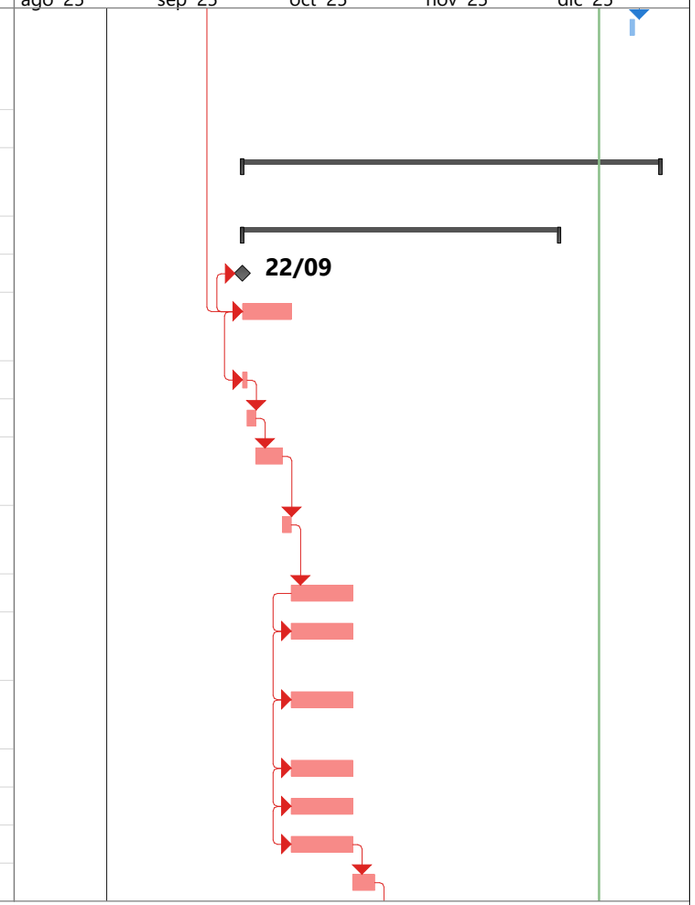

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
332	1,13	DI-22		Alistado piso 5cm mortero 1:3	3 días	nié 22/10/25	vie 24/10/25	$ 1.320.005,00	331
333	1,14	RI-01		Suministro y aplicación de mortero 1:3 impermeabilizado	3 días	lun 27/10/25	mié 29/10/25	$ 1.818.364,00	332
334	1,15	DI-02		suministro y fabricación de muro en perfilería de 90mm en super board de 8mm, doble cara, totalmente acabado.	6 días	lun 20/10/25	lun 27/10/25	$ 1.398.682,00	333CC-5 días
335	1,16	DI-05		Suministro e instalación de cartera en panel yeso de 12 cm incluye filos, con estructura galvanizada base 9 cal.24 encintada, masillada y rematada, con acabado en pintura de vinilo	2 días	mar 28/10/25	mié 29/10/25	$ 562.086,00	334
336	1,17	DI-04		Suministro e instalación de alma en madera de 88mm	1 día	mar 28/10/25	mar 28/10/25	$ 549.241,00	335CC
337	1,18	DI-12		Suministro e instalación cielo falso en panel yeso incluye nivelación de estructura.	1 día	mié 29/10/25	mié 29/10/25	$ 2.836.830,00	336
338	1,19	AC-10		Suministro e instalación enchape formato 0,60 X 0,30 para pared, color a definir por la Entidad	1 día	mié 8/10/25	mié 8/10/25	$ 5.030.187,00	337CC-15 días
339	1,2	AC-11		Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	1 día	jue 9/10/25	jue 9/10/25	$ 3.289.143,00	338
340	1,21	IH-01		Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2"incluye todos los elementos y accesorios para su instalación	1 día	jue 9/10/25	jue 9/10/25	$ 306.624,00	338
341	1,22	IH-09		suministro e instalación de puntos sanitario de 2"	1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25	$ 434.824,00	339
342	1,23	IH-20		Suministro e instalación de sifón de SOSCO de 2"incluye todos los elementos para su correcta instalación	1 día	vie 10/10/25	vie 10/10/25	$ 74.679,00	340

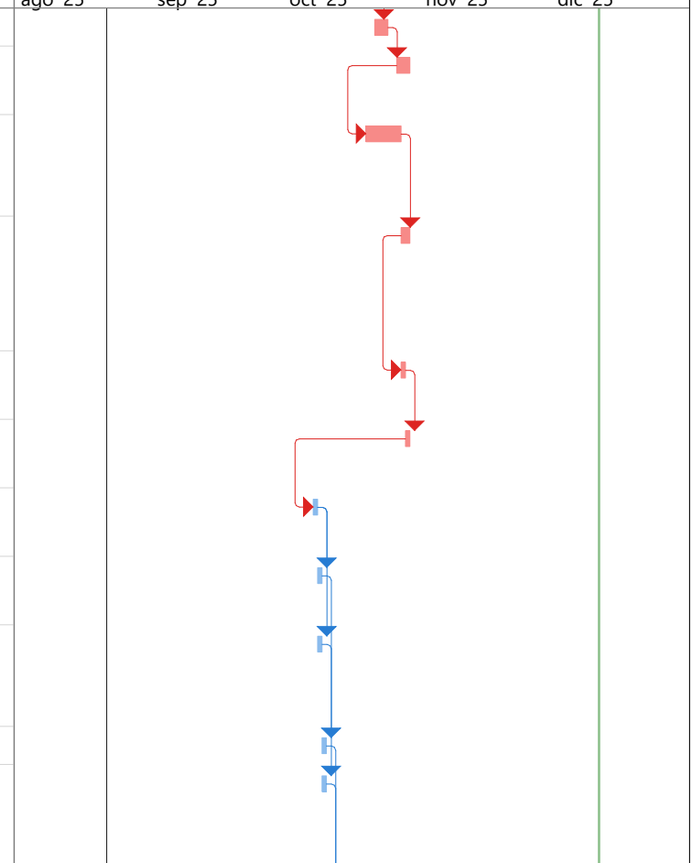

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
343	1,24	IH-10		suministro e instalación de rejilla aluminio/plástica anti- insectos de 2"	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$ 55.088,00	341
344	1,25	IH-03		suministro e instalación de tubería sanitaria de 4"incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	1 día	lun 13/10/25	lun 13/10/25	$ 1.115.400,00	342
345	1,26	IH-11		suministro e instalación de puntos sanitario de 4"	1 día	nar 14/10/25	nar 14/10/25	$ 379.092,00	343
346	1,27	IH-06		Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2"incluye accesorios	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$ 517.212,00	344
347	1,28	IH-12		Suministro e instalación punto hidráulico 1/2"	5 días	nié 15/10/25	nar 21/10/25	$ 847.476,00	345
348	1,29	IH-23		suministro e instalación de tapa registro de 15 x 15	5 días	nié 15/10/25	nar 21/10/25	$ 69.830,00	346
349	1,3	IH-19		Suministro e instalación Registro de corte en bronce 1/2"	5 días	mié 22/10/25	mar 28/10/25	$ 217.372,00	347
350	1,31	AC-5		Suministro e instalación de mesón para lavamanos en mármol, e= 20 mm, ancho de 55 cms, incluye estructura metálica y soporte al muro o similar que garantice estabilidad, babero de 15 cms y salpicadero de 10 cms.	5 días	mié 22/10/25	mar 28/10/25	$ 2.001.922,00	348
351	1,32	AP-03		Suministro e instalación de lavamanos de sobreponer, porcelana blanca redondo u ovalado, certificado, incluye sifón.	5 días	mié 29/10/25	mar 4/11/25	$ 1.318.698,00	349
352	1,33	AP-02		Suministro e instalación de sanitario 4.8 lts	2 días	mié 8/10/25	jue 9/10/25	$ 3.595.845,00	351CC-15 dí
353	1,34	AP-04		Suministro e instalación de Grifería de Push para lavamanos	2 días	vie 10/10/25	lun 13/10/25	$ 1.852.240,00	352
354	1,35	IH-15		Suministro e instalación de Acople con Válvula de Regulación, para sanitario	1 día	mar 14/10/25	mar 14/10/25	$ 287.790,00	353

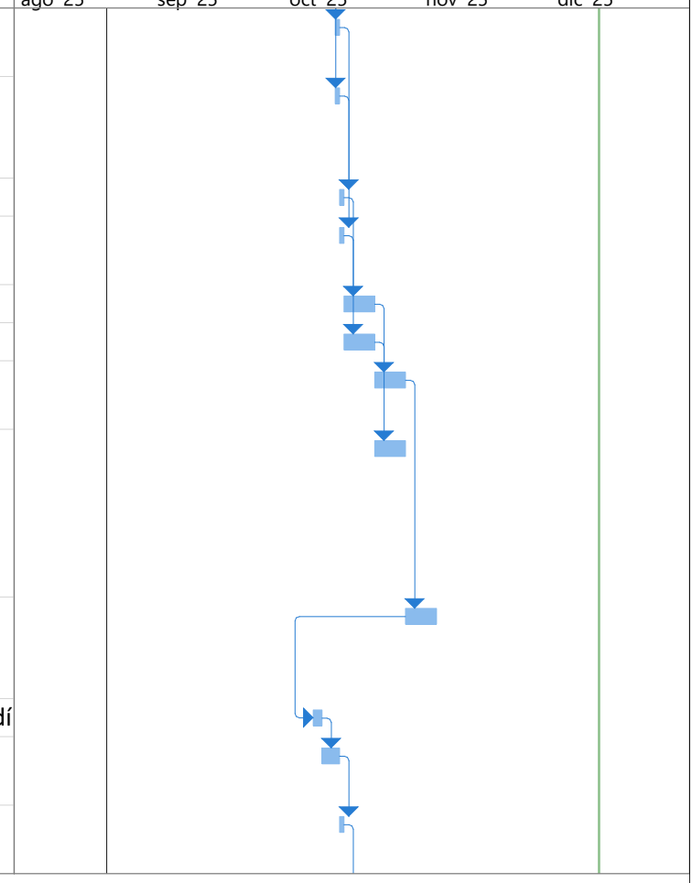

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
355	1,3	AC-4		Suministro e instalación de espejo de 4mm, dimensiones 80cm x 60cm, con basculante para graduación de inclinación.	3 días	mié 15/10/25	vie 17/10/25	$ 1.386.048,00	354
356	1,3	CA-3		Suministro e instalación de puerta de 1.00 x 2,4mts en madera maciza, inmunizada, pintura para madera color negro mate, diseño similar al existente, incluye marco, chapa tipo bola, bisagras y todos los elementos para su instalacion y correcto funcionamien	7 días	lun 20/10/25	mar 28/10/25	$ 2.408.660,00	355
357	1,3	CA-3		Suministro e instalación de puerta de 0,55 x 2mts con pasador y manija fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación.	5 días	mié 29/10/25	mar 4/11/25	$ 4.383.295,00	356
358	1,3	CA-3		suministro e instalación de división en aluminio para baños, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	5 días	mié 5/11/25	mar 11/11/25	$ 11.617.841,00	357
359	1,4	CA-3		suministro e instalación de división en aluminio para orinal de 0,45 x1 mts, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	5 días	mié 12/11/25	mar 18/11/25	$ 1.115.292,00	358

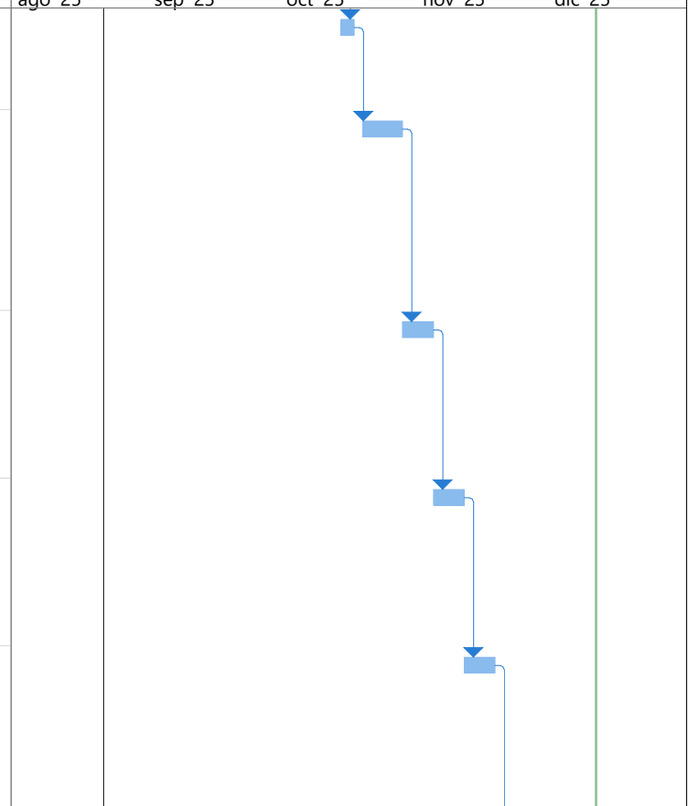

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
360	1,41	CA-29		suministro e instalación de puerta de 0.80x2mts con pasador y manija, fabricados en tubular t77 (2.5x2.5), paneles f06 de 7.06 cm, platina de ensamble ai5, ángulo 1/2, y demás accesorios para su correcta instalación. según diseño	5 días	mié 19/11/25	mar 25/11/25	$ 7.460.445,00	359
361	1,42	IE-06		Suministro e instalación de salida eléctrica red normal en puesto de trabajo con cable trenzado 3# 12 azul, verde, blanco con aislamiento libre de halógeno, longitud de 1,5m incluye tomacorriente polo a tierra	2 días	mié 19/11/25	jue 20/11/25	$ 502.144,00	360CC
362	1,43	IE-11		Suministro e instalación de interruptor sencillo incluye caja de sobreponer y salida de	5 días	mié 19/11/25	mar 25/11/25	$ 200.230,00	361CC
363	1,44	IE-09		Suministro e instalación de Lámpara panel led de sobreponer 24w 100 -240 - 1680Lm de 6,500 K - horas mínimas de vida útil 25,000	5 días	mié 19/11/25	mar 25/11/25	$ 610.920,00	362CC
364	1,45	IE-45		Suministro e instalación toma electrico GFCI	5 días	mié 26/11/25	mar 2/12/25	$ 117.403,00	363
365	1,46	IE-07		Suministro e instalación de cable trenzado 3#12 AWG para circuito normal o regulado	5 días	mié 26/11/25	mar 2/12/25	$ 574.380,00	364CC
366	1,47	VA-01		Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	1 día	mié 12/11/25	mié 12/11/25	$ 551.501,00	365CC-10 días
367	1,48	PR-04		Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 2", incluye retiro	1 día	mié 1/10/25	mié 1/10/25	$ 354.759,00	366CC-30 días
368	1,49	PR-05		Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 4", incluye retiro	1 día	jue 2/10/25	jue 2/10/25	$ 484.923,00	367
369	1,5	IH-14		Perforación de muro o piso en concreto y/o mamposteria para tubo de 6", incluye retiro	1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25	$ 0,00	368CC-10 días

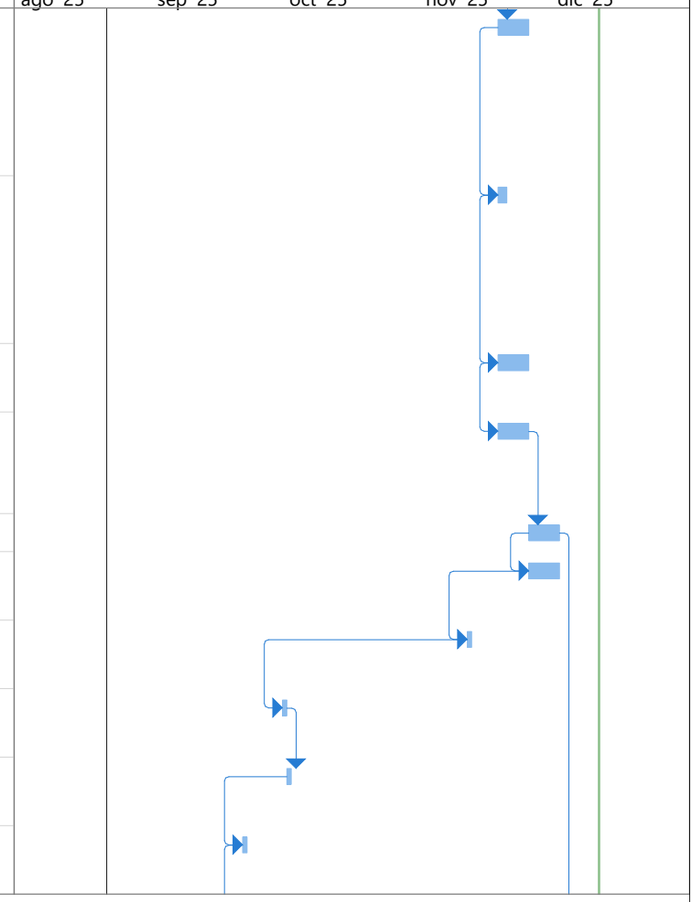

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	


Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
370	1,51	AP-01		Suministro e instalación orinal mediano blanco institucional, incluye todos los elementos para su fijación, instalacion y correcto funcionamiento	3 días	lun 22/09/25	mié 24/09/25	$ 951.618,00	369CC-5 días
371	1,52	AP-08		Suministro e instalación de grifería sistema push en bronce para Orinal	1 día	jue 25/09/25	jue 25/09/25	$ 954.018,00	370
372				FIN DE OBRA	0 días	mar 2/12/25	mar 2/12/25		364
373				**2. Hundimiento hall de acceso**	**69 días**	**lun 22/09/25**	**jue 25/12/25**	$ 33.625.334,00	
374				INICIO DE OBRA	0 días	lun 22/09/25	lun 22/09/25		375
375	2,01	PR-24		Demolicion contrapiso en concreto (incluye cerámica), incluye retiro de escombros	1 día	lun 22/09/25	lun 22/09/25	$ 4.235.737,00	5CC+19 días
376	2,02	PR-17		Excavación en tierra a mano	8 días	nar 23/09/25	jue 2/10/25	$ 3.186.137,00	375
377	2,03	PR-48		Relleno rocamuerta compactado 95%PM	7 días	vie 3/10/25	lun 13/10/25	$ 2.860.144,00	376
378	2,04	PR-32		Corte de piso en concreto con pulidora	7 días	nar 14/10/25	mié 22/10/25	$ 0,00	377
379	2,05	DI-09		Contrapiso en concreto e=0,10m	8 días	jue 23/10/25	lun 3/11/25	$ 5.031.699,00	378
380	2,06	DI-22		Alistado piso 5cm mortero 1:3	10 días	mar 4/11/25	lun 17/11/25	$ 2.926.764,00	379
381	2,07	DI-10		cajas de inspección de concreto reforzado 60x60	10 días	nar 18/11/25	lun 1/12/25	$ 1.769.524,00	380
382	2,08	AC-11		Suministro e instalación enchape piso formato 0,40 X 0,40, color a definir por la Entidad	8 días	mar 2/12/25	jue 11/12/25	$ 7.292.813,00	381
383	2,09	AC-14		Suministro e instalación guaradaescobas en PVC, color a definir por la Entidad	10 días	vie 12/12/25	jue 25/12/25	$ 1.146.322,00	382
384	2,1	IH-18		Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6", con sus respectivos accesorios y elementos de soporte, para su correcto funcionamiento	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$ 252.369,00	383CC-15 días

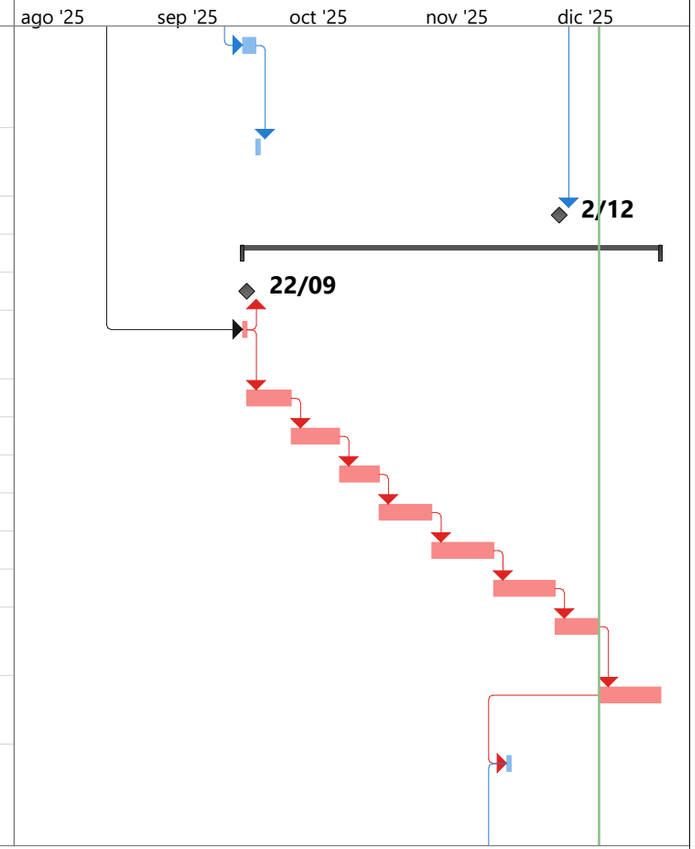

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	

Id	item	id.	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesoras
385	2,11	IH-03		suministro e instalación de tubería sanitaria de 4"incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación.	1 día	vie 21/11/25	vie 21/11/25	$ 625.860,00	384CC
386	2,12	IH-12		Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1/2"incluye accesorios	1 día	lun 24/11/25	lun 24/11/25	$ 0,00	385
387	2,13	IH-07		Suministro e instalación de tubería hidráulica de 1"incluye accesorios	1 día	mar 25/11/25	mar 25/11/25	$ 0,00	386
388	2,14	VA-01		Retiro escombros en Volqueta, a centro de acopio certificado	1 día	mié 26/11/25	mié 26/11/25	$ 2.534.170,00	387
389	2,15	AC-42		Suministro y aplicación de vinilo tipo 1 (3 manos)	14 días	jue 27/11/25	mar 16/12/25	$ 1.160.580,00	388
390	2,16	VA-05		Aseo general	21 días	jue 27/11/25	jue 25/12/25	$ 603.215,00	389CC
391				FIN DE OBRA	0 días	jue 25/12/25	jue 25/12/25		390
392				***TERMINACION DEL CONTRATO***	0 días	lun 19/01/26	lun 19/01/26		44

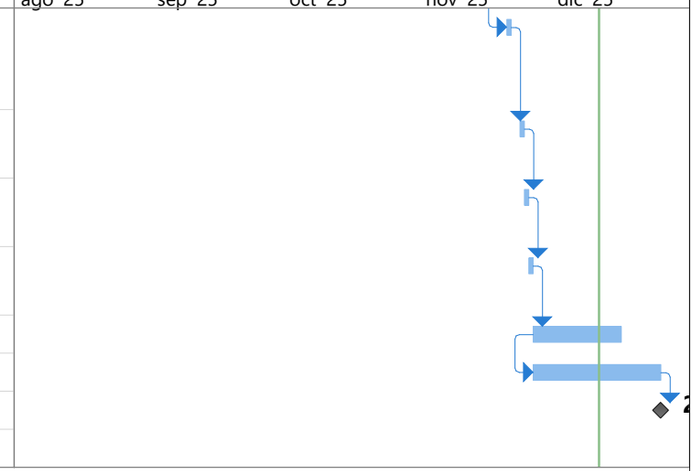

Proyecto: cronograma
Fecha: vie 12/12/25

Tarea	Hito inactivo	solo el comienzo	División crítica
División	Resumen inactivo	solo fin	Progreso
Hito	Tarea manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	solo duración	Hito externo	
Resumen del proyecto	Informe de resumen manual	Fecha límite	
Tarea inactiva	Resumen manual	Tareas críticas	
