FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR				**FECHA:**	27/09/2025
Semana No	**1**	**Del :**	22/09/2025	**Al:**	27/09/2025
Plazo Total		150	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		25	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		16,67%			
Nombre del Supervisor :		Juan Manuel Londoño Gordon			

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**3,04%**	**3,04%**	**(%) Ejecutado**	**3,85%**	**3,85%**
Valor programado ($)	**$ 18.072.000,00**	**$ 18.072.000,00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 22.897.214,00**	**$ 22.897.214,00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0,81%**
				Valor Adelanto	**$ 4.825.214,00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	HAH CONSTRUCCIONES SAS
Contrato No:	25000924 H4 2025
Valor Inicial:	$ 594.474.864,20
Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:	
Plazo inicial:	150 dias
Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	2-sep-25
Fecha de vencimiento:	10-dic-25
Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No.	
Periodo de Suspensión No.	
Levantamiento de la suspensión No.	
Nueva fecha de terminación	
Valor total actual del contrato	$ 594.474.864,20

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Creación de presupuesto inicial de acuerdo a reunión de socialización de necesidades, creación de Apu´s items no previstos necesarios para la correcta ejecución del contrato, programación general del proyecto.

OBRAS LADO AIRE

N/A

OBRAS LADO TIERRA

Zona de baños: Desmonte de puertas, desmonte de aparatos sanitarios, desmonte de enchapes de muros, desmonte de enchapes de piso, instalación de mortero de nivelación.
Zona de gimnasio: Desmonte de puerta, demolición de muros divisorios en oficina de lider.

AVANCE DE OBRA: El avance de obra presenta actividades liberadas para inicio de instalación de enchapes ya que la logistica de este insumo fue adelantada durante esta semana y ya se encuentra en las instalaciones.

FINANCIERO: Presentamos un avance de 0.81% el cual proyectamos incrementar la semana de ejecución N°2

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

AMBIENTAL
Actividades desarrolladas: Retiro de residuos de construcción y demolición a planta autorizada el cual se encuentra en proceso de certificación.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Creación de campamento de obra, creación de punto de hidratación, Instalación de camilla, instalación de botiquin de emergencias, instalación de punto ecologico, creación y delimitación de zonas de acopio de materiales y RCD. Inspección de herramientas, charlas SST.

PERSONAL EN OBRA

Personal del Contratista	**6**
Total Personal en Obra	**9**

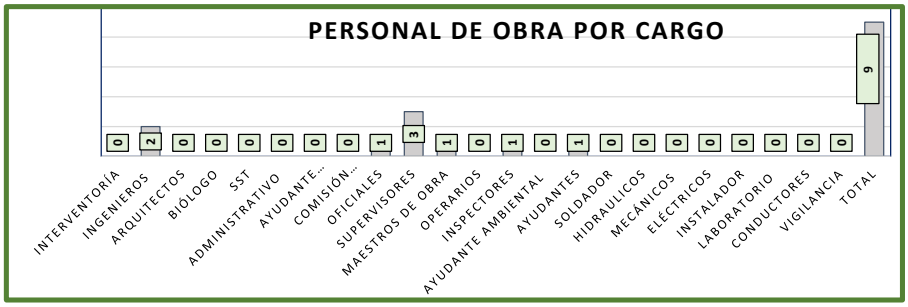

En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

RELACION MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Demoledor manual	Si	En obra	
Herramienta menor	Si	En obra	
Total Maquinaría	2		

AVANCE FINANCIERO DE OBRA


Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado		

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 594.474.864,20
Valor facturado Contrato Obra
$ 0,00
% Avance facturado Acumulado
0,00%

OBSERVACIONES

FIRMA




JAROL ESNEIDER GARZON
RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL DE EJECUCIÓN N°1

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL
N° CONTRATO 25000924 H4 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 1

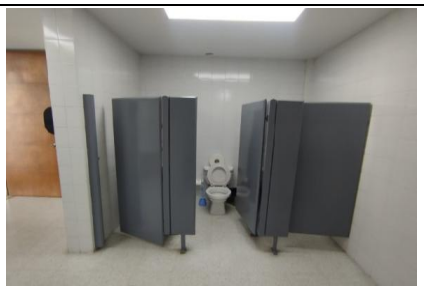ANTES	DESPUÉS
	
	
	
	
	

OBSERVACIONES	FIRMA
	JAROL ESNEIDER GARZON RESIDENTE DE OBRA
