FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL AERONÁUTICA CENTRO SUR				**FECHA:**	10/12/2025
Semana No	**11**	**Del :**	8/12/2025	**Al:**	10/12/2025
Plazo Total		100	días		
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato:		100	días		
porcentaje del tiempo transcurrido(%)		100.00%			
Nombre del Supervisor :		Juan Manuel Londoño Gordon			

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL

CONTROL DE LA PROGRAMACIÓN

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	**100.00%**	**100.00%**	**(%) Ejecutado**	**100.00%**	**100.00%**
Valor programado ($)	**$ 594,474,864.00**	**$ 594,474,864.00**	**Valor ejecutado ($)**	**$ 594,474,864.00**	**$ 594,474,864.00**
			Evaluación	**Porcentaje Adelanto**	**0.00%**
				Valor Adelanto	**$ 0.00**

DATOS CONTRACTUALES

CONTRATO DE OBRA

Contratista:	HAH CONSTRUCCIONES SAS
Contrato No:	25000924 H4 2025
Valor Inicial:	$ 594,474,864.00
Valor Actualizado al modificatorio :	
Valor actualizado 2:	
Plazo inicial:	100 días
Plazo actualizado:	
Fecha de iniciación:	2-sep-25
Fecha de vencimiento:	10-dic-25
Modificatorio No. Prórroga No.	
Fecha de Terminación Según Prórroga No.	
Suspensión No.	
Periodo de Suspensión No.	
Levantamiento de la suspensión No.	
Nueva fecha de terminación	
Valor total actual del contrato	$ 594,474,864.00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Memoria cantidades de obra, informe mensual, acta de recibo parcial

OBRAS LADO AIRE

N/A

OBRAS LADO TIERRA

Zona de parqueadero: Aplicación pintura epoxica azul, aplicación pintura epoxica amarilla, instalación de cortasol
Zona oficinas piso 2: Entrega de mobiliario,
Zona baño guardia, cuarto de bombeo y alojamiento 1: instalación de puertas de madera
Escalera: Instalación de cinta antideslizante
Baño Guardia: Instalación de sanitario
Cuarto de bombeo: Instalación de sistema de bombeo

AVANCE DE OBRA: Se finaliza intervención a base SEI en un 100%

FINANCIERO: Se finaliza intervención a base SEI en un 100%

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL


INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

AMBIENTAL
Actividades desarrolladas: Acopio de RCD´S de las ultimas demoliciones realizadas, inspección y mantenimiento de punto ecologico y zonas aledañas, orden y aseo de las obras realizadas. Desmantelamiento de campamento.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:
Inspección de herramientas y equipos, acompañamiento trabajo en alturas zona de parqueadero, charlas de seguridad y salud en el trabajo.

PERSONAL EN OBRA

Personal del Contratista	**7**
Total Personal en Obra	**10**

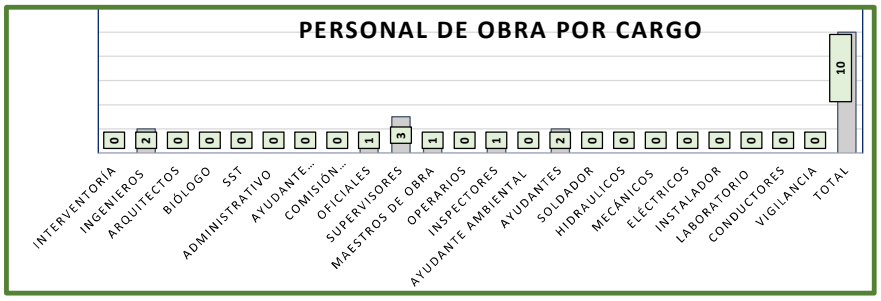

En el **gráfico número 1,** se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.



En el **gráfico número 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico de color azul corresponden al personal operativo.

FORMATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE EJECUCIÓN

RELACION MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
Demoledor manual	Si	En obra	
Herramienta menor	Si	En obra	
Total Maquinaria	2		

AVANCE FINANCIERO DE OBRA


Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total
1	20/09/2025-20/10/2025	$ 130,746,221.11
2	20/10/2025-20/11/2025	$ 212,785,474.70
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
Total Acumulado	**$ 343,531,695.81**	

AVANCE FINANCIERO

Valor Total Contrato Obra
$ 594,474,864.00
Valor facturado Contrato Obra
$ 343,531,695.81
% Avance facturado Acumulado
57.79%

OBSERVACIONES

FIRMA



JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ
RESIDENTE DE OBRA

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANAL DE EJECUCIÓN N°11

OBJETO DEL CONTRATO

REALIZAR MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA BASE SEI DEL AEROPUERTO FLAMINIO SUAREZ DE GUAYMARAL
N° CONTRATO 25000924 H4 2025

REGISTRO FOTOGRÁFICO SEMANA 11

ANTES	DESPUES
	
	
	
	
	

OBSERVACIONES	FIRMA
	JAROL E. GARZÓN RODRÍGUEZ RESIDENTE DE OBRA
