INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN CONVENIO 2024-016 ENTRE EL MUNICIPIO DE PÁEZ BOYACÁ Y CORPOBOYACÁ

EJECUTOR: MUNICIPIO DE PÁEZ MEDIANTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° CPS-23-MP-SA-014-2025

OBJETO : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ. CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ, PARA: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ ", EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD

SEPTIEMBRE 2025
PÁEZ BOYACÁ

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

(05 DE MARZO DE 2025 - 07 DE SEPTIEMBRE DE 2025)



OBJETO : AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ. CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ, PARA: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ ", EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD


MARZO 2025
PÁEZ BOYACÁ


1. INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, CORPOBOYACA y el Municipio de Páez, suscribieron CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CNV 2024-016 de fecha 31 de diciembre de 2024, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ. CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ, PARA: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ ", EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD"

De conformidad con la localización, cantidades y especificaciones técnicas señaladas en los documentos del proyecto, el cual hace parte integral del convenio, que se suscribió por un valor de OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS $82.901.700 M/CTE, los cuales se discriminan así:
CORPOBOYACÁ: Aportará en efectivo la suma de SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($62.375.883) M/CTE, correspondiente al 75,24% del valor del total del proyecto respaldados a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP NO. 2024001546 de fecha 03 de diciembre de 2024 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal con autorización de vigencia futura CDP NO. 2024000014 de fecha 26 de diciembre de 2024.
EL MUNICIPIO DE PÁEZ: Aporta al presente convenio la suma de VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($20.525.817) M/CTE, correspondiente al 24,76% del total del proyecto, respaldados con Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 773, de fecha 11 de noviembre de 2024 emitido el Municipio De Páez.

2. LOCALIZACIÓN

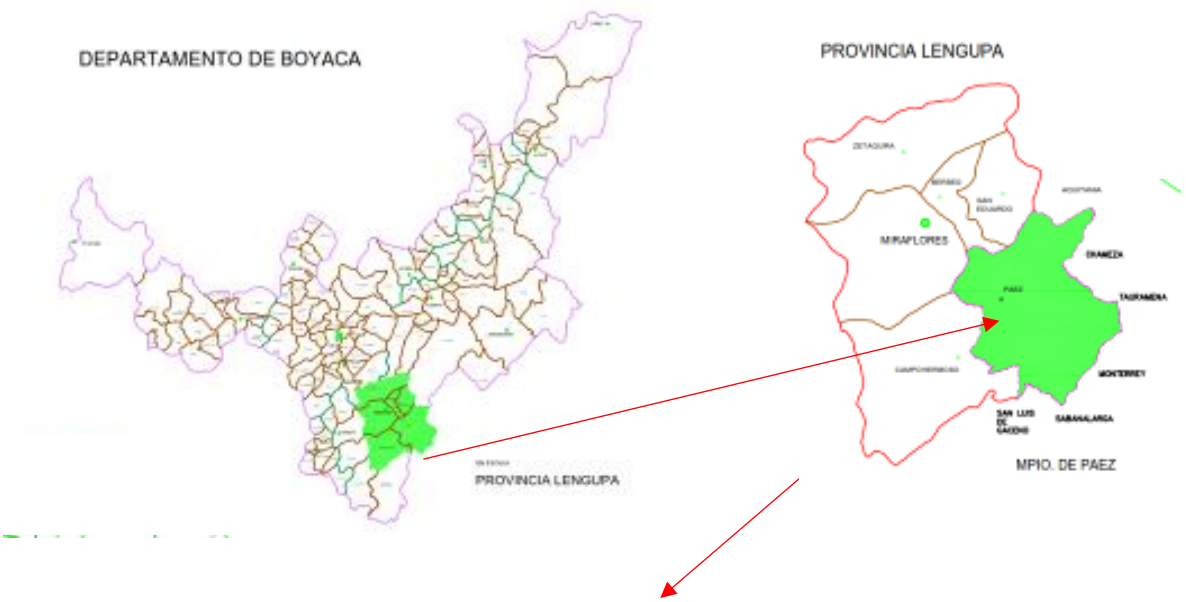

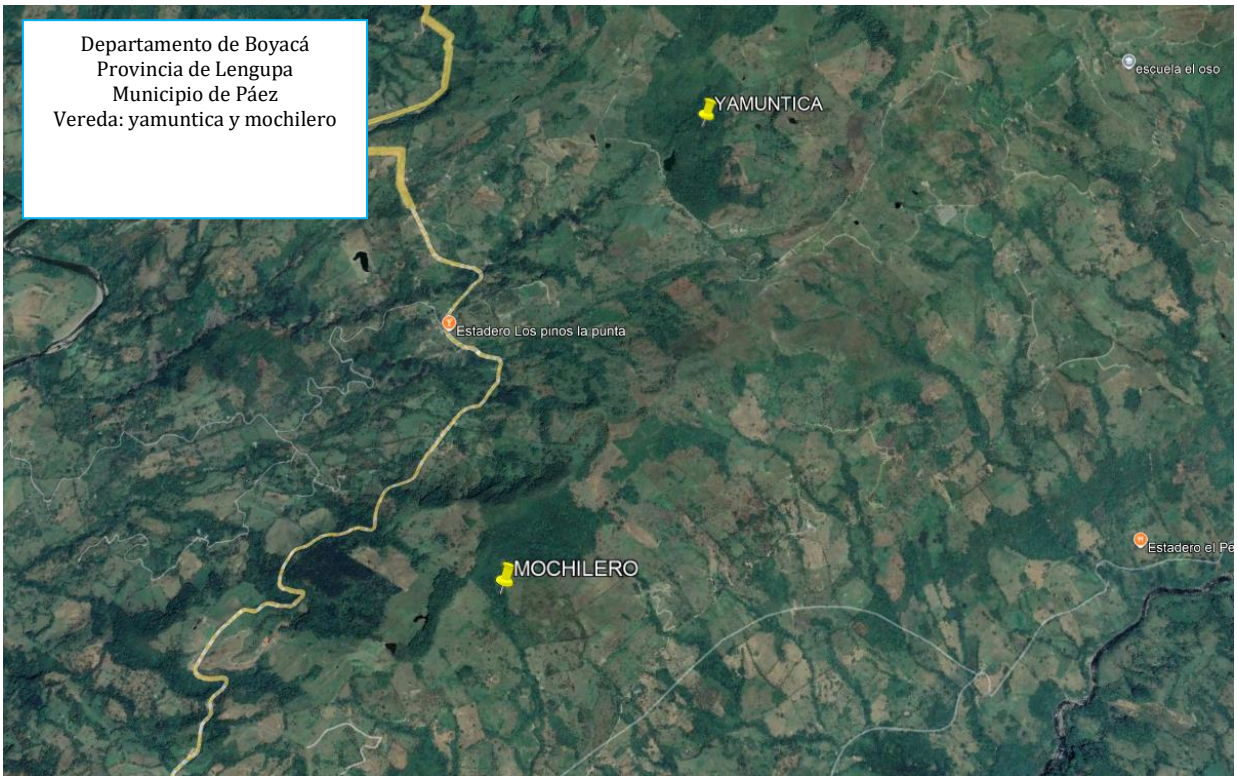

3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE PAEZ
CARGO / DEPENDENCIA	SECRETARIA DE PLANEACION
NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS
MODALIDAD	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ. CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PÁEZ, PARA: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE PÁEZ, BOYACÁ ", EN EL MARCO DEL PROYECTO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD
VALOR	VALOR TOTAL DEL CONVENIO: El valor total del convenio será por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS UN MIL SETECIENTOS PESOS $82.901.700 M/CTE, los cuales se discriminan así: CORPOBOYACÁ: Aportará en efectivo la suma de SESENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($62.375.883) M/CTE, correspondiente al 75,24% del valor del total del proyecto respaldados a través del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP NO. 2024001546 de fecha 03 de diciembre de 2024 y Certificado de Disponibilidad Presupuestal con autorización de vigencia futura CDP NO. 2024000014 de fecha 26 de diciembre de 2024. EL MUNICIPIO DE PÁEZ: Aporta al presente convenio la suma de VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($20.525.817) M/CTE, correspondiente al 24,76% del total del proyecto,

	respaldados con Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 773, de fecha 11 de noviembre de 2024 emitido el Municipio De Páez.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL FGC - 03 ACTA DE INICIACIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	04 DE JULIO DE 2025
PRORROGA 1	PRORROGA POR EL TÉRMINO DE NOVENTA Y CINCO (95) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA TERMINACIÓN DEL PLAZO INICIALMENTE ESTABLECIDO DENTRO DEL CNV 2024-016, ES DECIR A PARTIR DEL 5 DE JUNIO DE 2025 Y HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES Y NOVENTA Y CINCO (95) DÍAS CALENDARIO.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	07 DE SEPTIEMBRE DE 2025

4. ASPECTO TÉCNICO

A continuación, se relacionan y evidencian todas las actividades ejecutadas y aprobadas por supervisión, durante el periodo comprendido entre el 08 de Julio al 22 de agosto de 2025 mediante el contrato de prestación de servicios No CPS-23-MP-SA-014-2025.

4.1 ACTIVIDADES CONTRATADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
1,00	MANO DE OBRA				
1,01	JORNALES	UNIDAD	81,00	95.545,00	7.739.145,00
	COSTO GRUPO				7.739.145,00
2,00	INSUMOS				
2,01	Postes madera con 2,20 mts de altura, cuatro filos de 10x10cm amparada con factura de compra y preferiblemente de madera de Eucalipto	Unidad	1.126,00	45.300,00	51.007.800,00
2,02	Alambre de púas calibre 14 por 500 mts	Unidad	29,00	380.000,00	11.020.000,00
2,03	Grapa Galvanizada 1 pulgada, calibre 9	Kilogramo	29,00	14.210,00	412.090,00
2,04	Clavo de cuatro pulgadas por kg	Kilogramo	3,00	14.210,00	42.630,00
2,05	Transporte cargue y descargue	Unidad	1,00	9.996.895,00	9.996.895,00
	COSTO GRUPO				72.479.415,00
3,00	HERRAMIENTAS				
3,01	PALÍN CON CABO	UNIDAD	4,00	44.300,00	177.200,00
3,02	ALICATE 8"	UNIDAD	4,00	18.200,00	72.800,00
3,03	LIMA TRIANGULAR 6"	UNIDAD	10,00	12.380,00	123.800,00
3,04	MARTILLO CON MANGO DE MADERA 11 OZ	UNIDAD	4,00	36.400,00	145.600,00
3,05	ALICATE DIABLO 12"	UNIDAD	4,00	67.800,00	271.200,00
3,06	AZADÓN CON CABO	UNIDAD	4,00	60.340,00	241.360,00
3,07	BARRA DE ACERO 18 LB	UNIDAD	4,00	136.300,00	545.200,00
3,08	ZAPAPICO CON CABO 5 LB	UNIDAD	4,00	65.160,00	260.640,00
3,09	PALADRAGA CON CABO	UNIDAD	6,00	100.240,00	601.440,00
3,10	GUANTES DE CARNAZA X5 UND	UNIDAD	10,00	15.950,00	159.500,00
3,11	CABUYA DE FIQUE ECOLÓGICA X 500 M	UNIDAD	2,00	42.200,00	84.400,00
	COSTO GRUPO				2.683.140,00
	COSTO TOTAL				82.901.700,00


4.2 ACTIVIDADES TOTALES EJECUTADAS.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
1,00	MANO DE OBRA				
1,01	JORNALES	UNIDAD	81,00	95.545,00	7.739.145,00
	COSTO GRUPO				7.739.145,00
2,00	INSUMOS				
2,01	Postes madera con 2,20 mts de altura, cuatro filos de 10x10cm amparada con factura de compra y preferiblemente de madera de Eucalipto	Unidad	1.126,00	45.300,00	51.007.800,00
2,02	Alambre de púas calibre 14 por 500 mts	Unidad	29,00	380.000,00	11.020.000,00
2,03	Grapa Galvanizada 1 pulgada, calibre 9	Kilogramo	29,00	14.210,00	412.090,00
2,04	Clavo de cuatro pulgadas por kg	Kilogramo	3,00	14.210,00	42.630,00
2,05	Transporte cargue y descargue	Unidad	1,00	9.996.895,00	9.996.895,00
	COSTO GRUPO				72.479.415,00
3,00	HERRAMIENTAS				
3,01	PALÍN CON CABO	UNIDAD	4,00	44.300,00	177.200,00
3,02	ALICATE 8"	UNIDAD	4,00	18.200,00	72.800,00
3,03	LIMA TRIANGULAR 6"	UNIDAD	10,00	12.380,00	123.800,00
3,04	MARTILLO CON MANGO DE MADERA 11 OZ	UNIDAD	4,00	36.400,00	145.600,00
3,05	ALICATE DIABLO 12"	UNIDAD	4,00	67.800,00	271.200,00
3,06	AZADÓN CON CABO	UNIDAD	4,00	60.340,00	241.360,00
3,07	BARRA DE ACERO 18 LB	UNIDAD	4,00	136.300,00	545.200,00
3,08	ZAPAPICO CON CABO 5 LB	UNIDAD	4,00	65.160,00	260.640,00
3,09	PALADRAGA CON CABO	UNIDAD	6,00	100.240,00	601.440,00
3,10	GUANTES DE CARNAZA X5 UND	UNIDAD	10,00	15.950,00	159.500,00
3,11	CABUYA DE FIQUE ECOLÓGICA X 500 M	UNIDAD	2,00	42.200,00	84.400,00
	COSTO GRUPO				2.683.140,00
	COSTO TOTAL				82.901.700,00

ACTIVIDADES EJECUTADAS


Vereda	Predio		Aislamiento a Instalar (km)	Aislamiento instalado presente informe (km)	% ejecutado
MOCHILERO	Predio Manantial		0,43	0,43	100 %
	Predio Mangle o bocatoma		0,84	0,84	100 %
	Subtotales		**1,27**	**1,27**	**100 %**
YAMUNTICA	Predio Lote 2 - Los nacimientos		0,15	0,15	100%
	Predio Pensilvania –La Aurora		1,18	1,18	100%
	Subtotales		**1,33**	**1,33**	**100%**
TOTAL			**2,6**	**2,6**	**100 %**

Vereda Mochileros

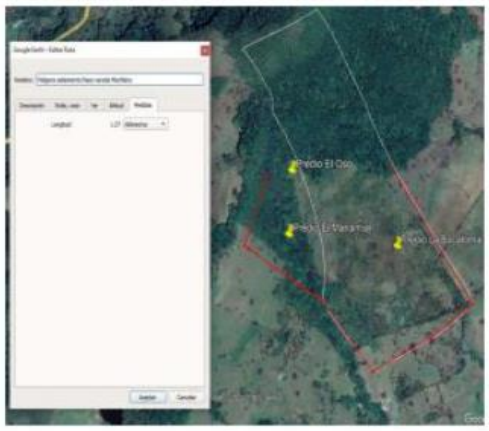



Vereda yamuntica.

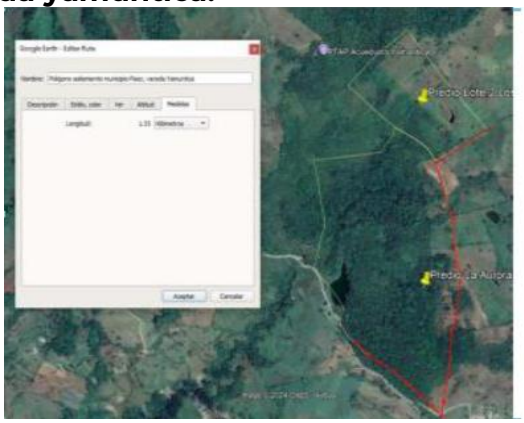



4. **CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES**

EJECUCION FISICA		
AVANCE PROGRAMADO	%	100%
AVANCE EJECUTADO	%	100%
EJECUCION FINACIERA		
AVANCE PROGRAMADO	%	100%
AVANCE EJECUTADO	%	100%

4.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO

- Jornales predios en la vereda Yamuntica





- Jornales Predios en la vereda Mochilero





- Postes madera con 2,20 mts de altura, cuatro filos de 10x10cm amparada con factura de compra y preferiblemente de madera de Eucalipto



- Alambre de púas calibre 14 por 500 mts



- Grapa Galvanizada 1 pulgada, calibre 9



- Clavo de cuatro pulgadas por kg



- Transporte cargue y descargue



- Palín con cabo



- Alicate 8"



- Lima triangular 6"



- Martillo con mango de madera 11 oz



- Alicate diablo 12"



- Azadón con cabo



- Barra de acero 18 lb



- Zapapico con cabo 5 lb



- Paladraga con cabo



- Guantes de carnaza x5 und



- Cabuya de fique ecológica x 500 m



4.2 CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES

Se verifico la calidad de los materiales de construcción y de los procesos constructivos empleados. La supervisión del contrato hizo periódicamente durante la ejecución de las actividades y constato la calidad de acuerdo a las especificaciones técnicas.

El supervisor verificó la correcta disposición del material vegetal extraído, asegurándose de que fuera colocado en los sitios apropiados designados para tal fin y en completo cumplimiento con las autorizaciones otorgadas por el propietario del terreno, garantizando así el adecuado manejo de los residuos vegetales

5. ASPECTO ADMINISTRATIVO, LEGAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL

OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	EVIDENCIA	%DE CUMPLIMIENTO
1. Garantizar el uso de los recursos del convenio para su respectiva ejecución, de conformidad las condiciones jurídicas, técnicas, presupuesto, lugar de ejecución, cantidades, especificaciones técnicas, cronograma, flujo de fondos y demás componentes convenidos debidamente formalizados en atención al debido proceso**.**	Se ha dio inicio al proceso de contratación en modalidad de Licitación Publica No. CPS-23-MP-SA-014-2025, en aras de ejecutar el objeto del presente convenio.	Carpetas físicas y proceso en SECOP I.	100%
2. Aportar la suma VEINTE MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS ($20.525.817)	Se han ejecutado el 80% de las actividades de la prestación de servicios	Fotografías Informes 3 de 3	100%
3. Abrir una cuenta bancaria a nombre del convenio, para el manejo de los recursos girados por CORPOBOYACÁ, y aportar certificación bancaria antes de que se suscriba el acta de inicio correspondiente	Se presento certificación Bancaria de BANCO AGRARIO de una cuenta de ahorros N 3-155-30-05003-0, denominada CONVENIO CORPOBOYACÁ 2024-016 MUNICIPIO DE PAEZ BOYACA, la cual se encuentra activa a la fecha	Certificación bancaria	100%
4. Adelantar los procesos de contratación	Se ha dio inicio al proceso de contratación en	Carpetas físicas y proceso en SECOP I.	100%

necesarios para la ejecución del proyecto aprobado por la Corporación, bajo los lineamientos del estatuto general de contratación, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y Decreto 1082 de 2015 y especialmente lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política que dispone: "la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad	modalidad de Licitación Publica No. CPS-23-MP-SA-014-2025, en aras de ejecutar el objeto del presente convenio.		
5. Realizar la supervisión del convenio y de los contratos derivados del mismo, atendiendo el debido proceso en atención a las funciones establecidas en el manual de supervisión e interventoría que aplique según disposición del municipio y/o la corporación, así como las demás normas pertinentes	Acta de designación de supervisor de contrato de prestación de servicios CPS-23-MP-SA-014-2025	Carpetas físicas y proceso en SECOP I.	100%

de acuerdo a la naturaleza de sus funciones; así mismo, debe allegar el acto administrativo a través del cual se delega y/o designa la supervisión cuando aplique			
6. Informar a Corpoboyacá, todas las acciones relacionadas con el gasto de recursos destinados y/o las anomalías que se puedan presentar con ocasión a la ejecución del convenio.	Se plantea la entrega del segundo informe dando cuenta de la ejecución de las actividades relacionadas específicamente al convenio y las derivadas del proceso de contratación	Informes 3 de 3, informe de entregas e informe de ejecución	100 %
7. Efectuar oportunamente una revisión minuciosa de las actividades del convenio y demás compromisos adquiridos debidamente planeados, a fin de compararlos con las presentadas en el proyecto aprobado por el banco de proyectos de la Corporación. En caso de discrepancia, el supervisor por parte del Municipio notificará a la Entidad, las modificaciones requeridas y establecerá su incidencia en la	Se revisaron oportunamente las actividades derivadas del convenio y demás compromisos adquiridos para ejecutar oportunamente el mismo.	Convenio y acta de inicio firmados	100%

planeación y el presupuesto del proyecto.			
8. Garantizar la ejecución física del convenio durante el plazo contractual de acuerdo al control y seguimiento contenido en el cronograma de actividades presentado.	Hasta la fecha se ha garantizado la realización del proceso de contratación conforme a lo planteado en el cronograma del proceso	Cronograma proceso contractual No. CPS-23-MP-SA-014-2025	100%
9. Rendir informes estipulados en el convenio, en los cuales se refleje el estado de avance técnico, administrativo y financiero del cumplimiento del objeto del convenio, registro fotográfico (Según aplique) de acuerdo a las observaciones, necesidades y/o requerimientos de CORPOBOYACÁ y/o los entes de control o cualquier otra entidad que los requiera. Dichos informes deberán ser entregados d conformidad con lo estipulado en el convenio.	Se plantea la entrega del segundo informe dando cuenta de la ejecución de las actividades relacionadas específicamente al convenio y las derivadas del proceso de contratación	Informes 2 de 3, informe de entregas e informe de ejecución	100 %
10. Atender los requerimientos, observaciones y/o recomendaciones que realice CORPOBOYACÁ dentro del término de cinco (5) días hábiles siguientes a	N/A	N/A	N/A

la fecha de radicado de la petición y/o de acuerdo a la fecha establecida para tal fin, entendiendo que estos corresponden a la esencia de la Supervisión del convenio y de los recursos.			
11. Formalizar con el ordenador del gasto y/o la Subdirección de Planeación y sistemas de información (Banco de Proyectos) de la Corporación, cuando aplique, y en atención al debido proceso, las solicitudes de modificación, previo cumplimiento de los requisitos que para tal efecto prevea la normatividad vigente	Se realizó trámite de Prorroga No.1	1 prorroga 1	100%
12. Aportar y/o gestionar los recursos que sean necesarios para garantizar la terminación y cumplimiento del alcance del presente convenio cuando se requieran ajustes o actividades no programadas, costos adicionales originados por causas no atribuibles a las partes o se requiera cualquier otro valor adicional no establecido en el presupuesto del	N/A	N/A	N/A

proyecto presentado por el municipio y legalizar las modificaciones y/o ajustes correspondientes**.**			
13. Asumir en su calidad de ejecutor, la responsabilidad de cualquier proceso de tipo legal que se pueda generar con ocasión a la ejecución de los contratos derivados del convenio y de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del convenio, cuando con ellos cause perjuicio a CORPOBOYACÁ o a terceros	N/A	N/A	N/A
14. Efectuar a través del profesional idóneo y competente la asistencia técnica en tiempo real el seguimiento, monitoreo y control a la ejecución del convenio y de los contratos derivados y efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes con el fin de garantizar la calidad de los trabajos y/u ordenar las correcciones a que haya lugar dentro de los términos	Acta de designación de supervisor de contrato de prestación de servicios CPS-23-MP-SA-014-2025	Carpetas físicas y proceso en SECOP I.	100%

establecidos para tal fin			
15. Imponer sanciones de apremio, con observancia y atención al debido proceso, de manera oportuna a los contratistas por incumplimiento parcial o total de las obligaciones de los contratos que se suscriban para la ejecución del convenio y si es el caso, adelantar las acciones prejudiciales y judiciales a que haya lugar y/oa recuperación de los recursos y al resarcimiento de los perjuicios irrogados, informando a la CORPORACIÓN toda acción que se adelante al respecto**.**	N/A	N/A	N/A
16. Estudiar las sugerencias, reclamaciones, consultas e indicadores que surjan en virtud de la ejecución de los contratos derivados, sobre aspectos técnicos, y resolver oportunamente en atención a sus competencias**.**	N/A	N/A	N/A
17. Mantener un sistema adecuado de archivo de toda la documentación	Carpeta en Físico	Carpeta en Físico	100%

derivada de la contratación y ejecución del convenio y garantizar su disponibilidad a CORPOBOYACÁ., como para los organismos de control. Esto incluye la información relacionada con los procesos de contratación, informes de visita y de seguimiento del proyecto, facturas, cuentas de cobro, comprobantes de pago, informes de gestión, soportes de autorización de pago, entre otros.			
18. Garantizar que los procesos de contratación derivados del convenio, pacten dentro su clausulado, formas de pago sujetas a los desembolsos de recursos establecidos en el convenio.	proceso de contratación de prestación de servicios No. CPS-23-MP-SA-014-2025,	Carpetas físicas y proceso en SECOP I.	100%
19. Autorizar los pagos a los contratistas derivados del convenio, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos.	proceso de contratación de prestación de servicios No. CPS-23-MP-SA-014-2025, con informe de avance al 50%, 90% y 100%	Carpetas físicas y proceso en SECOP I.	100%
20. Entregar para cada desembolso, enumeración,	Se raliza la entrega del informe No 3 donde se evidencia	Informe 3 de 3	100%

descripción y certificación de cumplimiento parcial y/o total de cada una de las obligaciones adquiridas por el municipio como ejecutor con ocasión al convenio. De igual manera, y en su calidad de supervisor, certificación de cumplimiento de cada una de las obligaciones adquiridas por los contratistas resultantes de los procesos derivados del convenio, junto con los respectivos soportes.	el cumplimiento de cada una de las obligaciones adquiridas		
21. Con el acta de terminación y recibo a satisfacción del convenio deberá hacer entrega tanto en medio físico como en magnético, los documentos e información generada en desarrollo del objeto del convenio	N/A	N/A	N/A
22. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro de acuerdo a los desembolsos de pago definida en la minuta del convenio.	Se realizó envío de documentos para realización de desembolso No.1 y N°2	Documentación solicitada: factura y demás	100%
23. Constituir las garantías pactadas en el convenio. El		Póliza de **CUMPLIMIENTO** No. 600-47-	

municipio deberá garantizar que las garantías estén vigentes durante toda la ejecución del convenio, para ello, deberá prever que la sociedad aseguradora que garantice el convenio no limite el tiempo asegurado a la vigencia del contrato de seguro. Concurrir oportunamente para la liquidación del convenio en cumplimiento del término estipulado en la minuta del mismo y/o en la normatividad vigente.	Se presenta la póliza de cumplimiento y responsabilidad civil, garantizando mantener la actualización según los tiempos de vencimiento de cada una	994000074677-0 anexo 3 y Póliza de **RESPONSABILIDAD CIVIL** No. 600-74-994000011960-0 anexo 2	100%
24. Requerir a los contratistas resultantes de los procesos de contratación derivados del convenio, que cumplan en caso de ser necesario las medidas de bioseguridad y garantizar el cuidado y la protección tanto del personal contratista como de los beneficiarios del proyecto	N/A	N/A	N/A
24. Una vez recibido a satisfacción el proceso de	N/A	N/A	N/A

restauración, el municipio será el único responsable de su posterior mantenimiento			

PRODUCTOS A ENTREGAR	AVANCES	FUENTE DE VERIFICACION
1) Informe final técnico, administrativo, legal, económico, financiero y ambiental con los respectivos soportes presentado por el supervisor del municipio.	En el presente informe se plasma la ejecución legal, económica, financiera y ambiental de la obra ejecutada al 100%.	Informe final municipio
2) Archivo fotográfico y descriptivo	Se presenta registro fotográfico del antes, durante y después de las actividades de obra	Formato registro fotográfico
3) Actas de terminación y liquidación de los contratos derivados	Acta de liquidación	Acta de liquidación proceso CPS-23-MP-SA-014-2025
4. Certificación de supervisión por parte del municipio en la cual señale:	Informes de supervisión	Informe de supervisión (1, 2 y 3)
5.Cumplimiento y paz y salvo de los contratos derivados	Oficio donde se deja plasmado la ejecución total de las actividades del contratista	Certificado de cumplimiento
6 cumplimiento y paz y salvos de actas de: (vecindad, concertación y entrega y recibo a satisfacción por parte de la comunidad).	Oficio donde se deja plasmado los permisos por parte de la comunidad para las actividades de obra	Certificado de cumplimiento actas de vecindad
7. Cumplimiento y paz y salvos de pólizas, actas, sábanas, bitácora, planos récord (físico y magnético) y demás documentos técnicos necesarios para liquidar los contratos derivados del convenio en atención a ley 80 de 1993, decreto 1082 de 2015 y demás normas que apliquen a la contratación estatal.	Documentación final de obra: acta de recibo final, acta de liquidación y pólizas	Póliza de **CUMPLIMIENTO** No. 600-47-994000074677 Y de RESPONSABILIDAD CIVIL No. 600-74-994000011960 de **ASEGURADORA SOLIDARIA**

8.Certificación de supervisión por parte del municipio en la cual señale cumplimiento de las obligaciones adquiridas con ocasión al convenio, adjuntando el respectivo cuadro junto con la descripción de su cumplimiento y respectivo soporte documental.	Documento en el cual señale cumplimiento de las obligaciones adquiridas con ocasión al convenio	Informe de supervisión
9. Declaración juramentada de parte del municipio en la cual se deje constancia de que: La responsabilidad en cuanto a calidad de obra, cantidades de obra, cumplimiento a las especificaciones técnicas es asumida en su totalidad por el municipio de Páez y los contratistas seleccionados con ocasión a la ejecución del convenio, en atención a sus competencias, librando a CORPOBOYACA y a sus funcionarios de cualquier proceso que se pueda adelantar por parte de los entes de control, posterior al recibo de las actividades objeto del convenio.	Declaración juramentada parte del municipio en la cual se deje constancia de que: La responsabilidad en cuanto a calidad de obra, cantidades de obra, cumplimiento a las especificaciones técnicas es asumida en su totalidad por el municipio de Páez	Declaración juramentada supervisor
10.Sabana del convenio en la cual se reflejen las condiciones contractuales, modificaciones y condiciones finales aprobadas y ejecutadas.	Sabana del convenio donde se refleja las cantidades ejecutadas de obra	Sabana final del convenio
11. Certificado de devolución de rendimientos financieros según corresponda	Se realizo la ejecución de la totalidad de los recursos	Certificado de rendimientos financieros
12. Pólizas actualizadas y debidamente aprobadas.	Se realizo la actualización de pólizas del convenio	Póliza de **CUMPLIMIENTO** No. 600-47-994000074677 Y de RESPONSABILIDAD CIVIL No. 600-74-994000011960 de **ASEGURADORA SOLIDARIA**
13 .Acta de terminación y/o liquidación del convenio según aplique.	Se realizo el acta de liquidación por parte del municipio	Acta de liquidación

14. Demás documentos requeridos por el supervisor y/o la entidad.		N/A para el presente periodo

8 CONCLUSIONES.

- Se cumplió con las actividades acorde con lo establecido en las especificaciones técnicas del convenio.
- Se realizó expedición y actualización de pólizas.
- Se realizaron los ajustes necesarios con el fin de cumplir con el objeto principal del convenio.
- Durante el desarrollo del proyecto no se presentó ningún accidente de los trabajadores.

SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

ACTA DE SOCIALIZACIÓN PROYECTO

En el Municipio de Páez, a los siete (07) días del mes de JULIO de 2025, se realizó socialización del proyecto denominado: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚA EN PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PÁEZ Y CORPOBOYACÁ.

LUGAR: VEREDA MOCHILERO

Generalidades del Proyecto:

CONTRATO N°:	CPS-23-MP-SA-014-2025
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚA EN PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PÁEZ Y CORPOBOYACÁ
CONTRATISTA:	RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S
R/L	RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES
FECHA CONTRATO:	TRES (03) DE JULIO DE 2025
DURACIÓN DEL CONTRATO:	UN (1) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 82.901.700,00

Los aquí firmantes hacemos constar que se nos informó del proyecto que pretende realizar IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚA EN PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PÁEZ Y CORPOBOYACÁ mejorando la calidad de vida de la población.

Nombres y apellidos:	Firma
Yalile Alonso Rojas	Yalile Alonso Rojas
Hernando Vaca Varga	
Blanca Cecilia Vaca C	Blanca. C. V

Continuación Firmas socialización proyecto IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚA EN PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PÁEZ Y CORPOBOYACÁ

Nombres y apellidos:	Firma
Luis Alfredo Reyes R	
Fernanda Ramirez Lozano	
Yenly Alexandra Bautista Dara	
Orlando Lopez B.	
Jilmar Farney moreno.	Jilmar Farney moreno.
Luis Alberto Vaca	
Rolfe Mendoza	
Fanny Vargas.	
Lidia Ruth Vargas.	
[illegible]	[illegible]
Mauricio Rojas	
miguel carranza m	miguel carranza m
[illegible]	
Bartolome Alfonso	Bartolome Alfonso
Blanca Cecilia Sanchez	Blanca cecilia Sanchez.
Jose primitivo Vargas	Jose Primitivo Vargas

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CPS-23-MP-SA-014-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PÁEZ Y RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PÁEZ.
NIT:	800.049.508-3.
CONTRATISTA:	RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT:	901057840-4
REPRESENTANTE LEGAL:	RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES
C.C:	9.506.083 DE PÁEZ
OBJETO:	"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚA EN PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PÁEZ Y CORPOBOYACÁ"
FECHA CONTRATO:	TRES (03) DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	OCHO (08) DE JULIO DE 2025
FECHA PRORROGA N°1:	SIETE (07) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO 2025
DURACIÓN INICIAL:	UN (01) MES
PRORROGA N°1:	QUINCE (15) DÍAS
DURACIÓN TOTAL:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO:	$ 82.901.700,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1:	$ 74.597.925,00
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 8.303.775,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 82.901.700,00

En el despacho de la Alcaldía del municipio de Páez, se reunieron **JUAN DIEGO MORALES CALDERÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 86.079.549 Expedida en Villavicencio Meta, obrando en su condición de Alcalde Municipal y por lo tanto representante legal del mismo, **SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS** identificada con la cédula de ciudadanía N° 33.366.924 expedida en Tunja, obrando en condición de Secretaria de Planeación e Infraestructura, y **RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S con Nit 901057840-4,** Representada legalmente por **RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES** Identificada con cedula de ciudadanía No. 9506083 Expedida en Páez, con la finalidad de dar recibo final al contrato en referencia de acuerdo a las siguientes cantidades.

CONTRACTUAL						ACTA PARCIAL 1		ACTA FINAL	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**VR UNITAR**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**
1,00	**MANO DE OBRA**								
1,01	JORNALES	UNIDAD	81,00	95.545,00	7.739.145,00	62	$ 5.923.790,00	19,00	$ 1.815.355,00
COSTO GRUPO					7.739.145,00		$ 5.923.790,00		$ 1.815.355,00
2,00	**INSUMOS**								
2,01	Postes madera con 2,20 mts de altura, cuatro filos de 10x10cm amparada con factura de compra y preferiblemente de madera de Eucalipto	Unidad	1.126,00	45.300,00	51.007.800,00	1.126	$51.007.800,00	0,00	$ 0,00
2,02	Alambre de púas calibre 14 por 500 mts	Unidad	29,00	380.000,00	11.020.000,00	12	$4.560.000,00	17,00	$ 6.460.000,00
2,03	Grapa Galvanizada 1 pulgada, calibre 9	Kilogramo	29,00	14.210,00	412.090,00	29	$412.090,00	0,00	$ 0,00
2,04	Clavo de cuatro pulgadas por kg	Kilogramo	3,00	14.210,00	42.630,00	1	$14.210,00	2,00	$ 28.420,00
2,05	Transporte cargue y descargue	Unidad	1,00	9.996.895,00	9.996.895,00	1	$ 9.996.895,00	0,00	$ 0,00
COSTO GRUPO					**72.479.415,00**		**$65.990.995,00**		**$ 6.488.420,00**
3,00	**HERRAMIENTAS**								
3,01	PALÍN CON CABO	UNIDAD	4,00	44.300,00	177.200,00	4,00	$177.200,00	0,00	$ 0,00
3,02	ALICATE 8"	UNIDAD	4,00	18.200,00	72.800,00	4,00	$ 72.800,00	0,00	$ 0,00
3,03	LIMA TRIANGULAR 6"	UNIDAD	10,00	12.380,00	123.800,00	10,00	$123.800,00	0,00	$ 0,00
3,04	MARTILLO CON MANGO DE MADERA 11 OZ	UNIDAD	4,00	36.400,00	145.600,00	4,00	$145.600,00	0,00	$ 0,00
3,05	ALICATE DIABLO 12"	UNIDAD	4,00	67.800,00	271.200,00	4,00	$271.200,00	0,00	$ 0,00
3,06	AZADÓN CON CABO	UNIDAD	4,00	60.340,00	241.360,00	4,00	$241.360,00	0,00	$ 0,00
3,07	BARRA DE ACERO 18 LB	UNIDAD	4,00	136.300,00	545.200,00	4,00	$545.200,00	0,00	$ 0,00
3,08	ZAPAPICO CON CABO 5 LB	UNIDAD	4,00	65.160,00	260.640,00	4,00	$ 260.640,00	0,00	$ 0,00
3,09	PALADRAGA CON CABO	UNIDAD	6,00	100.240,00	601.440,00	6,00	$ 601.440,00	0,00	$ 0,00
3,10	GUANTES DE CARNAZA X5 UND	UNIDAD	10,00	15.950,00	159.500,00	10,00	$ 159.500,00	0,00	$ 0,00
3,11	CABUYA DE FIQUE ECOLÓGICA X 500 M	UNIDAD	2,00	42.200,00	84.400,00	2,00	$ 84.400,00	0,00	$ 0,00
COSTO GRUPO					**2.683.140,00**		**$ 2.683.140,00**		$ 0,00
COSTO TOTAL					**82.901.700,00**		**$74.597.925,00**		**$ 8.303.775,00**

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE AVANCE		
DESCRIPCION	**VALORES**	
VALOR APORTADO POR CORPOBOYACA	$	62.375.883,00
VALOR APORTADO POR EL MUNICIPIO	$	20.525.817,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**82.901.700,00**
VALOR PAGO ACTA N°1 CORPOBOYACA	$	56.138.294,70
VALOR PAGO ACTA N°1 MUNICIPIO	$	18.459.630,30
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°1	**$**	**74.597.925,00**
VALOR PRESNETE ACTA	**$**	**8.303.775,00**
SALDO POR EJECUTAR CORPOBOYACA	$	6.237.588,30
SALDO POR EJECUTAR MUNICIPIO	$	2.066.186,70
SALDO TOTAL POR EJECUTAR	$	-

Para constancia se firma en Páez, a los 27/10/2025

SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS
Secretaria de Planeación e Infraestructura.
Supervisor

Rigoberto Numpaque

RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S
R.L: RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES
Contratista

JUAN DIEGO MORALES CALDERÓN
Alcalde Municipal

INFORME AVANCE DE OBRA 100%
CONTRATO DE OBRA No. CPS-23-MP-SA-014-2025



OBJETO: "IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA"

RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S

MUNICIPIO PÁEZ, BOYACÁ
26 DE AGOSTO DE 2025

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA: CARRERA 2 N° 2 -11 PAEZ BOYACA
TELEFONO: 311-2872722
E.MAIL: numpaque111@hotmail.com rsrconstruccionessas@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVO 3
3. GENERALIDADES 3
4. COMPONENTE TÉCNICO 4
4.1 PRESUPUESTO DE OBRA 4
4.2 AVANCE DE OBRA 5
4.1.2 UBICACIÓN LUGAR DE TRABAJO 5
5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 8
5.1 DATOS PÓLIZAS CONTRATISTA DE OBRA ACTA DE INICIO 8
5.1.1 PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 8
5.1.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 8
5.2 DATOS PÓLIZAS CONTRATISTA DE OBRA ADICION EN TIEMPO 1 8
5.1.1 PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 8
5.1.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 9
5.2 TRABAJADORES AFILIADOS 9
5.3 AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES 9
5.4 REVISIÓN Y CONTROL 9
5.4.1 Análisis de precios unitarios 10
5.4.2 Presupuesto y cantidad de obra 10
5.4.3 Revisión del contrato de construcción de la obra 10
5.4.4 Avance del contrato 10
5.4.5 Abrir y llevar bitácora 10
5.4.6 Control permanente 10
6. FINANCIERO 10
6.1 EJECUCIÓN DEL CONTRATO 10
6.2 BALANCE DE OBRA 11
7. BALANCE FINANCIERO 12

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato de obra No. CPS-23-MP-SA-014-2025 suscrito entre el municipio de Páez y RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S representado por RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES identificado con C.C No. 9.506.083 expedida en Páez; a continuación, se presenta el informe mensual de avance de obra del contrato que tiene como objeto la "implementación de acciones de restauración ecológica mediante el cerramiento con alambre de púa en predios de interés hídrico del municipio de Páez en el marco del convenio no CNV 2024-016 suscrito entre el municipio de Páez y Corpoboyacá". Por un valor total OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS UNOS MIL SETECIENTOS PESOS ($ 82.901.700,00) M/CTE

2. OBJETIVO

El objeto general del contrato es realizar es aislamiento de dos predios del municipio, en los cuales hay nacimientos de agua vitales para el abastecimiento del agua potable del municipio de Páez. Este aislamiento se realiza mediante cerca con alambre de púa, con el fin de evitar que animales puedan ingresar a estos predios a realizar posibles contaminaciones del recurso hídrico.

3. GENERALIDADES

No. CONTRATO Y FECHA	Contrato de prestación de servicios No. No. CPS-23-MP-SA-014-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.057.840-4 R/L RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES C.C. No. 9.506.083
OBJETO DEL CONTRATO	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA
No. DE IDENTIFICACION	NIT. 901057840-4
FECHA ACTA DE INICIO	08 de Julio de 2025
VALOR DEL CONTRATO	OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS UNOS MIL SETECIENTOS PESOS ($ 82.901.700,00) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Un (01) mes a partir de la firma del acta de inicio
ADICION EN TIEMPO No. 1	Quince (15) días calendario
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	Un (01) mes y quince(15) días

Ilustración 1 FICHA GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

4. COMPONENTE TÉCNICO

4.1 PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VR UNIT.	VR TOTAL
1,00	MANO DE OBRA				
1,01	JORNALES	UNIDAD	81,00	95.545,00	7.739.145,00
	COSTO GRUPO				7.739.145,00
2,00	INSUMOS				
2,01	Postes madera con 2,20 mts de altura, cuatro filos de 10x10cm amparada con factura de compra y preferiblemente de madera de Eucalipto	Unidad	1.126,00	45.300,00	51.007.800,00
2,02	Alambre de púas calibre 14 por 500 mts	Unidad	29,00	380.000,00	11.020.000,00
2,03	Grapa Galvanizada 1 pulgada, calibre 9	Kilogramo	29,00	14.210,00	412.090,00
2,04	Clavo de cuatro pulgadas por kg	Kilogramo	3,00	14.210,00	42.630,00
2,05	Transporte cargue y descargue	Unidad	1,00	9.996.895,00	9.996.895,00
	COSTO GRUPO				72.479.415,00
3,00	HERRAMIENTAS				
3,01	PALÍN CON CABO	UNIDAD	4,00	44.300,00	177.200,00
3,02	ALICATE 8"	UNIDAD	4,00	18.200,00	72.800,00
3,03	LIMA TRIANGULAR 6"	UNIDAD	10,00	12.380,00	123.800,00
3,04	MARTILLO CON MANGO DE MADERA 11 OZ	UNIDAD	4,00	36.400,00	145.600,00
3,05	ALICATE DIABLO 12"	UNIDAD	4,00	67.800,00	271.200,00
3,06	AZADÓN CON CABO	UNIDAD	4,00	60.340,00	241.360,00
3,07	BARRA DE ACERO 18 LB	UNIDAD	4,00	136.300,00	545.200,00
3,08	ZAPAPICO CON CABO 5 LB	UNIDAD	4,00	65.160,00	260.640,00
3,09	PALADRAGA CON CABO	UNIDAD	6,00	100.240,00	601.440,00

3,10	GUANTES DE CARNAZA X5 UND	UNIDAD	10,00	15.950,00	159.500,00
3,11	CABUYA DE FIQUE ECOLÓGICA X 500 M	UNIDAD	2,00	42.200,00	84.400,00
	COSTO GRUPO				2.683.140,00
	COSTO TOTAL				82.901.700,00

4.2 AVANCE DE OBRA

4.1.2 UBICACIÓN LUGAR DE TRABAJO



Ilustración 2 Fuente Google Earth, predio vereda Yamuntica



Ilustración 3 Fuente Google Earth, predio vereda Mochilero

- Jornales



- Alambre de púas calibre 14 por 500 mts



- Clavo de cuatro pulgadas por kg



DIRECCION DE CORRESPONDENCIA: CARRERA 2 N° 2 -11 PAEZ BOYACA
TELEFONO: 311-2872722
E.MAIL: numpaque111@hotmail.com rsrconstruccionessas@gmail.com

5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

5.1 DATOS PÓLIZAS CONTRATISTA DE OBRA ACTA DE INICIO

5.1.1 PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
No. Póliza **Compañía de seguros**	BY-100054223 SEGUROS MUNDIAL		**ANEXO 0**
AMPARO	**VIGENCIA**		**SUMA ASEGURADA**
Cumplimiento	03-07-2025	08-02-2026	$ 16.580.340,00
Prestaciones sociales	03-07-2025	08-08-2028	$ 16.580.340,00
Calidad del servicio	03-07-2025	08-02-2026	$ 16.580.340,00

5.1.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA No. CPS-23-MP-SA-014-2025		
No. Póliza **Compañía de seguros**	BY-100008468 SEGUROS MUNDIAL	**ANEXO 0**
AMPARO	**SUMA ASEGURADA**	
Amparo básico- predios, labores y operaciones	$ 284.700.000,00	
Patronal	$ 284.700.000,00	
Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.000,00	
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000,00	

5.2 DATOS PÓLIZAS CONTRATISTA DE OBRA ADICION EN TIEMPO 1

5.1.1 PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

POLIZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRATO DE OBRA No. CPS-23-MP-SA-014-2025		
No. Póliza **Compañía de seguros**	BY-100054223 SEGUROS MUNDIAL	**ANEXO 2**
AMPARO	**VIGENCIA**	**SUMA ASEGURADA**

Cumplimiento	08-07-2025	13-02-2026	$ 16.580.340,00
Prestaciones sociales	08-07-2025	13-08-2028	$ 16.580.340,00
Calidad del servicio	08-07-2025	13-02-2026	$ 16.580.340,00

5.1.2 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA No. CPS-23-MP-SA-014-2025		
No. Póliza **Compañía de seguros**	BY-100008468 SEGUROS MUNDIAL	**ANEXO 2**
AMPARO	**SUMA ASEGURADA**	
Amparo básico- predios, labores y operaciones	$ 284.700.000,00	
Patronal	$ 284.700.000,00	
Contratistas y subcontratistas	$ 284.700.000,00	
Vehículos propios y no propios	$ 284.700.000,00	

5.2 TRABAJADORES AFILIADOS

CARGO	NOMBRE	INTENSIDAD LABORAL (%)
RESIDENTE DE OBRA	DARIO SEBASTIAN NUMPAQUE HOLGUIN	100
AYUDANTE DE OBRA	ISRAEL PARRA VARGAS	100
AYUDANTE DE OBRA	ELKIN DIOMEDES BUENO CRUZ	100
AYUDANTE DE OBRA	DUBAN FELIPE ALVAREZ CRISTANCHO	100

5.3 AFILIACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Los trabajadores vinculados al contrato de obra CPS-23-MP-SA-014-2025 se afiliaron y se realizó el pago correspondiente a ARL, salud y pensión. (Anexo 3. Soportes de Pago Seguridad Social).

5.4 REVISIÓN Y CONTROL

5.4.1 Análisis de precios unitarios

Para el contrato No. CPS-23-MP-SA-014-2025 se presentó un presupuesto global donde se evidencio que lo expuesto en dicho informe está correcto.

5.4.2 Presupuesto y cantidad de obra

El presupuesto presentado por la entidad contratante se realizó de forma global, se verificaron los ítems y precios.

5.4.3 Revisión del contrato de construcción de la obra.

Se efectuó la revisión correspondiente a los documentos jurídicos del contrato.

5.4.4 Avance del contrato

El avance de la obra se evalúa de manera óptima debido a que se evidencia un avance del 90% del total de la obra. El cual es un redimiendo aceptable.

5.4.5 Abrir y llevar bitácora

En el (Anexo 4. Bitácora de obra) se encentra la bitácora de contrato CPS-23-MP-SA-014-2025

5.4.6 Control permanente

A la construcción de la obra se le ha realizado los controles pertinentes, de calidad de obra, equipos, materiales, bienes, insumos y productos que se requieren para la construcción del mismo.


6. FINANCIERO

En las actividades previstas en el contrato se traza el seguimiento financiero, en busca de analizar y supervisar la forma como el contratista ha invertido los recursos bajo su administración identificando los principales rubros donde se han transferidos los recursos, montos por ejecutar de las actividades, porcentajes de desarrollo de las actividades, grados de cumplimiento del programa de trabajo y otros factores adjuntos que determinan el estado actual del proyecto y permiten tomar decisiones de fondo sobre la forma que se deben desarrollar las actividades y la identificación de algunas situaciones particulares que generan atrasos o adelantos en el cronograma propuesto.

6.1 EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se realiza la ejecución a la obra contrastando las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción en corte del estimado entre el 08 de julio de 2025 al 22 de agosto de 2025, las cuales se han ejecutado de acuerdo la programación de obra realizada por el contratista y entregada a la supervisión de obra.

En la siguiente figura se evidencia la relación entre el % de avance de obra (actual)

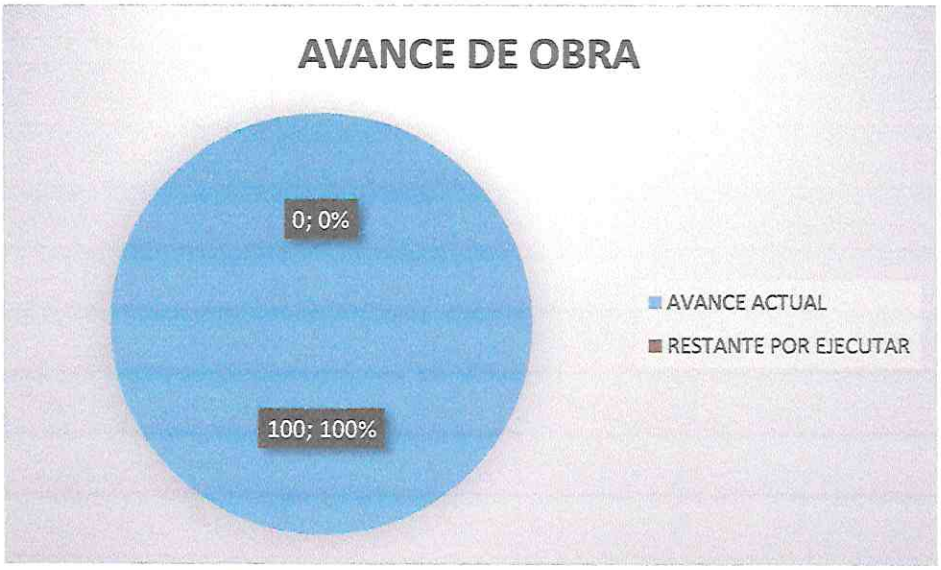

6.2 BALANCE DE OBRA

MUNICIPIO DE PAEZ - DEPARTAMENTO DE BOYACA

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CIV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA

CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-23-MP-SA-014-2025 — FECHA 26/08/2025

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRACTUAL			AVANCE 50%		AVANCE 90%		AVANCE 100%	
			CANT	VR UNITAR	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1.00	MANO DE OBRA										
1.01	JORNALES	UNIDAD	81.00	95,545.00	7,739,145.00	0.00	$ -	62	$ 5,923,790.00	81.00	$ 7,739,145.00
	COSTO GRUPO				7,739,145.00		$ -	COSTO GRUPO	$ 5,923,790.00	COSTO GRUPO	$ 7,739,145.00
2.00	INSUMOS										
2.01	Postes madera con 2,20 mts de altura, cuatro filos de 10x10cm amparada con factura de compra y preferiblemente de madera de Eucalipto	Unidad	1,126.00	45,300.00	51,007,800.00	916.00	$ 41,494,800.00	1,126	$ 51,007,800.00	1,126.00	$ 51,007,800.00
2.02	Alambre de púas calibre 14 por 500 mts	Unidad	29.00	380,000.00	11,020,000.00	0.00	$ -	12	$ 4,560,000.00	29.00	$ 11,020,000.00
2.03	Grapa Galvanizada 1 pulgada, calibre 9	Kilogramo	29.00	14,210.00	412,090.00	0.00	$ -	29	$ 412,090.00	29.00	$ 412,090.00
2.04	Clavo de cuatro pulgadas por kg	Kilogramo	3.00	14,210.00	42,630.00	0.00	$ -	1	$ 14,210.00	3.00	$ 42,630.00
2.05	Transporte cargue y descargue	Unidad	1.00	9,996,895.00	9,996,895.00	0.00	$ -	1	$ 9,996,895.00	1.00	$ 9,996,895.00
	COSTO GRUPO				72,479,415.00	COSTO GRUPO	$ 41,494,800.00	COSTO GRUPO	$ 65,980,995.00	COSTO GRUPO	$ 72,479,415.00
3.00	HERRAMIENTAS										
3.01	PALIN CON CABO	UNIDAD	4.00	44,300.00	177,200.00	0.00	$ -	4.00	$ 177,200.00	4.00	$ 177,200.00
3.02	ALICATE 8"	UNIDAD	4.00	18,200.00	72,800.00	0.00	$ -	4.00	$ 72,800.00	4.00	$ 72,800.00
3.03	LIMA TRIANGULAR 6"	UNIDAD	10.00	12,380.00	123,800.00	0.00	$ -	10.00	$ 123,800.00	10.00	$ 123,800.00
3.04	MARTILLO CON MANGO DE MADERA 11 OZ	UNIDAD	4.00	36,400.00	145,600.00	0.00	$ -	4.00	$ 145,600.00	4.00	$ 145,600.00
3.05	ALICATE DIABLO 12"	UNIDAD	4.00	67,800.00	271,200.00	0.00	$ -	4.00	$ 271,200.00	4.00	$ 271,200.00
3.06	AZADON CON CABO	UNIDAD	4.00	60,340.00	241,360.00	0.00	$ -	4.00	$ 241,360.00	4.00	$ 241,360.00
3.07	BARRA DE ACERO 18 LB	UNIDAD	4.00	136,300.00	545,200.00	0.00	$ -	4.00	$ 545,200.00	4.00	$ 545,200.00
3.08	ZAPAPICO CON CABO 5 LB	UNIDAD	4.00	65,160.00	260,640.00	0.00	$ -	4.00	$ 260,640.00	4.00	$ 260,640.00
3.09	PALADRAGA CON CABO	UNIDAD	6.00	100,240.00	601,440.00	0.00	$ -	6.00	$ 601,440.00	6.00	$ 601,440.00
3.10	GUANTES DE CARNAZA XS UND	UNIDAD	10.00	15,950.00	159,500.00	0.00	$ -	10.00	$ 159,500.00	10.00	$ 159,500.00
3.11	CABUYA DE FIQUE ECOLOGICA X 500 M	UNIDAD	2.00	42,200.00	84,400.00	0.00	$ -	2.00	$ 84,400.00	2.00	$ 84,400.00
	COSTO GRUPO				2,683,140.00	COSTO GRUPO	$ -	COSTO GRUPO	$ 2,683,140.00	COSTO GRUPO	$ 2,683,140.00
	COSTO TOTAL			COSTO TOTAL	82,901,700.00		$ 41,494,800.00		$ 74,587,925.00		$ 82,901,700.00

7. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
VALOR CONTRACTUAL	$ 82.901.700,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 82.901.700,00
VALOR PORCENTAJE EJECUTADO	100 %

Rigoberto Numpaque

Firma Contratista
RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES

DIRECCION DE CORRESPONDENCIA: CARRERA 2 N° 2 -11 PAEZ BOYACA
TELEFONO: 311-2872722
E.MAIL: numpaque111@hotmail.com rsrconstruccionessas@gmail.com

RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S

RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S NIT 901057840-4

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

CL 2 02 11 - Páez, Boyacá - Colombia

Tel.3112872722

numpaque111@hotmail.com

Calidad en Construcción

Responsabilidad Fisc

O-47 - Régimen Simple de Tributac

Act. Económica:773

Cliente: MUNICIPIO DE PAEZ

NIT ó CC: 800049508-3 **PERSONA:** Persona Jurídica

DIRECCIÓN: CR 3 5 37 SEC PALACIO MUNICIPAL

CIUDAD: Páez, Boyacá - Colombia

CORREO: tesoreria@paez-boyaca.gov.co

TELEFONO: 7594236 - 3214523454

RESPONS FISCAL: R-99-PN

RESPONS TRIBUTARIA: IVA

Factura electrónica de Venta **RSR160**

Fecha Creación: 2025-09-30 15:45

Fecha Validación: 2025-09-30 16:20

Fecha Vencimiento: 2025-09-30 23:59

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Efectivo

CUFE:1b278fdb5cae402ad38055969257e1dc922cfcbd1bc77d2e7cc3c8aa58beb0733ff6d64c6dc52f3b302b1c340afcf8c1

Modalidad: Electrónica - Número de Autorización: 18764074908483 desde RSR101 hasta RSR500 Vigencia: 2024-07-11 al 2026-07-11

N°	Codigo	Descripción	Cant	Precio	Impuesto	Total Impt.	Dto	Valor Total
1		Pago según acta de recibo final del contrato de prestación de servicios que tiene como objeto "Implementación de acciones de restauración ecológica mediante el cerramiento con alambre de púa en predios de interés hídrico del municipio de Páez en el marco del convenio no CNV 2024-016 suscrito entre el municipio de Páez y Corpoboyacá"	1.0	$ 8,303,775.00	IVA 0%	$ 0.00	0.0	$ 8,303,775.00

Información Adicional

Favor consignar a la cuenta de ahorros de Bancolombia No. 606-754173-45 a nombre de RS & R CONTRUCCIONES S.A.S

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Valor en letras

OCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Impuestos

Impuesto	Base Gravable	Valor Tributo
Exento	$ 8,303,775.00	$ 0.00

SUBTOTAL	$ 8,303,775.00
DESCUENTOS (-)	$ 0.00
PRECIO BASE	$ 8,303,775.00
IMPUESTOS (+)	$ 0.00
ANTICIPO	$ 0.00
TOTAL	**$ 8,303,775.00**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901057640
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RS RCONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAEZ	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 2 # 11	TELÉFONO:	7400000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	016 - TRABAJO SEBAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4618094038	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9993787204

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	23101-COLFONDOS	1	$ 174.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 174.700	$ 1.700	$ 176.400
230301	23031-PORVENIR	2	$ 235.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 235.500	$ 2.300	$ 237.800
SUBTOTALES:										**$ 410.200**	**$ 4.000**	**$ 414.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.900	$ 0	$ 600	$ 0	$ 89.500	$ 600	$ 0	$ 89.500
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 43.700	$ 0	$ 500	$ 0	$ 43.700	$ 500	$ 0	$ 44.200
SUBTOTALES:													**$ 133.600**	**$ 1.100**	**$ 0**	**$ 133.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD INP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 176.500	$ 176.500	$ 1.700	$ 0	$ 183.200
SUBTOTALES:									**$ 176.500**	**$ 1.700**	**$ 0**	**$ 183.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 102.600	$ 1.000	$ 103.600
SUBTOTALES:			**$ 102.600**	**$ 1.000**	**$ 103.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																												PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1022743547	ELVIRES CRISTANCHO DURAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	21															230301-PORVENIR	9	$ 379.600	$ 80.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 80.600	ESSC24-COOSALUD ESS	9	$ 379.600	$ 15.200	$ 0	$ 15.200	14-11 - ARL SURA	9	$ 379.600		$ 28.500	9	$ 379.600	CCF10-COMFABOY	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1057483483	NUEVO SPUZELLER MENESES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	05															230301-PORVENIR	25	$ 1.091.350	$ 174.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174.700	EPS042 - COOSALUD	25	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 43.700	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.091.350		$ 78.600	25	$ 1.091.350	CCF10-COMFABOY	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 9505537	PARRA VARGAS ISMAEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI	05															231001-COLFONDOS	25	$ 1.091.350	$ 174.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174.700	ESSC24-COOSALUD ESS	25	$ 1.091.350	$ 43.700	$ 0	$ 43.700	14-11 - ARL SURA	25	$ 1.091.350		$ 78.600	25	$ 1.091.350	CCF10-COMFABOY	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 801,700

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049656137
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		DARIO SEBASTIAN NUMPAQUE HOLGUIN	
CIUDAD-MUNICIPIO:	PAEZ	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 3 # 2-11 (BARRIO CENTRO)	TELÉFONO:	1900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4614884548	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio AÑO	2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9993450820

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA			TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 174,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 174,700	$ 0	$ 174,700
SUBTOTALES:											$ 174,700	$ 0	$ 174,700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 136,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136,500	$ 0	$ 0	$ 136,500
SUBTOTALES:													$ 136,500	$ 0	$ 0	$ 136,500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																											PENSIÓN					SALUD						ARP														
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1049656137	NUMPAQUE HOLGUIN DARIO SEBASTIAN	DEPEND		$ 1,423,500			NO	06	31														230301-PORVENIR	30	$ 1,091,350	$ 174,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 174,700	EPS037-NUEVA EPS	21	$ 1,091,350	$ 136,500	$ 0	$ 136,500			$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 311,200

Planilla Pagada
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901057849
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RS RCONSTRUCCIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	PAEZ	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 2 2 11	TELÉFONO:	7400000
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	016 - TRABAJO SEBAS
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4618899269	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9893787564

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	2	$ 243,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 243,100	$ 0	$ 243,100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 60,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60,800	$ 0	$ 60,800
SUBTOTALES:										$ 303,900	$ 0	$ 303,900

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS042	EPS042 - COOSALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 19,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19,000	$ 0	$ 0	$ 19,000
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57,000	$ 0	$ 0	$ 57,000
SUBTOTALES:													$ 76,000	$ 0	$ 0	$ 76,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	3		$ 0	$ 0		$ 0	$ 132,300	$ 132,300	$ 0	$ 0	$ 132,300
SUBTOTALES:									$ 132,300	$ 0	$ 0	$ 132,300

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF10	CCF10-COMFABOY	3	$ 76,000	$ 0	$ 76,000
SUBTOTALES:			$ 76,000	$ 0	$ 76,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES: PLANILLA | IBC | CCF ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

MUNICIPIO DE PAEZ - DEPARTAMENTO DE BOYACA

IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA

CANTIDADES ACTA PARCIAL No. 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-23-MP-SA-014-2025 — **FECHA 26/08/2025**

			CONTRACTUAL			AVANCE 50%		AVANCE 90%		AVANCE 100%	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VR UNITAR	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL	CANT	VR TOTAL
1.00	MANO DE OBRA										
1.01	JORNALES	UNIDAD	81.00	95,545.00	7,739,145.00	0.00	$ -	62	$ 5,923,790.00	81.00	$ 7,739,145.00
	COSTO GRUPO				7,739,145.00		$ -	COSTO GRUPO	$ 5,923,790.00	COSTO GRUPO	$ 7,739,145.00
2.00						INSUMOS					
2.01	Postes madera con 2,20 mts de altura, cuatro filos de 10x10cm amparada con factura de compra y preferiblemente de madera de Eucalipto	Unidad	1,126.00	45,300.00	51,007,800.00	916.00	$ 41,494,800.00	1,126	$ 51,007,800.00	1,126.00	$ 51,007,800.00
2.02	Alambre de púas calibre 14 por 500 mts	Unidad	29.00	380,000.00	11,020,000.00	0.00	$ -	12	$ 4,560,000.00	29.00	$ 11,020,000.00
2.03	Grapa Galvanizada 1 pulgada, calibre 9	Kilogramo	29.00	14,210.00	412,090.00	0.00	$ -	29	$ 412,090.00	29.00	$ 412,090.00
2.04	Clavo de cuatro pulgadas por kg	Kilogramo	3.00	14,210.00	42,630.00	0.00	$ -	1	$ 14,210.00	3.00	$ 42,630.00
2.05	Transporte cargue y descargue	Unidad	1.00	9,996,895.00	9,996,895.00	0.00	$ -	1	$ 9,996,895.00	1.00	$ 9,996,895.00
	COSTO GRUPO				72,479,415.00	COSTO GRUPO	$ 41,494,800.00	COSTO GRUPO	$ 65,990,995.00	COSTO GRUPO	$ 72,479,415.00
3.00	HERRAMIENTAS										
3.01	PALÍN CON CABO	UNIDAD	4.00	44,300.00	177,200.00	0.00	$ -	4.00	$ 177,200.00	4.00	$ 177,200.00
3.02	ALICATE 8"	UNIDAD	4.00	18,200.00	72,800.00	0.00	$ -	4.00	$ 72,800.00	4.00	$ 72,800.00
3.03	LIMA TRIANGULAR 6"	UNIDAD	10.00	12,380.00	123,800.00	0.00	$ -	10.00	$ 123,800.00	10.00	$ 123,800.00
3.04	MARTILLO CON MANGO DE MADERA 11 OZ	UNIDAD	4.00	36,400.00	145,600.00	0.00	$ -	4.00	$ 145,600.00	4.00	$ 145,600.00
3.05	ALICATE DIABLO 12"	UNIDAD	4.00	67,800.00	271,200.00	0.00	$ -	4.00	$ 271,200.00	4.00	$ 271,200.00
3.06	AZADÓN CON CABO	UNIDAD	4.00	60,340.00	241,360.00	0.00	$ -	4.00	$ 241,360.00	4.00	$ 241,360.00
3.07	BARRA DE ACERO 18 LB	UNIDAD	4.00	136,300.00	545,200.00	0.00	$ -	4.00	$ 545,200.00	4.00	$ 545,200.00
3.08	ZAPAPICO CON CABO 5 LB	UNIDAD	4.00	65,160.00	260,640.00	0.00	$ -	4.00	$ 260,640.00	4.00	$ 260,640.00
3.09	PALADRAGA CON CABO	UNIDAD	6.00	100,240.00	601,440.00	0.00	$ -	6.00	$ 601,440.00	6.00	$ 601,440.00
3.10	GUANTES DE CARNAZA X5 UND	UNIDAD	10.00	15,950.00	159,500.00	0.00	$ -	10.00	$ 159,500.00	10.00	$ 159,500.00
3.11	CABUYA DE FIQUE ECOLÓGICA X 500 M	UNIDAD	2.00	42,200.00	84,400.00	0.00	$ -	2.00	$ 84,400.00	2.00	$ 84,400.00
	COSTO GRUPO				2,683,140.00	COSTO GRUPO	$ -	COSTO GRUPO	$ 2,683,140.00	COSTO GRUPO	$ 2,683,140.00
	COSTO TOTAL			COSTO TOTAL	82,901,700.00		**$ 41,494,800.00**		**$ 74,597,925.00**		**$ 82,901,700.00**

Rigoberto Numpaque

RS&R CONSTRUCCIONES SAS
R/L RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES
CONTRATISTA

SANDRA LILIANA SOTRAGO ROJAS
SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISORA

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	1.01	DESCRIPCION	JORNALES	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 95,545

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS



DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
JORNALES	81.00	81.00
	TOTAL	81.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nemeque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	2.01	DESCRIPCION	Postes madera con 2,20 mts de altura, cuatro filos de 10x10cm amparada con factura de compra y preferiblemente de madera de Eucalipto	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 45,300

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	Postes madera con 2,20 mts de altura, cuatro filos de 10x10cm amparada con factura de compra y preferiblemente de madera de Eucalipto	1,126.00	1,126.00
		TOTAL	1,126.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nompaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	2.02	DESCRIPCION	Alambre de púas calibre 14 por 500 mts	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 380,000

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	Alambre de púas calibre 14 por 500 mts	29.00	29.00
		TOTAL	29.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nompaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	2.03	DESCRIPCION	Grapa Galvanizada 1 pulgada, calibre 9	UNIDAD	Kilogramo	V/ UNITARIO	$ 14,210

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	Grapa Galvanizada 1 pulgada, calibre 9	29.00	29.00
		TOTAL	29.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Numpaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	2.04	DESCRIPCION	Clavo de cuatro pulgadas por kg	UNIDAD	Kilogramo	V/ UNITARIO	$ 14,210

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	Clavo de cuatro pulgadas por kg	3.00	3.00
		TOTAL	3.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nompaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	2.05	DESCRIPCION	Transporte cargue y descargue	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 9,996,895

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	Transporte cargue y descargue	1.00	1.00
		TOTAL	1.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nompaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	3.01	DESCRIPCION	PALÍN CON CABO	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 44,300

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	PALÍN CON CABO	4.00	4.00
		TOTAL	4.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Numpaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	3.02	DESCRIPCION	ALICATE 8"	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 18,200

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	ALICATE 8"	4.00	4.00
		TOTAL	4.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nompaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	3.03	DESCRIPCION	LIMA TRIANGULAR 6"	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 12,380

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	LIMA TRIANGULAR 6"	10.00	10.00
		TOTAL	10.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nempaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	3.04	DESCRIPCION	MARTILLO CON MANGO DE MADERA 11 OZ	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 36,400

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	MARTILLO CON MANGO DE MADERA 11 OZ	4.00	4.00
		TOTAL	4.00

FIRMA SUPERVISOR:	FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Numpaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	3.05	DESCRIPCION	ALICATE DIABLO 12"	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 67,800

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	ALICATE DIABLO 12"	4.00	4.00
		TOTAL	4.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nompaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	3.06	DESCRIPCION	AZADÓN CON CABO	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 60,340

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	AZADÓN CON CABO	4.00	4.00
		TOTAL	4.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nompaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	3.07	DESCRIPCION	BARRA DE ACERO 18 LB	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 136,300

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	BARRA DE ACERO 18 LB	4.00	4.00
		TOTAL	4.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nimpaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	3.08	DESCRIPCION	ZAPAPICO CON CABO 5 LB	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 65,160

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	ZAPAPICO CON CABO 5 LB	4.00	4.00
		TOTAL	4.00

FIRMA SUPERVISOR:	FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nimpaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	3.09	DESCRIPCION	PALADRAGA CON CABO	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 100,240

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	PALADRAGA CON CABO	6.00	6.00
		TOTAL	6.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Numpuque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	3.10	DESCRIPCION	GUANTES DE CARNAZA X5 UND	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 15,950

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	GUANTES DE CARNAZA X5 UND	10.00	10.00
		TOTAL	10.00

FIRMA SUPERVISOR:		FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Nompaque

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO No. CPS-23-MP-SA-014-2025			
CONTRATISTA: RS&R CONSTRUCCIONES S.A.S			
SUPERVISOR: SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS			
IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE RESTAURACION ECOLOGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PUA EN PREDIOS DE INTERES HIDRICO DEL MUNICIPIO DE PAEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAEZ Y CORPOBOYACA	DIA	MES	AÑO
	26	8	25

ITEM	3.11	DESCRIPCION	CABUYA DE FIQUE ECOLÓGICA X 500 M	UNIDAD	Unidad	V/ UNITARIO	$ 42,200

REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ESQUEMAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	SUBTOTAL
	CABUYA DE FIQUE ECOLÓGICA X 500 M	2.00	2.00
		TOTAL	2.00

FIRMA SUPERVISOR:	FIRMA RESIDENTE DE OBRA:	Sebastian Numpaque

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CPS-23-MP-SA-014-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PÁEZ Y RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PÁEZ.
NIT:	800.049.508-3.
CONTRATISTA:	RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT:	901057840-4
REPRESENTANTE LEGAL:	RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES
C.C:	9.506.083 DE PÁEZ
OBJETO:	"IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE EL CERRAMIENTO CON ALAMBRE DE PÚA EN PREDIOS DE INTERÉS HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE PÁEZ EN EL MARCO DEL CONVENIO No CNV 2024-016 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PÁEZ Y CORPOBOYACÁ"
FECHA CONTRATO:	TRES (03) DE JULIO DE 2025
FECHA ACTA DE INICIO:	OCHO (08) DE JULIO DE 2025
FECHA PRORROGA N°1:	SIETE (07) DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	VEINTIDÓS (22) DE AGOSTO 2025
DURACIÓN INICIAL:	UN (01) MES
PRORROGA N°1:	QUINCE (15) DÍAS
DURACIÓN TOTAL:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR DEL CONTRATO:	$ 82.901.700,00
VALOR ACTA PARCIAL N°1:	$ 74.597.925,00
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 8.303.775,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	$ 82.901.700,00

En el despacho de la Alcaldía del municipio de Páez, se reunieron **JUAN DIEGO MORALES CALDERÓN**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 86.079.549 Expedida en Villavicencio Meta, obrando en su condición de Alcalde Municipal y por lo tanto representante legal del mismo, **SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS** identificada con la cédula de ciudadanía N° 33.366.924 expedida en Tunja, obrando en condición de Secretaria de Planeación e Infraestructura, y **RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S con Nit 901057840-4,** Representada legalmente por **RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES** Identificada con cedula de ciudadanía No. 9506083 Expedida en Páez, con la finalidad de dar por liquidado el Objeto del contrato en referencia.

RESUMEN DE EJECUCIÓN DE AVANCE		
DESCRIPCION	**VALORES**	
VALOR APORTADO POR CORPOBOYACA	$	62.375.883,00
VALOR APORTADO POR EL MUNICIPIO	$	20.525.817,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$**	**82.901.700,00**
VALOR PAGO ACTA N°1 CORPOBOYACA	$	56.138.294,70
VALOR PAGO ACTA N°1 MUNICIPIO	$	18.459.630,30
VALOR PAGADO ACTA PARCIAL N°1	**$**	**74.597.925,00**
VALOR PRESNETE ACTA	**$**	**8.303.775,00**
SALDO POR EJECUTAR CORPOBOYACA	$	6.237.588,30
SALDO POR EJECUTAR MUNICIPIO	$	2.066.186,70
SALDO TOTAL POR EJECUTAR	$	-

Para constancia se firma en Páez, a los 27/10/2025

SANDRA LILIANA BUITRAGO ROJAS
Secretaria de Planeación e Infraestructura.
Supervisor

RS & R CONSTRUCCIONES S.A.S
R.L: RIGOBERTO NUMPAQUE MORALES
Contratista

JUAN DIEGO MORALES CALDERÓN
Alcalde Municipal
