INFORME TÉCNICO DE RECIBO DE OBRAS DEL CONVENIO CNV-2024-016 FIRMADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PÁEZ Y CORPOBOYACÁ.

Interesado: CORPOBOYACÁ
Fecha Visita: 5 de septiembre del 2025

INFORME:
El día 5 de septiembre del 2025, se realizó visita técnica por parte de funcionarios adscritos a la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental de Corpoboyacá, a los sitios donde se desarrollaron las actividades de restauración pasiva establecidas en el CNV-2024-016 celebrado entre Corpoboyacá y el municipio de Páez, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-CORPOBOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAEZ, PARA: "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA EN EL MUNICIPIO DE PAEZ, BOYACA ", EN EL MARCO DEL PROYETO "CONSERVACIÓN Y GOBERNANZA DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD".
Dicha visita tuvo como objeto la revisión, verificación y recibo de las obras de restauración pasiva ejecutadas en los predios propiedad del Municipio de Paéz, según lo establecido en el convenio 2024-016, los productos a entregar son:

-Instalación de 2.6 km de aislamiento de acuerdo a las especificaciones definidas.

Dichas actividades se distribuían en los predios ubicados en las vereda yamuntica y Mochilero zonas como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. *Metas de restauración*

Vereda	PREDIO	AREA DEL PREDIO Ha	AISLMIENTO A INSTALAR Km
YAMUNTICA	Predio Lote 2 - Los nacimientos	5,5	0.15
	Predio Pensilvania - La Aurora	23	1.18
	TOTALES	**28,5**	**1,33**

Vereda	PREDIO	AREA DEL PREDIO Ha	AISLMIENTO A INSTALAR Km
MOCHILERO	predio el Oso	3	0
	Predio manantial	2,5	0.43
	Predio mangle o bocatoma	18,7	0.84
	TOTALES	**24,2**	**1.27**

Para el recibo de obras de tuvo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas establecidas en el numeral **1.1 METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTVIDADES PLANTEADAS**:

RESTAURACIÓN PASIVA (AISLAMIENTO):

1. Se realizó la revisión de la cerca, mediante un recorrido por cada uno de los linderos de los predios proyectados para realizar el aislamiento.









2. Se realizó la medición de la distancia entre cada uno de los postes,




3. Se realizó la medición para verificar la distancia de los pie de amigos los cuales se encentran cada 30 metros, cumpliendo con lo establecido en el convenio.




4. Se realizó la medición de la altura del poste (tamaño de los postes (10cmx10cm), se verifico que estuvieran apisonados y firmes.









5. Del alambre se evidencio completamente tensionado, con sus cuatro líneas separadas cada 30 cm, es de resaltar que donde se encontraba aislamiento, no se removió el alambre y los postes anteriores, quedando alternos y reforzados con las líneas de alambre anteriores, garantizando mayor protección.






LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA POR PREDIO:


Durante el recorrido se tomaron puntos, para verificar las cantidades de obra mediante la elaboración de los polígonos que se muestran a continuación, y determinar si cumplieron la meta establecida.

OBRAS DE RESTAURACIÓN PASIVA (AISLAMIENTO):

Vereda	PREDIO	AREA DEL PREDIO Ha	AISLMIENTO A INSTALAR Km
YAMUNTICA	Predio Lote 2 - Los nacimientos	5,5	0.15
	Predio Pensilvania - La Aurora	23	1.18
	TOTALES	**28,5**	**1,33**

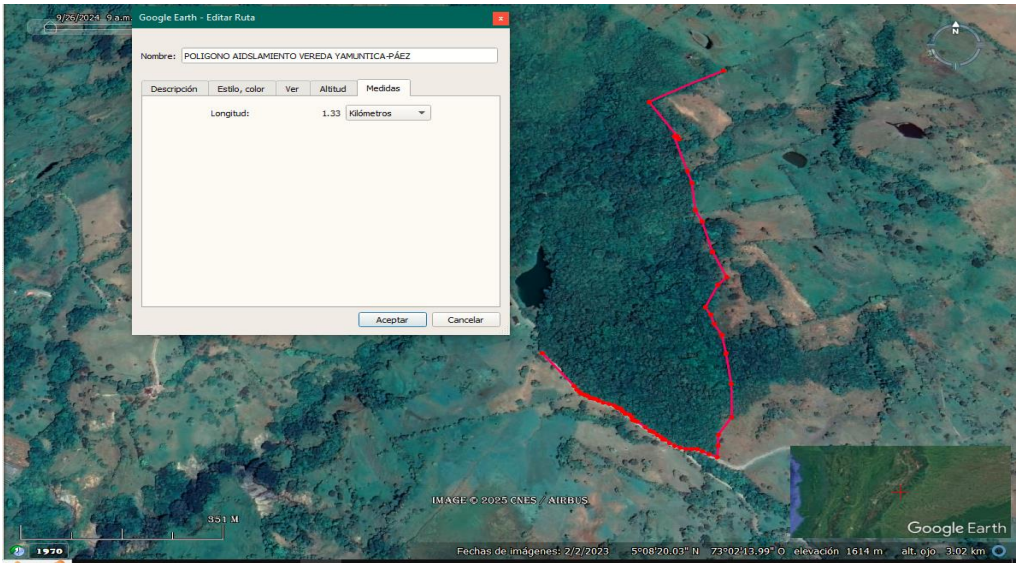

Vereda	PREDIO	AREA DEL PREDIO Ha	AISLMIENTO A INSTALAR Km
MOCHILERO	predio el Oso	3	0
	Predio manantial	2,5	0.43
	Predio mangle o bocatoma	18,7	0.84
	TOTALES	**24,2**	**1.27**

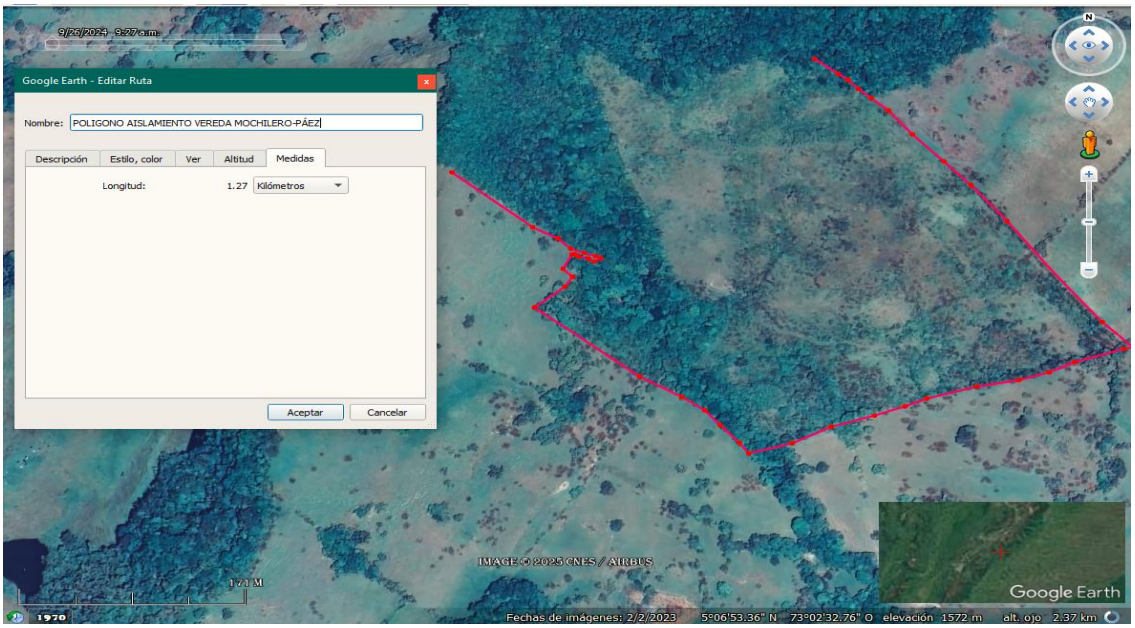

Conclusión

los trabajos se realizaron según las especificaciones técnicas estipuladas en el convenio las cantidades corresponden a las pactadas por tal razón la supervisión da por recibido a satisfacción las actividades y productos del convenio.

	Elaboró	Aprobó
Nombre:	Gilberto Nuñez Ardila	Maijdinayiver Mairan Gomez Cedeño
Cargo / Rol:	Técnico G-14 Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental	Profesional especializado G-16 Superviora CNV-2024-0016
Firma:	Gilberto Nuñez Ardila	
Fecha	5-09-2025	05-09-2025

Archivo: CNV 2024-016

Powered by CamScanner
