3. ACTA PARCIAL No 1.

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

4. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA.

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	1.549,96

FECHA	2025-11-10	MEMORIA	1	HOJA	1	DE	2

CAPÍTULO	1. PINTURA	ITEM	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	UNID.	ML	CODIGO	4









Localización	Dimensiones			EJEMPLARES	Medida Total
	Longitud	SECCION	CANTIDAD		
					0,00
ESTRUCTURA					0,00
COLUMNA EN ANGULO					0,00
DIAGONAL	6,10		2,00	12,00	146,40
VERTICAL	5,53		2,00	12,00	132,72
DIAGONAL INTERNA	1,02		2,00	12,00	24,48
DIAGONAL INTERNA	1,20		2,00	12,00	28,80
DIAGONAL INTERNA	1,27		2,00	12,00	30,48
DIAGONAL INTERNA	1,37		2,00	12,00	32,88
INTERIOR DE COLUMNAS					0,00
INTERIOR DE COLUMNAS		0,30	2,00	12,00	7,20
INTERIOR DE COLUMNAS		1,00	2,00	12,00	24,00
INTERIOR DE COLUMNAS		0,27	2,00	12,00	6,48
INTERIOR DE COLUMNAS		0,42	4,00	12,00	20,16
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	4,00	12,00	13,92
INTERIOR DE COLUMNAS		1,26	2,00	12,00	30,24
					0,00
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	2,00	12,00	6,96
INTERIOR DE COLUMNAS		0,59	2,00	12,00	14,16
INTERIOR DE COLUMNAS		1,27	2,00	12,00	30,48
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	2,00	12,00	6,96
					0,00
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	2,00	12,00	6,96
INTERIOR DE COLUMNAS		0,75	2,00	12,00	18,00
INTERIOR DE COLUMNAS		1,37	2,00	12,00	32,88
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	2,00	12,00	6,96
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
		Subtotal			621,12
		Vienen			0,00
		TOTAL			621,12

OBSERVACIONES:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	1.549,96

FECHA	2025-11-10	CORTE N°	1	HOJA	2	DE	2

CAPÍTULO	1. PINTURA	ITEM	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	UNID.	ML	CODIGO	4









Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Longitud	SECCION	CANTIDAD		
					0,00
COLUMNA EN ANGULO					0,00
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	2,00	12,00	6,96
INTERIOR DE COLUMNAS		0,90	2,00	12,00	21,60
INTERIOR DE COLUMNAS		1,44	2,00	12,00	34,56
INTERIOR DE COLUMNAS		1,31	2,00	12,00	31,44
		0,29	2,00	12,00	0,00
VIGA DE CUBIERTA					0,00
		CANT			0,00
DIAGONAL	0,83	1,00	16,00	12,00	159,36
VERTICAL	0,29	1,00	16,00	12,00	55,68
DIAGONAL	1,15	1,00	16,00	12,00	219,88
					0,00
VIGA TRANSVERSAL	24,98	1,00	2,00	6,00	299,76
					0,00
CERCHAS	33,20	1,00	1,00	3,00	99,60
					0,00
					0,00
					0,00


	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3


OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	881,65

FECHA	2025-11-10	MEMORIA	1	HOJA	1	DE	1

CAPÍTULO	1. PINTURA	ITEM	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	UNID.	M2	CODIGO	5



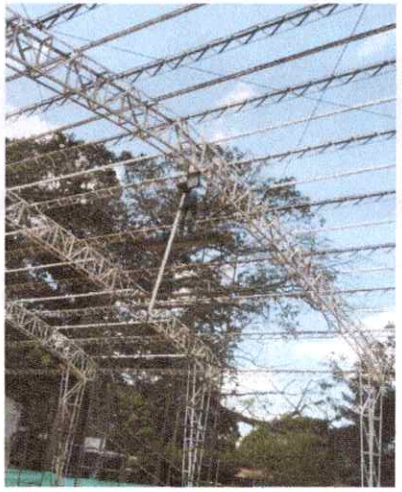

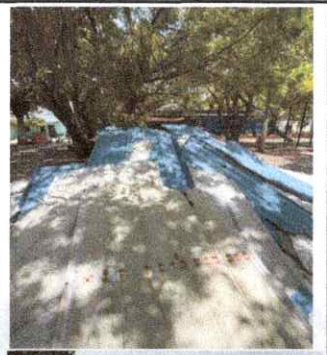



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Long		
					0,00
					0,00
					0,00
CUBIERTA	1,00	26,50	33,27	1,00	881,65
					0,00
					0,00
					0,00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3


OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	82,90

FECHA	2025-11-10	MEMORIA	1	HOJA	1	DE	1

CAPÍTULO	1. PINTURA	ITEM	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA 2 MM, TORNILLERIA Y SILICONA, ESTE PROCESO INCLUYE TRANSLADO VERTICAL DEL MATERIAL EN UNA ALTUYA APROCXIMADA DE 10 A 15 MTS DE ALTURA, LO QUE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL CERTIFICADO Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA TRABAJAR DE MANERA SEGURA A ESA ALTURA.	UNID.	M2	CODIGO	6





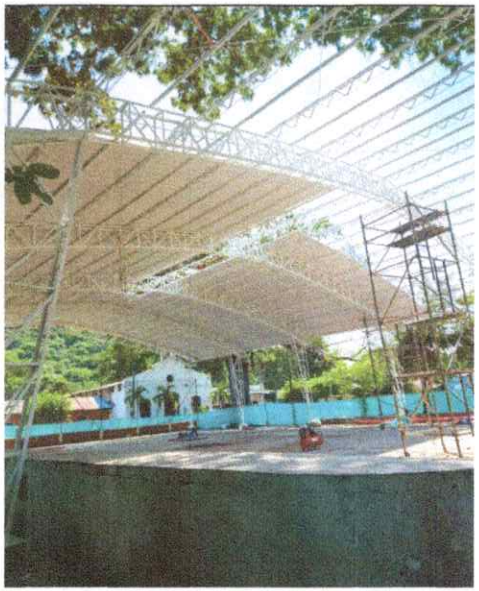

Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Long		
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
CUBIERTA	1,00	10,00	8,29	1,00	82,90
					0,00
					0,00
					0,00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	398,40

FECHA	18/09/25	MEMORIA	1	HOJA	1	DE	1

CAPÍTULO	1. PINTURA	ITEM	TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	UNID.	ML	CODIGO	8












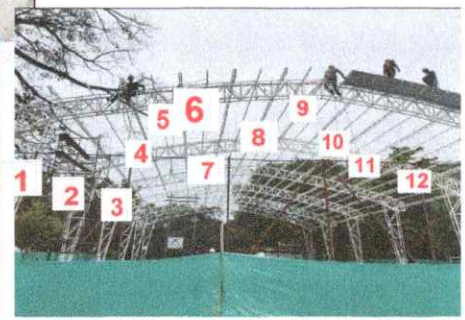



Localización	Dimensiones Alto	Ancho	Long	No Elem.	Medida Total
					0,00
					0,00
ARREGLO DE LINEAS DE					0,00
PERFILES					0,00
	1,00	1,00	33,20	12,00	398,40
					0,00
					0,00
					0,00

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	5,78

FECHA	2025-11-10	MEMORIA	1	HOJA	1	DE	1

CAPÍTULO	1. PINTURA	ITEM	REPARACION DE MALLA ESLABONADA CAL. 10	UNID.	M2	CODIGO	9



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Long		
					0,00
					0,00
REPARACION DE MALLA	0,60	1,00	2,41	4,00	5,78
					0,00
					0,00
					0,00


	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3


OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	1.549,96

FECHA	2025-11-10	MEMORIA	1	HOJA	1	DE	2

CAPÍTULO	1. PINTURA	ITEM	WASH-PRIMER PARA ESTRUCTURA	UNID.	ML	CODIGO	11



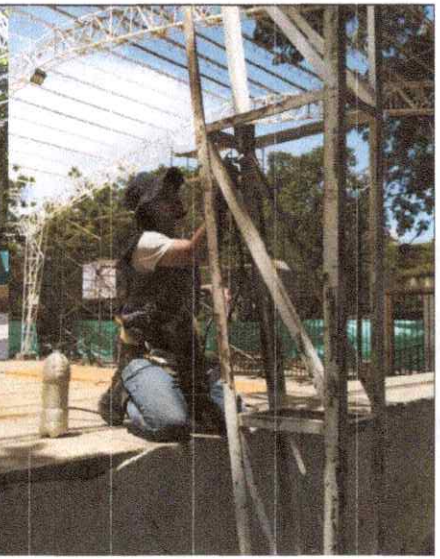

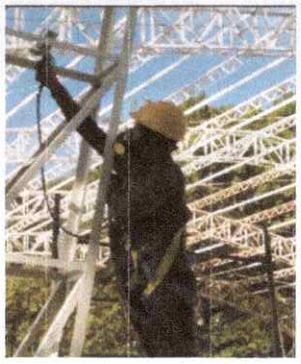



Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Long		
					0,00
ESTRUCTURA					0,00
COLUMNA EN ANGULO					0,00
DIAGONAL	6,10		2,00	12,00	146,40
VERTICAL	5,53		2,00	12,00	132,72
DIAGONAL INTERNA	1,02		2,00	12,00	24,48
DIAGONAL INTERNA	1,20		2,00	12,00	28,80
DIAGONAL INTERNA	1,27		2,00	12,00	30,48
DIAGONAL INTERNA	1,37		2,00	12,00	32,88
INTERIOR DE COLUMNAS					0,00
INTERIOR DE COLUMNAS		0,30	2,00	12,00	7,20
INTERIOR DE COLUMNAS		1,00	2,00	12,00	24,00
INTERIOR DE COLUMNAS		0,27	2,00	12,00	6,48
INTERIOR DE COLUMNAS		0,42	4,00	12,00	20,16
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	4,00	12,00	13,92
INTERIOR DE COLUMNAS		1,26	2,00	12,00	30,24
					0,00
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	2,00	12,00	6,96
INTERIOR DE COLUMNAS		0,59	2,00	12,00	14,16
INTERIOR DE COLUMNAS		1,27	2,00	12,00	30,48
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	2,00	12,00	6,96
					0,00
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	2,00	12,00	6,96
INTERIOR DE COLUMNAS		0,75	2,00	12,00	18,00
INTERIOR DE COLUMNAS		1,37	2,00	12,00	32,88
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	2,00	12,00	6,96
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
			Subtotal		621,12
			Vienen		0,00
			TOTAL		621,12

OBSERVACIONES:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUAUDAS CUNDINAMARCA	Código SA-04-01
	MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES	Versión 3

OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"				
CONSULTOR	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	CONTRATO	257-2025	TOTAL PROYECTADO	0,00
ENTIDAD	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS	ESTADO	ACTUALIZADO	TOTAL EJECUTADO	1.549,96

FECHA	2025-11-10	CORTE N°	1	HOJA	2	DE	2

CAPÍTULO	1. PINTURA	ITEM	WASH-PRIMER PARA ESTRUCTURA	UNID.	ML	CODIGO	11







Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
	Alto	Ancho	Long		
					0,00
					0,00
COLUMNA EN ANGULO					0,00
INTERIOR DE COLUMNAS		0,29	2,00	12,00	6,96
INTERIOR DE COLUMNAS		0,90	2,00	12,00	21,60
INTERIOR DE COLUMNAS		1,44	2,00	12,00	34,56
INTERIOR DE COLUMNAS		1,31	2,00	12,00	31,44
		0,29	2,00	12,00	0,00
VIGA DE CUBIERTA					0,00
		CANT			0,00
DIAGONAL	0,83	1,00	16,00	12,00	159,36
VERTICAL	0,29	1,00	16,00	12,00	55,68
DIAGONAL	1,15	1,00	16,00	12,00	219,88
					0,00
VIGA TRANSVERSAL	24,98	1,00	2,00	6,00	299,76
					0,00
CERCHAS	33,20	1,00	1,00	3,00	99,60
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Subtotal					928,84
Vienen					621,12
TOTAL					1.549,96

OBSERVACIONES:

INGENIERO ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ
MP: 25202215795 CND

INGENIERO DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

PERSONAL INICIAL		
	NOMBRES Y APELLIDOS	**No CEDULA**
1	JUAN CARLOS RUEDA	10.186.131
2	JENIFER FERNANDA COLORADOS BARRAGAN	1.110.509.577
3	JUAN DIEGO GOMEZ RUEDA	1.105.783.321
4	JEFERSON PABON OSORNO	1.039.693.454
5	JORDY ALEXANDER URBANO OLAYA	1.073.164.676
6	OLAYA GARZON LUIS CARLOS	14.318.397
7	JOHAN STEVEN SEPULVEDA ACERO	1.105.792.868

PERSONAL FINAL		
	NOMBRES Y APELLIDOS	**No CEDULA**
1	RODRIGO VELASQUEZ GAMBOA	11.807.829
2	GINO SAMIR OBANDO	16.929.250
3	JESUS DAVID ARIZA ARAGON	1.080.542.652
4	RONAL JOSE VELDEZ MANCILLA	19.600.457
5	HERNAN ENRIQUE BARRIOS CAMACHO	1.079.884.516

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **97.611.712**



PINZON MEDINA

APELLIDOS

OSCAR ERNESTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-MAR-1979**

SAN JOSE DEL GUAVIARE

(GUAVIARE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70	A-	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

01-ABR-1998 SAN JOSE DEL GUAVIARE

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-5400100-79135278-M-0097611712-20050217 00005050506 01 122363426

Libertad y orden
REPÚBLICA DE COLOMBIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

En Cumplimiento de la Ley 119 de 1994 y en atención a que

OSCAR ERNESTO PINZON MEDINA

Con Cedula de Ciudadanía No. 97.611.712

Cursó y aprobó el programa de Formación Profesional Integral
y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad, le confiere el

Título de

TECNÓLOGO EN

OBRAS CIVILES

En testimonio de lo anterior, se firma el presente Titulo en San José Del Guaviare,
a los veintinueve (29) días del mes de enero de dos mil quince (2015)

Firmado Digitalmente por
EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Autenticidad del Documento
Bogotá - Colombia

EDGAR AUGUSTO BRAGA SILVA
SUBDIRECTOR CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
REGIONAL GUAVIARE

10622789 - 29/01/2015
No y FECHA REGISTRO

La autenticidad de este documento puede ser verificada en el registro electrónico que se encuentra en la página web http://certificados.sena.edu.co, bajo el número 953300427959CC97611712C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA

COPNIA



CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN
PROFESIONAL AUXILIAR No.

25502-042204 CND
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES

DE FECHA **07/05/2015**
OSCAR ERNESTO
PINZON MEDINA
C.C. 97611712
SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE "SENA"

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Identificación Plástica S.A. 1(040) - 3/05-14

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003, que autoriza a su titular para ejercer como Profesional Auxiliar de la Ingeniería en todo el Territorio Nacional.

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA

Calle 78 No. 9 - 57 Oficina 1301 Tel: 636 5364 Bogotá D.C.
01 8000 116590

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2025-3922899

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que OSCAR ERNESTO PINZON MEDINA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 97611712, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de TECNOLOGIA EN OBRAS CIVILES con CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR 25502-042204 desde el 07 de Mayo de 2015, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 537.

2. Que el(la) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) CERTIFICADO DE INSCRIPCION PROFESIONAL - AUXILIAR se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Septiembre del año dos mil veinticinco (2025).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Oscar Ernesto Pinzón
Firma del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONSORCIO INGE-AD	CONSORCIO INGE-AD NIT: 901.784.077-9 CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO INGE-AD

CERTIFICA QUE

El señor **OSCAR ERNESTO PINZÓN MEDINA** identificado con cedula de ciudadanía No. 97.611.712, se desempeñó como **INSPECTOR EN EDIFICACIONES,** en nuestra empresa desde el desde el 17 de enero 2024 al 16 de agosto de 2024, desempeñándose satisfactoriamente en el cargo cumpliendo a cabalidad los objetivos asignados en los siguientes contratos.

- CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN LA VEREDA ALTO SARDINATA DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO META
  Contrato de obra No. 007 DE 26 DE DIC 2023
  Valor del contrato de obra: $2.095.793.367.05
  Tipo de vinculación: Por obra o labor.

La presente certificación se expide a solicitud de la interesado a los 25 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente,

Félix Omar Asprilla Gaitán.
Representante Legal
Consorcio INGE-AD

ACTA LIQUIDACION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 007 DE 2023

☐ LICITACION PUBLICA	☐ S.A. MENOR CUANTIA	☐ S.A. MINIMA CUANTIA	Fecha: jueves, 3 de julio de 2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación se confirma el Supervisor asumen plena responsabilidad sobre la veracidad de la información en ella contenida y en vía mantiene obligación garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993).

2) En el evento de que se hayan reconocido ítems a la fecha de esta acta el pago de los mismos sólo será procedente cuando se haya demostrado plenamente que en la ejecución del contrato se presentaron circunstancias o hechos especiales generadores de costos adicionales que deben ser cancelados al contratista. El contratista y el interventor de contrato serán plenamente responsables por los reconocimientos pactados.

3) El alcalde Municipal revisará que la información incluida en el acta sea correcta y como prueba de ello colocará su visto bueno. Su responsabilidad se limita a garantizar que el contrato se ajuste previo a la apertura del procedimiento de Supervisión contractual y revisión de las condiciones para su liquidación por parte del supervisor de contrato.

A) ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO: OBRA
CONTRATO No. 007 DE 26/12/2023 VIGENCIA 2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE UNA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA VEREDA ALTO SARDINATA DEL MUNICIPIO DE FUENTEDEORO META

LOCALIZACION DEL PROYECTO:

LOCALIDAD	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
VEREDA ALTO SARDINATA	FUENTEDEORO	META

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 212 DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: miercoles, 17 de enero de 2024 (DD: 17 MM: 01 AA: 2024)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DE OBRA: viernes, 16 de agosto de 2024 (DD: 16 MM: 08 AA: 2024)

VALOR DEL CONTRATO: $ 2.013.484.470,54

VALOR ADICION: $ 82.308.896,51

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 2.095.793.367,05

SON: DOS MIL NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS ($ 2.095.793.367,05) M/CTE

1. PRORROGAS

FECHA SOLICITUD	CONTRATO ADICIONAL N	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
12/08/2024	PRORROGA N°1	60
13/11/2024	PRORROGA N°2	30
		90

2. SUSPENSIONES

FECHA SOLICITUD	ACTA N	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
16/08/2024	SUSPENSION N°1	30
09/11/2024	AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N°1	15
22/11/2024	AMPLIACION N°2 A LA SUSPENSION N°1	15
		46

B) CRONOLOGIA DEL CONTRATO

FECHA INICIACIÓN DE LA OBRA	miercoles, 17 de enero de 2024
FECHA TERMINACION	viernes, 16 de agosto de 2024
FECHA DE ENTREGA FINAL DE LA OBRA	martes, 10 de junio de 2025
PLAZO TRANSCURRIDO (DIAS)	365
FECHA DE INICIACION DE OBRA:	miercoles, 17 de enero de 2024
PLAZO PRORROGADO	90 DIAS CALENDARIO
PLAZO SUSPENDIDO	46 DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL TRANSCURRIDO	360 DIAS CALENDARIO
FECHA TERMINACION DEFINITIVA	jueves, 15 de enero de 2026

1) ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.013.484.470,54
VALOR SOLICITADO EN ADICION:	$ 82.308.896,51

ACTA LIQUIDACION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 007 DE 2023

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$	2.095.783.367,05

La Supervisor presente y firmas mencionadas actúa de recibo final de obra a los avales correspondientes a la ejecución del presente contrato las cuales corresponden a las siguientes condiciones:

PAGOS EFECTUADOS

VALOR DEL ANTICIPO	$	-
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	$	1.208.099.982,32
VALOR ACTA FINAL DE OBRA	$	887.702.884,73
VALOR TOTAL PAGOS	**$**	**2.095.783.367,05**

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$	2.095.783.367,05
VALOR PAGO POR AMORTIZAR	$	-

CONTRATISTA: CONSORCIO INGE-AD
REPRESENTANTE LEGAL: ARBELLA GAITAN

INTERVENTORIA: GUILLERMO ROJAS PINEROS

SUPERVISOR: Ing. JAIME RADHYS GUALTEROS ARBOLEDA

Vo Bo SECRETARIO: Ing. JAIME RADHYS GUALTEROS ARBOLEDA

En el Municipio de Fuentedeoro - Meta a los 01 días del mes de julio de 2025, se reunieron en el Despacho de la Alcaldesa, Ana Shirley Gonzalez Gonzalez, identificado con la cedula de ciudadanía No. 40.615.512 expedida en Granada - Meta, quien actúa en calidad de Alcalde del Municipio de Fuentedeoro - Meta y por otra parte Felix Omar Aranda Gaitan, RA del CONSORCIO INGE-AD, Guillermo Rojas Bautista, en representación legal de la Interventoria y el supervisor del contrato el Ing. JAIME RADHYS GUALTEROS ARBOLEDA, como Secretario de Planeación y Obras publicas, con el objeto de proceder a liquidar por mutuo acuerdo el contrato de Obra que nos ocupa, suscrito entre el MUNICIPIO DE FUENTEDEORO y el CONSORCIO INGE-AD, de conformidad con el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.

Se deja constancia del recibo a satisfaccion por parte de la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas de la Alcaldia Municipal de Fuentedeoro con su respectivo informe final y registro fotográfico, en la cual se aprueban todas y cada una de las actividades involucradas en el desarrollo del presente contrato.

3) ORDENES DE PAGO

Los valores de la obra ejecutada y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo:

ACTA No.	MES EJEC.	ORDEN PAGO No.	FECHA	VALOR OBRA	VALOR AJUSTE	ANTICIPO		VALOR DE
						AMORTIZADO	SALDO	RETENCIÓN
PARCIAL N°1			15 DE JULIO DE 2024	$ 1.208.099.982,32	-	-	-	-
RECIBO FINAL			10 DE JUNIO DE 2025	$ 887.702.884,73				-
TOTALES				$ 2.095.783.367,05	-	-	-	-

CONDICIONES FINANCIERAS	CONTRATO	ANTICIPO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 2.731.464.471,84	
ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO	$ 42.708.495,21	
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 2.095.783.367,05	
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$ 1.208.099.982,32	
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 2.095.783.367,05	
VALOR SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL	$ 887.702.884,73	
VALOR POR EJECUTAR	$ 0,00	

3) Reservas Presupuestales.

Las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los avales cumplidos son los siguientes:

FUENTE DE FINANCIACION	REGISTRO PRESUPUESTAL		
SGR ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL SEGUN NBI Y MUNICIPIOS DE CUARTA QUINTA Y SEXTA CATEGORIA	829 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2023	$	2.053.964.871,84
	124 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024	$	42.708.495,21

C) ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

1) ACTAS TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA	APLICA
1	ACTA DE INICIO	17/01/2024	SI
2	ACTA PARCIAL N°1	18/07/2024	SI
3	ACTA DE PRORROGA N° 1	12/08/2024	SI
4	ACTA DE SUSPENSION N° 1	10/10/2024	SI
5	ACTA DE AMPLIACION N°1 A LA SUSPENSION N°1	08/11/2024	SI
6	ACTA DE ADICION N°2 A LA SUSPENSION N°1	22/11/2024	SI
7	ACTA DE REINICIO N° 1	13/12/2024	SI
8	ACTA DE MODIFICACION N°1 ADICION N°1 Y PRORROGA N°2	13/12/2024	SI
9	ACTA DE TERMINACION DE OBRA	15/01/2025	SI
10	ACTA DE RECIBO FINAL	10/06/2025	SI

2) Contratos Adicionales, Otros y Modificaciones Contractuales

ITEM	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA

ACTA LIQUIDACION DE OBRA

CONTRATO DE OBRA N° 067 DE 2023

1	ADICION	1	ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO DE OBRA No 067 DE 2023	$ 62.304.895,51
2				

3) Acciones Legales en Proceso

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE

4) Poliza de Garantia **APLICA:** **SI** X **NO**

El contratista presento el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta. Ja

COMPAÑIA	RIESGO	POLIZA No.	FECHA EXP.	Vr ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30-44-101084714	18/06/2025	$ 209.575.156,80	17/07/2024	16/07/2029
	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	30-44-101084714	18/06/2025	$ 104.787.578,40	17/07/2024	17/01/2029
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30-44-101084714	18/06/2025	$ 209.575.156,80	17/07/2024	16/07/2030
	ANTICIPO, ANEXO Y CORRESPONDE	30-44-101020868	18/07/2024	$ 344.000.000,00	17/01/2024	17/01/2025

5) Recibo de las Empresas Servicios Públicos (cuando aplique)

EMPRESA	ACTA No.	FECHA	OBSERVACIONES

6) Reconocimientos SI X NO

En el presente contrato se efectuaron los reconocimientos a los que da lugar su ejecución (ley) con fundamento en los artículos 5 y 6 del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y en las bases técnicas que a continuación se consignan, debidamente sustentadas y justificadas por el contratista y revisadas por el supervisor de (unidad)

6.1 Fundamento Tecnico

7. INFORME DEFINITIVO

Se anexa Informe Definitivo, donde se contiene el desarrollo de las actividades ejecutadas, entregada por el contratista mediante oficio al Supervisor del Contrato

El recibo de la obra, equipos y elementos relacionados en el ACTA DE RECIBO FINAL y la liquidación del contrato no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes

Por las anteriores razones, las partes se declaran a paz y salvo una vez realizado el último pago por todo concepto con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato de obra, en los términos del artículo 60 de la ley 80 de 1993 y 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta las que en ella intervinieron hoy **jueves, 3 de julio de 2025**

CONSORCIO INGE-AD
REPRESENTADO POR LA FIRMA
CONTRATISTA

Ing. JAIME ANDRES CABALLEROS ARBOLEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
Supervisor

GUILLERMO ROJAS PINEROS
Representante

ANA SHIRLEY GONZALEZ GONZALEZ
Alcaldesa

CARTA DE COMPROMISO

Yo, **OSCAR ERNESTO PINZÓN MEDINA,** identificado con cedula de ciudadanía No. 97.611.712 de San José del Guaviare, me comprometo a prestar mis servicios como **TECNOLOGO DE OBRA** en el Proceso de selección No. **SAMC - 014 DE 2025** cuyo objeto es **MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.**, de ser adjudicada al **CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025**, con una dedicación del 100%, en el municipio de Guaduas Cundinamarca.

Firmado a los 01 días del mes de octubre de 2025.

Atentamente,

Oscar Ernesto Pinzón

OSCAR ERNESTO PINZÓN MEDINA
C.C. 97.611.712 de San José del Guaviare
Cel. 3205485232
E-mail: ernestopinzon45@gmail.com

Trabajo Seguro en Alturas

LRI S.A.S

Aprobación Ministerio de trabajo ***No. 08SE2018220000000034177 del 18 de Septiembre del 2018***
Certificación BUREAU VERITAS ***No. CO25.00719 del 20 de Agosto del 2025***
En cumplimiento de la resolución 4272 de 2021 expedida por el ministerio de trabajo.

Otorga Certificado de capacitación y entrenamiento para Trabajo en Altura a:

JORDY ALEXANDER URBANO OLAYA

Identificado con ***CC*** *N°* ***1073164676***
cursó y aprobó la formación de

TRABAJO EN ALTURAS

Nivel: ***REENTRENAMIENTO***

Con una duración de **8** horas
Realizado en Bogotá del **27/10/2025** *al* **27/10/2025**

En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá D.C,
El **27/10/2025**

Enviado a capacitación y entrenamiento por parte de la empresa:
Razón Social: ***P&A SABOYA SAS***
NIT: ***900737814-7***
Rep. Legal: ***ANDRES FABIAN SABOYA DIAZ***
ARL: ***POSITIVA***

VIVIANA RAIGOSA JARAMILLO
C.C: 52976507
Entrenador para trabajo en alturas
Lic. SST # 6967 de 09/06/2016


EDWIN MAURICIO HUERTAS REYES
C.C: 1023886189
Representante Legal

Código de verificación
17687

Para verificar la autenticidad de este certificado:
Comuníquese a nuestra línea de atención **3217328266**
Ingrese a nuestro sitio web **https://lrialturas.com**

Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo
No. **8363 de 25/09/2023**

NIT: 900413167-9
Cra 79B No. 41F - 72 Sur
Teléfonos: 601 5662100
gerencia@lrisas.com

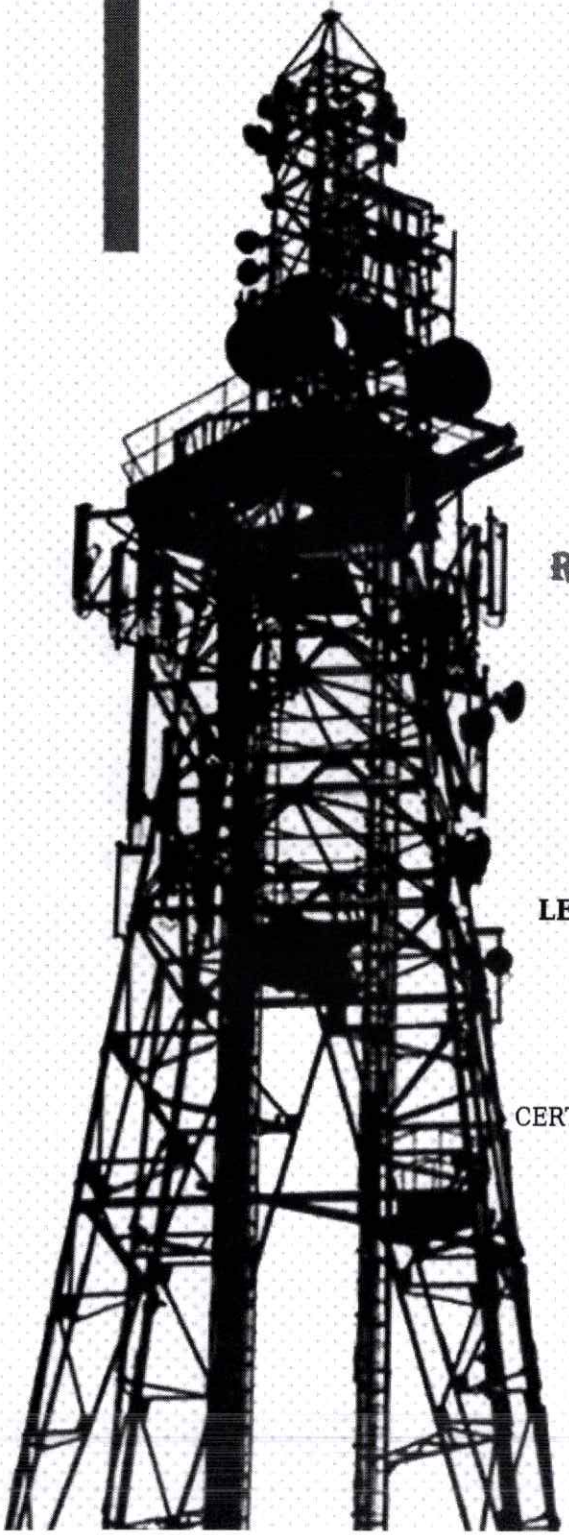

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.
SANT-MIGUEL S.A.S
PENSANDO EN TU SEGURIDAD E INTEGRIDAD

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.

SANT-MIGUEL S.A.S.

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

RODRIGO VELASQUEZ GAMBOA

Identificación No. 11807829

Realizo y curso el Programa de Capacitación en el nivel de:

REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS RESOLUCIÓN 4272/21


Durante los días 26-06-2025 al 26-06-2025 con una intensidad de 8 horas, en testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá a los 26 días el mes de junio de 2025

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Representante Legal
NIT: 900.968.228-1

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas
LSO 7953 DE 05/03/2021

Aprobación del Ministerio de Trabajo 08SE2021220000000002162
CERTIFICADO CENTRO LATINOAMERICANO DE CERTIFICACIÓN SAS CELAC SAS, ACREDITADO 18-CPR-002
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 2 de 07/01/2021
Carrera 88 # 136 - 42 SUBA SAN PEDRO - BOGOTÁ
MOVIL 318 788 04 38 PBX 6 92 95 62
PARA VERIFICAR ESTE CERTIFICADO INGRESA A https://www.cursosenalturas.com
Nombre de la empresa: CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS - NIT: 901065688
Representante Legal RODRIGO VELASQUEZ GAMBOA
Identificación: 901065688
ARL: SURA

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T SANT-MIGUEL SAS 2021

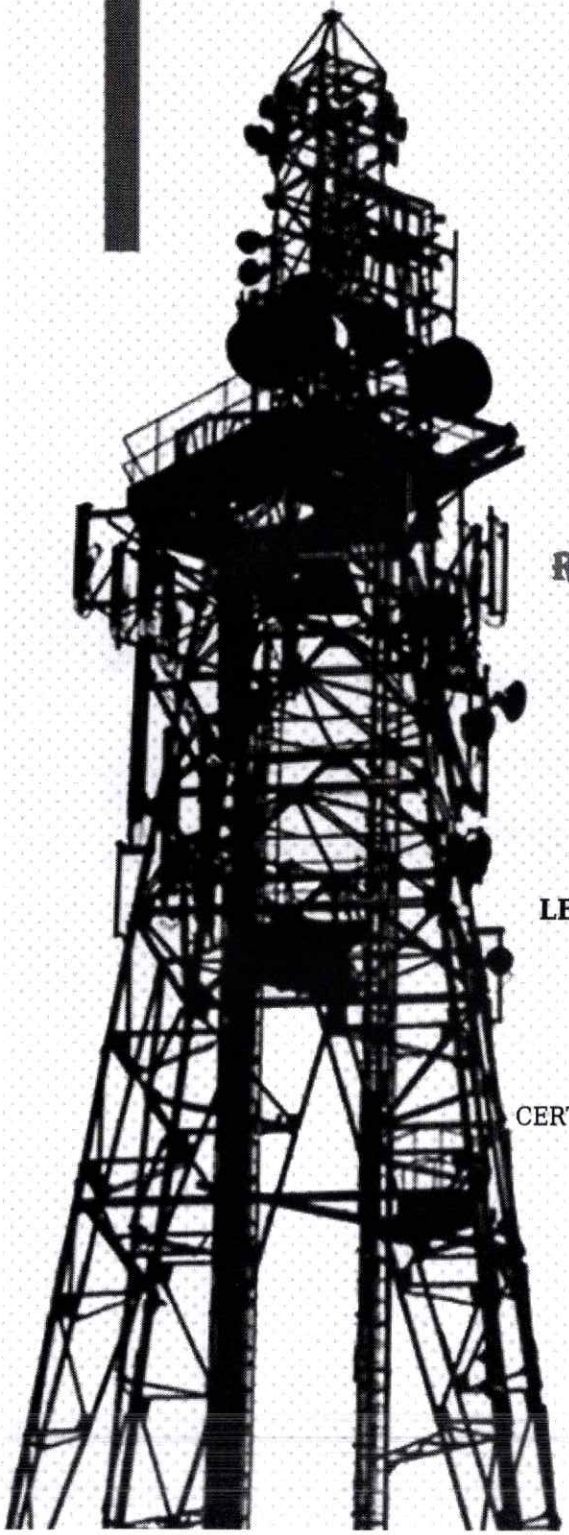

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.
SANT-MIGUEL S.A.S
PENSANDO EN TU SEGURIDAD E INTEGRIDAD

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.

SANT-MIGUEL S.A.S.

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

BRAYAN STIVEN ROMAÑA URRUTIA

Identificación No. 1007874651

Realizo y curso el Programa de Capacitación en el nivel de:

REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS RESOLUCIÓN 4272/21

Durante los días 27-09-2025 al 27-09-2025 con una intensidad de 8 horas, en testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá a los 27 días el mes de septiembre de 2025

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Representante Legal
NIT: 900.968.228-1

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas
LSO 7953 DE 05/03/2021

Aprobación del Ministerio de Trabajo 08SE2021220000000002162
CERTIFICADO CENTRO LATINOAMERICANO DE CERTIFICACIÓN SAS CELAC SAS, ACREDITADO 18-CPR-002
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 2 de 07/01/2021
Carrera 88 # 136 - 42 SUBA SAN PEDRO - BOGOTÁ
MOVIL 318 788 04 38 PBX 6 92 95 62
PARA VERIFICAR ESTE CERTIFICADO INGRESA A https://www.cursosenalturas.com
Nombre de la empresa: CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS - NIT: 901065688
Representante Legal RODRIGO VELASQUEZ GAMBOA
Identificación: 901065688
ARL: SURA

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T SANT-MIGUEL SAS 2021



TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.
SANT-MIGUEL S.A.S
PENSANDO EN TU SEGURIDAD E INTEGRIDAD

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.

SANT-MIGUEL S.A.S.

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

JESUS DAVID ARIZA ARAGON

Identificación No. 1080542652

Realizo y curso el Programa de Capacitación en el nivel de:

REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS RESOLUCIÓN 4272/21


Durante los días 17-05-2025 al 17-05-2025 con una intensidad de 8 horas, en testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá a los 17 días el mes de mayo de 2025

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Representante Legal
NIT: 900.968.228-1

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas
LSO 7953 DE 05/03/2021

Aprobación del Ministerio de Trabajo 08SE2021220000000002162
CERTIFICADO CENTRO LATINOAMERICANO DE CERTIFICACIÓN SAS CELAC SAS, ACREDITADO 18-CPR-002
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 2 de 07/01/2021
Carrera 88 # 136 - 42 SUBA SAN PEDRO - BOGOTÁ
MOVIL 318 788 04 38 PBX 6 92 95 62
PARA VERIFICAR ESTE CERTIFICADO INGRESA A https://www.cursosenalturas.com
Nombre de la empresa: CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS - NIT: 901065688
Representante Legal RODRIGO VELASQUEZ GAMBOA
Identificación: 901065688
ARL: SURA

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T SANT-MIGUEL SAS 2021

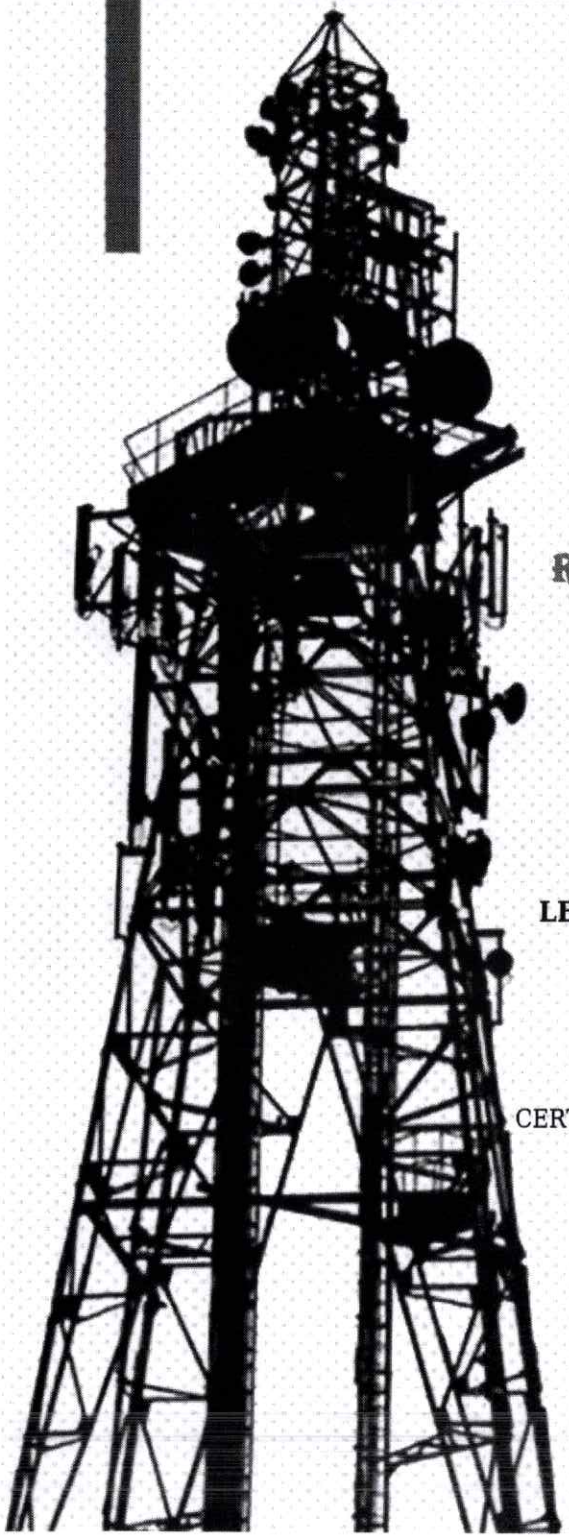

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.
SANT-MIGUEL S.A.S
PENSANDO EN TU SEGURIDAD E INTEGRIDAD

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.

SANT-MIGUEL S.A.S.

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

RONAL JOSE VALDEZ MANCILLA

Identificación No. 19600457

Realizo y curso el Programa de Capacitación en el nivel de:

REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS RESOLUCIÓN 4272/21


Durante los días 04-04-2025 al 04-04-2025 con una intensidad de 8 horas, en testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá a los 04 días el mes de abril de 2025

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Representante Legal
NIT: 900.968.228-1

ALEXANDER BERNAL VARGAS
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas
LSO 5596 DE 22/05/2017

Aprobación del Ministerio de Trabajo 08SE2021220000000002162
CERTIFICADO CENTRO LATINOAMERICANO DE CERTIFICACIÓN SAS CELAC SAS, ACREDITADO 18-CPR-002
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 2 de 07/01/2021
Carrera 88 # 136 - 42 SUBA SAN PEDRO - BOGOTÁ
MOVIL 318 788 04 38 PBX 6 92 95 62
PARA VERIFICAR ESTE CERTIFICADO INGRESA A https://www.cursosenalturas.com
Nombre de la empresa: CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS - NIT: 901065688
Representante Legal RODRIGO VELASQUEZ GAMBOA
Identificación: 901065688
ARL: SURA

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T. SANT-MIGUEL SAS 2021

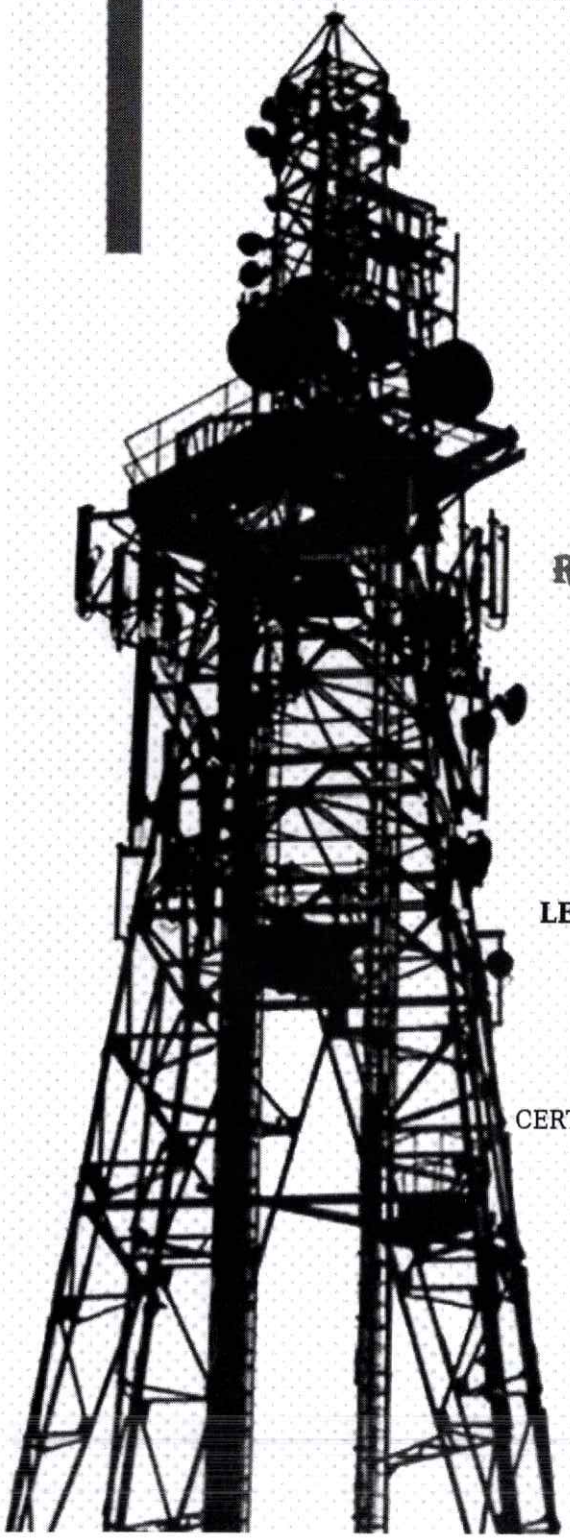

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.
SANT-MIGUEL S.A.S
PENSANDO EN TU SEGURIDAD E INTEGRIDAD

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T.

SANT-MIGUEL S.A.S.

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA TRABAJO EN ALTURA

WILBERTO GUTIERREZ AYALA

Identificación No. 73591415

Realizo y curso el Programa de Capacitación en el nivel de:

REENTRENAMIENTO TRABAJO EN ALTURAS RESOLUCIÓN 4272/21

Durante los días 03-10-2025 al 03-10-2025 con una intensidad de 8 horas, en testimonio de lo anterior se firma en la ciudad de Bogotá a los 03 días el mes de octubre de 2025

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Representante Legal
NIT: 900.968.228-1

LEONILDE LEON HERNANDEZ
Entrenador Trabajo Seguro en Alturas
LSO 7953 DE 05/03/2021

Aprobación del Ministerio de Trabajo 08SE2021220000000002162
CERTIFICADO CENTRO LATINOAMERICANO DE CERTIFICACIÓN SAS CELAC SAS, ACREDITADO 18-CPR-002
Licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución 2 de 07/01/2021
Carrera 88 # 136 - 42 SUBA SAN PEDRO - BOGOTÁ
MOVIL 318 788 04 38 PBX 6 92 95 62
PARA VERIFICAR ESTE CERTIFICADO INGRESA A https://www.cursosenalturas.com
Nombre de la empresa: CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS - NIT: 901065688
Representante Legal RODRIGO VELASQUEZ GAMBOA
Identificación: 901065688
ARL: SURA

TRABAJO EN ALTURAS S.S.T SANT-MIGUEL SAS 2021

5. JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025

JUSTIFICACIÓN DE IMPREVISTOS ACTA PARCIAL No 1

Guaduas 10 noviembre de 2025

Por medio de la siguiente relación se presenta la justificación de los imprevistos en el trascurso de la ejecución del Obra.

ITEM	ACTIVIDAD	UBICACIÓN	JUSTIFICACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	REFERENCIA PRECIO	VALOR / UNITARIO	VALOR/ TOTAL
1.1	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M	POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA	Se realizo la instalación de un cerramiento en lona para la protección del personal como de las personas o niños que quisieran entrar y estuvieran en trabajos	M3	136,88	COMERCIAL	$ 32.738,00	$ 4.481.203,01
VALOR IMPREVISTOS								**$ 4.481.203,01**

El valor total de los imprevistos presentados en la obra es de **($ 4.481.203,01**), CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS CON UN CENTAVO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella,

CONTRATISTA,

CONSORCIO INTERDEPORTES GUADUAS 2025
ANDRES SABOYA DIAZ
NIT 901.985.348-2

SUPERVISOR,

INGENIERO DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
INGENIERO CIVIL
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025

6. INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA.

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDÍA MUNICIPAL	**CONSORCIO INTERDEPORTES 2 GUADUAS 2025** **INFORME EJECUTIVO DE OBRA DE ACTA PARCIAL No 1**	Escudo de Armas CÓDIGO CON-EO-03 VERSIÓN FORMATO: 3

PROYECTO: "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA" **CODIGO:** CON-01

FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2025 **PERIODO No. 01** **DEL** 01/10/2025 AL 10/11/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA	CO- 257-2025
OBJETO	"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"
LOCALIZACION	POLIDEPORTIVO BOMBONERA- PUERTO BOGOTA - GUADUAS- CUNDINAMARCA

2- CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE OBRA:	257-2025	
FECHA CONTRATO:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE OCTUBRE DE 2025	
FECHA FINAL DE OBRA:	30 DICIEMBRE DE 2025	
PLAZO TRANSCURRIDO:	40 Dias	
VALOR INICIAL:	$	260.000.000,00
VALOR ADICION (ES)	$	38.000.000,00
VALOR FINAL:	$	298.000.000,00
VALOR ANTICIPO:	$	-
VALOR ACTA PARCIAL N°1:	$	119.200.000,00
VALOR POR PAGAR:	$	178.800.000,00

3- INFORMACIÓN INTERVENTORIA

SUPERVISION	SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR	INGENIERO DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS

4- INDICADORES DE GESTION

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

REQUISITOS	CUMPLIDO	PENDIENTE	CALCULO	TOTAL
Acta de Inicio	X		Cumplidos / Exigidos x 100	100,00%
Expedicion POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO 1-2-3-4-5	X			
Expedicion POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 1-2-3-4-5	X			
Afiliaciones de Personal	X			
Documentacion de Equipos - Andamio certificado	X			
Instalacion de Valla Informativa	X			
	X			

5- SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE OBRA

No.	DESCRIPCIÓN DE LA PROGRAMACION	FECHA PROGRAMADA	FECHA REAL DE CUMPLIMIENTO	DÍAS DE RETRASO
	SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO (HITO OBLIGATORIO)			
1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	2025-10-05	2025-10-05	N/APLICA
2	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	2025-10-10	2025-10-10	N/APLICA
3	DESMONTE DE REFLECTORES	2025-10-11	2025-10-11	N/APLICA
4	CORTE CON PULIDORA TORNILLERIA DE ESTRUCTURA	2025-10-13	2025-10-12	N/APLICA
5	LIJADO DE ESTRUCTURA METALICA	2025-10-15	2025-10-17	N/APLICA
6				
7				
8				
9				
	ENTREGA A LA SUPERVISIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/O ACTIVIDADES CONTRATADAS (HITO OBLIGATORIO)	2025-10-30	2025-10-30	Empezado


Este cuadro de resumen se enfoca en las actividades terminadas, por lo que la fecha real de cumplimiento en cero indica que no se ha terminado un hito más no es indicador de inicio.

ITEM		DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	CUMPLIDO	PENDIENTE	PENDIENTE POR ADICION	CALCULO	TOTAL
1	19.6.	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO ESPESOR SEGÚN NORMA	ML	517,00	4.572,00	2.363.724,00		X			100%
2	14.44.	DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	162,80	21.283,00	3.464.872,40		X			
3	18.9.	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	95,02	23.317,00	2.215.581,34		X			
4	***	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	1549,96	4.868,00	7.545.183,33		X			
5	1.36.	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	881,65	16.327,00	14.394.699,55	X				
6	***	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA 2 MM, TORNILLERIA Y SILICONA, ESTE PROCESO INCLUYE TRANSLADO VERTICAL DEL MATERIAL EN UNA ALTUYA APROCXIMADA DE 10 A 15 MTS DE ALTURA, LO QUE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL CERTIFICADO Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA TRABAJAR DE MANERA SEGURA A ESA ALTURA.	M2	881,65	133.465,00	117.669.417,25		X			
7	7.12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	0,00	89.387,00	0,00		X			
8	***	TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	ML	398,40	47.568,00	18.951.091,20	X	X			
9	***	REPARACION DE MALLA ESLABONADA CAL. 10	M2	5,78	40.262,00	232.714,36	X				
10	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFECTOR LUZ LED 400 W	UN	12,00	567.892,00	6.814.704,00		X			
11	***	WASH-PRIMER PARA ESTRUCTURA	ML	1549,96	24.153,00	37.436.074,95	X	X			

12	12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	1,00	627.550,00	627.550,00		X		
13	18.23.	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,00	11.888,00	0,00		X		
14	18.16.	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	26.105,00	0,00		X		
15	19.2.	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	0,00	15.423.826,00	0,00		X		
		ITEMS NO PREVISTOS								
NP-1	19,5	CANCHA MÚLTIPLE TUBO 2" A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO PARA ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	1,00	12.344.538,00	12.344.538,00		X		
SUBTOTAL					**224.060.150,38**					
VALOR ACTIVIDADES PROGRMADAS MAS AIU			33%		**73.939.849,62**					
AJUSTE AL PESO										
VALOR ACTIVIDADES PROGRMADAS MAS AIU					**298.000.000,00**					

INFORME DE EJECUCION No 1 DE CANTIDADES DE OBRA CON ADICION							**CUMPLIDO**	**PENDIENTE**	**PENDIENTE SOLICITUD ADICION**	**CALCULO**	
1	19.6.	DEMARCACION CON PINTURA TIPO TRAFICO ESPESOR SEGÚN NORMA	ML	0,00	4.572,00	0,00			X		
2	14.44.	DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRILICA PARA PISOS	M2	0,00	21.283,00	0,00			X		
3	18.9.	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	0,00	23.317,00	0,00			X		
4	***	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	1549,96	4.868,00	7.545.183,33			X		
5	1.36.	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE ZINC)	M2	881,65	16.327,00	14.394.699,55	X				
6	***	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y TRANSPORTE DE TEJA TERMOACUSTICA 2 MM, TORNILLERIA Y SILICONA, ESTE PROCESO INCLUYE TRANSLADO VERTICAL DEL MATERIAL EN UNA ALTUYA APROCXIMADA DE 10 A 15 MTS DE ALTURA, LO QUE REQUIERE LA UTILIZACIÓN DE PERSONAL CERTIFICADO Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA TRABAJAR DE MANERA SEGURA A ESA ALTURA.	M2	881,65	133.465,00	117.669.417,25	X	X			
7	7,12	CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA	ML	0,00	89.387,00	0,00	X				
8	***	TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)	ML	398,40	47.568,00	18.951.091,20	X				
9	***	REPARACION DE MALLA ESLABONADA CAL. 10	M2	5,78	40.262,00	232.714,36	X				
10	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFECTOR LUZ LED 400 W	UN	0,00	567.892,00	0,00			X		
11	***	WASH-PRIMER PARA ESTRUCTURA	ML	1549,96	24.153,00	37.436.074,95	X				
12	12,14	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	UN	0,00	627.550,00	0,00			X		100%
13	18.23.	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	0,00	11.888,00	0,00			X		
14	18.16.	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	0,00	26.105,00	0,00			X		
15	19.2.	CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO CON RODACHINES Y CILINDRO PARA MOVILIZAR (PAR)	UN	0,00	15.423.826,00	0,00			X		
		ITEMS NO PREVISTOS									
NP-1	19,5	CANCHA MÚLTIPLE TUBO 2" A.N. INCL.TABLERO ACRÍLICO PARA ANCLAR AL PISO (PAR)	UN	-	12.344.538,00	0,00			X		
SUBTOTAL					**196.229.180,64**						
VALOR ACTIVIDADES PROGRMADAS MAS AIU			33%		**64.755.629,61**						
AJUSTE AL PESO											
VALOR ACTIVIDADES PROGRMADAS MAS AIU					**260.984.810,25**						

5. CURVA "S"

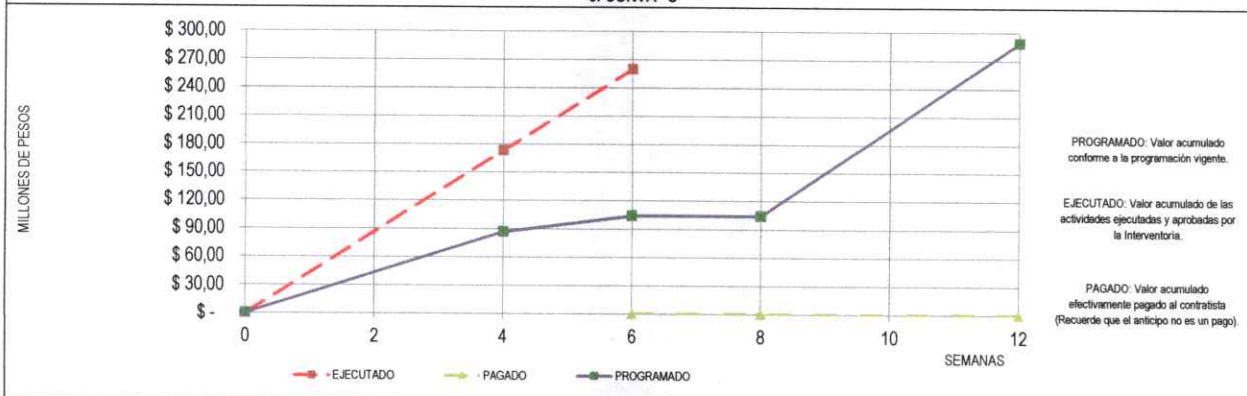

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

COMPROMISOS

DOCUMENTO	FECHA DE ORIGEN	COMPROMISO	RESPONSABLE	INTERESADO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ACTA DE COMITÉ N°1	2025-10-01	Ajustar la vallla Informativa Vinculacion personal	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	INTERVENTORIA	2025-10-01
ACTA DE COMITÉ N°2	2025-10-09	Realizar informe del estado de la estructura . Realizar el balance de Mayores y Menores cantidades	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	INTERVENTORIA	2025-10-09
ACTA DE COMITÉ N°3	2025-10-27	Realizar informe del estado de la estructura. Realizar el balance de Mayores y Menores cantidades	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	INTERVENTORIA	2025-10-27

OBSERVACIONES GENERALES DE OBRA

OBSERVACIONES GENERALES:

Despues de firmado acta de inicio se realiza la contratacion de personal, de parte de la secretaria de Obras solicita que se debe hacer un cerramiento en lona verde para asegurar los trabajos y a personas o niños que quieran ingresar mientras se realizan los trabajos de desmontes de cubierta y pintura de estructra metalica de cubierta.
Se inicia con el desmonte de cubierta existente, corte con pulidora a tornilleria de anclaje de la cubierta existente, Armado de andamio certificado para desmonte de cubierta.
Se evidencia que la perfileria rectangular debe ser cambiada en un 100% debido a que el estado de los perfiles se encuentra en perdidad de seccion estructural y su estado es un 90% en oxidacion siendo este inservible para soportar la nueva teja de cubierta.
Se realiza la recomendacion de parte de residente de Obra que se debe hacer un prelijado y lavado de estructura antes de aplicar el Was Primer dos capas en blanco, se entregan las muestras del color de la cubierta estableciendo que el color de la teja UPVC debe ser en Rojo y su longitud debe ser de 11,80 mtrs tal como es suministrada por el proveedor, el contratista Consorcio establece que el transporte para la cubierta debe ser en cama baja y su instalacion un minimo de 30 cms de traslape, el contratista estima que para el jueves 30 de octubre llegan las tejas UPVC de 2,00 mm creta alta.
Ala fecha se tiene un abance de ejecucion de obra 48,08 % de ejecucion de Obra de un 40,0% programado.

OBSERVACIONES IMPORTANTES DE BITÁCORA:		FECHA
1- Vinculacion del personal para realizar los desmontes de cubierta		2025-10-01
2- Cerramiento en Lona verde		2025-10-01
2- Retiro de perfil metalico existente.		2025-10-01
3- Retiro de refectores existentes.		2025-10-01
4-Retiro de cubierta existente.		

CORTES A PROVEEDORES

PROVEEDOR DE SERVICIOS	VALOR DEL CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA	VALOR DEL CORTE/ MATERIAL	ACUMULADO
JUAN CARLOS RUEDA RODRIGUEZ	$ 29.500.000,00	$ 29.500.000	$ 29.500.000
CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000	$ 75.000.000
JOHAN STEVEN SEPULVEDA ACERO	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000	$ 5.500.000
			$ 110.000.000

OBSERVACIONES DESEMPEÑO PROVEEDOR: Se evidencia que se debe hacer un cambio de personal para la instalacion de la cubierta debido a que el proveedor realiza y da la garantia del producto.

EQUIPO UTILIZADO EN OBRA

FECHA	EQUIPO	PROVEEDOR	MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
			SI	NO	
2025-10-01	Andamio Certificado	Consorcio 2 Interdeportes Guaduas 2025		X	N.A.
2025-10-01	Secciones de andamio tubular	Consorcio 2 Interdeportes Guaduas 2025		X	N.A.
2025-10-02	Herramienta menor	Consorcio 2 Interdeportes Guaduas 2025		X	N.A.

CONSORCIO 2 INTER DEPORTES GUADUAS 2025
NIT 901985,348-2

ACCIONES DE MEJORA

Acción de mejora	ABIERTO	CERRADO	CALCULO	TOTAL
Se habia contemplado traer un 5.00% de teja termoacustica	N.A	X	Acción de mejora cerrada /total de acciones de mejora x 100	100%

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN CLIENTE

CLIENTE	ASPECTOS POR MEJORAR	TOTAL
N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.

CUADRO INFORMATIVO DE ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

ACTA	FECHA	OBJETO	COMPROMISO
1	2025-10-01	Revision actividades y compromisos al incio de la Obra.	extracontractual. Actulizacion de Cumplimiento Afiliaciones de Personal a fondos
2	2025-10-09	Recorrido de Obra avance y ejecucion de Obra .	Entregar avance y programacion. Acta de mayores y menores cantidades. Entrega de informe de estado de la estructura. Planos en Obra
3	2025-10-27	Recorrido de Obra avance y ejecucion de Obra .	Entregar avance y programacion. Llegada de cubierta Termoacustica Instalacion de Cubierta 30 de Octubre Realizar cobro de Acta Parcial No 1

RESUMEN TRAMITES ADMINISTRATIVOS

FECHA	REPONSABLE	OBJETO	DEPENDENCIA	ESTADO
2025-10-01	Consocio 2 Interdeportes Guaduas 2025	Solicitud de cambio de Tecnologo de construcciones	Alcaldia Municipal	Tramitado
2025-10-01	Consocio 2 Interdeportes Guaduas 2025	Actulizacion de Polizas de Cumplimiento y responsabilidad Civil - Extracontractual	Alcaldia Municipal	Tramitado
2025-10-01	Consocio 2 Interdeportes Guaduas 2025	Acta de Inicio	Alcaldia Municipal	Tramitado
2025-10-01	Consocio 2 Interdeportes Guaduas 2025	Actulizacion de Polizas de Cumplimiento y responsabilidad Civil - Extracontractual Anexos 1-5 ajuste de cambio fecha de Acta de Inicio	Alcaldia Municipal	Tramitado

CORREPONDENCIA ENVIADA

REGISTRO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
OF-GU--001	2025-10-01	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	Cambio de Tecnologo de Obra
OF-GU--002	2025-10-10	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	Entrega de Pólizas de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil y Extra Contractual.
OF-GU--003	2025-10-10	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	INFORME TECNICO DE ESTADO DE ESTRUCTURA POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA DE PUERTO BOGOTA GUADUAS
OF-GU--004	2025-10-21	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	Respuesta a Veeduría Ciudadanía de requerimientos
OF-GU-005	2025-10-14	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ENTREGA BALANCE CONTRACTUAL DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA AL VALOR CONTRACTUAL

CORREPONDENCIA RECIBIDA

REGISTRO	FECHA	REMITENTE	ASUNTO
1	2025-10-01	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ACTA DE COMITÉ N°1
2	2025-10-09	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ACTA DE COMITÉ N°2
3	2025-10-27	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS CUNDINAMARCA	ACTA DE COMITÉ N°3

PLAN DE INVERSIÓN MENSUAL DEL PROYECTO

10-2025	11-2025	12-2025									
$ 119.200.000	$ 173.333.333	$ 298.000.000									

SEGUIMIENTO AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA

Tiempo real de obra	Tiempo programado	CALCULO	TOTAL
40	40	Tiempo real de obra/ tiempo programado hasta la fecha x 100	43,96%

SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE OBRA

Presupuesto real de obra	Presupuesto programado	PRESUPUESTO DE COBRO	% DE AVANCE EJECUTADO	% AVANCE DE COBRO
298.000.000,00	260.984.810,25	$ 119.200.000,00	87,58%	40,00%

GARANTIAS DEL CONTRATO

No Poliza	Fecha de Expedicion de la Poliza	Concepto Amparo		Vigencia		VALOR ASEGURADO
				Desde (D.M.A)	Hasta (D.M.A)	
CMZ-100014838 - ANEXO -0	19/08/2025	SEGUROS MUNDIAL	SERIEDAD DE OFERTA	2025-08-21	21/11/2025	$ 26.000.000,00
CMZ-100004370- ANEXO 5	07/10/2025	SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	26/09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO 5	07/10/2025	SEGUROS MUNDIAL	PREDIOS LABORALES Y OPREACIONALES	26/09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO 5	07/10/2025	SEGUROS MUNDIAL	PATRONAL	26/09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO 5	07/10/2025	SEGUROS MUNDIAL	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	26/09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO 5	07/10/2025	SEGUROS MUNDIAL	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26/09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100015295- ANEXO 5	07/10/2025	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	01/10/2025	30/06/2026	$ 26.000.000,00
CMZ-100015295- ANEXO 5	07/10/2025	SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	01/10/2025	30/12/2028	$ 26.000.000,00
CMZ-100015295- ANEXO 5	07/10/2025	SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD DE OBRA	30/12/2025	30/12/2030	$ 52.000.000,00
CMZ-100004370- ANEXO 6	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL	26-09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO -6	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	PREDIOS LABORALES Y OPREACIONALES	26-09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO -6	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	PATRONAL	26-09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO -6	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	26-09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100004370- ANEXO -6	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	26-09/2025	30/12/2025	$ 284.700.000,00
CMZ-100015295- ANEXO -6	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	CUMPLIMIENTO	10/11/2025	30/06/2026	$ 29.800.000,00
CMZ-100015295- ANEXO -6	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	PRESTACIONES SOCIALES	10/11/2025	30/12/2028	$ 29.800.001,00
CMZ-100015295- ANEXO -6	10/11/2025	SEGUROS MUNDIAL	ESTABILIDAD DE OBRA	01/01/2026	30/12/2030	$ 59.600.000,00

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

NOMBRE DEL PROVEEDOR	ANTIGUO	NUEVO	VALOR EVALUACIÓN
JUAN CARLOS RUEDA RODRIGUEZ		X	3,80
CUBIERTA HERMANOS GAMBOA SAS		X	5,00
PINTULAN		X	5,00
PINTURAS TITO PABON		X	5,00
PINRURAS TONER		X	5,00
TOTAL			4,76

TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME

PRODUCTO NO CONFORME	ABIERTO	CERRADO	CALCULO	TOTAL
Se recibe una teja fisurada	X		Producto no conforme gestionado /total de producto no conforme x 100	100%

7. CERTIFICADOS DE MATERIAL

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354



PRIMER CROMATO DE ZINC

REF: EA-505 yEA-513

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Imprimante anticorrosivo alquídico modificado, con muy buena resistencia a la corrosión ya que contiene cromato de zinc como inhibidor de corrosión. Producto de excelente secamiento, muy buena adherencia y flexibilidad.

2. USOS:

Se utiliza para proteger, aplicando como primera capa para el recubrimiento de superficies metálicas expuestas a la intemperie y a condiciones atmosféricas moderadas. Se emplea en la protección de ventanas, puertas, barandas y cualquier superficie metálica que no esté sometida a contaminación industrial alta.

No es recomendable aplicar en ambientes muy agresivos.

3. DATOS TÉCNICOS:

CARACTERISTICA	*VALOR ESTANDAR*
Color	Amarillo y verde oliva
Rendimiento Teórico a 2manos (m^2/Gl)	25 – 30
Peso/Gal (Kg/Gl)	4,9 – 5,1
Viscosidad STORMER a 25°C.	85 – 90 KU
Contenido de VOC Teórico (g/L)	460 - 500
SECAMIENTO (25°C, 50 % HR)	
Al tacto	1 – 2 horas
Manejo	2 – 4 horas

NOTA: El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la superficie sobre el que se aplique, forma de aplicación y espesor de película.

4. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✓ Antes de aplicar *PRIMER CROMATO DE ZINC TONNER®* es necesario revisar la superficie a trabajar, de tal manera que se encuentre seca, limpia, libre de óxido, grasa, polvo, mugre o pintura vieja.

- ✓ Se deben reparar todos los defectos que puedan afectar el acabado final de la superficie. Lijar la superficie antes de realizar la aplicación para una mejor adherencia.

- ✓ En caso de que la superficie tenga restos de pinturas aplicadas anteriormente, se deben eliminar por completo con ayuda de lija, rasqueta metálica, cepillo de alambre o *REMOVEDOR TONNER®*, eliminando todos los residuos del mismo.

- ✓ **Material Ferroso**: para material ferroso aplicar el producto directamente en la superficie.

- ✓ **Material NO ferroso:** para material no ferroso utilizar primero una capa delgada de *WASH PRIMER TONNER®*, para una óptima adherencia.

5. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:

- ✓ Mezclar muy bien la pintura con espátula raspando la pared y el fondo del envase, hasta conseguir un material completamente uniforme.

- ✓ Puede aplicarse con brocha o rodillo, ajustando la viscosidad con máximo 1/8 de **XILOL**.

- ✓ Para aplicar con pistola diluir máximo con 1/4 de **XILOL** por galón

- ✓ **NO** usar como diluyente Thinner,ya que puede modificar las propiedades del producto.

6. PRESENTACIONES:

- ✓ Galón
- ✓ Cuarto de galón

7. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD:

- ✓ Manténgase fuera del alcance de los niños.
- ✓ El producto debe mantenerse almacenado en un lugar fresco, alejado de toda fuente de calor, a temperatura ambiente.
- ✓ Contiene productos inflamables.
- ✓ Mantenga los envases herméticamente sellados, mientras no se esté utilizando.Una vez abierto el envase, se debe utilizar el producto en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones de almacenamiento y seguridad.
- ✓ No comer, ni beber mientras se manipula el producto.
- ✓ Evite la inhalación prolongada de sus vapores, usando elementos de protección adecuados como respirador con filtros para gases y vapores orgánicos e inorgánicos.
- ✓ Usar guantes de caucho y ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- ✓ Practique toda la higiene personal apropiada después de usar el producto.
- ✓ Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación vigente. Los desechos por ningún motivo deben arrojarse a la cañería o cualquier fuente de agua natural o artificial.

Para mayor información de manipulación, almacenamiento, seguridad, entre otros, solicitar la Ficha de Datos de Seguridad del producto.

Los datos técnicos, y especificaciones de uso que se dan en esta ficha técnica son para la orientación del usuario basados en la experiencia de la Empresa y su Departamento Técnico. Lo anterior no constituye una garantía ya que no conocemos las condiciones de uso, almacenaje o manipulación del producto. Por lo anterior es responsabilidad del usuario realizar sus propios ensayos antes de utilizar nuestros productos. Pinturas Tonner® se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Nuestro Departamento Técnico está en disposición de resolver cualquier inquietud.

Pinturas Tonner. *Calle 53 No. 3 –41. Entrada 3.Cazucá-Soacha-Bogotá-Colombia.*
PBX 780 32 99

www.pinturastonner.com

QUIMICA COSMOS S.A. IMPORTACIONES REPRESENTACIONES	Código DI-F-65	Versión 1	Fecha de Creación: 22/11/2022	Fecha de actualización: N/a
FICHA TÉCNICA PRODUCTO TERMINADO				

ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND** esta diseñado con resinas alquidicas, pigmentos y aditivos que dan un producto final de acabado metalizado para colores azul, verde, dorado y oro. Producto que al secar con el oxigeno del aire genera un secado rápido, alta adherencia, excelente flexibilidad, excelente durabilidad; ideal para uso interior y exterior en ambientes de exposición a condiciones comunes tales como: ambientes urbanos y rurales, intemperie y atmósferas típicas de grandes ciudades.

USOS RECOMENDADOS

Es un producto ideal para uso en construcción y mantenimiento industrial. Recomendado para proteger y decorar superficies como metal, concreto o madera. De uso interior y exterior en superficies como: concreto, muros, puertas, ventanas, rejas, muebles, cerchas, pasamanos y estructuras metálicas en general que se encuentran expuestas a condiciones comunes (ambientes urbanos y rurales, intemperie y atmósferas típicas de grandes ciudades).

ESPECIFICACIONES

Bajo los criterios de calidad establecidos por **QUIMICA COSMOS S A - PINTULAND** cumple con las siguientes especificaciones técnica:

REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Brillo especular a 60°	NTC 592-1	70 - 85 UB - Brillante	Cumple
Finura de dispersión	NTC 557	Mín. 6 unidades Hegman - Brillante	Cumple
Adherencia	NTC 811	Mín. 4B	Cumple
Flexibilidad	NTC 1115	No debe presentar agrietamiento	Cumple
Estabilidad al almacenamiento	NTC 6108	En sus envases llenos y sin abrir mantenidos en condiciones adecuadas de almacenamiento, no debe endurecerse, gelarse ni formar sedimentos duros o presentar putrefacción.	Cumple
Peso por galón	NTC 561	3.2 – 3.8 kg/gal	Cumple
Contenido de sólidos, fracción volumen	NTC 6217	Mín. 30%	Cumple

REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Viscosidad Stormer a 25 °C	NTC 559	90 – 95 KU Dorado y Oro = 80 – 85 KU	Cumple
Viscosidad Copa Ford N°4 a 25 °C	NTC 558	Aluminio Bituminoso = 24 – 28 segundos	Cumple
Poder cubriente, relación de contraste	NTC 4974	Mín. 95%	Cumple

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Metales pesados: no contienen concentraciones mayores a 0.01% (m/m) ninguno de los siguientes elementos ni sus compuestos: cromo total, cadmio y mercurio ya sean añadidos intencionalmente o como impurezas procedentes de las materias primas. Contenido de plomo máximo 0.009% (m/m) en base seca.

REQUISITO TÉCNICO	NORMA	RANGO ESPECIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC)	NTC 6533	Máx.550 g/litro Función del color	Cumple

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la superficie:

Limpie muy bien la superficie, debe estar seca y libre de polvo, grasa, mugre, humedad y pintura suelta. Tener en cuenta que materiales extraños, impurezas o grasas residuales puede afectar el desempeño del sistema a aplicar. Se recomienda un lijado suave para mejorar la adherencia y durabilidad de la pintura.

- *Superficies nuevas:* **Metal ferroso:** aplicar previamente Anticorrosivo Pintuland, dejar secar y proceder a aplicar **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND**. **Metal no ferroso** (galvanizado, aluminio, acero inoxidable): aplicar Primer Industrial Pintuland o Wash Primer Pintuland, dejar secar y aplicar **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND**. **Concreto o mampostería:** selle la superficie aplicando una primera mano de Vinilo Lavable Fino T2 o Vinilo Corriente T3 Pintuland extra diluido al 40% con agua potable, dejar secar y aplicar **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND**. **Madera:** se recomienda primero sellar con el producto extra diluido a 40%, dejar secar, lijar para obtener un mejor acabado, limpiar y luego aplicar **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND.**

- *Superficies previamente pintadas deterioradas:* para eliminar pinturas aplicadas anteriormente, se recomienda el uso de cepillo de alambres y/o rasquetas metálicas. Si la superficie está limpia y libre de cualquier contaminante, un lijado suave mejora la adherencia y durabilidad de la pintura.

- Superficies brillantes: Eliminar el brillo, lijando suavemente con papel de lija #180 o #140 y retirar polvo residual para obtener una óptima adherencia de la pintura

Preparación previa del producto:

Mezcle el **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA**

PINTULAND en su envase original, con una espátula limpia hasta obtener uniformidad. Es aconsejable mezclar también durante la aplicación. No mezcle con otros productos que puedan alterar sus propiedades. Se recomienda diluir con **Disolvente Alquídico Pintuland** o thinner de polaridad baja y bajo contenido de metanol o alcoholes.

Condiciones de aplicación:

- Aplique dos o tres manos de **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA PINTULAND**, según lo requerido dejando secar entre cada una de 4 a 6 horas (condiciones ideales de temperatura 23°C +/- 2°C y humedad relativa de 50% +/- 5%). En otras condiciones tener en cuenta que este resultado vario y se debe verificar la película que este bien curada antes de aplicar otra mano.
- No aplicar cuando exista probabilidad de lluvia.
- Aplique una base adecuada según el tipo de superficie para lograr máxima adherencia.
- En el momento de la aplicación la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C.
- La temperatura del sustrato no debe ser superior a 25 °C con el fin de evitar un secado prematuro del producto sin la adecuada penetración al sustrato, generando mala adherencia y fácil desprendimiento.
- Mantenga la brocha, rodillo o pistola con suficiente pintura, con el fin de formar una capa pareja y de buen cubrimiento.

Dilución: Diluya la cantidad de producto de acuerdo a la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	Dilución máx. con Disolvente Alquídico Pintuland o Thinner	N° de manos
Brocha o rodillo	*25 %*	*2 a 3 manos*
Pistola convencional	*10 % – 20 %*	

Nota: Diluir únicamente la cantidad de producto que se va a utilizar.

Una sobre dilución puede afectar las propiedades de desempeño del producto.

Tiempo de secado:

Duro	A través
Máx. 8 horas	Máx. 12 horas

Nota: Durante el secado del producto se debe asegurar una buena ventilación.

Recomendaciones de limpieza:

Los equipos e instrumentos de aplicación se deben lavar con **Disolvente Alquídico Pintuland** o varsol.

Rendimiento:

El **ESMALTE SINTÉTICO LÍNEA DORADA**, presenta los siguientes rendimientos:

Rendimiento	m^2/gal
Teórico a 25 micrones (1 mils)	50 – 56
Práctico sobre superficies nuevas con base	32 - 38
Repinte sobre color similar	23 - 29
Repinte sobre color diferente	14 - 20

Nota: Los rendimientos son aproximados. Estos varían de acuerdo al tipo de aplicación, porosidad de la superficie, color, condiciones ambientales, manos y estado de la superficie.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto en un recipiente cerrado, en lugar bajo techo a temperaturas entre 4°C y 35°C, seco y alejado de fuentes de ignición. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para mayor información consulte ficha datos de seguridad del producto.

GARANTÍA

Se da una garantía de los productos siempre y cuando las condiciones de preparación de la superficie, dilución de la pintura y almacenamiento sean las recomendadas en este documento y/o etiqueta. No se da garantía sino se cumple con la anterior condición.

Ante cualquier inquietud, asesoría o información, consulte a su distribuidor o al PBX: 601 4324742.

PRESENTACIÓN

QUIMICA COSMOS S.A. – PINTULAND ofrece las siguientes presentaciones:

Presentación	Cantidad
Cuarto	0,254 gal (0,946 litros)
Galón	1 gal (3,785 litros)
Cuñete	5 gal (18,925 litros)

Producto fabricado por:

QUIMICA COSMOS S.A. - PINTULAND
Calle 72 # 52-51
Tel: (601) 4324742
Bogotá – Cundinamarca, Colombia
http://www.pintuland.com.co

Fecha Actualización = 05/08/2024
Versión N° = 2

CUBIERTA HERMANOS
GAMBOA S.A.S.

Bogotá, Noviembre 05 del 2025

Señores

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025

REF: GARANTIA POR INSTALACION DE CUBIERTA

La empresa **CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S** con NIT901.065.688-4, da una garantía de 2 años por la mano de obra instalación de cubierta upvc en la obra **Polideportivo Puerto Bogota**

Agradezco su atención

Cordialmente,

Rodrigo Velasquez
RODRIGO VELASQUEZ GAMBOA
Representante Legal
CUBIERTA HERMANOS GAMBOA S.A.S

CUBIERTA HERMANOS
GAMBOA S.A.S.
NIT. 901.065.688 - 4
CL 74 81S No. 83-46 | Cel.: 301 703 6722

CARRERA 81 A 74-31 / CEL: 3017035772 – BOGOTA D.C. Colombia
rodrigovelasquezg5@gmail.com

TEJAS & CANALES

BOGOTA 31 DE OCTUBRE 2025

Señores.

CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
NIT .901985348 -2

Gerente General E.S.M.

REF: CARTA DE GARANTÍA TEJA TERMOACUSTICA 37 UPVC CRESTA ALTA

Apreciados,

Reciban un cordial saludo, A continuación, encontrará nuestra Carta de Garantía del producto Teja StrongRoof 2,mm Cresta Alta Color/ Rojo/Blanco en medida 11,8ml x 1.075

CARTA DE GARANTÍA DE PRODUCTO
PAÍS: COLOMBIA
COMPAÑÍA RESPONSABLE FABRICA DE TEJAS Y CANALES BC SAS
NIT: 901.235.074-2
ÍTEM: Teja Termoacústica Upvc Bicapa 1 Y 3+ capas intermedia PVC, Carbonato y estabilizantes.
ESPESOR: 2 mm
COLOR: Rojo / Blanco
ANCHO TOTAL: 1.07 MTS / UTIL 1.00
APOYOS: 1.20 Máximo.
PESO: 5 KG M2 Aprox AISLAMIENTO ACUSTICO: 10 A 12 Decibeles.
AISLAMIENTO TERMICO: 3 a 4 Grados.
RESISTENCIA AL FUEGO: B1
PENDIENTE MINIMA: 10% Sin traslapo – 15% con traslapo.
FIJACION: Tornillo capelote 2 ½ sobre la Cresta .

***Especificación y normas técnicas (Ver en ficha técnica adjunta).**
*** Garantía aplicada sobre: Decoloración, pandeamiento o deformaciones térmicas (Ver condiciones y restricciones en ficha técnica),**

Dir. Cl 35C # 26H-55 SUR Bogota,Colombia
Tel: 3106782460-3132237060
e-mail: tejasycanalesbc@hotmail.com

TEJAS & CANALES

1. Colocación, corte, transporte e instalación de estos productos, deben cumplir con las reglas del fabricante.
2. Durante la colocación, transporte e instalación de estos productos, no deben ser atacados y/o deteriorados mecánicamente o químicamente.
3. La perforación para instalación de tornillos y sujetadores, no implica el fin de la vida útil de estos productos.
4. El producto no se garantiza en caso de fenómenos extremos meteorológicos
5. No se garantiza si no se utilizan los elementos de fijación recomendados y comercializados.
6. Puede presentar fenómeno de condensación en su interior si no es manejado correctamente la ventilación y corrientes de aire.
7. Condiciones que no estén cubiertas por esta garantía deben ser definidas por el fabricante y su representante de ventas en Colombia (comercializadora y central de cubiertas)
8. En el caso de llevar cielo raso seguir todos los procedimientos según la ficha técnica.
9. Se debe tener en cuentan las recomendaciones plasmadas en la ficha técnica.

Garantía de 10 años y Vida Útil de 30 años, Válida solo bajo las condiciones siguientes:
Cualquier inquietud o aclaración adicional la resolveré con gusto.

CORDIALMENTE

BRAYAN CORTES
Gerente General
3222485346
Cl 35 C sur # 26 h -50, Bogotá

8. PÓLIZAS ACTUALIZADAS.

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.09.12 17:02:44 -05:00

Código de Seguridad: t1F47jBHzrKOOVJVzhNNSg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8800000027-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100004370	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	528032892	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELÉFONO	3219806028
ASEGURADO	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELÉFONO	3219806028
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 257 -2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS.

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	141.960,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIONALES D	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	141.960,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	141.960,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	27.922,00
TOTAL A PAGAR	$	174.882,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos tus sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R0000000027-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100004370	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	528032092	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	12/09/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APF

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.01 17:50:11 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

Código de Seguridad: zupHwmUjgzshs98D8i8Rng==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-86-PPSU3[illegible]027-D001

No. POLIZA	CMZ-100004370	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	528032856	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICION	01/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCION	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELÉFONO	3219806028
ASEGURADO	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCION	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELÉFONO	3219806028
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCION		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

ANULACION CERTIFICADO 528032092
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 257 -2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS.

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	-141.960,00
PATRONAL	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIONALES D	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	-141.960,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-141.960,00
GASTOS EXP	$	-5.000,00
IVA	$	-27.922,00
TOTAL A PAGAR	$	-174.882,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LIDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/09/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA POLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CODIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIEN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA POLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTICULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACIÓN AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA POLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMAS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUI INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTIAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100004370	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	528032856	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	01/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	12/09/2025	24:00 Horas Del	12/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APR

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.01 17:49:43 -05:00

Codigo de Seguridad: 5LtoKVYY5qinQ41icbNpEQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12 05 2025-1317-P-06-RPS/SSR000000027-0001

No. PÓLIZA CMZ 100004370	No. ANEXO 2		No. CERTIFICADO 528032857		No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO			FECHA DE EXPEDICION 01/10/2025		SUC. EXPEDIDORA CEN MANIZALES		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	26/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELEFONO	3219886028
ASEGURADO	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELEFONO	3219886028
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCION		TELEFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE REALIZA TRASLADO DE VIGENCIAS DE ACUERDO CON EL ACTA DE INICI AL CONTRATO NO. 257 -2025, FECHADA DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025. SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO NO. 257 -2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS.

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	141.960,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00

TOTAL ASEGURADO $ 284.700.000,00

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIONALES D	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	141.960,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	141.960,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	27.922,00
TOTAL A PAGAR	$	174.882,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACION

CONVENIO DE PAGO: DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIO DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100004370	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	528032857	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICION	01/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	26/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta recidando responsablemente.
Procege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA - APP

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.06 18:30:47 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

Código de Seguridad: SgDo6QYSVwb0mzjGjKNcHw==

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS0R000000027-D00I

No. PÓLIZA CMZ-100004370	No. ANEXO 3		No. CERTIFICADO 528033062		No. RIESGO		
TIPO DE DOCUMENTO			FECHA DE EXPEDICIÓN 06/10/2025		SUC. EXPEDIDORA CEN MANIZALES		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA	DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del 30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-3
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELÉFONO	3219806028
ASEGURADO	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELÉFONO	3219806028
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

POR AJUSTE EN EL ACTA DE INICIO AL CONTRATO NO. 257 -2025, SE DETERMINA COMO NUEVA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO EL 01 DE OCTUBRE DE 2025.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 257 -2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

SE ACLARA DE MANERA EXPRESA QUE LA FECHA DE INICIO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES EL 01 DE OCTUBRE DE 2025.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO 2

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	25.000,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIONALES D	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	25.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	25.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	4.750,00
TOTAL A PAGAR	$	29.750,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 12/12/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 4712/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

SEGUROS MUNDIAL

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. POLIZA	CMZ-100004370	No. ANEXO	3	No. CERTIFICADO	528033062	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	06/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

INTERDEPORTES GUADUAS 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS.

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRA AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

APLICACIÓN A LA CARÁTULA COLOMBIANA DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.07 10:44:26 -05:00

Código de Seguridad: m988m+IKR0v5L5xIP6tseg==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUSRR000000027-0001

No. PÓLIZA CMZ-100004370 **No. ANEXO** 4 **No. CERTIFICADO** 528033072 **No. RIESGO**

TIPO DE DOCUMENTO **FECHA DE EXPEDICIÓN** 07/10/2025 **SUC. EXPEDIDORA** CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELÉFONO	3219806028
ASEGURADO	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELÉFONO	3219806028
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

SE ANULA POR ERROR EN EL COBRO DE PRIMA
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO. 257 -2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTA, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

SE ACLARA DE MANERA EXPRESA QUE LA FECHA DE INICIO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES EL 01 DE OCTUBRE DE 2025.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	-25.000,00
PATRONAL	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	(284.700.000,00)	(284.700.000,00)	-284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ -284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACION
PREVER SIMMONDS Y CTA LTDA PROFESIONALES D	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	-25.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	-25.000,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	-4.750,00
TOTAL A PAGAR	$	-29.750,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860 037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100004370	No. ANEXO	4	No. CERTIFICADO	528033072	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICION	07/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- **BENEFICIARIO ADICIONAL** : ADICIONALMENTE, SE TENDRA AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA IVA

seguros mundial

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.07 10:45:07 -05:00

Código de Seguridad: c76XMsuq2f81lbOCtc8pAQ==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8[illegible]27-0001

No. POLIZA CMZ-100004370 **No. ANEXO** 5 **No. CERTIFICADO** S28033076 **No. RIESGO**

TIPO DE DOCUMENTO **FECHA DE EXPEDICIÓN** 07/10/2025 **SUC. EXPEDIDORA** CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	**TELEFONO**	3219806028
ASEGURADO	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	**TELÉFONO**	3219806028
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELEFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR AJUSTE EN EL ACTA DE INICIO AL CONTRATO NO. 257 -2025, SE DETERMINA COMO NUEVA FECHA DE INICIO DEL CONTRATO EL 01 DE OCTUBRE DE 2025.
SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 257 -2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRA AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS UNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIONALES D	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LIDER	CERTIF. LIDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 07/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACION DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO E INGRESA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037 013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. POLIZA	CMZ-100004370	No. ANEXO	5	No. CERTIFICADO	528033076	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	07/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA APP

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.10 15:19:10 -05:00

Código de Seguridad: 2PJ3zAjF8px6J/hEUL1IXw==

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100004370	**No. ANEXO**	6	**No. CERTIFICADO**	528034439	**No. RIESGO**	
TIPO DE DOCUMENTO				**FECHA DE EXPEDICIÓN**	10/11/2025	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	**TELÉFONO**	3219806028
ASEGURADO	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	**TELÉFONO**	3219806028
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN		**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

DE ACUERDO CON OTROSI NO. 001 AL CONTRATO DE OBRA NO. 257-2025, SE ADICIONA AL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($38.000.000) M/CTE. LAS DEMAS CONDICIONES DE ESTA POLIZA CONTINUAN IGUAL Y EN RIGOR.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 257 -2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

SE ACLARA DE MANERA EXPRESA QUE LA FECHA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA ES EL 01 DE OCTUBRE DE 2025.

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
PATRONAL	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284.700.000,00	284.700.000,00	284.700.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 284.700.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIONALES D	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 10/11/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresion de este documento.

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PAGA APP

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100004370	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	528034439	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2025		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

- ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS.

- BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ AL MUNICIPIO DE GUADUAS COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL.

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PAGA : APF

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.11.10 15:13:38 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: vHcfaIK6XyNXfQcCROHasA==

No. PÓLIZA	CMZ-100015295	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	528034437	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901.985.348-2
DIRECCIÓN	CR 7 # 1 - 33 CRR PUERTO BOGOTA	TELÉFONO	3219806028
ASEGURADO	MUNICIPIO DE GUADUAS	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.701-4
DIRECCIÓN	CARRERA 5 N. 12-04 SUR SEDE CERES	TELÉFONO	8466033
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE GUADUAS	No. DOC. IDENTIDAD	899.999.701-4
DIRECCIÓN	CARRERA 5 N. 12-04 SUR SEDE CERES	TELÉFONO	8466033

OBJETO DE CONTRATO

DE ACUERDO CON OTROSI NO. 001 AL CONTRATO DE OBRA NO. 257-2025, SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN LA SUMA DE TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($38.000.000) M/CTE. LAS DEMAS CONDICIONES DE ESTA POLIZA CONTINUAN IGUAL Y EN RIGOR.
GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.257 -2025, CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.

SE ACLARA DE MANERA EXPRESA QUE LA FECHA DE INICIO DE LA PRESENTE POLIZA ES EL 01 DE OCTUBRE DE 2025.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/11/2025	24:00 Horas Del 30/06/2026	29.800.000,00	4.831,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/11/2025	24:00 Horas Del 30/12/2028	29.800.000,00	23.862,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 01/01/2026	24:00 Horas Del 30/12/2030	59.600.000,00	75.958,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 119.200.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
PREVER SIMMONDS Y CIA LTDA PROFESIONALES D	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	104.651,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	104.651,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	19.884,00
TOTAL A PAGAR	$	124.535,00

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 01/01/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

AFIANZADORA LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA - PEGA NIT

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	CMZ-100015295	No. ANEXO	6	No. CERTIFICADO	528034437	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	10/11/2025	SUC. EXPEDIDORA	CEN MANIZALES

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	26/09/2025	24:00 Horas Del	30/12/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 100000034

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** MANIZALES 10/11/2025 4:07:21 p.m.

VALOR TOTAL: $124.535,00

RECIBO DE: CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901985348

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20250100390254	1918964524	BANCO CAJA SOCIAL	124.535,00

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100015295 Certificado(s): 528034437;

FIRMA AUTORIZADA



CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

Detalle del pago

Transaction ID:

84e6bd3c-73af-4ea9-bb68-7e7ae4195cbc

Creado: 11/10/25, 9:04 PM | Actualizado: 11/10/25, 9:05 PM

País: CO

Estado: READY_TO_P

Subestado: SYNC

Cliente: CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025
CONSORCIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025

Descripción : **Boleta de Pago No. :** 20250100390254
Polizas: 100015295-6

Correo:

Valor venta

$124,535.00

Descargar Cerrar

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

Escudo de Armas	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025		Código CON-EO-04
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDÍA MUNICIPAL

PROYECTO

CON- 0001

OBJETO

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"

CONTRATO No: **CO-257-2025**

257 de 2025

SUPERVISOR:

DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA
DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS

DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:

ZONA O ÁREA
POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA
F1 INSTLACION DE VALLA INFORMATIVA
F2= CUBIERTA EXISTENTE
F3-DESMONTE DE CUBIRETA
F4= CUBIERTA DESMONTADA

FECHA DE LAS FOTOS 01-10-2025 HASTA 10-11-2025

ALCALDIA MUCIPAL DE GUADUAS

RESIDENTE:

ING. OSCAR PINZON




FOTOGRAFIA Nº1



FOTOGRAFIA Nº2



FOTOGRAFIA Nº3

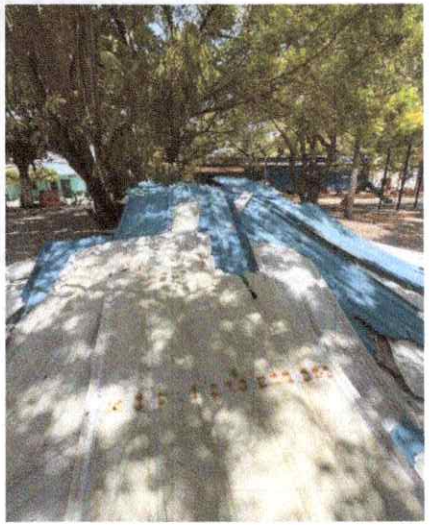


FOTOGRAFIA Nº4

Escudo de Armas	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025		Código CON-EO-04
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDÍA MUNICIPAL


PROYECTO
CON- 0001
OBJETO
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"
CONTRATO No: **CO-257-2025** 257 de 2025
SUPERVISOR: DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:
ZONA O ÁREA POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA F1= DESMONTE DE CUBIRTA EXISTENTE F2= DESMONTE DE CUBIERTA EXISENTE F3= PINTURA DE WASH PRIMER F4= RETIRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO
FECHA DE LAS FOTOS 01-10-2025 HASTA 10-11-2025
ALCALDIA MUCIPAL DE GUADUAS
RESIDENTE: ING. OSCAR PINZON



FOTOGRAFIA Nº1

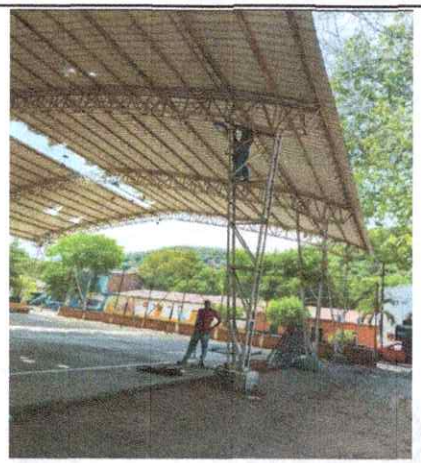

FOTOGRAFIA Nº2

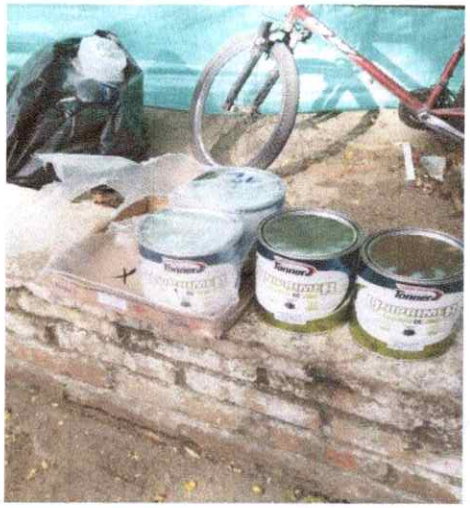

FOTOGRAFIA Nº 3



FOTOGRAFIA Nº4

Escudo de Armas	**CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025**	Código CON-EO-04
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDÍA MUNICIPAL


PROYECTO	 FOTOGRAFIA Nº1  FOTOGRAFIA Nº2
CON- 0001	
OBJETO	
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"	
CONTRATO No: **CO-257-2025** 257 de 2025	
SUPERVISOR: DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS	
DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:	
ZONA O ÁREA POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA F1= DESMONTE DE TEJA UPVC F2= RETIRO DE PERFIL METALICO F3= LIJADO DE ESTRUCTURA METALICA F4= LIJADO DE ESTRUCTURA METALICA	 FOTOGRAFIA Nº 3  FOTOGRAFIA Nº4
FECHA DE LAS FOTOS 01-10-2025 HASTA 10-11-2025	
ALCALDIA MUCIPAL DE GUADUAS	
RESIDENTE: ING. OSCAR PINZON	

Escudo de Armas	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025		Código CON-EO-04
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		REPÚBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA MUNICIPIO DE GUADUAS ALCALDÍA MUNICIPAL


PROYECTO
CON- 0001
OBJETO
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"
CONTRATO No: **CO-257-2025** 257 de 2025
SUPERVISOR: DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:
ZONA O ÁREA POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA F1= PINTURA EN WASH PIMER F2= LAVADO CON HIDROLAVADORA F3= ESTRUCTURA DE CUBIERTA- F4= CUBIERTA EN ESTRUCTURA
FECHA DE LAS FOTOS 01-10-2025 HASTA 10-11-2025
ALCALDIA MUCIPAL DE GUADUAS
RESIDENTE: ING. OSCAR PINZON



FOTOGRAFIA Nº 1

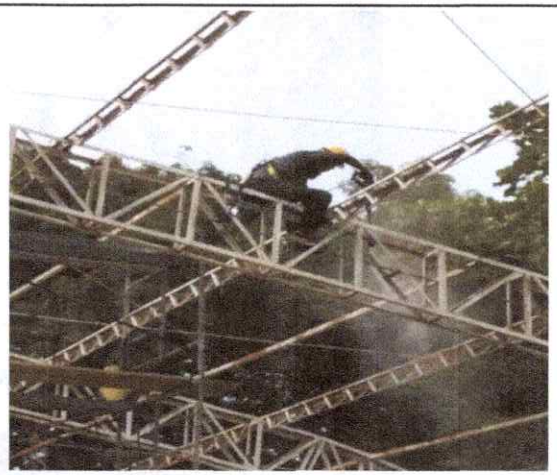

FOTOGRAFIA Nº2

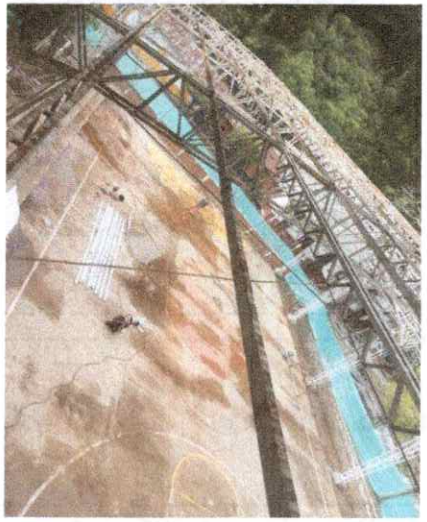

FOTOGRAFIA Nº 3



FOTOGRAFIA Nº4

Escudo de Armas	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025		Código
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		CON-EO-04

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS
ALCALDÍA MUNICIPAL


PROYECTO
CON- 0001
OBJETO
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"
CONTRATO No: **CO-257-2025** 257 de 2025
SUPERVISOR: DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:
ZONA O ÁREA POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA F1= LAVADO DE ESTRUCTURA METALICA F2= PINTURA EN WAS PRIMER F3= INSTALACION DE PERFIL METALICO F4= INSTALACION DE PINTURA WASH PRIMER
FECHA DE LAS FOTOS 01-10-2025 HASTA 10-11-2025
ALCALDIA MUCIPAL DE GUADUAS
RESIDENTE: ING. OSCAR PINZON




FOTOGRAFIA Nº1



FOTOGRAFIA Nº2

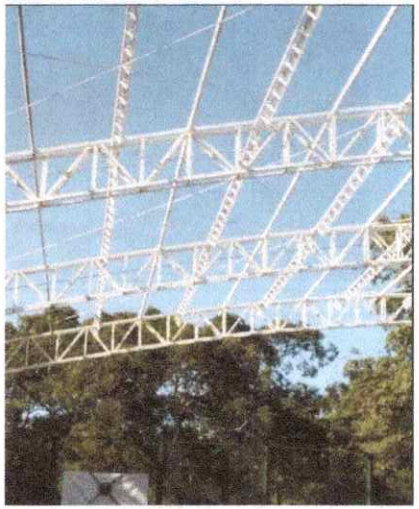


FOTOGRAFIA Nº 3

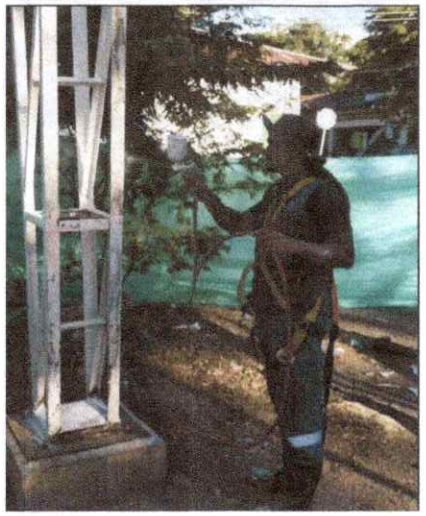

FOTOGRAFIA Nº4

Escudo de Armas	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025		Código CON-EO-04
	REGISTRO FOTOGRÁFICO		Versión formato 2

PROYECTO
CON- 0001
OBJETO
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"
CONTRATO No: **CO-257-2025** 257 de 2025
SUPERVISOR:
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:
ZONA O ÁREA POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA F1= PINTURA EN WASH PRIMER PERFILES DE ESTRUCTURA F2= DESMONTE DE PERFIL METALICO F3= PINTURA EN WASH PRIMER F4= PINTURA EN WASH PRIMER
FECHA DE LAS FOTOS 01-10-2025 HASTA 10-11-2025
ALCALDIA MUCIPAL DE GUADUAS
RESIDENTE: ING. OSCAR PINZON

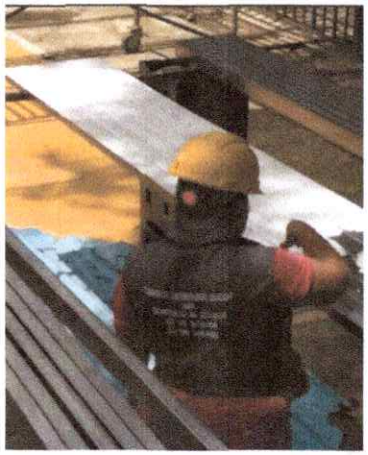

FOTOGRAFIA Nº1



FOTOGRAFIA Nº2




FOTOGRAFIA Nº 3



FOTOGRAFIA Nº4

Escudo de Armas	CONSORICIO 2 INTERDEPORTES GUADUAS 2025	Código CON-EO-04
	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Versión formato 2

PROYECTO
CON- 0001
OBJETO
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA"
CONTRATO No: **CO-257-2025** 257 de 2025
SUPERVISOR:
DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
DESCRIPCION FOTOGRAFIAS:
ZONA O ÁREA POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA F1= ENTREGA DE DOTACION F2= ENTREGA DE DOTACION F3= INSTALCION DE TEJA UPVC F4= INSTALACION DE TEJA UPVC
FECHA DE LAS FOTOS 01-10-2025 HASTA 10-11-2025
ALCALDIA MUCIPAL DE GUADUAS
RESIDENTE: ING. OSCAR PINZON

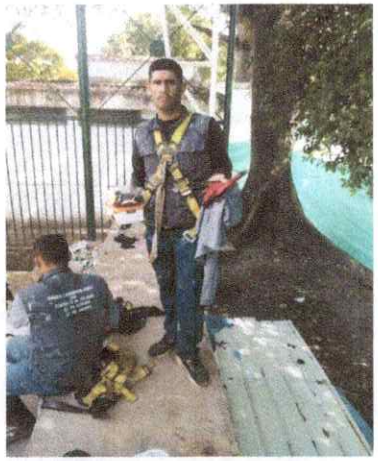

FOTOGRAFIA Nº1



FOTOGRAFIA Nº2



FOTOGRAFIA Nº 3



FOTOGRAFIA Nº4

10. BITÁCORA DE OBRA.

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

CONTRATO No.257 -2025.

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE GUADUAS NIT. 899.999.701-4.
CONTRATISTA: NIT.	CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025 901985348-2
R/L:	ANDRES FABIAN SABOYA DÍAZ **C.C** 1.022.345.121 de Bogotá D.C
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.
VALOR:	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000.00) M/CTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES

Entre los suscritos, **DIEGO ARIEL JIMENEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.005.824 de Guaduas, quien actua en nombre y representación de la Alcaldía de Guaduas- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde Municipal, nombrado mediante acta de posesión de fecha Veintiocho (28) de diciembre de 2023, según consta en acta de posesión emitida por la notaría única de Villeta, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, y por la otra, **CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025. Nit.** 901985348-2 representado legalmente por **ANDRES FABIAN SABOYA DÍAZ** identificado con C.C 1.022.345.121 de Bogotá D.C, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos celebrado el presente **CONTRATO,** consignado en las cláusulas que se pactan a continuación, conforma a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, previas las siguientes consideraciones **a).** Que de conformidad con lo preceptuado en el decreto 1082 de 2015, se efectuó el procedimiento de **SELECCIÓN ABREVIADA SAMC No. 014 DE 2025. b).** Que agotado el procedimiento descrito en el Decreto 1082/2015, mediante resolución 305 de fecha 03 de Septiembre de 2025, se adjudicó el presente proceso SAMC-014-2025 a, **CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025,** representado legalmente por **ANDRES FABIAN SABOYA DÍAZ** identificado con C.C 1.022.345.121 de Bogotá D.C por cumplir con los requisitos jurídicos, técnicos, operacionales y financieros, así como la evaluación y calificación establecidos en los pliegos de condiciones definitivos y presentar el valor más favorable para el Municipio. **c).** Que por lo antes expuesto el presente contrato, además de lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y sus normas complementarias, se regirá por las siguientes cláusulas **CLÁUSULA PRIMERA OBJETO:**

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

ACTA DE INICIO

En el Municipio de Guaduas, el primer (1) día del mes de octubre de dos mil Veinticinco (2025), en la alcaldía del Municipio de Guaduas Cundinamarca, se reunieron **DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS,** DIRECTOR DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA y **ANDRES FABIAN SABOYA DÍAZ,** representante legal de la empresa CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025, en calidad de Contratista, con el fin de efectuar el Acta de Inicio al contrato de Obra No. 257-2025.

Contratista	CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025
Nit./ CC	901.985.348-2
Contrato No	257-2025
Naturaleza de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Objeto	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO LA BOMBONERA EN EL CORREGIMIENTO DE PUERTO BOGOTÁ, MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.
Valor Inicial del contrato	**DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS ($260.000.000,00) M/CTE.**
Forma de Pago	La Entidad cancelará al Contratista así: un Primer pago: equivalente al 40% del valor total del contrato, el cual se realizará una vez se haya ejecutado el 40% del valor contractual, conforme a las cantidades de obra ejecutadas y aprobadas por la supervisión o interventoría - Pagos parciales por avance de obra: el valor restante, hasta completar el 90% del valor total del contrato, se cancelará mediante pagos parciales, de acuerdo con los avances de obra y las cantidades ejecutadas y aprobadas por la supervisión. - Pago final: el 10% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. El pago a el Contratista se efectuará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la presentación de la factura y visto bueno por parte del supervisor o interventor designado del recibo a satisfacción de las actividades, acompañada del acta de recibo y de la certificación de encontrarse el Contratista al día en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo señalado en el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. El supervisor designado solo aprobará el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista. Parágrafo 1. El supervisor o interventor solo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista.

Escaneado con CamScanner

	Para causar el pago final del contrato, el Contratista deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y *empleados que haya utilizado en la ejecución de las actividades contratadas.* Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hará el respectivo recibo de factura final de pago al contrato. Parágrafo 2: En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, será obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan. Reglas comunes de la forma de pago: - La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. - La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
Fecha de Suscripción	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Fecha de Iniciación	1 DE OCTUBRE DE 2025
Fecha de Terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2025

REQUISITO DE LEGALIZACIÓN	FECHA	NUMERO	VALOR
REGISTRO PRESUPUESTAL	26/09/2025	2025000927	$260.000.000.00

Escaneado con CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS

INFORMACIÓN DE LA POLIZA			
TIPO	N°	ANEXO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO PRESTACIONES SOCIALES ESTABILIDAD DE LA OBRA	CMZ-100015295	0	Desde 12/09/2025 hasta 12/12/2030
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONAL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	CMZ-100004370	0	12/09/2025 hasta 12/12/2025

DAVID SANTIAGO OROZCO ROJAS
Directora de Obras e Infraestructura
Supervisor

CONSORCIO 2 INTEDEPORTES GUADUAS 2025
NIT 901.985.348-2
R.L ANDRES FABIAN SABOYA DÍAZ
Contratista

Elaboró: Juan Manuel Montalvo Fonseca - A.U. Dirección de Obras e Infraestructura
Aprobó: David Santiago Orozco Rojas - Director de Obras e Infraestructura

Escaneado con CamScanner

Jueves
02-10-2025

Tiempo: No se presentan lluvias.

Personal:
1 Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes
1 Ingeniero de Obra

Actividades

1) Desinstalación de Teja en PVC existente 200 Mt

Herramienta y Equipo

10 Secciones de Andamio Certificado
2 Juego de Rondas para Andamio
3 Arnes
1 Hidrolavadora
1 Compresor de 150 PSI
1 Escalera Telescopica
1) Linea de Vida
1) Herramienta Menor
1) Extensiones Electricas de 30 ML

Escaneado con CamScanner

Viernes
31-10-2025

Tiempo: No se presentan lluvias

Personal:
1) Maestro
1) Oficial
3) Ayudantes
1) Ingeniero de Obra -

Actividades

1) Acordonamiento del polideportivo la Bomberera
2) Curamiento Areas a Intervenir
3) Desinstalación de Teja Existente 100 Mt
4) Suministro de Cerradura para Baño - Guarda de Material.

Herramienta

10 Secciones de Andamio
2 Juegos de Rondas para Andamio
3 Arnes
1 Hidrolavadora
1 Compresor de 150 PSI
1 Escalera telescopica
1) Herramienta Menor
1) Extensiones Electricas de 30 ML

Escaneado con CamScanner

Viernes
03-10-
2025

Tiempo: No se presentan lluvias

Personal:
1 Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes
1 Ingeniero de Obra

Actividades

1) Desmonte de Teja en PVC existente 100 Mts
2) Desmonte de Perfiles dañados

Herramienta y Equipo.

10 Secciones de Andamio Certificado
2 Juegos de Ruedas para Andamio
3 Arnes
1 Hidrolavadora
1) Compresor de 150 PSI
1) Escalera Telescopica
1) Linea de Vida
1) Herramienta Menor
1) Extensiones Electricas de 30 ML

Escaneado con CamScanner

Sabado
04-10-2025

Tiempo: No se presentan lluvias

Personal:
1 Maestro
1 Oficial
3 Ayudantes
1 Ingeniero de Obra

Actividades

1 Desmonte de Teja de UPVC 150 Mts
2) Llegada de 21 Perfiles de 6 Mts

Herramienta y Equipo

10 Secciones de Andamio Certificado
2 Juegos de Ruedas para Andamio C
3 Arnes
1 Hidrolavadora
1 Compresor de Aire 150 PSI
1 Escalera Telescopica
1) Linea de Vida
1) Herramienta Menor
4 Pulidoras
2) Extensiones de 30 ML

Escaneado con CamScanner

Lunes
06-10-25

Tiempo = No se presentan lluvias.

Personal = 1.- Maestro
3. Ayudantes
1. Ingeniero de obra

Actividades:

1) Desmonte de teja UPVC 70 mts
instalación de Perfil Rectangular. (10) unidades.
2) Desmonte de perfil metalico en
pesima condiciones.
3) lavados

Herramientas y equipo =
10. Secciones de Andamio Certificado
2 Juegos de ruedas para Andamios
3 Arnes
1 Hidrolavadora
1 compresor de Aire 150 Ps1
1 Escalera telescopica
1 Linea de vida
1 Herramienta Menor
4 Poladoras 2= Extenciones de 30 ML.

Escaneado con CamScanner

Martes
07-10-2025

Tiempo: No se presentan lluvias

Personal = 1 Maestro
1= oficial
3= Ayudantes
1= Ingeniero de obra

Actividades = Desmonte de teja upvc
100 mts
Desmonte de 8 perfiles de 4x1 metalic
3) lavados
4) Ujado de Estructura Metalica existente

Herramientas y equipo:

10. Secciones de Andamios Certificado
2 dos Juegos de ruedas para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
1 compresor de Aire 150 Ps1
1 Escalera telescopica
1 Linea de vida
1 Herramienta Menor
4 Poladoras 2. Extensiones de 30 ML

Escaneado con CamScanner

Miercoles 08-10-2025

Tiempo = No se Presentan lluvias

Personal = 1= Maestro
1= Oficial
3= Ayudantes
4= Ingeniero de obra

Actividad = Se realiza el desmonte de teja uPVC 150 mts.

Se realiza la instalacion de perfil metalico de 4x1 6 unidades.
3) lavados

4) Lijado de Estructadura Metalica Existente

Herramientas, y equipo:

10. secciones de Andamios Certificado
2 Juegos de ruedas Para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
1 compresor de Aire 150 PSI
1 escalera telescopica
1 linea de vida 1. Herramienta Menor
4 Pulidoras 2. extensiones de 30 ML

Escaneado con CamScanner

Jueves 09-10-2025

Tiempo = No se Presentan lluvias

Personal = 1. Maestro
1. Oficial
3= Ayudantes
1= Ingeniero de obra

Actividades = 1) se sigue con el desmonte de teja UPVC 100 m2
2) se inicia con el lvado con disco a toda la estructura
3) lavado de exturctura con alta Presion hidrolavadora.

4) Lijado de Estructura Metalica Existente
5) se realizo Carita de Obra en donde se evidencia los desmontes y Cantidades que se deben realizar.

Herramientas y equipo:

10. Secciones de Andamios Certificado
2 Pares de ruedas Para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
1 Compresor de Aire 150 PSI
1 escalera telescopica
1 linea de vida
1 Herramienta Menor
4 Pulidoras 2. compresores
2 Extensiones de 30 ML

Escaneado con CamScanner

Viernes
10-10-2025

Tiempo: No se presentan lluvias

Personal = 1 = Maestro
1 = oficial
3 = Ayudantes
1 = Ingeniero de obra

Actividades: Se sigue con el desmonte de teja UPVC. 100 m2
2) lavados.
4) Ligado de estructura Existente

Herramientas y equipo:

10. secciones de Andamios Certificado
2 Pares de ruedas para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
1 compresor
1 Escalera telecopica
1 Linea de vida 2. compresores
1 Herramienta Menor
4 Pulidoras 2. Extensiones de 30 ML.

Escaneado con CamScanner

Martes
14-10-2025

Tiempo: Se Presentan lluvias

Personal = 1 Maestro
3 Ayudantes
1 Ingeniero de obra

Actividades: 1) se sigue con el desmonte de teja UPVC 100 m2
2.) se inicia con el lavado con disco a toda la estructura metalica
3) se inicia con la pintura en una Primer columna.
4) Ligado de Estructura Existente

Herramientas y equipo:

10 Secciones de Andamios Certificado
2 juegos de ruedas para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora.
1 compresor de Aire 150 PSI
1 Escalera telescopica
1 Linea de vida 2. compresores
1 herramientas menor
4 Pulidoras 2 Extensiones de 30 ML.

Escaneado con CamScanner

Miercoles 15-10-2025

Tiempo: ... se presentan lluvias

Personal = 1. Maestro
3. Ayudantes
1. Ingeniero de obra
1. Tecnologo de Obra.

Actividades:

1) se sigue con el desmonte de teja UPVC 100 m2 2) se inicia con el lavado con disco a toda la estructura metalica
3) se inicia con la Antura en was Primer columna.
4) lijado de estructura metalica.
4) Pintura de Was Primer. en Blanco

Herramientas y equipo:

10 Secciones de Andamios ~~Certificado~~
2 Juego de ruedas Para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
1 compresor de Aire 150 PSI
1 Escalera telescopica
1 Linea de vida 2. compresores
1 herramienta menor
4 Pulidoras 2. Extensiones de 30 ML.

Escaneado con CamScanner

Jueves 16-10-2025

Tiempo se Presentan lluvias

Personal 1 Oficial
1 Maestro
3 Ayudantes
1. Ingeniero de obra
1. Tecnologo de Obra

Actividades:

1) Desmonte de teja. UPVC 50 mts
2) Desmonte de Perfil metalico en Pesima condiciones.
3) Lijado de Estructura Existente
4) Pintura de Was Primer Blanco

Herramientas y equipo:

10. secciones de Andamios Certificado
2. Juegos de ruedas Para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
1 compresor de Aire 150 psi
1 Escalera telescopica 2. compresores
1 Linea de vida 1. Herramienta menor
4 Pulidoras 2 Extensiones de 30 ML

Escaneado con CamScanner

Viernes 17-10-2025

Tiempo: Se Presentan lluvias.

Personal = 1. Maestro
3. Ayudantes
1. Ingeniero de Obra
1. Tecnologo de obra

Actividades = Siendo las 4:00 pm de la tarde
Se realiza comite de obra

1) Instalación de Perfil Metalico de 4" x 2"
2) Ligado de Estructura Existente
3) Pintura de Vigas Primer en Blanco

Herramientas y Equipo:

10 Secciones de Andamios Certificado
2 Juegos de ruedas para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
1 Compresor
1 Escalera telescopica 1. linea de vida
1 herramienta menor 2. compresores
4 Amoladoras 2 extensiones de 30 ml

Escaneado con CamScanner

Lunes 20-10-2025

Tiempo: Se Presentan lluvias

Personal = 1. oficial
1 Maestro
3 Ayudantes
1 Ingeniero de obra
1 Tecnologo de obra

Actividades:

1) Se sigue con el desmonte de teja UPVC 100 m2
2) Se inicia con el lijado con disco a toda la estructura metalica
3) Se inicia con la pintura en las Primer columnas

Herramientas y Equipo:

10 Secciones de Andamios Certificado
2. Juegos de ruedas Para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora.
1 Compresor de Aire 150 Psi
1 Escalera telescopica 2. compresores
1 linea de vida 1 Herramienta de menor
4 Amoladoras 2 extensiones de 30 ml.

Escaneado con CamScanner

Martes 21.10.2025

Tiempo = No se Presentan lluvias

Personal = 1 oficial
1 maestro
3 Ayudantes
1 Ingeniero de Obra
1 Tecnologo de obra

Actividades:
1). Se inicia con la Pintura en was Primer columna. Una Mano
2) Pintura en Was Primer

Herramientas y Equipo:
10 Secciones de Andamios Cuerpo
2 Juegos de ruedas Para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
1 Compresor de Aire 150 PSI
1 Escalera telescopica
1 Linea de vida 1 Herramienta menor
4 Roldoras 2. Extensiones de 30 ML.

Escaneado con CamScanner

Miercoles 22.10.2025

Tiempo = No se Presentan lluvias

Personal = 1 oficial
1 Maestro
3 Ayudantes
1 Ingeniero de Obra
1 Tecnologo de Obra.

Actividades: 1) Se inicia con la Pintura en was Primer Columnas

2) Llegan 8 galones en Was Primer Blanco

3) Llegan 3 Kg de Soldadura Electrica para Instalación de perfil Metalico. 9'x2'

Herramientas y Equipo:

10 secciones de Andamios Cuerpo
2 Juegos de ruedas Para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
1 Compresor de Aire 150 PSI
1 escalera telescopica 2. compresores
1 Linea de vida 1. Herramienta menor
4 Roldoras 2. Extensiones de 30 ML

Escaneado con CamScanner

Jueves
23-10-25

Tiempo: Se presentan lluvias en la Mañana Se pierden 4 Horas de lluvia

Personal:
1) Oficial
1) Maestro de Obra
3) Ayudantes
1) Ingeniero de Obra
1) Tecnologo de Obra
1) Director de Obra

Actividades de Obra
1) Se Sigue con la Instalacion de Pintura en Vias Primer
2) Se termina de Instalar los perfiles Metalicos de 4"x2"
3) Se programa la llegada de la Teja UPVC de 2mm Roja para el dia 30 de Noviembre

Herramientas y Equipo:

10 secciones de Andamios Certificado
2 Juegos de ruedas para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
2 compresores de Aire 150 Psi
1 escalera telescopica.
1 Linea de vida 1 herramienta menor
4 Roladoras 2 Extensiones de 30 ML.

Escaneado con CamScanner

Viernes
24/10/2025

Tiempo: Se Presentan lluvias en Horas de la Mañana

Personal:
1) oficial
1) Maestro de obra
3) Ayudantes
1) Ingeniero de Obra
1) Tecnologa de Obra
1) Director de Obra.

Actividades:

1) Para este dia Se presentaron lluvias en las horas de la madrugada haciendo que la estructura estuviese mojada, y Se esperara hasta las 11:00 AM para continuar Con las labores de Pintura en Vias finales.

2). Se Mando hacer mantenimiento al compresor N° 2 debido a las fallas por energia

Herramientas y Equipo

10 secciones de Andamios Certificado
2 Juegos de ruedas Para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
2 compresores de Aire 150 Psi
1 escalera telescopica
2 Extensiones de 30 ML
4 Roladoras 1 Linea de vida.

Escaneado con CamScanner

Lunes 27/10/2025

Tiempo: No se presentan lluvias.

Personal = 1) Oficial
1) Maestro
3) Ayudantes
1) Ingeniero de Obra
1) Tecnologo de obra
1) Director de Obra.

Actividades:

1) Para este dia se termina la pintura en Wop Primer en Blanco una capa.

2) Para Garantizar los trabajos de Cubierta, el contratista Consorcio 2 Inter Repartes Guadua 2025 realiza la Compra y la Instalación de la Teja UPVC 2.00 mm.

Herramientas. Y EQUIPO

10 Secciones de Andamios Certificado
2 Juegos de ruedas para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
2 Compresores de Aire 150 PSI
1 escalera telescopica
1 Linea de vida 2. Extensiones 30 M
4 Pulidoras

Escaneado con CamScanner

Martes 28/10/2025

Tiempo:

Personal = 1) Oficial
1) Maestro
3) Ayudantes
1 Ingeniero de obra
1) Tecnologo de obra
1) Director de Obra

Actividades:

1) Para este dia se recoger una torre de andamios

2) Se envian. Las afiliaciones de Personal nuevo para Instalación de Teja UPVC 2.00 mm

Herramientas Y EQUIPOS

10 Secciones de Andamios Certificado
2 Juegos de ruedas para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
2 compresores de Aire 150 PSI
1 Escalera telescopica
2 extensiones de 30 ML
4 Pulidoras 1 Linea de vida

Escaneado con CamScanner

Miercoles 29/10/25

Tiempo: Se presenta lluvia.

Personal: 1) Oficial
3) Ayudante
1) Maestro
1) Ingeniero de obra
1) Tecnologo de Obra
1) Director de Obra

Actividades:

1) Se revisan las apilaciones de Personal y Cursos de Alturas.

2) Se compran 8 botones de Was-Primer Blanco.

Herramientas y Equipo.

10 Secciones de Andamios Certificado
2 Juegos de ruedas Para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora 1 Linea de vida
2 compresores de Aire 150 PSI
1 escalera telescopica
2 Extensiones de 30 ML
4 Pulidoras.

Escaneado con CamScanner

Jueves 30/10/25

Tiempo = No se presenta lluvia.

Personal = 1) Oficial
1) Maestro
1) Ayudante
1) Ingeniero de obra
1) Tecnologo de Obra
1) Director de obra

Actividades:

1). Se inicia con personal nuevo para instalacion de Was Primer 2 Capa.

2) Llego cubierta en teja de UPVC 2.00 m es Como baja de 12 Mts una Cantidad de 86 UNA

Herramientas y Equipo

10 Secciones de Andamios Certificado
2 Juegos de ruedas Para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora
1 Linea de vida 4 Pulidoras
2 Compresores de Aire 150 PSI
1 Escalera telescopica
2 Extensiones de 30 ML

Escaneado con CamScanner

Viernes 31/10/25

Tiempo:= No se presentan lluvias.

Personal = 5) Oficial
1) Maestro
1) Ayudantes
1) Ingeniero de Obra
1) Tecnologo de Obra
1) Director de Obra

Actividades:

1). Se Sigue con la aplicacion de Was Primer Segunda capa
2) Instalación de Teja UPVC de 2.00 mts. 300 Mts

Herramientas y EQUIPO.

10 Secciones de Andamios Certificado
2 Juegos de ruedas para Andamios.
3 Arnes
1 hidrolavadora 1 Linea de vida
2 compresores de Aire 150 PSI
1 Escalera telescopica
2 Extensiones de 30 ML
4 Pulidoras.

Escaneado con CamScanner

Sabado 01/11/25

Tiempo = No se Presentan lluvias

Personal = 1) Maestro
5) Oficial
1) Ayudantes
1) Ingeniero de Obra
1) Tecnologo de Obra
1) Director de Obra

Actividades:

1) Se Sigue con la Segunda capa en Was Primer. en Blanco
2) Instalación de Teja UPVC 2.00 MM 250 Mts 2.

Herramientas y EQUIPO

10 Secciones de Andamios Certificado
2. Juegos de ruedas para andamios
3 Arnes
1 hidrolaqueadora
1 Linea de vida
2 Compresores de Aire 150 PSI
1 escalera telescopica
1 Extension de 30 ML 4. Pulidoras.

Escaneado con CamScanner

Domingo 02/11/25

Tiempo No se presentan lluvias

Personal = 6) Oficial
1) Maestro
1) Ayudantes
1) Ingeniero de Obra
1) Tecnologo de obra
1) Director de Obra

Actividades:

1) Se sigue con la Segunda Capa en Vigas Primer Blanco para Vigas y Columnas Blanco
2) Instalación de Tapa UPVC 200 mm 250 Mz en Roja.

Se tiene una Instalacion de Cubierta de 95% de Ejecución.

Herramientas y Equipo.

10 Secciones de Andamios Cuticado
2 Juegos de ruedas para Andamios
3 Arnes
1 hidrolavadora 1 Linea de vida
2 compresores de aire 150 Psi
1 escalera telescopica
1 Extension de 30 ML
4 pulidoras.

Escaneado con CamScanner

Lunes 03-11-2025

Tiempo: No se presentan lluvias

Personal:
1) Maestro de Obra
1) Ayudante
1) Ingeniero de Obra
1) Tecnico de Obra
1) Director de Obra

Actividades

1) Se sigue con Remates de Cubierta y Pintado de Vigas Primer Segunda Capa.
2) Se tiene el 100% de la Instalación de cubierta UPVC 200 MM Roja

Herramienta y Equipo

10 Andamio Certificado
2 Juegos de Ruedas para Andamios
3 Arnes
1 Hidrolavadora
1 Linea de Vida
1 Compresor de Aire
1 Escalera Telescopica
2 Extensiones de 30 ML

Escaneado con CamScanner

Martes Tiempo No se presentan lluvias
04-11-2025

Personal

1) Maestro de Obra
1) Ayudante
1) Ingeniero de Obra
1) Tecnologo de Obra
1) Director de Obra

Actividades

Para este día se realizo comite de Obra con el Ingeniero Director de Obras y el profesional Auxiliar, con el Fin de revisar las Actividades de Cubierta, Pintura en Wash Primer, Pintura en Esmalte y perfileria de Soporte

Se realiza el recorrido en donde la Supervisor Solicito hacer unos ajuste de retoques de pintura en Wash Primer y Esmalte, Ubicación de (2) dos perforaciones los cuales se repararan el Instante

Herramienta y Equipo

Andamio Certificado
Arnes
Linea de Vida
Escalera Telescopica

2) Extensiones de 30 Mt

Escaneado con CamScanner

Lunes 10/11/25 Tiempo No se presentan lluvias

1) Maestro de Obra
1) Tecnologo de Obra
1) Residente de Obra
1) Director de obra
2) Oficiales

Actividades

Se Inicia con la pintura de piso para canchas y delimitado, Marcamos con pintura para canchas y trafico pesado

1) Herramienta y Equipo


1) Andamio Certificado
1) Arnes con Eslinga
1) Linea de Vida
1) Escalera Telescopica

Escaneado con CamScanner


11. PROGRAMACIÓN

Calle 7 No. 1 - 33 Puerto Bogotá Guaduas – Cundinamarca
consorciointerdepguaduas2025@gmail.com
Cel: 321 9806028-3138336354

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		<Tarea nueva>	1 día?	mié 25-10-01	mié 25-10-01
2		<Tarea nueva>	1 día?	mié 25-10-01	mié 25-10-01
3		INICIO	0 días	mié 25-10-01	mié 25-10-01
4		DEMARCACION CON PINTUR.	6 días	mar 25-12-16	lun 25-12-22
5		DEMARCACIÓN CON PINTUR.	10 días	mar 25-12-02	vie 25-12-12
6		ESMALTE SOBRE LAMINA LLE	6 días	lun 25-12-08	sáb 25-12-13
7		ESMALTE SOBRE LAMINA LIN	6 días	mié 25-10-22	mar 25-10-28
8		DESMONTE DE CUBIERTAS (T	10 días	mié 25-10-01	sáb 25-10-11
9		SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y	15 días	jue 25-10-30	sáb 25-11-15
10		CABALLETE CUBIERTA TERM(	5 días	jue 25-11-20	mar 25-11-25
11		TUBO ESTRUCTURAL ABIERT(	5 días	mié 25-10-01	lun 25-10-06
12		REPARACION DE MALLA ESLA	3 días	mié 25-10-08	vie 25-10-10
13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día?	mié 25-11-26	mié 25-11-26
14		WASH-PRIMER PARA ESTRUC	10 días	mié 25-10-08	sáb 25-10-18
15		TABLERO PARCIALES 12 CIRC	2 días	jue 25-10-30	vie 25-10-31
16		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MA	4 días	jue 25-11-27	lun 25-12-01
17		ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	4 días	mar 25-12-02	vie 25-12-05
18		CANCHA MÚLTIPLE TUBO A.M	5 días	lun 25-12-22	vie 25-12-26
19		FIN	0 días	mar 25-12-30	mar 25-12-30

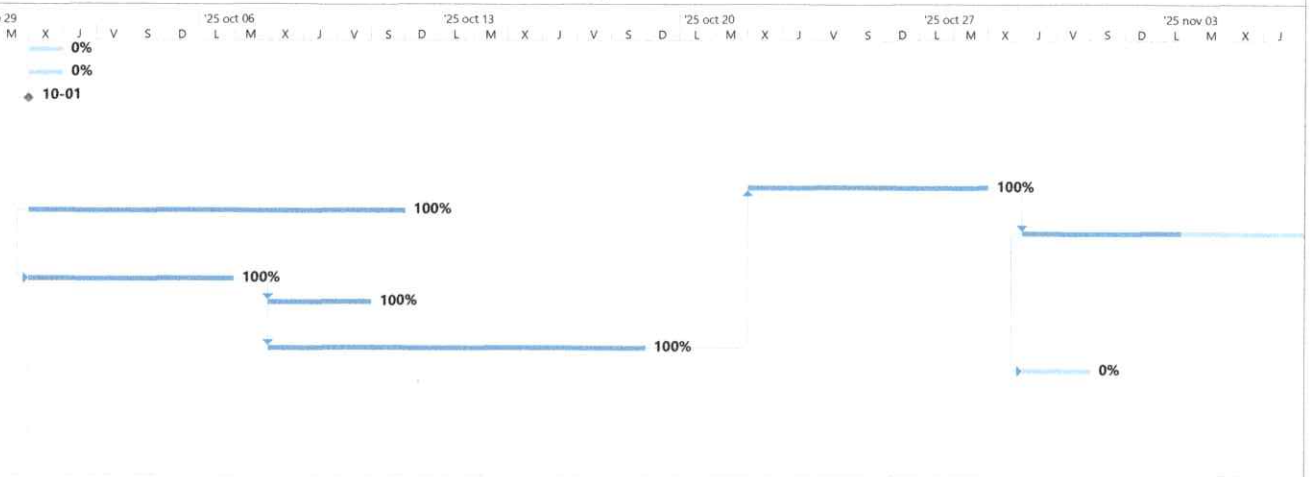

Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite

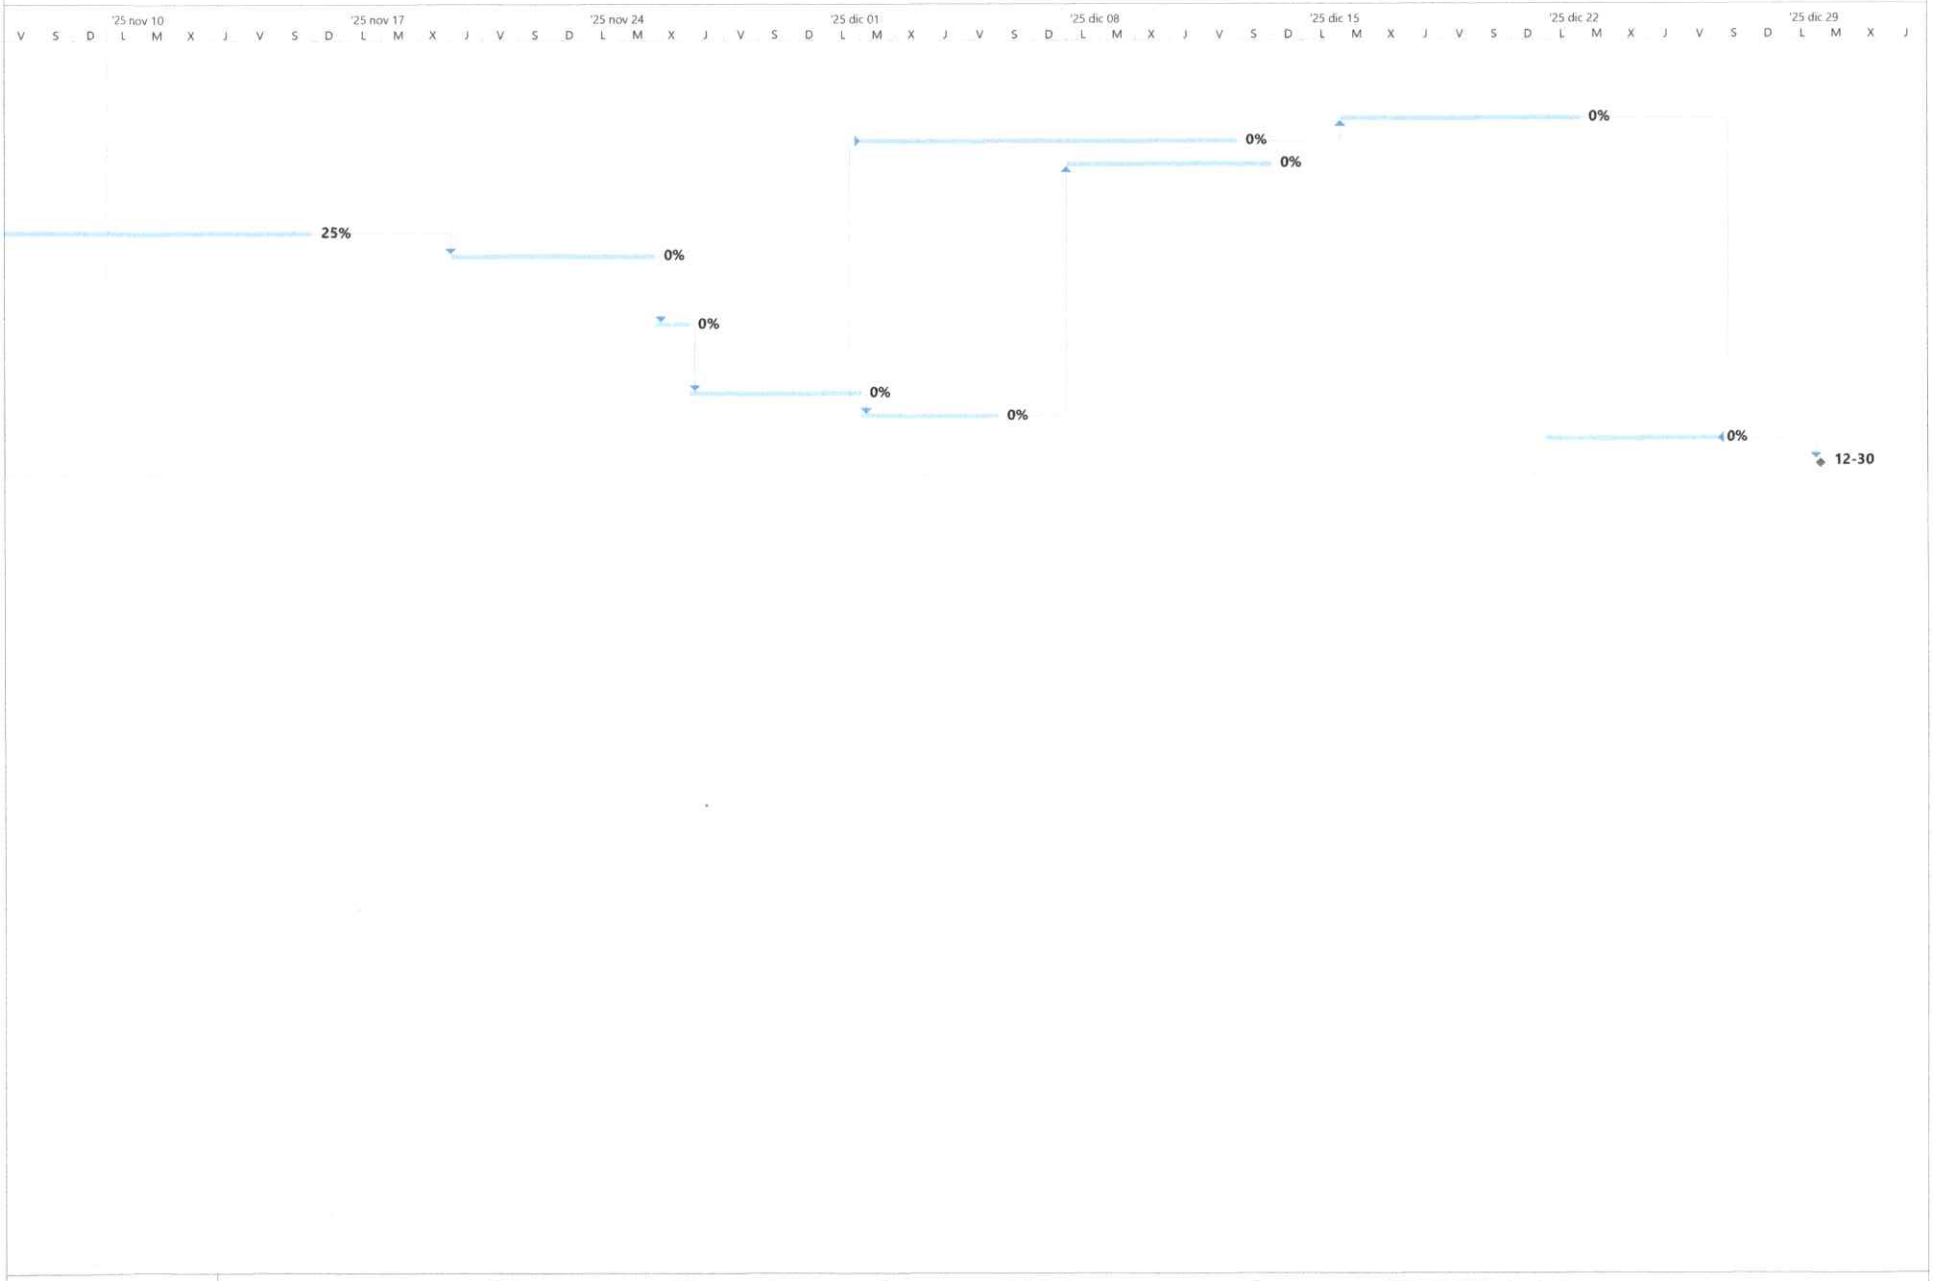
'25 nov 10
'25 nov 17
'25 nov 24
'25 dic 01
'25 dic 08
'25 dic 15
'25 dic 22
'25 dic 29
V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J
25%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
12-30
Tareas críticas
División crítica
Progreso de tarea crítica
Tarea
División
Progreso de tarea
Tarea manual
solo el comienzo
solo fin
solo duración
Línea base
División de la línea base
Hito de línea base
Hito
Progreso del resumen
Resumen
Resumen manual
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Fecha límite
