
1160

CONTRATO DE OBRA No. CLPIH376 de 2023

INFORME DE OBRA No. 05

MENSUAL [X] **FINAL** [ ]

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA

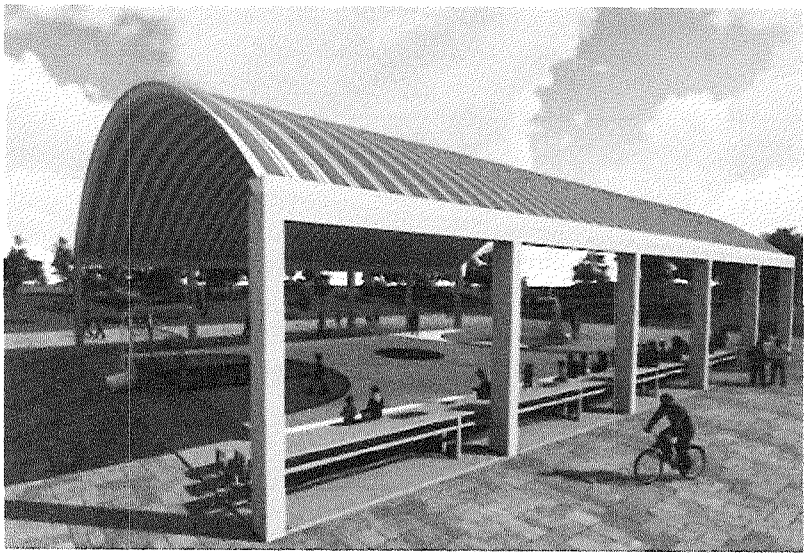

MUNICIPIO: Agrado

DEPARTAMENTO: Departamento Del Huila



1161

CONTRATO DE OBRA No. CLPIH376 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ

INTERVENTORIA	CONSORCIO WF	**ENTIDAD**	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLPIH376 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA VEREDA ALTO BUENAVISTA DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL AGRADO - DEPARTAMENTO DEL HUILA	**PERIODO DEL INFORME**	Entre 01 de septiembre al 06 de septiembre de 2024
CONTRATISTA	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	**NIT**	79356655-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	**C.C**	79356665

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	31 de octubre de 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	08 de noviembre de 2023		
PLAZO INICIAL	Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones, sin superar la presente vigencia fiscal		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	Un (1) mes y quince (15) días		
PLAZO TOTAL:	Cuatro (4) meses y quince (15) días calendario, contados a partir del acta de inicio, sin superar la presente vigencia fiscal 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	28 de diciembre de 2023		
FECHA DE REINICIO:	10 de julio de 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2:	06 de septiembre de 2024		
VALOR INICIAL:	$ 524.045.228,04		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A		
VALOR TOTAL:	$ 524.045.228,04		
INTERVENTOR:	CONSORCIO WF	**NIT:**	901.767.496-1
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**C.C:**	7.711.430

1162

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto Cubierta Autoportante con Iluminación se desarrolla en la Vereda Alto Buenavista de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila

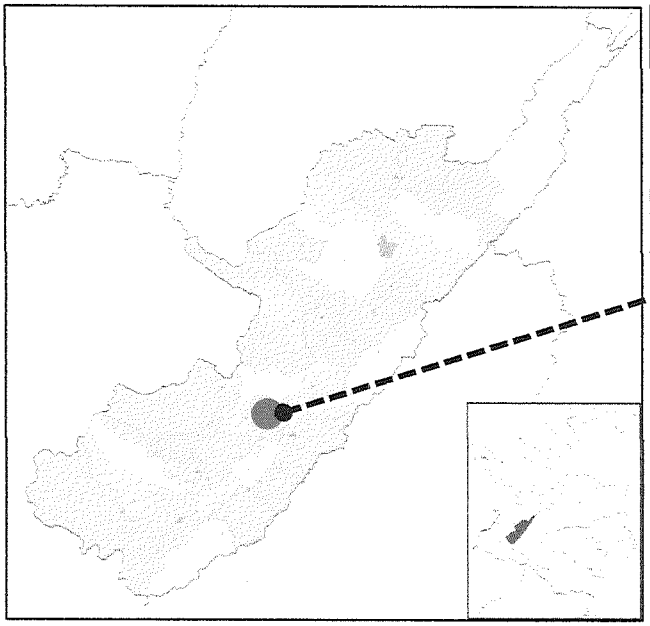


Ilustración 1. Departamento del Huila



Ilustración 2. Municipio de Agrado

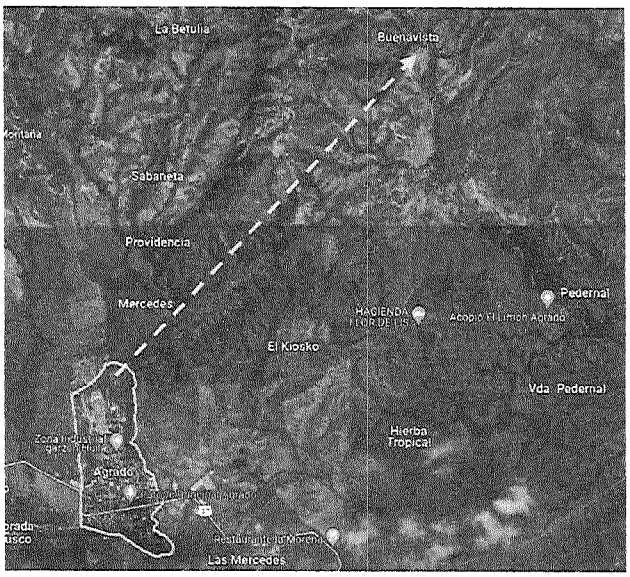


Ilustración 3. Ubicación de la Vereda Buenavista



Ilustración 4. Vereda Alto Buenavista

1163

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico contempla la construcción de la Cubierta Autoportante con Iluminación para la Vereda Alto Buenavista de la Zona Rural del Municipio Del Agrado - Departamento Del Huila, la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural, correspondientes a estructura cubierta, iluminación, y sistema hidráulico para el manejo de aguas lluvias. La cubierta será un sistema autoportante, sostenida con columnas vigas aéreas en concreto reforzado de 3000 PS y una cimentación tipo zapata, vigas de cimentación y viga canal, plaza contrapiso en concreto reforzado de 3000 PSI.

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

N/A

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	08/11/2023			29/12/2023
Suspensión No. 1	28/12/2023	50		29/12/2023
Reinicio No. 1	10/07/2024		195	04/10/2024
Suspensión No. 2	06/09/2024	56		30/10/2024
Terminación Contrato.	30/10/2024			30/10/2024
TOTAL DIAS		106	195	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	1	8 DE NOVIEMBRE DE 2023
ACTA DE VEEDURIA No. 1	1	4 DE DICEMBRE DE 2023
ACTA DE CONSERTACION Y SOCIALIZACION DE OBRA No. 1	1	4 DE DICEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 1 DE MODIFICACION	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023

1164

OTROSI MODIFICATORIO No. 1	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 1 DE SUSPENSIÓN No. 1	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE SUSPENSION No 1	1	28 DE DICIEMBRE DE 2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 2 DE REINICIO	1	10 DE JULIO DE 2024
ACTA DE REINICIO No. 1	1	10 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACION No. 3 DE OTROSÍ MODIFICATORIO No. 2	1	10 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACION No. 4	1	17 DE JULIO DE 2024
OTROSI MODIFICATORIO No.3	1	22 DE JULIO DE 2024
ACTA DE JUSTIFICACION No. 5 DE SUSPENCIÓN No. 2	1	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No 2	1	06 DE SEPTIEMBRE DE 2024

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). **Actividades administrativas**

Durante el periodo del 01 al 06 de septiembre de 2024 se realizaron las siguientes actividades administrativas:

1. Se cuenta con el siguiente personal en obra:

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO
Julio Ricardo Rojas Hernández	Director de Obra
Diego Fernando Cárdenas Ortiz	Residente de Obra
María Claudia Ortegón Prada	Residente SISO
Raúl Alfonso Rojas Hernández	Maestro General de obras /Técnico en Estructuras en Concreto
German Alonso Tenorio Navarro	Oficial de obra
Anturi Ancizar	Oficial de obra
José Zoilo Cáceres Ibargüen	Ayudante de Obra
Rodolfo Cáceres Ibargüen	Ayudante de Obra
Uriel Antonio Cáceres Ibargüen	Ayudante de Obra
Elkin Darío Caro Estrada	Ayudante de Obra
Giovanny Caro Estrada	Ayudante de Obra

1169

	Paula Andrea Derazo Arango	Ayudante de Obra
	Alvaro León Barraza	Ayudante de Obra
	William Palacios Caicedo	Ayudante de Obra
	Marlon Stiven Torres Arroyo	Ayudante de Obra
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Se verifica mediante inspección el buen funcionamiento de los equipos y herramientas utilizadas para las actividades llevadas a cabo durante el periodo
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Se solicitan los certificados de calidad de los materiales utilizados en las actividades ejecutadas durante el periodo
	APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL EQUIPO MINIMO y PERSONAL INGRESADO EN SEPTIEMBRE 2024	Planilla de aportes mes agosto No. 9474735651 Fecha de pago: 04 de octubre de 2024
	2. Se hace entrega de los elementos de protección personal; se acatan las normas de seguridad y salud en el trabajo 3. 06 de septiembre se suspende la obra, teniendo en cuenta el cierra de la vía de ingreso a la obra por aplicación de placa huella	
b.) **Actividades operativas**	Durante el periodo del 01 al 06 de septiembre de 2024 No se ejecuta obra debido a la construcción de la placa huella la cual impide el acceso a el area con materiales.	

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

La *temporada templada* dura *1,3 meses*, del *28 de agosto* al *7 de octubre*, y la temperatura máxima promedio diaria es más de *29 °C*. El mes más cálido del año en Agrado es *septiembre*, con una temperatura máxima promedio de *29 °C* y mínima de *20 °C*. a *temporada fresca* dura *3,1 meses*, del *18 de abril* al *21 de julio*, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de *28 °C*. El mes más frío del año en Agrado es *junio*, con una temperatura mínima promedio de *20 °C* y máxima de *28 °C*. La *temporada más mojada* dura *7,7 meses*, de *5 de octubre* a *29 de mayo*.

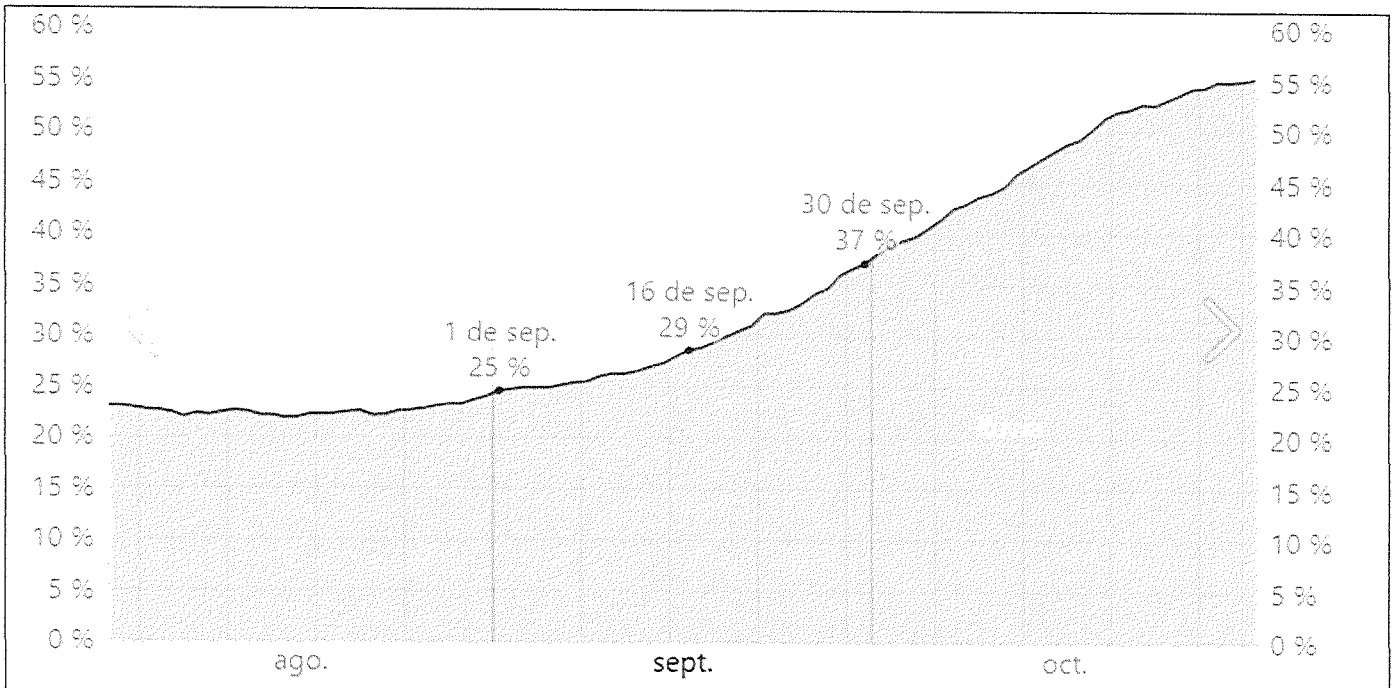


Ilustración 6. Precipitaciones en Agrado. Tomado de _Weather Spark https://es.weatherspark.com/m/22372/9/Tiempo-promedio-en-septiembre-en-Agrado-Colombia#Figures-Temperature

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	3000 PSI	1: 3,3: 1,1
Diseños de mezcla para base.	**N/A**	
Compresión simple al concreto.	**N/A**	
Ensayo de compactación de campo	**N/A**	

NOTA: *Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Articulo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.*

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO	RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE

1167

			7	14	28			
ZAPATA	06/08/2024	13/08/2024	X			3000 PSI	1633,14 PSI	
		03/09/2024			X	3000 PSI	3022,67 PSI	CUMPLE
Observación: Se está cumpliendo a los siete (7) días con 54,44% de la resistencia requerida y se cumple a los (veintiocho) 28 días con una resistencia del 100,76%, superior a los 3000 PSI								
VIGA DE CIMENTACION	12/08/2024	19/08/2024	X			3000 PSI	1886,83 PSI	CUMPLE
		06/09/2024			X	3000 PSI	3019,48 PSI	CUMPLE
Observación: Se está cumpliendo a los siete (7) días con 62,89% de la resistencia requerida y se cumple a los (veintiocho) 28 días con una resistencia del 100,65%, superior a los 3000 PSI								
COLUMNA	20/08/2024	27/08/2024	X			3000 PSI	1936,68 PSI	CUMPLE
		17/09/2024			X			
Observación: Se está cumpliendo a los siete (7) días con 64,56% de la resistencia requerida; se proyecta que a los (veintiocho) 28 días dará una resistencia superior a los 3000 PSI								

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	30/07/2024	$ 131.011.307,01	$	$ 131.011.307,01
Acta Parcial No. 1		$	$	$
Acta Parcial No. 2		$	$	$
Acta Recibo Final No.4		$	$	$
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$524.040.534.87	$	$524.040.534.87	$	$524.040.534.87

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)

1168

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA INTERVENTORIA (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (01/09/2024) al (06/09/2024)	10/09/2024		Físico
Informe HSEQ (periodo del (01/09/2024) al (06/09/2024)	10/09/2024		Físico
Actas de comités (periodo del (01/09/2024) al (06/06/2024)	10/09/2024		Físico
Registros de ensayos de laboratorio periodo del (01/09/2024) al (06/09/2024)	10/09/2024		Físico
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARL-AFP) (periodo del (01/09/2024) al (30/09/2024)	10/09/2024		Físico

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
Julio Ricardo Rojas Hernández	79356655	Director de Obra	Obra Labor
Diego Fernando Cárdenas Ortiz	93130553	Residente de Obra	Obra Labor
María Claudia Ortegón Prada	65726142	Residente SISO	Obra Labor
Raúl Alfonso Rojas Hernández	79445826	Maestro General de obras /Técnico en Estructuras en Concreto	Obra Labor
German Alonso Tenorio Navarro	1020803673	Oficial de obra	Obra Labor
Anturi Ancizar	1117495184	Oficial de obra	Obra Labor
José Zoilo Cáceres Ibargüen	1077633443	Ayudante de Obra	Obra Labor
Rodolfo Cáceres Ibargüen	11621273	Ayudante de Obra	Obra Labor
Uriel Antonio Cáceres Ibargüen	1113664324	Ayudante de Obra	Obra Labor
Elkin Darío Caro Estrada	71277685	Ayudante de Obra	Obra Labor
Giovanny Caro Estrada	1037591050	Ayudante de Obra	Obra Labor
Paula Andrea Derazo Arango	29679146	Ayudante de Obra	Obra Labor
Alvaro León Barraza	1002422428	Ayudante de Obra	Obra Labor
William Palacios Caicedo	16514111	Ayudante de Obra	Obra Labor
Marlon Stiven Torres Arroyo	1006195389	Ayudante de Obra	Obra Labor

1169

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
Anticipo	2023003244	30/07/2024

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFI SCALES	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO
Julio Ricardo Rojas Hernández	$ 208.000	$ 162.500	$ 90.500	$ 26.000	0,00	9474458084	04/10/2024
Diego Fernando Cárdenas Ortiz	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
María Claudia Ortegón Prada	$ 0.00	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
Raúl Alfonso Rojas Hernández	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
German Alonso Tenorio Navarro	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
Anturi Ancizar	$ 0.00	$ 52.000	$ 6 800	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
José Zoilo Cáceres Ibargüen	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
Rodolfo Cáceres Ibargüen	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
Uriel Antonio Cáceres Ibargüen	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
Elkin Darío Caro Estrada	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
Giovanny Caro Estrada	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
Paula Andrea Derazo Arango	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
Alvaro León Barraza	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
William Palacios Caicedo	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024
Marlon Stiven Torres Arroyo	$ 208.000	$ 52.000	$ 90.500	$ 52.000	0,00	9474735651	04/10/2024

16. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

170

Póliza legalización del CONTRATO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S. A	14-40-101196607	0	28/10/2023	Cumplimiento del contrato	26/10/2023	30/06/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	26/10/2023	30/06/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/10/2023	29/12/2026
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses y 0 Día.	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	**0**	28/10/2023		26/10/2023	29/12/2023
Póliza actualizada ANEXO DE MODIFICACIÓN POR TRASLADO DE VIGENCIAS						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	1	14/11/2023	Cumplimiento del contrato	Sin fechas	Sin fechas
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	Sin fechas	Sin fechas
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	Sin fechas	Sin fechas
				Estabilidad y Calidad de Obras	Sin fechas	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	1	14/11/2023		Sin fechas	Sin fechas
Póliza actualizada por ACTA DE INICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	2	14/11/2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	13/07/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	13/07/2024

1171

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	11/01/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses y 0 Día.	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	2	14/11/2023		08/11/2023	11/01/2024
Póliza actualizada por ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	3	03/01/2024	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	31/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	31/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	28/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses y 0 Día.	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	3	03/01/2024		08/11/2023	28/02/2024
Póliza actualizada por ACTA DE REINICIO No. 1						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	4	12/07/2024	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	31/01/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	31/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	28/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses y 0 Día.	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.		FECHA		VIGENCIA	

1172

		END OSO	DE EMISIÓN	DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	4	03/01/2024	08/11/2023	31/07/2024

Póliza actualizada por ACTA DE REINICIO No. 1, corrección de vigencias

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	5	26/07/2024	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	19/08/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	19/08/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	19/082027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses y 0 Día.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN	**VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)**
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	5	26/07/2024	08/11/2023	19/08/2024

Póliza actualizada por ACTA DE PRORROGA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	6	16/08/2024	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	05/10/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	05/10/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	05/10/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses y 0 Día.	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	6	16/08/2024	08/11/2023	05/10/2024

1173

Póliza actualizada por ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101196607	7	10/09/2024	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	05/11/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	08/11/2023	05/11/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	05/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	Si Ampara 5 Años, 0 Meses y 0 Día.	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	END OSO	FECHA DE EMISIÓN		VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-40-101060094	7	10/09/2024		08/11/2023	05/11/2024

17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (Describir el contenido del plano)

No se realiza en este periodo ejecución de Obra

1174

- **ANEXOS**

- Informe HSEQ.
- Bitácora de Obra.
- Soportes de pago de Aportes a la Seguridad Social Integral (EPS-ARL-AFP).

ARQ. JULIO RICARDO ROJAS HERNANDEZ	08/10/2024	ING. YARDELY NATHALIA LOPEZ ROJAS CONSORCIO WF
FIRMA ORIGINAL **DIRECTOR DE OBRA**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo.Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
