Bogotá D.C., diciembre 22 de 2025.

Señores
**LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA**
**Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Quibdó**
Atn: Dra: YEUDITH LEDEZMA GARRIDO - Supervisora
E. S. M.

**Ref.:** Informe inicial y solicitud **suspensión** o **prórroga** contrato No. 2025-036.
**Objeto:** "*ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS ENROLLABLES*"

Respetados señores;

La suscrita **ANA ZULAY GONZALEZ BOHORQUEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 51.957.017, expedida en Bogotá; actuando en calidad de representante legal de la firma **SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA SAS** – NIT. 830.080.652-5; firma contratista; luego de realizada la visita técnica para verificación de medidas de las cortinas, de la cual allego como anexo al presente informe, comedidamente solicito estudiar la conveniencia técnico-jurídica de ***suspender*** o ***prorrogar*** el contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. La información recogida nos arroja el siguiente consolidado:


| CONSOLIDADO INFORMACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SEDE** | **UND** | **SCREEN 1%** | **BLACK OUT** | **VALOR TOTAL** |
| MIRAFLORES | 168 | 208,809 | 208,809 | $ 79.138.611 |
| EL SILENCIO | 160 | 204,014 | 204,014 | $ 77.321.117 |
| PALACIO | 178 | 338,908 | 157,326 | $ 94.490.253 |
| ITSMINA | 64 | 78,795 | 78,795 | $ 29.863.305 |
| **TOTALES** | **570** | **830,526** | **648,943** | **$ 280.813.285** |
| | | | | |
| SOPORTES INTERMEDIOS | 104 | | $ 24.990 | $ 2.598.960 |
| ESCUADRAS | 514 | | $ 41.650 | $ 21.408.100 |
| | | | | **$ 304.820.345** |
| | | | | |
| **INFORMACIÓN CONTRATO:** | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | **$ 304.991.298** |
| AREA | | | | 1588,496 |
| VALOR M2 INCLUYE IVA | | | | **$ 192.000** |
| | | | | |
| SALDO A FAVOR DIRECCION EJECUTIVA | | | | **$ 170.953** |

2. El plazo vence de ejecución material del próximo 31 de diciembre de 2025, es decir que estamos a 9 días, 3 de los cuales no son laborales, es decir que solo tenemos 6 días para la aprobación de la apertura y tono, montar orden de ensamble, ensamblar, empacar, despachar desde Pereira y entregar en la ciudad de Quibdó en cada sede e instalar.

3. Estos plazos son técnica y logísticamente inalcanzables, teniendo en cuenta tres variables: *i)* vacaciones colectivas para las fábricas, *ii)* mayores tiempos de entrega de las transportadoras y la *iii)* vacancia judicial que conlleva la imposibilidad de acceder a los despachos judiciales a realizar la instalación.

4. Por las razones anteriormente expuestas, pongo a consideración de la administración definir la manera adecuada de flexibilizar los tiempos para permitir la adecuada ejecución a través de cualesquiera de los dos mecanismos expuestos en la introducción.

5. Se adjunta cronograma sugerido y detalle de la información recogida, que permita reforzar la decisión y organizar los tiempos para cada etapa de la ejecución.

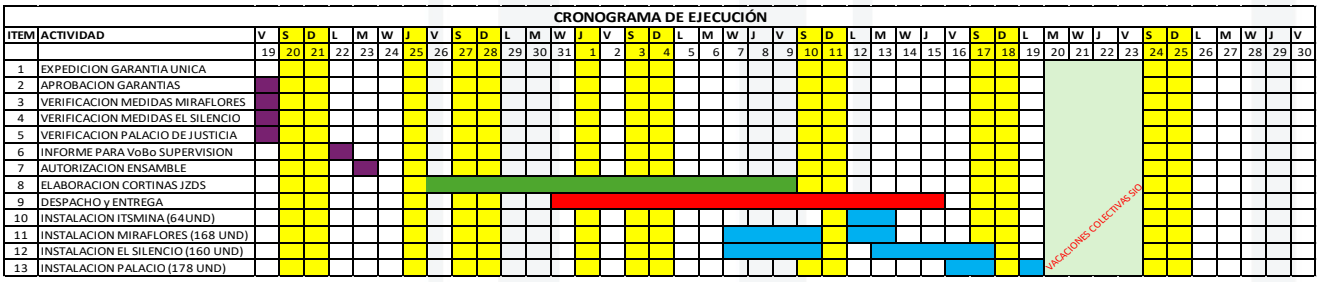


Atentamente;

Ana Zulay González Bohórquez
Representante Legal
