
INFORME DE INTERVENTORIA ACTA PARCIAL No 1 DE OBRA

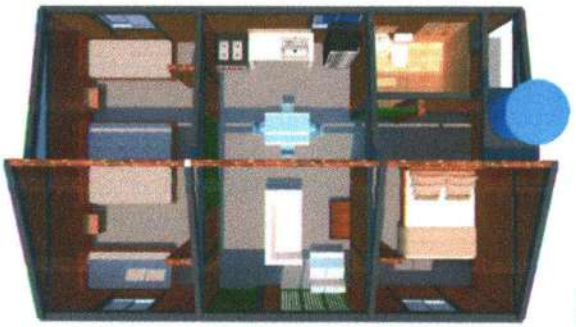

PERIODO: DEL 13 DE AGOSTO DE 2025 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE OBRA No. 7943767-2025, PROCESO DE LP-SHAB-00817-2025, DEFECHA JULIO 7 DE 2025 ID 00817

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VSR NORTE R/L ALVARO ADRIAN VILLAMIZAR LATORRE

OBJETO: CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL NUEVA EN LOTES DISPERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, EL CARMEN, SAN CALIXTO Y TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

Contrato electrónico 7982455 – 2025, de fecha 04/07/2025
Proceso contractual CM-SHA-00461-2025

CONTRATISTA: ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO R/L ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL NUEVA EN LOTES DISPERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCIÓN, EL CARMEN, SAN CALIXTO Y TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SUPERVISOR: ARQ. CARLOS YAIR SOLER GARCÍA.

CUCUTA, 13 DICIEMBRE DEL 2025

CONTENIDO

INTRODUCCION.....3

1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES.....4

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN.....4
1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO.....4

2 ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO.....4

2.1 DESCRIPCION GENERAL.....4
2.2 LOCALIZACION.....5
2.3 ALCANCE.....8
3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....12
3.1 INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA.....12
3.2 GARANTIAS DEL CONTRATO.....13
3.2.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN.....13
3.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS.....14
4 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA.....14
4.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO.....14
5 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.....15
5.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO.....15
5.2 PERSONAL OPERATIVO.....16
5.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.....19
5.3.1 DOTACIÓN DEL PERSONAL.....19
5.3.2 SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA.....20
5.3.3 ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA.....21
5.3.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).....21
5.4 PERMISOS Y LICENCIAS.....21
5.4.1 LICENCIAS Y PERMISOS AMBIENTALES.....21
5.4.2 LICENCIAS Y PERMISOS PARA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.....22
6 CONDICIONES CONTRACTUALES.....22
6.1 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA.....26
6.2 CANTIDADES DE OBRA ACUMULADAS.....31
6.3 AVANCE FÍSICO DE LAS OBRAS.....36
6.4 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL.....36
7. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS.....37

INTRODUCCION

El presente documento tiene como objeto dar un informe de las actividades que se ejecutaron en para el cobro del acta parcial No 1, se adelantan por parte del contratista UNION TEMPORAL VSR NORTE y su representante legal ALVARO ADRIAN VILLAMIZAR LATORRE, NIT. 901.959.772-2 cuyo objeto del contrato es CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL NUEVA EN LOTES DISPERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, EL CARMEN, SAN CALIXTO Y TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, con contrato número LP-SHAB-00817-2025.

En el periodo del 13/08/2025 y al 13/12/2025 la presente acta parcial No.1 por el contratista de obra se ejecutó un 83% y avance financiero de $ 3.141.180.075,00

1 ASPECTOS PRECONTRACTUALES

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN

La secretaria de hábitat de Norte de Santander adelantó el proceso de selección del contratista mediante la Licitación Pública número LP-SHAB-00817-2025, de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, numeral 1 del art. 2 de la ley 1150 de 2007, art 14 y 15 del decreto 2474 de 2008 y demás normatividad concordante, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB https://community.secop.gov.co, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato a la UNIÓN TEMPORAL VSR NORTE mediante Resolución (No.023 del 13/06/2025).

1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación No.023 del 13/06/2025, se procedió a la suscripción del contrato de obra No. 7943767 de 2025 el día 07 de 07 de 2025 entre LA SECRETARIA DE HÁBITAT del Norte de Santander y la firma contratista UNIÓN TEMPORAL VSR NORTE representada por Álvaro Adrián Villamizar Latorre, el cual tiene por objeto CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL NUEVA EN LOTES DISPERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, EL CARMEN, SAN CALIXTO Y TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, con un plazo de ejecución de cinco (5) meses veinte (20) días y un valor de $ 3.807.491.000.

2 ANTECEDENTES Y REVISIÓN DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

Los municipios de Convención, El Carmen, Teorama y San Calixto, todos ubicados en el departamento de Norte de Santander, comparten varios elementos históricos importantes que han marcado su desarrollo y características sociales:

- Colonización Y Poblamiento

Estos municipios fueron colonizados principalmente durante el siglo XVIII, con pobladores que llegaron desde otras regiones como Ocaña.

La presencia inicial de comunidades indígenas influyó en la configuración cultural y social de la zona. En muchos casos, la colonización enfrentó resistencia de los grupos originarios.

Condiciones Geográficas Similares

Están ubicados en una zona montañosa de la Cordillera Oriental, lo que condicionó sus formas de vida, economía (agricultura, especialmente café, cacao y otros cultivos) y comunicaciones.

- Influencia De La Conflictividad Armada

A lo largo de la historia reciente, estas zonas han estado afectadas por la presencia de grupos armados ilegales y el conflicto armado interno colombiano. Esto ha impactado el desarrollo social, económico y político de los municipios, generando desplazamientos y dificultades en la estabilidad.

- Identidad Cultural Y Social

A pesar de los desafíos, los municipios han mantenido tradiciones culturales, económicas y sociales propias, con comunidades que valoran su historia y patrimonio.

- Economía Rural


La economía de estos municipios se ha basado tradicionalmente en actividades agropecuarias, aprovechando la riqueza natural del territorio para cultivos como café, cacao, y productos tradicionales.


En resumen, la historia compartida de Convención, El Carmen, Teorama y San Calixto está marcada por la colonización en tierras indígenas, una fuerte vinculación con la agricultura de montaña y el impacto del conflicto armado, que juntos han definido la identidad y los retos de estas comunidades.

2.2 LOCALIZACION

El proyecto se desarrollará en el departamento del Norte de Santander, Municipios de Convención, El Carmen, Teorama y San Calixto en predios pertenecientes a los beneficiarios y acreditados con escrituras o sanas posesiones suscritas por la alcaldía de cada municipio.

CONVENCIÓN

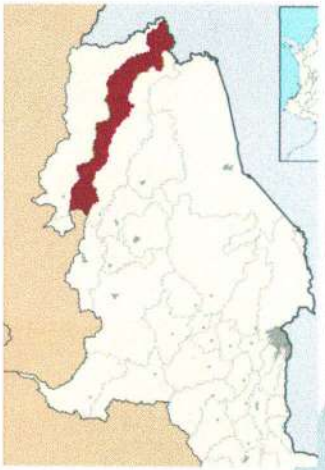


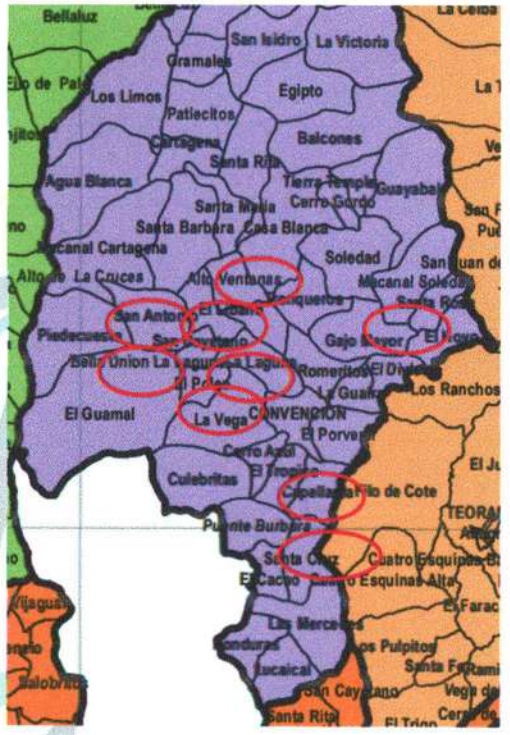

Avenida Demetrio Mendoza-Centro Comercial Bolívar Bloque A Oficina A10
Telf.: 5956455 Cel: 3208080736 – 3203435946-
Email: construccioneseinterventorias@hotmail.com – zulyva891@gmail.com

SCAN ME


EL CARMEN

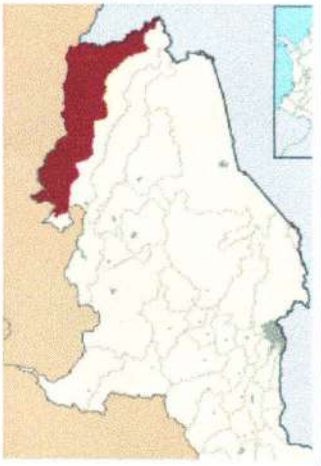



TEORAMA




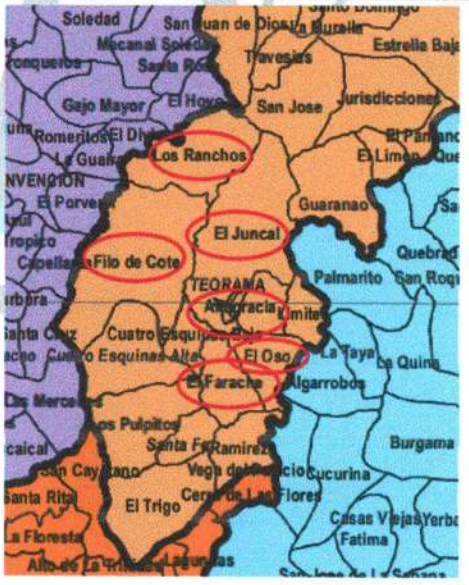

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

Avenida Demetrio Mendoza-Centro Comercial Bolivar Bloque A Oficina A10
Telf.: 5956455 Cel: 3208080736 – 3203435946-
Email: construccioneseinterventorias@hotmail.com – zulyva891@gmail.com

SCAN ME

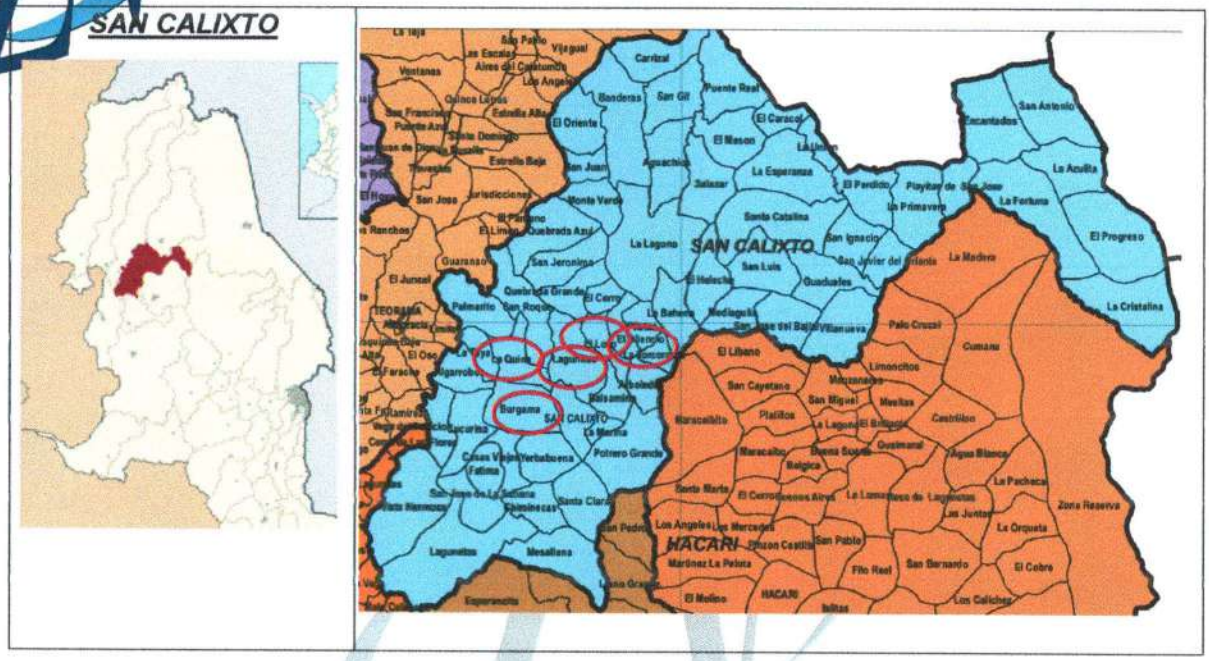

2.3 ALCANCE

A continuación, se relaciona el alcance correspondiente al contrato de obra No. LP-SHAB-00817-2025 de julio de 2025.

Tabla 1. Alcance del Proyecto

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
1,00 OBRAS PRELIMINARES					**913.746,00**
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	56,12	5.431,00	304.788,00
1,02	EXCAVACIÓN A MANO	m3	10,80	56.385,00	608.958,00
2,00 CIMENTACIÓN					**11.906.890,00**
2,01	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25*0,25 M	ml	55,31	56.623,00	3.131.818,00
2,02	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,15*0,25 M	ml	11,46	58.801,00	673.859,00
2,03	ACERO DE REFUERZO 3/8" FY= 4200KG/CM2	kg	247,30	7.704,00	1.905.199,00

2,04	ACERO DE REFUERZO 1/4" FY= 2400KG/CM2	kg	182,49	8.867,00	1.618.139,00
2,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	m3	7,56	50.517,00	381.909,00
2,06	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA e=0,10 M (incluye malla de refuerzo)	m2	63,53	66.047,00	4.195.966,00
3,00 ESTRUCTURA EN CONCRETO					**11.617.282,00**
3,01	CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNA SECCION 0.10*0,25m (COLUMNAS C1-C2-C3)	ml	33,00	56.143,00	1.852.719,00
3,02	CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNETAS SECCION 0,1*0,1M (COLUMNETAS CL)	ml	13,50	49.814,00	672.489,00
3,03	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA SOBRE MURO (0.12*0.25)	ml	70,25	50.327,00	3.535.472,00
3,04	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA CINTA (0.12*0.25)	ml	6,13	50.327,00	308.505,00
3,05	DINTEL DE 0.12*0.10 (CONCRETO 21 MPA+ ACERO DE REFUERZO)	ml	4,00	38.511,00	154.044,00
3,06	CONCRETO DE 21 MPA PARA PLACA SOPORTE TANQUE ELEVADO (e=0,05M) incluye refuerzo	m2	1,40	142.171,00	199.039,00
3,07	ACERO DE REFUERO 3/8" FY=4200 KG/CM2	kg	357,97	7.704,00	2.757.801,00
3,08	ACERO DE REFUERZO 1/4" FY= 2400KG/CM2	kg	241,03	8.867,00	2.137.213,00
4,00 MAMPOSTERIA					**4.651.900,00**
4,01	MURO EN BLOQUE No.5 E=12 CM	m2	84,60	54.987,00	4.651.900,00
5,00 CUBIERTA					**7.174.905,00**
5,01	VIGUETA EN PERFIL METALICO RECTANGULAR 80*40*2,0mm ESTRUCTURAL HR50	ml	63,94	48.025,00	3.070.719,00
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO No. 5	m2	73,92	55.522,00	4.104.186,00
6,00 CARPINTERÍA METÁLICA					**5.402.176,00**
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0,6*0,4M	und	1,00	175.833,00	175.833,00
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALUMINIO (1,15*1,00). (INCLUYE VIDRIO 4MM)	und	4,00	338.863,00	1.355.452,00

6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALUMINIO (2,30*1,50M). (INCLUYE VIDIRIO 4MM)	und	1,00	460.375,00	460.375,00
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA PARA EXTERIORES DE 0.90M*2.30M (INCLUYE MARCO METALICO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA)	und	2,00	648.720,00	1.297.440,00
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA INTERIORES DE 0.90M*2,30M (INCLUYE MARCO METALICO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA DE POMO)	und	4,00	528.269,00	2.113.076,00
7,00 INSTALACIONES HIDRAULICAS					**2.016.957,00**
7,01	RED SUMINISTRO DE AGUA PVC 1" Y 1/2"	ml	12,43	42.000,00	522.060,00
7,02	PUNTOS DE AGUA FRIA (incluye tuberías y accesorios según diseño)	und	6,00	66.380,00	398.280,00
7,03	VALVULA DE PASO 1"	und	1,00	34.299,00	34.299,00
7,04	VALVULA DE PASO 1/2"	und	1,00	22.799,00	22.799,00
7,05	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LITROS (incluye tubería y accesorios según diseño)	und	1,00	1.039.519,00	1.039.519,00
8,00 INSTALACIONES SANITARIAS					**909.068,00**
8,01	PUNTO SANITARIO 2".	und	5,00	46.945,00	234.725,00
8,02	PUNTO SANITARIO 4".	und	1,00	112.809,00	112.809,00
8,03	CAJA DE INSPECCION 50*50	und	1,00	332.175,00	332.175,00
8,04	RED SANITARIA PVCS 2"	ml	7,07	27.182,00	192.177,00
8,05	RED SANITARIA PVCS 4"	ml	1,00	37.182,00	37.182,00
9,00 INSTALACIONES ELECTRICAS					**4.562.448,00**
9,01	SALIDA ILUMINACION-ROCETAS	und	10,00	136.424,00	1.364.240,00
9,02	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE	und	7,00	124.950,00	874.650,00
9,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE GFCI	und	2,00	196.277,00	392.554,00
9,04	SISTEMA PUESTA A TIERRA	und	1,00	459.519,00	459.519,00
9,05	SISTEMA DE MEDICION	und	1,00	429.519,00	429.519,00
9,06	TABLERO PRINCIPAL	und	1,00	359.262,00	359.262,00
9,07	ACOMETIDA	ml	12,00	56.892,00	682.704,00
10,00 ACABADOS					**6.263.836,00**
10,0	SUMINISTRO E INSTALACION DE	und	1,00	320.156,00	320.156,00

1	SANITARIO				
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMAOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	und	1,00	225.925,00	225.925,00
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO	und	1,00	419.420,00	419.420,00
10,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE 40*60 (incluye llave)	und	1,00	244.130,00	244.130,00
10,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (REGADERA CORRIENTE)	und	1,00	97.889,00	97.889,00
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA BAÑO	m2	3,43	62.443,00	214.179,00
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PARED DE DUCHA+ SALPICADERA LAVAMANOS	m2	6,07	72.382,00	439.359,00
10,08	MESON PARA COCINA	m2	0,87	104.655,00	91.050,00
10,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA SALPICADERO Y MESON DE LAVAPLATOS	m2	4,22	72.382,00	305.452,00
10,1	PAÑETE SOBRE MUROS	m2	73,92	30.562,00	2.259.143,00
10,11	ENCHAPE PISO COCINA EN TABLETA DE GRES	m2	8,75	55.061,00	481.784,00
10,12	PINTURA TERMOAISLANTE PARA CUBIERTA	m2	73,92	15.765,00	1.165.349,00
11,00	**SISTEMA POSTRATAMIENTO**				**2.977.404,00**
11,01	EXCAVACIÓN A MANO	m3	2,38	56.385,00	134.196,00
11,02	SISTEMA SEPTICO PREFABRICADO Y CAMPO DE INFILTRACION	und	1,00	2.843.208,00	2.843.208,00

COSTO DIRECTO =	**$**	**58.396.612,00**
COSTOS INDIRECTOS=	**$**	**20.438.814,00**
ADMINISTRACION (29%) =	$	16.935.017,00
IMPREVISTOS (1%) =	$	583.966,00
UTILIDADES (5%) =	$	2.919.831,00
COSTO TOTAL DE UNA VIVIENDA =	**$**	**78.835.426,00**
COSTO DIRECYO DEL PROYECTO (40 VIVIENDAS) =	$	2.335.864.480,00
COSTO TRANSPORTE (40 VIVIENDAS) INCLUYE: CAMIÓN 600, 300 Y	$	560.000.000,00

TRANSPORTE A MULA=	
COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO (40 VIVIENDAS) =	$ 817.552.560,00
TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO (40 VIVIENDAS)	$ 3.713.417.040,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 14.073.960,00
CERTIFICACION RETIE-RETILAP	$ 80.000.000,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 3.807.491.000**

3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 INFORME CONTRACTUAL – FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
INTERVENTOR EXTERNO:	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
SUPERVISOR:	CARLOS YAIR SOLER GARCIA
CONTRATO No:	7943767 DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL NUEVA EN LOTES DISPERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, EL CARMEN, SAN CALIXTO Y TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL VSR NORTE
REPRESENTANTE LEGAL:	ALVARO ADRIAN VILLAMIZAR LATORRE
NIT. No:	901.959.772-2
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.807.491.000
PLAZO CONTRACTUAL:	CINCO (5) MESES, VEINTE (20) DIAS
VALOR DEL ANTICIPO:	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	RN 001925 de marzo 21 de 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RN número 004925, de fecha Julio 08 de 2025
FECHA INICIO:	13/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	02/02/2026
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	DEL 13/08/2025 AL 13/12/2025

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
DIAS TRANSCURRIDOS:	122

3.2 GARANTIAS DEL CONTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por la SECRETARIA DE HABITAT DEL NORTE DE SANTANDER en el Contrato de obra No. LP-SHAB-00817-2025, se suscribe con la compañía de Berkley International Seguros Colombia S.A las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la CLÁUSULA 16 del Contrato así:

3.2.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas de cumplimiento en favor de entidades estatales fueron expedidas el 25 de septiembre de 2025 por la aseguradora Berkley International Seguros Colombia SAS, tomadas por UNION TEMPORAL VSR NORTE y como beneficiario a SECRETARIA DE HABITAT DE NORTE DE SANTANDER y fueron aprobadas el día 13 de agosto de 21025.

Pólizas iniciales del contrato de obra No. LP-SHAB-00817-2025

Pólizas de cumplimiento

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	04/07/2025	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Berkley International Seguros Colombia SAS	92984	$ 380.749.100,00	24/12/2025	25/12/2027
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 761.498.200,00	04/07/2025	25/06/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES			$ 190.374.550,00	04/07/2025	25/12/2028

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
1	25/09/2025	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Berkley International Seguros Colombia SAS	92984	$ 380.749.100,00	27/12/2025	28/12/2027
		CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			$ 761.498.200,00	13/08/2025	03/02/2029
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E			$ 190.374.550,00	13/08/2025	03/02/2029

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
		INDEMNIZACIONES LABORALES					

3.3 ACTOS ADMINISTRATIVOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Actos Administrativos Contrato de Obra No. LP-SHAB-00817-2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
14/08/2025	Acta de socialización	Necesidad de dar a conocer el proyecto a la comunidad.	Asistentes a la socialización
13/08/2025	Acta de inicio de obra	*Dar inicio a la ejecución del contrato de obra No. LP-SHAB-00817-2025*	*Álvaro Adrián Villamizar – R/L Contratista* *Zulay Yadira Vásquez Pino – Interventoría* *Samir Casadiego- secretario de SECRETARIA DE HABITAT* *Libia Stella Soto Urbina – Supervisora*
13/08/2025	Acta de inicio de interventoría	*Dar inicio a la ejecución del contrato de interventoría No. CM-SHA-00461-2025*	*Zulay Yadira Vásquez Pino – Interventoría* *Samir Casadiego- secretario de SECRETARIA DE HABITAT* *Libia Stella Soto Urbina – Supervisora*

4 CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

4.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

Entre el 14 y 15 de agosto de 2025, se realizó la socialización del proyecto cuyo objeto es CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL NUEVA EN LOTES DISPERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, EL CARMEN, SAN CALIXTO Y TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER, en las instalaciones del parque principal de Guamalito.

En dicha reunión participaron representantes de la comunidad directamente beneficiada, de la firma contratista de la obra, de la Interventoría, un representante de cada uno de los Municipios, a quienes se les dio a conocer el alcance físico y financiero del contrato, el plazo de ejecución del

mismo; de igual forma se atendieron las observaciones e inquietudes de los participantes y se presentaron los profesionales que van a estar frente a la ejecución del proyecto por parte del contratista, la Interventoría.



5 VINCULACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

El contratista vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La Interventoría antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregadas por el contratista.

5.1 Personal Administrativo

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe, es el mismo que fue ofertado por el contratista en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona el personal administrativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Personal administrativo del contrato de obra No. LP-SHAB-00817-2025 del 13 de agosto de 2025, en el periodo comprendido entre el 13 DE AGOSTO DE 2025 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2025.

MES: AGOSTO DE 2025

	DATOS GENERALES								AFILIADO A		
	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	VILLAMIZAR LATORRE	ALVARO ADRIAN	13.277.602	REPRESENTANTE LEGAL		13/08/2025		17	X	X	X
2	VILLAMIZAR LATORRE	ALVARO ADRIAN	13.277.602	DIRECTOR DE OBRA		13/08/2025		17	X	X	X
3	MANZANO BARBOSA	DUBAN ARMANDO	1.091677.525	ING, AMBIENTAL Y PGIO		13/08/2025		17	X	X	X
	SANCHEZ CARRILLO	LAURA JULIANA	1.004.860.844	RESIDENTE DE OBRA		13/08/2025		17	X	X	X
5	CALDERON QUINTERO	ANA MILENA	88'263.769	INSPECTOR DE OBRA		13/08/2025		17	X	X	X

MES: SEPTIEMBRE DE 2025

	DATOS GENERALES								AFILIADO A		
	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	VILLAMIZAR LATORRE	ALVARO ADRIAN	13.277.602	REPRESENTANTE LEGAL		13/08/2025		30	X	X	X
2	VILLAMIZAR LATORRE	ALVARO ADRIAN	13.277.602	DIRECTOR DE OBRA		13/08/2025		30	X	X	X
3	MANZANO BARBOSA	DUBAN ARMANDO	1.091677.525	ING, AMBIENTAL Y PGIO		13/08/2025		30	X	X	X
4	SANCHEZ CARRILLO	LAURA JULIANA	1.004.860.844	RESIDENTE DE OBRA		13/08/2025		30	X	X	X
5	CALDERON QUINTERO	ANA MILENA	88'263.769	INSPECTOR DE OBRA		13/08/2025		30	X	X	X

MES: OCTUBRE DE 2025

	DATOS GENERALES								AFILIADO A		
	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS
	VILLAMIZAR LATORRE	ALVARO ADRIAN	13.277.602	REPRESENTANTE LEGAL		13/08/2025		30	X	X	X
2	VILLAMIZAR LATORRE	ALVARO ADRIAN	13.277.602	DIRECTOR DE OBRA		13/08/2025		30	X	X	X
3	MANZANO BARBOSA	DUBAN ARMANDO	1.091677.525	ING, AMBIENTAL Y PGIO		13/08/2025		30	X	X	X
4	SANCHEZ CARRILLO	LAURA JULIANA	1.004.860.844	RESIDENTE DE OBRA		13/08/2025		30	X	X	X
5	CALDERON QUINTERO	ANA MILENA	88'263.769	INSPECTOR DE OBRA		13/08/2025		30	X	X	X

MES: NOVIEMBRE DE 2025

	DATOS GENERALES								AFILIADO A		
	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	VILLAMIZAR LATORRE	ALVARO ADRIAN	13.277.602	REPRESENTANTE LEGAL		13/08/2025		30	X	X	X
2	VILLAMIZAR LATORRE	ALVARO ADRIAN	13.277.602	DIRECTOR DE OBRA		13/08/2025		30	X	X	X
3	MANZANO BARBOSA	DUBAN ARMANDO	1.091677.525	ING, AMBIENTAL Y PGIO		13/08/2025		30	X	X	X
4	SANCHEZ CARRILLO	LAURA JULIANA	1.004.860.844	RESIDENTE DE OBRA		13/08/2025		30	X	X	X
5	CALDERON	ANA MILENA	88'263.769	INSPECTOR DE				30	X	X	X

5.2 Personal Operativo

El contratista utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo a los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo del contratista y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe:

Personal operativo del contrato de obra No: LP-SHAB-00817-2025

MES: SEPTIEMBRE DE 2025											
DATOS GENERALES									AFILIADO A		
	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	TELLEZ MORA	ALVARO	13.169.349	OFICIAL		13/08/2025		25	X	X	X
2	GARCIA DURAN	ALIRIO ANTONIO	88.149.907	OFICIAL		13/08/2025		25	X	X	X
3	RODRIGUEZ	JESUS DANIEL	1.122.337.789	OFICIAL		13/08/2025		25	X	X	X
4	ALVAREZ SANCHEZ	ELMER YESID	1.065.863.662	OFICIAL		13/08/2025		25	X	X	X
5	ZAMUTH MARTINEZ	ELVIS LUIS	72.337.334	OFICIAL		13/08/2025		25	X	X	X
6	CALDERON SERRANO	FAUSTO	5.519.610	OFICIAL		13/08/2025		25	X	X	X
7	JACOME QUINTERO	JOSE ALVARO	13.166.867	OFICIAL		13/08/2025		25	X	X	X
8	ARDILA CHOGO	JERONIMO	1.091.533.242	OFICIAL		13/08/2025		25	X	X	X
9	LAZARO CANAVETE	OSCAR MANUEL	1.091.535.136	OFICIAL		13/08/2025		25	X	X	X
10	LANNI PEREZ	RAFAEL ANTONIO	8.010.879	OFICIAL		13/08/2025		25	X	X	X
11	PARADA SANTIAGO	YURGEN ANTONIO	1.979.351	OFICIAL		13/08/2025		25	X	X	X

MES: OCTUBRE DE 2025											
DATOS GENERALES									AFILIADO A		
	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	TELLEZ MORA	ALVARO	13.169.349	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
2	GARCIA DURAN	ALIRIO ANTONIO	88.149.907	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
3	RODRIGUEZ	JESUS DANIEL	1.122.337.789	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
4	ALVAREZ SANCHEZ	ELMER YESID	1.065.863.662	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
5	ZAMUTH MARTINEZ	ELVIS LUIS	72.337.334	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
6	CALDERON SERRANO	FAUSTO	5.519.610	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
7	JACOME QUINTERO	JOSE ALVARO	13.166.867	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X

8	ARDILA CHOGO	JERONIMO	1.091.533.242	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
9	LAZARO CANAVETE	OSCAR MANUEL	1.091.535.136	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
10	LANNI PEREZ	RAFAEL ANTONIO	8.010.879	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
11	PARADA SANTIAGO	YURGEN ANTONIO	1.979.351	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X

MES: NOVIEMBRE DE 2025											
DATOS GENERALES									AFILIADO A		
	APELLIDOS	NOMBRES	CC	CARGO	SALARIO	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	DIAS LABORADOS	SALUD	PENSION	RIESGOS
1	TELLEZ MORA	ALVARO	13.169.349	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
2	GARCIA DURAN	ALIRIO ANTONIO	88.149.907	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
3	RODRIGUEZ	JESUS DANIEL	1.122.337.789	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
4	ALVAREZ SANCHEZ	ELMER YESID	1.065.863.662	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
5	ZAMUTH MARTINEZ	ELVIS LUIS	72.337.334	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
6	CALDERON SERRANO	FAUSTO	5.519.610	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
7	JACOME QUINTERO	JOSE ALVARO	13.166.867	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
8	ARDILA CHOGO	JERONIMO	1.091.533.242	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
9	LAZARO CANAVETE	OSCAR MANUEL	1.091.535.136	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
10	LANNI PEREZ	RAFAEL ANTONIO	8.010.879	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X
11	PARADA SANTIAGO	YURGEN ANTONIO	1.979.351	OFICIAL		13/08/2025		30	X	X	X

Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- Contrato de Obra No LP-SHAB-00817-2025 de 2025.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1		MES 2		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X		
El contratista ha entregado a la Interventoría copia de las afiliaciones del personal.	X		X		
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X		
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.					Aún no se ha retirado algún personal de la obra.
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		

5.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

5.3.1 Dotación del personal

La firma contratista UNION TEMPORAL VSR NORTE llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, por parte de su profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) lleva un control de los elementos entregados al personal en obra, a continuación, se relacionan los siguientes elementos entregados:

Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. LP-SHAB-00817-2025 de 2025.

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes.
GUANTES	X		X			Maestros, Oficiales, ayudantes.
BOTAS DE SEGURIDAD		X	X			
BOTAS DE CAUCHO	X					Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes.
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes.
OVEROL/CAMISA/PANTALON	X		X			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes.
TAPA BOCAS	X		X			Ingenieros, Maestros, Oficiales, ayudantes.
MASCARA		X				





Entrega de dotación del personal en obra.

Foto 1-2. Entrega de dotación del personal en obra.

La Interventoría verificó diariamente en campo la utilización de los elementos de protección por parte del personal en obra, haciendo los respectivos requerimientos a los trabajadores que en determinado momento no los estaban usando.

5.3.2 Señalización de la obra

En la ejecución de los trabajos, el contratista implementó la señalización requerida para el aislamiento de las zonas de trabajo.

Tabla 2. Señalización instalada en la obra por el contratista- Contrato de Obra No. LP-SHAB-00817-2025 de 2025.

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO			LOCALIZACION EN OBRA
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CINTA REFLECTIVA	X		X			
AVISOS PREVENTIVOS		X				
AVISOS INFORMATIVOS		X				
AVISOS REGLAMENTARIOS		X				
SEÑALES NOCTURNAS REFLECTANTES O LUMINOSAS		X				

ELEMENTOS DE SEÑALIZACION	INSTALADOS		ESTADO		LOCALIZACION EN OBRA
(conos luminosos, flashes, licuadoras, flechas, ojos de gato, etc.)					
COLOMBINAS		X			
BARRICADAS		X			
DELINEADORES		X			
CANECAS PLASTICAS O METALICAS	X	X			
MALLA SINTETICA		X			
CERRAMIENTO EN POLISOMBRA		X			

La Interventoría diariamente verificó que dichas señales se encontraran debidamente instaladas en todos los frentes de trabajo de la obra y en buen estado, haciendo las recomendaciones del caso al contratista para subsanar cualquier inconveniente frente a la falta de señalización o mal estado de la misma.

5.3.3 Accidentalidad en la obra

La Interventoría estuvo atenta al registro y atención de los accidentes laborales presentados en obra con el personal vinculado por el contratista. Para el periodo del presente informe no se presentaron accidentes laborales en la ejecución del contrato No. LP-SHAB-00817-2025.

5.3.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "*consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales.*"

5.4 PERMISOS Y LICENCIAS

5.4.1 Licencias y permisos ambientales

Dentro del proyecto se contemplaron solicitud de la licencia ambiental la cual fue gestionada por la entidad contratante y emitida por la Corporación Autónoma Regional de La Frontera Nororiental, CORPONOR. Según resolución No. 0055 del 07 de febrero de 2012.

Tabla 3. Relación de licencias o permisos ambientales para las obras objeto del contrato No. LP-SHAB-00817-2025.

TIPO DE LICENCIA O PERMISO	RESPONSABLE DEL TRAMITE	FECHA DEL TRAMITE	ACTO ADMINISTRATIVO	ENTIDAD QUE LA OTORGA	VIGENCIA
Explotación de material de construcción	*Departamento de Norte de Santander*	*07/02/2012*	*Resolución No.0055 de 2012*	*CORPONOR*	*Vida útil del proyecto.*

En el **ANEXO 6.** Se presenta copia de (el permiso Explotación de material de construcción) otorgado por la Autoridad Ambiental competente y además copia de las Resoluciones otorgadas por la autoridad ambiental competente para la explotación de materiales de construcción de las canteras.

5.4.2 Licencias y permisos para explotación de materiales de construcción

La Interventoría constató que el contratista realizara la adquisición de los materiales de construcción como arena, triturado en canteras autorizadas por la Agencia Nacional de Minería que cuentan con los respectivos permisos y licencias de CORPO, vigentes a la fecha de adquisición de los materiales.

Para la ejecución del contrato de obra No. LP-SHAB-00817-2025, el contratista adquirió los materiales de construcción en las siguientes canteras:

Tabla 4.Proveedores de materiales de cantera para la obra objeto del contrato No. LP-SHAB-00817-2025.

TIPO DE MATERIAL	CANTERA	LOCALIZACION DE LA CANTERA	PERMISOS Y LICENCIAS		RESOLUCION DE CORPONOR	VIGENTE	
			Minero	Ambiental		SI	NO
ARENA	RIO ALGODONAL	*Jurisdicción Municipio de Abrego*	X	X	*No. 0055 del 07/02/2012*	X	
TRITURADO	RIO ALGODONAL	*Jurisdicción Municipio de Abrego*	X	X	*No. 0055 del 07/02/2012*	X	

6 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre EL SECRETARIA DE HABITAT DE NORTE DE SANTANDER y la firma contratista UNION TEMPORAL VSR NORTE contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de cinco (5) meses y veinte (20) días.

NÚMERO 7943767 – 2025, PROCESO LP-SHAB-00817-2025						
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL NUEVA EN LOTES DISPERSOS EN LOS MUNICIPIOS DE CONVENCION, EL CARMEN, SAN CALIXTO Y TEORAMA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER						
CUADRO GENERAL DEL PRESUPUESTO						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL	%
1,00 OBRAS PRELIMINARES						
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	55,56	5.431,00	301.746,00	0,32%
1,02	EXCAVACIÓN A MANO	m3	4,21	56.385,00	237.381,00	0,25%
2,00 CIMENTACIÓN						
2,01	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25*0,25 M	ml	52,34	56.623,00	2.963.648,00	3,11%
2,02	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,15*0,25 M	ml	25,16	58.801,00	1.479.433,00	1,55%
2,03	ACERO DE REFUERZO 3/8" FY= 4200KG/CM2	kg	210,23	7.704,00	1.619.612,00	1,70%
2,04	ACERO DE REFUERZO 1/4" FY= 2400KG/CM2	kg	182,17	8.867,00	1.615.301,00	1,70%
2,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	m3	4,78	50.517,00	241.471,00	0,25%
2,06	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA e=0,10 M (incluye malla de refuerzo)	m2	71,82	66.047,00	4.743.496,00	4,98%
3,00 ESTRUCTURA EN CONCRETO						
3,01	CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNA SECCION 0.10*0,25m (COLUMNAS C1-C2-C3)	ml	57,57	56.143,00	3.232.153,00	3,40%
3,02	CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNETAS SECCION 0,1*0,1M (COLUMNETAS CL)	ml	11,50	49.814,00	572.861,00	0,60%
3,03	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA SOBRE MURO (0.12*0.25)	ml	55,72	50.327,00	2.804.220,00	2,95%
3,04	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA CINTA (0.12*0.25)	ml	33,76	50.327,00	1.699.040,00	1,78%
3,05	DINTEL DE 0.12*0.10 (CONCRETO 21 MPA+ ACERO DE REFUERZO)	ml	0,00	38.511,00	0,00	0,00%
3,06	CONCRETO DE 21 MPA PARA PLACA SOPORTE TANQUE ELEVADO (e=0,05M) incluye refuerzo	m2	1,40	142.171,00	199.039,00	0,21%
3,07	ACERO DE REFUERO 3/8" FY=4200 KG/CM2	kg	246,23	7.704,00	1.896.956,00	1,99%
3,08	ACERO DE REFUERZO 1/4" FY=	kg	136,39	8.867,00	1.209.370,00	1,27%

	2400KG/CM2					
4,00 MAMPOSTERIA						
4,01	MURO EN BLOQUE No.5 E=12 CM	m2	98,62	54.987,00	5.422.818,00	5,70%
5,00 CUBIERTA						
5,01	VIGUETA EN PERFIL METALICO RECTANGULAR 80*40*2,0mm ESTRUCTURAL HR50	ml	65,70	48.025,00	3.155.070,00	3,31%
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO No. 5	m2	73,92	55.522,00	4.104.186,00	4,31%
6,00 CARPINTERÍA METÁLICA						
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0,6*0,4M	und	1,00	175.833,00	175.833,00	0,18%
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALUMINIO (1,15*1,00). (INCLUYE VIDRIO 4MM)	und	4,00	338.863,00	1.355.452,00	1,42%
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALUMINIO (2,30*1,50M). (INCLUYE VIDIRIO 4MM)	und	1,00	460.375,00	460.375,00	0,48%
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA PARA EXTERIORES DE 0.90M*2.30M (INCLUYE MARCO METALICO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA)	und	2,00	648.720,00	1.297.440,00	1,36%
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA INTERIORES DE 0.90M*2,30M (INCLUYE MARCO METALICO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA DE POMO)	und	4,00	528.269,00	2.113.076,00	2,22%
7,00 INSTALACIONES HIDRAULICAS						
7,01	RED SUMINISTRO DE AGUA PVC 1" Y 1/2"	ml	16,00	42.000,00	672.000,00	0,71%
7,02	PUNTOS DE AGUA FRIA (incluye tuberías y accesorios según diseño)	und	6,00	66.380,00	398.280,00	0,42%
7,03	VALVULA DE PASO 1"	und	1,00	34.299,00	34.299,00	0,04%
7,04	VALVULA DE PASO 1/2"	und	1,00	22.799,00	22.799,00	0,02%
7,05	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LITROS (incluye tubería y accesorios según diseño)	und	1,00	1.039.519,00	1.039.519,00	1,09%
8,00 INSTALACIONES SANITARIAS						
8,01	PUNTO SANITARIO 2".	und	5,00	46.945,00	234.725,00	0,25%
8,02	PUNTO SANITARIO 4".	und	1,00	112.809,00	112.809,00	0,12%
8,03	CAJA DE INSPECCION 50*50	und	1,00	332.175,00	332.175,00	0,35%
8,04	RED SANITARIA PVCS 2"	ml	7,07	27.182,00	192.177,00	0,20%
8,05	RED SANITARIA PVCS 4"	ml	1,00	37.182,00	37.182,00	0,04%
9,00 INSTALACIONES ELECTRICAS						
9,01	SALIDA ILUMINACION-ROCETAS	und	10,00	136.424,00	1.364.240,00	1,43%
9,02	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE	und	7,00	124.950,00	874.650,00	0,92%

9,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE GFCI	und	2,00	196.277,00	392.554,00	0,41%
9,04	SISTEMA PUESTA A TIERRA	und	1,00	459.519,00	459.519,00	0,48%
9,05	SISTEMA DE MEDICION	und	1,00	429.519,00	429.519,00	0,45%
9,06	TABLERO PRINCIPAL	und	1,00	359.262,00	359.262,00	0,38%
9,07	ACOMETIDA	ml	12,00	56.892,00	682.704,00	0,72%
10,00 ACABADOS						
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO	und	1,00	320.156,00	320.156,00	0,34%
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMAOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	und	1,00	225.925,00	225.925,00	0,24%
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO	und	1,00	419.420,00	419.420,00	0,44%
10,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE 40*60 (incluye llave)	und	1,00	244.130,00	244.130,00	0,26%
10,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (REGADERA CORRIENTE)	und	1,00	97.889,00	97.889,00	0,10%
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA BAÑO	m2	3,14	62.443,00	196.071,00	0,21%
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PARED DE DUCHA+ SALPICADERA LAVAMANOS	m2	11,30	72.382,00	817.917,00	0,86%
10,08	MESON PARA COCINA	m2	0,87	104.655,00	91.050,00	0,10%
10,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA SALPICADERO Y MESON DE LAVAPLATOS0	m2	5,83	72.382,00	421.987,00	0,44%
10,1	PAÑETE SOBRE MUROS	m2	13,06	30.562,00	399.140,00	0,42%
10,11	ENCHAPE PISO COCINA EN TABLETA DE GRES	m2	8,75	55.061,00	481.784,00	0,51%
10,12	PINTURA TERMOAISLANTE PARA CUBIERTA	m2	73,92	15.765,00	1.165.349,00	1,22%
11,00 SISTEMA POSTRATAMIENTO						
11,01	EXCAVACIÓN A MANO	m3	2,38	56.385,00	134.196,00	0,14%
11,02	SISTEMA SEPTICO PREFABRICADO Y CAMPO DE INFILTRACION	und	1,00	2.843.208,00	2.843.208,00	2,99%
				COSTO DIRECTO =	**58.396.612,00**	
				COSTOS INDIRECTOS=	**20.438.814,00**	
				ADMINISTRACION (29%) =	16.935.017,00	0,44%
				IMPREVISTOS (1%) =	583.966,00	0,02%
				UTILIDADES (5%) =	2.919.831,00	0,08%
				COSTO TOTAL DE UNA VIVIENDA =	**78.835.426,00**	
				COSTO DIRECYO DEL PROYECTO (40 VIVIENDAS) =	$	

	2.335.864.480,00	
COSTO TRANSPORTE (40 VIVIENDAS) INCLUYE: CAMIÓN 600, 300 Y TRANSPORTE A MULA=	560.000.000,00	14,71%
COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO (40 VIVIENDAS) =	817.552.560,00	21,47%
TOTAL COSTOS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO (40 VIVIENDAS)	3.713.417.040,00	
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 14.073.960,00	0,37%
CERTIFICACION RETIE-RETILAP	$ 80.000.000,00	2,10%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$3.807.491.000**	100,000%

6.1 CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA

Para el periodo de corte acta parcial de obra, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato:

Cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. LP-SHAB-00817-2025 comprendidas en el periodo del 13/08/2025 y 13/12/2025

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						RECIBO PRESENTE ACTA		
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	VIVIENDAS ENTREGADAS ACTA 1	CANT.	VR/PARC.	%
1.	OBRAS PRELIMINARES							
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	2222,4	$ 12.069.854,00		1.833,48	$ 9.957.630,00	83%
1,02	EXCAVACION A MANO	m3	168,4	$ 9.495.234,00		138,93	$ 7.833.568,00	83%
2	CIMENTACION							
2,01	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25*0,25 M	ml	2093,6	$ 118.545.913,00		1.727,22	$ 97.800.378,00	83%
2,02	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,15*0,25 M	ml	1006,4	$ 59.177.326,00		830,28	$ 48.821.294,00	83%
2,03	ACERO DE REFUERZO 3/8" FY= 4200KG/CM2	kg	8409,2	$ 64.784.477,00		6.937,59	$ 53.447.193,00	83%
2,04	ACERO DE REFUERZO 1/4" FY= 2400KG/CM2	kg	7286,8	$ 64.612.056,00		6.011,61	$ 53.304.946,00	83%
2,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	m3	191,2	$ 9.658.850,00	33,00	157,74	$ 7.968.552,00	83%
2,06	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA e=0,10 M (incluye malla de refuerzo)	m2	2872,8	$ 189.739.822,00		2.370,06	$ 156.535.353,00	83%
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO							
3,01	CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNA SECCION 0.10*0,25m (COLUMNAS C1-C2-C3)	ml	2302,8	$ 129.286.100,00		1.899,81	$ 106.661.033,00	83%
3,02	CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNETAS SECCION 0,1*0,1M (COLUMNETAS CL)	ml	460	$ 22.914.440,00		379,50	$ 18.904.413,00	83%
3,03	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA SOBRE MURO (0.12*0.25)	ml	2228,8	$ 112.168.818,00		1.838,76	$ 92.539.275,00	83%
3,04	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA CINTA (0.12*0.25)	ml	1350,4	$ 67.961.581,00		1.114,08	$ 56.068.304,00	83%

3,05	DINTEL DE 0.12*0.10 (CONCRETO 21 MPA+ ACERO DE REFUERZO)	ml	0	$ -		0,00	$ -	
3,06	CONCRETO DE 21 MPA PARA PLACA SOPORTE TANQUE ELEVADO (e=0,05M) incluye refuerzo	m2	56	$ 7.961.576,00		46,20	$ 6.568.300,00	83%
3,07	ACERO DE REFUERO 3/8" FY=4200 KG/CM2	kg	9849,2	$ 75.878.237,00		8.125,59	$ 62.599.545,00	83%
3,08	ACERO DE REFUERZO 1/4" FY= 2400KG/CM2	kg	5455,6	$ 48.374.805,00		4.500,87	$ 39.909.214,00	83%
4	**MAMPORTERIA**							
4,01	MURO EN BLOQUE No.5 E=12 CM	m2	3944,8	$ 216.912.718,00		3.254,46	$ 178.952.992,00	83%
5	**CUBIERTA**							
5,01	VIGUETA EN PERFIL METALICO RECTANGULAR 80*40*2,0mm ESTRUCTURAL HR50	ml	2627,86	$ 126.202.784,00		2.167,98	$ 104.117.296,00	83%
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO No. 5	m2	2956,8	$ 164.167.450,00		2.439,36	$ 135.438.146,00	83%
6	**CARPINTERIA METALICA**							
6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0,6*0,4M	und	40	$ 7.033.320,00		33,00	$ 5.802.489,00	83%
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALUMINIO (1,15*1,00). (INCLUYE VIDRIO 4MM)	und	160	$ 54.218.080,00		132,00	$ 44.729.916,00	83%
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALUMINIO (2,30*1,50M). (INCLUYE VIDIRIO 4MM)	und	40	$ 18.415.000,00		33,00	$ 15.192.375,00	83%
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA PARA EXTERIORES DE 0.90M*2.30M (INCLUYE MARCO METALICO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA)	und	80	$ 51.897.600,00		66,00	$ 42.815.520,00	83%
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA INTERIORES DE 0.90M*2,30M (INCLUYE MARCO METALICO, VENTILACION	und	160	$ 84.523.040,00		132,00	$ 69.731.508,00	83%

Avenida Demetrio Mendoza-Centro Comercial Bolívar Bloque A Oficina A10
Telf.: 5956455 Cel: 3208080736 – 3203435946-
Email: construccioneseinterventorias@hotmail.com – zulyva891@gmail.com

SCAN ME

	SUPERIOR Y CERRADURA DE POMO)							
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**							
7,01	RED SUMINISTRO DE AGUA PVC 1" Y 1/2"	ml	640	$ 26.880.000,00		528,00	$ 22.176.000,00	83%
7,02	PUNTOS DE AGUA FRIA (incluye tuberías y accesorios según diseño)	und	240	$ 15.931.200,00		198,00	$ 13.143.240,00	83%
7,03	VALVULA DE PASO 1"	und	40	$ 1.371.960,00		33,00	$ 1.131.867,00	83%
7,04	VALVULA DE PASO 1/2"	und	40	$ 911.960,00		33,00	$ 752.367,00	83%
7,05	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LITROS (incluye tubería y accesorios según diseño)	und	40	$ 41.580.760,00		33,00	$ 34.304.127,00	83%
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**							
8,01	PUNTO SANITARIO 2".	und	200	$ 9.389.000,00		165,00	$ 7.745.925,00	83%
8,02	PUNTO SANITARIO 4".	und	40	$ 4.512.360,00		33,00	$ 3.722.697,00	83%
8,03	CAJA DE INSPECCION 50*50	und	40	$ 13.287.000,00		33,00	$ 10.961.775,00	83%
8,04	RED SANITARIA PVCS 2"	ml	282,8	$ 7.687.070,00		233,31	$ 6.341.832,00	83%
8,05	RED SANITARIA PVCS 4"	ml	40	$ 1.487.280,00		33,00	$ 1.227.006,00	83%
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
9,01	SALIDA ILUMINACION-ROCETAS	und	400	$ 54.569.600,00		330,00	$ 45.019.920,00	83%
9,02	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE	und	280	$ 34.986.000,00		231,00	$ 28.863.450,00	83%
9,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE GFCI	und	80	$ 15.702.160,00		66,00	$ 12.954.282,00	83%
9,04	SISTEMA PUESTA A TIERRA	und	40	$ 18.380.760,00		33,00	$ 15.164.127,00	83%
9,05	SISTEMA DE MEDICION	und	40	$ 17.180.760,00		33,00	$ 14.174.127,00	83%
9,06	TABLERO PRINCIPAL	und	40	$ 14.370.480,00		33,00	$ 11.855.646,00	83%
9,07	ACOMETIDA	ml	480	$ 27.308.160,00		396,00	$ 22.529.232,00	83%
10	**ACABADOS**							

10,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO	und	40	$ 12.806.240,00		33,00	$ 10.565.148,00	83%
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	und	40	$ 9.037.000,00		33,00	$ 7.455.525,00	83%
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO	und	40	$ 16.776.800,00		33,00	$ 13.840.860,00	83%
10,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE 40*60 (incluye llave)	und	40	$ 9.765.200,00		33,00	$ 8.056.290,00	83%
10,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (REGADERA CORRIENTE)	und	40	$ 3.915.560,00		33,00	$ 3.230.337,00	83%
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA BAÑO	m2	125,6	$ 7.842.841,00		103,62	$ 6.470.344,00	83%
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PARED DE DUCHA+ SALPICADERA LAVAMANOS	m2	452	$ 32.716.664,00		372,90	$ 26.991.248,00	83%
10,08	MESON PARA COCINA	m2	34,8	$ 3.641.994,00		28,71	$ 3.004.645,00	83%
10,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA SALPICADERO Y MESON DE LAVAPLATOS	m2	233,2	$ 16.879.482,00		192,39	$ 13.925.573,00	83%
10,1	PAÑETE SOBRE MUROS	m2	522,4	$ 15.965.589,00		430,98	$ 13.171.611,00	83%
10,11	ENCHAPE PISO COCINA EN TABLETA DE GRES	m2	350	$ 19.271.350,00		288,75	$ 15.898.864,00	83%
10,12	PINTURA TERMOAISLANTE PARA CUBIERTA	m2	2956,8	$ 46.613.952,00		2.439,36	$ 38.456.510,00	83%
11	**SISTEMA POSTRATAMIENTO**							
11,01	EXCAVACIÓN A MANO	m3	95,2	$ 5.367.852,00		78,54	$ 4.428.478,00	83%
11,02	SISTEMA SEPTICO PREFABRICADO Y CAMPO DE INFILTRACION	und	40	$ 113.728.320,00		33,00	$ 93.825.864,00	83%
COSTO DIRECTO				**$ 2.335.864.480,00**			**$ 1.927.088.196,00**	**83%**
ADMINISTRACIÓN		**29%**	**VALOR POR 40 VIVIENDAS**	$ 677.400.680,00	**VALOR POR 33 VIVIENDAS ACTA DE COBRO 1.**		$ 558.855.561,00	83%
IMPREVISTOS		**1%**		$ 23.358.640,00			$ 19.270.878,00	83%
UTILIDAD		**5%**		$ 116.793.240,00			$ 96.354.423,00	83%

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification

Avenida Demetrio Mendoza-Centro Comercial Bolívar Bloque A Oficina A10
Telf.: 5956455 Cel: 3208080736 – 3203435946-
Email: construccioneseinterventorias@hotmail.com – zulyva891@gmail.com

SCAN ME

COSTO TRANSPORTE (40 VIVIENDAS) INCLUYE: CAMIÓN 600, 300 Y TRANSPORTE A MULA		$ 560.000.000,00		$ 462.000.000,00	83%
COSTO DIRECTO OBRA+ AIU		**$ 3.713.417.040,00**		**$ 3.063.569.058,00**	**83%**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		$ 14.073.960,00		$ 11.611.017,00	83%
CERTIFICACION RETIE-RETILAP		$ 80.000.000,00		$ 66.000.000,00	83%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		$ -		$ -	
COSTO TOTAL DE OBRA		**$ 3.807.491.000,00**		**$ 3.141.180.075,00**	**83%**

6.2 *CANTIDADES DE OBRA ACUMULADAS*

Así mismo se lleva a la fecha del presente informe un acumulado para cada uno de los ítems del contrato.

CONDICIONES DEL CONTRATO INICIAL O MODIFICADO						EJECUTADO ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD TOTAL	VALOR TOTAL	VIVIENDAS TERMINADAS ACUMULADAS	CANT.	VALOR	%
1.	**OBRAS PRELIMINARES**							
1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	2222,4	$ 12.069.854,00		1.833,48	$ 9.957.630,00	83%
1,02	EXCAVACION A MANO	m3	168,4	$ 9.495.234,00		138,93	$ 7.833.568,00	83%
2	**CIMENTACION**							
2,01	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25*0,25 M	ml	2093,6	$ 118.545.913,00	**33,00**	1.727,2	$ 97.800.378,00	83%
2,02	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,15*0,25 M	ml	1006,4	$ 59.177.326,00		830,28	$ 48.821.294,00	83%
2,03	ACERO DE REFUERZO 3/8" FY= 4200KG/CM2	kg	8409,2	$ 64.784.477,00		6.937,6	$ 53.447.193,00	83%
2,04	ACERO DE REFUERZO 1/4" FY= 2400KG/CM2	kg	7286,8	$ 64.612.056,00		6.011,61	$ 53.304.946,00	83%

2,05	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	m3	191,2	$ 9.658.850,00		157,7	$ 7.968.552,00	83%
2,06	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA e=0,10 M (incluye malla de refuerzo)	m2	2872,8	$ 189.739.822,00		2.370,06	$ 156.535.353,00	83%
3	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**							
3,01	CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNA SECCION 0.10*0,25m (COLUMNAS C1-C2-C3)	ml	2302,8	$ 129.286.100,00		1.899,81	$ 106.661.033,00	83%
3,02	CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNETAS SECCION 0,1*0,1M (COLUMNETAS CL)	ml	460	$ 22.914.440,00		379,5	$ 18.904.413,00	83%
3,03	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA SOBRE MURO (0.12*0.25)	ml	2228,8	$ 112.168.818,00		1.838,76	$ 92.539.275,00	83%
3,04	CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA CINTA (0.12*0.25)	ml	1350,4	$ 67.961.581,00		1.114,08	$ 56.068.304,00	83%
3,05	DINTEL DE 0.12*0.10 (CONCRETO 21 MPA+ ACERO DE REFUERZO)	ml	0	$ -		0,0	$ -	
3,06	CONCRETO DE 21 MPA PARA PLACA SOPORTE TANQUE ELEVADO (e=0,05M) incluye refuerzo	m2	56	$ 7.961.576,00		46,2	$ 6.568.300,00	83%
3,07	ACERO DE REFUERO 3/8" FY=4200 KG/CM2	kg	9849,2	$ 75.878.237,00		8.125,6	$ 62.599.545,00	83%
3,08	ACERO DE REFUERZO 1/4" FY= 2400KG/CM2	kg	5455,6	$ 48.374.805,00		4.500,87	$ 39.909.214,00	83%
4	**MAMPORTERIA**							
4,01	MURO EN BLOQUE No.5 E=12 CM	m2	3944,8	$ 216.912.718,00		3.254,5	$ 178.952.992,00	83%
5	**CUBIERTA**							
5,01	VIGUETA EN PERFIL METALICO RECTANGULAR 80*40*2,0mm ESTRUCTURAL HR50	ml	2627,86	$ 126.202.784,00		2.167,98	$ 104.117.296,00	83%
5,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO No. 5	m2	2956,8	$ 164.167.450,00		2.439,36	$ 135.438.146,00	83%
6	**CARPINTERIA METALICA**							

6,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0,6*0,4M	und	40	$ 7.033.320,00		33,0	$ 5.802.489,00	83%
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALUMINIO (1,15*1,00). (INCLUYE VIDRIO 4MM)	und	160	$ 54.218.080,00		132,0	$ 44.729.916,00	83%
6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALUMINIO (2,30*1,50M). (INCLUYE VIDIRIO 4MM)	und	40	$ 18.415.000,00		33,0	$ 15.192.375,00	83%
6,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA PARA EXTERIORES DE 0.90M*2.30M (INCLUYE MARCO METALICO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA)	und	80	$ 51.897.600,00		66,0	$ 42.815.520,00	83%
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA INTERIORES DE 0.90M*2,30M (INCLUYE MARCO METALICO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA DE POMO)	und	160	$ 84.523.040,00		132,0	$ 69.731.508,00	83%
7	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**							
7,01	RED SUMINISTRO DE AGUA PVC 1" Y 1/2"	ml	640	$ 26.880.000,00		528,0	$ 22.176.000,00	83%
7,02	PUNTOS DE AGUA FRIA (incluye tuberías y accesorios según diseño)	und	240	$ 15.931.200,00		198,0	$ 13.143.240,00	83%
7,03	VALVULA DE PASO 1"	und	40	$ 1.371.960,00		33,0	$ 1.131.867,00	83%
7,04	VALVULA DE PASO 1/2"	und	40	$ 911.960,00		33,0	$ 752.367,00	83%
7,05	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LITROS (incluye tubería y accesorios según diseño)	und	40	$ 41.580.760,00		33,0	$ 34.304.127,00	83%
8	**INSTALACIONES SANITARIAS**							
8,01	PUNTO SANITARIO 2".	und	200	$ 9.389.000,00		165,0	$ 7.745.925,00	83%
8,02	PUNTO SANITARIO 4".	und	40	$ 4.512.360,00		33,0	$ 3.722.697,00	83%
8,03	CAJA DE INSPECCION 50*50	und	40	$ 13.287.000,00		33,0	$ 10.961.775,00	83%
8,04	RED SANITARIA PVCS 2"	ml	282,8	$ 7.687.070,00		233,31	$ 6.341.832,00	83%
8,05	RED SANITARIA PVCS 4"	ml	40	$ 1.487.280,00		33,0	$ 1.227.006,00	83%

9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
9,01	SALIDA ILUMINACION-ROCETAS	und	400	$ 54.569.600,00		330,0	$ 45.019.920,00	83%
9,02	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE	und	280	$ 34.986.000,00		231,0	$ 28.863.450,00	83%
9,03	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE GFCI	und	80	$ 15.702.160,00		66,0	$ 12.954.282,00	83%
9,04	SISTEMA PUESTA A TIERRA	und	40	$ 18.380.760,00		33,0	$ 15.164.127,00	83%
9,05	SISTEMA DE MEDICION	und	40	$ 17.180.760,00		33,0	$ 14.174.127,00	83%
9,06	TABLERO PRINCIPAL	und	40	$ 14.370.480,00		33,0	$ 11.855.646,00	83%
9,07	ACOMETIDA	ml	480	$ 27.308.160,00		396,0	$ 22.529.232,00	83%
10	**ACABADOS**							
10,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO	und	40	$ 12.806.240,00		33,0	$ 10.565.148,00	83%
10,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)	und	40	$ 9.037.000,00		33,0	$ 7.455.525,00	83%
10,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO	und	40	$ 16.776.800,00		33,0	$ 13.840.860,00	83%
10,04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE 40*60 (incluye llave)	und	40	$ 9.765.200,00		33,0	$ 8.056.290,00	83%
10,05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (REGADERA CORRIENTE)	und	40	$ 3.915.560,00		33,0	$ 3.230.337,00	83%
10,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA BAÑO	m2	125,6	$ 7.842.841,00		103,62	$ 6.470.344,00	83%
10,07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PARED DE DUCHA+ SALPICADERA LAVAMANOS	m2	452	$ 32.716.664,00		372,90	$ 26.991.248,00	83%
10,08	MESON PARA COCINA	m2	34,8	$ 3.641.994,00		28,71	$ 3.004.645,00	83%
10,09	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA SALPICADERO Y MESON DE LAVAPLATOS	m2	233,2	$ 16.879.482,00		192,39	$ 13.925.573,00	83%
10,1	PAÑETE SOBRE MUROS	m2	522,4	$ 15.965.589,00		430,98	$ 13.171.611,00	83%
10,11	ENCHAPE PISO COCINA EN TABLETA DE GRES	m2	350	$ 19.271.350,00		288,8	$ 15.898.864,00	83%
10,12	PINTURA TERMOAISLANTE PARA CUBIERTA	m2	2956,8	$ 46.613.952,00		2.439,36	$ 38.456.510,00	83%

11	**SISTEMA POSTRATAMIENTO**							
11,01	EXCAVACIÓN A MANO	m3	95,2	$ 5.367.852,00		78,54	$ 4.428.478,00	83%
11,02	SISTEMA SEPTICO PREFABRICADO Y CAMPO DE INFILTRACION	und	40	$ 113.728.320,00		33,0	$ 93.825.864,00	83%
COSTO DIRECTO				**2.335.864.480,00**			**$1.927.088.196,00**	**83%**
ADMINISTRACIÓN		29%		$ 677.400.680,00			$ 558.855.561,00	83%
IMPREVISTOS		1%		$ 23.358.640,00			$ 19.270.878,00	83%
UTILIDAD		5%		$ 116.793.240,00			$ 96.354.423,00	83%
COSTO TRANSPORTE (40 VIVIENDAS) INCLUYE: CAMIÓN 600, 300 Y TRANSPORTE A MULA			**VALOR POR 40 VIVIENDAS**	$ 560.000.000,00	**VALOR ACUMULADO**		$ 462.000.000,00	83%
COSTO DIRECTO OBRA+ AIU				**$3.713.417.040,00**			**$3.063.569.058,00**	**83%**
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL				$ 14.073.960,00			$ 11.611.017,00	83%
CERTIFICACION RETIE-RETILAP				$ 80.000.000,00			$ 66.000.000,00	83%
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD				$ -			$ -	
COSTO TOTAL DE OBRA				**$3.807.491.000,00**			**$3.141.180.075,00**	**83%**

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification

Avenida Demetrio Mendoza-Centro Comercial Bolívar Bloque A Oficina A10
Telf.: 5956455 Cel: 3208080736 – 3203435946-
Email: construccioneseinterventorias@hotmail.com – zulyva891@gmail.com

SCAN ME

6.3 Avance Físico de las obras

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo del 13/08/2025 y el 13/12/2025, se presenta un avance de ejecución de 83% para un acumulado de 83%, haciendo falta por ejecutar un 17% para completar la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.



6.4 Avance del plazo contractual

Con respecto al plazo contractual, de los cinco (5) meses y veinte (20) establecidos en la minuta del contrato, han transcurrido 122 días desde la fecha de inicio hasta la fecha de corte del presente informe, lo cual equivale a un 70.85% % del total del plazo contractual, restando 29.15% meses para finalizar las actividades del contrato y proceder con la liquidación del contrato de obra No. LP-SHAB-00817-2025

Durante el tiempo que ha transcurrido del contrato de obra No. LP-SHAB-00817-2025 no se han realizados suspensiones.
En cuanto al estado del tiempo para el periodo del presente informe se han presentado lluvias fuertes lo cual afectado el rendimiento de las actividades que se tenían programadas por el contratista.

PLAZO CONTRACTUAL	*CINCO (05) MESES Y VEINTE (20) DIAS*
TIEMPO SUSPENDIDO	*0*
PLAZO ADICIONADO	*0*
PLAZO EJECUTADO	*CUATRO (04) MESES*

PLAZO POR EJECUTAR	*UN (01) MESES Y VEINTE (20) DIAS*
% PLAZO EJECUTADO	*70.85%*


7. ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS

Para el periodo del presente informe comprendido entre el 13 de agosto de 2025 al 13 de diciembre del 2025, la firma contratista UNIÓN TEMPORAL VSR NORTE bajo la supervisión y control de la Interventoría, ha ejecutado las siguientes actividades de los ítems del contrato de obra No. LP-SHAB-00817-2025

1.01 LOCALIZACION Y REPLANTEO:

La localización y replanteo comprenden todas las operaciones necesarias para establecer en el terreno la posición exacta, cotas y dimensiones del proyecto, de acuerdo con los planos, niveles y coordenadas aprobados.
Incluye el trazado de ejes, referencias, niveles, alineamientos, y la marcación física en el terreno de los elementos constructivos que conforman la obra.

En esta actividad se realizaron 1.833,48 m2 de 2.222,40 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por m2 como esta en el presupuesto

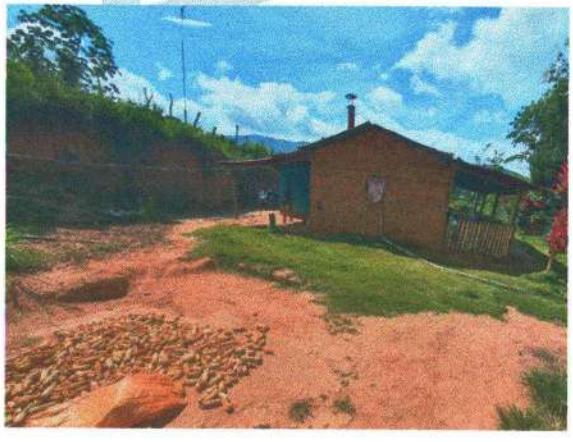

1.02 EXCAVACION A MANO

Este ítem comprende la ejecución de excavaciones manuales en terreno natural, destinadas a la formación de zanjas, cimentaciones, u otros elementos, según los planos y especificaciones del proyecto.

En esta actividad se realizaron 138,93 m3 de 168,40 m3 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por m3 como esta en el presupuesto



2.01 CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,25*0,25 M

Este ítem comprende la preparación, transporte, colocación, compactación, curado y control de calidad del concreto estructural con una resistencia característica a la compresión de 21 MPa (210 kg/cm²), destinado a la ejecución de vigas de cimentación con sección de 0.25 m x 0.25 m, según los planos estructurales y las especificaciones del proyecto.

En esta actividad se realizaron 1.727,22 ml de 2093,60 ml contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



2.02 CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA DE CIMENTACIÓN DE 0,15*0,25 M

Este ítem comprende la preparación, transporte, colocación, compactación, curado y control de calidad del concreto estructural con una resistencia característica a la compresión de 21 MPa (210 kg/cm²), destinado a la ejecución de vigas de cimentación con sección de 0.15 m x 0.25 m, según los planos estructurales y las especificaciones del proyecto.
En esta actividad se realizaron 830,28 kg de 1.006,40 kg contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



2.03 ACERO DE REFUERZO 3/8" FY= 4200KG/CM2

Este ítem comprende el suministro, corte, doblado, colocación, amarre y aseguramiento del acero de refuerzo corrugado de 3/8" (Ø 9.5 mm) de diámetro nominal, con límite de fluencia f_y = 4,200 kg/cm² (≈ 420 MPa), destinado a elementos estructurales de concreto armado (vigas de cimentación, columnas, losas, zapatas, etc.), según los planos estructurales y las especificaciones técnicas del proyecto.

En esta actividad se realizaron 6.937,6 kg de 8.409,20 kg contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



2.04 ACERO DE REFUERZO 1/4" FY= 2400KG/CM2

Este ítem comprende el suministro, corte, doblado, colocación y amarre del acero liso o corrugado de ¼" (Ø 6.35 mm) de diámetro nominal, con límite de fluencia f_y = 2,400 kg/cm² (≈ 235 MPa), destinado al refuerzo secundario o complementario de elementos estructurales de concreto armado (mallas, vigas, losas, soleras, zapatas corridas, bordes, etc.), según planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto.

En esta actividad se 6.011,61 kg de 7.286,80 kg contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



2.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION

El presente ítem comprende todas las labores necesarias para la ejecución del relleno con material seleccionado proveniente de la misma excavación, incluyendo selección, transporte, colocación, extendido, humedecimiento, compactación y control de calidad del material hasta alcanzar las densidades requeridas según las especificaciones del proyecto y las normas vigentes.

En esta actividad se realizaron 157,7 m3 de 191.20 m3 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



2.06 PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 21 MPA e=0,10 M (incluye malla de refuerzo)

El presente ítem comprende la construcción de una placa de contrapiso de concreto simple con una resistencia característica a la compresión de f'c = 21 MPa, y un espesor uniforme de 0.10 m, incluyendo el suministro, colocación y nivelación del concreto, colocación de la malla de refuerzo electrosoldada, vibrado, curado y acabado superficial, conforme a los planos y especificaciones del proyecto.

En esta actividad se realizaron 2.370,06 m2 de 2.872,80 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.

3.01 CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNA SECCION 0.10*0,25m (COLUMNAS C1-C2-C3)

Este ítem comprende la construcción de columnas de concreto armado con una sección rectangular de 0.10 × 0.25 m, elaboradas con concreto de resistencia f'c = 21 MPa (210 kg/cm²) a los 28 días, incluyendo la colocación de acero de refuerzo, encofrado, vaciado, vibrado, curado y desencofrado, conforme a los planos estructurales y las especificaciones del proyecto.

En esta actividad se realizaron 1.899,81 ml de 2.302,80 ml contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.






3.02 CONCRETO DE 21 MPA PARA COLUMNETAS SECCION 0,1*0,1M (COLUMNETAS CL)

El presente ítem comprende la construcción de columnetas de concreto armado de sección cuadrada 0.10 × 0.10 m, elaboradas con concreto de resistencia f'c = 21 MPa (210 kg/cm²) a los 28 días, incluyendo la colocación del acero de refuerzo, encofrado, vaciado, vibrado, curado y desencofrado, de acuerdo con los planos estructurales y las normas técnicas vigentes.


En esta actividad se realizaron 379,5 ml de 460,00 ml contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.

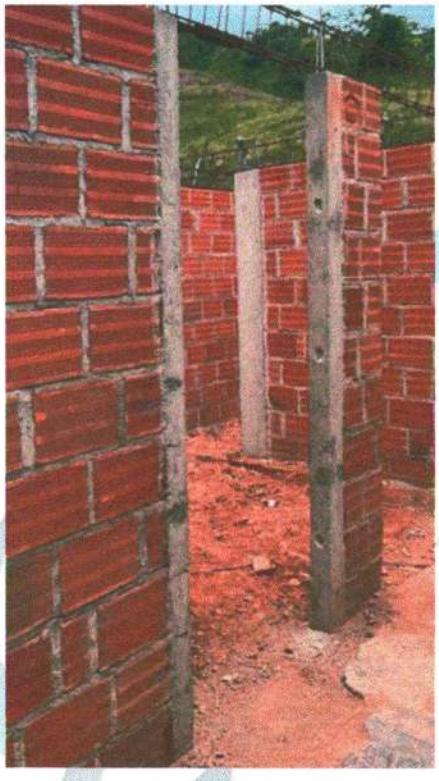

3.03 CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA SOBRE MURO (0.12*0.25)

En el presente ítem comprende la construcción de vigas de concreto armado apoyadas sobre muros portantes o de albañilería, de sección 0.12 × 0.25 m, con una resistencia característica del concreto de f'c = 21 MPa (210 kg/cm²) a los 28 días, incluyendo el suministro, colocación y compactación del concreto, así como la instalación del acero de refuerzo, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, de acuerdo con los planos estructurales y las normas técnicas vigentes.

En esta actividad se realizaron 1.838,76 ml de 2.228,80 ml contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.

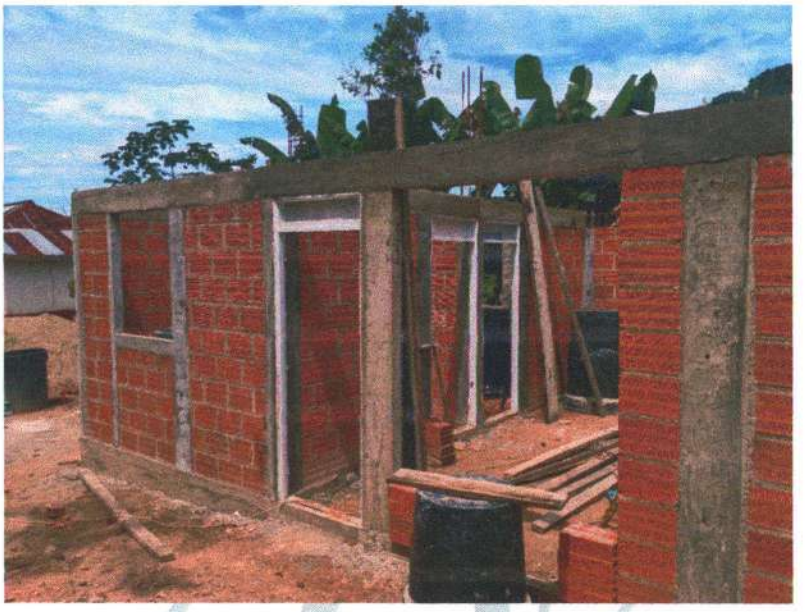

3.04 CONCRETO DE 21 MPA PARA VIGA CINTA (0.12*0.25)

Este ítem comprende la construcción de vigas cinta de concreto armado de sección 0.12 × 0.25 m, con una resistencia característica a la compresión de f'c = 21 MPa (210 kg/cm²) a los 28 días, incluyendo el suministro, colocación y compactación del concreto, así como la instalación del acero de refuerzo, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, de acuerdo con los planos estructurales, las especificaciones del proyecto y las normas técnicas vigentes.

Las vigas cinta tienen la función de vincular y distribuir las cargas de los muros sobre el sobrecimiento o cimiento, proporcionando continuidad y estabilidad a la estructura.

En esta actividad se realizaron 1.114,08 ml de 1.350,40 ml contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



3.06 CONCRETO DE 21 MPA PARA PLACA SOPORTE TANQUE ELEVADO (e=0,05M) incluye refuerzo

El presente ítem comprende la construcción de una placa de soporte para tanque elevado, de espesor 0.05 m, elaborada con concreto armado de resistencia característica f'c = 21 MPa (210 kg/cm²) a los 28 días, incluyendo el suministro, colocación y compactación del concreto, así como la colocación del acero de refuerzo, vibrado, curado, nivelado y acabado superficial, conforme a los planos estructurales y las especificaciones del proyecto.


La placa soporte tiene como función principal distribuir las cargas del tanque elevado hacia su estructura portante y garantizar una base rígida y estable.

En esta actividad se realizaron 46,2 m2 de 56,00 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



3.07 ACERO DE REFUERO 3/8" FY=4200 KG/CM2

Este ítem comprende el suministro, corte, doblado, colocación, amarre y aseguramiento del acero de refuerzo corrugado de 3/8" (Ø 9.5 mm) de diámetro nominal, con límite de fluencia f_y = 4,200 kg/cm² (≈ 420 MPa), destinado a elementos estructurales de concreto armado (vigas de cimentación, columnas, losas, zapatas, etc.), según los planos estructurales y las especificaciones técnicas del proyecto.
En esta actividad se realizaron 8.125,6 kg de 9.849,20 kg contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.

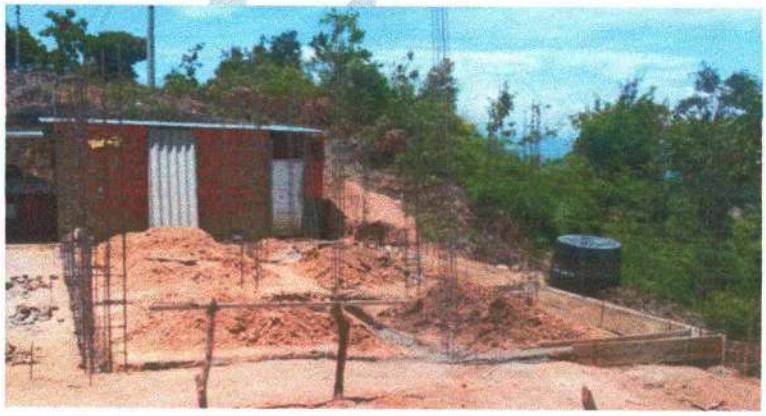

4.08 ACERO DE REFUERZO 1/4" FY= 2400KG/CM2

Este ítem comprende el suministro, corte, doblado, colocación y amarre del acero liso o corrugado de ¼" (Ø 6.35 mm) de diámetro nominal, con límite de fluencia f_y = 2,400 kg/cm² (≈ 235 MPa), destinado al refuerzo secundario o complementario de elementos estructurales de concreto armado (mallas, vigas, losas, soleras, zapatas corridas, bordes, etc.), según planos estructurales y especificaciones técnicas del proyecto.

En esta actividad se realizaron 4.500,87 kg de 5.455,60 kg contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



4.01 MURO EN BLOQUE No.5 E=12 CM

El presente ítem comprende la construcción de muros de albañilería con bloques de concreto tipo N°5 de 12 cm de espesor, asentados con mortero de cemento y arena, incluyendo el suministro y colocación de los bloques, preparación del mortero, nivelación, alineamiento, plomeo, relleno de juntas, limpieza y curado, de acuerdo con los planos, especificaciones del proyecto y las normas técnicas vigentes.
Los muros podrán funcionar como tabiques, cerramientos o elementos portantes, según el diseño estructural.

En esta actividad se realizaron 3.254,5 m2 de 3.944,80 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



5.01 VIGUETA EN PERFIL METALICO RECTANGULAR 80*40*2,0mm ESTRUCTURAL HR50

El presente ítem comprende la fabricación, suministro y montaje de viguetas estructurales metálicas conformadas por perfiles rectangulares de acero estructural HR50 de sección 80×40×2.0 mm, de acuerdo con los planos estructurales, especificaciones técnicas y normas vigentes. Las viguetas metálicas se emplearán como elementos portantes secundarios dentro del sistema estructural de la cubierta y estarán diseñadas para resistir las cargas muertas y vivas establecidas en el proyecto.

En esta actividad se realizaron 2.167,98 ml de 2.627,86 ml contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



5.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN FIBROCEMENTO No. 5

El presente ítem comprende el suministro, transporte e instalación de tejas onduladas de fibrocemento tipo N°5, incluyendo el suministro de accesorios de fijación, cortes, perforaciones, sellos y remates necesarios para la correcta instalación, conforme a los planos arquitectónicos y estructurales, las especificaciones del fabricante y las normas técnicas vigentes. Las tejas en fibrocemento N°5 serán instaladas sobre una estructura soporte metálica, conformada por correas y viguetas, debidamente alineadas y niveladas.

En esta actividad se realizaron 2.439,36 m2 de 2.956,80 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



6.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 0,6*0,4M

El presente ítem comprende el suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio con dimensiones 0,6 m de ancho por 0,4 m de alto, incluyendo el marco, hoja(s), vidrios, herrajes, sellos y accesorios necesarios para su correcta colocación y funcionamiento, conforme a los planos arquitectónicos y especificaciones del proyecto.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



6.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALUMINIO (1,15*1,00). (INCLUYE VIDRIO 4MM)

El presente ítem comprende el suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio con dimensiones 1,15 m de ancho por 1,00 m de alto, incluyendo el marco, hojas móviles o fijas, vidrio transparente de 4 mm, herrajes, sellos y accesorios necesarios para su correcta colocación, funcionamiento y estanqueidad, según planos arquitectónicos y normas técnicas vigentes.

En esta actividad se realizaron 132 und de 160 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



6.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA ALUMINIO (2,30*1,50M). (INCLUYE VIDIRIO 4MM)

El presente ítem comprende el suministro, transporte e instalación de ventana de aluminio con dimensiones 2,30 m de ancho por 1,50 m de alto, incluyendo el marco, hojas móviles o fijas, vidrio transparente de 4 mm, herrajes, sellos y accesorios necesarios para su correcta colocación, funcionamiento y estanqueidad, de acuerdo con los planos arquitectónicos y normas técnicas vigentes.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.




6.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METÁLICA PARA EXTERIORES DE 0.90M*2.30M (INCLUYE MARCO METALICO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA)

El presente ítem comprende el suministro, transporte e instalación de puerta metálica para exteriores con dimensiones 0,90 m de ancho por 2,30 m de alto, incluyendo:

- Marco metálico.
- Hoja de puerta con refuerzos estructurales.
- Ventilación superior (rejilla o celosía metálica).
- Cerradura, bisagras y accesorios necesarios.

La puerta se instalará en muros de albañilería o concreto, garantizando seguridad, funcionalidad, alineación, durabilidad y resistencia a la intemperie.

En esta actividad se realizaron 66 und de 80 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.

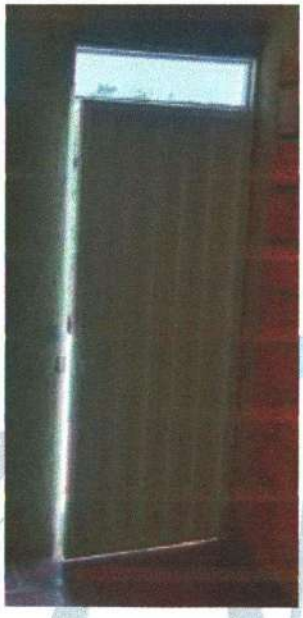

6.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA INTERIORES DE 0.90M*2,30M (INCLUYE MARCO METALICO, VENTILACION SUPERIOR Y CERRADURA DE POMO)

El presente ítem comprende el suministro, transporte e instalación de puerta de madera para interiores con dimensiones 0,90 m de ancho por 2,30 m de alto, incluyendo:

- Marco metálico.
- Hoja de puerta en madera maciza o MDF de alta densidad.
- Ventilación superior (rejilla o celosía de madera o metálica).
- Cerradura de pomo y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

La puerta se instalará en muros de albañilería, concreto o tabiques ligeros, garantizando alineación, resistencia, funcionalidad y acabado estético.

En esta actividad se realizaron 132 und de 160 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



7.01 RED SUMINSTRO DE AGUA DE 1" Y ½"

El presente ítem comprende el suministro, instalación, prueba y puesta en funcionamiento de la red de agua potable, incluyendo tuberías de 1 pulgada (1") y ½ pulgada (½") de diámetro, accesorios, válvulas, codos, tees y soportes necesarios para su correcta operación según los planos de proyecto y normas técnicas vigentes.

Se considera la conexión a la red principal de abastecimiento, distribución hacia los diferentes puntos de consumo y aseguramiento de caudal y presión adecuados.

En esta actividad se realizaron 528,0ml de 640,00 ml contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.




7.02 PUNTOS DE AGUA FRIA (incluye tuberías y accesorios según diseño)

El presente ítem comprende el suministro, instalación, conexión y prueba de puntos de agua fría, incluyendo tuberías, accesorios, válvulas y demás elementos necesarios para su funcionamiento de acuerdo con los planos y diseño hidráulico del proyecto.

Cada punto incluye la entrega de agua fría lista para uso en lavamanos, fregaderos, duchas, lavadoras, etc., con presión y caudal adecuados según normas de diseño.

En esta actividad se realizaron 198 und de 240 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.

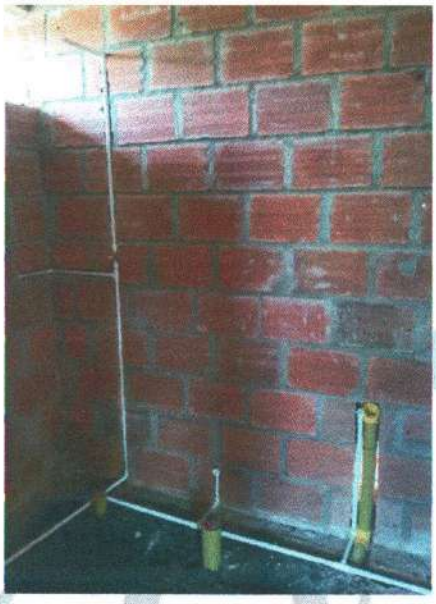

7.03 VALVULA DE PASO DE 1"

El presente ítem comprende el suministro, instalación, ajuste y prueba de válvula de paso de 1 pulgada (1"), destinada a controlar el flujo de agua en la red hidráulica de agua fría o caliente según el diseño del proyecto.

La válvula permitirá abrir o cerrar el flujo de manera segura, garantizando estanqueidad y durabilidad.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



7.04 VALVULA DE PASO DE ½"


El presente ítem comprende el suministro, instalación, ajuste y prueba de válvula de paso de ½ pulgada (½"), destinada a controlar el flujo de agua en la red hidráulica de agua fría o caliente según el diseño del proyecto.
La válvula permitirá abrir o cerrar el flujo de manera segura, garantizando estanqueidad y durabilidad.
En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



7.05 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1.000 LITROS (incluye tubería y accesorios según diseño)

El presente ítem comprende el suministro, transporte, instalación, conexión y puesta en servicio de un tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1.000 litros, incluyendo tuberías de conexión, válvulas, accesorios y soportes estructurales según diseño del proyecto.
El tanque se instalará en posición elevada o sobre base firme, garantizando flujo adecuado hacia la red de distribución y facilitando mantenimiento.


En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.

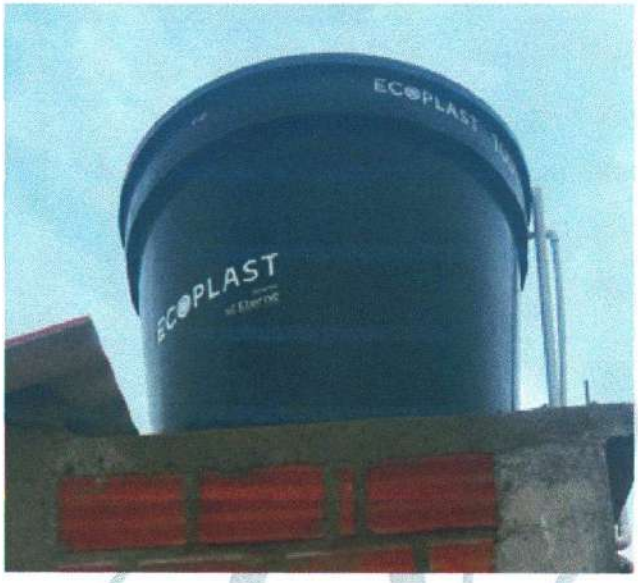

8.01 PUNTO SANITARIO 2".

El presente ítem comprende el suministro, instalación y conexión de un punto sanitario de 2 pulgadas (2"), incluyendo tuberías, accesorios y válvulas necesarias según diseño de desagüe o evacuación sanitaria.
Este punto corresponde a conexiones de inodoros, lavamanos, duchas u otros equipos sanitarios, asegurando evacuación segura y libre de fugas.

En esta actividad se realizaron 165 und de 200 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.

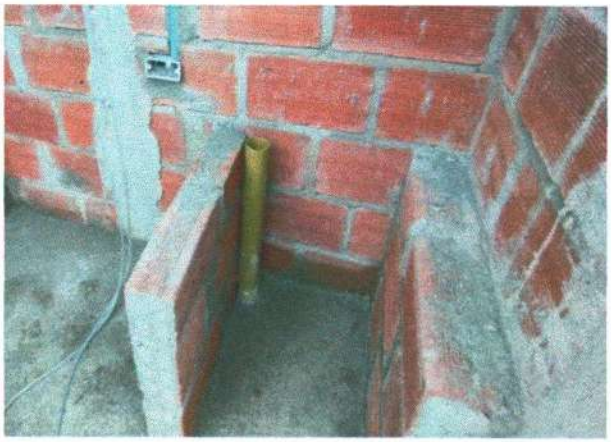

8.02 PUNTO SANITARIO 4".

El presente ítem comprende el suministro, instalación y conexión de un punto sanitario de 4 pulgadas (4"), incluyendo tuberías, accesorios y válvulas necesarias según el diseño de desagüe o evacuación sanitaria.
Este punto está destinado a líneas principales de descarga sanitaria, garantizando evacuación adecuada de aguas residuales.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



8.03 CAJA DE INSPECCION 50*50

El presente ítem comprende el suministro de materiales, construcción e instalación de una caja de inspección sanitaria de 50 cm × 50 cm, destinada a permitir la revisión, limpieza y mantenimiento de las redes de desagüe sanitario.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



8.04 RED SANITARIA PVCS 2"

El presente ítem comprende el suministro, instalación, conexión, prueba y puesta en funcionamiento de la red sanitaria en tubería PVC-S de 2 pulgadas (2"), incluyendo todos los accesorios, uniones, soportes y pruebas hidráulicas necesarias para garantizar un sistema de evacuación eficiente y hermético.

Esta red forma parte del sistema de desagüe sanitario del proyecto y transporta las aguas residuales domésticas hacia la caja de inspección.

En esta actividad se realizaron 233,31 ml de 282,80 ml contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



8.08 RED SANITARIA PVCS 4"

El presente ítem comprende el suministro, instalación, conexión, prueba y puesta en funcionamiento de la red sanitaria en tubería PVC-S de 4 pulgadas (4"), incluyendo todos los accesorios, uniones, soportes y pruebas hidráulicas necesarias para garantizar un sistema de evacuación de aguas residuales seguro, eficiente y duradero.

Esta red forma parte del sistema principal de desagüe del proyecto y conecta los artefactos sanitarios o ramales secundarios con la caja de inspección.

En esta actividad se realizaron 33,00 ml de 40,00 ml contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



9.01 SALIDA ILUMINACION-ROCETAS

El presente ítem comprende el suministro e instalación de salidas eléctricas para iluminación tipo roseta, destinadas a permitir la conexión de luminarias en techos o muros según planos eléctricos del proyecto.

El trabajo incluye: instalación de caja octogonal metálica o plástica empotrada, Conduit o tubería eléctrica, cableado interno, conexión a los circuitos de iluminación y pruebas de funcionamiento.

En esta actividad se realizaron 330 und de 400 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



9.02 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE

El presente ítem comprende el suministro e instalación de salidas eléctricas para tomacorrientes de uso general, empotrados o sobrepuestos, según planos eléctricos del proyecto.

El trabajo incluye la colocación de la caja de salida, Conduit, cableado, conexión del tomacorriente y pruebas de funcionamiento, cumpliendo con las normas de seguridad eléctrica y el Código Nacional de Electricidad.

En esta actividad se realizaron 231 und de 280 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



9.03 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE GFCI

La salida para toma corriente GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) es un dispositivo eléctrico diseñado para proteger a las personas contra descargas eléctricas por fallas a tierra. Detecta corrientes de fuga y desconecta automáticamente la alimentación en menos de 1/40 de segundo cuando se excede el límite de corriente de fuga.

En esta actividad se realizaron 66 und de 80 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



9.04 SISTEMA PUESTA A TIERRA

El sistema de puesta a tierra tiene como finalidad garantizar la seguridad eléctrica de las instalaciones, protegiendo a las personas, equipos y estructuras ante fallas eléctricas, sobretensiones o descargas atmosféricas. Su función principal es derivar de manera segura las corrientes de falla hacia tierra, minimizando riesgos de electrocución y daños en los equipos.


En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



9.05 SISTEMA DE MEDICION

El sistema de medición eléctrica permite registrar, monitorear y controlar el consumo de energía eléctrica en instalaciones residenciales, comerciales o industriales. Su propósito es garantizar la correcta facturación, eficiencia energética y seguridad de la instalación, proporcionando datos precisos de voltaje, corriente, potencia y energía consumida.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.

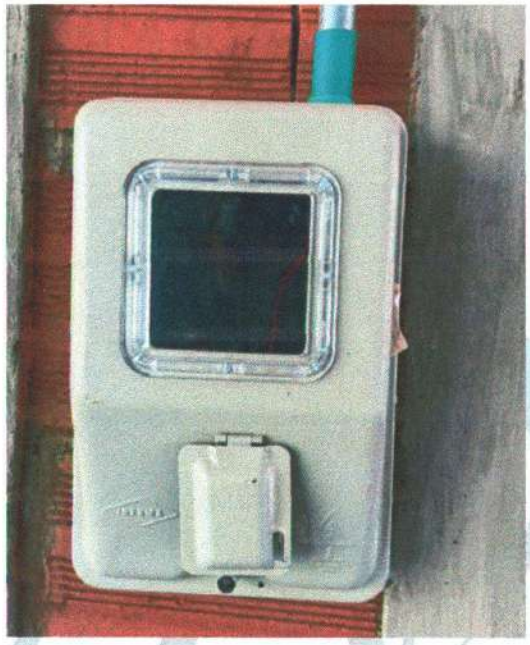

9.06 TABLERO PRINCIPAL

El Tablero Principal de distribución eléctrica (TP) es el elemento central de la instalación que recibe la alimentación de la red eléctrica y distribuye la energía hacia los tableros secundarios o circuitos finales. Está diseñado para proteger la instalación y los equipos conectados mediante dispositivos de protección contra sobrecorriente, cortocircuito y fallas a tierra.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



9.07 ACOMETIDA

La acometida eléctrica es el conjunto de conductores, dispositivos y accesorios que permiten la conexión de la instalación eléctrica de un edificio, vivienda o industria a la red de suministro de energía eléctrica de la compañía suministradora. Su función es garantizar una entrega segura, confiable y conforme a normas de la energía eléctrica.

En esta actividad se realizaron 396,00 ml de 480,00 ml contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO

El alcance de este ítem comprende el suministro, transporte, almacenamiento, montaje e instalación de sanitarios completos, incluyendo taza, tanque de descarga, asiento, sellos y accesorios necesarios, garantizando su correcto funcionamiento conforme a normas de calidad y seguridad.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR (INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS)

El alcance de este ítem comprende el suministro, transporte, almacenamiento y montaje de lavamanos de colgar, incluyendo grifería, desagüe, tornillería y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y fijación a la pared, cumpliendo con normas de calidad, higiene y seguridad.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



10.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO PREFABRICADO

El alcance de este ítem comprende el suministro, transporte, almacenamiento, montaje e instalación de lavaderos prefabricados, incluyendo grifería, desagüe, soportes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento y fijación, asegurando durabilidad, seguridad e higiene.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



10.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE 40*60 (incluye llave)

El trabajo comprende el suministro, transporte, almacenamiento, montaje e instalación de lavaplatos prefabricados de 40 x 60 cm, incluyendo llave de agua, desagüe, accesorios y fijaciones necesarias para garantizar funcionamiento correcto, durabilidad y seguridad.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



10.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA (REGADERA CORRIENTE)

El alcance comprende el suministro, transporte, almacenamiento, montaje e instalación de ducha de tipo corriente (regadera), incluyendo llaves, tuberías de conexión, soportes y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, asegurando durabilidad, seguridad e higiene.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



10.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA BAÑO

El alcance comprende el suministro, transporte, almacenamiento, preparación de superficie, colocación e instalación de piso cerámico aprobado para baños, incluyendo mortero adhesivo, juntas, selladores y accesorios necesarios para una instalación segura, funcional y estética.

En esta actividad se realizaron 103,62 m2 de 125,60 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



10.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA PARED DE DUCHA+ SALPICADERA LAVAMANOS

El alcance comprende el suministro, transporte, almacenamiento, preparación de superficie, colocación e instalación de enchapes cerámicos para paredes de ducha y salpicaderas de

avanzados, incluyendo adhesivos, juntas, selladores y accesorios necesarios para garantizar un acabado estético, duradero e impermeable.


En esta actividad se realizaron 372,90 m2 de 452,00 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



10.08 MESON PARA COCINA

El alcance comprende el suministro, transporte, almacenamiento, fabricación (si aplica), montaje e instalación de mesón para cocina, incluyendo encimeras, estructuras de soporte, herrajes, accesorios y acabados necesarios para garantizar funcionalidad, durabilidad y estética.

En esta actividad se realizaron 28,71m2 de 34,80 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.

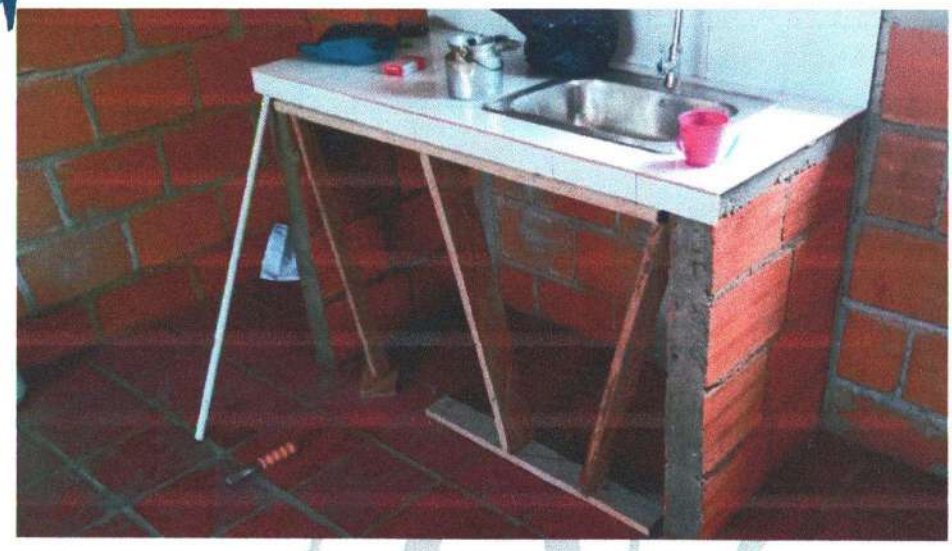

10.09 SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA SALPICADERO Y MESON DE LAVAPLATOS

El alcance comprende el suministro, transporte, almacenamiento, preparación de superficie, colocación e instalación de enchape cerámico aprobado para salpicadero y mesón de lavaplatos, incluyendo adhesivos, juntas, selladores y accesorios necesarios para garantizar un acabado estético, duradero e impermeable.

En esta actividad se realizaron 192,39 m2 de 233,20 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



10.10 PAÑETE SOBRE MUROS

El alcance comprende el suministro de materiales, preparación de superficie, aplicación y acabado de pañete sobre muros, garantizando uniformidad, adherencia, durabilidad y acabado estético. El trabajo incluye la protección de áreas adyacentes y limpieza final de la obra.

En esta actividad se realizaron 430,98 m2 de 522,40 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



10.11 ENCHAPE PISO COCINA EN TABLETA DE GRES

El alcance comprende el suministro, transporte, almacenamiento, preparación de superficie, colocación e instalación de baldosas de gres en piso de cocina, incluyendo adhesivos, juntas, selladores y limpieza final de la obra, asegurando funcionalidad, durabilidad y acabado estético.

En esta actividad se realizaron 288,8 m2 de 350,00 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



10.12 PINTURA TERMOAISLANTE PARA CUBIERTA

El alcance comprende el suministro, preparación de superficie, aplicación y acabado de pintura termoaislante sobre tejas de fibrocemento, con el fin de mejorar el aislamiento térmico, proteger contra radiación solar y aumentar la durabilidad del recubrimiento.

En esta actividad se realizaron 2.439,36 m2 de 2.956,80 m2 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



11.01 EXCAVACIÓN A MANO

El alcance comprende la excavación manual del terreno para la instalación de un tanque séptico prefabricado y su respectivo campo de infiltración, incluyendo preparación de taludes, limpieza de materiales excavados, y nivelación del fondo y lados según dimensiones del proyecto.

En esta actividad se realizaron 78,54 m3 de 95,20 m3 contratados el cual equivale a un 83% de este ítem, este ítem será pagado por m3 como esta en el presupuesto



11.02 SISTEMA SEPTICO PREFABRICADO Y CAMPO DE INFILTRACION

El alcance comprende el suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de un sistema séptico prefabricado con su correspondiente campo de infiltración, incluyendo excavación, nivelación, conexiones de entrada y salida, relleno y compactación del terreno, garantizando operación segura, duradera y conforme a normas sanitarias.

En esta actividad se realizaron 33 und de 40 und contratados el cual equivale a un 85% de este ítem, este ítem será pagado por ml como esta en el presupuesto.



CONCLUSIONES

- De acuerdo con la ejecución de las obras del Contrato **7943767-2025**, se presenta avance financiero que equivale a $3.141.180.075,00 **(TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETENTA Y CINCO PESOS MCTE** correspondiente al ACTA PARCIAL No. 01 y un valor en porcentaje del 83% del valor del contrato.

- Las Obras se ejecutan dentro de los parámetros técnicos requeridos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas generales del Contrato, garantizando así, la calidad de las obras ejecutadas.

- Se autoriza cada una de las actividades realizadas por el contratista de obra ya que corresponde a lo ejecutado en campo, de igual manera el rubro de **$11.611.017 (ONCE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL DIECISIETE PESOS MCTE)** correspondiente al **PLAN DE MANEJO AMBIENTAL** y un rubro de **$66.000.000 (SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MCTE)** para la **CERTIFICACIÓN RETIE+RETILAP.**

- Todas las labores referentes a las actividades objeto del presente periodo se realizaron teniendo en cuenta lo establecido en los estudios o evaluaciones ambientales del proyecto y las disposiciones vigentes sobre la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales.

- Es de vital importancia que el contratista acate las respectivas recomendaciones para que marche de la mejor manera posible la ejecución de cada una de las actividades contractuales enmarcadas en el contrato de obra No. 794367-2025.

Elaboro:	Aprobó:
Diego Valderrama DIEGO ALEXANDER VALDERRAMA RESIDENTE DE INTERVENTORIA MP: 54202-250657 NTS	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO R/L DE INTERVENTORIA

U.T. VSR NORTE

COPIA BITACORA DEL PERIODO A COBRAR.

13/08/2025 Miercoles	Ctto No. 7943767-2025 Personal: Residente de obra, Residente interventoria. Equipos: N/A Clima: Actividades: Se da inicio al contrato de obra No. 7943767-2025. Para lo cual se comienza por la Justificación del Transporte, el cual fue solicitado por la supervisión y la Interventoria Adrian Villamizar RIL UT VSE Norte Andres Parra. Insp Interventoria.
14/08/2025 Jueves	Ctto No. 7943767-2025 Personal: Residente de obra, Residente Interventoria Equipos: N/A Clima: Actividades: Se continua realizando la Justificación del valor del transporte de material, donde se anexan referencia del punto del lote mediante Imagen por Google Earth, se realiza socialización con beneficiarios de Tenerama y San calixto. Adrian Villamizar. RIL contratista Andres Parra Insp Interventoria.

líder

Powered by CamScanner

15/08/2025 viernes	Ctto No: 7945767 - 2025 Personal: Residente de obra, residente interventoria Equipos: N/A Clima: Actividades: se continua realizando la justificacion del valor del transporte de material, donde se anexan referencia del punto del lote, mediante imagen por Google Earth, se realiza Socializacion con beneficiarios de Convencion y el Carmen. Adrian Villamizar — Andres Parra R/L contratista — Insp interventoria
16/08/2025 sabado	Ctto No: 7943767 - 2025 Personal: residente de obra, residente interventoria equipos: N/A clima: Actividades: se continuo realizando la justificacion del valor del transporte del material, donde se anexan referencia del punto del lote, mediante imagen por Google Earth. Adrian villamizar — Andres Parra R/L contratista — Insp interventoria
17/08/2025 Domingo	Día No laboral Adrian Villamizar — Andres Parra R/L Contratista — Insp Interventoria

líder

Powered by CamScanner

18/08/2025	Ctto No: 7943767 - 2025
Lunes	Personal: Residente de obra, Residente Interventoría
	Equipos: N/A
	clima:
	Actividades: Se comienza con la realizacion del cronograma de obra para aprobacion de la Interventoria.
	Adrian Villamizar. — Andres Parra
	RIL contratista — INSP Interventoria
19/08/2025	ctto No: 7943767 - 2025
Martes	Personal: Residente de obra, Residente Interventoría
	Equipos: N/A
	clima:
	Actividades: Se continua con la realizacion del cronograma de obra para aprobacion de la interventoría.
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — INSP Interventoría
20/08/2025	Ctto No: 7943767 - 2025
Miercoles	Personal: Residente de obra - Residente Interventoría
	Equipos: N/A
	clima:
	Actividades: se continua con la realizacion del cronograma de obra

líder

Powered by CamScanner

	para operación de la interventoría.
	Adrian Villamizar — R/L contratista; Andres Parra — Insp. Interventoría
21/08/2025 Jueves	CTTO No: 7943767 - 2025 Personal: Residente de obra, residente interventoría Equipos: N/A Clima: Actividades: Al realizar el cronograma se evidencia que la cantidad de muro presupuestado no alcanza para la Terminación de la vivienda, así como la cantidad de Panete que se está tomando en cuenta es por ello que, se realiza una modificatoria de menores y mayores cantidades
	Adrian Villamizar — R/L contratista; Andres Parra — Insp Interventoría
22/08/2025 Viernes	CTTO No. 7943767 - 2025 Personal: Supervisora Secretaría de habitat Libia Stella Soto, Representante Legal contratista Alvaro adrian Villamizar, Representante legal Interventoría Julay Vasquez, Empleados contratistas (OPS) Secretaría de habitat, Inspector de Interventoría. Equipos: Clima: Soleado

líder

Powered by CamScanner

Actividades: se realiza comité de obra No. 1 en la ciudad de Cucuta, donde se tocan los temas sobre el Cronograma de obra, Plan de accion del contrato e interventoria, y se aborda el tema de las mayores y menores cantidades En el presupuesto, se Propone la realizacion del anden completo en la Fachada de la entrada Principal y la fachada donde se encuentra la Zona de lavadero. Se da por terminada la jornada del comite con el compromiso de hacer entrega de Cronograma, Justificacion Valor del transporte y Acta modificatoria de mayores y menores Cantidades

Adrian Villamizar.
DIL contratista

Andres Parra
tesp interventoria

13/08/2025
Sabado

Ctto No.: 7943767-2025
personal: Residente de obra, Residente interventoria
Equipos: N/A
Clima:

Actividades = Se continua con la modificatoria de menores y mayores cantidades teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el comité de obra No. 1

Adrian villamizar
DIL contratista

Andres Parra
tesp interventoria

líder=

Powered by CamScanner

24/08/2025 Domingo	Día no laboral Adrian villamizar RIL contratista Andres Parra Insp. interventoría
25/08/2025 lunes	Ctto No.: 7943767-2025 Personal: Residente de obra, Residente de interventoría Equipos: N/A Clima: Actividades: se continua con la modificación de menores y mayores cantidades teniendo en cuenta los observaciones realizados en el comité de obra No. 1 Adrian villamizar RIL contratista Andres Parra Insp. interventoría
26/08/2025 Martes	Ctto No.: 7943767-2025 Personal: Residente de obra, Residente interventoría Equipos: N/A clima: Actividades: se continua con la modificación de menores y mayores cantidades teniendo en cuenta los observaciones realizados en el comité de obra No. 1 Adrian villamizar RIL contratista Andres Parra Insp. interventoría

Powered by CamScanner

27/08/2025 Miercoles	c+to No: 7943767 - 2025 personal: Residente de obra, Residente interventoria Equipos: N/A clima: Actividades: se continua con la modificación de menores y mayores cantidades teniendo en cuenta las observaciones realizadas en el comité de obra No. 1. Adrian Villamizar R/L contratista Andres Parra Insp. Interventoria
28/08/2025 Jueves	c+to No: 7943767 - 2025 Personal: Residente de obra, Residente interventoria, Inspector de obra, Inspector de interventoria y personal logistico. Equipo: N/A clima: Actividades: Se comienza el envio de material para 3 beneficiarios, los materiales que se enviaron son para cimentacion. Beneficiarios: Fabian Amaya chona, Hernan Dario Quintero, Jose trinidad leon, Todos del municipio de convención. Adrian Villamizar R/L contratista Andres parra Insp. Interventoria

líder

Powered by CamScanner

29/08/2025 viernes	Ctto No.: 7943767 - 2025 Personal: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector de obra, Inspector de Interventoría y personal logístico. Equipos: N/A clima: Actividades: se continua el envio de material para 3 beneficiarios, los materiales que se enviaron son para cimentación. Beneficiarios: Elos Maria Suarez Sanchez, Hernan Julio Alvarez, Lucila Arenales Paez, todos del municipio del Carmén. Adrian Villamizar R/L contratista Andres Parra Insp Interventoría.
30/08/2025 sabado	Ctto No.: 7943767 - 2025 personal: Residente de obra, Residente Interventoría, Inspector de obra, Inspector de Interventoría y personal logístico Equipos: N/A clima: Actividades: se continua el envio de material para 2 beneficiarios, los materiales que se enviaron son para cimentación. Beneficiarios: Juan Nuñez Hernandez, Luis Alfredo Sanguino Carrascal, todos de la vereda Mirocotes del municipio de Teorama. Adrian Villamizar R/L contratista Andres Parra Insp Interventoría

líder:

Powered by CamScanner

31/08/2025 Domingo	Dia no laboral Adrian Villamizar R/L contratista — Andres Parra Insp Interventoria
01/09/2025 lunes	Ctto No: 7943767 - 2025 personal: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector de Obra, Inspector de Interventoria y personal logistico. Equipos: N/A Clima: Actividades: se continua el envio de material para 2 beneficiarios, los materiales que se enviaron son para cimentacion. Beneficiarios: Ramiro Manosalva Santiago, Marlene Quintero Poba, todos de municipio de convencion Adrian Villamizar R/L Contratista — Andres Parra Insp. Interventoria.
02/09/2025 Martes	Ctto No: 7943767 - 2025 personal: Residente de obra, Residente Interventoria, Inspector de Obra, Inspector de Interventoria y personal logistico. Equipos: N/A clima: Actividades: Se continua el envio de material para 3 beneficiarios, los materiales que se enviaron son para cimentacion. Beneficiarios: Gustavo Avila Agudelo, Jaime Aleiser Avila Echavez, de la vereda el Junco del municipio de Teorama; y Ana Lorena Urquijo

líder=

Powered by CamScanner

	lopez del municio de San calixto.
	Adrian villamizar — Andres Parra
	R/L contratista — Insp Interventoria
03/09/2025	Ctto No.: 7943767 - 2025
Miercoles	Personal: Residente de obra, Residente interventoria, Inspector de obra, Inspector de interventoria y personal logistico.
	Equipo: N/A
	Clima:
	Actividades: Se comienza el envio de material para cubierta a 5 beneficiarios; Fabian Arroyo Chona, Heiner Dario Quintero Quintero, Jose Trinidad Leon Barranco, Roberto Manosalva Santiago, Mariane Quintero Peña, todos del municipio de convención y Anyi Isabel Urquijo lopez del municipio de San Calixto.
	Adrian villamizar — Andres Parra
	R/L contratista — Insp Interventoria.
04/09/2025	Ctto No.: 7943767 - 2025
Jueves	Personal: Residente de obra, Residente interventoria, Inspector de obra. Inspector de interventoria y personal logistico
	Equipo: N/A
	Clima:
	Actividades: Se comienza el envio de material para cubierta a 7 beneficiarios; Elias Maria Suarez Sanchez, Hermos Julio Alvarez, Lucila Avendaño Perez, todos del municipio del carmen y Gustavo

líder=

Powered by CamScanner

	Aidela Angarita, Ivan Nunez Hernandez, Jaime Alpiser Aidela echevez, luis Alfredo sanguino corrasco!, todos del municipio de Teorama.
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp Interventoria.
05/09/2025	C+t O N°: 7943767 - 2025
viernes	personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector Interventoria, oficiales y ayudantes
	Equipo: Herramienta Menor
	Municipio: convención
	Clima: Soleado
	1. Jose leon: Se inicia localización y replanteo de vivienda.
	2. Hernan Quintero: Se inicia localización y replanteo de vivienda.
	3. Fabian Araque: Se inicia localización y replanteo de vivienda.
	4. Ramiro Monsalva: Se inicia localización y replanteo de vivienda.
	5. Marlene Quintero: se inicia localización y replanteo de vivienda.
	Municipio: El Carmen
	Clima: Soleado
	1. Hermes Julio: Se inicia localización y replanteo de vivienda
	2. Elos Sanchez: Se inicia localización y replanteo de vivienda
	3. Lucio Avendaño: se inicia localizacion y replanteo de vivienda.
	Municipio: San Calixto
	Clima: Soleado
	1. Anyi Urquijo. Se inicia localización y replanteo de vivienda.
	Municipio: Teorama

líder

Powered by CamScanner

	Clima: Soleado
	1. Juan Nuñez: Se inicia localizacion y replanteo de vivienda
	2. Jaime Avila: Se inicia localizacion y replanteo de vivienda
	3. Gustavo Avila: Se inicia localizacion y replanteo de vivienda.
	4. Luis Sanguino: Se inicia localizacion y replanteo de vivienda.
	Se realiza comité de seguimiento en la ciudad de cucuta donde se contó con la presencia de la supervisora Libia Stella Urbina, su equipo de trabajo, la interventoria y contratista.
	Adrian Villamizar. — Andres Parra
	R/L contratista — Jose. Interventoria
06/09/2025	CTTO No: 7943767-2025
Sabado	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector Interventoria, Oficiales y ayudantes.
	Equipo: Herramienta menor.
	Municipio: Convencion
	Clima: Soleado
	1. Jose Leon: Se continua replanteo de vivienda
	2. Hernan Quintero: Se continua replanteo de vivienda
	3. Fabian Amaya: Se continua replanteo de vivienda.
	4. Ramiro Manosalva: Se continua replanteo de vivienda
	5. Marlene Quintero: Se continua replanteo de vivienda.
	Municipio: El Carmen
	Clima: Soleado
	1. Hermes Julio: Se continua con replanteo de vivienda.
	2. Elos Sanchez: Se continua con replanteo de vivienda.

líder

Powered by CamScanner

	3. Lucila Avendaño: Se continua con replanteo de vivienda.
	Municipio: San Calixto
	clima: lluvia dispersa
	1. Anyi Urquijo: se continua replanteo de vivienda.
	Municipio: Teorama
	clima: nublado
	1. Ivan Nuñez: Se continua replanteo de vivienda.
	2. Jaime Ardila: Se continua replanteo de vivienda.
	3. Gustavo Ardila: Se continua replanteo de vivienda.
	4. Luis Sanguino: Se continua replanteo de vivienda.
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. Interventoria.
7/09/2025 domingo	Dia no laboral
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. Interventoria.
08/09/2025 lunes	Ctto No: 7943767-2025
	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, oficiales y ayudantes.
	Equipo: Herramienta Menor.
	Municipio: Convención
	clima: nublado
	1. Jose Leon: Se inicia excavación manual para cimentación

líder

Powered by CamScanner

	2. Hernan Quintero: Se inicia excavacion manual para cimentacion.
	3. Fabian Arroyo: Se inicia excavacion manual para cimentacion
	4. Ramiro Monsalve: Se inicia excavacion manual para cimentacion
	5. Marlene Quintero: Se inicio excavacion manual para cimentacion
	Municipio: El carmen
	clima: Soleado
	1. Hermes Julio: Se inicia excavacion manual para cimentacion
	2. Elos Sanchez: Se inicia excavacion manual para cimentacion
	3. Lucilo Avendaño: Se inicia excavacion manual para cimentacion
	Municipio: San Calixto
	Clima: Nublado
	1. Anyr Urquijo: Se inicio excavacion manual para cimentacion
	Municipio: Teorama
	Clima: nublado
	1. Juan Nuñez: Se inicia excavacion manual para cimentacion
	2 Jaime Avila: Se inicia excavacion manual para cimentacion
	3. Gustavo Avila: Se inicia excavacion manual para cimentacion
	4. Luis Sanguino: Se inicia excavacion manual para cimentacion.
	Adrian Villamizar R/L contratista
	Andres Parra Insp. Interventoria.
09/09/2025 Martes	CTTO No: 7943767 - 2025 Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector Interventoria, Operarios y ayudantes. Equipo: Herramienta menor
	Municipio: Concepcion

líder=

Powered by CamScanner

	Clima: Soleado
	1. Jose Leon: Se continua excavacion manual para cimentacion
	2. Heron Quintero: Se continua excavación manual para cimentacion
	3. Fabian Arroyo: Se continua excavacion manual para cimentacion
	4. Ramiro Monsalvo: Se continua excavacion manual para cimentacion
	5. Marlene Quintero: Se continua excavacion manual para cimentacion.
	Municipio: El carmen
	Clima: soleado
	1. Hermes Julio: Se continua excavación manual para cimentacion
	2. Eles Sanchez: Se continua excavacion manual para cimentacion
	3. Lucila Avendaño: se continua excavacion manual para cimentacion.
	Municipio: San calixto
	Clima: lluvia dispersa
	1. Anyi Urquijo: Se continua excavacion manual para cimentacion
	Municipio: Teorama
	Clima: Nublado
	1. Ivan Nuñez: Se continua excavación manual para cimentacion
	2. Jaime Ardila: Se continua excavacion manual para cimentacion
	3. Gustavo Ardila: Se continua excavacion manual para cimentacion
	4. Luis Sanguino: Se continua excavacion manual para cimentacion.
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. Interventoria.
10/09/2025	CTTO N°: 79483767 - 2025
Miercoles	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, oficiales y ayudantes.
	Equipo: Herramienta Menor.

Powered by CamScanner

Municipio: convención

Clima: nublado

1. Jose leon: Se inicio figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.

2. Heiran Quintero: se inicia figurado de acero para viga de cimentacion y columnas

3. Fabian Arcaya: se inicia figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.

4. Ramiro Mansolva: Se inicia figurado de acero para viga de cimentacion y columnas

5. Marlene Quintero: Se inicia figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.

Municipio: El carmen

Clima: Nublado

1. Hermes - Julio: Se inicia figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.

2. Elas Sanchez: Se inicia figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.

3. Lusila Avendaño: Se inicia figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.

Municipio: San calixto

Clima: lluvias dispersas

1. Anyi Urquijo: se inicio figurado de acero para viga de cimentacion y columnas

Municipio: Teorama

Clima: Nublado

1. Juan Nuñez: Se inicia figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.

2. Jaime Avila: Se inicio figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.

líder:

Powered by CamScanner

	3. Gustavo Ardila: Se inicia figurado de acero para viga de cimentación y columnas
	4. Luis Sanguino: Se inicia figurado de acero para viga de cimentación y columnas.
	Adrian villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. Interventoria.
11/09/2025	C+to No: 7943767 - 2025
Jueves	personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Equipo: Herramienta Menor
	Municipio: Convención
	Clima: lluvias dispersas
	1. Jose leon: Se continua figurado de acero para viga de cimentación y columnas.
	2. Hernan Quintero: Se continua figurado de acero para viga de cimentación y columnas
	3. Fabian Anaya: Se continua figurado de acero para viga de cimentación y columnas
	4. Camilo Manosalva: Se continua figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.
	5. Marlene Quintero: Se continua figurado de acero para viga de cimentación y columnas.
	Municipio: El carmen
	clima: lluvias dispersas.
	1. Hermes Julio: Se continua figurado de acero para viga de cimentación y columnas.
	2. Elos Sanchez: Se continua figurado de acero para viga de

Powered by CamScanner

	Cimentacion y columnas.
	3. Ludlo Alvarado: Se continua figurado de acero para viga de cimentacion y columnas
	Municipio: San Calixto
	clima: lluvias dispersas
	1. Anyi Urquijo: Se continua figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.
	Municipio: Teorama
	clima: lluvias dispersas.
	1. Ivan Nuñez: Se continua figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.
	2. Jaime Ardila: Se continua figurado de acero para viga de cimentacion y columnas
	3. Gustavo Ardila: Se continua figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.
	4. Luis Sanguino: Se continua figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.
	Adrian Villamizar R/L contratista — Andres Parra Insp. Interventoria.
12/09/2025 viernes	C++O. No: 7943767-2025
	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, oficiales y ayudantes.
	Equipos: Herramienta menor
	Municipio: Convención - Clima: nublado
	1. Jose Leon: Se continua con figurado de acero para viga de cimentación y columnas.

líder=

Powered by CamScanner

2. Hernan Quintero: Se continua con figurado de acero para viga de cimentación y columnas.
3. Fabian Arroyo: Se continua con figurado de acero para viga de cimentación y columnas
4. Ramiro Monsalve: Se continua figurado de acero para viga de cimentación y columnas
5. Marlene Quintero: Se continua con figurado de acero para viga de cimentación y columnas.

Municipio: El carmen
clima: nublado
1. Hermes Julio: Se continua con figurado de acero para viga de cimentación y columnas.
2. Eles Sanchez: Se continua con figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.
3. Lucila Avendaño: Se continua con figurado de acero para viga de cimentación y columnas

Municipio: San Calixto
clima: lluvia dispersa
1. Amp. Urquijo: Se continua figurado de acero para viga de cimentación y columnas.

Municipio: Teorama
clima: nublado
1. Juan Nuñez: Se continua figurado de acero para viga de cimentación y columnas.
2. Jaime Ardila: Se continua figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.
3. Gustavo Ardila: Se continua figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.
4. Luis Sanguino: Se continua figurado de acero para viga de cimentacion y columnas.

líder:

Powered by CamScanner

	Adrian Villamizar — R/L contratista
	Andres Parra — Insp. Interventoria
13/09/2025	Ctto No: 7943767 - 2025
sabado	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector Interventoria, oficiales y ayudantes
	Equipo: Herramienta menor
	Municipio: Convencion
	Clima: Soleado
	1. Jose leon: Se inicia fundiendo concreto de 21MPA para viga de cimentacion.
	2. Heiman Quintero: Se inicia fundiendo concreto de 21MPA para viga de cimentacion.
	3. Fabian Arroyo: Se inicia fundiendo concreto de 21MPA para viga de cimentacion.
	4. Ramiro Manosalva: Se inicia fundiendo concreto de 21MPA para viga de cimentacion
	5. Marlene Quintero: Se inicia fundiendo concreto de 21MPA para viga de cimentacion
	Municipio: El carmen
	Clima: soleado
	1. Heimes Julio: se inicia fundiendo concreto de 21MPA para viga de cimentacion.
	2. Elias Sanchez: Se inicia fundiendo concreto de 21MPA para viga de cimentacion
	3. Lucila Averbano: Se inicia fundiendo concreto de 21MPA para viga de cimentacion

líder=

Powered by CamScanner

	Municipio: San Calixto
	Clima: nublado
	1. Arq: Urquijo: se inicia fundiendo concreto de 21 MPA para viga de cimentación.
	Municipio: Teorama
	clima: nublado
	1. Ivan Nuñez: Se inicia fundiendo concreto de 21 MPA para viga de cimentación.
	2. Jaime Avila: Se inicia fundiendo concreto de 21 MPA para viga de cimentación.
	3. Gustavo Avila: Se inicia fundiendo concreto de 21 MPA para viga de cimentación.
	4. Luis Sanguino: Se inicia fundiendo concreto de 21 MPA para viga de cimentación.
	Adrian villamizar — Andres Parra
	P/L contratista — Insp. Interventoria.
14/09/2025 Domingo	Día no laboral
	Adrian villamizar — Andres Parra
	P/L contratista — Insp. Interventoria.
15/09/2025 lunes	Ctto No. 7943767-2025
	personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, oficiales y ayudantes.
	Equipo: Herramienta Menor.

líder

Powered by CamScanner

Municipio: Concepción

Clima: Soleado

1. Jose Leon: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentacion.

2. Heinan Quintero: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentación.

3. Fabian Amaya: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de Cimentación.

4. Ramiro Marsalva: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentacion.

5. Mariano Quintero: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentación.

Municipio: El carmen

Clima: Soleado

1. Hermes Julio: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentación.

2. Elos Sanchez: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentacion.

3. Lucila Avendano: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentación

Municipio: San Calixto

Clima: Soleado

1. Amyi Urquijo: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentacion.

Municipio: Teorama

clima: Soleado

1. Juan Nunez: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentacion

2. Jaime Ardila: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentacion.

líder

Powered by CamScanner

	3. Gustavo Ardila: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentacion.
	4. Luis Sarguino: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentacion.
	Adrian Villamizar — Ardies para
	RIL contratista — trsp. interventoria.
16/09/2025	ctto No.: 7943767 -2025
Martes	Personal: Residente de obra, trspector de obra, trspector interventoria, oficiales y ayudantes.
	Equipo: Herramienta menor.
	Municipio: convencion
	clima: soleado
	1. Jose leon: Se continua fundiendo concreto 21 MPA para viga de cimentacion
	2. Heiron Quintero: Se continua fundiendo concreto 21 MPA para viga de cimentacion.
	3. Fabian Arroyo: Se continua fundiendo concreto 21 MPA para viga de cimentacion.
	4. Ramiro Manosalva: Se continua fundiendo concreto 21 MPA para viga de cimentacion.
	5. Marlene Quintero: Se continua fundiendo concreto 21 MPA para viga de cimentacion.
	Municipio: El Carmen
	clima: soleado
	1. Hermes Ayo: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentacion
	2. Eles Sanchez: se continua fundiendo concreto 21MP para viga de

líder

Powered by CamScanner

	cimentacion.
	3. Lucila Alcedo: se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentacion.
	Municipio: San calixto
	Clima: nublado
	1. Anyi Urquijo: Se continua fundiendo concreto 21 MPA para viga de cimentación
	Municipio: Teorama
	Clima: nublado
	1. Juan Nuñez: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentación
	2. Jaime Ardila: se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentación.
	3. Gustavo Ardila: se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentación
	4. Luis Sanguino: Se continua fundiendo concreto 21MPA para viga de cimentación
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. Interventoria.
17/09/2025	CTTO N°: 79437677-2025
Miercoles	personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector Interventoria, Oficiales y ayudantes.
	Equipo: Herramienta Menor.
	Municipio: Convencion
	Clima: Nublado
	1. Jose Leon: Se inicia pega de mampostería
	2. Heiver Quintero: Se inicia pega de mampostería
	3. Fabian Arroyo: Se inicia pega de mampostería.
	4. Ramiro Manosalva: Se inicia pega de mampostería.
	5. Marlene Quintero: Se inicia pega de mampostería.

líder

Powered by CamScanner

	Municipio: El carmen
	Clima: Soleado
	1. Heimes Julio: Se inicia con la pega de mampostería
	2. Eles Sanchez: Se inicio con la pega de mampostería.
	3. Lucio Alcocer: Se inicio con la pega de mampostería.
	Municipio: San calixto
	Clima: lluvios dispersos
	1. Anyi Urquijo: Se inicia con la pega de mampostería.
	Municipio: Teorama
	Clima: nublado
	1. Juan Nuñez: Se inicia pega de mampostería
	2. Jaime Avila: Se inicia pega de mampostería
	3. Gustavo Avila: Se inicia pega de mampostería
	4. Luis Sanguino: Se inicia pega de mampostería.
	Adrian Villamizar / Ril contratista — Andres Para. / Insp. Interventoria.
18/09/2025 Jueves	Ctto No: 79437367 - 2025
	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Equipo: Herramienta Menor.
	Municipio: Convención
	Clima: Soleado.
	1. Jose León: Se continua pega de mampostería.
	2. Hernan Cuenca: se continua pega de mampostería
	3. Fabian Arroyo: Se continua pega de mampostería.
	4. Ricardo Manosalva Se continua pega de mampostería

líder

Powered by CamScanner

5. Mariano Quintero: Se continua pega de mamposteria.

Municipio: El Colmao
Clima: Soleado
1. Hermes Julio: Se continua pega de mamposteria
2. Elos Sanchez: se continua pega de mamposteria
3. Lupio Alfaro: Se continua pega de mamposteria.

Municipio: San Alberto
clima: nublado
1. Any: Urquijo: se continua pega de mamposteria

Municipio: Tenerife
Clima: lluvia dispersa
1. Juan Nuñez: Se continua pega de mamposteria
2. Jaime Ardila: Se continua pega de mamposteria
3. Gustavo Ardila: Se continua pega de mamposteria
4. Luis Sorguito: Se continua pega de mamposteria.

Adrian Villamizar
R/L contratista

Andres Parra
Insp. Interventoria

19/09/2025 viernes

Ctto No: 7943367 - 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, Oficiales y ayudantes
Equipo: Herramienta Menor.

Municipio: Convención
Clima: Soleado.
1. Jose leon: Se continua pega de mamposteria
2. Hernan Quintero: Se continua pega de mamposteria.

líder

3. Fabian Arroyo: Se continua pega de mampostería
4. Ricardo Monsalva: Se continua pega de mampostería
5. Mariano Quintero: Se continua pega de mampostería

Municipio: El Carmen
Clima: nublado
1. Hermes Julio: Se continua pega de mampostería
2. Elos Sanchez: se continua pega de mampostería
3. Jueta Avendaño: se continua pega de mampostería

Municipio: San Calixto
clima: nublado
1. Any: Urquijo: se continua pega de mampostería

Municipio: Teorama
Clima: nublado
1. Ivan Nuñez: Se continua pega de mampostería
2. Jaime Ardila: Se continua pega de mampostería
3. Gustavo Ardila: Se continua pega de mampostería
4. Luis Sanguino: Se continua pega de mampostería

Se realiza comité de seguimiento en la ciudad de Cucuta, donde se conto con la presencia de la supervisora Libia Stella Ubaina, su equipo de trabajo, la interventoría y contratista.

Adrian Villamizar
RLL contratista

Andres Parra
Insp. Interventoría.

20/09/2025 Sabado

CTO. No: 7943767 - 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector Interventoría, Oficiales y ayudantes.

líder:

Powered by CamScanner

Equipo: Herramienta menor

Municipio: Convencion

Clima: nublado

1. Jose Leon: se continua pega de mampostería y se inicia fundiendo concreto de 21MPA para columnas.

2. Heiron Quintero: se continua pega de mampostería y se inicio fundiendo concreto de 21MPA para columnas.

3. Fabian Arroyo: se continua pega de mampostería y se inicio fundiendo concreto de 21MPA para columnas

4. Ricardo Manosalvo: se continua pega de mampostería y se inicia fundiendo concreto de 21MPA para columnas.

5. Mariane Quintero: se continua pega de mampostería y se inicio fundiendo concreto de 21MPA para columnas.

Municipio: El Carmen

Clima: lluvias Dispersa

1. Hermes Julio: Se continua pega de mampostería y se inicio fundiendo concreto de 21MPA para columnas.

2. Elos Sanchez: Se continua pega de mampostería y se inicio fundiendo concreto de 21MPA para columnas.

3. Lucila Avendaño: Se continua pega de mampostería y se inicia fundiendo concreto de 21MPA para columnas.

Municipio: San Calixto

Clima: lluvia disperso

1. Any: Urquijo: se continua pega de mampostería y se inicia fundiendo concreto de 21MPA para columnas

Municipio: Teorama

Clima: lluvia dispersa

1. Juan Nuñez: Se continua pega de mampostería y se inicio fundiendo concreto de 21MPA para columnas.

líder=

Powered by CamScanner

	2. Jaime Avdila: Se continua pega de mampostería y se inicia fundido concreto de 21MPA para columnas.
	3. Gustavo Avdila: se continua pega de mampostería y se inicia fundido concreto de 21MPA para columnas.
	4. Luis Sarguino: se continua pega de mampostería y se inicia fundido concreto de 21MPA para columnas
	Adrian Villamizar — Residente Ingeniero Civil contratista
	Ardies Parra — Insp. Interventoria.
21/09/2025 Domingo	Dia no laboral
	Adrian Villamizar — Residente Ingeniero Civil contratista
	Ardies Parra — Insp. Interventoria
22/09/2025 Lunes	CTTO No.: 3943767-2025
	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector Interventoria, Oficiales y ayudantes.
	Equipo: Herramienta Menor.
	Municipio: Convencion
	Clima: nublado
	1. Jose Isaac: Se continua pega de mampostería y fundido de concreto de 21MPA para columnas.
	2. Hernan Quintero: Se continua pega de mampostería y fundido de concreto de 21MPA para columnas.
	3. Fabian Amaya: Se continua pega de mampostería y fundido de concreto de 21MPA para columnas
	4. Pablo Manosalva: Se continua pega de mampostería y fundido de concreto

líder

Powered by CamScanner

21 MPA para columnas.

5. Marlene Quintero: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto 2MPA para columnas.

Municipio: El roman

clima: nublado

1. Hermes Julio: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto 2MPA para columnas

2. Elys Sanchez: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto de 2MPA para columnas.

3. Lucila Avendaño: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto de 2MPA para columnas.

Municipio: San calixto

Clima: Nublado

1. Angi Urquijo: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto de 2MPA para columnas

Municipio: Teorama

clima: Nublado

1. Juan Nuñez: Se continua pega de mampostería y fundido de concreto de 2MPA para columnas.

2. Jaime Avilla: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto de 2MPA para columnas.

3. Gustavo Avilla: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto de 2MPA para columnas.

4. Luis Sanguino: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto de 2MPA para columnas.

Adrian villamizar
RIL contratista

Andres Parra
Insp. Interventoria.

líder

Powered by CamScanner

23/09/2025

Notas

CTTO de: 7943767 - 2025

personal Residente de obra, Inspector de obra, Inspector Interventoría, Oficiales y ayudantes.

Equipo: Herramienta Menor

Municipio: Concepción

Clima: Soleado.

1. Jose León: se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas.

2. Heiron Quintero: se continua pega de mampostería y fundida de concreto de 21 MPA para columnas.

3. Fabian Arauj: se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas.

4. Ramiro Maroalva: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas.

5. Marlene Quintero: se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas.

Municipio: El Carmen

Clima: Soleado

1. Hermes Julio: se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas

2. Elias Sanchez: se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas.

3. Lucio Avendaño: se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas.

Municipio: San Calixto

Clima: soleado

1. Anyi Urquija: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas.

Municipio: Teorama

lider=

Powered by CamScanner

clima: Soleado.

1. Ivan Nuñez: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas

2. Jaime Ardila: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas.

3. Gustavo Ardila: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas.

4. Luis Sanguino: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columnas.

Adrian Villamizar
R/L contratista

Andres Parra
Insp. Interventoria.

24/09/2025
Miercoles

Ctto No: 7943767 - 2025

Personal: Residente de obra, Inspetor de obra, Inspector Interventoria, Oficiales y ayudantes

Equipo: Herramienta menor.

Municipio: Concepción

clima: Soleado

1. Jose Leon: Se continua con pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columna y se inicia relleno y repicante para contra Piso.

2. Heiron Quintero: Se continua con pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columna y se inicia relleno y repicante para contra piso.

3. Fabian Anaya: Se continua con pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columna y se inicia relleno y repicante para contra piso.

4. Ramiro Monsalve: Se continua con pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columna y se inicia relleno y repicante para contra piso

5. Mariene Quintero: Se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPA para columna y se inicia relleno y repicante para contra piso.

líder=

Powered by CamScanner

Municipio: El carmen

Clima: soleado

1. Hermes Julio: se continua pega de mampostería, fundido de concreto 21MPD y se inicia relleno y replanteo para contra piso

2. elos sanchez: se continua pega de mampostería y fundido de concreto de 21MPD y se inicia relleno y replanteo para contra piso.

3. Lucila Avendaño: se continua pega de mampostería y fundida de concreto 21 MPD y se inicia relleno y replanteo para contra piso.

4. Humberto Alvarez: se inicia localización y replanteo

5. wil perez: se inicia localización y replanteo.

Municipio: San calixto

Clima: soleado

1. Amy: Urquijo: se continua pega de mampostería, fundida de concreto 21 MPD y se inicia relleno y replanteo para contra piso.

2. Jose Quintero y se inicia localización y replanteo

3. Lucenith Delgado: se inicia localización y replanteo

4. Diorge Ramirez: se inicia localización y replanteo

5. Daniel Suarez: Se inicia localización y replanteo

Municipio: Teorama

clima: soleado

1. Juan nuñez: se continua pega de mampostería, fundido de concreto 21 MPD para columnas y relleno para contrapiso.

2. Jaime Ardila: Se continua pega de mampostería, fundida de concreto 21MPD para columnas y relleno para contrapiso.

3. Gustavo Ardila: se continua pega de mampostería, fundida de concreto 21 MPD para columnas y relleno para contrapiso

4. Luis Sanguino: se continua pega de mampostería, fundida de concreto 21 MPD para columnas y relleno para contrapiso.

5. Alirio Argumedo: se inicia localización y replanteo

6. Javier Carvajalino: se inicia localización y replanteo

7. leonel Ramirez: se inicia localización y replanteo

líder=

Powered by CamScanner

	Adrian Villamizar — P/L contratista; Andres Parra — Insp. Interventoria
25/09/2025	CTTO No: 7943767 - 2025
Jueves	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector Interventoría, oficiales y ayudantes
	Municipio: Concepción
	Clima: soleado
	1. Jose leon: se continua con pega de mampostería, fundido de concreto
	21 MPA para columnas y relleno para contrapiso
	2. Heiron Quintero: se continua con pega de mampostería, fundida de concreto
	21MPA para columnas y relleno para contrapiso.
	3. Faiber Amaya: se continua pega de mampostería, fundido de concreto
	21 MPA para columnas y relleno para contrapiso.
	4. Ramiro Manosalva: se continua con pega de mampostería, fundida de concreto 21MPA para columnas y relleno para contrapiso
	5. Mailene Quintero: se continua con pega de mampostería, fundida de concreto
	21MPA para columnas y relleno para contrapiso.
	Municipio: El Carmen
	Clima: soleado
	1. Hermes Ortiz: se continua pega de mampostería, fundida de concreto 21MPA
	para columnas y relleno para contrapiso.
	2. Eles Sanchez: se continua pega de mampostería, fundida de concreto 21MPA
	para columnas y relleno para contrapiso.
	3. Lucio Avendaño: se continua pega de mampostería, fundida de concreto
	21MPA para columnas y relleno para contrapiso
	4. Humberto Alvarez: se continua localización y replanteo
	5. Luis Perez: se continua localización y replanteo

líder:

Powered by CamScanner

	Municipio: San Calixto
	Clima: nublado
	1. Anyi Urquijo: se continua pega de mampostería, fundida de concreto
	2. MPA para columnas y relleno contrapiso
	2. Jose Quintero: se continua localizacion y replanteo
	3. Lucenith Delgado: se continua localizacion y replanteo
	4. Diego Ramirez: se continua localizacion y replanteo
	5. Daniel Suarez: se continua localizacion y replanteo
	Municipio: Teorama
	Clima: nublado
	1. Ivan Nuñez: se continua pega de mampostería, fundida de concreto
	2. MPA para columnas y relleno para contrapiso.
	2. Jaime Avila: se continua pega de mampostería, fundida de concreto
	2. MPA para columnas y relleno de contrapiso
	3. Gustavo Avila: se continua pega de mampostería, fundida de concreto
	2. MPA para columnas y relleno de contrapiso.
	4. Luis Sanguino: se continua pega de mampostería, fundido de concreto 2 MPA
	para columnas y relleno de contrapiso.
	5. Alirio Argueta: se continua localizacion y replanteo
	6. Javier Carvajalino: se continua localizacion y replanteo
	7. Leonel Ramirez: se continua localizacion y replanteo
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	Ptl contratista — Insp. Interventoria
26/09/2025	Ctto No: 7943767 -2025
viernes	personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria,
	oficiales y ayudantes

Powered by CamScanner

Municipio: Concepcion

Clima: Soleado

1. Jose Leon: Se inicio figurado para viga de amarre
2. Heiman Quintero: Se inicia figurado para viga de amarre
3. Fabian Arroyo: se inicio figurado para viga de amarre
4. Ramiro Manosalva: se inicio figurado para viga de amarre
5. Mariano Quintero: se inicia figurado para viga de amarre

Municipio: El carmen

Clima: Soleado

1. Hermes Ruiz: Se inicio figurado para viga de amarre
2. Elias Sanchez: Se inicia figurado para viga de amarre
3. Lucio Alvarado: Se inicia figurado para viga de amarre
4. Humberto Alvarez: Se inicio figurado para viga de amarre
5. Luis Perez: se inicia figurado para viga de amarre.

Municipio: San Calixto

Clima: Lluvias dispersas

1. Angi Urquijo: Se inicio figurado para viga de amarre.
2. Jose Quintero: Se inicia figurado para viga de amarre
3. Lucenith Delgado: Se inicio figurado para viga de amarre
4. Diorge Ramirez: se continua localizacion y replanteo
5. Daniel Suarez: Se continua localizacion y replanteo.

Municipio: Teorama

Clima: Nublado

1. Ivan Nuñez: Se inicio figurado para viga de amarre
2. Jaime Ardila: se inicia figurado para viga de amarre
3. Gustavo Ardila: Se inicio figurado para viga de amarre
4. Luis Sanguino: Se inicia figurado para viga de amarre.
5. Alirio Angarita: se continua localizacion y replanteo
6. Javier Covagalino: Se continua localizacion y replanteo
7. Leonel Ramirez: Se continua localizacion y replanteo

líder=

Powered by CamScanner

	Adrian Villamizar — RIL contratista
	Andres Parra — trsp. interventoria
27/09/2025 sabado	CTTO No: 7943767 -2025
	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes.
	Municipio: Convencion
	Clima: soleado
	1. Joseleon: se continua figurado de acero para viga de amarre
	2. Hernan Quintero: Se continua figurado de acero para viga de amarre
	3. Fabian Amaya: se continua figurado de acero para viga de amarre
	4. Ramiro Monsalva: se continua figurado de acero para viga de amarre
	5. Marlene Quintero: Se continua figurado de acero para viga de amarre
	Municipio: El carmen
	Clima: soleado
	1. Hermes Julio: Se continua figurado de acero para viga de amarre
	2. Elos Sanchez: Se continua figurado de acero para viga de amarre
	3. Lucila Avendaño: Se continua figurado de acero para viga de amarre.
	4. Humberto Alvarez: Se continua localizacion y replanteo
	5. Luis Perez: se continuo localizacion y replanteo.
	Municipio: San Calixto
	Clima: soleado
	1. Anyi Urquijo: Se continuo figurado de acero para viga de amarre
	2. Jose Quintero: Se continua localizacion y replanteo
	3. Lucenith Delgado: Se continua localizacion y replanteo
	4. Diorge Ramirez: Se continuo localizacion y replanteo
	5. Daniel Suarez: Se continua localizacion y replanteo.

líder=

Powered by CamScanner

	Municipio: Tenjo
	Clima: Soleado
	1. Juan Nuñez: Se continua fraguado de acero para viga de amarre.
	2. Jaime Ardila: Se continua fraguado de acero para viga de amarre.
	3. Gustavo Ardila: Se continua fraguado de acero para viga de amarre
	4. Luis Sanguino: Se continua fraguado de acero para viga de amarre.
	5. Alirio Angarita: Se continua localizacion y replanteo.
	6 Javier Carvajalino: Se continua localizacion y replanteo
	7. Leonel Ramirez: Se continua localizacion y replanteo.
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	R/L contratista — Insp. Interventoria
28/09/2025 Domingo	Dia no laboral
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	R/L contratista — Insp. Interventoria
29/09/2025 Lunes	CTO No: 7943767 - 2025
	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, Oficiales y ayudantes
	Municipio: Cogua
	Clima: Soleado
"	1. Jose Leon: Se continua con fraguado de acero para viga de amarre
"	2. Hernan Quintero: Se continua con fraguado de acero para viga de amarre
"	3. Fabian Arana: Se continua con fraguado de acero para viga de amarre
	4. Ramiro Manosalva: Se continua con fraguado de acero para viga de amarre
"	5. Marlene Quintero: Se continua con fraguado de acero para viga de amarre.

líder:

Powered by CamScanner

Municipio: El Carmen

Clima: Soleado

11 1. Hermes Ortiz: Se continua con figurado de acero para viga de amarre.

12 2. Eles Sanchez: Se continua con figurado de acero para viga de amarre.

11 3. Lucia Alvarado: Se continua con figurado de acero para viga de amarre

4. Humberto Alvarez: Se continua localizacion y replanteo

8 5. Luis Perez: Se continua localizacion y replanteo.

Municipio: San Calixto

Clima: Soleado

11 1. Angi Urquijo: Se continua figurado de acero para viga de amarre.

2. Jose Quintero: Se continua localizacion y replanteo

11 3. Lucenith Delgado: Se continua localizacion y replanteo

4. Diego Ramirez: Se continua localizacion y replanteo

5. Daniel Suarez: Se continua localizacion y replanteo.

Municipio: Teorama

Clima: Soleado

11 1. Juan Nuñez: Se continua figurado de acero para viga de amarre

11 2. Jaime Rojas: Se continua figurado de acero para viga de amarre

11 3. Gustavo Avila: Se continua figurado de acero para viga de amarre.

11 4. Luis Sanguino: Se continua figurado de acero para viga de amarre.

12 5. Alirio Angarita: Se continua localizacion y replanteo

18 6. Javier Carvajalino: Se continua localizacion y replanteo

11 7. Leonel Ramirez: Se continua localizacion y replanteo.

Adrian Villamizar
PIL Contratista

Andres Pavo
Insp. Interventoria.

Powered by CamScanner

30/09/2025	Ctto Nº: 7943767 - 2025
Martes	Personal: residente de obra, inspector de obra, inspector interventoría, cerrajeros y ayudantes
	Municipio: Concepción
	Clima: nublado
	1. José Iegn: Se continua figurado de acero para viga de amarre.
	2. Hernan Quintero: Se continua figurado de acero para viga de amarre.
	3. Fabian Arroyo: Se continua figurado de acero para viga de amarre.
	4. Ramon Monsalvo: Se continua figurado de acero para viga de amarre.
	5. Mariano Quintero: Se continua figurado de acero para viga de amarre.
	Municipio: El carmen
	Clima: nublado
	1. Hermes Jurado: Se continua fundida de acero para viga de amarre.
	2. Eles Sanchez: Se continua fundida de acero para viga de amarre.
	3. Lucio Avendaño: Se continua fundida de acero para viga de amarre.
	4. Humberto Alvarez: Se continua localizacion y replanteo.
	5. Luis Perez: Se continua localizacion y replanteo.
	Municipio: San calixto
	Clima: lluvias dispersas.
	1. Any: Urquijo: Se continua figurado de acero para viga de amarre.
	2. Jose Quintero: Se continua localizacion y replanteo
	3. Lucenith Delgado: Se continua localizacion y replanteo
	4. Diego Ramirez: Se continua localizacion y replanteo.
	5. Daniel Suarez: Se continua localizacion y replanteo.
	Municipio: Teorama
	Clima: lluvias dispersas.
	1. Juan Nuñez: Se continua figurado de acero para viga de amarre
	2. Jaime Avella: Se continua figurado de acero para viga de amarre.
	3. Gustavo Avella: Se continua figurado de acero para viga de amarre.

líder:

Powered by CamScanner

	4. Luis Sanguino: Se continua replanteo de obra para viga de cimiento.
	5. Alirio Argenta: Se continua localizacion y replanteo
	6. Javier Carvajalino: Se continua localizacion y replanteo.
	7. Ronal Ramirez: Se continua localizacion y replanteo.
	Adrian Villamizar — Archivo Para
	RIL contratista — tmp: Interventoria
11/10/2025	Otro N° 7943767-2025
Miercoles	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Convencion
	Clima Soleado
	1. Jose leon: Se realiza encofre. encofre y se inica fundida para viga de amarre
	2. Hernan Quintero: Se realiza encofre y se inica fundida para viga de amarre
	3. Edgar Arenas: Se realiza encofre y se inica fundida para viga de amarre
	4. Ramiro Manolaluna: Se realiza encofre y se inica fundida para viga de amarre
	5. Marlone Quintero: Se realiza encofre y se inica fundida para viga de amarre
	6. Jose de la Rosa Diaz: Se inica localizacion y replanteo de vivienda
	7. Gustavo Portilla. Se inica localizacion y replanteo de vivienda
	Municipio: El carmen
	Clima: Soleado
	1. Hermes Julio: Se inician cuchillas para cubierta
	2. Elel Suarez: Se continua fundida de acero para viga de amarre

líder

Powered by CamScanner

3. Lucila Avendaño: Se inicia Cuchillal para cubierta
4. Humberto Alvarez: Se inicia excavacion manual para viga de cimentacion
5. Luis Perez: Se realiza excavacion manual para viga de cimentacion y figurado de acero para viga de cimentacion
6. Victor Rodriguez: Se realiza localizacion y reeplanteo y se inicia excavacion manual para viga de cimentacion

Municipio: San calixto:
Clima: Soleado
1. Ana Urquijo: Se realiza encofre y se inicia fundida para viga de amarre
2. Jose Montero: Se inicia excavacion manual para viga de cimentacion
3. Lucenith Delgado: Se realiza excavacion manual y figurado de acero para viga de cimentacion.
4. Dorse Ramirez: Se inicia excavacion manual para viga de cimentacion
5. Daniel Suarez: Se inicia excavacion manual para viga de cimentacion

Municipio: Teorama
Clima: Soleado
1. Ivan Nuñez: Se realiza encofre y se inicia fundida para viga de amarre
2. Jaime Archila: Se realiza encofre y se inicia fundida para viga de amarre
3. Gustavo Archila: Se realiza encofre y se inicia fundida para viga de amarre
4. Luis Sarsuno: Se realiza encofre y se inicia fundida para viga de amarre
5. Mario Angarita: Se realiza excavacion manual y figurado de acero para viga de cimentacion
6. Javier Carvajalino: Se realiza excavacion manual y figurado de acero para viga de cimentacion
7. Isabel Ramirez: Se realiza excavacion manual y figurado de acero para viga de cimentacion.

Adrian Villamizar
El contratista

Andres Parra
Interventoria

líder

2/10/2025	GHO Nº 7943767-2025
Jueves	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoría, oficiales y ayudantes
	Municipio: Convención
	Clima: Nublado
	1. Jose Leon: Se inician cuchillas para cubierta
	2. Hernan Quintero: Se inician cuchillas para cubierta
	3. Fabian Amaya: Se inician cuchillas para cubierta
	4. Ramiro Manosalva: Se continua fundida para viga de amarre
	5. Marlone Quintero: Se inician cuchillas para cubierta
	6. Jose de la Rosa Diaz: Se realiza excavación manual para viga de cimentación
	7. Gustavo Portillo: Se realiza excavación manual para viga de Cimentación
	Municipio: El carmen
	Clima: Nublado
	1. Hermes Julio: Se realiza instalación de viga canta, correas metálicas y se inicia instalación de cubierta
	2. Elkis Suarez: Se realizan cuchillas para cubierta
	3. Wilson Avendaño: Se realiza instalación de viga canta y correas metálicas y se inicia instalación de cubierta
	4. Humberto Alvarez: Se continua excavación manual para viga de cimentación
	5. Luis Perez: Se realiza instalación fundida y deberá fundir de viga de cimentación y se inicia pega de mampostería, Fundida de concreto 21 MPA para columnas y relleno para contrapiso
	6. Victor Rodriguez: Se realiza figurado de acero para viga de cimentación, fundida y desencofre de viga de cimentación, se inicia pega de mampostería

líder:

Powered by CamScanner

	Municipio: San calixto
	Clima: Nublado
	1 Abril Orayjo: Se inician cuchillas para cubierta
	2. Jole Quintero: Se contrata excavación manual para viga de cimentación
	3 Lucenith Delgado: Se realiza fundida y desencofre para viga de cimentación, Se inicia Pega de mampostería, fundida de concreto 21 MPA para columnas y relleno de contrapiso
	4. Diorge Ramirez: Se contrato excavación manual para viga de cimentación
	5. Daniel Suarez: Se contrata excavación manual para viga de cimentación
	Municipio: Teorama
	Clima: Nublado
	1. Ivan Nuñez: Se realizan cuchillas para cubierta
	2. Jaime Ardila: Se realizan cuchillas para cubierta
	3. Gustavo Ardila: Se realizan cuchillas para cubierta
	4. Luis Sanguino: Se realizan cuchillas para cubierta
	5. Alvaro Arsanta: Se realiza fundida y desencofre de viga de cimentación y se inicia Pega de mampostería, fundida de concreto 21 MPA para columnas y relleno de contrapiso
	6. Javier Carvajino: Se realiza fundida y desencofre de viga de cimentación y se inicia pega de mampostería, fundida de concreto 21 MPA para columnas y relleno de contrapiso.
	7. Leonel Ramirez: Se realiza fundida y desencofre de viga de cimentación y se inicia Pega de mampostería, fundida de concreto 21 MPA para columnas y relleno de contrapiso
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	R/L contratista — Insp Interventoria
31/01/2025	CTO N° 7943767-2021
Viernes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria,

líder=

Powered by CamScanner

Oficiales y ayudantes.

Municipio: Concepción
Clima: Nublado
1 Jose León: Se realiza instalación de viga cinta y correas metálicas y se inicia instalación de cubierta.
2. Hernan Quintero: Se realiza instalación de viga cinta y correas metálicas y se inicia instalación de cubierta
3 Fabian Amaya: Se realiza instalación de viga cinta y correas metálicas y se inicia instalación de cubierta
4, Ramiro Hansolaug: Se inician cuchillas para cubierta
5. Marlene Quintero: Se realiza instalación de viga cinta y correas metálicas y se inicia instalación de cubierta
6. Jose de la Paz Paz: Se realiza fisurado de acero y fundida para viga de cimentación.
7. Gustavo Portillo: Se realiza fisurado y fundida de acero para viga de cimentación

Municipio: El carmen
Clima: Nublado
1 Hermes Julio: Se realiza instalación de cubierta
2. Elvis Suarez: Se realiza instalación de cubierta
3. Ayala Fuentes: Se realiza instalación de cubierta
4 Humberto Alcocer: Se inicia fisurado de acero para viga de cimentación
5- Luis Perez: Se continua Pesa de mampostería, fundida de concreto 21 MPA para columnas y relleno para contra piso.
6. Victor Rodriguez: Se continua pesa de mampostería, fundida de concreto 21 MPA para columnas y relleno para contra piso

Municipio: San calixto
Clima: Nublado
1. Anyi Urquijo: Se realiza instalación de cubierta

líder=

Powered by CamScanner

	2. Jose Quintero: Se inicia fabricado y fundida de viga de cimentacion.
	3. Ucenith Pelgarda: Se continua Pega de mamposteria, fundida de concreto 21 MPA Para columnas y relleno de contrapiso
	4. Diego Ramirez: Se inicia fabricado y fundida de acero para viga de cimentacion
	5. Daniel Suarez: Se inica fabricado y fundida de acero para viga de cimentacion
	Municipio: Tocrama
	Clima: Nublado
	1. Juan Nuñez: Se realiza instalacion de cubierta
	2 Jaime Avila: Se realiza instalacion de cubierta
	3. Gustavo Avila: Se realiza instalacion de cubierta
	4. Luis Sanabria: Se realiza instalacion de cubierta
	5. Alvaro Angarita: Se continua Pega de mamposteria, fundida de Concreto 21 MPA Para columnas y relleno de contrapiso.
	6. Javier Carvajalino: Se continua Pega de mamposteria, fundida de Concreto 21 MPA Para columnas y relleno de contrapiso.
	7 Leonel Ramirez: Se continua Pega de mamposteria, fundida de Concreto 21 MPA Para columnas y relleno de contrapiso.
	Adrian Villamizar. — Andres Pena
	RIL contratista — Insp. Interventoria
4/10/2025 Sabado	CTTO 7943767-2025
	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspecto. Interventoria Oficial y ayudantes
	Municipio: Concepcion
	1 Jose Leon: Se realiza instalacion de docteria electrica y Cajas electricas
	2 Hernan Quintero. Se realiza instalación de docteria y Cajal electrica

líder:

3 Fabian Amaya: Se realiza instalación de ductera electrica y Cajas electricas
4 Ramiro Manosalva: Se realiza instalación de viga cinta, y Correas metalicas y se inicia instalación de cubierta.
5. Marlene Quintero. Se realiza instalación de ductera electrica y cajas electricas
6 Jose Diaz: Se inicia Pega de mampostera fundida de concreto 21 MPA para columnas y relleno de contrapiso.
7: Gustavo Portillo: Se inicia pega de mampostera, fundida de concreto 21 MPA para columnas y relleno de contrapiso.

Municipio: El carmen
Clima: Nublado.
1. Hermes Julio: Se realiza instalacion de ductera y cajas electricas.
2. Ciro Suarez: Se realiza instalación de ductera y cajas electricas
3. Lucia Avendaño: Se realiza instalacion de ductna y cajas electricas
4. Humberto Alvarez: Se continúa fisurado de acero para viga de cimentacion.
5- Luis Perez: Se inicia fisurado, encofre y fundida para viga de amarre
6. Victor Rodriguez: Se inicia fisurado, encofre y fundida para viga de amarre

Municipio: San calixto:
Clima: Nublado
1. Angel Orozco: Se realiza instalación de ductera electrica y cajas electricas
2. Jose Quintero: Se continúa fisurado y fundida de viga de cimentacion
3. Kenith Delgado: Se inicia fisurado, encofre y fundida de acero para viga de amarre

líder

Powered by CamScanner

	4 Diese Ramirez: Se continúa fisurado y fundida de acero para usa de cimentación
	5. Daniel Suarez: Se continua fisurado y fundida de acero para usa de cimentación
	Horario: Teorama
	Clima: Nublado
	1. Juan Nuñez: Se realiza instalación de doctena electrica y cajas electricas
	2 Jaime Ardila: Se realiza instalacion de doctena y cajas electricas
	3 Gustavo Ardila: Se realiza instalación de doctena y cajas electricas
	4 Luis Samsung: Se realiza instalación de doctena y cajas electricas
	5. Alvaro Arguello: se inicia fisurado, encofre y fundida para usa de amarre
	6. Javier Carvajalino: se inicia fisurado, encofre y fundida de acero para usa de amarre
	7. Leonel Ramirez: Se inicia fisurado, encofre y fundida de acero para usa de amarre
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Interventoria
5/10/2025	Dia no laboral
Domingo	
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Interventoria
6/10/2025	CTTO 7943767-2025
Lunes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria asociados y ayudantes

líder=

Powered by CamScanner

Montaña: Concepción
Clima: Soleado
1. Jose León: Se realiza instalación de Puntos Sanitarios y red hidraulica y se inicia instalación de tableta de gres.
2. Hernan Quintero: Se realiza instalación de puntos sanitarios y red hidraulica y se inicia instalación de tableta de gres.
3. Faloran Arraya: Se realiza instalacion de Puntos sanitarios y red hidraulica y se inicia instalación de tableta de gres.
4. Ramiro Manosalva: Se continúa instalación de cubierta
5. Marlene Quintero: Se realiza instalación de puntos sanitarios y red hidraulica y se inicia instalación de tableta de gress.
6. Jose Diaz: Se continúa Pesa de mamposteria, fundida de concreto 21 mpa Para columnas y rellenos de contrapiso.
7. Gustavo Portillo: Se continúa Pesa de mamposteria, fundida de concreto 21 mpa. Para columnas y rellenos de contrapiso

Montaña: El carmen
Clima: Soleado
1. Hermes Julio: Se realiza instalacion de puntos sanitarios y red hidraulica y se inicia instalación de tableta de gres
2. Efes Suarez: Se realiza instalacion de puntos sanitarios y red hidraulica y se inicia instalación de tableta de gres
3. Wuala Avendaño: Se realiza instalacion de puntos sanitarios y red hidraulica y se inicia instalacion de tableta de gress.
4. Humberto Alvarez: Se inicia fundida de acero Para viga de cimentación
5. Luis Perez: Se continúa fundida Para viga de amarre
6. Victor Rodriguez: Se continúa fundida Para viga de amarre

Montaña: San Calixto
Clima: Soleado.

Powered by CamScanner

1 Anni Urquijo: Se realiza instalacion de Punto sanitario y red hidraulica y se inicia instalacion de tableta de gress
2. Jose Quintero: Se inicia Pega de mamposteria
3. Lucenith Delgado: Se continua fundida para viga de amarre.
4. Diosa Ramirez: Se inicia Pega de mamposteria
5. Daniel Suarez: Se inicia Pega de mamposteria

Municipio: Tenerife
Clima: Soleado
1. Ivan Nunez: Se realiza instalacion de Punto sanitario y red hi...
y se inica instalacion de tableta de gress
2. Jaime Ardila: Se realiza instalacion de punto sanitario y red hidraulica y se inicia instalacion de tableta de gress
3. Gustavo Ardila: Se realiza instalacion de Punto Sanitario y ...
hidraulica y se inica instalacion de tableta de gress.
4. Luis Sanjuan: Se realiza instalacion de Punto sanitario y red hidraulica y se inica instalacion de tableta de gress
5. Alina Angarita: Se continua fundida para viga de amarre
6. Javier Carvajalino: Se continua fundida para viga de amarre
7. Leonel Ramirez: Se continua fundida para viga de amarre

Adrian Villamizar
RH contratista

Andres Parra
Interventoria

7/10/2025 GTO 7AM3767-2025
Martes Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria oficiales y ayudantes

Municipio: Convencion
Clima: Mañana soleada, tarde nublada
1. Jose Leon: Se continua instalacion de tableta de gress y fraguado y esmaltado de Piso

líder:

Powered by CamScanner

2 Hernan Quintero: Se continua instalacion de tableta de gress y fisurado y esmaltado de pisos.
3. Fabian Amaya: Se continua instalacion de tablota de gress y fisurado y esmaltado de pisos
4 Ramiro Manosalva: Se continua instalacion de cubierta
5. Marlene Quintero: Se continua instalacion de tablota de gress y fisurado y esmaltado de pisos
6. Jose Diaz: Se inica fisura, encofre y fundida de acero para viga de amarre
7. Gustavo portillo: Se inica fisurado, encofre y fundida de acero para viga de amarre

Municipio: El carmen
Clima: Mañana soleada, tarde nublada.
1 Hermes Julio: Se continua instalacion de tableta de gress y fisurado y esmaltado de pisos
2. Elias Suarez: Se continua instalacion de tableta de gress y fisurado y esmaltado de pisos.
3. Wilson Avendaño: Se continua instalacion de tableta de Gress y fisurado y esmaltado de pisos.
4 Humberto Alvarez: Se continua fundida de acero para viga de cimentacion.
5. Wilson Perez: Se inican cuchillas para cubierta
6. Victor Rodriguez: Se inican cuchillas para cubierta.

Municipio: San calixto
Clima: Mañana soleada, tarde nublada
1. Anyi Criollo: Se continua instalacion de tableta de gress y fisurado y esmaltado de pisos.
2. Jose Quintero: Se continua Pega de mampostena
3. Lucenith Pelsado: Se inican cuchillas para cubierta
4. Diose Ramirez: Se continua Pega de mampostena
5. Daniel Suarez: Se continua Pega de mampostena.

líder:

Powered by CamScanner

52

	Municipio: Tenerama
	Clima: Dia soleado
	1. Juan Manuel: Se continua instalacion de tableta de yeso y fisurado y enmaltado de pisos
	2. Jaime Ardila: Se continua instalacion de tableta de yeso y fisurado y enmaltado de pisos
	3. Gustavo Ardila: Se continua instalación de tableta de yeso y fisurado y enmaltado de pisos
	4. Luis Sanzino: Se continua instalacion de tableta de yeso y fisurado y enmaltado de pisos
	5. Miro Acosta: Se realizan cuchillas y se inicia instalacion de cubierta
	6. Javier Carvajalino: Se realizan cuchillas y se inicia instalacion de cubierta
	7. Leonel Ramirez: Se realizan cuchillas y se inicia instalacion de cubierta
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	B/L Contratista — Insp interventoria
8/10/2025	OTP 7943767-2025
Hierro tes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria oficial y ayudantes
	Municipio: Concepcion
	Clima: Soleado
	1. Jose Leon: Se realiza Pañete en baño y se inicia instalacion de meson de la cocina
	2. Hernan Quintero: Se realiza Pañete en baño y se inicia instalacion de meson de la cocina
	3. Fabian Amaya: Se realiza Pañete en baño y se inicia instalacion de meson de la cocina

Powered by CamScanner

4. Ramiro Manosalva: Se inicia instalación de defensa electrica
5. Marlene quintero: Se realiza pañete en baño y se inicia instalación de meson de la cocina
6. Jose Diaz: Se inicia cuchillas para cubierta
7. Gustavo Portillo: Se inicia cuchillas para cubierta

Municipio: El carmen
Clima: Soleado
1. Hermes Soto: Se realiza pañete en baño y se inicia instalación de meson de la cocina
2. Eder Suarez: Se realiza pañete en baño y se inica instalación de meson de cocina
3. Lucia Fuentes: Se realiza pañete en baño y se inica instalación de meson de la cocina
4. Humberto Alvarez: Se inica pega de mamposteria
5. Luis Perez: Se inica instalación de cubierta
6. Victor Rodriguez: Se inica instalación de cubierta

Municipio: San calixto
Clima: Soleado
1. Angel orozco: Se realiza pañete en baño y se inicia instalación de meson de la cocina
2. Jose quintero: Se continua mamposteria
3. Lucenith Delgado: Se inicia instalación de cubierta
4. Diose Ramirez: Se continua mamposteria
5. Daniel Suarez: Se continúa mamposteria

Municipio: Teorama
Clima: Dia soleado
1. Juan Nuñez: Se realiza pañete en baño y se inica instalación de meson de la cocina
2. Jaime Ardila: Se realiza pañete en baño y se inicia

líder

Powered by CamScanner

	Instalacion de meson de la cocina
	3. Gustavo Arcila: Se realiza Pañete en baño y se inica instalacion de meson de la cocina
	4. Luis Sanguino: Se realiza Pañete en baño y se inica instalacion de meson de la cocina
	5. Alino Ansanta: Se continua instalacion de cubierta
	6. Javier Carvajalino: Se continuó instalacion de cubierta
	7. Leonel Ramirez: Se continua instalacion de cubierta
	Adrian Villamitar — Andres Parra
	R/L contratista — Insp interventoria
9/10/2025 Jueves	CTD-7943767-2025
	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria ayudantes y oficiales
	Municipio: Cocorna
	Clima: Nublado
	1. Jose Leon: Se realiza instalacion de ceramica en baño, cocina y lavadero
	2. Hernan Quintero: Se realiza instalacion de ceramica en baño, cocina y lavadero
	3. Fabian Arroyo: Se realiza instalacion de ceramica en baño cocina y lavadero
	4 Ramiro Manzalbar: Se continua instalacion de tactena electrica
	5. Hailore Quintero: Se realiza instalacion de ceramica en baño cocina y lavadero
	6. Jose Peas: Se inica instalacion de cubierta
	7. Gustavo Portillo: Se inica instalacion de cubierta
	Municipio: El carmen
	Clima: Nublado

líder=

Powered by CamScanner

1. Hermes Julio: Se realiza instación de ceramica en baño, cocina y lavadero.
2. Del Suarez: Se realiza instalación de ceramica en baño, cocina y lavadero
3. Lucila Fuentaño: Se realiza instalación de ceramica en baño, cocina y lavadero
4. Humberto Alvarez: Se continua Pesa de mampostera
5. Luis Perez: Se continúa instalación de cubierta
6. Victor Rodriguez: Se continua instalación de cubierta

Municipio: San calixto
Clima: Nublado
1. Anai urquijo: Se realiza instalación de ceramica en baño, cocina y lavadero
2. Jose Quintero: Se continua mampostera
3. Lucenith Delgado: Se continúa instalación de cubierta
4. Dorse Ramirez: Se continua mampostera
5. Daniel Suarez: Se continua Mamposteria

Municipio: Teorama
Clima: Nublado:
1. Juan Nuñez: Se realiza instalación de ceramica en baño, cocina y lavadero.
2. Jaime Ardila: Se realiza instalación de ceramica en baño, cocina y lavadero.
3. Cristian Ardila: Se realiza instalacion de ceramica en baño, Cocina y lavadero
4. Luis Sanguino: Se realiza instalación de ceramica en baño cocina y lavadero.
5. Alino Angarita: Se iniaa instalacion de doctena electrica y Cajas electricas
6. Javier Carvajalino: Se inicia instalacion de doctena electrica y Cajas electricas

líder:

Powered by CamScanner

	7. Leonel Ramirez: Se inicia instalación de cubierta y cajas electricas
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RLL contratista — Insp Interventoria
10/10/2025	CTO 7943767 - 2025
Viernes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Concepcion
	Clima: Nublado
	1. Jose Leon: Se realiza instalacion de placa de concreto para tanque aereo, instalacion de puertas, ventanas y cristaleria
	2. Hernan Quintero: Se realiza instalacion de placa de concreto para tanque aereo, instalacion de puertas, ventanas y cristaleria
	3. Fabian Amaya: Se realiza instalacion de placa de concreto para tanque aereo, instalacion de puertas, ventanas y cristaleria
	4. Ramiro Hernandez: Se realiza instalacion de cajas electricas
	5. Harlone Quintero: Se realiza instalacion de placa de concreto para tanque aereo, instalacion de puertas, ventanas y cristaleria
	6. Jose Diaz: Se continua instalacion de cubierta
	7. Gustavo Portillo: Se continua instalacion de cubierta
	Municipio: El carmen
	Clima: Soleado
	1. Hermes Julio: Se realiza instalacion de placa de concreto para tanque aereo, instalacion de puertas y ventanas y cristaleria
	2. Elias Suarez: Se realiza instalacion de placa de concreto para tanque aereo, instalacion de puertas y ventanas y cristaleria
	3. Yuri Alvarado: Se realiza instalacion de placa de concreto para tanque aereo, instalacion de puertas y ventanas y cristaleria
	4. Humberto Alvarez: Se inicia fundido concreto 21 MPA para columnas

líder=

Powered by CamScanner

y relleno de contrapiso,
5. Luis Perez: Se realiza instalacion de ductoria y cajas electrical
6. Victor Rodriguez: Se realiza instalación de ductoria y cajas electrical

Municipio: San Calixto
Clima: Soleado
1. Anyi Urquijo: Se realiza instalacion de placa de concreto para tanque aereo, instalacion de puertas y ventanas, cristalera
2. Jose Quintero: Se inicia fundiendo concreto 21 MPA para columnas y relleno de contrapiso
3. Lucenith Delgado: Se realiza instalacion de ductoria y cajas electricas
4. Diorse Ramirez: Se inicia fundiendo concreto 21 MPA para columnas y relleno de contrapiso.
5. Daniel Suarez: Se inicia fundiendo concreto 21 MPA para columnas y relleno de contrapiso.

Municipio: Teorama
Clima: Soleado.
1. Juan Nuñez: Se realiza instalacion de placa de concreto para tanque aereo, instalacion de puertas y ventanas, cristalera
2. Jaime Ardila: Se realiza instalacion de placa de concreto, instalacion de puertas, ventanas y cristalera
3. Gustavo Ardila: Se realiza instalacion de placa de concreto puertas, ventanas y cristalera
4. Luis Sanjuan: Se realiza instalacion de placa de concreto, puertas, ventanas y cristalera
5. Alvaro Ansanta: Se realiza instalacion de puntos sanitarios y red hidraulica
6. Javier Carvajalino: Se realiza instalacion de puntos sanitarios y red hidraulica

líder=

Powered by CamScanner

	7. Leonel Ramirez: se realiza instalación de partes sanitarios y red hidraulica
	Adrian Villamizar R/L contratista
	Andres Parra Insp interventoria
11/10/2025 Sabado	CITO 7943767-2025 Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Cepeda Clima: Soleado 1. Jose Leon: Se realiza instalación de aparatos sanitarios, lavaplatos y lavamanos, tanque aereo y sistema septico. Casa terminada 2. Hernan Quintero: Se realiza instalación de aparatos sanitarios, lavaplatos y lavamanos, tanque aereo y sistema séptico. Casa terminada 3. Fabian Amaya: Se realiza instalación de aparatos sanitarios, lavaplatos y lavamanos, tanque aereo y sistema septico. Casa terminada 4. Ramiro Monsalvo: Se inicia instalación de partes sanitarios y red hidraulica 5. Marlene Quintero: se realiza instalación de aparatos sanitarios, lavaplatos y lavamanos, tanque aereo y sistema septico. casa terminada 6. Jose Diaz: Se realiza instalación de tuberia y cajas electricas 7. Gustavo Portillo: Se realiza instalación de tuberia y cajas electricas
	Municipio: El carmen Clima: Soleado. 1. Hermes Julio: Se realiza instalación de aparatos sanitarios, lavaplatos lavamanos, tanque aereo y sistema septico. casa terminada 2. Elver Suarez: Se inicia instalación de aparatos sanitarios 3. Lucila Avendaño: Se realiza instalación de aparatos sanitarios, lavaplatos lavamanos, tanque aereo y sistema septico. Casa terminada

Powered by CamScanner

4. Humberto Alvarez: Se continua fundiendo concreto 21 mpa Para columnas y relleno de contrapiso
5. Luis Perez: Se inicia instalacion de puntos sanitarios
6. Victor Izaguirre: Se inicia instalacion de puntos sanitarios

Municipio: San calixto
Clima: Soleado
1. Anyi orgullo: Se realiza instalacion de aparatos sanitarios, lavaplatos, lavamanos, tanque aereo y sistema septico. Casa terminada
2. Jose Quintero: Se continua fundiendo concreto 21 MPA Para columnas y relleno de contra piso
3. Lucenith Delgado: Se realiza instalacion de puntos sanitarios y red hidraulica
4. Dorse Ramirez: Se continua fundiendo concreto 21 MPA para columnas y relleno Para contra piso
5- Daniel Juarez: Se continuó fundiendo concreto 21 MPA Para columnas y relleno Para contra piso.

Municipio: Teorama
Clima: Soleado.
1. Ivon Nuñez: Se realiza instalacion de aparatos sanitarios, lavaplatos, lavamanos, tanque aereo y sistema septico. Casa terminada
2. Jaime Ardila: Se realiza instalacion de aparatos sanitarios, lavaplatos, lavamanos, tanque aereo y sistema Septico. Casa terminada
3. Gustavo Ardila: Se realiza instalacion de aparatos sanitarios, lavaplatos, lavamanos, tanque aereo y sistema septico. Casa terminada.
4. Luis Sanguino: Se realiza instalacion de aparatos sanitarios, lavaplatos, lavamanos, tanque aereo y sistema Septico. Casa terminada

líder:

Powered by CamScanner

	5. Alino Alegría: Se inicia instalación de tableta de cres:
	6. Jaime Carvajalino: Se inicia instalación de tableta de cres:
	7. Leonel Ramirez: Se inicia instalación de tableta de cr
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. interventoria
12/10/2025	Día no laboral
Domingo	
	Adrian Villamizar — Adrian Villamizar
	RIL contratista — Insp. interventoria
13/10/2025	Día no laboral
Lunes	
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp interventoria
14/10/2025	OTO 7943767-2025
Martes	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Convención
	Clima: Soleado
	1. Ramiro Manosalva: se continua instalación de Puntos sanitarios y red hidraulica
	2. Jose Diaz: se inica instalación de Puntos sanitarios y red hidraulica
	3. Gustavo Portillo: se inica instalación de Puntos sanitarios y red hidraulica
	Municipio: El Carmen

líder:

Powered by CamScanner

	Clima: Soleado
	1. Eleo Suarez: Se continua instalacion de aparatos sanitarios lavaplatos y lavamanos
	2. Humberto Alvarez: Se inicia fisurado y encuatre para uisa de amarre.
	3. Luis Perez: Se continua instalacion de tableta de sress
	4 Victor Rodriguez: Se inicia instalacion de tableta de sress
	Municipio: San Calixto
	1, Jose Quintero: Se inicia fisurado y encuatre para uisa de amarre
	2 Lucenth Delgado: Se realiza instalacion de tableta de gress y fisurado y esmaltado de Piso
	3. Diorse Ramirez: Se inicia fisurado y encuatre para uisa de amarre
	4 Daniel Suarez: Se inicia fisurado y encuatre para uisa de amarre
	Municipio: Tecarama
	Clima: Soleado
	1. Aliro Ansanta: se realiza fisurado y esmaltado de pisos y Pañete en el area del baño.
	2. Javier Carvalino: Se realiza fisurado y esmaltado de piso y Pañete en el area del baño.
	3. Leonel Ramirez: Se realiza Fisurado y esmaltado de Pisos y Pañete en area del baño.
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	El C contratista — Resp. Interventoria
15/10/2025	GTO 7043767-2025
Miercoles	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria

líder=

Powered by CamScanner

Oficiales y ayudantes

Municipio: Guanacaste

Clima: Nublado

1 Ramiro Manzanilla: Se inicia instalación de tableta de stress

2. Jose Diaz: Se continúa instalación de tableta de stress.

3. Gustavo Portillo: Se continua instalación de tableta de stress.

Municipio: El carmen

Clima: Nublado

1. Eles Suarez: Se inicia instalación de techos aereos y instalacion de centrales

2. Humberto Alvarez: Se continúa fisurado y encofre de acero para viga de amarre

3. Luis Perez: Se realiza fisurado y emmaltado de piso y Pañete en baño. y se inicia instalación de meson de la cocina

4. Victor Rodriguez: Se realiza fisurado y emmaltado de piso y Pañete en baño, y se inicia instalación de meson de la cocina

5. Onelio Castillo: Se inician localizacion y replanteo de vivienda

Municipio: San calixto

Clima: Nublado

1. Jose Quintero: Se continua fisurado de acero para viga de amarre

2. Lucenith Pelsado: Se realiza Pañete en el area del baño y se inicia instalacion de meson de la cocina

3. Diorse Ramirez: Se continua fisurado de acero para viga de amarre

4. Daniel Suarez: se continúa fisurado de acero para viga de amarre

5. Martha Rodriguez: se inicia localizacion y replanteo de vivienda.

Municipio: Teorama

Clima: Nublado

1. Alvio Arenas: Se realiza meson de la cocina e instalación de Ceramica en baño, cocina y lavadero

líder:

Powered by CamScanner

	2. Javier Carvajalino: Se realiza mesón de la cocina e instalación de cerámica en baño, lavadero y cocina
	3 Leonel Ramirez: Se realiza mesón de la cocina e instalación de cerámica en baño, lavadero y cocina
	4 Yorman Avallos: Se inicia localización y replanteo de cuerda
	Adrián Villamizar — Andres Parra
	PIL contratista — Insp. Interventoría
16/10/2025	OTO 7943767-2025
Jueves	Personal: Residente de obra, inspector de obra, INTector interventoría, oficiales y ayudantes
	Municipio: Concepción
	Clima: Soleado
	1. Ramiro Manalaka: Se continúa instalación de tableta de gres
	2. Jose Diaz: Se continua instalacion de tableta de gres
	3. Gustavo Portilla: Se continúa instalacion de tableta de gres
	Municipio: El Carmen
	Clima: Soleado
	1. Elvis Suarez: Se inicia instalación de sistema Sephra.
	2. Humberto Alvarez: Se inicia cuchillas para cubierta
	3. Luis Perez: Se continua mesón de la cocina y se inicia instalacion de ceramica en baño y lavadero
	4. Victor Rodriguez: Se continua mesón de la cocina y se inicia instalación de ceramica en baño y lavadero
	5. Oneilo Contreras: Se inicia excavacion manual para viga de cimentacion.
	Municipio: San calixto
	Clima: Soleado

Powered by CamScanner

1. Jose Quintero: Se inica instalacion de cuchillas para cubierta
2 Lucenith Delgado: Se continua mesón de la cocina y se inica instalacion de ceramica en baño y lavadero.
3. Diose Ramirez: Se inican cuchillas para cubierta
4. Daniel Suarez: Se inican cuchillas para cubierta
5. Martha Rodriguez: Se inica excavacion manual para viga de cimentacion

Municipio: Tecrama
Clima: Soleado
1. Mino Argenta: Se realiza instalacion de placa de concreto y Puertas y ventanas.
2 Jader Carvajalino: Se realiza instalacion de Placa de concreto y Puertas y ventanas.
3. Leonel Ramirez: Se realiza instalacion de placa de concreto y Puertas y ventanas
4 Yuman Ovallos: Se inica excavacion manual para viga de cimentacion

Adnon Villamizar
RIL Contratista

Andres Parra
Insp Interventoria

17/10/2025 OTO 7943767-2025
Viernes Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria oficiales y ayudantes

Municipio: Concepcion
Clima: Soleado
1 Ramiro Hurtado: Se continua instalacion de tableta de stress
2. Jule Diaz: Se inica frisado y enmaltado de pisos
3 Gustavo Portillo: Se inica frisado y enmaltado de piso

Municipio: El Carmen
Clima: Soleado

líder

Powered by CamScanner

1. Cleiscret. Se continúa instalación de sistema septico
2- Humberto Alvarez: Se continúan cuchillas para cubierta
3. Luis Perez: Se realiza instalación de ceramica en cocina y se realiza instalación de placa de concreto y Puertas y ventanas
4. Victor Rodriguez: Se realiza instalación de ceramica en baño, instalación de placa de concreto, Puertas y ventanas
5. Onelso Cañizares: Se continúa excavación manual para viga de cimentación.

Municipio: San calixto
Clima: Soleada
1. Jose Quintero: Se continúan cuchillas para cubierta
2. Lucenith Delgado: Se realiza instalación de ceramica en cocina, Placa de concreto, Puertas y ventanas
3. Diorse Ramirez: Se continúan cuchillas para cubierta
4. Daniel Suarez: Se continúan cuchillas para cubierta
5. Martina Rodriguez: Se continúa excavación manual para viga de cimentación

Municipio: Teorama
Clima: Soleado
1. Anno Arsenta: Se realiza instalación de aparatos sanitarios, lavaplatos y lavamanos, tanque aereo y cristalera de ventanas.
2. Javier Carvajalino: Se realiza instalación de aparatos sanitarios, lavaplatos y lavamanos, tanque aereo y cristalera de ventanas.
3. Leonel Ramirez. Se realiza instalación de aparatos sanitarios, lavaplatos, lavamanos, tanque aereo y cristalera de ventanas
4. Yorman Ovalle: Se continúa excavación manual para viga de cimentación

líder:

Powered by CamScanner

	Adrian Villamizar — Andres Parra
	R/L Cantalona — Insp. Interventoria
18/10/2025	CITO 7943767-2025
Sabado	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, obra civil, ayudantes
	Municipio: Cucuta
	Clima: Mañana Soleada
	1. Ramiro Maldonado: se inicia fisurado y amaitado de pisos
	2. Jose Diaz: Se continua fisurado y amaitado de piso
	3. Gustavo Portillo: Se continua fisurado y amaitado de pisos
	Municipio: El Zulia
	Clima: Mañana Soleada
	1. Eliel Suarez: Se realiza instalacion de sistema septico. Casa terminada
	2. Humberto Alvarez: Se inicia instalacion de cubierta
	3. Luis Perez: Se realiza instalacion de aparatos sanitarios, cristalera de centavos y sistema septico. Casa terminada
	4. Victor Rodriguez: se realiza instalacion de aparatos sanitarios, cristalera de centavos y sistema septico. Casa terminada
	5. Oneiro Contreras: Se inicia fisurado y fundida de acero para viga de cimentacion
	Municipio: San Calixto
	Clima: Mañana Soleada
	1. Jose Quintero: Se inicia instalacion de cubierta
	2. Lucenith Delgado: se realiza instalacion de aparatos sanitarios, cristalera de centavos y sistema septico. Casa terminada
	3. Darse Ramirez: Se inicia instalacion de cubierta
	4. Daniel Suarez: Se inicia instalacion de cubierta

líder

Powered by CamScanner

	5. Martha Rodriguez: se inica fisorado y fundida de acero para usa de amentación.
	Municipio: Tecrama
	1. Alirio Ansanta: Se realiza instalación de sutema septico casa terminada
	2. Javier Carvajalino: Se realiza instalación de sutema septico casa terminada
	3. Leonel Ramirez: Se realiza instalación de sutema septico casa terminada
	4. Yorman Ovallos: Se inica fondiendo y fisorado de acero para usa de amentación.
	Adnan Villamizar — Andres Parra
	RIC contratista — Insp interventoria
19/10/2025	CTO 7943769-2025
Domingo	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Dia no laboral
	Adnan Villamizar — Andres Parra
	RIC contratista — Insp interventoria
20/10/2025	CTO 7943769-2025
Lunes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria oficiales y ayudantes
	Municipio: Concencion
	Clima: Nublado
	1. Ramiro Hernandez: se continua fisorado y ermaltado de pisos

líder=

Powered by CamScanner

	2. Jose Diaz: Se inicia Pañete en el área del baño
	3. Gustavo Portillo: Se inicia Pañete en el area del baño
	Municipio: El carmen
	Clima: Nublado
	1. Humberto Navarro: Se continúa instalación de cubierta
	2. Onelio Canizares: Se continua fundiendo acero para viga de cimentación.
	Municipio: San calixto
	Clima: Nublado
	1. Jose Quintero: Se continúa instalación de cubierta
	2. Diorse Ramirez: Se continua instalación de cubierta
	3. Daniel Suarez: Se continua instalación de cubierta
	4. Martha Rodriguez: Se continúa fundida de acero para viga de amarre
	Municipio: Teorama
	Clima: Nublado
	1. Yarman Ovallos: Se continua fundiendo acero para viga de amarre
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	EIL contratista — Insp. interventoria
21/10/2025	CTTO 5443967-2025
Martes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Concepción
	Clima: Soleado
	1. Ramiro Manosalva: Se inicia pañete en el baño
	2. Jose Diaz: Se continua pañete en el baño
	3. Gustavo Portillo: Se continua pañete en el baño

líder:

Powered by CamScanner

	Municipio: San calixto
	Clima: Soleado
	1. Jose Quintero: Se inicia instalación de ductena y cajas electricas
	2. Diorse Ramirez: Se inicia instalación de ductena y cajas electricas
	3. Daniel Suarez: Se iniaa instalación de ductena y caja electricas
	4. Martha Rodrsuez: Se realiza desenastre de via de cimentación y se inicia mamparteria.
	Municipio: El carmen
	Clima: Soleado
	1. Humberto Navarro: Se inicia instalación de ductena y cajas electricas
	2. Onelio Cantillares: Se realiza desenastre de via de cimentación y se inicia mamparteria
	Municipio: Teorama
	Clima: Soleado
	1. Yarman Ovallos: Se continua fundiendo acero para viga de amarre
	Adrian Villamizar — RIC contratista
	Andres Parra — Insp. Interventoria
22/10/2025	ETU 7943767-2025
Miercoles	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, oficiales y ayudantes.
	Municipio: Convención.
	Clima: Soleado.

líder

Powered by CamScanner

	1. Ramiro Manosalva: Se continua Pañete en el baño
	2. Jose Diaz: Se inicia instalacion de meson de la cocina
	3. Gustavo Portillo: Se inicia instalacion de meson de la cocina
	Municipio: El carmen
	Clima: Soleado.
	1. Humberto Navarro: Se continua instalacion de cajas electricas
	2. Onelio Cañizares: Se continua mamposteria
	Municipio: San Calixto
	Clima: Soleado
	1. Jose Cantero: Se continua instalacion de cajas electricas
	2. Diorse Ramirez: Se continua instalacion de cajas electricas
	3. Daniel Soarez: Se continua instalacion de cajas electricas
	4. Maritza Rodriguez: Se continua Mamposteria
	Municipio: Teorama
	Clima: Soleado
	1. Yorman Ovallos: Se inicia cuchillas para cubierta
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIC contratista — Insp. Interventoria
23/6/2021 Jueves	OTO 7943767-2021
	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Cucuta
	Clima: Nublado
	1. Ramiro Manosalva: Se inicia instalacion de meson de la cocina
	2. Jose Diaz: Se continua instalacion de meson de la cocina
	3. Gustavo Portillo: Se continua instalacion de meson de la cocina

líder=

Powered by CamScanner

	Municipio: El carmen
	Clima: Nublado
	1: Humberto Navarro: Se inicia instalacion de ductena y cajas electricas
	2. Oneiso Cubillares: Se continua mamposteria
	Municipio; San calixto
	Clima: Nublado
	1. Jose Quintero: Se inicia instalacion de aparatos sanitarios y red hidraulica.
	2. Diorse Ramirez: Se inicia instalacion de Puntos Sanitarios y red hidraulica
	3. Daniel Suarez: Se inicia instalacion de puntos sanitarios y red hidraulica
	4. Martha Rodriguez: Se continua mamposteria
	Municipio: Teorama
	Clima: Nublado
	1. Yarman Caballo: Se continuan cuchillas para cubierta
	Adrian Villamizar — El contratista
	Andres Parra — Insp interventoria
24/10/2025	CTTO 7943767 - 2025
Viernes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria oficiales y ayudantes
	Municipio: concepcion
	Clima: Mañana Soleada y tarde nublada
	1. Ramiro Hernandez: Se continua meson de la cocina
	2. Jose Diaz: Se inicia instalacion de ceramica en baño, lavadero y cocina

líder:

Powered by CamScanner

	3. Gustavo Portillo: Se inicia instalacion de ceramica en baño, lavadero y cocina
	Municipio: El carmen
	Clima: Mañana soleada, tarde nublada
	1. Humberto Navarro: Se continúa instalacion de cajas electricas
	2. Oneyda Contreras: Se continúa mamposteria
	Municipio: San calixto
	Clima: Mañana soleada, tarde nublada
	1. Jose Quintero: Se inicia instalacion de tableta de gress
	2 Dorse Ramirez: Se Inicia instalacion de tableta de gress
	3. Daniel Suarez: Se inicia instalacion de tableta de gress
	4. Martha Rodriguez: Se continúa mamposteria
	Municipio: Teorama
	Clima: Mañana Soleada, tarde nublada
	1. Yorman Ovallos: Se inicia instalacion de cobierta
	Adrian Villamizar / Andres Parra
	RH contratista / Insp Interventoria
25/10/2021 Sabado	OTO 7943767-2021
	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria oficiales y ayudantes
	Municipio: Convencion
	Clima: Soleado
	1. Ramiro Mendoza: Se inicia instalacion de ceramica en baño, cocina y lavadero.
	2. Jose Diaz: Se continua instalacion de ceramica en cocina.
	3. Gustavo Portillo: Se continua instalacion de ceramica en cocina.

líder:

Powered by CamScanner

	4. Jaime Castilla: Se inicia localitacion y replanteo de vivienda
	Municipio: El carmen
	Clima: Soleado,
	1, Humberto Navarro: Se realiza instalacion de puntos sanitario y red hidraulico.
	2. Onelso Cañizares: Se inicia fundiendo concreto 21 MPA Para columnas y relleno Para contrapiso.
	3. Gladys moreles: Se inica localitacion y replanteo de vivienda
	4. Samuel Jaime: Se inica localitacion y replanteo de vivienda
	Municipio: San calixto
	Clima: Soleado
	1. Jose Quintero: Se continua instalacion de tableta de stress
	2. Diorse Ramirez: Se continua instalacion de tableta de stress
	3. Daniel Suarez: Se continua instalacion de tableta de stress
	4. Martha Rodriguez: Se inicia fundiendo concreto 21 MPA Para columnas y relleno Para contrapiso.
	5. Jhon Vera: Se inica localitacion y replanteo de vivienda
	Municipio: Teorama
	Clima: Soleado
	1. Hermanos Ovallos: Se continua instalacion de tableta.
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp Interventoria
26 Octubre Domingo	Dia no Laboral
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL interventoria — Insp. Interventoria líder

Powered by CamScanner

27/10/2025	CITO 7443767 - 2025
Lunes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoría oficial y ayudantes
	Municipio: Concepción
	Clima: Lluvioso
	1. Ramiro Monsalve: Se continúa instalación de cerámica en cocina
	2. Jose Diaz: Se realiza instalación de placa de concreto
	3. Gustavo Portillo: Se continúa instalación de cerámica en cocina
	4. Jaimes Castilla: Se inicia excavación manual para viga de cimentación.
	Municipio: El Carmen
	Clima: Nublado
	1. Humberto Navarro: Se inicia instalación de tableta de grees
	2. Onelio Contreras: Se continúa fundiendo concreto 21 MPA para columnas y relleno para contrapiso
	3. Gladys Meneses: Se inicia excavación manual para viga de cimentac
	4. Samuel Jaime: Se inicia excavación manual para viga de cimentac
	Municipio: Sancalixto
	Clima: Lluvioso
	1. Jose Quintero: Se realiza fisurado y esmaltado de pisos
	2. Diose Ramirez: Se realiza fisurado y esmaltado de pisos
	3. Daniel Suarez: Se realiza fisurado y esmaltado de pisos
	4. Martha Rodriguez: Se continúa fundiendo columnas 21 MPA para columnas y relleno de contrapiso.
	5. John Vera: Se inicia excavación manual para viga de cimentac
	Municipio: Teorama
	Clima: Lluvioso
	1. Yarmon Cuellar: Se continúa instalación de cubierta

líder

Powered by CamScanner

	Adrian Villamizar — Andres Parra ELL contratista — Insp interventoria
28/10/2025 Martes	GTRD 7943767-2025 Personal: Residente de obra, Inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Concepción Clima: Nublado 1. Ramiro Manobalda: se realiza instalación de placa de concreto 2. Jose Diaz: Se realiza instalación de puertas y ventanas 3. Gustavo Portillo: Se realiza instalación de placa de concreto. 4. Jaimer Cortilla: Se continúa excavación manual para viga de cimentacion
	Municipio: El carmen Clima: Nublado 1. Humberto Navarro: Se continúa instalación de tableta de press. 2. Onelso Cañizares: Se inicia fisurado, enrasfre y fundida para viga de amarre. 3. Gladys Meneses: Se continúa excavación manual para viga de cimentación 4. Samoel Jaime: Se continua excavación manual para viga de cimentacion.
	Municipio: San Calixto Clima: Nublado 1. Jose Quintero: Se inicia pañete en el baño 2. Diorge Ramirez: Se inicia pañete en el baño

líder

Powered by CamScanner

	3. Daniel Suarez: Se inicia Panete en baño
	4. Martina Rodriguez: Se inicia fisurado, encofre y fundida Para Viga de amarre
	5- Jhon Vera: Se continúa excavación manual para viga de cimentacion
	Horario: Tesarma
	Clima: Nublado
	1. Yorman Ayallos: se inicia instalacion de ductera electrica
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	DIL - contratista — Insp. Interventoria
20/10/2025	OTO 7943767 - 2025
Miercoles	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, inspector interventoria oficiales, ayudantes
	Horario: Convencion
	Clima: Soleado
	1. Ramiro Manosalva: se realiza instalacion de puertas y ventanas
	2. Jose Diaz: se realiza instalacion de aparatos sanitarios, lavaplato y lavamanos
	3 Gustavo Portillo: Se realiza instalacion de Puertas y ventanas
	4. Jaimer Cavilla: Se inicia fisurado de acero para viga de cimentacion
	Horario: El Carmen
	Clima: Soleado
	1. Humberto Navarro: Se inicia fisurado y emaltado de pisos
	2. Ordoz cañizares: Se continua fundida para viga de amarre
	3. Gladys Herrera: Se inicia fisurado de acero para viga de cimentacion.
	4. Samuel Jaime: Se inicia fisurado de acero para viga de cimentacion.

líder

Powered by CamScanner

	Municipio: San Calixto
	Clima: Soleado
	1. Jose Quintero: Se continua Pañete en el baño.
	2. Diorse Ramirez: Se continua Pañete en baño.
	3. Daniel Suarez: Se continua Pañete en baño
	4. Martha Rodriguez: Se continua fundida Para viga de amarre
	8. Jhon Yerar: Se inica fisurado, encofre y fundida para viga de cimentación
	Municipio: Teorama
	Clima: Soleada
	1. Yorman Ovallos: Se continúa instalación de cuctera electrica
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RH contratista — Insp. Interventoria
30/10/2025 Jueves	CTO 7943767-2025
	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales, ayudantes
	Municipio: convención
	Clima: Soleado
	1. Ramiro Manosalva: Se inica instalacion sanitaria, lavaplatos y lavamanos.
	2. Jose Diaz: Se realiza instalacion de tanque aereo y cristalera de ventanal
	3. Gustavo Portillo: Se realiza instalacion de tanque aereo y Cristalera de ventanal
	4. Jairner Carrillo: Se continua fisurado de acero para viga de cimentacion.

líder

Powered by CamScanner

Municipio: El carmen
Clima: Soleado
1. Humberto Navarro: Se continúa figurado y esmaltado de piso
2. Anolvo Cañizares: Se inician cuchillas para asterma
3. Gladys meneses: Se inicia fundida para viga de cimentación
4. Samuel Jaime: Se inicia fundida para viga de cimentación

Municipio: San calixto
1. Jose Cantero: Se inicia instalación de mesón de la cocina
2. Diorse Ramirez: Se inicia instalación de mesón de la cocina
3. Daniel Suarez: Se inicia instalación de mesón de la cocina
4. Martha Rodriguez: Se inician cuchillas para cubierta
5. Jhon Vera: Se continua fundida para viga de cimentación

Municipio: Teorama
Clima: Soleado
1. Yarman castro: Se realiza instalación de cajas electricas

Adrian Villamizar
RIC contratista

Andres Parra
Insp interventoria

31/10/2025
Werner

OTO 7043767-2025
personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria oficiales y ayudantes

Municipio: Concepción
Clima: Soleado
1. Ramiro Mendoza: Se continúa instalación de lavamanos y lavaplatos
2. Jose Diaz: Se realiza instalación de tanque aereo, cristales de ventana
3. Gustavo Portillo: Se inicia instalacion de sistema septico.
4. Jaimes castillo: Se inicia fundida de viga de cimentación

líder

Powered by CamScanner

	Municipio: El carmen
	Clima: Soleado
	1. Humberto Navarro: Se inicia pañete en baño
	2 Urnello Cantalel: Se continúa cuchillas para columnas
	3. Gladys Meneses: Se continua fundida para uso de cimentación
	4. Samuel Jaime: Se continua fundida para uso de cimentación
	Municipio: San Calixto
	1 Jose Quintero: Se continua meson de la cocina y se inica ceramica en baño y lavadero
	2. Diorse Ramirez: Se realiza meson de la cocina
	3. Daniel Suarez: Se realiza meson de la cocina
	4. Martha Rodriguez: Se continua cuchillas para cubierta
	5- Jhon Vera: Se realiza desencofre y se inica mampostera
	Municipio: Teorama
	Clima: Soleado
	1. Yorman Cuellar: Se realiza instalacion de puntos sanitarios y red hidraulica
	Adrian Villamizar — El contratista
	Andres Parra — Insp. Interventoria
01/11/2025 Sabado	Cto 7943767 - 2025
	Personal: Residente de obra, Inspector interventoria, inspector de obra, oficiales y ayudantes
	Municipio: Concepcion
	Clima: Mañana nublada
	1. Ramiro Manosalva: Se realiza instalacion de tanque cerco
	2. Jose Diaz: Se inica instalacion de sistema septico.

3 Gustavo Padilla: Se continua instalación de sistema septico.
4 Jaime Castilla: Se continua fundida para viga de cimentación

Municipio: El carmen
Clima: Mañana Soleada
1. Humberto Navarro: Se continua Pañete en baño.
2. Onelio Cantarel: Se inicia instalación de cubierta
3. Gladys meneses: Se continua fundida para viga de cimentación
4. Samuel Jaime: Se continua fundida para viga de cimentación

Municipio: San alvito
Clima: Mañana nublada
1. Jose Quintero: Se continua instalación de ceramica en cocina
2 Dorse Ramirez: Se inicia instalación de ceramica en baño, lavadero y cocina
3. Daniel Suarez: Se inicia instalación de ceramica en baño, lavadero, cocina
4. Martha Rodriguez: Se inicia instalación de cubierta
5. Jhon Vera: Se continua mampostera
6. Jaider Perez: Se inicia localización y replanteo de vivienda.
7. Aura cartilla: Se inicia localización y replanteo de vivienda

Municipio: Tierrama
Clima: Mañana Soleada
1. Yorman Ovallos: Se inicia instalación de tableta de stress
2. Gabriel Quintero: Se inicia localización y replanteo de vivienda
3. Jesus Ortiz: Se inicia localización y replanteo de vivienda
4. Oscar Angarita: Se inicia localización y replanteo de vivienda
5. Sandra Suarez: Se inicia localización y replanteo de vivienda

Adrian Villamizar
RLC contratista

Andres Parra
Insp interventoria

líder

02/11/2021 Domingo	Dia no laboral
	Adrian Villamizar — Andres Interventor
	EU contratista — Insp Interventoria
03/11/2021 Lunes	Dia no laboral
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	EU contratista — Insp. Interventoria
04/11/2021 Martes	CITO 7913767 - 2021
	Personal: Residente de obra, Inspector interventoria, Inspector de obra, oficiales y ayudantes
	Municipio: Convención
	Clima: Soleado
	1. Ramiro Manosalva: Se realiza instalacion de cortalera de ventana
	2. Jose Diaz: Se continúa instalacion de sistema septico.
	3. Gustavo Patillo: Se continua instalacion de sistema Septico
	4. Jaime Castilla: Se continua fundida para viga de cimentacion
	Municipio: El carmen
	Clima: Soleado
	1. Humberto Navarro: Se inicia instalacion de meson de la cocina.
	2. Onelvo Contreras: Se continúa instalacion de ventana
	3. Gladys Meneses: Se realiza desencofre para viga de cimentacion
	4 Samuel Jaime: Se realiza desencofre para viga de cimentacion
	Municipio: San calixto

	Clima: Soleado
	1. Jose Quintero: Se realiza instalacion de placa de concreto
	2. Diorse Ramirez: Se continua instalacion de ceramica en cocina
	3. Daniel Suarez: Se continua instalacion de ceramica en cocina
	4. Hailing Rodriguez: Se continua instalacion de cubierta
	5. Jhon Vera: Se continua mampostenia
	6. Jaider Perez: Se continua localizacion y replanteo de vivienda
	7. Ana castilla: Se continua localizacion y replanteo de vivienda
	Municipio: Tierralta
	Clima: Soleado
	1. Yorman ovalles: Se continua instalacion de tableta de grees
	2. Gabriel Quintero: Se continua localizacion y replanteo de vivienda
	3. Jairo Ortiz: Se continua localizacion y replanteo de vivienda
	4. Oscar Argenta: Se continua localizacion y replanteo de vivienda
	5. Sandra Suarez: Se continua localizacion y replanteo de vivienda
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp Interventoria
05/11/2025	GTO 7A1867-2025
Miercoles	Personal: Residente de obra, inspector de obra, Inspector interventoria
	obrero y ayudantes
	Municipio: Cienaga
	Clima: Nublado
	1. Ramiro Maradiaga: Se inicia instalacion de sistema septico
	2. Jose Diaz: Se continua instalacion de sistema septico
	3. Gustavo Portillo: Se continua instalacion de sistema septico
	4. Jaimes castilla: Se realiza levantamiento de uso de cimentacion
	Municipio: El carmen

lider

Clima: Nublado:
1. Humberto Navarro: Se continúa mejora de la cocina
2. Onelio Cañizares: Se continúa instalación de cobertela
3. Gladys Meneses: Se inica Pega de mampostera
4. Samuel Jaime: Se inica pega de mampostera



Municipio: San Calixto
Clima: Nublado
1. Jose Quintero: Se realiza instalación de Portal y ventanal
2. Dorse Ramirez: Se realiza instalación de placa de concreto
3. Daniel Suarez: Se realiza instalación de placa de concreto
4. Martha Rodriguez: Se inica instalación de doctera electrica
5. Jhon Vera: Se continua mampostera
6. Jaider Perez: Se inica excavación manual para viga de cimentacion.
7. Ana Castilla: Se inica excavación manual para viga de cimentacion

Municipio: Teorama
Clima: Soleado
1. Yorman Ovallos: Se continúa instalacion de tableta de yeso.
2. Gabriel Quintero: Se inica excavación manual para viga de cimentacion.
3. Jesus ortiz: Se inica excavación manual para viga de cimentacion
4. Oscar Ansonta: Se inica excavacion manual para viga de cimentacion
5. Sandra Suarez: Se inica excavación manual para viga de cimentacion
6. Teresa Guerrero: Se inica localitacion y replanteo de vivienda

Adrian Villamizar
RH. contratista

Andres Parra
Insp. Interventoria
lider

06/11/2025	Ctto 7043767-2025
Jueves	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector intercultural, Oficiales y ayudantes
	Municipio: Concepcion
	Clima: Soleado.
	1. Ramiro Manolaki: Se continuó instalacion de sistema septico.
	2. Jose Diaz: Se continuó instalacion de sistema septico.
	3. Gilberto Portillo: Se continuó instalacion de sistema septico.
	4. Jaime Castilla: Se inicia Pega de mamposteria
	Municipio: El Carmen
	Clima: Soleado
	1. Humberto Alcaraz: Se continuó medición de la cocina
	2. Onelio Contreras: Se continuó instalacion de cubierta
	3. Gladys Morales: Se continuó Pega de mamposteria
	4. Samuel Jaime: Se continuó Pega de mamposteria
	Municipio: San Carlito
	Clima: Soleado
	1. Jose Quintero: Se realiza instalacion de aparatos sanitarios, accesorios y lavamanos
	2. Jorge Ramirez: Se realiza instalacion de puertas y ventanas
	3. Daniel Suarez: Se realiza instalacion de puertas y ventanas
	4. Martha Rodriguez: Se continuó instalacion de doctena electrica
	5. Jhon Vera: Se continuó mamposteria
	6. Javier Perez: Se continua excavacion manual para cimentacion
	7. Laura Castilla: Se continúa excavacion manual para cimentacion
	Municipio: Teorama
	Clima: Soleado
	1. Yurman Ovallos: Se inicia instalacion de ceramica en baño
	2. Coronel Quintero: Se continuó excavacion manual para cimentacion

	3. Jesus Ortiz: Se continúa excavación manual para cimentación
	4 Oscar Ansorita: Se continúa excavación manual para cimentación
	5. Sandra Suarez: Se continua excavación manual para cimentación
	6 Teresa Guerrero: Se continúa localizacion y replanteo de vivienda
	 
	Adrian Villamizar — Ing. Residente
	Elc. Contratista — Insp. Intervertoria
07/11/2025	Dia 7943767 - 2025
Viernes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector intervertoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Concepción
	1. Ramiro Manosalva: Se continúa instalación de sistema septico.
	2. Jose Diaz: Se continúa instalación de sistema septico.
	3. Gustavo Portillo: Se continua instalación de sistema septico
	4. Jaimes Castilla: Se continua Pega de mamposteria
	Municipio: El Carmen
	Clima: Nublado
	1. Humberto Alvarez: Se inica instalación de ceramica en baños
	2. Anelso Carrabares: Se continúa instalación de cubierta
	3. Gladys meneses: Se continua Pega de mamposteria
	4. Samuel Jaimes: Se continua Pega de mamposteria
	Municipio: San Calixto
	Clima: Nublado
	1. Jose Quintero: Se realiza instalación de tanque aereo y cristalera de ventana
	2 Diose Ramirez: Se realiza instalación de aparatos sanitarios
	3. Daniel Suarez: Se realiza instalación de aparatos sanitarios

	4. Martha Rodriguez: Se inica instalacion de cajal electrical
	5. Juan Vera: Se continua mampostera
	6. Jaider Perez: Se inica fisurado de acero para viga de cimentacion
	7. Dora Castilla: Se inica fisurado de acero para viga de cimentación
	Municipio: Teorama
	Clima: Nublado
	1. Yormen Ascillul: Se continua instalacion de ceramica en baño
	2. Gabriel Cantero: Se inica fisurado de acero para viga de cimentacion
	3 Jesus ortiz: Se inica fisurado de acero para viga de cimentacion
	4. Oscar Arsanta: Se inica fisurado de acero para viga de cimentacion
	5. Sandra Suarez: Se inica fisurado de acero para viga de cimentación
	6. Teresa Guerrero: Se continua localizacion y replanteo de vivienda
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RL contratista — Insp. Interventoria
08/11/2025	OTD 7943767-2025
Sabado	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria oficial y ayudantes
	Municipio: Convencion
	Clima: Mañana Soleado
	1. Ramiro Manosalva: Se continua instalacion de sistema septico
	2. Jose Diaz: Se continua instalacion de sistema septico.
	3. Gustavo Portilla: Se continua instalacion de sistema septico
	4. Jaimar Castilla: Se inica fundiendo columnas y columnetas
	Municipio: El Carmen
	Clima: Mañana Soleado
	1. Humberto Alvarez: Se continua instalacion de ceramica en baño
	2. Onelso Contreras: Se inicia instalacion de ductena electrica

y calor electrical
3. Gladys Heredes: Se continúa pega de mampostería
4. Samuel Jaime: Se continua pega de mampostería

Municipio: San calixto
Clima: Mañana Soleada.
1, Jose Quintero: Se inicia instalación de sistema septico.
2. Dorse Ramirez: Se inicia instalación de lavaplatos y lavamanos
3. Daniel Suarez: Se realiza instalación de lavaplatos, lavamanos, tanque aerea y cristalera de ventanas y se inicia instalación de sistema septico.
4. Martha Rodriguez: Se realiza instalación de puntos sanitarios, tableta de grass, Poñete en baño, instalación de ceramica, placa de concreto y aparatos sanitarios
5. Jhon Vera: Se continúa mamposteria
6. Jaider Perez: Se continúa fisurado de acero para viga de cimentación.
7. Ana Carolina: Se continua fisurado de acero para viga de cimentacion

Municipio: Teorama
Clima: Mañana Soleada
1. Yaman Ovalle: Se continua instalación de ceramica en lavadero y cocina
2 Fabnel Quintero: Se continúa fisurado de acero para viga de cimentacion
3. Jesus Ortiz: Se continua fisurado de acero para viga de cimentacion.
4. Oscar Arsenio: Se realiza fundida y desencofre para viga de cimentacion
5. Sandra Suarez: Se realiza fundida y desencofre para viga de cimentacion

	6. Teresa Guerrero: Se realiza excavación manual para viga de cimentación
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	R/L contratista — Insp. interventoria
04/11/2025 Domingo	Día no laboral
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	R/L contratista — Insp. Interventoria
10/11/2025 Lunes	CTO 7443767 - 2025
	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio Concepción
	Clima: Día soleado
	1. Ramiro Manotatua: Se realiza instalación de sistema septico. casa terminada
	2. Jose Diaz: Se continúa instalación de sistema septico.
	3. Gustavo Portillo: Se continúa instalación de sistema septico.
	4. Jaimes Cortilla: Se continúa fundiendo columnas y columnetas
	Municipio: El Carmen
	Clima: Día Soleado
	1. Humberto Alvarez: Se continúa instalación de ceramica en baño y bracadera
	2. Onelio Contreras: Se continúa instalación de salas electrica
	3. Gladys Heredes: Se continúa pega de mamposteria
	4. Samuel Jaimes: Se continua pega de mamposteria

Municipio: San Caluto
Clima: Dra soleado
1. Jose Quintero: Se realita instalacion de sistema septico. Casa terminada
2 Diose Ramirez: Se continia instalacion de lavaplatol y lavamanol
3. Daniel Suarez: Se realita instalacion de sistema septico. Casa terminada
4. Martha Rodrigues: Se realita instalacion de lavaplatol lavamand, tanque aereo, cristalena de centanel y sistema septico. Casa terminada
5. Jhon vera: Se continua mamposteria
6. Jaider Perez: Se inica fisurado y delencastre de viga de amentacion
7. Aura Castilla: Se inica fisurado y delencastre de viga de amentacion

Municipio: Teorama.
Clima: Dra soleado
1. Yorman Ovallos: Se realita instalacion de tanque aereo. y Placa de concreto.
2. Gabinel Quintero: Se inica fundida y delencastre de viga de amentacion.
2 Jesus Ortiz: Se inica fundida y delencastre de viga de amentacion.
4. Oscar Angarita: Se inica pesa de mamposteria
5. Sandra Suarez: Se inicap pesa de mamposteria
6. Tereia Guerrero: se realita fisurado, fundida y delencastre Para viga de amentacion

Adrian Villamizar
RIL contratista

Andres Parra
Insp. interventoria

líder

11/11/2025	CPD-7943767-2025
Martes	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, Oficiales y ayudantes
	Municipio: Concepción
	Clima: Dia nublado
	1. Jose Diaz: Se continua instalación de sistema septico.
	2. Gustavo Portillo: Se continua instalación de sistema septico.
	3. Jaimar Castilla: Se realiza figurado de acero, encofre y fundida para viga de amarre
	Municipio: El carmen
	Clima: Dia soleado
	1. Humberto Alvarez: Se realiza instalación de placa de concreto para tanque aereo.
	2. Orelio Cañizares: Se inica instalacion de portal sanitario y red hidraulica
	3. Gladys Meneses: Se continua Pega de mampostena
	4. Samuel Jaime: Se continua pega de mampostena
	Municipio: San calixto
	Clima: Dia nublado
	1. Darise Ramirez: Se continua instalación de bajantes y lavamanos
	2. Jhon Vera: Se continua mampostena
	3. Jaider Peret: Se continua desencofre de viga de cimentacion
	4. Nixa Castilla: Se continua desencofre de viga de cimentacion
	Municipio: Teorama:
	Clima: Dia nublado.
	1. Yaman Ovallos: Se inica instalación de puertas y ventanas
	2. Gabriel Quintero: Se continua desencofre de viga de cimentación
	3. Jesus Ortiz: Se continua desencofre de viga de cimentación
	4. Oscar Angarita: Se continua pega de mampostena

	5. Sandra Suarez: Se continua Pesa de mampostena
	6. Teresa Guerrero: Se inicia Pesa de mampostena
	Adrian Villamitar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. Interventoria
12/11/2025	CTO 7943767 - 2025
Miercoles	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, ayudantes y oficiales
	Municipio: Convencion
	Clima: Mañana soleada, tarde nublada
	1. Jose Diaz: Se continua instalacion de sistema septico.
	2. Gustavo Portillo: Se continua instalacion de sistema septico
	3. Jaimer Carrillo: Se inician cuchillas para cubierta
	Municipio: El carmen
	Clima: Mañana Soleada, tarde nublada
	1. Humberto Alvarez: Se realiza instalacion de puerta y ventanas
	2. Onelio Cañizares: Se continua instalacion de red hidraulica
	3. Abdul Heneses: Se continua mampostena
	4. Samuel Jaime: Se continua Pesa de mampostena
	Municipio: San Calixto
	Clima: Mañana Soleada, tarde nublada
	1. Diose Ramirez: Se inica instalacion de tanque aereo
	2. Jhon Vera: Se inica fundiendo columnas y columnetas
	3. Jaider Peret: Se inicia pesa de mampostena
	4. Adrian Castilla: Se inicia Pesa de mampostena
	Municipio: Teorama
	Clima: Mañana soleada, tarde nublada

1. Yaman Avalos: Se continúa instalación de Perfal cuentanar
2. Gabriel Quintero: Se inicia Pesa de mampostería
3. Jesus Ortiz: Se inicia Pesa de mampostería
4. Oscar Argaita: Se continúa Pesa de mampostería
5. Sandra Suarez: Se continua Pesa de mampostería
6. Teresa Guerrero: Se continua Pesa de mampostería

Adrian Villamizar
Ppl contratista

Andres Parra
Insp interventoria

13/11/2025
Jueves



OTD 7443767 - 2025
Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria, oficiales y ayudantes

Municipio: Convención
Clima: Dia Soleado
1. Jose Diaz: Se continúa instalación de sistema septico.
2. Gustavo Portillo: Se continúa instalación de sistema Septico.
3. Jaimar castilla: Se realiza instalación de viga canta y correal metalicos

Municipio: el carmen
Clima: Dia Soleado
1. Humberto Alvarez: se inicia instalación de aparatos sanitarios
2. Onelio Cañizares: Se inica instalación de tableta de sifers
3. Gladys Meneses: Se continua mampostería
4. Samuel Jaime: Se continua mampostería

Municipio: San calixto:
Clima: Dia Soleado
1. Diose Ramirez: Se continúa instalación de tanque aereo
2. Jhon Vera: Se continua fundiendo columnas y columnetas

líder

	3. Javier Perez: Se continúa pega de mampostería
	4. Ana Castilla: Se continua pega de mampostería
	Municipio: Teorama
	Clima: Dia soleado
	1. Yorman Ovallos: Se inicia instalacion de aparatos sanitarios
	2. Gabriel Quintero. Se continua Pega de mampostería
	3. Jesus Ortiz: Se continua Pega de mampostería
	4. Oscar Angarita: Se continua Pega de mampostería
	5. Sandra Suarez: Se continua Pega de mampostería
	6. Tereza Guerrero: Se continua Pega de mampostería
	 
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	DIL contratista — Insp. interventoria
14/11/2025	CTTO 7943767-2025
Viernes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: convención
	Clima: Dia soleado.
	1. Jose Diaz: Se continua instalación de sistema septico.
	2. Gustavo Portillo: Se continua sistema septico.
	3. Jaimer castilla: Se inica instalación de cubierta
	Municipio: El carmen.
	Clima: Dia Sabado
	1. Humberto Suarez: Se continua instalación de aparatos Sanitarios
	2 Oneiro Canitarez: Se continúa instalación de tableta de gress.
	3 Oficiales Meneses: Se continua mamposteria

4. Samuel Jaime: Se continúa mampostería

Municipio: San Calixto:
Clima: Día Soleado
1. Diomse Ramirez: Se continúa instalación de tubería aereo
2. Jhon Vera: Se inicia fisuerdo de acero para viga de amarre
3. Jader Perez: Se continua Pega de mampostería
4. Ana Castilla: Se continua Pega de mampostería

Municipio: Teorama
Clima: Día soleado.
1. Yaiman Ovalles: Se continúa instalación de aparatos sanitarios
2. Gabriel Quintero: Se continúa Pega de mampostería
3. Jesus Ortiz: Se continúa Pega de mampostería
4. Oscar Arenas: Se inicia fundiendo columnas y columnetas
5. Sandra Suarez: Se inicia fundiendo columnas y columnetas.
6. Teresa Guerrero: Se inicia fundiendo columnas y columnetas.

Adrian Villamizar
R/L contratista

Andres Parra
Insp. interventoria

15/11/2025
Sabado

OTO 7943767 - 2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes

Municipio: Convención
Clima: Mañana nublado
1. Joe Diaz: Se continua Sistema septico
2. Gustavo Portillo: Se continúa Sistema septico
3. Jaimer castilla: Se realiza instalación de acometida electrica y cabal electrica

Municipio: El carmen
Clima: Mañana Nublada
1. Humberto Alvarez: Se realiza instalación de lavaplatos y lavamanos.
2. Onelvis Cañizares: Se realiza fisurado y emplantado de piso.
3. Gladys Meneleo: Se construía mampostería
4. Samuel Jaime: Se construía mampostería

Municipio: San Calixto
Clima: Mañana Nublada
1. Diose Ramirez: Se inicia instalación de puertas y ventanas
2. Jhon Vera: Se construía fisurado de acero para uso de amarre.
3. Isidro Perez: Se construía pesa de mampostería
4. Ara Castilla: Se construía pesa de mampostería

Municipio: Teorama
Clima: Mañana Soleada.
1. Yorman Ovallos: Se realiza instalación de lavaplatos y lavamanos
2. Gabriel Quintero: Se construía pesa de mampostería
3. Jesus Ortiz: Se construía pesa de mampostería
4. Oscar Ansanta Se realiza fisurado de acero para uso de amarre.
5. Sandra Suarez: Se realiza fisurado de acero para uso de amarre
6. Jerda Guerrero: Se realiza fisurado de acero para uso de amarre

Adrian Villamizar
RIL contratista

Andres Parra
Insp. interventoría
líder

16/11/2025	Dia no Laboral
Domingo	
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. Interventoria
17/11/2025	Dia no laboral
Lunes	
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. Interventoria
18/11/2025	Otro Si N°3 - 2025
Martes	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, inspector interventoria oficiales y ayudantes.
	Municipio: Convención
	Clima: Dia Soleado
	1. Jose Diaz: Se continúa instalación de sistema septico.
	2. Gustavo Portillo: Se continúa instalación de sistema septico.
	3. Jaime Castilla: Se realiza instalación de punto sanitario y red hidraulica.
	4. Alber Pallares: Se realiza localización y replanteo de viviendo
	Municipio: El carmen
	Clima: Dia soleado
	1. Humberto Alvarez: Se inicia instalación de tanque septico
	2. Onelio Contreras: Se realiza pañete en baño y se inicia meson de cocina
	3. Gladys meneses: Se inicia fundido columnas y columnetas
	4 Samuel Jaime: Se inicia fundiendo columnas y columnetas
	Municipio: San Calixto

	Clima: Dia soleado
	1. Jorge Ramirez: Se continua instalacion de puertas y ventanas
	2. Jhon Vera: Se realiza encofre y fundida para viga de amarre y se inician cuchillas
	3. Jaider Perez: Se continua mamposteria
	4. Ara Castilla: Se continua mamposteria
	Municipio: Tocaima
	Clima: Dia soleado
	1. Yaman Ovalles: Se inicia instalacion de tanque aereo
	2. Gabriel Quintero: Se continua mamposteria
	3. Jesus Ortiz: Se continua mamposteria
	4. Oscar Angarita: Se realiza encofre y fundida para viga de amarre
	5. Sandra Suarez: Se realiza encofre y fundida para viga de amarre
	6. Tereza Guerrero: se realiza encofre y fundida para viga de amarre
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	PIL contratista — Insp. interventoria
12/11/2025	OTO 7943767 - 2025
Miercoles	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Concencion
	Clima: Dia nublado
	1. Jose Diaz: Se continua instalacion de sistema septico.
	2. Gustavo Pantillo: Se continua instalacion de sistema septico
	3. Jaimer Carrillo: Se realiza instalacion de tableta de gres y

Descarte y esmaltado de PVC

4. Yuber Pallares: Se inicia excavación manual para vaciado de cimentación

Municipio: El Carmen

Clima: Dia nublado.

1 Humberto Alvarez: Se continúa instalación de tanque aereo

2 Anello Cañizares: Se realiza medición de la cocina y se inicia instalacion de ceramica

3. Gladys Herrera: Se continúa fundiendo columnas y columnetas

4 Samuel Gomez: Se continua fundiendo columnas y columnetas

Municipio: San calixto

Clima: Dia nublado

1. Diosse Ramirez: Se inicia instalación de aparatos Sanitarios, lavaplatos y lavamanos

2. Jhon vera: Se continúa instalación de cuchillas

3. Valder Perez: Se inicia fundiendo columnas y columnetas

4 Rosa castilla: Se inicia fundiendo Columnas y columnetas

Municipio: Teorama

Clima: Dia nublado

1. Yarman Ovallos: Se realiza instalación de tanque aereo

2. Gabriel Quintero: Se continúa mampostería

3. Jesus ortiz: Se inicia fundiendo columnas y columnetas

4. oscar Arsanta: Se inician cuchillas para cubierta

5. Sandra Suarez: Se inician cuchillas para cubierta

6. Teresa Guerrero: Se inician cuchillas para cubierta

Adrian Villamizar
RIL contratista

Andres Parra
Insp. interventoria

20/11/2017	Ctto 7945761 - 2017
Jueves	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Concepción
	Clima: Dia Soleado
	1. Se continua instalacion de sistema septico.
	2. Gustavo Portillo Se continua instalacion de sistema septico
	3. Jaimer Castilla: Se realiza Pañete en el area del baño y mesón de la cocina.
	4. Huber Pallares: Se continua excavacion manual para viga de cimentacion
	Municipio: El Carmen
	Clima: Dia Soleado
	1. Humberto Alarcet: Se realiza instalacion de cortalena de entrada y se inicia instalacion de sistema septico.
	2. Oneyo Sanitarios: Se realiza instalacion de ceramica y Placa de concreto para tanque aereo
	3. Gladys Narvaez: Se realiza figurado de acero para viga de amarre
	4. Samuel Jaimes: Se realiza figurado de acero para viga de amarre
	Municipio: San Calixto:
	Clima: Dia Soleado
	1. Diorse Ramirez: Se continua instalacion de basabetal y buzamos
	2. Jhon Vera: Se realiza instalacion de viga canta y correa metalica y se inicia instalacion de cubierta
	3. Jaider Perez: Se continua fundiendo columnas y columneta
	4. Aura Castilla. Se continua fundiendo columnas y columneta.

	Municipio: Teorama
	Clima: Dia Soleado
	1. Yuman Ovalle: Se realiza instalación de cubierta de ventanal y se inicia instalación de sistema septico.
	2. Gabriel Quintero: se inicia fundiendo columnas y columnetas
	3. Jesus ortiz: Se continua fundiendo columnas y columnetas
	4. Oscar Argonta: Se realiza viga corta y correas metalicas y se inicia instalación de cubierta.
	5. Sandra Suarez: Se realiza viga corta y correas metalicas y se inicia instalación de cubierta
	6. Teresa Guerrero: Se realiza viga corta y correas metalicas y se inicia instalación de cubierta
	Adnan Villamizar — RIC contratista
	Andres Parra — Insp. interventoria
21/11/2025	CTO 7943767-2025
Viernes	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria oficiales y ayudantes
	Municipio: Convencion
	Clima: Dia soleado
	1. Jose Diaz: Se continua instalación de sistema septico.
	2. Gustavo Pontillo: Se continua instalación de sistema septico
	3. Jaimar Castilla: Se realiza instalación de ceramica en baño, kiadero y cocina, instalación de placa de concreto y Rieles y ventanal
	4. Humberto Palbral: Se inicia fisurado de acero para viga de cimentación.
	Municipio: El carmen
	Clima: Dia soleado
	1. Humberto Alvarez: Se continua instalación de sistema septico

	2. Anelly Contreras: Se realiza instalación de puertas y ventanas, aparatos sanitarios, tanque aereo y cristalería de ventanas.
	3. Gladys Meneses: Se realiza encofre y fundida de viga de amarre
	4. Samuel Jaime: Se realiza encofre y fundida de viga de amarre
	Municipio: San Calixto
	Clima: Dia Soleado
	1. Diosse Ramirez: Se inicia instalación de tanque aereo
	2. Jhon Vera: Se continúa instalación de cubierta
	3. Jaider Perez: Se inicia fisurado de acero para viga de cimentación.
	4. Ana Castilla: Se inicia fisura de acero para viga de cimentación.
	Municipio: Teorama
	Clima: Dia Soleado
	1. Yarman Ovallos: Se continúa instalación de sistema septico
	2. Gabriel Quintero: Se continua fundiendo columnas y columnetas
	3. Jesus Ortiz: Se continua fundiendo columnas y columnetas
	4. Oscar Arciniega: Se continúa instalación de cubierta
	5. Sandra Suarez: Se continúa instalación de cubierta
	6. Teresa Guerrero: Se continúa instalación de cubierta.
	Adrian Villamizar RIL contratista
	Andres Parra Insp. interventoria
22/11/2025	CITO 7943767-2025
Sabado	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria oficiales y ayudantes.

Municipio: Concepción
Clima: Mañana Soleada
1. Jose Abal: Se realiza instalación de sistema septico. Casa terminada
2. Gustavo Portillo: Se realiza instalación de sistema septico. casa terminada
3. Jaime Cedilla: Se realiza instalación de aparatos sanitarios, tanque aereo, cantalera y sistema septico. Casa terminada
4. Heber Alfaro: Se anclan fisurado de acero para uso de amarracion

Municipio: El carmen
Clima: Mañana Soleada.
1. Humberto Alvarez: Se realiza instalación del sistema septico. casa terminada
2. Oneyo Cañaveral: Se realiza instalación de sistema septico. Casa terminada
3. Gladys Moreira: Se inicia instalan cuchillas para cubierta
4. Samuel Jaime: Se inician cuchillas para cubierta

Municipio: San calixto
Clima: Mañana soleada
1. Diose Ramirez: Se anclan instalacion de tanque aereo
2. Jhon Vera: Se anclan instalacion de cubierta
3. Jaider Perez: Se anclan fisurado de acero para uso de amarracion
4. Ana Cedilla: Se anclan fisurado de acero para uso de amarracion

Municipio: Teorama
Clima: Mañana Soleada
1. Yorman Ovallos: Se realiza instalación de sistema septico. Casa terminada
2. Gabriel Quintero: Se inicia fisurado de acero para uso de amarre
3. Jesus Ortiz: Se inicia fisurado de acero para uso de amarre
4. Oscar Argueta: Se inicia instalación de cableado electrico y caja electrica

	5. Sandra Suarez: se inicia instalación de ductería eléctrica y cable eléctrico
	6. Teresa Guerrero: Se inicia instalación de ductería eléctrica y cable eléctrico
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. Interventoría
23/11/2025	Día no laboral
Domingo	
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL — Ins. Interventoría
24/11/2025	CITO 7943767 - 2025
Lunes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoría, oficiales y ayudante.
	Municipio: Convención
	Clima: Día nublado
	1. Jubes Pallares: Se inicia fundida y derencutre para viga de cimentación
	Municipio: El carmen
	Clima: Día nublado
	1. Gladys Mendez: Se continuan cuchillas para cubierta
	2. Samuel Jaime: Se continuan cuchillas para cubierta
	Municipio: San Calixto
	Clima: Día nublado
	1. Diosse Ramirez: Se inicia instalación de cubierta de cerramiento
	2. Jhon Vera: Se inicia instalación de ductería eléctrica

	3 Jaider Perez: Se inicia encofre y fundida para viga de cimentacion
	4 Ana Castilla: Se inicia encofre y fundida para viga de cimentacion
	Municipio: Tenerife
	Clima: Dia nublado
	1. Gabriel Quintero: Se continua fisurado de acero para viga de amarre
	2. Jesus Ortiz: Se continua fisurado de acero para viga de amarre
	3. Oscar Arsenio: Se continua instalacion de cajas electricas
	4. Sandra Suarez: Se continua instalacion de cajas electricas
	5. Teresa Herrera: Se continua instalacion de cajas electricas
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIC contratista — Insp. interventoria
25/11/2025	OTO 7943767-2025
Martes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Convencion
	1. Nubor Pallares: se realiza desencofre para viga de cimentacion
	Municipio: el carmen
	Clima: Dia soleado
	1. Gladys Meneses: Se inica instalacion de viga canta y correas metalicas
	2. Samuel Jaimes: Se inica instalacion de viga canta y correas metalicas
	Municipio: San Calixto
	Clima: Dia soleado
	1. Dorse ramirez: Se continua instalacion de cristalera de ventanas
	2. Jhon Vera: Se continua instacion de ductera y cajas electricas
	3. Jaider Perez: Se continua fundida para viga de cimentacion
	4. Ana Castilla: Se continua fundida para viga de cimentacion

lider

	Municipio: Teorama
	Clima: Dia soleado
	1. Gabriel Quintero: Se inicia excavacion y fundida para viga de amarre
	2. Jesus Ortiz: Se inicia excavacion y fundida para viga de amarre.
	3. Oscar Argenta: Se inicia instalacion de Puntos sanitarios y red hidraulica
	4. Sandra Suarez: Se inicia instalacion de Puntos sanitarios y red hidraolica
	5. Teresa Guerrero: Se inicia instalacion de Puntos sanitarios y red hidraolica.
	Adrian Villamizar — RIC contratista
	Andres Parra — Insp. Interventoria
26/11/2021 Miercoles	CTTO 7943767-2021
	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, inspector de interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Concepcion
	1. Huber Pallares: se inicia pega de mamposteria
	Municipio: El carmen
	1. Gladys Mendez: Se continua instalacion de correas metalicas
	2. Samuel Jaime: Se continua instalacion de correas metalicas
	Municipio: San calixto
	Clima: Dia Soleado
	1. Diorse Ramirez: Se inicia instalacion de sistema septico
	2. Jhon Vera: Se inicia instalacion de Puntos sanitarios
	3. Jaider Perez: Se realiza excavacion para viga de

	Cimentacion
	4 Ara Calzilla: Se inicia descubre para viga de cimentacion
	Municilio: Teorama
	Clima: Dia soleado
	1 Gabriel Quintero. Se realiza fundida para viga de amarre
	2 Jesus ortiz: Se realiza fundida para viga de amarre
	3. Oscar Ansonta: Se realiza instalacion de red hidraulica
	4: Sondra Lopez: Se realiza instalacion de red hidraulica
	5: Teresa Guerrera: Se realiza instalacion de red hidraulica
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. Interventoria
27/11/2025	CTO 7443167-2025
Jueves	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Convencion
	Clima: Mañana soleada, tarde nublado
	1. Heber Pallares: Se continua pega de mamposteria
	Municipio: El carmen
	Clima: Mañana Soleada, tarde nublada
	1 Gladys monsalve: Se inicia instalacion de cubierta
	2. Samuel Jaime: Se inicia instalacion de cubierta
	Municipio: San calixto
	Clima: Mañana Soleada, tarde nublada
	1, Diorse Ramirez: Se continua instalacion de sistema septico
	2 Jhon Yerci: se continua instalacion de rentas sanitarias y red hidraulica

3. Javier Perez: Se inica pega de mampostena
4. Ana Castilla: Se inica pega de mampostena

Municipio: Teorama
Clima: Mañana soleada
1. Gabriel Quintero: Se inicia cuchillas para instalación de cubierta
2. Jesus Ortiz: Se inicia cuchillas para instalacion de cubierta
3. Oscar Angarita: Se inicia instalacion de tableta de gres
4. Sandra Suarez Se inicia instalación de tableta de gres
5. Tereza Guerrero: Se inicia instalacion de tableta de gres

Adrian Villamizar
RH contratista

Andres Parra
INSP. interventoria

20/11/2025 Viernes

OTO 7943767 - 2021
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes

Municipio: Convención
Clima: Mañana nublada, tarde lluvia
1. Huber Palmeras: Se continua pega de mampostena

Municipio: El carmen
Clima: Mañana nublada, tarde lluvia
1. Gladys meneses: Se continua instalación de cubierta
2. Samuel Jaime: Se continua instalación de cubierta

Municipio: San Calixto
Clima: Mañana nublado, tarde lluvia
1. Diose Ramirez: Se continua instalacion de sistema septico

2. Jhon Vera: Se inicia instalacion de tableta de sress
3. Jordy Perez: Se continua Pega de mampostena
4. Ana Castilla: Se continua Pega de mampostena

Municipio: Tenorio
Clima: Mañana nublada, tarde lluvia
1. Gabriel Quintero: Se continua instalacion de cuchillas
2. Jesus Ortiz: Se continua instalacion de cuchillas
3. Oscar Angarita: Se realiza instalacion de tableta de sress
4. Sandra Suarez: Se realiza instalacion de tableta de sress
5. Teresa Guerrero: Se realiza instalacion de tableta de sress

Adrian Villamizar
EIC contratista

Andres Parra
Insp. interventoria

24/4/2025
Sabado

GTO 7243767-2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, Inspector interventoria, oficiales y ayudantes

Municipio: Convencion
Clima: Mañana soleada
1. Fidel Pallares: Se continua Pega de mampostena

Municipio: El carmen
Clima: Mañana soleada
1. Eddy Meneses: Se continua instalacion de cubierta
2. Samuel Jaime: Se continua instalacion de cubierta

Municipio: San calixto
Clima: Mañana soleada
1. Duvan Ramirez: Se continua instalacion de sistema septico
2. Jhon Vera: Se continua instalacion de tableta de sress

	3. Javier Perez: Se continua Pega de mamposteria
	4. Aura Castilla: Se continua Pega de mamposteria
	Municipio: Teorama
	Clima: Mañana soleada
	1. Gabriel Quintero: Se realiza instalacion de viga canta
	2. Jesus Ortiz: Se realiza instalación de viga canta
	3. Oscar Ansonta: Se realiza figurado y emmallado de Pral y
	Se realiza Panete en baño
	4. Sandra Suarez: Se realiza figurado y emmallado de Pral y
	Panete en baño
	5. Teresa Guerrero: Se realiza figurado y emmallado de Pral y
	Panete en baño.
	Adrian Villamizar — Andrel Pama
	RIL contratista — Insp. interventoria
30/11/2015	Dia no laboral
Domingo	
	Adrian Villamizar — Andrel Pama
	RIL contratista — Insp. interventoria
01/12/2015	OTO 7943767 - 2015
Lunes	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector Interventoria
	Oficiales y ayudantes
	Municipio: Convencion
	Clima: Dia soleado
	1. Huber Pallares: Se continua Pega de mamposteria
	Municipio: El carmen

	Clima: Dia soleado
	1. Gladys Moreira: Se inicia instalacion de doctena electrica
	2. Samuel Jaime: Se inicia instalacion de doctena electrica
	Municipio: San Calixto
	Clima: Dia soleado
	1. Diorse Ramirez: Se continua instalacion de sistema septico.
	2. Jhon Vera: Se inicia fisuracion y enmallado de Piso
	3. Jaider Perez: Se inicia fundicion columnas y columneta
	4. Ara Castilla: Se inicia fundicion columnas y columneta
	Municipio: Tearama
	Clima: Dia soleado
	1. Gabriel Quintero: Se realiza instalacion de correas metalicas
	2. Jesus Ortiz: Se realiza instalacion de correas metalicas
	3. Oscar Angarita: Se realiza instalacion de meson de la cocina
	4. Sandra Suarez: Se realiza instalacion de meson de la cocina
	5. Teresa Guerrero: Se realiza instalacion de meson de la cocina
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	R11 contratista — Insp. Interventoria
02/12/2017	CTTO 7943767-2015
Martes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria
	Oficiales y ayudantes
	Municipio: Convencion
	Clima: Dia nublado
	1. Huber Pallares: Se continua pega de mamposteria
	Municipio: El carmen
	Clima: Dia nublado

	1. Gladys Heredel: Se continua instalacion de cabl electricas
	2 Samuel Jaime: Se continua instalación de cabl electrica
	Municipio: San calixto
	Clima: Dia nublado
	1. Diorse Ramirez: Se continua instalación de sistema septico
	2 Jhon vera: Se realiza Peñete en baño
	3. Jaide Perez: Se continua fundiendo columnas y columnetas
	4. Ana Castilla: Se continua fundiendo columnas y columnetas
	Municipio: Teorama
	Clima: Dia nublado
	1. Gabriel Quintero: Se inicia instalación de cubierta
	2. Jesus Ortiz: Se inicia instalación de cubierta
	3. Oscar Ansanta: Se realiza instacion de ceramica en baño, cocina y lavadero
	4. Sandra Suarez: Se realiza instalacion de ceramica en baño, cocina, y lavadero
	5. Teresa Guerrero: Se realiza instalación de ceramica en baño, cocina, y lavadero.
	Adrián Villamizar. — Andrel Parra
	R.L contratista — Insp. interventoria
03/12/2025	CTTO 7043767- 2025
Miercoles	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficales y ayudantes
	Municipio: convencion
	Clima: Dia nublado.
	1. Huber Palbarez: Se inicia fundiendo columnas y columnetas

Municipio: El carmen
Clima: Dia nublado
1. Gladys Mendez: Se inica instalacion de Puntos sanitarios y red hidraulica
2 Samuel Jaime: Se inica instalacion de Puntos sanitarios y red hidraulica

Municipio: San Calixto
Clima: Dia nublado
1. Diurse Ramirez: Se continua instalacion de sistema septico
2 Jhon Vera: Se inica instalacion de muros de la cocina
3. Jaider Perez: Se realiza fisurado de acero para viga de amarre
4. Flora Castilla: Se realiza fisurado de acero para viga de amarre

Municipio: Teorama
Clima: Dia nublado
1. Gabriel Cantero: Se continua instalacion de cubierta
2 Jesus Ortiz: Se continua instalacion de cubierta
3 Oscar Argueta: Se realiza instalacion de placa de concreto
4. Teresa Guerrero: Se realiza instalacion de placa de concreto
5. Sandra Jaret: Se realiza instalacion de placa de concreto

Adrian Villamizar
Rlc contratista

Andres Parra
Insp. Interventoria

04/11/2025 Jueves

OTO 7943767-2025
Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria oficiales y ayudantes

Municipio: Concepcion
Clima: Dia soleado
1. Heber Bellaret: Se continua Pega de mamposteria.

	Municipio: El carmen
	Clima: Dia soleado
	1. Gladys Herrera: Se continua instalación de red hidraulica
	2 Samuel Jaime: Se continuá instalación de red hidraulica
	Municipio: San calixto
	Clima: Dia soleado
	1. Diosse Ramirez: Se continua instalación de sistema septico.
	2. Jhon Vera: Se realiza mezcla de la cocina e instalación de ceramica en baño, lavadero y cocina
	3. Jaider Perez: Se realiza fundida y encofre para viga de amarre
	4. Aura castilla: Se realiza fundida y encofre para viga de amarre
	Municipio: Teorama
	Clima: Dia soleado.
	1. Gabriel Quintero: Se inicia instalación de ductera electrica y cajas electricas.
	2. Jesus Ortiz: Se inicia instalación de ductera y cajas electricas.
	3. Oscar Ansaitas: Se realiza instalación de puertas y ventanas.
	4. Teresa Guerrero: Se realiza instalación de puertas y ventanas.
	5. Sandra Suarez: Se realiza instalación de puertas y ventanas.
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	R/C contratista — Insp. interventoria
05/12/2021	CITO 7943767-2021
Viernes	Personal: Residente de obra, Inspector interventoria, Inspector de obra oficiales y ayudantes
	Municipio: Convención

Clima: Dia Soleado
1. Hubert Pallares: Se inicia fundendo columnas y columnetas

Municipio. El carmen
Clima: Dia Soleado
1. Gladys Meneses: Se realiza instalacion de tableta desgress
2 Samuel Jaime: Se realiza instalacion de tableta desgress

Municipio: San Calixto
Clima: Dia soleado
1. Diorse Ramirez: Se continua instalacion de sistema septico
2. Jhon Vera: Se inicia instalacion de placa de concreto para tanque aereo.
3. Jaider Perez: Se realizan cuchillas para instalacion de cubierta
4. Ana Carrillo: Se realizan cuchillas para instalacion de cubierta

Municipio: Teorama
Clima: Dia Soleado
1. Gabriel Quintero: Se continua instalacion de cajas electricas
2. Jesus Ortiz: Se continua instalacion de cajas electricas
3. Oscar Arenas: Se realiza instalacion de aparatos sanitarios, lavaplatos y lavamanos
4. Teresa Guerrero: Se realiza instalacion de aparatos sanitarios, lavaplatos y lavamanos
5. Sandra Suarez: Se realiza instalacion de aparatos sanitarios, lavaplatos y lavamanos

Adrian Villamizar
RIL contratista

Andres Parra
Insp. interventoria

06/12/2025 — OTO 7043767-2025
Sabado — Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria

líder

oficiales y ayudantes.

Municipio: Concepción
Clima: Mañana Soleada
1. Heber Pallares: Se continua fundiendo columnas y columnetas

Municipio: El carmen
Clima: Mañana Soleada
1. Gladys Meneses: Se inicia fisurado y emmallado de piso
2. Samuel Jaime: Se inicia fisurado y emmallado de piso

Municipio: San Calixto
Clima: Mañana Soleada
1. Diorse Ramirez: Se realiza instalación de sistema septico. casa terminada
2. Jhon Vera: Se continua instalacion de placa de concreto
3. Jaider Perez: Se realiza instalación de viga cinta y correas metalicas
4. Aura Carbilla: Se realiza instalacion de viga cinta y correas metalicas

Municipio: Teorama
Clima: Mañana Soleada
1. Gabriel Quintero: Se inica instalacion de punto sanitario y red hidraulica
2. Jesus ortiz: se inicia instalacion de punto sanitario y red hidraulica
3 oscar Ansonta: se realiza instalacion de tanque aereo, enstalena y sistema septico. casa terminada
4. Tereza Guerrero: Se realiza instalacion de tanque aereo, cintalena y sistema septico. Casa terminada
5. Sandra Suarez: se realiza instalacion de tanque aereo, cintalena y sistema septico. Casa terminada

	Adrian Villamizar R/L contratista	Andres Parra Insp. interventoria
09/12/2015 Domingo	Dia no laboral	
	Adrian Villamizar R/L contratista	Andres Parra Insp. interventoria
08/12/2015 Lunes	Dia no laboral	
	Adrian Villamizar R/L contratista	Andres Parra Insp. interventoria
07/12/2015 Martes	OTO 7413747-2015 Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria oficiales y ayudantes	
	Municipio: Concepcion Clima: Dia nublado 1. Hobe Pallares. Se inicia fijorado de acero para viga de amarre	
	Municipio: El carmen clima: Dia nublado 1. Elodys moreles: Se continua el maltado de Piso 2. Samuel. Jaime: se continua el maltado de Piso	
	Municipio: San calixto Clima: Dia nublado 1. Ivan Vera: Se realiza instalacion de puertas y ventanas	

	2. Jaider Perez: Se inicia instalación de cubierta
	3. Ana Castilla: Se inicia instalación de cubierta
	Municipio: Teorama
	Clima: Dia nublado
	1. Gabriel Quintero: Se continúa instalación de red hidraulica
	2. Jesus Ortiz: Se continúa instalación de red hidraulica
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Inp. interventoria
10/12/2021	OTD 7943767-2021
Miercoles	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector interventoria, oficiales y ayudantes
	Municipio: Convencion
	Clima: Dia Soleado
	1. Hebert Pallares: Se continua fisurado de acero para uso de amarre
	Municipio: El carmen
	Clima: Dia soleado
	1. Gladys Moreno: Se inicia Pañete en baño
	2. Samuel Jaime: Se inica Pañete en baño
	Municipio: San calixto
	Clima: Dia Soleado
	1. Jhon Vera: Se realiza instalacion de aparatos sanitarios
	2. Jaider Perez: Se continuó instalacion de cubierta
	3. Ana Castilla: Se continuó instalación de cubierta
	Municipio: Teorama

	Clima: Dia Soleado
	1. Gabriel Quintero: Se inica instalacion de tableta de grees
	2. Jesul ortiz: Se inica instalacion de tableta de grees
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	ESL contratista — Insp. interventoria
11/12/2025 Jueves	OTD 7943767 - 2025
	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, inspector interventoria Oficiales y ayudantes
	Municipio: Concencion
	Clima: Dia Soleado
	1. Yuber Palmeral: Se realiza encofre y fundida para viga de amarre
	Municipio: El carmen
	Clima: Dia Soleado
	1. Gladys menesel: Se continua Pañete en baño
	2. Samuel Jaime: Se continua Pañete en baño
	Municipio: San calixto
	Clima: Dia Soleado
	1. Jhon Vera: se realiza instalacion de aparatos Sanitarios, lavamanos, tanque acreo y instalacion de ventanas y se inica instalacion de sistema septico.
	2. Jaider Perez: Se continua instalacion de cubierta
	3. Alex castilla: Se continua instalacion de cubierta
	Municipio: Teorama
	Clima: Dia soleado
	1. Gabriel Quintero: Se continua instalacion de tableta de grees

	2 Jesus Ortiz: Se continua instalacion de tableta de yeso
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. interventoria
12/12/2025	CTTO 7943767-2021
Viernes	Personal: Residente de obra, inspector de obra, inspector de interventoria y ayudantes
	Municipio: Convencion
	Clima: Mañana soleada, tarde nublada
	1. Huber Pallares: Se inician cubrillas para cubierta
	Municipio: El carmen
	Clima: Dia nublado
	1. Gladys Meneses: Se inicia instalacion de meson de la cocina
	2. Samuel Jaime: Se inicia instalacion de meson de la cocina
	Municipio: San calixto
	Clima: Mañana soleada, tarde nublada
	1. Jhon Vera: Se continua instalacion de sistema septico
	2. Jaide Perez: Se inicia instalacion de doctora electrica
	3. Abra Castilla: Se inicia instalacion de cubierta
	Municipio: Teorama
	Clima: Mañana Soleada, tarde nublada
	1. Gabriel Quintero: Se inicia fisurado y enmallado de pisos
	2. Jesus ortiz: Se inicia fisurado y enmallado de pisos
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RIL contratista — Insp. interventoria

lider

13/12/2025	OTO 741369-2025
Sabado	Personal: Residente de obra, Inspector de obra, Inspector interventoria ayudantes y ayudantes
	Municipio: Cumaral
	Clima: Mañana nublada
	1. Heber Pallares: Se continúa instalación de cubierta
	Municipio: El Calvario
	Clima: Mañana Nublada
	1. Gladys morales: Se continua instalación de malla de cocina
	2. Samuel Jaime: Se continua instalación de malla de cocina
	Municipio: San Calixto
	Clima: Mañana nublada
	1. Jhon Vega: Se realiza instalación de sistema Septico. Casa terminada
	2. Julder Perez: Se continúa instalación de cableado electrico
	3. Ana Castillo: Se continúa instalación de cableado electrico
	Municipio: Teorama
	Clima: Mañana nublada
	1. Gabriel Quintero: Se continua enmallado de piso
	2. Jesus Ortiz: Se continua enmallado de piso
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RL contratista — INSP. Interventoria
14/12/2025	Dia no laboral
Domingo	
	Adrian Villamizar — Andres Parra
	RL contratista — Insp. Interventoria
