LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

INFORMES SEMANALES

Carrera 8 No. 24-54 B. Villa Fanny
Cel. 311 861 69 05
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	7/12/2024	INFORME N°:	1	PERÍODO DEL	29/11/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	7/12/2024
N° Y AÑO DE CONTRATO DE OBRA:	283 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	ID DEL PROYECTO:	CONSTRUCCION Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SANITARIAS EN EL BARRIO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO:	SARAVENA		
N° Y AÑO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	284 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA		

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	"CONSTRUCCION Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SANITARIAS EN EL BARRIO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVENA BARRIO LAS FLORES	N° DE BENEFICIARIOS :	192

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)			CONTRATO DE OBRA		
N° Y AÑO DE CONTRATO:	284 DE 2024		N° Y AÑO DE CONTRATO:	283 DE 2024	
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA		CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA	
INTERVENTOR:	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ		CONTRATISTA:	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA	
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	-		PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0	
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	UN (01) MES		PLAZO CONSTRUCCIÓN:	UN (01) MES	
PLAZO TOTAL INICIAL:	UN (01) MES		PLAZO TOTAL INICIAL:	UN (01) MES	
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2024		FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2024	
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° :			*FECHA DE SUSPENSIÓN N°:		
*FECHA DE REINICIO N°:			*FECHA DE REINICIO N°:		
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2024		FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2024	
PLAZO ACTUALIZADO:	30		PLAZO ACTUALIZADO:	30	
PLAZO TRANSCURRIDO:	8	EQUIVALE AL 27%	PLAZO TRANSCURRIDO:	8	EQUIVALE AL 27%
VALOR INICIAL :	$ 35.954.850,40		VALOR INICIAL :	$ 454.045.126,05	
*VALOR ADICIÓN N° :	N.A		*VALOR ADICIÓN N° :	N.A	
VALOR ACTUALIZADO:	N.A		VALOR ACTUALIZADO:	N.A	
VALOR EJECUTADO	$ 9.587.960,11		VALOR EJECUTADO:	$ 136.213.537,82	
VALOR PAGADO:	0		VALOR PAGADO:	0	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 26.366.890,29		VALOR POR EJECUTAR:	$ 317.831.588,24	
SUPERVISOR:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA		SUPERVISOR:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA	


* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.


	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	7/12/2024	INFORME N°:	1	PERÍODO DEL	29/11/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	7/12/2024

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Descripcion	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	25,00%	30,00%	120%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO (MILLONES) ($)	$ 113.511.281,51	$ 136.213.537,82	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	$	22.702.256,30	

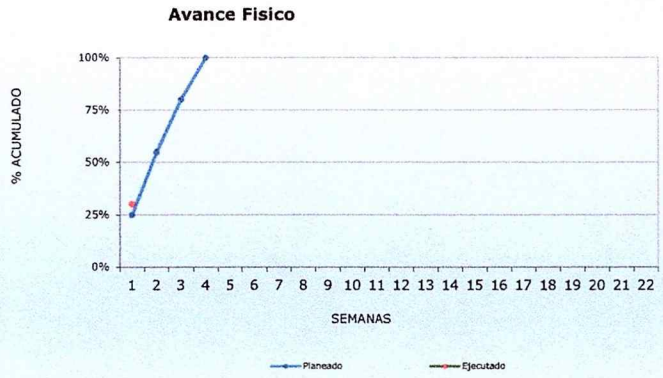

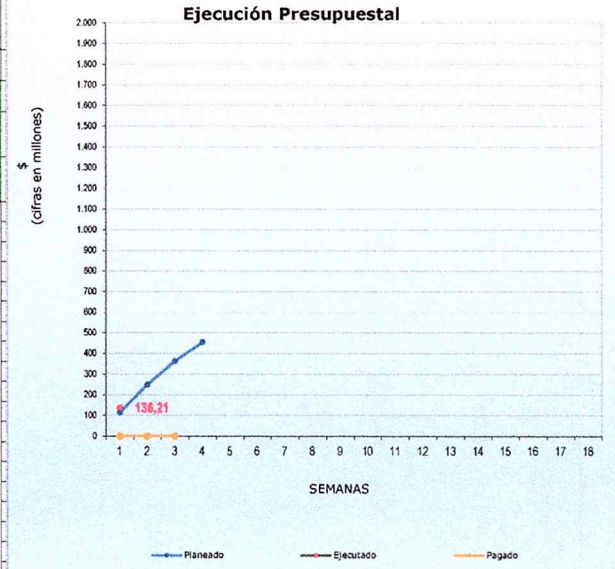

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N.A

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N.A

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N.A

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N.A

3.5. MANEJO AMBIENTAL

N.A

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

N.A

3.7 SALUD OCUPACIONAL

N.A

3.8 ASPECTOS SOCIALES

N.A

	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	7/12/2024	INFORME N°:	1	PERÍODO DEL	29/11/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	7/12/2024

4. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
NO APLICA					

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1. A la fecha se tiene una ejecucion de obra de acuerdo con la programacion, la cual muestra una programacion del 25% y una ejecucion de 30%.
2. En la presente semana solo se trabajo en oficina y se realizo socializacion del proyecto
3. Se realiza alstamiento de materiales y se inicia levantamiento topografico
4. Para la presente semana se realiza la vinculación del personal activo para la ejecución de las actividades de obra
5. Se inician actividades de excavacion para pozos, se funden solados, placa de fonfo y se figura acero para armado de anillos, los cuales se funden posteriormente.
6. Se Reazliza excavacion para instalacion de tuberia, se instala previamente el colchon de arena y se rellena con material seleccionado.
7. Se inicia instalacion de acometidas instalando tuberia, previamente encamado de arena y posterior se realizan rellenos con material seleccionado

FIRMA:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
TP N°: 54202-188037 NTS

FIRMA:
SUPERVISOR
NOMBRE: WILSON HERNANDO ROA GAMBOA

	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	14/12/2024	INFORME N°:	2	PERÍODO DEL	8/12/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	14/12/2024
N° Y AÑO DE CONTRATO DE OBRA:	283 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	ID DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCION Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SANITARIAS EN EL BARRIO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO:	SARAVENA		
N° Y AÑO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	284 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA		

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	"CONSTRUCCION Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SANITARIAS EN EL BARRIO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVENA BARRIO LAS FLORES	N° DE BENEFICIARIOS :	192

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)				CONTRATO DE OBRA			
N° Y AÑO DE CONTRATO:	284 DE 2024			N° Y AÑO DE CONTRATO:	283 DE 2024		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA			CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA		
INTERVENTOR:	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ			CONTRATISTA:	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA		
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	-			PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0		
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	UN (01) MES			PLAZO CONSTRUCCIÓN:	UN (01) MES		
PLAZO TOTAL INICIAL:	UN (01) MES			PLAZO TOTAL INICIAL:	UN (01) MES		
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2024			FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2024		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° :				*FECHA DE SUSPENSIÓN N°:			
*FECHA DE REINICIO N°:				*FECHA DE REINICIO N°:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	30			PLAZO ACTUALIZADO:	30		
PLAZO TRANSCURRIDO:	15	EQUIVALE AL	50%	PLAZO TRANSCURRIDO:	15	EQUIVALE AL	50%
VALOR INICIAL :	$ 35.954.850,40			VALOR INICIAL :	$ 454.045.126,05		
*VALOR ADICIÓN N° :	N.A			*VALOR ADICIÓN N° :	N.A		
VALOR ACTUALIZADO:	N.A			VALOR ACTUALIZADO:	N.A		
VALOR EJECUTADO	$ 17.977.425,20			VALOR EJECUTADO:	$ 289.680.790,42		
VALOR PAGADO:	0			VALOR PAGADO:	0		
VALOR POR EJECUTAR:	$ 17.977.425,20			VALOR POR EJECUTAR:	$ 164.364.335,63		
SUPERVISOR:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA			SUPERVISOR:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA		


* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.


	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	14/12/2024	INFORME N°:	2	PERÍODO DEL	8/12/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	14/12/2024

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Descripcion	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	55,00%	63,80%	116%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO (MILLONES) ($)	$ 249.724.819,33	$ 289.680.790,42	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	$	39.955.971,09	

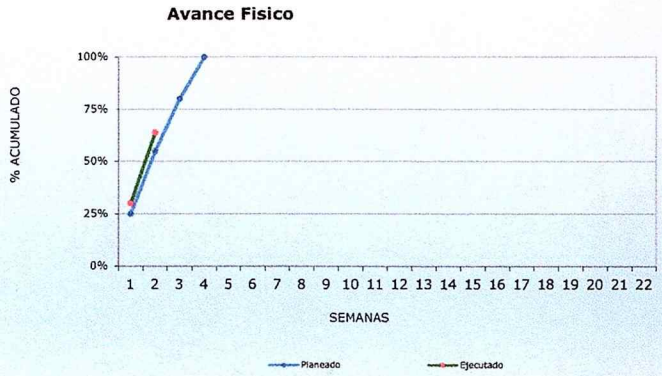

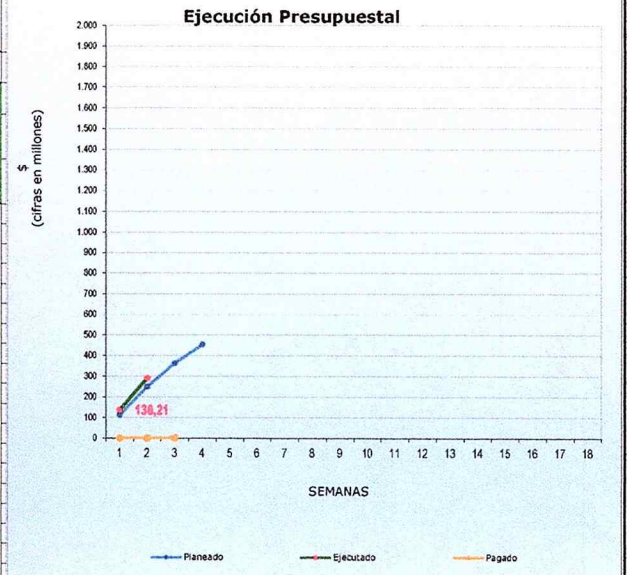

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N.A

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N.A

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N.A

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N.A

3.5. MANEJO AMBIENTAL

N.A

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

N.A

3.7 SALUD OCUPACIONAL

N.A

3.8 ASPECTOS SOCIALES

N.A

	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	14/12/2024	INFORME N°:	2	PERÍODO DEL	8/12/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	14/12/2024

4. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
NO APLICA					

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1. A la fecha se tiene una ejecucion de obra optima dadas las condiciones favorables, la cual muestra una programacion del 55% y una ejecucion de 63,80%.
2. Se continua instalando tuberia, encamado de arena y relleno seleccionado compactando en capas
3. Se continua con la instalacion de acometidas domiciliarias
4. Se realizan reparaciones de acometidas existentes.
5. Continua la actividad de fundida de anilos y se inician a fundir las aro tapas
6. Se Realiza retiro de material sobrante y
7. Se inicia fundida de cajas de inspeccion

FIRMA:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
TP N°: 54202-188037 NTS

FIRMA:
SUPERVISOR
NOMBRE: WILSON HERNANDO ROA GAMBOA

	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	21/12/2024	INFORME N°:	3	PERÍODO DEL	15/12/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	21/12/2024
N° Y AÑO DE CONTRATO DE OBRA:	283 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	ID DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCION Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SANITARIAS EN EL BARRIO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO:	SARAVENA		
N° Y AÑO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	284 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA		

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	"CONSTRUCCION Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SANITARIAS EN EL BARRIO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVENA BARRIO LAS FLORES	N° DE BENEFICIARIOS :	192

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)				CONTRATO DE OBRA			
N° Y AÑO DE CONTRATO:	284 DE 2024			N° Y AÑO DE CONTRATO:	283 DE 2024		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA			CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA		
INTERVENTOR:	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ			CONTRATISTA:	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA		
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	-			PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0		
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	UN (01) MES			PLAZO CONSTRUCCIÓN:	UN (01) MES		
PLAZO TOTAL INICIAL:	UN (01) MES			PLAZO TOTAL INICIAL:	UN (01) MES		
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2024			FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2024		
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° :				*FECHA DE SUSPENSIÓN N°:			
*FECHA DE REINICIO N°:				*FECHA DE REINICIO N°:			
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2024			FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2024		
PLAZO ACTUALIZADO:	30			PLAZO ACTUALIZADO:	30		
PLAZO TRANSCURRIDO:	22	EQUIVALE AL	73%	PLAZO TRANSCURRIDO:	22	EQUIVALE AL	73%
VALOR INICIAL :	$ 35.954.850,40			VALOR INICIAL :	$ 454.045.126,05		
*VALOR ADICIÓN N° :	N.A			*VALOR ADICIÓN N° :	N.A		
VALOR ACTUALIZADO:	N.A			VALOR ACTUALIZADO:	N.A		
VALOR EJECUTADO	$ 26.366.890,29			VALOR EJECUTADO:	$ 404.054.757,67		
VALOR PAGADO:	0			VALOR PAGADO:	0		
VALOR POR EJECUTAR:	$ 9.587.960,11			VALOR POR EJECUTAR:	$ 49.990.368,38		
SUPERVISOR:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA			SUPERVISOR:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA		


* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.


	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	21/12/2024	INFORME N°:	3	PERÍODO DEL	15/12/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	21/12/2024

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Descripcion	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	80,00%	88,99%	111%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO (MILLONES) ($)	$ 363.236.100,84	$ 404.054.757,67	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	$ 40.818.656,83		

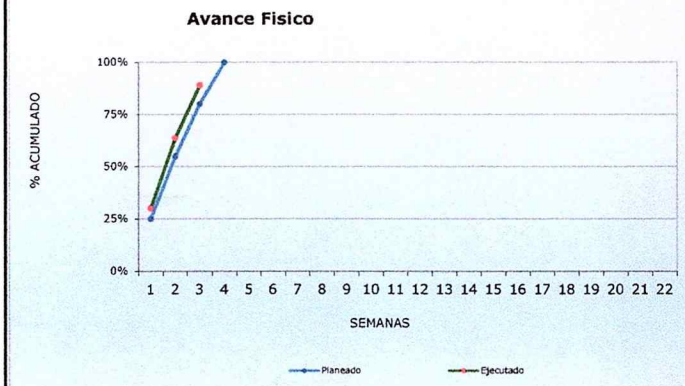

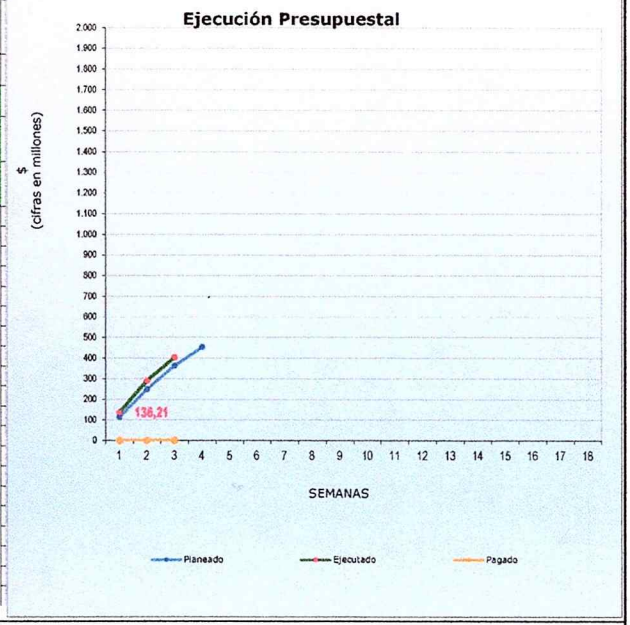

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N.A

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N.A

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N.A

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N.A

3.5. MANEJO AMBIENTAL

N.A

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

N.A

3.7 SALUD OCUPACIONAL

N.A

3.8 ASPECTOS SOCIALES

N.A

	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	21/12/2024	INFORME N°:	3	PERÍODO DEL	15/12/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	21/12/2024

4. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
NO APLICA					

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1. A la fecha se tiene una ejecucion de obra optima dadas las condiciones favorables, la cual muestra una programacion del 80% y una ejecucion de 88,99%.
2. Se continua instalando tuberia, encamado de arena y relleno seleccionado compactando en capas
3. Se continua con la instalacionde acometidas domiciliarias
4. Se inician a fundir las aro tapas
5. Se realiza limpieza de pozos y se mejoran emboquillados
6. Se Realiza retiro de material sobrante y se instalan las tapas de los pozos
7. Se continua con la actividad de fundida de cajas de inspeccion

FIRMA:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: ING. LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
TP N°: 54202-188037 NTS

FIRMA:
SUPERVISOR
NOMBRE: WILSON HERNANDO ROA GAMBOA

	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	28/12/2024	INFORME N°:	4	PERÍODO DEL	22/12/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	28/12/2024
N° Y AÑO DE CONTRATO DE OBRA:	283 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	ID DEL PROYECTO:	"CONSTRUCCION Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SANITARIAS EN EL BARRIO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
DEPARTAMENTO:	ARAUCA	MUNICIPIO:	SARAVENA		
N° Y AÑO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	284 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA		

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:	"CONSTRUCCION Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS SANITARIAS EN EL BARRIO LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA, MUNICIPIO DE SARAVENA BARRIO LAS FLORES	N° DE BENEFICIARIOS :	192

PROYECTO DE INTERVENTORÍA (PI)		CONTRATO DE OBRA	
N° Y AÑO DE CONTRATO:	284 DE 2024	N° Y AÑO DE CONTRATO:	283 DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA	CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SARAVENA
INTERVENTOR:	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	CONTRATISTA:	ROGGER ULISES MARTINEZ TRASLAVIÑA
PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	-	PLAZO PRECONSTRUCCIÓN:	0
PLAZO CONSTRUCCIÓN:	UN (01) MES	PLAZO CONSTRUCCIÓN:	UN (01) MES
PLAZO TOTAL INICIAL:	UN (01) MES	PLAZO TOTAL INICIAL:	UN (01) MES
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2024	FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2024
*FECHA DE SUSPENSIÓN N° :		*FECHA DE SUSPENSIÓN N°:	
*FECHA DE REINICIO N°:		*FECHA DE REINICIO N°:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	28/12/2024
PLAZO ACTUALIZADO:	30	PLAZO ACTUALIZADO:	30
PLAZO TRANSCURRIDO:	30 EQUIVALE AL 100%	PLAZO TRANSCURRIDO:	30 EQUIVALE AL 100%
VALOR INICIAL :	$ 35.954.850,40	VALOR INICIAL :	$ 454.045.126,05
*VALOR ADICIÓN N° :	N.A	*VALOR ADICIÓN N° :	N.A
VALOR ACTUALIZADO:	N.A	VALOR ACTUALIZADO:	N.A
VALOR EJECUTADO	$ 35.954.850,40	VALOR EJECUTADO:	$ 454.045.126,05
VALOR PAGADO:	0	VALOR PAGADO:	0
VALOR POR EJECUTAR:	$ -	VALOR POR EJECUTAR:	$ -
SUPERVISOR:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA	SUPERVISOR:	WILSON HERNANDO ROA GAMBOA


* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.


	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	28/12/2024	INFORME N°:	4	PERÍODO DEL	22/12/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	28/12/2024

2. PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Descripcion	Planeado	Ejecutado	Avance
2.1 AVANCE FÍSICO (%)	100,00%	100,00%	100%
2.2 AVANCE - EJECUCIÓN PRESUPUESTO (MILLONES) ($)	$ 454.045.126,05	$ 454.045.126,05	
DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO (en $)	$ -		

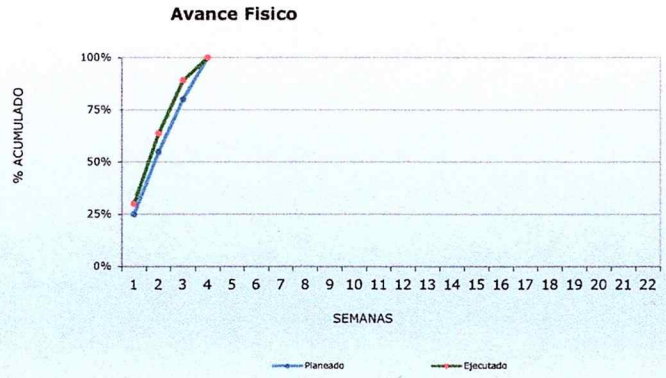

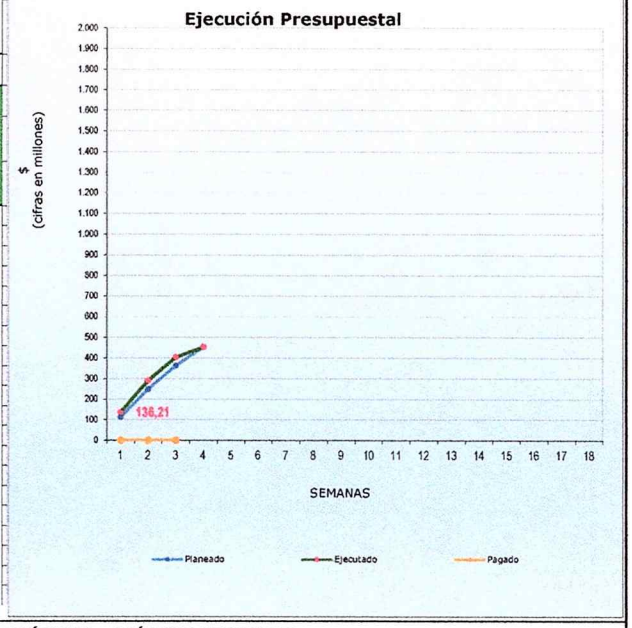

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

N.A

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS (ECONÓMICOS, PERSONAL, EQUIPOS, ETC) AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

N.A

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

N.A

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

N.A

3.5. MANEJO AMBIENTAL

N.A

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL

N.A

3.7 SALUD OCUPACIONAL

N.A

3.8 ASPECTOS SOCIALES

N.A

	FORMATO INFORME SEMANAL	Código: F-GI-IH-XX
		Versión: 1
		Fecha de Aprobación:

FECHA DE INFORME:	28/12/2024	INFORME N°:	4	PERÍODO DEL	22/12/2024
		ETAPA:	CONSTRUCCION	AL	28/12/2024

4. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ID ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ESTADO	NOMBRE Y CARGO RESPONSABLE	FECHA INICIO PROGRAMADA	FECHA FIN PROGRAMADA
NO APLICA					

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

N.A

6. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

1. A la fecha se tiene una ejecucion de obra optima dadas las condiciones favorables, la cual muestra una programacion del 100% y una ejecucion de 100%.
2. Se realiza instalacion de cañuelas utilizando acelerante
3. Se instalan escaleras de pozos y se instalan aro tapas faltantes
4. Se realiza mejoramiento de rellenos y se realizan reparaciones de los andenes afectados
5. Se realiza limpieza y retiro de material sobrante
6. Se Realiza instalacion de tapas de cajas de inspeccion
7. se coloca en funcionamiento el sistema y se termina la siembra de arboles contemplado en el pma

FIRMA:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ING. LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

TP N°: 54202-188037 NTS

FIRMA:

SUPERVISOR

NOMBRE: WILSON HERNANDO ROA GAMBOA
