ANEXO B

SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CLIMA

CODIGO:	GI-F-020
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA:	CTO 440 MT 2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	CTO 459 MT 2022	PERIODO	
NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TOCANCIPA I.T.	NIT:	820.002.625-7	DESDE	26/07/2023
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS - CRIR	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS - CRIR	HASTA	31/07/2023


HORAS/DÍA DEL MES JULIO 2025

ESTADO DEL TIEMPO	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		TOTAL HORAS
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
SECO																																	-
NUBLADO																																	-
LLUVIOSO																																	-
	-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-

ESTADO DEL TIEMPO	17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		TOTAL HORAS
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
SECO																			3,5	2,5			2,0	3,0	3,0				4,5	3,0	21,50
NUBLADO																			1,0		3,5	3,5	1,0	1,5						1,5	12,00
LLUVIOSO																				2,0	0,5	0,5	1,5		1,0						5,50
	-		-		-		-		-		-		-		-		-			9,0		8,0		9,0		4,0		-		9,0	39,00

	TOTAL	
	MAÑANA	TARDE
SECO	13,0	8,5
NUBLADO	5,5	6,5
LLUVIOSO	3,0	2,5
	21,5	17,5

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EN EL MES DE JULIO 2023

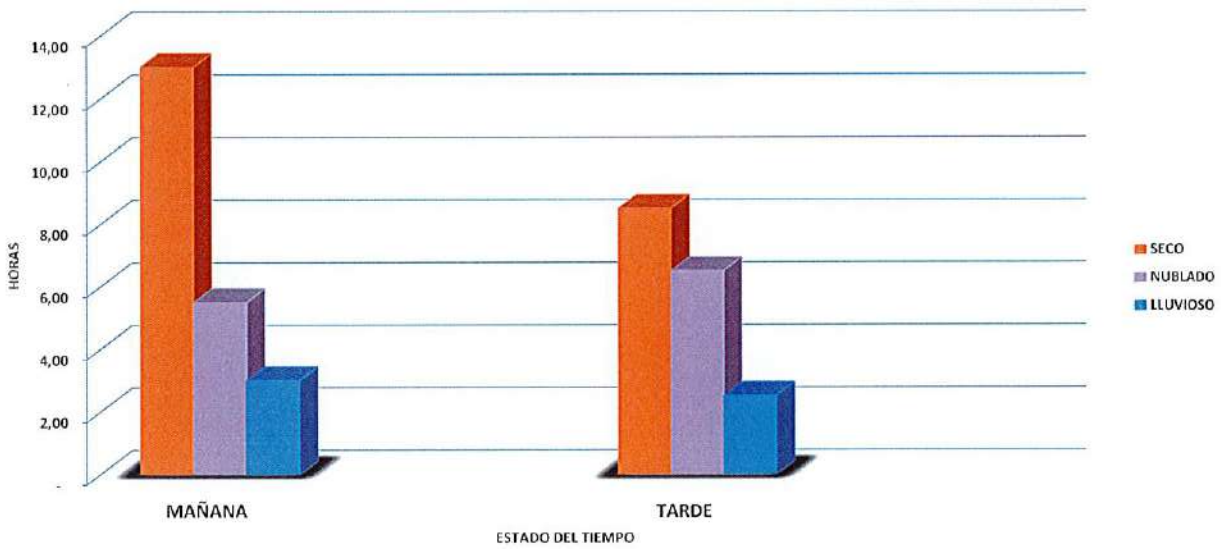

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
No Mat.

MARTHA JOHANA SANCHEZ NUMPAQUE

SEGUIMIENTO MENSUAL DEL CLIMA

CODIGO:	GI-F-020
VERSION:	01
FECHA:	MARZO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

				PERIODO	
CONTRATO DE OBRA:	CTO 440 MT 2022	CONTRATO INTERVENTORIA:	CTO 459 MT 2022	DESDE	1/08/2023
NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TOCANCIPA I.T.	NIT:	820.002.625-7		
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS - CRIR	OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS - CRIR	HASTA	31/08/2023


HORAS/DÍA DEL MES AGOSTO DE 2023

ESTADO DEL TIEMPO	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		TOTAL HORAS
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
SECO	4,0	2,0	4,0	2,0	4,0	5,0	4,0	4,0	4,0	1,0	3,0				4,0	3,0	4,0	5,0	4,0	5,0	3,0		3,0		3,0		3,0	1,0	3,0	3,0	2,0	2,0	85,00
NUBLADO		1,0		1,0				1,0		1,0						2,0					1,0	3,0	1,0	3,0			2,0	1,0	1,0	1,0	2,0	1,0	22,00
LLUVIOSO		2,0		2,0						3,0												2,0		2,0				2,0		1,0		2,0	16,00
		9,0		9,0		9,0		9,0		9,0		3,0		-		9,0		9,0		9,0		9,0		9,0		3,0		9,0		9,0		9,0	123,00

	17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		TOTAL HORAS
	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	M	T	
SECO	4,0	5,0	3,0	3,0	4,0	3,0					4,0	4,0	2,0	2,0	4,0	5,0	4,0	3,0	4,0	4,0	3,0				4,0	3,0	4,0	5,0	4,0	4,0	85,00
NUBLADO			1,0	1,0		1,0	3,0					1,0		3,0				2,0		1,0						1,0				1,0	15,00
LLUVIOSO				1,0		1,0								2,0												1,0					5,00
		9,0		9,0		9,0		3,0		-		9,0		9,0		9,0		9,0		9,0		3,0		-		9,0		9,0		9,0	105,00

	TOTAL	
	MAÑANA	TARDE
SECO	96,0	74,0
NUBLADO	11,0	28,0
LLUVIOSO	-	21,0
	107,0	123,0

CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EN EL MES DE AGOSTO DE 2023

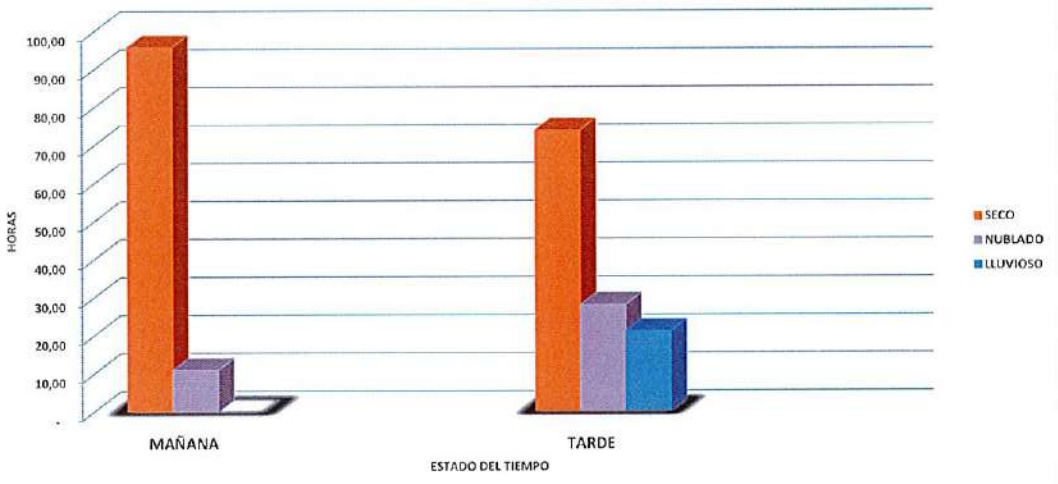

CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
DIRECTOR DE OBRA
No Mat. _____

MARTHA JOHANA SANCHEZ NUMPAQUE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. _____

* EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

ANEXO C

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja de Fecha 25 | 08 | 2023 DD MM AA	OBJETO	Tocancipá Alcaldía de

CONTRATO No. CTO 440 MT 2022

ACTA No 13 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ CONVENIO ☐

CONTRATISTA Consorcio Tocancipa IT-Oscar Julio Perez.
(Escriba el nombre o razon social del contratista)

INTERVENTOR Ingelco Proyectos EU - R.L Jorge Pulido Cuadros
(Escriba el nombre o razon social del interventor)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Megaly Merchán	Apoyo Supervisión	
Oscar Julio Perez P.	Rep Legal Cons.	
Victor Gonzalo Pulido	Residente Interven	
Fabio García M.	Apoyo Interventoría	

II. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja de Fecha 25 | 08 | 2023 DD MM AA	OBJETO	Alcaldía de Tocancipá

CONTRATO No. CTO 440 MT 2022.

ACTA No 13 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ CONVENIO ☐

III. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja de Fecha 25 08 2023 DD MM AA	OBJETO	Tocancipá Alcaldía de

CONTRATO No. CTO 440 MT 2022.

ACTA No 13 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ CONVENIO ☐

IV. TEMAS TRATADOS

1) Se verifica q' ya se ejecutó actividades principales cuarto de bomba (agua potable)
2) Ya se instalo red eléctrica, tablero salidas alumbrado y tomacorrientes del cuarto de bomba (agua potable)
3) Se instalo ducto de 6" red contraincendios desde punto de salida administrativa hasta el tanque.
4) Se inicio pintura administrativo y edificio alojamiento incluye reparación fachada
5) Se tuvo problema en la consecucion de la teja área administrativa que esta rota por el viento y ocasionó desgarre, al contratista ya la consiguio y se hará cambio de la misma.
6) Se entregaron en obra gabinetes de red contraincendio con sus accesorios de fijación y conexión
7) La próxima semana se harán las revisiones de filtraciones en los techos de los dos edificios por daño láminas dry wall.
8) Se hará inspeccion ducto de agua potable por daño tubería.

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja de Fecha 25 | 08 | 2023 DD MM AA	OBJETO	Alcaldía de Tocancipá

CONTRATO No. CTO 440 HT 2022.

ACTA No 13 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ CONVENIO ☐

A. DECISIONES TOMADAS

9) La supervision va a colaborar en la revision de fuga de aguas ya que cuenta con el equipo requerido.

10) Teniendo en cuenta la aprobacion de serie 1, se radico ante Codensa el serie 3 de fecha de radicacion en julio de 2023 y al 3 de Agosto se hicieron observaciones al proyecto las cuales se estan resolviendo

11)

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja de Fecha 25 | 08 | 2023 DD MM AA	OBJETO	Alcaldía de Tocancipá

CONTRATO No. CTO AAC MT 2022.

ACTA No 13 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ CONVENIO ☐

B. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
-Radicar respu estas a observa ciones a Codensa.	Oscar Julio Perez.	Próxima semana.
-Personal alcaldia revisará fuga agua con suscriptores y personal	Supervision	29/08/2023
-Se reanudan comité obra viernes 10am x 8dias y sobre c/8dias a las 10:00 am.	Alcaldia	Todos los viernes

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA			HORA			
D	M	A	10:00			
1	09	2023	AM ✓		PM	

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja de Fecha 01 Sep 2023 DD MM AA	OBJETO	Tocancipá Alcaldía de

CONTRATO No. CTO 440 HT 2022

ACTA No 14 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ CONVENIO ☐

CONTRATISTA Consorcio Tocancipa IT-Oscar Julio Perez
(Escriba el nombre o razon social del contratista)

INTERVENTOR Ingelco Proyectos EU- R-L Jorge Pulido Cuadrado
(Escriba el nombre o razon social del interventor)

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
Maguly Merchan	Apoyo supervision	
Oscar Julio Pérez.	Rep legal consorcio	
Victor Gonzalo Pulido	Rep. Interventoria	
Fabio García Melo	Apoyo interventoria	

II. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja de Fecha 01 | Sep | 2023 DD MM AA	OBJETO	Tocancipá Alcaldía de

CONTRATO No. CTO 440 HT 2022

ACTA No 14 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ CONVENIO ☐

III. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja de Fecha 01 Sep 2023 DD MM AA	OBJETO	Alcaldía de Tocancipá

CONTRATO No. CTO 440 MT 2022

ACTA No 14 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ CONVENIO ☐

IV. TEMAS TRATADOS

1). Arreglo tejas edificio administrativo. ya se empezaría hoy, ya se hizo revisión fugas del mismo

2) Para el día martes en horas de la noche los técnicos irán a hacer revisión para la fuga de agua.

3) Enel. Codensa → se sacan certificados tradición y libertad pendiente, se envía para la próxima semana llegue el respectivo radicado lunes ó martes.

4) Ya se presento producto a la interventoría para impermeabilización de tanques de agua potable.

5) Contratista presenta fotos referencia divisiones de baño marca SOCODA, aún pendiente aprobación (divisiones baños), ya se envió y se hi

6) Ya se hizo pago del 50% del trafo de 45 KVA para subestación, posible entrega finales octubre 2023

127

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja de Fecha 01 | Sep | 2023 DD MM AA	OBJETO	Alcaldía de Tocancipá

CONTRATO No. CTO 440 MT 2022

ACTA No 14 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ CONVENIO ☐

A. DECISIONES TOMADAS

Powered by CamScanner

	ACTA DE COMITÉ	CODIGO: GI-F002 VERSION: 002 FECHA: FEBRERO 2012
Hoja de Fecha 01 | Sep | 2023 DD MM AA	OBJETO	Alcaldía de Tocancipá

CONTRATO No. CTO 410 NT 2022

ACTA No 14 DE COMITE DE

SUMINISTRO ☐ CONSULTORIA ☐ OBRA ☒ CONVENIO ☐

B. COMPROMISOS PACTADOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA			HORA			
D	M	A				
			AM		PM	

Powered by CamScanner

ANEXO D

Listado de los Gestores de RCD Inscritos ante La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Fecha de actualización: Enero 17 de 2023

CANCELADO/ Registro como Gestor es retirado de manera definitiva

SUSPENDIDO/ Registro como Gestor es retirado temporalmente debido al incumplimiento de las obligaciones

ACTIVO / Registro en operación sujeto a seguimiento y control

GESTORES- SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD INSCRITOS EN LA CAR VIGENCIA ANTERIOR A LA RESOLUCION MADS No. 0472

No. DE REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO DEL REGISTRO	OBSERVACIÓN ESTADO DEL REGISTRO	MUNICIPIO	PREDIO/ LOCALIZACIÓN	TIPO DE RCD A DISPONER	CONTACTO
1	MAGIR S.A.S. – ESP	ACTIVO	NA	SOACHA	Vereda Panamá	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel.: 320 830 6335
2	EL VINCULO	ACTIVO	NA	SOACHA	KM. 14 Vía Soacha Sibaté	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos. • No pétreos.	Tel.: 7251891
3	LA ESCOMBRERA	CANCELADO	SIN VIGENCIA	GIRARDOT	Vereda Potrerillo Km 3 via Girardot - Nariño.	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel.: 8889526

GESTORES- SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD INSCRITOS EN LA CAR EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES MADS No. 0472 DE 2017 y 1257 DE 2021

No.DE REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO DEL REGISTRO	OBSERVACIÓN ESTADO DEL REGISTRO	MUNICIPIO	PREDIO/ LOCALIZACIÓN	TIPO DE RCD A DISPONER	CONTACTO
1	FUNDACIÓN DIA AZUL FUTURO VERDE	ACTIVO	NA	SIBATÉ	Predio El Triunfo/ Vereda Chacua Finca Chuscalito	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3219949007
2	MINERSA	ACTIVO	NA	LA CALERA	Vereda Aurora Alta	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel.: 317 4863
3	LAGUNA BLANCA	CANCELADO	No se allegaron los documentos de actualización solicitados por la CAR.	BOJACÁ	Predio Laguna Blanca/ Vereda Barro Blanco	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3138054034

"La inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro".

151

Listado de los Gestores de RCD Inscritos ante La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Fecha de actualización: Enero 17 de 2023

GESTORES- SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD INSCRITOS EN LA CAR EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES MADS No. 0472 DE 2017 y 1257 DE 2021							
No.DE REGISTRO	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**ESTADO DEL REGISTRO**	**OBSERVACIÓN ESTADO DEL REGISTRO**	**MUNICIPIO**	**PREDIO/ LOCALIZACIÓN**	**TIPO DE RCD A DISPONER**	**CONTACTO**
4	EMPRESA SAN JOSE GREEN GROUP SAS	ACTIVO	NA	SOACHA	Predio San José / Vereda Panamá Frente al Parque Cagua	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3106665535
5	PREDIO LA ESPERANZA	**CANCELADO**	Medidas Mínimas de Manejo Ambiental	BOGOTA RURAL	Predio la Esperanza/ Buenos Aires la Esperanza, Ciudad Bolívar Mochuelo Alto	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3102449382
6	CAMPO ALEGRE BAJO	ACTIVO	NA	FUSAGASUGÁ	Predio Campo Alegre/ Vereda La Venta	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3229466027
7	AGREGADOS Y RELLENOS TERRENA SAS	ACTIVO	NA	MOSQUERA	Vereda Balsillas	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3204946725
8	CONSORCIO VIAL RUTA 40	ACTIVO	NA	FUSAGASUGÁ	Predio El Cielo/ Sector Chinauta costado derecho de la vía principal.	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3104169000
9	CONSORCIO VIAL RUTA 40	ACTIVO	NA	FUSAGASUGÁ	Predio el Trapiche/ Vereda Resguardo	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3104169000
10	CONSORCIO VIAL RUTA 40	ACTIVO	NA	FUSAGASUGÁ	Predio Codemas/ Vía Bogotá-Girardot, Km 1.5 después del peaje de Chinauta costado derecho.	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3104169000
11	INVERSIONES MR INGENIERIA SAS	SUSPENDIDO	No Operación	SOACHA	Predio Buena Vista	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel:3106665535
12	CIA QUÍMICA Y MINERA DE COLOMBIA SAS	ACTIVO	NA	TOCANCIPÁ	Predio El Triunfo/ Vereda Canavita	• Productos de excavación y sobrantes de la • adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel:4775008 Cel:3213415059,
13	ALCALDIA DE MOSQUERA	ACTIVO	NA	MOSQUERA	Predio Montanel lotes 1 y 2 /Vereda Balsillas	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel: 8928061 - 3213477404

"La inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro".

Listado de los Gestores de RCD Inscritos ante La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Fecha de actualización: Enero 17 de 2023

GESTORES - PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD INSCRITOS EN LA CAR EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES MADS No. 0472 DE 2017 y 1257 DE 2021							
No. DE REGISTRO	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**ESTADO DEL REGISTRO**	**OBSERVACIÓN ESTADO DEL REGISTRO**	**MUNICIPIO**	**PREDIO/LOCALIZACIÓN**	**TIPO DE RCD A APROVECHAR**	**CONTACTO**
1	SECAM JR SAS	ACTIVO	NA	BOGOTA RURAL	Lote 4/ Carrera 7 D Este Calle 115 Sur	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel.: 3015981851
2	DROMOS	ACTIVO	NA	MOSQUERA	Kilómetro 3.8 Zona Industrial Vereda Balsillas	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel.: 742 5376
3	INCOMINERÍA SAS	ACTIVO	NA	MOSQUERA	Kilómetro 3.5 Zona Industrial Vereda Balsillas (Entrada Los puentes)	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel.: 322 475 2219
4	CICLOMAT	SUSPENDIDO	Medidas Mínimas de Manejo	COTA	Autopista Medellín Kilómetro 1.2 vía Siberia – Bogotá entrada Parque Industrial La Florida	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel.: 487 4315
5	CICLOMAT - CODEOBRAS	ACTIVO	NA	COTA	Autopista Medellín Kilómetro 1.6 vía Siberia – Bogotá entrada Parque Industrial La Florida	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel.: 487 4315
6	AGREGADOS ARENAS Y GRAVAS S.A.S	ACTIVO	NA	TENJO	Vía Siberia - Medellín Kilómetro 3 Vereda La punta	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3003114712
7	CUNDICOAL SAS	ACTIVO	NA	COGUA	Kilómetro 7 vía Zipaquirá - Ubaté Vereda El Olivo	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel.: 311 477 1536
8	UAERMV	ACTIVO	NA	BOGOTA RURAL	Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilómetro 3 Vía Pesquilla Ciudad Bolívar	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel.: 747 0909
9	EL VINCULO	ACTIVO	NA	SOACHA	KM. 1.4 VIA SOACHA SIBATE	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel.: 7251891
10	PUENTE PIEDRA S.A.S.	SUSPENDIDO	Medidas Mínimas de Manejo	MADRID	Vereda La Cuesta	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel:3187509487
11	TRANSFORMACION NATURAL S.A.S	SUSPENDIDO	NA	MOSQUERA	Vereda Balsillas	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel:3187509487

"La inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro".

Listado de los Gestores de RCD Inscritos ante La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Fecha de actualización: Enero 17 de 2023

GESTORES - PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD INSCRITOS EN LA CAR EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES MADS No. 0472 DE 2017 y 1257 DE 2021							
No. DE REGISTRO	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**ESTADO DEL REGISTRO**	**OBSERVACIÓN ESTADO DEL REGISTRO**	**MUNICIPIO**	**PREDIO/LOCALIZACIÓN**	**TIPO DE RCD A APROVECHAR**	**CONTACTO**
12	CMOP (Centro de Mantenimiento, Operación y Producción) MHC - MARIO HUERTAS COTES	ACTIVO	NA	MADRID	Km 12 Vía Bogotá - Medellín	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3204903172
13	Granulados Reciclados de Colombia - GRECO S.A.S	ACTIVO	NA	COTA	Vereda Siberia, sector La Florida en la zona agroindustrial	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3138876569
14	GRANJEROS S.A.S	ACTIVO	NA	MOSQUERA	Vereda Balsillas	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel :3203045038
15	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA	ACTIVO	NA	COTA	Km 1.5 Costado sur Vía Bogotá -Siberia	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel:3182153129
16	ALBORAL S.A.	ACTIVO	NA	MOSQUERA	Vereda Balsillas	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3153393288
17	CONSORCIO DESARROLLOS ECO-AMBIENTALES	CANCELADO	Medidas Mínimas de Manejo Ambiental	SOACHA	Predio San Carlos/ Vereda Panamá	• Productos de excavación y sobrantes de laadecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel: 4757313 Cel:3134207029
18	LAMINADOS JAB S.A.S	ACTIVO	NA	SOACHA	Carrera 13 No. 3-22 sur sector de Santa Ana	No pétreos (Materiales ferrosos)	Cel: 3002146821
19	CENTRO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -CARCD	ACTIVO	NA	MOSQUERA	Vereda Balsillas	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3124326986 - 312432699
20	C.C.Q. CONSTRUCCIONES S.A.S.	CANCELADO	No se iniciaron las actividades de Gestión de los RCD	BOJACA	Vereda Fute	• Productos de excavación y sobrantes de laadecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3208483448
21	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA	ACTIVO	NA	MOSQUERA	Predio Finca Las Juntas Lote 10/ Vereda San José	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3182153129
22	ASMINCOL	ACTIVO	NA	SIBATE	Vereda La Unión costado occidental de la Represa Del MUÑA, Vía INDUMIL	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3102886432

"La inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro".

Listado de los Gestores de RCD Inscritos ante La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Fecha de actualización: Enero 17 de 2023

GESTORES - PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD INSCRITOS EN LA CAR EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES MADS No. 0472 DE 2017 y 1257 DE 2021							
No. DE REGISTRO	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**ESTADO DEL REGISTRO**	**OBSERVACIÓN ESTADO DEL REGISTRO**	**MUNICIPIO**	**PREDIO/LOCALIZACIÓN**	**TIPO DE RCD A APROVECHAR**	**CONTACTO**
23	AGENCIA NACIONAL DE RECUPERACIONY RECICLAJE	SUSPENDIDO	Medidas Mínimas de Manejo Ambiental	MOSQUERA	Vereda Balsillas	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3187509487
24	AGREGADOS LA PUNTA SAS	SUSPENDIDO	Medidas Mínimas de Manejo Ambiental	MADRID	Predio Rute/ Vereda La Punta	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3188979849
25	SAN JOSE GREEN GROUP SAS	ACTIVO	NA	SOACHA	Predio San José / Vereda Panamá Frente al Parque Cagua	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3106665535
26	CORESA	CANCELADO	NA	BOJACA	Vereda Barroblanco	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel:3134201910
27	COMINERALES SAS	ACTIVO	NA	NEMOCÓN	Vereda Patio Bonito/ Sector La Ruidosa	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel:3124633503
28	ARENAS HIMALAYA	CANCELADO	NA	BOJACA	Predio Santa Barbara / Vereda Santa Barbara	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes:arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3228475920 / 3155283352
29	COMTRIRED S.A.S	ACTIVO	NA	COGUA	Km 7 vía Zipaquirá Ubaté Vereda el Olivo	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3208338192
30	SECAM JR EU	ACTIVO	NA	SOACHA	Predio El Tesoro, Lote No. 1 / Vereda Panamá	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3144649098
31	SOCIEDAD RENACIMIENTO MINEROS SAN SEBASTIÁN SAS, "SOREMISBA S.A.S.	CANCELADO	NA	SOACHA	Planta en el predio denominado San Sebastián, en la vereda Panamá	• Productos de excavación y sobrantes de laadecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 320 4725207

"La inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro".

Listado de los Gestores de RCD Inscritos ante La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Fecha de actualización: Enero 17 de 2023

GESTORES - PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD INSCRITOS EN LA CAR EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES MADS No. 0472 DE 2017 y 1257 DE 2021							
No. DE REGISTRO	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**ESTADO DEL REGISTRO**	**OBSERVACIÓN ESTADO DEL REGISTRO**	**MUNICIPIO**	**PREDIO/LOCALIZACIÓN**	**TIPO DE RCD A APROVECHAR**	**CONTACTO**
32	AGREGADOS ARENAS Y GRAVAS S.A.S	CANCELADO	No se iniciaron las actividades de gestión delos RCD	TENJO	Planta: Predio Villa Lucy, Vereda la Punta, Municipio de Tenjo, costado norte de la Autopista Medellín.	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3105691679
33	INGRACO S.A.	CANCELADO	NA	CAJICÁ	Predio Lote Santana/ Vereda Río Grande	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3144649098 Fijo: 8273216
34	BGM INGENIERÍA CONSTRUCCIONES SAS	ACTIVO	NA	MOSQUERA	Predio Lote 5B/ Vereda Balsillas	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3203451697
35	LOS EUCALIPTOS	CANCELADO	NA	SOACHA	Municipio de Soacha	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes:arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3144649098
36	INGENIERIA AMBIENTAL Y LABORAL SAS.INGENIAL COLOMBIA	CANCELADO	NA	SOACHA	Carrera 5 No. 9-15 Sur Santa Ana	• No Pétreos (Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimientos de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera o cartón-yeso ,drywall),	Cel: 312 3844100
37	MATERIALES Y LOGÍSTICA S.A.S	ACTIVO	NA	TENJO	Predio Lote No. 6/ Km 1 vía la Punta Funza/ Vereda la Punta	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3015531529
38	GEOMINERAL OPERATIVO S.A.S.	ACTIVO	NA	SOACHA	Mina el Cielo/ Vereda Fusunga.	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3223172755 / 3144649098
39	PROYECTO PA&CO	ACTIVO	NA	COTA	Km 2 Vía Cota-Chía	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel: 720 6251
40	COMPAÑÍA QUÍMICA Y MINERA DE COLOMBIA - CQMC	ACTIVO	NA	TOCANCIPÁ	Predio Lubeka/ VeredaTibitó, frente al parque Jaime Duque	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel:4775008 Cel:3213415059,
41	CONSORCIO RUTA 40	ACTIVO	NA	FUSAGASUGÁ	Predio El cielo/ Predio El Trapiche/Predio Codemas.	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 310 4169000

"La inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro".

Listado de los Gestores de RCD Inscritos ante La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Fecha de actualización: Enero 17 de 2023

GESTORES - PLANTAS DE APROVECHAMIENTO DE RCD INSCRITOS EN LA CAR EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES MADS No. 0472 DE 2017 y 1257 DE 2021

No. DE REGISTRO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	ESTADO DEL REGISTRO	OBSERVACIÓN ESTADO DEL REGISTRO	MUNICIPIO	PREDIO/LOCALIZACIÓN	TIPO DE RCD A APROVECHAR	CONTACTO
42	OBRAS Y SUMINISTROS GFM S.A.S.	SUSPENDIDO	No Operación	Soacha	Predio San Sebastián-Vereda Panamá	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3213002131
43	TECNOCIVILES LTDA	SUSPENDIDO	No Operación	SOACHA	Predio Aguazuque	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel.: 3108800740
44	TECNOCIVILES LTDA	CANCELADO	NA	SOACHA	Predios Santa Isabel y El Espanto/ Sector el Tuso, vereda Panamá	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes:arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel.: 3108800740
45	ECOCICLUS GESTION S.A. S	ACTIVO	NA	MOSQUERA	Predio los Andes/ Vereda Balsillas- Sector Parcelas.	No pétreos (Drywall)	Cel: 321 438731
46	ARENAS Y ROCAS VILLA MARIA S.A.S	ACTIVO	NA	SOPÓ	Predio La Diana/ Vereda Pueblo Viejo.	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3212358252
47	ALCALDIA DE MOSQUERA	SUSPENDIDO	No Operación	MOSQUERA	Predio Montanel lotes 1 y 2 /Vereda Balsillas	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel: 8928061 - 3213477404
48	INGENIERIA CIVIL Y TRANSPORTE S.A.S.	SUSPENDIDO	No Operación	MOSQUERA	Predio Lote 7B / Mondoñedo Vereda Balsillas	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3014228164
49	INCOMINERIA S.A.S	ACTIVO	NA	SOACHA	Predio Cascajal/ Vereda Panamá	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel: 7425644 – 3143932133 - 3187758659
50	CONSORCIO VIAL RUTA 40	ACTIVO	NA	SOACHA	Predio Aritur-Predio La Floresta / Vereda Alto de La Cruz	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	CeL: 3104169000
51	INVERSIONES MR INGENIERIA SAS	ACTIVO	NA	SIBATÉ	Predio LT1 Vereda La Unión	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel:3106665535

"La inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro".

137

Listado de los Gestores de RCD Inscritos ante La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Fecha de actualización: Enero 17 de 2023

GESTORES - PUNTOS LIMPIOS DE RCD INSCRITOS EN LA CAR EN EL MARCO DE LAS RESOLUCIONES MADS No. 0472 DE 2017 y 1257 DE 2021							
No. DE REGISTRO	**NOMBRE O RAZON SOCIAL**	**ESTADO DEL REGISTRO**	**OBSERVACIÓN ESTADO DEL REGISTRO**	**MUNICIPIO**	**PREDIO/ LOCALIZACIÓN**	**MATERIALES PARA ALMACENAR Y CLASIFICAR**	**CONTACTO**
1	PLANTA PRODUCTIVA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS Y CULTIVOS DE FRUTAS TIPO EXPORTACIÓN - EXPORHUILA S.A.S	CANCELADO	Cambio de Predio definido para las actividades de gestión de los RCD	COTA	INTEXZONA LOTE 93/ VEREDASIBERIA	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes:arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3108583796
2	MAAT SOLUCIONES AMBIENTALES	ACTIVO	NA	COTA	Autopista Medellín Km 3.9- vía Bogotá- Siberia	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Tel: 7425410
3	AGREGADOS ARENAS Y GRAVAS S.A.S.	ACTIVO	NA	TENJO	Predio Lote No. 6/ Vía Siberia - Medellín Kilómetro 3 Vereda La punta	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3003114712
4	CORESA	CANCELADO	NA	BOJACA	Vereda Barro Blanco	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes:arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel:3134201910
5	COMINERALES SAS	CANCELADO	NA	TAUSA	Predio La Rosa / Vereda Rasgata Bajo	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes:arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel:312463350
6	AGREGADOS ARENAS Y GRAVAS S.A.S	CANCELADO	No se iniciaron las actividades de gestiónde los RCD	TENJO	Predio Villa Lucy	• Productos de excavación y sobrantes de laadecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel: 3003114712
7	PROYECTO PA&CO	ACTIVO	NA	COTA	Km 2 -Vía Cota-Chía	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno. • Productos de cimentaciones y pilotajes: arcillas, bentonitas y demás. • Pétreos.	Cel.: 311 7206251
8	ASOCIACIÓN NACIONAL DE RECUPERADORES AMBIENTALES E.S.P	ACTIVO	NA	FUNZA	Cra 9 # 19-35 Barrio La Aurora	• No Pétreos (Vidrio, metales como acero, hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimientos de zinc o estaño, plásticos tales como PVC, polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, compuestos de madera o cartón-yeso ,drywall),	Cel.: 3015290415

"La inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro".

Listado de los Gestores de RCD Inscritos ante La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR
Fecha de actualización: Enero 17 de 2023

SITIOS APROBADOS DE ADECUACIÓN DE SUELOS CON FINES AGRÍCOLAS – CAR							
No.	NOMBRE / RAZON SOCIAL	MUNICIPIO	LOCALIZACION	AUTO DECISORIO	MATERIALES PARA DISPONER	VIGENCIA	CONTACTO
1	PRACTICAS AMBIENTALES S.A.S	MOSQUERA	La Merindad 1 y 2 Vereda San Jorge	Res. 2660 del 21/11/2014	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno	Vigente	Tel.: 757 9729
2	SOCIEDAD PAISAJO S.A.S	MOSQUERA	Vereda San José	Res. 2325 del 2015	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno	Vigente	Cel.: 316 2254
3	RAFAEL ROMERO	MOSQUERA	Vereda San Jorge	Res. 3976 del 14/12/2017	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno	Vigente	Cel.: 321 365 3360
4	JAIME WILLS	MOSQUERA	Vereda San José	Res. 2895 del 29/09/2017	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno	Vigente	Tel.: 636 4465
6	TRANSPORTES LAMD	MOSQUERA	Vereda Balsillas	Res. 0726 del 18/03/2019	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno	Vigente	Cel.: 3212010645
7	INDUSTRIA AGRICOLA Y PECUARIA EL INTERIOR Ltdo. INAPIN Ltda.	COTA	Km 4.9 Vía Siberia -Cota	Res. 0975 del 03 /04/2019	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno	Vigente	Cel: 320 3394716
9	FUNDACIÓN SEMILLEROS DE EMPRENDIMIENTO	SOACHA	Predio Santa Ana/ Vereda Canoas	Res. DGEN No. 20207100963 de 18/09/2020	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno	Vigente	Cel: 3138771273 Cel: 3133526600
10	SOCIEDAD AGROPECUARIA JARDÍN S.A.S – SOCIEDAD INVERSIONES NORMANDÍA S.A.S	MOSQUERA	Predio El Danubio/ Granja La RinconadaVereda San Francisco	Res. DGEN No. 20207100959 del 17/09/2020	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno	Vigente	Cel: 3132827707
11	GERMAN ALFREDO SANCHEZ SIERRA	MOSQUERA	Predio El Ruby-Predio Normadia PTE-Predio La Dorita-Lote7-Lote $	Res. DGEN No. 20217000145 del 08/04/2022	• Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno	Vigente	NR
12	MARQUEZ OCHOA Y CIAS. ENC. – CIVIL-	MOSQUERA	Predio Chijua - Vereda San Francisco	Res. DGEN No. 20227000057 de 4/02/2022	•Productos de excavación y sobrantes de la adecuación de terreno	Vigente	Cel: 3105478806

"La inscripción no implica permisos o autorizaciones ambientales diferentes al registro".

REPUBLICA DE COLOMBIA
ORGANIZACIÓN ELECTORAL
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

E-27

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL

DECLARAMOS

Que, **JORGE ANDRES PORRAS VARGAS** con C.C. **79882688** ha sido elegido(a) **ALCALDE** por el Municipio de **TOCANCIPA - CUNDINAMARCA**, para el periodo de **2020** al **2023**, por el **PARTIDO COAL. CONSERVADOR COL. - COL. RENACIENTE - COL. JUSTA LIBRES.**

En consecuencia, se expide la presente CREDENCIAL, en TOCANCIPA (CUNDINAMARCA), el domingo 03 de noviembre del 2019.

JAVIER ANDRES CHAPARRO GUEVARA
MIEMBROS DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

JUDIETH NAYIBE ROJAS AVILA

OLGA REGINA BASTIDAS CAICEDO
SECRETARIO(S) DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA

140

ACTA DE POSESIÓN DEL DOCTOR JORGE ANDRES PORRAS VARGAS COMO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA CUNDINAMARCA

Ante mí **RAMIRO PEÑA CORTES**, Notario Único del círculo de Tocancipá Cundinamarca, hoy veintisiete (27) del mes de Diciembre de dos mil diecinueve (2.019), compareció el doctor **JORGE ANDRES PORRAS VARGAS**, quien se identificó con la cédula de ciudadanía número 79.882.688 expedida en Bogotá, con el fin de tomar posesión del cargo de Alcalde Municipal de Tocancipá Cundinamarca para el que resultó electo en el periodo constitucional 2.020 – 2.023, en las elecciones públicas llevadas a cabo en el Municipio de Tocancipá Cundinamarca, el día 27 del mes de Octubre de 2.019, conforme a la Credencial expedida por la Comisión Escrutadora de Tocancipá Cundinamarca, el día tres (3) del mes de noviembre de dos mil diez y nueve (2.019) y cuyo comprobante exhibió y aporto el compareciente. En tal virtud el señor Notario único del Círculo de Tocancipá Cundinamarca, procedió a recibirle al electo y compareciente el juramento de rigor, previa imposición del Artículo 94 de la ley 136 del 02 de Junio de 1.994, al tenor de los siguientes términos "JURA A DIOS Y PROMETE AL PUEBLO CUMPLIR FIELMENTE LA CONSTITUCION, LAS LEYES DE COLOMBIA, LAS ORDENANZAS Y LOS ACUERDOS? Al juramento CONTESTO: " si lo juro", A LO CUAL EL FUNCIONARIO DIJO "SI ASI LO HICIERE QUE DIOS Y LA PATRIA OS LO PREMIEN Y SI NO QUE EL Y ELLA OS LO DEMANDEN". El posesionado presentó los siguientes documentos: Fotocopia de la cédula de ciudadanía, Certificado Judicial y de Policía, Certificado Especial para Alcalde de Antecedentes Disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la Nación, Fotocopia de la Credencial E-27 de Alcalde Electo, Póliza de Seguro de Manejo expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia, Hoja de vida, Declaración Juramentada de Bienes que posee el compareciente, su cónyuge, Declaración extrajuicio de Alimentos, Antecedentes Fiscales, expedido por la Contraloría General de la Nación, la Certificación expedida por la Escuela Superior de Administración Pública, afiliación a seguridad social Sanitas y Colpensiones por encontrarse afiliado a salud y pensión, libreta militar, rut, Certificado de Carencia nacional de medidas Correctivas.

No siendo otro el objeto de la presente diligencia se firma para constancia por los que en ella han intervenido, tal como aparece.

Para efectos Fiscales, esta posesión rige a partir del primero (1°) del mes de Enero de 2.020.

JORGE ANDRES PORRAS VARGAS

RAMIRO PEÑA CORTES - NOTARIO

27 DIC 2019

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.682.688
PORRAS VARGAS
APELLIDOS
JORGE ANDRES
NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 10-AGO-1980
TOCANCIPA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

21-AGO-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1529200-00584368-M-0079682088-20140609 0038903953A 1 42759816

ANEXO:

FOTOS DE LAS EDIFICACIONES TERMINADAS DEL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA – CRIR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ



Foto No1. Edificaciones del CRIR terminados, Ed. Operativo - Ed. Alojamientos.

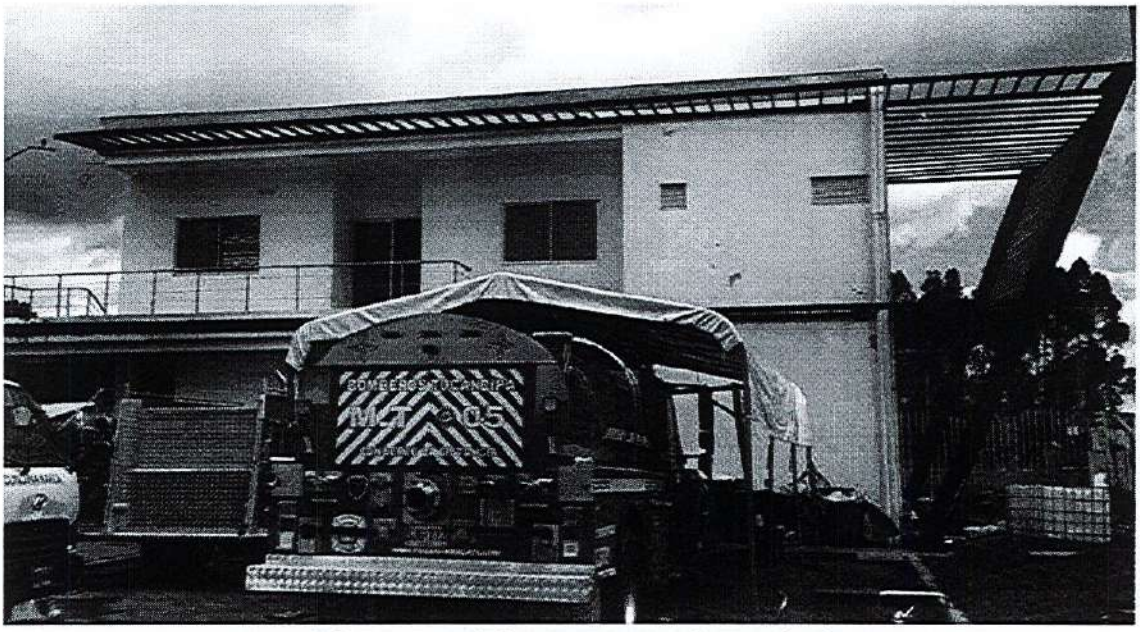


Foto No2. Edificaciones del CRIR terminados - Ed. Alojamientos.



Foto No3. Edificaciones del CRIR terminados - Ed. Operativo.

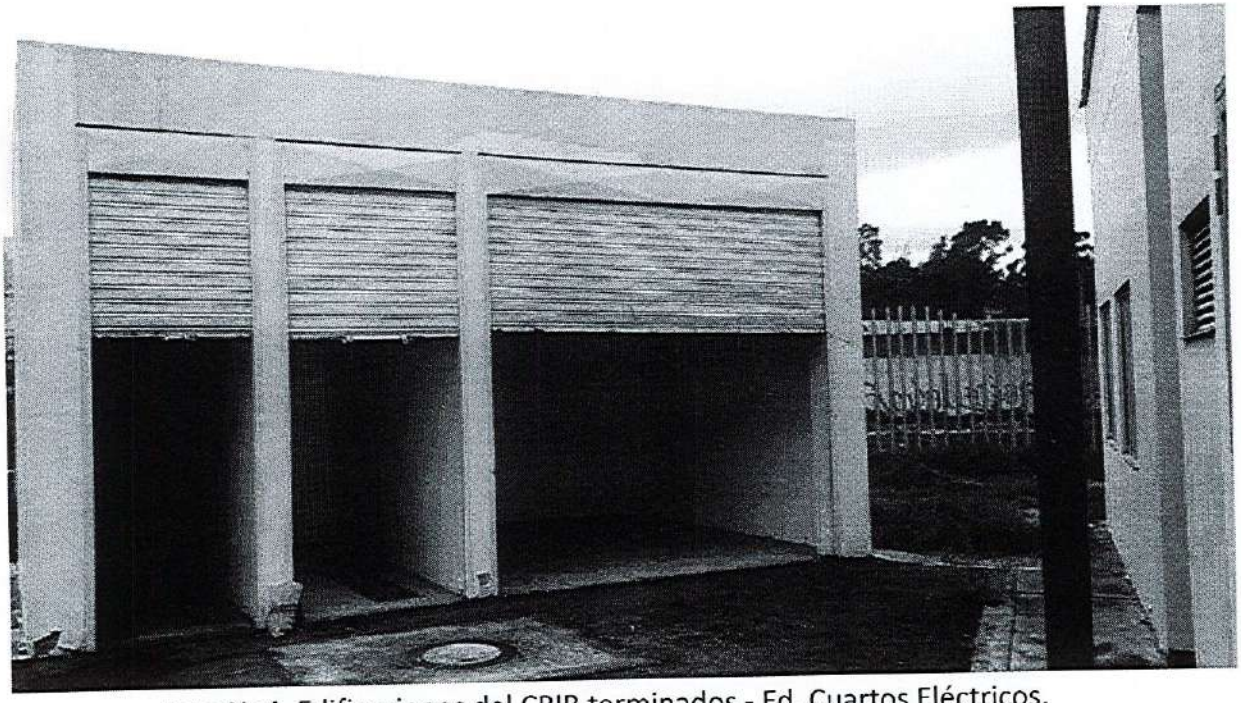


Foto No4. Edificaciones del CRIR terminados - Ed. Cuartos Eléctricos.

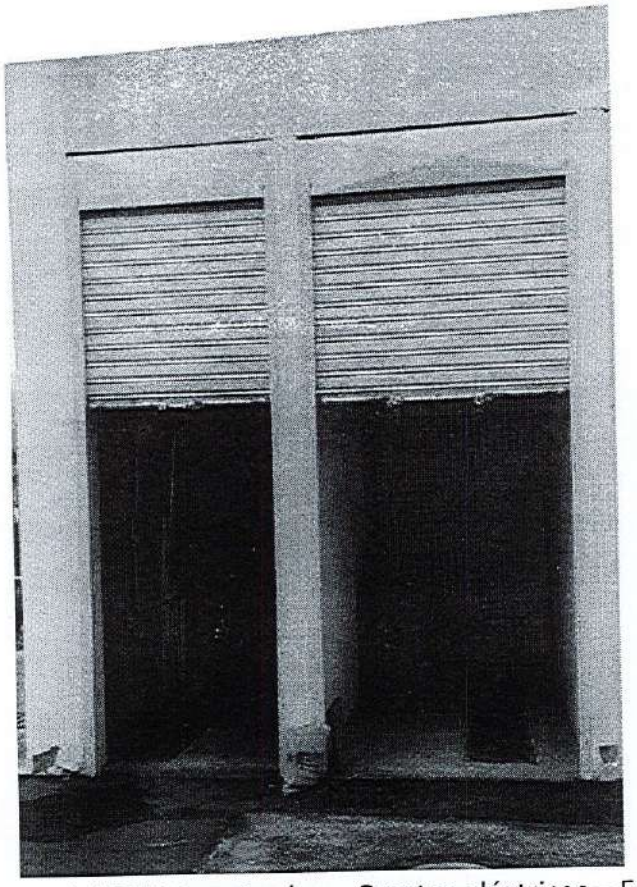


Foto No5. Edificaciones del CRIR terminados – Cuartos eléctricos – Eq. de medida y TGD.

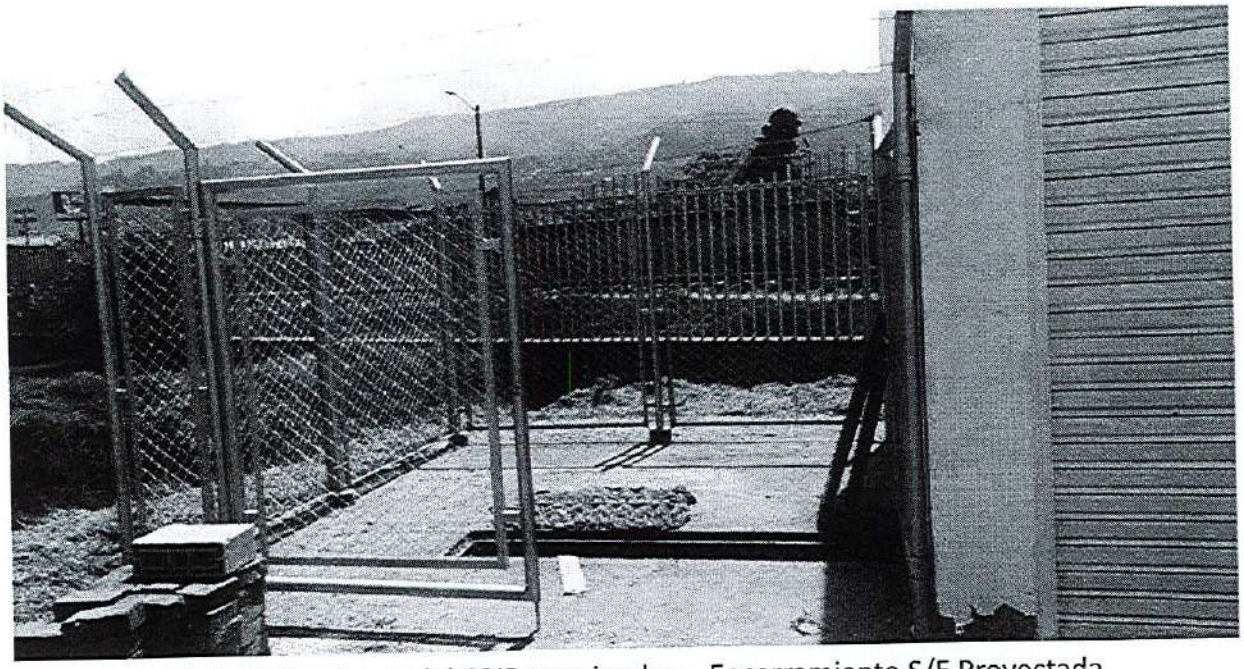


Foto No6. Edificaciones del CRIR terminados – Encerramiento S/E Proyectada.

ATS TOOLS & SERVICES
GESTIÓN DE PROYECTOS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN

Tocancipá, diciembre 22 de 2022 **PCD No. 10112022-09**

Arquitecta
MAGALY MERCHAN
Apoyo Supervisión / Infraestructura.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Asunto: **JUSTIFICACIÓN CAMBIO DE CABLE COBRE POR ALUMINIO ALIMENTADOR SUBESTACIÓN PROYECTADA CRIR (ITEM 5.1.39) - CONTRATOS DE OBRA CTO 440 MT 2022 E INTERVENTORIA CONTRATO CTO 459 MT 2022.**

Cordial saludo Arquitecta Magaly.

El motivo de la presente es dar a conocer las razones por la cual se solicita cambiar el Cable XLPE No 2 en Cobre de 15kV que se encuentra en el presupuesto, por Cable XLPE No 70mm (2/0AWG) en Aluminio de 15kV alimentador subestación proyectada de 75kVA.

-En cuanto a la parte económica se tiene en el presupuesto contratado 110m y se requiere adicionar 250m más para un total de 360m, el cable en Aluminio es más económico que el de Cobre y por lo tanto en el presupuesto no se elevaría ya que la diferencia en precio entre estos es del 50% más barato que el de Aluminio aproximadamente.

-Por otro lado, al instalarse el cable en Aluminio es menos atractivo en lo referente al hurto ya que suele suceder muy a menudo por el costo del cobre que cada vez está más elevado por lo cual ENEL CODENSA recomienda que se use cable en Aluminio en las nuevas instalaciones.

-En lo que tiene que ver en la parte técnica operativa eléctricamente es igualmente de eficiente el cable en Aluminio que el de cobre ya que por parte de capacidad de carga eléctrica a transportar se compensa con un calibre superior y como dato informativo el cable XLPE de MT que alimenta la subestación de Bomberos está en calibre 120mm en Aluminio.

Por lo expuesto anteriormente se considera que no hay ningún inconveniente ni alteraciones que afecten el diseño inicial del proyecto a lo que respecta al cambio de conductor de Cobre por Aluminio en lo técnico y muy favorable en cuanto lo económico como en la menor posibilidad de no ser hurtado en el futuro por su costo.

Agradeciendo la atención prestada,

Cordialmente.

Ing. Juvani Aguirre Neira.
Representante Legal.
ATS. Tools & Services.
Tels. Móvil +57 (1) 311-8692143 311-2173258

CONSORCIO TOCANCIPA LT

Tocancipá, 10 de agosto del 2023

Arquitecta
MAGALY MERCHAN
Apoyo supervisión / Infraestructura.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
Ciudad

Ref. Contrato No. CTO 440 MT 2022 — CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

ASUNTO: SOLICITUD DE DOCUMENTOS PEDIDOS POR ENEL CODENSA EN LAS OBSERVACIONES DE RESPUESTA RAD. No 1500346883. DEL PROYECTO SERIE 3. CON FACTIBILIDAD No 1500199183 - CRIR - MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.

Respetada Arquitecta, cordial saludo.

La presente con el fin de solicitarle los documentos pedidos por ENEL CODENSA por parte de La Alcaldía para completar las observaciones al proyecto serie 3 con radicado en referencia, las observaciones documentales son las siguientes.

1. *Al no requerir una licencia de construcción vigente, se debe adjuntar el certificado de libertad del predio.*
2. *La ubicación del transformador no está aprobada en plano de licencia. Se debe adjuntar carta firmada por el propietario autorizando la ubicación de la subestación.*

Agradezco de antemano la atención a la presente.

Cordialmente,

CONSORCIO TOCANCIPA I.T
RL OSCAR JULIO PEREZ PANQUEVA
CC No 7.165.049 de Tunja

KRA 21B 31-10
CEL 3142031767
Email: consorciotocancipai.t2022@gmail.com

147

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Tocancipá, 23 de mayo de 2023

Señores:
ENEL CODENSA

Ref: **RADICADO 1500312553 DEL 12 DE MAYO DE 2023**

Asunto: **INFORMACIÓN SOLICITADA PARA ADELANTAR REVISIÓN DE PROYECTO SERIE 1 y SERIE 3 PARA CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito informar que el proyecto CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA – CRIR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, fue construido durante la vigencia 2018 a 2020 mediante Resolución No 145 del 14 de Junio de 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA – CRIR – EN EL PREDIO CON MATRICULA CATASTRAL 25817020000100002000, 25817020000100001000 Y 25817020000100003000 Y MATRICULA INMOBILIARIA No 176-141193 EN EL CENTRO POBLADO URBANO SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA", encontrándose desde el año 2020 totalmente culminado arquitectónica y estructuralmente.

Que teniendo en cuenta lo anterior, y que las actividades a realizar producto del trámite de aprobación de proyecto eléctrico Serie 1, con radicado 1500312553 del 12 de mayo de 2023, no implican un cambio dentro del diseño interior y/o exterior a las condiciones arquitectónicas del inmueble y constituyen una ampliación de la red eléctrica, estas estarian enmarcadas como reparaciones o mejoras locativas, según se referencia dentro del artículo 8 de la Ley 810 de 2003, por lo cual NO se requiere Licencia de Construcción

Que igualmente dentro de los documentos aportados en el radicado, se presentó el formulario debidamente diligenciado, con datos del ingeniero Víctor Gonzalo Pulido Cuadros con C.C. 72.324.965, a quien le fue autorizada la revisión del diseño eléctrico y la realización de los respectivos trámites ante su entidad, a nombre del Municipio de Tocancipá propietario del proyecto en referencia.

Por lo anterior se adjunta nuevamente la Licencia de Construcción con la cual se construyó el proyecto donde se puede identificar los siguientes datos:

- Matricula Inmobiliaria: 176-141193
- Numero Catastral: 25817020000100001000, 25817020000100002000 y 25817020000100003000
- Dirección: Lotes La Esquina, La Estancia y El Porvenir, ubicados en el Centro Poblado Urbano San Javier, Vereda Verganzo del Municipio de Tocancipá
- Propietario: Municipio de Tocancipá

Igualmente se adjuntan los planos arquitectónicos sellados y aprobados por la Secretaría de Planeación dentro de la Resolución de Licencia 145 del 14 de junio de 2018

Agradeciendo su amable atención,

JORGE ANDRES PORRAS VARGAS
Alcalde del Municipio de Tocancipá

Proyectó: Arq. Fruccy Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suanca Pulido - Secretario de Infraestructura

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Tocancipá, 03 de Enero de 2023

S.I. 008-23

Señores:
INGELCO PROYECTOS E.U.
A/A JORGE PULIDO CUADROS
Representante Legal
ingelcoproyectos@gmail.com

Ref: **"CONTRATO 459 DE 2022 – INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS – CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA"**

Asunto: Pago de Servicios Públicos – Infraestructura Centro Regional Integral de Respuestas – CRIR

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito recordar a la interventoría que dentro de sus obligaciones Especificas dentro del contrato se encuentra:

4. *Realizar actividades de verificación, control y seguimiento de carácter técnico, referidas al cumplimiento de normas y especificaciones técnicas del contrato de obra y actividades de carácter administrativo, relacionadas con el control de uso de recursos humanos, técnicos, presupuestales, tiempos de ejecución, ejerciendo de esta manera la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental.*

Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha se informa sobre presunto incumplimiento en el pago de los servicios públicos provisionales y definitivos con los que cuenta la Infraestructura Centro Regional Integral de Respuestas – CRIR, los cuales por la ejecución del proyecto se encuentran a cargo del Contrato 440 de 2022 sobre el cual cumple labores como interventoria.

Así entonces se aclara los números de cliente en cada servicio público, para que realice el seguimiento y control respectivo al contratista de obra y se anexen en próximos informes copias de las facturas con sus respectivos pagos.

- ENEL CODENSA
  Número de cuenta: 6097437-2
  Cliente: MP Tocancipa Vereda Verganzo ST Colegio Industrial L
  Provic Obra Estación de Bomberos de Tocancipa

- EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPA
  Código Interno: 1139292
  Nombre: Unión Temporal CRIR 2018
  Dirección de Predio: Centro Regional Integral de Respuesta

Agradeciendo su amable atención,

ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
Secretario de Infraestructura.

Proyectó: Arq. Fruccy Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suanca Pulido - Secretario de Infraestructura.
Anexo: Factura Empresa de Servicios Públicos de Tocancipá S.A. ESP – 11843594
Factura Enel Codensa – 706671265-5

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P.
Nit. 900.227.413-9

Siempre INCONDICIONALES

Factura N° 11843594
VALOR A PAGAR 56,960

(57) (1) 878 8339 - (57) (1) 878 8527 | atencionalusuario@espdetocancipa.com | Calle 10 No. 6-63 Tocancipá, Cund

FECHA DE EXPEDICIÓN	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
05/12/2022	20/12/2022	21/12/2022

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO DE RUTA	MESES DE MORA
1139292	010050002303200	0


DATOS DE USUARIO

Nombre: UNION TEMPORAL CRIR 2216
C.C o Nit: 901218594
Uso: OFICIAL_RURAL
Estrato: 1
Dirección de Predio: CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE REEMPLEO
Periodo de Facturación: 03/11/2022-05/12/2022
N° Medidor: C19FC000410

INFORMACIÓN TÉCNICA

Lectura Anterior: 1806
Lectura Actual: 3693
Consumo: 6

Consumo Histórico/m³



Cons. Promedio



Observaciones:

PROC. DESVIACION

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Concepto	Consumo	Tarifa Acueducto	Tarifa Alcantarillado	Total Acueducto 6.513	Total Alcantarillado 3.666
Cargo Fijo	6	2.454.35	1192.19	14.726	7.153
Cons. Básico	0	2.454.35	1192.19	0	0
Cons. Complem	0	2.454.35	1192.19	0	0
Cons. Suntuario				-0	-0
Mas Ajuste / Menos Subsidio					

TOTAL $ 21,239 10,820

ASEO

Concepto	Costos	Tarifa
	5,009.573271	5,010
Costo Fijo Total	179,427.430495	19,200
Costo Variable NO Aprovechables (CVNA)	0.001133	
Ton. de Barrido y Limpieza (TRBL)	0.000000	
Ton. Limpieza Urbana (TRLU)	0.000000	
Ton. NO Aprovechables (TRNA)	0.000000	
Ton. Rechaze de Aprovechamiento (TRRA)	169,935.310405	695
Vr. Base Aprovechamiento por Tonelada (VBA)	0.000000	
Ton. Efectivamente Aprovechables (TRA)	0.00	
Factor de Subsidios (FSC)	0.00	
Factor de Contribución (FCS1)		

Tbl paso 0.84153 Frec Recolección N Zona J

TOTAL ASEO $ 24,905

OTROS COBROS

-4

TOTAL OTROS COBROS $

RESUMEN LIQUIDACIÓN

ACUEDUCTO	21,239
ALCANTARILLADO	10,820
ASEO	24,905
OTROS COBROS	-4
TOTAL A PAGAR $	56,960

LISANDRO RODRIGUEZ HAMON
Gerente General

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A. E.S.P.
Nit. 900.227.413-9

FACTURA N°	11843594
FECHA DE EXPEDICIÓN	05/12/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	21/12/2022
PERIODO FACTURACIÓN	03/11/2022-05/12/2022

COD. INTERNO	COD. RUTA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
1139292	010050002303200	20/12/2022	56,960



(415)7709998014862(8020)000113929(3900)000056960(96)20221221

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
NIt. 900.227.413-9

Siempre INCONDICIONALES

11817632
158,560
VALOR A PAGAR

(57) (1) 878 8389 - (57) (1) 878 8527 | atencionalusuario@espstocancipa.com | Calle 10 No. 6-63 Tocancipá, Cund.

FECHA DE EXPEDICIÓN	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
03/11/2022	21/11/2022	22/11/2022

CÓDIGO INTERNO	CÓDIGO DE RUTA	MESES DE MORA
1139292	010050002303200	0

DATOS DE USUARIO


UNION TEMPORAL CRIR 2018 — OFICIAL_RURAL

Nombre: 90:2:8594
C.C o Nit: CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUEST
Dirección de Predio: 05/10/2022-03/11/2022
Periodo de Facturación:
Uso: 1
Estrato:
N° Medidor: C19FC000418

INFORMACIÓN TÉCNICA

Lectura Anterior:	1806
Lectura Actual:	2838
Consumo:	34

Consumo Histórico/m³



Cons. Promedio: —

Observaciones: PROC. DESVIACION

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Concepto	Consumo	Tarifa Acueducto	Tarifa Alcantarillado	Total Acueducto	Total Alcantarillado
Cargo Fijo	11	2.454.35	1192.19	26.998	13.114
Cons. Básico	11	2.454.35	1192.19	26.998	13.114
Cons. Complem	12	2.454.35	1192.19	29.452	14.306
Cons. Suntuario	-			-0	-0
Más Aporte / Menos Subsidio					
				89,961	44,201

TOTAL $

ASEO

Concepto	Costos 4,997.790252	Tarifas 4.998
Costo Fijo Total	174,973.841137	18.723
Costo Variable NO Aprovechables (CVNA)	0.001133	
Ton. de Barrido y Limpieza (TRBL)	0.000000	
Ton. Limpieza Urbana (TRLU)	0.000000	
Ton. NO Aprovechables (TRNA)	0.000000	
Ton. Rechazo de Aprovechamiento (TRRA)	165,581.516753	676
Vr. Base Aprovechamiento por Tonelada (VBA)	0.000000	
Ton. Efectivamente Aprovechables (TRA)	0.00	
Factor de Subsidios (FSC)	0.00	
Factor de Contribución (FCS1)		
TDmes 0.04133 Frec Recolección Zona U		24,397

TOTAL ASEO $

OTROS COBROS

1

TOTAL OTROS COBROS $

RESUMEN LIQUIDACIÓN

ACUEDUCTO	44,201
ALCANTARILLADO	24,397
ASEO	1
OTROS COBROS	158,560
TOTAL A PAGAR $	

LISANDRO RODRIGUEZ HAMON
Gerente General

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TOCANCIPÁ S.A ESP
Nit. 900.227.413-9

FACTURA N°	11817632
FECHA DE EXPEDICIÓN	03/11/2022
FECHA DE SUSPENSIÓN	22/11/2022
PERIODO FACTURACIÓN	05/10/2022-03/11/2022

COD. INTERNO	COD. RUTA	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
1139292	010050002303200	21/11/2022	158,560



(415)7709998014862(8020)0001139292(3900)0000158560(96)20221122

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES: 6097437-2

ENEL DO OMBIA S.A. E.S.P. NIT 830.059.875-8 Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

Factura de servicios publicos

No. 706671265-5

1 de 1

CLIENTE


Alcaldia Municipio Tocancipa

MP TOCANCIPA VDA VERGANZO ST COLEGIO INDUSTRIAL T

PROVI CC OBRA ESTACION DE BOMBEROS DE TOCANCIPA TOCANCIP TOCANCIP

TOTAL A PAGAR	CONTRIBUCION	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 721.540	$21.259	INMEDIATO	SUSPENSION

-EVOLUCION DEL CONSUMO




PERIODO FACTURADO:	23 NOV/2022 A 22 DIC/2022
TIPO LIQUIDACION:	Mensual
TIPO DE LECTURA:	Real
ANOMALIA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES:	96
PROXIMA LECTURA:	23 ENE/2023

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAFV	[illegible]	15904	147	1	147	147

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: [illegible]

-CALIDAD DEL SERVICIO



-INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

La tarifa fiuales de $723.0819 kWh

G:	276.8469	T:	42.0988
CV:	64.5468	PR:	16.8376
CU:	229.2469	CF:	0
D:	258.4264	R:	24.9871

TARIFA MES [illegible] VALOR kWH Prom $723.0819

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]
RUTA REPARTO:	[illegible]
ESTRATO:	4
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]
CARGA (KW):	15
SERVICIO:	Comercial
NIVEL DE TENSION:	1
COD. FACTURACION:	PJ
GRUPO:	604
MEDIDOR No:	180649
MEDIDOR No:	

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
723.0819(Valor kWh)x147 (Consumo en kWh)	$106.293
CONTRIBUCION COMERCIAL SENCILLA/CIVA (20.0%)	$21.259
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$127.552**
INTERES MORA CONTRIBUCION 41.46%	$2.046
INTERES POR MORA (DE 56% NOM; 41.46% EA)	$10.227
IVA RECONEXION 19%	$8.976
SALDO ANTERIOR	$522.430
VERIFICACION DEL ESTADO DE CONEXION	$47.242
ALUMBRADO PUBLICO ART 19 1 PAR 2 CCD	$3.062
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$5
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 4398 DIARIOS	**$593.988**
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$0**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$721.540**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**SUBTOTAL**
CONCEPTO:	
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$0**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
6097437-2	706671265-5

En Proceso Juridico

TOTAL A PAGAR: $ 721.540

PAGO OPORTUNO: INMEDIATO

152

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES **6097437-2**

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860063 875-8 Calle 93 No 13 – 45 Piso 1

Factura de servicios públicos **No. 702942237-5**

1 de 1

-CLIENTE


Alcaldia Municipio Tocancipa

MP TOCANCIPA VDA VEREDA NUEVO COLEGIO INDUSTRIAL I

PROVICOBRA ESTACION DE BOMBEROS DE TOCANCIPA TOCANCIP TOCANCIP

TOTAL A PAGAR	CONTRIBUCION	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$ 522.430	$68.982	INMEDIATO	SUSPENSION

-EVOLUCION DEL CONSUMO



PERIODO FACTURADO: 21 OCT 2022 A 23 NOV 2022

TIPO LIQUIDACION: Mensual

TIPO DE LECTURA: Real

ANOMALIA: Normal

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 20


PROXIMA LECTURA: 22 DIC 2022

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
[illegible]	[illegible]	[illegible]	477	1	477	477

FECHA DE EXPEDICION: [illegible] TOTAL CONSUMO: [illegible]

-CALIDAD DEL SERVICIO



-INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:

La tarifa finales de $723.0819 kWh

G: [illegible] T: [illegible] D: 251.4830

CV: [illegible] PR: [illegible] R: 28.4783

CU: [illegible] CF: [illegible]

TARIFA MES [illegible] VALOR kWH Prom $ 723.0819

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	[illegible]	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	[illegible]	COD. FACTURACION:	97
ESTRATO:	6	GRUPO:	904
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	150849
CARGA (KW):	[illegible]	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	[illegible]		

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
723.0819 Valor kWh x 477 (Consumo en kWh)	$ 341.910
CONTRIBUCION COMERCIAL SUJETA A IVA (20.0%)	$68.982
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 413.892**
INTERES MORA CONTRIBUCION (38.67%)	$438
INTERES POR MORA (TES 6% - NOBE 38.67%-LA)	$2.193
SALDO ANTERIOR	$165.910
AJUSTE A LA DECENA(CREDITO)	($3)
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 12542 DIARIOS	
SUBTOTAL VALOR OTROS	**$108.538**
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	**$0**
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**$ 522.430**
CONCEPTO:	**SUBTOTAL**
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	**$0**

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
6097437-2	702942237-5

En Proceso Juridico

TOTAL A PAGAR: $ 522.430

PAGO OPORTUNO: INMEDIATO

153

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

6097437-2


Factura de servicios públicos
No. 699197003-9

1 de 1

CLIENTE
Municipio De Tocancipa
MP TOCANCIPA VDA VILLA ANA JOSE COL GIO INDUSTRIAL I
PROVI. COBRA - ESTACION DE BOMBEROS DE TOCANCIPA TOCANCIP TOCANCIP

TOTAL A PAGAR	CONTRIBUCION	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSION:
$105.910	$17.499	INMEDIATO	SUSPENSION

-EVOLUCION DEL CONSUMO




PERIODO FACTURADO: 20 SEP/2022 A 21 OCT/2022
TIPO LIQUIDACION: Mensual
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALIA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0
PROXIMA LECTURA: 23/NOV/2022

-INFORMACION DEL CONSUMO

TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	DIFERENCIA	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FACT.
EAFP	15427	15306	121	1	121	121

FECHA DE EXPEDICION: 21/OCT/2022 TOTAL CONSUMO: (kWh) 121

-CALIDAD DEL SERVICIO



-INFORMACION DE INTERES

ESTIMADO CLIENTE:
La tarifa final es de $723.0819 kWh

G:	236.8829	T:	50.8461	D:	347.7524
CV:	80.5487	PR:	51.0863	R:	42.6438
CU:	689.3602	CF:	0		

TARIFA MES 09/2022 VALOR kWH Prom $723.0819

-INFORMACION TECNICA

RUTA LECTURA:	5000938940246	NIVEL DE TENSION:	1
RUTA REPARTO:	5000938940305	COD. FACTURACION:	
ESTRATO:	0	GRUPO:	904
CIRCUITO-TRAFO:	[illegible]	MEDIDOR No:	180849
CARGA (KW):	15	MEDIDOR No:	
SERVICIO:	Comercial		

-DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO:	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGIA	
723.0819 (Valor kWh) x 121 (Consumo en kWh)	$87.493
CONTRIBUCION COMERCIAL SUNCITA ACTIVA (20.0%)	$17.499
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$ 104.992**
INTERES MORA CONTRIBUCION (36.92%)	$4
INTERES POR MORA (DE 5.6% NOM 36.92% EA)	$19
SALDO ANTERIOR	$890
AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$5
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $ 3386 DIARIOS	$918
SUBTOTAL VALOR OTROS	$0
SUBTOTAL VALOR DESCUENTOS	$ 105.910
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGIA	**SUBTOTAL**
CONCEPTO:	
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y BENEFICIOS	
SUBTOTAL PORTAFOLIO	$0

Numero de Cuenta	Factura de Servicios Publicos No
6097437-2	699197003-9

TOTAL A PAGAR:
$ 105.910

PAGO OPORTUNO:
INMEDIATO

154

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Tocancipá, 16 de Enero de 2023

S.I. 025-23

Señores:
INGELCO PROYECTOS E.U.
A/A JORGE PULIDO CUADROS
Representante Legal
ingelcoproyectos@gmail.com

Ref: **"CONTRATO 459 DE 2022 – INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS – CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA"**

Asunto: Respuesta a radicado 149 del 12 de enero de 2023

Cordial Saludo,

Con referencia a la información recibida, sobre los documentos necesarios para continuar con el trámite de aprobación del proyecto Serie 3 del Centro Regional Integral de Respuestas – CRIR me permito informar:

- Que dado que el proyecto esta ejecutado arquitectónica y estructuralmente en su totalidad, no se hace necesario una nueva la licencia de construcción y/o ampliación de la misma, razón por la cual se adjunta documento emitido por el Alcalde Municipal como Representante Legal del Municipio de Tocancipá, propietario del proyecto.

- Se hace entrega de copia digital de la Resolución de Licencia de Construcción con la cual fue construida la edificación del proyecto en referencia (9 Folios)

- Se hace entrega de copias digitales de la totalidad de planos arquitectónicos aprobados y sellados, que hacen parte integral de la respectiva Resolución de Licencia de Construcción (15 Planos)

Entendiendo que los temas requeridos de serie 1, son actividades por revisar de su parte, quedamos atentos a que se continue en los temas de aprobación ante Enel Codensa para contar con energía definitiva tanto en los edificios como en el área de parqueaderos.

Agradeciendo su amable atención,

ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
Secretario de Infraestructura.

Proyectó: Arq. Fruccy Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suanca Pulido - Secretario de Infraestructura.

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Tocancipá, 16 de enero de 2023

Actualizar fechas.

Señores:
ENEL CODENSA

Ref: **RADICADO 1500256405 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022**

Asunto: **INFORMACIÓN SOLICITADA PARA ADELANTAR REVISIÓN DE PROYECTO SERIE 3 PARA CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito informar que el proyecto CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA – CRIR DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA, fue construido durante la vigencia 2018 a 2020 mediante Resolución No 145 del 14 de Junio de 2018 "POR MEDIO DE LA CUAL SE OTORGA UNA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA MODALIDAD DE AMPLIACIÓN LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RES[illegible] – CRIR – EN EL PREDIO CON MATRICULA CATASTRAL 258170200001[illegible] 25817020000100001000 Y 25817020000100003000 Y MATRICULA INMOBILIARIA [illegible] 141193 EN EL CENTRO POBLADO URBANO SAN JAVIER DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA", encontrándose desde el año 2020 totalmente culminado arquitectónica y estructuralmente.

Actualizar

Que teniendo en cuenta lo anterior, y que las actividades a realizar producto del trámite de aprobación de proyecto eléctrico Serie 3, con radicado 1500256405 del 27 de diciembre de 2022, no implican un cambio dentro del diseño interior y/o exterior a las condiciones arquitectónicas del inmueble y constituyen una ampliación de la red eléctrica, estas estarían enmarcadas como reparaciones o mejoras locativas, según se referencia dentro del artículo 8 de la Ley 810 de 2003, por lo cual NO se requiere Licencia de Construcción

Que igualmente dentro de los documentos aportados en el radicado, se presentó el formulario debidamente diligenciado, con datos del ingeniero Victor Gonzalo Pulido Cuadros con C.C. 72.324.965, a quien le fue autorizada la revisión del diseño eléctrico y la realización de los respectivos trámites ante su entidad, a nombre del Municipio de Tocancipá propietario del proyecto en referencia.

Por lo anterior se adjunta nuevamente la Licencia de Construcción con la cual se construyó el proyecto donde se puede identificar los siguientes datos:

- Matricula Inmobiliaria: 176-141193
- Numero Catastral: 25817020000100001000, 25817020000100002000 y 25817020000100003000
- Dirección: Lotes La Esquina, La Estancia y El Porvenir, ubicados en el Centro Poblado Urbano San Javier, Vereda Verganzo del Municipio de Tocancipá
- Propietario: Municipio de Tocancipá

Igualmente se adjuntan los planos arquitectónicos sellados y aprobados por la Secretaría de Planeación dentro de la Resolución de Licencia 145 del 14 de junio de 2018

Agradeciendo su amable atención,

JORGE ANDRES PORRAS VARGAS
Alcalde del Municipio de Tocancipá

Proyectó: Arq. Fruddy Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suancha Pulido - Secretario de Infraestructura

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Tocancipá, 27 de Enero de 2023
S.I. 090-23

Señores:
INGELCO PROYECTOS E.U.
A/A JORGE PULIDO CUADROS
Representante Legal
ingelcoproyectos@gmail.com

Ref: **"CONTRATO 459 DE 2022 – INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS – CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA"**

Asunto: LLAMADO DE ATENCIÓN – PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Cordial Saludo,

Por medio de la presente me permito recordar a la interventoría que dentro de sus Obligaciones Especificas dentro del contrato se encuentra:

22. *Presentar ante la Supervisión del MUNICIPIO los productos de acuerdo con las actividades planteadas, en los plazos establecidos o cada que la Entidad lo solicite.*

Lo anterior teniendo en cuenta que, a la fecha no se han recibido informes mensuales del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2022 hasta la fecha de la suspensión de los contratos de obra e interventoria.

Igualmente, sobre los informes de julio, agosto y septiembre cabe mencionar de acuerdo con lo indicado en el "INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES" que les fue remitido al inicio del proyecto, los mismos presentan inconsistencias respecto a la información suministrada o se presenta de forma incompleta, como se lista a continuación:

- Fueron presentados fuera de los plazos establecidos para su entrega.
- Aunque se muestra un seguimiento aparente a la programación de actividades, no se muestra ninguna actuación realizada por la interventoría frente a la falta de gestión del contratista de obra.
- Las actas de comité presentadas, en su gran mayoría se anexan sin firmas de los participantes.
- Los formatos de relación de personal no están firmados por los SST o directores responsables de obra e interventoría.
- No se ha realizado seguimiento al pago de servicios públicos del proyecto en intervención.
- No se ha realizado ningún reporte frente a falta de información en lo que refiere a seguridad social del personal de obra, cuando recientemente la supervisión, evidenció mora mayor a 30 días en el pago de la seguridad social del personal relacionado.

Es por todo lo anterior que se considera, se está configurando un presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales como INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS – CRIR

Por lo cual se espera que se pongan al día con los informes pendientes y los mismos se entreguen de forma completa, acatando en adelante y una vez se genere el reinicio de actividades, los formatos, e instructivos que le han sido entregados, recordándole que los tiempos de entrega oportunos son:

- Informe semana Lunes antes de las 10am vía correo electrónico
- Informe Mensual Primeros 8 días hábiles de cada mes

Agradeciendo su amable atención,

ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
Secretario de Infraestructura.

Proyectó: Arq. Fruccy Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suanca Pulido - Secretario de Infraestructura.

Tocancipá, 24 de Abril de 2023
S.I. 478-23

Señores:
INGELCO PROYECTOS E.U.
A/A JORGE PULIDO CUADROS
Representante Legal
ingelcoproyectos@gmail.com

Ref: **"CONTRATO 459 DE 2022 – INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS – CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPA"**

Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE PRORROGA Y ADICIÓN DEL CONTRATO 440 DE 2022

Cordial Saludo,

Una vez revisada la solicitud de adición y prorroga solicitada por el contrato 440 de 2022 la cual fue avalada por usted mediante oficio 017 del 11 de abril de 2023, esta Secretaría se permite indicar que se evidencian las siguientes inconsistencias en la valoración de algunos ítems no previstos:

ELÉCTRICOS

- **NPE-2_ Actualización Proyecto Eléctrico** **GL 1**
  La valoración de este ítem se ve desproporcionado respecto al valor que muestra el mercado frente al tema, es preciso mencionar que a la fecha la Secretaría de Infraestructura desarrolló un proceso de contratación exclusivamente por diseños, dentro de los cuales también se consideraron diseños eléctricos y por el cual se desarrolló un estudio de mercado que arrojó un valor de entre $8.000 y $10.000 pesos m/cte por metro cuadrado de diseño.

  Cabe destacar que este proceso de contratación incluye diseños generales internos y externos a la edificación, serie 3, diagrama unifilar, memorias de cálculo, estudio fotométrico, diseños de voz y datos y CCTV, detalles, presupuestos, especificaciones técnicas de cada uno de los equipos requeridos y trámites de disponibilidad y factibilidad de servicio expedido por la empresa prestadora del servicio público de energía eléctrica.

  En este sentido y realizando un comparativo con las actividades de actualización que son necesarias de realizar, se evidencia una diferencia en los entregables a producir, siendo para nuestro caso menor en cantidad y solo se sumaria el diseño del proyecto de conexión serie 1, por lo que se le solicita ajuste el presupuesto en este ítem.

- **NPE-4_Salida lampara toma emt completa** **UND 4**
  Se observa que este que el diseño del respectivo APU se desarrolla a partir del ítem 12.3 del ICCU, lo cual es una actividad positiva, sin embargo, el valor de la Caja tipo radwell presente un valor elevado con respecto al mercado, ya que se revisó en los listados de precios de almacenes de Tocancipá y Bogotá con precios promedio de $26.000 pesos m/cte. para la caja emt 2400 3 huecos de 1", por lo que se le solicita en primer lugar verificar el valor del insumo, así como la especificación, ya que se considera debería ser caja 3 huecos de ½", lo que implica el ajuste del valor final del ítem.

- **NPE-5_Salida toma emt completa** **UND 4**
  Se observa que este que el diseño del respectivo APU se desarrolla a partir del ítem 12.3 del ICCU, lo cual es una actividad positiva, sin embargo, el valor de la Caja tipo radwell presente un valor elevado con respecto al mercado, ya que se revisó en los listados de precios de almacenes de Tocancipá y Bogotá con precios promedio de $12.000 pesos

m/cte. para la caja emt 5800 3 huecos de 1", igualmente el valor de la toma tipo gfci promedia en $35.000 pesos m/cte.; por lo que se le solicita en primer lugar verificar el valor de los insumos, así como la especificación, ya que se considera debería ser caja 3 huecos de ½", lo que implica el ajuste del valor final del ítem.

- **NPE-6_Suministro e instalación cable cobre 4** **ML** **100**
  Realizar la aclaración de que tipo de cable de cobre es (especificación, desnudo, aislado, AWG, THNN, THHN, THW, marca especifica o similar a) según corresponda e indique los accesorios que incluye para poder tener claridad del ítem.

- **NPE-7_Suministro e instalación cable cobre 1/0** **ML** **300**
  Realizar la aclaración de que tipo de cable de cobre es (especificación, desnudo, aislado, AWG, THNN, THHN, THW, marca especifica o similar a) según corresponda e indique los accesorios que incluye para poder tener claridad del ítem.

- **NPE-8_Suministro e instalación cable cobre 8** **ML** **360**
  Realizar la aclaración de que tipo de cable de cobre es (especificación, desnudo, aislado, AWG, THNN, THHN, THW, marca especifica o similar a) según corresponda e indique los accesorios que incluye para poder tener claridad del ítem.

- **NPE-9_Suministro e instalación de protecciones (breakers) red contra incendio** **GL** **1**
  Las cotizaciones presentadas no son comparables ya que no se identifica en ellas especificaciones que permitan verificar su similitud, por ejemplo, se debe aclarar marca, tipo de breaker, amperaje, intensidad máxima, voltaje de ruptura y accesorios adicionales con los que cuenta, por lo que el ítem no termina indicando claramente que se ofrece por el precio indicado

- **NPE-10_Suministro e instalación arrancador para bomba de 3pH** **UND** **1**
  Realizar la aclaración de que tipo de arrancador es (especificación, marca especifica o similar a) según corresponda e indique los accesorios que incluye para poder tener claridad del ítem (contactor, relé termomagnético o guardamotor, caja muletilla manual – automático, cuantas posiciones).

- **NPE-11_Acometida media tensión en cable XLPE-15kv-700mm (2/0 awg) aluminio** **ML** **360**
  Realizar la aclaración marca especifica o similar del cable propuesto e indicar los accesorios que incluye, para poder tener claridad del ítem

- **NPE-12_Accesorios y pruebas de cable XLPE-15kv 2/0 awg** **GL** **1**
  Realizar la aclaración de los accesorios que incluye e indicar con que equipos o instrumentos se realizará la prueba para poder tener claridad del ítem.

- **NPE-13_Medidor trifásico tetrafilar electrónico 2014-a 1800 3x58/100-277/480v, (10ap) conexión indirecta clase de imprecisión 0.5sg energía reactiva, perfil de carga rs 232** **UND** **2**
  Realizar la aclaración de que tipo de medidor es (marca especifica o similar a) según corresponda e indique los accesorios que incluye para poder tener claridad del ítem.

- **NPE-15_Transformador tipo pad mounted 45kva tipo radial, 11400/208-120v, conex. DY5, aislamiento aceite, refrigeración onan** **UND** **1**
  Se solicita evaluar la posibilidad que este equipo cuente con aislamiento de estado sólido, ya que se han presentado solicitudes al municipio por parte de Codensa sobre el tema.

- **NPE-16_Identificación y marcado de circuitos existentes** **UND** **100**
  Aclarar el material de las marquillas e indicar porque se considera una cantidad de 100, ya que la memoria no es clara en ese aspecto

Toda la justificación eléctrica debe estar firmada en original y con número de matrícula profesional de los asesores eléctricos presentados en la propuesta tanto de obra como de interventoría, en caso de que estos no sean los mismos de la propuesta, se debe presentar nuevamente la documentación de los profesionales que los remplazan, quienes deben como mínimo cumplir con las condiciones solicitadas en el pliego o superarlas; lo anterior teniendo en cuenta que los diseños se encuentran en revisión por parte de Codensa y no se ha entregado a la supervisión un diseño final aprobado.

OBRA CIVIL

- **NPO-2_ Placa base de concreto 0.15 2500 psi** **ML 10.70**
  Aclarar memoria de cantidades del ítem, ya que las imágenes son pequeñas y no se alcanzan a observar las medidas adecuadamente, además no coinciden los colores indicados en la tabla con los de los planos

- **NPO-3_ Muro tolete común 0.12m** **ML 4.90**
  Aclarar memoria de cantidades del ítem, ya que las imágenes en la subestación no permiten identificar donde se ubican los muros y no se alcanzan a observar las medidas adecuadamente, además no coinciden los colores indicados en la tabla con los de los planos.

- **NPO-4_ Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm** **ML 51.7**
  Aclarar memoria de cantidades del ítem, ya que las imágenes en la subestación no permiten identificar donde se ubican los muros y no se alcanzan a observar las medidas adecuadamente, además no coinciden los colores indicados en la tabla con los de los planos.

- **NPO-5_ Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm** **M2 55.26**
  Corregir memoria de cantidades en el apartado de ventana, para que coincidan datos de dimensiones de ventana en tabla y planos.

- **NPO-6_ Filos o dilataciones s/muro** **ML 47.46**
  Corregir memoria de cantidades en el apartado de puertas cuarto de máquinas, para que coincidan datos de dimensiones de ventana en tabla y planos, así como cantidades.

- **NPO-8_ muro en ladrillo estructural 0.15 m** **M2 55.26**
  Corregir memoria de cantidades en el apartado de ventana, para que coincidan datos de dimensiones de ventana en tabla y planos.

- **NPO-9_ Acero figurado 60000psi** **KG 167.05**
  Corregir memoria de cantidades y especificar el desarrollo del acero en dovelas y vigas para tener claridad de las dimensiones del acero ya que difieren los datos en planos y en tabla. Corregir unidad de medida en memoria.

- **NPO-11_ Dovela, grouting 3000 psi** **ML 38.00**
  Corregir memoria de cantidades para que coincidan datos de dimensiones de planos.

- **NPO-14_ Puerta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo** **UND 2.00**
  Aunque no afecta la memoria de cantidades, se debe corregir las dimensiones de las puertas que se indican en los planos de la memoria.

- **NPO-16_ Vinilo sobre pañete 2 manos** **M2 55.26**
  Corregir memoria de cantidades en el apartado de puerta, ventana y muros, para que coincidan datos de dimensiones en tabla y planos.

- **NPO-17_ Excavación manual zanja en tierra H=1.0 M** **M3 2.40**

No es clara la justificación de dicho ítem, mas aun cuando se relaciona con otro ítem no previsto denominado NP18 que no cuenta con coherencia de actividad.

- **NPO-18_ Estuco y vinilo 3 manos** **ML** **15.00**
No se entiende claramente la forma en que se sacaron las cantidades, ya que algunos datos tienen coherencia y otros no, anexar mas planos de ser necesario.

- **NPO-24_ Perforaciones mecánicas en concreto de 2"** **UND** **2.00**
Se requiere cotización adicional, ya que no se aceptará la suministrada por la empresa Torin SAS, dado que el área de actividad de esta hace referencia a actividades eléctricas especializadas y no de obra civil.

- **NPO-25_ Perforaciones mecánicas en concreto de 4"** **UND** **5.00**
Se requiere cotización adicional, ya que no se aceptará la suministrada por la empresa Torin SAS, dado que el área de actividad de esta hace referencia a actividades eléctricas especializadas y no de obra civil.

- **NPO-26_ Impermeabilización de tanque agua potable** **GL** **1.00**
Las cotizaciones presentadas para este ítem no son del todo comparables, dado que la primera propuesta se presenta con membrana de PVC mientras que las otras dos se indican con aditivos. Igualmente, entre las dos ultimas cotizaciones, una integra lavado y desinfección de tanques mientras las otras dos no lo incluyen

  Por lo anterior se solicita se unifiquen las especificaciones y se presenten las 3 cotizaciones en concordancia, dejando de forma independiente la actividad de desinfección del tanque igualmente con sus cotizaciones respectivas.

- **NPO-27_ Escalera en acero inoxidable de 0.60mt se ancho** **ML** **5.60**
Teniendo en cuenta que las cotizaciones presentadas evidencian una gran disparidad en los precios, se solicitan otras dos cotizaciones adicionales para promediar el valor de forma adecuada.

  Por lo anterior se solicita se unifiquen las especificaciones y se presenten las 3 cotizaciones en concordancia, dejando de forma independiente la actividad de desinfección del tanque igualmente con sus cotizaciones respectivas.

- **NPO-28_ Aseo general de pisos, lámparas y muros** **GL** **1.00**
La valoración de este ítem se ve desproporcionado respecto al valor que muestra el mercado del pago hombre/mes ya que una cuadrilla de aseo, compuesta normalmente por 2 personas esta alrededor de $3.900.000 por 1 mes completo incluyendo los elementos de aseo, sin embargo, las actividades a realizar dan una duración máxima de 20 días. Por lo anterior se pide que valore nuevamente este ítem ya que con el promedio presentado estaría vinculando al menos a 5 personas por todo el mes

HIDROSANITARIOS Y RED CONTRA INCENDIO

- **NPS-2_ Suministro e instalación bomba eyectora de 2HP** **UN** **1.00**
Se requiere cotización adicional, ya que no se aceptará la suministrada por la empresa Torin SAS, dado que el área de actividad la misma hace referencia a actividades eléctricas especializadas y no a suministro de equipos de bombeo.

- **NPS-3_ Tubería acero negro ranurada 6" sch-40 (incluye Accesorios y soportes)** **ML** **54.00**
No se aceptará la cotización suministrada por la empresa Torin SAS, dado que el área de actividad la misma hace referencia a actividades eléctricas especializadas y no a suministro de tuberías hidrosanitarias o de acero, por lo cual se debe recalcular el promedio con las cotizaciones restantes.

- **NPS-5_ Suministro e instalación de sistema hidráulico de Presión 3.0 HP y tanque de almacenamiento de 200 litros** **UN** **1.00**

Se requiere cotización adicional, ya que no se aceptará la suministrada por la empresa Torin SAS, dado que el área de actividad la misma hace referencia a actividades eléctricas especializadas y no a suministro de equipos de bombeo.

AJUSTE PRECIOS 2023

- **División de baño en acero inoxidable 304 Cal. 20 (incluye puertas y accesorios)** **M2 82.00**

  Teniendo en cuenta que este ítem es contractual y que dentro de la forma de pago se estipula "precios unitarios fijos sin formula de reajuste", además de que la presentación de la oferta implicó la aceptación de la matriz de riesgos, en la cual se indica "Riesgos que asume el contratista: ...1.Los efectos, favorables o desfavorables, derivados de las variaciones en los precios de mercado de los materiales, insumos y mano de obra necesarios para ejecutar en los términos del contrato que se derive del presente proceso de contratación.", no se considera viable el ajuste de precio al ítem indicado.

Toda la justificación de obra civil he hidrosanitaria. debe estar firmada en original y con número de matricula profesional del director de obra e interventoria, teniendo en cuenta que el representante legal de obra no es ingeniero civil o arquitecto; este debe ser el presentado en la propuesta tanto de obra como de interventoría, en caso de que estos no sean los mismos de la propuesta, se debe presentar nuevamente la documentación de los profesionales que los remplazan, quienes deben como mínimo cumplir con las condiciones solicitadas en el pliego o superarlas.

Agradeciendo su amable atención,

ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO
Secretario de Infraestructura.
Proyectó: Arq. Fruccy Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suanca Pulido - Secretario de Infraestructura

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ

Tocancipá, 04 de Julio de 2023
S.I. 762-23

Señores:
CONSORCIO TOCANCIPA IT
A/A OSCAR JULIO PÉREZ PANQUEVA
Representante Legal

Ref: **"CONTRATO 440 DE 2022 – CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"**

Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD CAMBIO DE PROFESIONALES

Cordial Saludo,
Por medio de la presente me permito informar que, una vez revisados los documentos adicionales a la solicitud inicial para cambio de profesional técnico electricista, se encuentra:

TÉCNICO ELECTRICISTA
OSCAR JULIO PÉREZ PANQUEVA

	DESCRIPCIÓN	CUMPLE / NO CUMPLE
Formación Académica	Técnico electricista con matricula	Técnico Electricista / **Cumple**
	Curso de trabajo en alturas certificado por la autoridad competente.	Expedido en abril de 2023 / **Cumple**
Experiencia General	Cinco (05) años de experiencia contados desde la expedición de la matricula profesional	Tarjeta expedida en 2001 / **Cumple**
Experiencia Especifica	Experiencia laboral acreditada: Técnico electricista dos (2) contratos de obra relacionados con construcción y/o terminación y/o mantenimiento y/o adecuación y/o mejoramiento de infraestructura Institucional Pública y/o Privada.	• Discon LTDA_ "Reparación, Mantenimiento, Expansión, Montaje de redes aéreas y subterráneas en el Alumbrado Público de la ciudad de Tunja • Asociación de Suscriptores del Acueducto Vereda de Puede Hamaca_ "Mantenimiento preventivo y correctivo a motores eléctrico de 18HP, por igual a sus respectivas bombas multietapas serie MS horizonte de 18HP del acueducto vereda Puente Hamaca **Cumple**

Teniendo en cuenta la anterior información se **APRUEBA** el cambio del TÉCNICO ELECTRICISTA, siendo el nuevo profesional el OSCAR JULIO PÉREZ PANQUEVA

Agradeciendo su amable atención,

ING. HUGO GILDARDO ESPINOSA SEPÚLVEDA
Secretario de Infraestructura (E).
Proyectó: Arq. Fruccy Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario
Revisó y aprobó. Ing. Hugo Gildardo Espinosa Sepúlveda- Secretario de Infraestructura (E).

Generated using the old legacy WebKit rendering engine. For the best result and quality, use our latest Blink engine with a simple change. To remove this warning message, check here.

	INSTRUCTIVO INSTRUCTIVO PARA ELABORACIÓN DE INFORMES POR CONCEPTO DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA		
MUNICIPIO DE TOCANCIPA TRADICION Y PROGRESO	COD: GI-I-002	VERSIÓN: 1	FECHA APROBADO: 3/Ago/2021

1. DEPENDENCIA RESPONSABLE

2. OBJETIVO

El presente instructivo tiene como finalidad establecer parámetros y directrices generales de como se debe presentar y que debe contener minimamente la bitácora, los informes semanales y mensuales de obra; con el propósito de determinar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos tanto de obra como de interventoría que se encuentren dentro de la Supervisión de la Secretaría de Infraestructura.

3. CLIENTES

Interventor, contratista y/o supervisor de acuerdo a la asignación contractual para la obra.

4. ALCANCE

De conformidad con la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, Manual de Supervisión e interventoría de la Alcaldia Municipal de Tocancipá el presente documento se presenta como herramienta guía para que las personas naturales o jurídicas que ejercen labores de interventoría y de ejecución de obras documenten de forma cabal las obligaciones que les acarrea su contrato

5. DEFINICIONES

BITÁCORA: Registro que constituye parte inseparable del contrato de obra; es un instrumento importante en el control y supervisión de obra, se usa para ir haciendo las anotaciones, se trata de un libro o libreta que contiene el formato con las especificaciones necesarias requeridas en una obra.

INFORME DE OBRA: Documento que evidencia un conjunto de hechos y de actividades desarrolladas en un periodo de tiempo durante el transcurso y ejecución de una obra, donde se deja constancia de lo acontecido de una manera detallada, basándose en la inspección técnica, administrativa y contable, entre otros.

CONTROL TÉCNICO: Control y seguimiento de los procesos constructivos correspondientes a la ejecución de la obra, considerando las características de los materiales, normas, especificaciones técnicas, ensayos, instalaciones, mediciones fisicas, igualmente verificar la concordancia ente lo que se construye y los que se presenta en los respectivos planos, programación y presupuesto.

CONTROL ADMINISTRATIVO: Es el control de los procesos de la gestión administrativa que debe cumplir el contratista durante en desarrollo del compromiso contractual. Dentro de las actividades esta verificar el estricto cumplimiento de los pagos a de salud, pensión, riesgos, prestaciones sociales, pagos de carácter fiscal a organizamos nacionales y municipales.

CONTROL FINANCIERO: Se refiere a los movimientos contables del proyecto, donde se evalúa la inversión realizada frente a la programada y ejecutada en la obra.

CONTROL JURIDICO: Implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional establecido por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Involucra la responsabilidad por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.

CONTROL AMBIENTAL: Hacer referencia al cumplimiento de la legislación ambiental vigente y especifica para el proyecto, así como de los controles y medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones. Igualmente refiere al cumplimiento de las guías, normas y lineamientos vigentes en Colombia en materia de Salud en el trabajo y Seguridad Industrial.

6. REFERENCIA

Los informes son fundamentales para conocer lo sucedido durante el desarrollo del contrato, por lo anterior debe reflejar de manera clara y veraz lo realmente ocurrido y contener la información necesaria para dilucidar cualquier inquietud al respecto.

Los informes servirán de evidencia para certificar que lo ejecutado por el contratista se ajusta a lo requerido por el contratante, o si por el contrario se deben aplicar correctivos, multas o sanciones por incumplimiento.

Estos informes ayudaran y servirán de base probatoria para un arreglo de conflictos entre las partes, en la eventualidad que se presenten inconformidades, pleitos y demandas.

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS

•MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA

8. PROCEDIMIENTO

8.1. BITÁCORA DE OBRA

No se permite dejar hojas en blanco antes de la primera página.

La bitácora debe registrarse diariamente y en los días en que está en ejecución el proyecto.

Las fechas de suspensión y de reinicio deben ser indicadas en la bitácora, si se presentan condiciones especiales para proceder al reinicio de las obras, estas deben quedar consignadas en la bitácora.

Se consideran válidos y vinculantes los conceptos y/o recomendaciones de los especialistas que sean registrados.

Se prohíben hojas en blanco, enmendaduras o arrancar hojas

Diariamente se deben consignar los siguientes datos en la bitácora:
a) Numeración
b) Fecha
c) Condiciones del clima en la mañana y en la tarde
d) Actividades de obra ejecutadas en el día.
e) Los esquemas que se incluyan deben estar firmados por su autor.
f) El cierre del día debe estar firmado por el residente de obra, residente de interventoría, debajo de cada firma debe ir el nombre y cargo.
g) La bitácora debe ser diligenciada en esfero de tinta negra y con letra legible.
h) Al finalizar las obras, la bitácora debe ser entregada por la Interventoría o Contratista (en caso de que la obra no cuente con interventoría).

Hoja de entrega / Hoja final, en esta hoja pueden quedar asentadas dos situaciones diferentes: la primera cuando se terminan las hojas y debe continuarse en otro documento. En ese caso se señala el cierre en la última página y se asienta que se continúa en una nueva, dando detalles de esta nueva bitácora. El segundo caso es cuando se da por concluida la obra, incluyendo la entrega y cuando se han cerrado las notas que pudieran haber quedado pendientes. Se efectúa el último asiento en el cual se debe anotar el cierre de la relación técnica, cumpliéndose todo lo que fue consignado en el contrato. Por último, se anulan las hojas sobrantes y se firma por las partes de conformidad con la conclusión de la obra.

8.2. INFORME SEMANAL

Datos generales del (los) contrato(s).

Avance programado, físico y financiero (con gráficas de reporte).

Actividades técnicas realizadas en la semana.

Estado del tiempo de la semana laborada.

Registro fotográfico (obra, ambiental, SST, calidad, entre otros).

Observaciones y comentarios del interventor sobre el avance de las obras, necesidades del contrato, planteamiento de soluciones de manera previsiva y proactiva, recomendaciones de medidas administrativas y financieras, entre otros).

8.3. INFORME MENSUAL

8. 3. 1. Introducción (Resumen del Proyecto)

8. 3. 2. Localización del Proyecto

8. 3. 3. Información General

Datos generales del (los) contrato(s).

Relación de las garantías exigidas y su actualización cada vez que sea necesario, es decir, al presentarse modificaciones al contrato, suspensiones, entre otras.

8. 3. 4. Control Técnico

Actividades ejecutadas en el periodo

Seguimiento a la programación (con gráficas de reporte).

Diseños de mezclas

Cuadro comparativo de pruebas de obra contra pruebas de interventoría

Ensayos y laboratorios.

Certificados de calidad de materiales

Certificados de calibración de equipos

Estado del tiempo del periodo laborado.

Registro fotográfico (obra, ambiental, SST, calidad, entre otros).

8. 3. 5. Control Financiero

Seguimiento al plan de inversión de anticipo (cuadro de relación, extracto y soportes)

Relación de actas de pago generadas en el periodo con sus correspondientes soportes. Así mismo, en este cuadro relacionar las actas de pago parcial anteriores.

Balance financiero a la fecha de corte del informe.

8. 3. 6. Control Administrativo

Relación de personal (administrativo, operativo, subcontratistas).

Registro de ingreso diario de personal a obra durante el periodo.

Soportes de pago a seguridad social.

Acta de conformación y/o acta de reunión del COPASST o Vigía según sea el caso.

Plan de Capacitaciones - Registro de capacitaciones del periodo.

Registro de accidentalidad y ausentismo.

Registro de entregas de EPP y entrega de dotación.

Permisos de trabajo en alturas, espacios confinados, trabajo en caliente, etc.

Implementación, seguimiento y control a los protocolos de Bioseguridad.

Comités o reuniones técnicas realizadas en la semana.

Actas de vecindad.

Correspondencia enviada y recibida.

Compilado de los informes semanales del periodo.

Copia de facturas pagas de servicios públicos.

Estado de trámites ante empresas de servicio público u otras entidades estatales.

8. 3. 7. Control Jurídico

Vigencia y actualización de las pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil extracontractual y de prestaciones sociales.

Hallazgos dentro del cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al interior de su trabajo.

Copia de contratos laborales

Hallazgos en el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales, en especial sobre empleados del contratista de obra en lo referente a la afiliación al Sistema de Seguridad Social, Normas de seguridad en el trabajo y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

8. 3. 8. Control Ambiental

Manejo de la obra para la protección Ambiental y ecosistemas vecinos
- Aspectos e impactos ambientales identificados y controles definidos
- Registro de cantera autorizada para suministro de materiales pétreos
- Registro de capacitaciones ambientales
- Registro fotográfico

Manejo de Maquinaria y equipos
- Procedimiento de mantenimiento de Maquinaria
- Relación de maquinaria
- Revisión técnico-mecánica y de gases
- Registro mantenimiento de maquinaria, equipos y herramientas
- Registro fotográfico

Manejo integral de Residuos
- Plan de manejo de residuos
- Clasificación de residuos
- Certificados de escombrera autorizada
- Registro fotográfico

8. 3. 9. Conclusiones

Conclusiones, recomendaciones, y comentarios del interventor sobre el avance de las obras, necesidades del contrato, planteamiento de soluciones de manera previsiva y proactiva, recomendaciones de medidas administrativas y financieras, entre otros).

9. LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: FRUCCY MAGALY MERCHAN BARBOSA **CARGO:** Profesional Universitario 01 **Fecha:** 03/Ago/2021	**Nombre:** ADMINISTRADOR DEL SISTEMA **CARGO:** Profesional Especializado **Fecha:** 03/Ago/2021 **Nombre:** MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO **CARGO:** Secretario **Fecha:** 03/Ago/2021	**Nombre:** GIOVANNA STELLA PAEZ CORTES **CARGO:** Secretario **Fecha:** 03/Ago/2021

COPIA CONTROLADA
FRUCCY MAGALY MERCHAN BARBOSA

Tocancipá, 07 de marzo de 2023.

Señores
CONSORCIO TOCANCIPA IT
Atn. OSCAR JULIO PEREZ P.
Representante Legal
CONTRATO No: CTO 440 MT 2022.

Asunto: **LLAMADO DE ATENCIÓN No 6 - CTO 440 MT 2022.**

REF.: Contrato de Interventoría No. CTO 459 MT 2022. Cuyo objeto es:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

Respetado Sr. Pérez:

Cordial saludo, por medio de la presente La Interventoría del contrato en referencia, le solicita explicar las razones por la cual no han presentado los informes mensuales de octubre, noviembre y diciembre los cuales se deben presentar en los primeros (10) días de cada mes los cuales lleva un retraso ya de tres meses del último a presentar, además no nos ha llegado el balance financiero del modificatorio para su revisión por parte de La Interventoría y ya se va a cumplió el plazo del suspensión de los tres meses.

La Interventoría necesita saber como va ha ser el contratista para cumplir con el contrato en el tiempo que queda y presente una plan de contingencia para lograrlo.

Se solicita ponerse al día cuanto antes.

Agradezco de antemano la atención a la presente.

Atentamente.

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Tocancipá, 22 de diciembre de 2022.

Ingeniero
MARIO ENRIQUE SUANCA P.
Supervisión / Infraestructura.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Ref. Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

Asunto: **RESPUESTA A OFICIO RECIBIDO No SI-1447-22 CON FECHA 15 DICIEMBRE DE 2022.**

Respetado Ingeniero:
La presente con el fin de dar respuesta a las observaciones al oficio SI-1447-22.

Teniendo en cuenta que el objetivo de los CONTRATO DE OBRA CTO 440 MT 2022 y el CONTRATO DE INTERVENTORIA CTO 459 MT 2022 es poner en funcionamiento el CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA – CRIR, y de acuerdo a los ITEM'S contratados no se logra ese objetivo ya que se requiere obras civiles, eléctricas y de consultoría adicionales no contratadas, como también es de anotar que se deben hacer obras civiles y/o adecuaciones antes de colocar cableados o equipos eléctricos que están contratados en algunas áreas y es de su entero conocimiento desde un inicio del contrato, como también se requiere de la aprobación del proyecto serie 3 por parte ENEL CODENSA y la certificación de las instalaciones eléctricas RETIE y de alumbrado RETILAP requisito para la conexión definitiva de la red eléctrica.

De acuerdo con lo anterior presentamos los ITEM'S a adicionar de las actividades no previstas, que deben ser ejecutadas y además ocasionan en algunos ítems mayores y menores cantidades de obra en el BALANCE MODIFICATORIO No 1.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

1- JUSTIFICACIÓN Y APROBACION DE CADA UNO DE LOS ITEM NUEVOS.

A continuación, exponemos la justificación de cada uno de los ÍTEM nuevos que solicitamos incluir para la correcta ejecución de obra de dicho contrato mencionado.

ÍTEM 5,1,1. RETIE Y RETILAP.

Es primordial colocar este ítem para poder certificar la obra en cuanto al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, como también el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público RETILAP ya que sin estos certificados no es posible que el Operador de Red ENEL CODENSA energice la red proyectada ya que son documentos que se deben anexar como requisito y es garantía que la obra cumple con la normatividad vigente para este tipo de proyectos.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,2. ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO ELÉCTRICO:

Es fundamental la actualización de los diseños eléctricos tanto de planos como de memorias de cálculo para la presentación del proyecto Serie 3 exigido por ENEL CODENSA para su aprobación, posteriormente su revisión y finalmente su conexión, como también la actualización de planos de las instalaciones eléctricas de uso final y sus respectivas memorias de cálculo para presentación al certificador RETIE, como también la actualización de planos de salidas de alumbrado interior y exterior, simulación con software de alumbrado para cumplimiento del reglamento técnico de iluminación y alumbrado público, RETILAP, además el acompañamiento en el proceso de certificación.

Este ITEM se creó por que los diseños eléctricos tanto de planos como de memorias de cálculo entregados por La Alcaldía están incompletos de acuerdo con lo exigido tanto por el operador de red ENEL CODENSA como por los organismos certificadores de RETIE y RETILAP es decir se requieren de tres diseños y memorias que hay que presentar a cada uno, a continuación, describimos los requerimientos exigidos por cada organismo:

-Al operador de red ENEL CODENSA se le debe presentar el proyecto serie 3, en cuanto a los diseños entregados por la alcaldía tanto de planos como memorias de cálculo están incompletos como también están desactualizados ya que las canalizaciones de la red de media tensión no coinciden con lo real y además algunas cargas como el ascensor, el sistema fotovoltaico no fueron construidos como tampoco está contratado.

-Al organismo de certificación RETIE se le debe presentar el diseño detallado de acuerdo con el ART. 10.1 del RETIE tanto de planos como de memorias actualizados con respecto a lo construido y para esto se requiere tener los planos en AutoCAD de las instalaciones internas de cada edificio los cuales no fueron entregados por lo tanto se requiere elaborarlos ya que los entregados están en PDF, en cuanto a las memorias entregadas están también en PDF las cuales se requiere modificar, actualizar como también los cuadros de cálculo incluidos se requiere editarlos en Excel para su modificación.

- Al organismo de certificación RETILAP se le debe presentar el diseño de planos y memorias de acuerdo al Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP, el cual consiste en presentar las simulaciones de alumbrado con un software autorizado, en cada una de las áreas de trabajo de acuerdo a los niveles de iluminación permitidos en el reglamento con las especificaciones de las luminarias instaladas tanto las generales como las de emergencia, entre los planos y memorias entregadas por la alcaldía solo esta el plano de ubicación de las luminarias en PDF el cual esta desactualizado con respecto a lo construido por lo tanto también se requiere actualizar para la entrega al certificador.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,3. LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA:

Es importante esta lámpara para la iluminación de cuarto de equipos de las bombas red contra incendios ya que se requiere hacer mantenimiento o revisión de los equipos.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,4. SALIDA LÁMPARA EMT COMPLETA:
Son necesarias las salidas para las lámparas que van a iluminar el cuarto de equipos de la red contra incendios ya que por seguridad no se debe dejar cableados sin canalización.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,5. SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA:
Son necesarias las salidas para las tomas en el cuarto de equipos de la red contra incendios ya que cuando se requiera hacer mantenimiento se tenga un punto de conexión para herramientas que se requieran utilizar para tal labor.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,6. CABLE DE COBRE No 4:
Este cableado es requerido para la alimentación de las bombas de red contra incendios que va desde la transferencia automática hasta el cuarto de equipos que queda al lado del tanque de almacenamiento de agua de la bomba red contra incendios.
Este cable no fue incluido en el contrato inicial ya que aparece en el diseño la ubicación de la bomba red contra incendios, pero no está la alimentación de la acometida para poderla energizar el calibre del conductor se calcula por carga y distancia entre otros parámetros como se presentará en su momento en los planos y en las memorias de calculo que se le entreguen al certificador RETIE, ver informe técnico del especialista ANEXO.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,7. CABLE DE COBRE No 1/0:
Este cableado es requerido para la alimentación de las bombas de red contra incendios que va desde la transferencia automática hasta el cuarto de equipos que queda al lado del tanque de almacenamiento de agua de la bomba red contra incendios.
Este cable no fue incluido en el contrato inicial ya que aparece en el diseño la ubicación de la bomba red contra incendios, pero no está la alimentación de la acometida para poderla energizar el calibre del conductor se calcula por carga y distancia entre otros parámetros como se presentará en su momento en los planos y en las memorias de calculo que se le entreguen al certificador RETIE, ver informe técnico del especialista ANEXO.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,8. DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M:
Es fundamental la inclusión de este nuevo ítem para la demolición del piso existente de los cárcamos para poder realizar las adecuaciones necesarias para que estos queden cumpliendo la norma que exige CODENSA para su correcto funcionamiento.

171

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,9. PLACA BASE CONCRETO 0.20 2500 PSI:

Es de vital importancia la inclusión de este ítem para la adecuación y construcción de las siguientes actividades como los cárcamos para el correcto funcionamiento del trasformador, la base para el muro que se a construir para la siamesa, los pollos para el transformador, las electrobombas red contra incendios y bomba de presión agua potable.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,10. MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL):

Es necesaria la inclusión de este nuevo ítem para la construcción del muro para la siamesa y la adecuación de los cárcamos del trasformador.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,11. PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL):

Es fundamental la inclusión de este ítem para darle acabados y proteger de los patógenos e inclemencia de tiempo a los muros que toca se van a construir en los cárcamos, darle mejor acabado y protegerlos de las inclemencias del tiempo a los muros de la siamesa, resanar los muros donde se van a abrir los vanos para ventilación en el cuarto donde queda ubicada la planta eléctrica.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,12. ANCLAJE 1/2" L=50 cm:

Se hace necesario la inclusión de este nuevo ítem para el confinamiento de los muros de una caseta que se construirá sobre el tanque subterráneo, que fue construido para el suministro de agua potable al CRIR, pues en los comités realizados con interventoría y supervisión se acordó la construcción de esta para la seguridad y protección del sistema de bombeo.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,13. MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M:

Es de vital importancia la inclusión de este nuevo ítem ya que sería la estructura y cerramiento de la caseta que se va a construir para garantizar la protección y seguridad de los equipos encargados de mantener con la mejor calidad de agua potable en todos y cada uno de los puntos donde se requiere dentro y fuera del CRIR.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,14. ACERO FIGURADO 60000 PSI:

Se hace impajaritable la inclusión de este nuevo ítem ya que sería el encargado del confinamiento, reforzamiento y así poder garantizar la calidad y estabilidad de todos los muros que son construidos

para la conformación de la caseta que servirá para garantizar el Servicio de agua potable para todo el CRIR.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,15. VIGA AÉREA 3500 PSI:
Es de vital importancia la inclusión de este nuevo ítem ya que sería el encargado de terminar de rigidizar los muros estructurales por la parte superior en conjunto con la estructura de la cubierta.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5, 1,16. DOVELA, GROUTING 3000 PSI:
Es necesaria la inclusión de este ítem puesto que este tipo de concreto junto con el acero son los encargados de rigidizar y confinar la mampostería estructural que va a usarse para la construcción de la caseta que servirá como proyección y seguridad para el sistema de bombeo de agua potable.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5, 1,17. ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM):
Es de vital importancia la inclusión de este nuevo ítem ya que dicha estructura sería la encargada de soportar y anclar la cubierta a los muros de la caseta que está proyectada para el sistema de bombeo de agua potable.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5, 1,18. TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA:
Es fundamental incluir este nuevo ítem pues está cubierta es la que brindaría protección de las inclemencias del tiempo y seguridad contra posibles pérdidas de los equipos de bombeo ubicado en la caseta.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,19. PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM:
Es fundamental incluir este ítem ya que tiene varios fines como es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros protegerlos de patógenos producto de las inclemencias del tiempo.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,20. EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA:

Es fundamental incluir este nuevo ítem para poder realizar el drenaje de las cajas eléctricas existentes ya que cuando fueron construidas dichas cajas no previnieron que con las lluvias estas se llenarían de agua y cabe resaltar que por estas cajas y ductos se va a instalar cables para la conducción de electricidad y el recubrimiento de estos no están diseñado para estar todo el tiempo entre el agua y muy seguramente tendrán un daños prematuros donde el aislamiento puede sufrir deterioro y ocasionar fallas eléctricas que pueden acarrear daños a los equipos conectados como también interrupción en el servicio, por todo lo anteriormente expuesto es más que vital su inclusión.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,21. MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8:

Es de vital importancia la inclusión de este nuevo ítem ya que es parte de la puerta que les dará seguridad de posibles fraudes a los equipos encargados del bombeo de agua potable hacia los edificios del CRIR, garantizar la seguridad de la Ups de 15 kVA para respaldo de energía en los puestos de trabajo.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,22. FILOS O DILATACIONES S/MURO:

Es fundamental este nuevo ítem para terminar de darle acabados al pañete tanto en la casta para el bombeo de agua potable como del cuarto de la planta eléctrica donde se va a realizar la instalación de las ventanas de ventilación.

>REVISADO Y APROBADO.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

ÍTEM 5,1,23. VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS:

Es necesario incluir este ítem para terminar de darle un acabado final como obra blanca en la caseta de bombeo de agua potable hacia los edificios del CRIR y la siamesa.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,24. ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL):

Es necesario incluir este ítem para terminar de darle un acabado final como obra blanca en el cuarto donde será ubicada la planta eléctrica donde se va a realizar la instalación de las ventanas de ventilación.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,25. PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO:
Es vital inclusión de este ítem para garantizar la seguridad de posibles fraudes contra los equipos que se van a instalar en la caseta para el bombeo de agua potable hacia los edificios del CRIR, garantizar la seguridad de la UPS de 15 kVA para respaldo de energía en los puestos de trabajo.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,26. DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M:
Es importante la inclusión de este ítem para poder realizar la instalación de las ventanas en celosía para la ventilación recomendada en el cuarto donde será ubicada la planta eléctrica.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,27. CELOSÍA ALUMINIO 100 CM X 60 CM:
Es fundamental la inclusión de este nuevo ítem para la instalación de las ventanas en celosía para la respectiva ventilación necesaria en el cuarto donde se va a realizar la instalación de la planta eléctrica como también en la caseta de equipo de bombeo.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,28. ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04:
Es necesaria incluir este ítem para poder garantizar que los tanques subterráneos tanto para el suministro de agua potable como de red de suministro de agua potable no tendrán filtraciones por la parte inferior esto por la cantidad de tiempo de fueron construidos y no se les han dado su respectivo uso.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,29. CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2"):
Es de vital importancia la inclusión de este nuevo ítem ya que sería la estructura y cerramiento para garantizar la seguridad y protección del Transformador tipo pad mounted 75 kVA y exigido por ENEL CODENSA y que está contratada la instalación en el edificio del CRIR.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,30. MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M:

Es fundamental la inclusión de este nuevo ítem ya que sería la parte fundamental para garantizar la seguridad y protección contra posibles hurtos a la UPS de 15 KVA para respaldo de energía en los puestos de trabajo y que está contratado el suministro e instalación en el edificio del CRIR.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,31. PERFORACIONES MECANICAS TANQUE SUBTERRANEO DE 2":
Es de vital importancia la inclusión de este nuevo ítem ya que cuando realizaron la construcción de los tanques subterráneos para el almacenamiento de agua tanto para la red contra incendio como suministro de agua potable no contemplaron las entradas de redes eléctricas como el sistema de succión de las electrobombas que se van a instalar para dichas actividades.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,32. PERFORACIONES MECANICAS TANQUE SUBTERRANEO DE 4":
Es de vital importancia la inclusión de este nuevo ítem ya que cuando realizaron la construcción de los tanques subterráneos para el almacenamiento de agua tanto para la red contra incendio como suministro de agua potable no contemplaron las entradas de redes eléctricas como el sistema de succión de las electrobombas que se van a instalar para dichas actividades.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,33. SUMINISTRO INSTALACIÓN LUZ CASETA CELADOR:
Es fundamental la inclusión de este nuevo ítem para poderle dar servicio de energía eléctrica a la caseta.
Este cable no fue incluido en el contrato inicial, pero se requiere para la alimentación de las salidas eléctricas de la caseta ya que solo tiene la instalación de los puntos eléctricos, pero no está la alimentación de la acometida desde el cuarto eléctrico alimentado por el Transformador y el Grupo electrógeno, el calibre del conductor se calcula por carga y distancia entre otros parámetros como se presenta en su momento en los planos y en las memorias de calculo que se le entreguen al certificador RETIE.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,34. BREAKER TABLERO CONTROL RED CONTRA INCENDO:
Es de vital importancia la inclusión de este nuevo ítem ya que sería una de las protecciones en la red que se va a instalar para el funcionamiento de las electrobombas de la red contraincendios de las instalaciones del CRIR.

Estas protecciones no fueron incluidas en el contrato inicial ya que aparece en el diseño la ubicación de la bomba red contra incendios, pero se requieren ya que van a proteger la bomba en caso de una avería interna o para hacerle mantenimiento.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,35. ARRANCADOR PARA BOMBA DE 3 HP:

Es fundamental la inclusión de este nuevo ítem ya que sería el encargado de proteger y controlar el encendido y apagado de la electrobomba que está proyectada instalar en la caseta sobre el tanque subterráneo para el suministro de agua potable al CRIR.

El arrancador para la bomba de presión de suministro de agua potable no fue incluido en el contrato inicial ya que aparece en el diseño la ubicación de la bomba de presión, pero no está el arrancador que es el encargado de controlar el encendido y apagado de forma automática como también de protegerla de las averías internas que pueda tener en caso de falla.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,36. SUMINISTRO INSTALACIÓN BOMBA INYECTORA DE 2 HP:

Es de vital importancia la inclusión de este nuevo ítem para garantizar un drenaje en el cuarto de electrobombas para la red contra incendio.

La bomba eyectora no aparece en el contrato, pero se requiere ya que si por alguna circunstancia se llega a dañar algún tubo o las bomba Líder y Jockey de la red contra incendios presente alguna fuga de agua esta va a inundar el cuarto y por ende va a deteriorar las bombas como también no habrá como ingresar al cuarto inundado.

>REVISADO Y APROBADO.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

ÍTEM 5,1,37. ACCESORIOS Y PRUEBAS DE CABLE XLPE-15KV 70mm (2/0 AWG):

Es fundamental la inclusión de este nuevo ítem para la correcta instalación del cable XLPE-15kV 70mm (2/0 AWG).

Esta prueba VLF del cable XLPE que se hace con un equipo especializado no se contempló en el contrato inicial, pero lo exige ENEL CODENSA para garantizar la correcta instalación como también daños internos que pueda tener el cable y cuando sea energizado pueda presentar una explosión generando el daño del material como un accidente a las personas que transiten en su trayectoria.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,38. MEDIDOR TRIFASICO TETRAFILAR ELECTRONICO 2014-A 1800 3X58/100-277/480V, (10AP) CONEXCCION INDIRECTA CLASE DE IMPRESICION 0,5S ENERGIA, REACTIVA PERFIL DE CARGA RS 232:

Es de vital importancia la inclusión de este nuevo ítem ya que se requiere hacer el aforo de el consumo de energía.

Los dos medidores de energía tanto para el aforo de la energía consumida por el CRIR y el de la Bomba red contra incendios, están en los diseños, pero no fueron incluidos en el contrato inicial y son requeridos por el operador de red ENEL CODENSA como requisito para dar servicio de energía.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,39. ACOMETIDA MEDIA TENSIÓN EN CABLE XLPE-15KV – 70mm (2/0 AWG) AL:

Es fundamental la inclusión de este nuevo ítem por varias razones como son las siguientes.

En cuanto a la parte económica se tiene en el presupuesto contratado 110m y se requiere adicionar 250m más para un total de 360m, el cable en Aluminio es más económico que el de Cobre y por lo tanto en el presupuesto no se elevaría ya que la diferencia en precio entre estos es del 50% más barato el de Aluminio aproximadamente.

Por otro lado, al instalarse el cable en Aluminio es menos atractivo en lo referente al hurto ya que suele suceder muy a menudo por el costo del cobre que cada vez está más elevado por lo cual ENEL CODENSA recomienda que se use cable en Aluminio en las nuevas instalaciones.

En lo que tiene que ver en la parte técnica operativa eléctricamente es igualmente de eficiente el cable en Aluminio que el de cobre ya que por parte de capacidad de carga eléctrica a transportar se compensa con un calibre superior, además el cable que está alimentando la subestación de bomberos esta en aluminio y no presenta ningún inconveniente, se ANEXA informe técnico.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,40. RED SANITARIA PVC-S 4":

Es fundamental incluir este nuevo ítem como complemente del ítem 5,1,20 para poder realizar un drenaje de las cajas eléctricas existentes ya que cuando fueron construidas dichas cajas no previnieron que con las lluvias estas se llenarían de agua y cabe resaltar que por estas cajas y ductos se va a instalar cables para la conducción de electricidad y el recubrimiento de estos no están diseñado para estar todo el tiempo entre el agua y muy seguramente tendrán un daños prematuros donde el aislamiento puede sufrir deterioro y ocasionar fallas eléctricas que pueden acarrear daños a los equipos conectados como también interrupción en el servicio, por todo lo anteriormente expuesto es más que vital su inclusión.

>REVISADO Y APROBADO.

ÍTEM 5,1,41. TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A):

Es necesario este tablero ya que se requiere para la distribución de las diferentes cargas y las protecciones de estas, en el cuarto de la red contra incendios.

>REVISADO Y APROBADO.

2- A CONTINUACIÓN, SE RELACIONAN LOS ÍTEM QUE SE ESTÁ SOLICITANDO LA INCLUSIÓN BASADOS EN LAS TABLAS ICCU.

ÍTEM NO PREVISTOS		PRECIOS TABLAS ICCU	
ITEM	**ACTIVIDAD**	**ITEM**	**DESCIPCION**
5,1,3	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA	12.23.	LÁMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA
5,1,4	SALIDA LÁMPARA EMT COMPLETA	12.3.	SALIDA LÁMPARA EMT COMPLETA
5,1,5	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA	12.3.	SALIDA LÁMPARA TOMA EMT COMPLETA
5,1,8	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M	1.22.	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.20 M
5,1,10	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)	5.40.	MURO TOLETE COMÚN 0.12 M (LINEAL)
5,1,11	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)	6.18.	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL)
5,1,12	ANCLAJE 1/2" L=50 cm	5.53.	ANCLAJE 1/2" L=50 cm
5,1,13	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M	5.29.	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL 0.15 M
5,1,14	ACERO FIGURADO 60000 PSI	4.22.	ACERO FIGURADO 60000 PSI
5,1,15	VIGA AÉREA 3500 PSI	4.26.	VIGA AÉREA 3500 PSI
5,1,16	DOVELA, GROUTING 3000 PSI	5.57.	DOVELA, GROUTING 3000 PSI
5,1,18	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA	7.44.	TEJA TERMOACUSTICA ONDULADA
5,1,19	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	6.17.	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM
5,1,20	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M	16.3.	EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M
5,1,21	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8	10.4.	MARCO PARA PUERTA EN LÁMINA CAL 18-0.8
5,1,22	FILOS O DILATACIONES S/MURO	6,3	FILOS O DILATACIONES S/MURO
5,1,23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	18.23.	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS
5,1,24	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)	18.17.	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS (LINEAL)
5,1,25	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	10.7.	PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO
5,1,26	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	1.16.	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M
5,1,27	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	10.2.	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM
5,1,28	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04	13.2.	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0.04
5,1,29	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	10.10.	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")
5,1,30	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M	5.15.	MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.12 M
5,1,40	RED SANITARIA PVC-S 4"	11.33.	RED SANITARIA PVC-S 4"
5,1,41	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)	12.14.	TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)

Luego de presentar su respectiva justificación de cada uno de los ITEM'S damos la aprobación por parte de La Interventoría, teniendo en cuenta los APU's presentados por el contratista ya sea precio ICCU o sus respectivos soportes de cotizaciones en caso de no serlo y lo remitimos a La Supervisión para su aprobación, y solicitarle la resolución de aprobación por parte de la entidad contratante.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente.

Atentamente.

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Tocancipá, 26 de julio de 2023

Oficio No 22

SUPERVISION
Atn. Ing. MARIO ENRIQUE SUENCA P.
Secretario de Infraestructura
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Ref. Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, del contrato de obra No. CTO 440 MT 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

Asunto: **SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA CTO 459 MT 2022.**

Respetado Ing. Mario,

Cordial saludo, Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar la **ADICIÓN Y PRORROGA** del contrato en referencia. De acuerdo con la ampliación del tiempo del contrato CTO 440 MT2022 por los motivos expuestos más adelante revisados y avalados por La Interventoría y Aprobada por La Supervisión de acuerdo con el balance general y el cronograma presentado por el Contratista en un término de (60) días para culminación de la obra y por (30) días adicionales para su liquidación por parte de La interventoría para un total de (90) días laborales calendario para su terminación y liquidación.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERIA ELÉCTRICA

Agradecemos de antemano la atención a la presente.

Atentamente.

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, del contrato de obra No. CTO 440 MT 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

A continuación, se presenta el análisis (motivos y causas) por la cual se requiere incrementar el valor del presupuesto y la ampliación o prorroga de tiempo (plazo) de ejecución:

"Por la adición de los ítems nuevos de las actividades no previstas, por la adición de cantidades de obra mayores y además el proceso de aprobación y revisión del proyecto serie 3 de ENEL CODENSA pendiente, certificación RETIE, RETILAP en las empresas certificadoras, las cuales tienen tiempos que pueden oscilar bastante de acuerdo con las disponibilidades de programación de los funcionarios de cada una de las entidades involucradas".

ADICIÓN

- El valor del contrato inicial es de **VEINTE Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS PESOS M/CTE. ($29.797.600)**. Por un término de (6) meses.
- El valor Adicional del contrato por ampliación de tiempo ya que como el contrato de Interventoría se le va a adicionar 90 días es decir (3) meses el valor es de **CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE**. (**$14.898.800**) al cual corresponde al **50%** del valor del contrato inicial.

PRORROGA

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Teniendo en cuenta la cantidad de actividades no contempladas o no previstas, presentadas por El Contratista revisados y avalados por La Interventoría y Aprobada por La Supervisión de acuerdo con el balance general y el cronograma presentado por El Contratista, solicitamos una adición en tiempo (prorroga) de 60 días calendario para la culminación de la obra y por (30) días adicionales para su liquidación por parte de La interventoría para un total de (90) días laborales calendario para su terminación y liquidación, quedando una fecha estimada para la terminación del contrato así:

Fecha de reinicio a la suspensión 3: 26 de julio de 2023.
Fecha de terminación 3: 11 de agosto de 2023
Prorroga 90 días, nueva fecha de terminación: 9 de noviembre de 2023.

Tocancipá, 31 de julio de 2023

Oficio No 23

Arquitecta
MAGALY MERCHAN
Apoyo Supervisión / Infraestructura.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Ref. Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, del contrato de obra No. CTO 440 MT 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

Asunto: **SOLICITUD ADICIÓN Y PRORROGA CONTRATO CTO 440 MT 2022.**

Cordial saludo Arquitecta Magaly.

Por medio de la presente y por petición del contratista de la obra No CTO440 MT 2022 cuyo objeto en referencia, de acuerdo con los motivos expuestos en el oficio ANEXO, en el cual solicita la **ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO** de la obra por termino de 60 días calendario para su terminación, dando así una fecha estimada para la terminación del contrato así:

PRORROGA

Teniendo en cuenta la cantidad de actividades no contempladas o no previstas, solicitamos una adición en tiempo (prorroga) de 60 días calendario para su terminación, dando así una fecha estimada para la terminación del contrato así:

Fecha de reinicio a la suspensión 3: 26 de julio de 2023.
Fecha de terminación 3: 11 de agosto de 2023
Prorroga 60 días, nueva fecha de terminación: 10 de octubre de 2023.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

A continuación, presentan los motivos:

"Por la adición de los ítems nuevos de las actividades no previstas, por la adición de cantidades de obra mayores y además el proceso de aprobación y revisión del proyecto serie 3 de ENEL CODENSA pendiente, certificación RETIE, RETILAP en las empresas certificadoras, las cuales tienen tiempos que pueden oscilar bastante de acuerdo con las disponibilidades de programación de los funcionarios de cada una de las entidades involucradas".

ADICIÓN

El valor total del contrato será de **SETECIENTOS VEINTE SEIS MILLONES SEIS CIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. ($ 726.696.760),** justificados de la siguiente manera:

- ✓ Valor inicial del contrato: **$ 484´449.894,** equivalente a 484,45 salarios mínimos mensuales legales del 2022.
- ✓ Valor adicional del contrato por actividades no previstas es **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($ 242´246.866),** este valor equivale a un **50.00%** del valor inicial.

El contratista de obra presenta a continuación en el ANEXO los siguientes documentos:

1. BALANCE GENERAL A LA FECHA
2. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CUADROS COMPARATIVOS, COTIZACIONES Y MEMORIAS DE CANTIDADES
3. JUSTIFICACIÓN ACTIVIDADES NO PREVISTAS (NP)

De acuerdo con los motivos anteriores presentados por el contratista de la obra en referencia, por parte de La Interventoría avalamos la petición de la **ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO** de los 60 días quedando sujetos a las observaciones o sugerencias por parte de La Supervisión.

En cuanto al BALANCE FINANCIERO 31-07-2023 presentado por el contratista, su aprobación se hizo mediante el Oficio No 20 de Interventoría.

Agradecemos de antemano la atención a la presente.

Atentamente.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Ingelco – Proyectos E.U.
Ingeniería Eléctrica
Renovables
NIT: 820.002.625-7
Calidad e Innovación

Tocancipá, 31 de julio de 2023.

OF- 24

Arquitecta
MAGALY MERCHAN
Apoyo Supervisión / Infraestructura.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Asunto: **APROBACIÓN ITEMS NP30-33 01-08-2023 - CTO 440 MT 2022.**

REF.: Contrato de Interventoría No. CTO 459 MT 2022. Cuyo objeto es:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIODE TOCANCIPÁ".

Respetada Arq. Magaly

Cordial saludo, por medio de la presente La Interventoría del contrato en referencia, se permite dar APROBACIÓN A LOS ITEM'S No Previstos NPO 30, NPO 31, NPO 32 y NPO 33, con fecha 31-07-2023 entregado por el contratista de obra CTO 440 MT 2022, lo remitimos a La Supervisión para su verificación. (Ver archivo anexo).

Agradezco de antemano la atención a la presente.

Atentamente.

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Tunja, Diagonal 57#7-10 | Cel: 311 480 9242 - 315 355 0218 | Email: ingelcoproyectos@gmail.com

ANEXO
CONCEPTO DE INTERVENTORÍA
APROBACIÓN A LOS ITEMS NO PREVISTOS ADICIONALES NUEVOS PARA EL MODIFICATORIO

NP	ACTIVIDADES NO PREVISTAS

NOTA: -Se requiere 3 cotizaciones como mínimo tanto de materiales como de mano de obra para todos los ITEM´S nuevos que no estén o se encuentren desfasados con respecto a los precios en el ICCU.
-Revisar que todos los ITEM'S en MEMORIAS como en los APUS este completa su especificación tal como aparece en el BALANCE.

OBRA CIVIL

	NPO-30	Vinilo tipo uno para Exteriores a 2 manos, sobre pintura existente	M2	$ 18.505,14	1.391,02	$	25.741.060

Nota: - Presentaron 3 cotizaciones de los materiales y se toma como referencia el APU del ítem 18.23 del ICCU, pero se le adiciona el equipo andamio tubular dadas las condiciones de trabajo (altura mayor a 3 mts), igualmente se incorpora el costo de herramienta menor y se cambia el valor y rendimiento de la pintura por condiciones para exteriores.
NPO-30 REVISADO Y APROBADO

1. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
Herramienta menor (%MO)	%	15.291,18	5%	$764,56
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.	D	1.590,00	1,54	$2.449,40
			SUBTOTAL	$3.213,96

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	V/UNIT	CANT.	VALOR PARCIAL
VINILO TIPO 1 PARA EXTERIORES (KORAZA O SIMILAR)	GL	95.380,00	0,06	5.723
			SUBTOTAL	$5.722,80

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MANO DE OBRA CC	$ 144.961,00	220%	$ 318.914,20	33,33	9.568
				SUBTOTAL	$9.568,38

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$18.505,14

Cotizaciones:

EQUIPO	HOMECENTER	EASY	METROPOLIS CENTER	PROMEDIO
VINILO TIPO 1 PARA EXTERIORES (KORAZA O SIMILAR)	$ 96.380,00	$ 96.380,00	$ 93.380,00	$ 95.380,00

	NPO-31	Reparacion de Fachada	M2	$	12.892,78	278,20	$ 3.586.828

Nota: - Se toma como referencia el APU del ítem 18.14 del ICCU, pero se le adiciona el equipo andamio tubular dadas las condiciones de trabajo (altura mayor a 3 mts), igualmente se incorpora el costo de herramienta menor.

NPO-31 REVISADO Y APROBADO

1. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
Herramienta menor (%MO)	%	9.946,08	5%	$497,30
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001.	D	1.590,00	1,54	$2.449,40
			SUBTOTAL	$2.946,70

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	V/UNIT	CANT.	VALOR PARCIAL
CAOLIN	BT	$ 16.056,00	0,09	$ 1.445,04
CEMENTO GRIS	KG	$ 509,00	0,26	$ 132,34
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UNID.	$ 1.590,00	0,02	$ 31,80
YESO CORRIENTE VENCEDOR	BT	$ 36.404,00	0,01	$ 364,04
			SUBTOTAL	$1.973,22

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MANO DE OBRA CC	$ 144.961,00	220%	$ 318.914,20	40,00	7.973
				SUBTOTAL	$7.972,86

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$12.892,78

	NPO-32	Vinilo tipo uno para interiores a 2 manos, sobre pintura existente	M2	$	10.747,80	560,99	$ 6.029.373

Nota: - Se toma como referencia el APU del ítem 18.23 del ICCU., se incorpora el costo de herramienta menor.

NPO-32 REVISADO Y APROBADO

1. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
Herramienta menor (%MO)	%	9.770,72	10%	$977,07
			SUBTOTAL	$977,07

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	V/UNIT	CANT.	VALOR PARCIAL
VINILO TIPO 1	GL	84.811,00	0,04	3.392
			SUBTOTAL	$3.392,44

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MANO DE OBRA CC	$ 144.961,00	220%	$ 318.914,20	50,00	6.378
				SUBTOTAL	$6.378,28

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$10.747,80

ICCU 15,5	NPO-33	Reparacion de cielo raso en drywall plano (incluye pintura)	M2	$	53.575,39	32,00	$	1.714.412

Nota: - Se toma como referencia el APU del ítem 15,5, pero se le eliminan los materiales ángulo cal. 26 lámina galv. 2.44 m, chazo plástico 1/4" y perfil omega metálico 63 mm x 3,05 m.
NPO-33 REVISADO Y APROBADO

1. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
ANDAMIO SECCIÓN	D	1.590,00	1,30	$1.223,08
TALADRO	D	45.539,00	100,00	$455,39
			SUBTOTAL	$1.678,47

2. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNID.	V/UNIT	CANT.	VALOR PARCIAL
LÁMINA DRYWALL 1/2" SUPERPLACA	M2	11.923	1,05	12.519
VINILO TIPO 1	GL	84.811,00	0,04	3.392
CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250	UN	9.936	0,07	696
MASILLA SUPERMÁSTICO 5GLN	GL	72.968	0,06	4.378
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UN	1.590	1,00	1.590
PERNO 1/2" ALT. VEL. 1 3/4"	UND	795	2,00	1.590
			SUBTOTAL	$24.165,19

3. MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	VALOR PARCIAL
MANO DE OBRA DD	$ 151.264,00	220%	$ 332.780,80	12,00	27.732
				SUBTOTAL	$27.731,73

TOTAL COSTOS DIRECTOS	$53.575,39

Tocancipá, 14 de agosto de 2023

Oficio No 25

SUPERVISION
Atn. Ing. MARIO ENRIQUE SUENCA P.
Secretario de Infraestructura
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Ref. Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, del contrato de obra No. CTO 440 MT 2022 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

Asunto: **SOLICITUD DE MANEJO DE CANINOS EN CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA-CRIR- DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, CONTRATOS CTO440 MT2022 Y CTO459 MT2022.**

Respetado Ing. Mario,

Cordial saludo, Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de solicitar a quien corresponda el manejo de los caninos en las horas laborales en el CENTRO REGINAL INTEGRAL DE RESPUESTA – CRIR - del Municipio de Tocancipá, por cuanto se han tenido mas de un incidentes con las personas que están laborando en el desarrollo de los contratos en ASUNTO, teniendo en cuenta lo dispuesto en el ART. 117 del CÓDIGO DE POLICÍA NACIONAL, además se requiere colocar una barrera para que los caninos no ingresen a los edificios Operativo y Alojamientos ya que se esta haciendo los acabados para entrega en funcionamiento a La Alcaldía.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERIA ELÉCTRICA

Agradecemos de antemano la atención a la presente.

Atentamente.

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Tocancipá, 28 de agosto de 2023.

OF- 26

Arquitecta
MAGALY MERCHAN
Apoyo Supervisión / Infraestructura.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Ref..: Contrato de Interventoría No. CTO 459 MT 2022. Cuyo objeto es: — **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"**

Asunto: **REVISADO Y APROBADO INFORME No7 - CTO 440 MT 2022.**

Respetada Arq. Magaly:

Cordial saludo, por medio de la presente La Interventoría del contrato en referencia, se permite dar APROBACIÓN AL INFORME MENSUAL No 7, comprendido de 26 de julio al 20 de agosto. Entregado por el contratista de obra CTO 440 MT 2022, después de haberlo revisado y emitido a La Supervisión. (Ver documento anexo).

Agradezco de antemano la atención a la presente.

No de Folios: ____

Atentamente.

o - Proyectos E.U.
IERÍA ELÉCTRICA

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Tocancipá, 27 de junio de 2023.

Arq.
MAGALY MERCHAN
Apoyo Supervisión / Infraestructura.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Asunto: **SOLICITUD DE CAMBIO ASESOR Y TÉCNICO ELECTRICISTA A PETICIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO CTO 440 MT2022.**

Respetada Arquitecta:
La presente con el fin de solicitar el cambio de asesor electricista y técnico electricista por motivo de la no disponibilidad de tiempo y por encontrarsen en otra ciudad manifestado por ellos.

De acuerdo con las competencias de cada uno de los profesionales y sus soportes anexos a la hojas de vida presentados, La Interventoría da el aval a la solicitud presentada por El Contratista, queda sujeto a la verificación y aprobación por parte de La Supervisión.

Asesor Electricista:
Ing. LUIS HERNANDO MANRIQUE por Ing. LIDA IRENE BERNAL HERNÁNDEZ

Técnico Electricista:
Tec. JHON FRANCISCO RODRIGUEZ NIETO por Tec. OSCAR JULIO PÉREZ PANQUEVA

Se anexa:
-hojas de vida de los profesionales de cambio
-diplomas
-matriculas profesionales
-certificaciones de estudio
-certificaciones laborales

INGENIERÍA ELÉCTRICA

Agradeciéndole de antemano la atención a la presente.

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Tocancipá, 19 de mayo de 2023.

Arquitecta
MAGALY MERCHAN
Apoyo Supervisión / Infraestructura.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Ref. Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, del contrato de obra No. CTO 440 MT 2022 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"**

Asunto: **SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No CTO 440 MT 2022.**

Cordial saludo Arquitecta Magaly.

Por medio de la presente y por petición del contratista de la obra No CTO440 MT 2022 cuyo objeto en referencia, de acuerdo con los motivos expuestos en el oficio ANEXO remitido por EL CONTRATISTA en el cual solicita la AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN de la obra por termino de 64 días a partir del 23 de mayo del 2023 al 26 de julio del 2023, a continuación, se exponen los motivos presentados por EL CONTRATISTA:

"1. Estamos en espera de Aprobación del proyecto eléctrico serie 1. El cual fue Radicado el 10-04-2023 y posteriormente ENEL remite observaciones las cuales se solucionan y se volvió a radicar el día 12-05-2023 estamos pendientes de la respuesta por parte ENEL. A continuación, luego de tener el proyecto serie 1 Aprobado, se debe Radicar el proyecto serie 3 el cual ya está bastante adelantado ya que fue el primero que ellos revisaron, pero por petición de ENEL se debía primero hacer Aprobar el proyecto serie 1.

Teniendo en cuenta los tiempos que ellos se toman para revisión y aprobación del proyecto serie 3 al cual normalmente presentan observaciones que luego se deben solucionar y volver a radicar, además posteriormente vienen las visitas técnicas de obra, complementación de documentos, posibles cambios de infraestructura existente, observaciones al mismo y finalmente orden de conexión.

Sin la aprobación de los proyectos serie 1 y serie 3, no podemos adelantar las labores propuestas en el contrato en lo que respecta a los alcances de estas aprobaciones, por lo tanto no es conveniente la compra de la mayoría de los materiales como: subestación eléctrica, transformador de corriente, cables, medidores eléctricos, Breaker's de protección entre otros, ya que si se requiere hacer algún cambio solicitado por el operador de red ENEL tendrían inconvenientes si se compraron esos materiales y aún peor si se instalaron."

De acuerdo con los motivos anterior presentados por el contratista de la obra en referencia, por parte de La Interventoría avalamos la petición de la AMPLIACIÓN A LA SUSPENCIÓN de los 64 días con fecha de reinicio seria el día 26 de julio del 2023, quedando sujetos a las observaciones o sugerencias por parte de la Alcaldía.

Agradecemos de antemano la atención a la presente.

Atentamente.

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U.
Interventor del proyecto.

Ingelco - Proyectos E.U.
INGENIERÍA ELÉCTRICA

Tocancipá, 16 de marzo de 2023.

Arquitecta
MAGALY MERCHÁN
Apoyo Supervisión / Infraestructura.
ALCALDÍA MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ.
Ciudad.

Ref. Contrato No. CTO 459 MT 2022 — INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS — CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

Asunto: **SOLICITUD DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No CTO 440 MT 2022.**

Respetada Arquitecta:
Por medio de la presente y por petición del contratista de la obra No CTO440 MT 2022 cuyo objeto en referencia, de acuerdo con los motivos expuestos en el oficio ANEXO, en el cual solicita la AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN de la obra por termino de 61 días a partir del 23 de marzo del 2023 al 23 de mayo del 2023.

Anexo 3 folios

Esperamos ver dado respuesta a las observaciones emitidas por La Supervisión.

Atentamente.

JORGE PULIDO CUADROS.
R-L Ingelco – Proyectos E.U
Interventor del proyecto.

16/03/2023 : 07:35 AM
ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ
Radicado No. 2-2023-1500-002631
Asunto:SOL_AMPLIACION
Dependencia:SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA(1500)
Folios:4
Anexos:SOPORTES

ANEXO E

CONTRATO DE OBRA No. CCT 440 MT 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CCT 459 MT 2022
PERIODO: JULIO-AGOSTO 2023

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

No	NOMBRE	CARGO	DIAS DEL MES (Cantidad de hora																				
			M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M
			26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Martha Sánchez	Director de interventoria	9	8	9	9	5		8	9	8	9	8	5		9	8	9	5	9	5		9	8
2	Victor Gonzalo Pulido Cuadros	Residente de interventoria	8	9	9	8	5		9	8	9	8	8	5		9	9	9	5	8	5		8	9
3	Darley Forero	Inspector SST	9	9	8	8	5		9	9	9	9	9	5		8	8	9	5	9	5		8	8

ELABORÓ: _____
Residente de Interventoría

APROBÓ: _____
Director de Interventoría

RELACIÓN DE PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No. CCT 440 MT 2022
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CCT 459 MT 2022
PERIODO: JULIO-AGOSTO 2023

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMETARIAS CRIR

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS - CRIR

| No | NOMBRE | CARGO | DIAS DEL MES (Cantidad de horas trabajadas en el día) | | |

ANEXO F

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GI-F-019
VERSION: 03
FECHA: JULIO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	26	OJBETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	31/07/2023	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	26,87%
DESDE	26/07/2023		% AVANCE SEMANA
HASTA	30/07/2023		1,26%

CONTRATO DE OBRA	CTO 440 MT 2022	VALOR COSTO DIRECTO	$ 368.123.019,76	PLAZO	6 MESES	FECHA DE INICIO	7/07/2022	FECHA VENCIMIENTO	9/10/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CTO 459 MT 2022	VALOR	$ 29.797.600,00	PLAZO	6 MESES	FECHA DE INICIO	7/07/2022	FECHA VENCIMIENTO	9/11/2023

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	%
1.3.1	Gabinete tipo III	UN	2,00	$ 1.082.652,00	2,00	0,586%	0,17	0,050%
1.3.2	Siamesa inyección 4" x 2 1/2" x 2 1/2"	UN	1,00	$ 2.764.598,00	1,24	0,931%	0,26	0,195%
1.3.3	Suministro e instalación de sistema red contra incendio compuesto por una bomba principal caudal de 200 GPM a 95 psi, bomba jockey capacidad 2,5 GPM a una presión de 105 psi accesorios de control maniobra	UN	1,00	$ 74.356.836,00	0,12	2,424%	0,05	1,010%
				TOTAL	$ 14.516.226	3,94%	$ 4.620.688	1,26%

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA
(REGISTRE MOVIMIENTOS - PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -	$ -	$ -

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TÉCNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)


LLEGARON A OBRA EL SUMINISTRO DE LA SIAMESA INYECCION, EL GABINETE TIPO III Y LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LA RED CONTRA INCENDIOS, CON EL FIN DE DAR INICIO A LA RESPECTIVA ENSAMBLACIÓN E INSTALACIÓN EN LAS SIGUIENTES SEMANAS.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA***
(CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y FINANCIERO)

SE PROCEDIÓ A VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE CONFORMAN LA SIAMESA, EL GABINETE TIPO III Y LOS EQUIPOS QUE CONFORMAN LA RED CONTRA INCENDIOS LOS CUALES LLEGARON A OBRA. ESTOS SERÁN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS COMO LO ES EL ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN DE ESTAS EN SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE UBICACIÓN.

SE VERIFICÓ CON AYUDA DEL PROFESIONAL EN SST QUE EL PERSONAL ENCARGADO EN DESARROLLAR CADA ACTIVIDAD HACE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE UNA MANERA CORRECTA.

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL



PERIODO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1-25	92,00%	25,61%	66,39%
SEM 26	3,94%	1,26%	2,69%
SEM 27	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 28	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 29	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 30	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO MES	3,94%	1,26%	2,69%
ACUMULADO TOTAL	95,94%	26,87%	69,08%

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA






SUMINISTRO DEL SISTEMA RED CONTRA INCENDIOS COMPUESTO POR UNA BOMBA PRINCIPAL CAUDAL DE 200 GPM A 95 PSI, BOMBA JOCKEY CAPACIDAD 2,5 GPM A UNA PRESIÓN DE 105 PSI ACCESORIOS DE CONTROL MANIOBRA



SUMINISTRO GABINETE TIPO III



SUMINISTRO SIAMESA INYECCIÓN 4" X 2 1/2" X 2 1/2"

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQINARIA

PERSONAL EN OBRA			EQUIPO EN OBRA	
DIRECTOR		1	RETRO	N.A.
RESIDENTE		1	VOLQUETA	N.A.
INSPECTOR		1	PILOTEADORA	N.A.
ASESOR SST		1	MEZCLADOR	N.A.
MAESTRO		1	BOMBA CONCRETO	N.A.
OFICIALES		1	OTROS	
AYUDANTES		0		
OTROS		#		

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)

FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
26/07/2023	2,00	7,00	NO
27/07/2023	1,00	8,00	NO
28/07/2023	1,50	7,50	NO
29/07/2023	1,00	3,00	NO
30/07/2023	n/a	n/a	n/a
	5,50	25,50	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUENTE SEMANA

SE ESPERA QUE LLEGUE A OBRA EL SUMINISTRO DEL ITEM 2.6.3 EL CUAL CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA, SISTEMA CONTRAINCENDIOS, CON CONTACTORES TRIFASICOS DE 100A EN AC3, A 208 V, CON SISTEMA DE SELECCIÓN MANUAL

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

SE RECOMIENDA MANTENER LAS ÁREAS DE TRABAJO ASEADAS YA QUE PUEDE OCASIONAR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES.

MARTHA JOHANNA SANCHEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

No. MAT: _____

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GI-F-019
VERSION: 03
FECHA: AGOSTO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	27
FECHA INFORME	7/08/2023
DESDE	31/07/2023
HASTA	6/08/2023

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

% AVANCE ACUMULADO	30,55%
% AVANCE SEMANA	3,68%

CONTRATO DE OBRA	CTO 440 MT 2022	VALOR	$ 368.123.019,76	PLAZO	6 MESES	FECHA DE INICIO	7/07/2022	FECHA VENCIMIENTO	9/10/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CTO 459 MT 2022	VALOR	$ 29.797.600,00	PLAZO	6 MESES	FECHA DE INICIO	7/07/2022	FECHA VENCIMIENTO	9/11/2023

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	%
2,6,3	Transferencia automática, sistema de incendios, con contactores trifásicos de 100A en AC3, a 208 v, con sistema de selección manual	UN	1,00	$ 26.058.026,00	0,836	5,92%	0,52	3,68%
				TOTAL	$ 21.784.510	5,92%	$ 13.550.174	3,68%

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA
(REGISTRE MOVIMIENTOS - PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -	$ -	$ -


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TÉCNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)

LLEGARON A OBRA EL SUMINISTRO DE LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA, SISTEMA DE INCENDIOS, CON CONTACTORES TRIFÁSICOS DE 100A EN AC3, A 208 V, CON SISTEMA DE SELECCIÓN MANUAL, CON EL FIN DE DAR INICIO A LA RESPECTIVA ENSAMBLACIÓN E INSTALACIÓM EN LAS SEMANAS SIGUIENTES.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA***
(CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y FINANCIERO)

SE PROCEDIÓ A VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE CONFORMAN LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA LOS CUALES LLEGARON A OBRA Y SERÁN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS COMO LO ES ENSAMBLACIÓN E INSTALACION DE ESTAS EN EL TRANSCURSO DE LAS SIGUIENTES SEMANAS.

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL



PERIODO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1-25	92,00%	25,61%	66,39%
SEM 26	3,94%	1,26%	2,69%
SEM 27	5,92%	3,68%	2,24%
SEM 28	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 29	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 30	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO MES	9,86%	4,94%	4,92%
ACUMULADO TOTAL	101,86%	30,55%	71,31%

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



SUMINISTRO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQINARIA

PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA	
DIRECTOR	1	RETRO	N.A.
RESIDENTE	1	VOLQUETA	N.A.
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	N.A.
ASESOR SST	1	MEZCLADOR	N.A.
MAESTRO	1	BOMBA CONCRETO	N.A.
OFICIALES	1	OTROS	
AYUDANTES	0		
OTROS	#		

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)

FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
31/07/2023	-	9,00	NO
1/08/2023	3,00	6,00	NO
2/08/2023	1,50	7,50	NO
3/08/2023	-	9,00	NO
4/08/2023	1,00	8,00	NO
5/08/2023	1,00	9,00	NO
6/08/2023	n/a	n/a	n/a
	6,50	48,50	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUENTE SEMANA

POR PARTE DE LA ALCALDIA SE ESPERA LA APROBACIÓN DEL MODIFICATORIO QUE SE LE HIZO AL CONTRATO INICIAL, CON EL FIN DE EMPEZAR A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN PARA AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ALISTAMIENTO PARA INSTALAR LA TRANSFERENCIA , ADICIOANLEMNTE SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTRATUALES EJECUTANDOLAS CON LA CALIDAD CORREPSONDIENTE

ASI MISMO SE ADELANTAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS PARA EL MODIFICATORIO QUE SE REQUIERE PARA AVANZAR EN LA EJECUCIÓN

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

SE RECOMIENDA EL ASEO EN LAS AREAS DE TRABAJO YA QUE PUEDE OCASIONAR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES.

SE RECOMIENDA POR INTERVENTORIA AGILIZAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES, SE HACE LA RECOMENDACION DE ABRIR MAS FRENTES DE OBRA PARA AVANZAR EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES,SE HACE LA RECOMENDACION POR INTERVENTORIA DE CONTAR CON SUFICIENTES PUNTOS DE HIDRATACION PARA EL PERSONAL, SE REALIZA LA RECOMENDACION POR INTERVENTORIA DE CONTAR CON EL MATERIAL SUFIENTE PARA QUE LAS ACIVIDADES DE OBRA NO SE SUSPENDAN POR FALTA DEL MISMO Y ASI NO SE GENEREN ATRASOS QUE PUEDEN SER TRAUMATICOS PARA EL DESARROLLO Y AVANCE DE LA OBRA

VERIFICAR CON EL RESPECTIVO PERSONAL DE SST QUE SE USEN LOS ELEMENTOS DE PROTECCION DE UNA MANERA CORRECTA YA QUE SE VA DAR INICIO A EJECUTAR ACTIVIDADES EN OBRA.

MARTHA JOHANNA SANCHEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No. MAT: _____

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GI.F-019
VERSION: 03
FECHA: JULIO DE 2020

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	28	OJBETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	14/08/2023	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	30,55%
DESDE	7/08/2023		% AVANCE SEMANA
HASTA	13/08/2023		0,00%

CONTRATO DE OBRA	CTO 440 MT 2022	VALOR	$ 368.123.019,76	PLAZO	6 MESES	FECHA DE INICIO	7/07/2022	FECHA VENCIMIENTO	9/10/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CTO 459 MT 2022	VALOR	$ 29.797.600,00	PLAZO	6 MESES	FECHA DE INICIO	7/07/2022	FECHA VENCIMIENTO	9/11/2023

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	%
							-	0,000%
							-	0,000%
							-	0,000%
							-	0,000%
							-	0,000%
							-	0,000%
							-	0,000%
							-	0,000%
				TOTAL	$ -	0,00%	$ -	0,00%


CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA
(REGISTRE MOVIMIENTOS - PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -	$ -	$ -

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TÉCNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA***
(CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y FINANCIERO)

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL



PERIODO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1-25	92,00%	25,61%	66,39%
SEM 26	3,94%	1,26%	2,69%
SEM 27	5,92%	3,68%	2,24%
SEM 28	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 29	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 30	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO MES	9,86%	4,94%	4,92%
ACUMULADO TOTAL	101,86%	30,55%	71,31%

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL EN OBRA			EQUIPO EN OBRA	
DIRECTOR		1	RETRO	N.A.
RESIDENTE		1	VOLQUETA	N.A.
INSPECTOR		1	PILOTEADORA	N.A.
ASESOR SST		1	MEZCLADOR	N.A.
MAESTRO		1	BOMBA CONCRETO	N.A.
OFICIALES		1	OTROS	
AYUDANTES		0		
OTROS		#		

REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)

FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
7/08/2023	1,50	7,50	NO
8/08/2023	-	9,00	NO
9/08/2023	-	9,00	NO
10/08/2023	2,50	6,50	NO
11/08/2023	1,00	8,00	NO
12/08/2023	-	3,00	NO
13/08/2023	-	-	
	5,00	43,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

EL DIA 10 DE AGOSTO, POR PARTE DE DE LA ALCALDIA Y LA SUPERVISION DEL CONTRATO NOS ANUNCIAN QUE EL MODIFICATORIO FUE APROBADO, POR LO TANTO SE LE COMINICO AL CONTRATISTA PARA QUE COMIENCE A EJECUTAR.
SE ESPERA QUE LLEGUE A OBRA LOS MATERIALES DE ARENA, GRAVILLA, BLOQUE Y CEMENTO PARA PODER DAR INICIO A LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO EN LADRILLO LAS CUALES CONFORMARAN EL CUARTO MAQ. AGUA POTABLE
SE DARA INICIO PARA DETERMINAR EL REPLANTEO DE LA UBICACIÓN DEL CUARTO DE BOMBA AGUA POTABLE SOBRE EL TANQUE, DE ESTA MANERA PODER DAR INICIO TAMBIÉN A LA COLOCACIÓN DE LOS ANCLAJES.
EMPEZAR CON LA RESPECTIVA DEMOLICIÓN DE LA PLACA MACIZA DEL CARCAMO.
PODER REALIZAR LA RESPECTIVA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS ELECTRICOS.
ESTA PROYECTADO HACER LA EXCAVACIÓN PARA COLOCACIÓN DE TUBO DE DRENAJE PARA LAS CAJAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS.
EN EL CUARTO DE BOMBA AGUA POTABLE SE ESPERA DAR COMIENZO A INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE CON EL FIN DE PODER INSTALAR LA TEJA TERMOACUSTICA.
SE ESPERA LA LLEGADA DEL MARCO Y PUERTA DEL CUARTO DE BOMBA AGUA POTABLE PARA PODER HACER LA RESPECTIVA INSTALACIÓN.
LAS CELOSIDAS EN ALUMINIO ESTA PROGRAMADA PARA ENTREGA EN OBRA LA PROXIMA SEMANA PARA COMENZAR SU INSTALACIÓN.
REALIZAR LA INSTALACIÓN DE RED SANITARIA PVC-S 4" Y A SU VEZ INSTALAR LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA.
DAR INICIO A LA APLICACIÓN DEL PAÑETE EN MUROS , CONSTRUCCIÓN DE VIGA AEREA Y DOVELAS.
EN ESTA SEMANA SE REALIZAN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZANDO LOS TRAMITES PERTINENTES ANTE LA EMPRESA DE ENERGÍA ENEL COLOMBIA.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

SE RECOMIENDA MANTENER LAS AREAS DE TRABAJO ASEADAS YA QUE PUEDE OCASIONAR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES.
SE SUGIERE TERMINAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS ELECTRICOS YA QUE SE REQUIEREN PARA REVISIÓN
SE ACONSEJA ESTAR PENDIENTES DE LAS REPARACIONES EN LAS FACHADAS YA QUE DE ESTA MANERA SE PUEDE DAR EL VISTO BUENO PARA LA APLICACIÓN DEL VINILO

MARTHA JOHANNA SANCHEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

No./MAT: _____

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GI-F-019
VERSION: 03
FECHA: AGOSTO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	29	OJBETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	21/08/2023	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	36,86%
DESDE	14/08/2023		% AVANCE SEMANA
HASTA	20/08/2023		17,29%

CONTRATO DE OBRA	CTO 440 MT 2022	VALOR COSTO DIRECTO	$ 552.184.528,46	PLAZO	6 MESES	FECHA DE INICIO	7/07/2022	FECHA VENCIMIENTO	9/10/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CTO 459 MT 2022	VALOR	$ 44.696.400,00	PLAZO	6 MESES	FECHA DE INICIO	7/07/2022	FECHA VENCIMIENTO	9/11/2023

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	%
2.6.3	Transferencia automática, sistema de incendios, con contactores trifásicos de 100A en AC3, a 208 v, con sistema de selección manual.	UN	1,00	$ 26.058.026,00	0,40	1,888%	0,43	2,029%
NPE-1	Inspección y certificación de cumplimiento de retie y retilap	GL	1,00	$ 9.948.000,00	1,00	1,802%	0,69	1,243%
NPE-2	Actualización del proyecto eléctrico	GL	1,00	$ 12.198.333,33	0,86	1,900%	1,00	2,209%
NPE-3	Lámpara a prueba de humedad tipo tortuga	UN	4,00	$ 56.754,00	1,00	0,010%	2,00	0,021%
NPE-4	Salida lampara toma emt completa	UN	4,00	$ 98.308,25	1,00	0,018%	2,00	0,036%
NPE-5	Salida toma emt completa	UN	4,00	$ 125.977,75	1,00	0,023%	2,00	0,046%
NPE-14	Tablero parciales 12 circuitos (incluye tacos de 30A)	UN	1,00	$ 520.324,00	0,50	0,047%	1,00	0,094%
NPO-1	Demolición placa maciza 0.20 m	M2	0,40	$ 83.646,00	15,00	0,227%	5,93	0,090%
NPO-2	Placa base concreto 0.20 2500 psi	M2	10,91	$ 82.416,00	25,00	0,373%	8,03	0,120%
NPO-3	Muro tolete común 0.12 m	ML	7,30	$ 39.789,00	3,00	0,022%	6,20	0,045%
NPO-4	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	ML	53,70	$ 13.935,00	5,00	0,013%	46,70	0,118%
NPO-5	Pañete liso muros 1:4, e=1.5 cm	M2	55,08	$ 21.944,00	21,00	0,083%	55,08	0,219%
NPO-6	Filos o dilataciones s/muro	ML	45,31	$ 9.087,00	12,00	0,020%	45,31	0,075%
NPO-7	Anclaje 1/2" l=50 cm	UND	10,00	$ 20.114,00	28,30	0,103%	10,00	0,036%
NPO-8	Muro en ladrillo estructural 0.15 m	M2	55,08	$ 108.023,00	25,00	0,489%	55,08	1,078%
NPO-9	Acero figurado 60000 psi	KG	207,64	$ 7.073,00	415,28	0,532%	207,64	0,266%
NPO-10	Viga aérea 3500 psi	M3	1,07	$ 980.423,00	0,54	0,096%	1,07	0,191%
NPO-11	Dovela, grouting 3000 psi	ML	33,05	$ 5.583,00	13,50	0,014%	33,05	0,033%
NPO-12	Estructura metálica para teja termoacústica trapezoidal (tubo estructural abierto 4"x2", 15	M2	33,12	$ 74.864,00	16,00	0,217%	33,12	0,449%
NPO-13	Teja termoacustica ondulada	M2	33,12	$ 76.703,00	21,07	0,293%	39,12	0,543%
NPO-14	Puerta en lamina cal 18 inc. Anticorrosivo	M2	2,00	$ 269.912,00	1,00	0,049%	1,00	0,049%
NPO-15	Marco para puerta en lámina cal 18-0.8	UND	2,00	$ 194.844,00	1,00	0,035%	1,00	0,035%
NPO-16	Vinilo sobre pañete 2 manos	M2	55,08	$ 9.771,00	23,00	0,041%	55,08	0,097%
NPO-17	Excavación manual zanja en tierra H=1,0 M	M3	1,20	$ 38.465,00	4,80	0,033%	3,20	0,022%
NPO-19	Demolición muros en mampostería 0.15 m	M2	2,55	$ 19.010,00	1,27	0,004%	8,55	0,029%
NPO-20	Celosía aluminio	M2	4,27	$ 259.017,00	5,00	0,235%	6,64	0,311%
NPO-21	Alistado impermeabilizado pisos 1:3, e = 0.04	M2	22,50	$ 43.315,00	5,00	0,039%	19,80	0,154%
NPO-22	Cerramiento malla eslabonada c. 10 inc. ángulo (paral en tubo estructural galvanizado 2")	M2	27,38	$ 139.781,00	13,68	0,346%	21,90	0,554%
NPO-28	Aseo general de pisos, lámparas y muros	GL	1,00	$ 7.059.210,33	0,47	0,601%	0,15	0,192%
NPO-30	Vinilo tipo uno para Exteriores a 2 manos, sobre pintura existente	M2	1391,02	$ 18.505,14	91,00	0,305%	771,04	2,584%
NPS-1	Red sanitaria PVC-s 4"	ML	6,00	$ 61.359,00	15,00	0,167%	16,50	0,183%
NPS-3	Tubería acero negro ranurada 6" sch-40 (incluye accesorios y soportes)	ML	54,00	$ 553.728,60	27,00	2,708%	41,26	4,138%
				TOTAL	$ 70.297.793	12,73%	$ 95.468.303	17,29%

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA
(REGISTRE MOVIMIENTOS - PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -	$ -	$ -

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TÉCNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)

SEGUIR CON LA CONSTRUCCIÓN DE LAS MAMPOSTERIAS, ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANOS ELECTRICOS, INSPECCION Y CERTIFICACIÓN RETIE Y RETILAP
SE CONTINUA CON LA REPARACIÓN DE LAS FACHADAS Y APLICACIÓN DE LA PINTURA EN EL EDIFICIO OPERATIVO.
SE REALIZÓ EL REPLANTEO DE UBICACIÓN DEL CUARTO DE BOMBA AGUA POTABLE SOBRE EL TANQUE; CON ESTO SE DA INICIÓ A LA COLOCACIÓN DE LOS ANCLAJES LOS CUALES PERMITIRÁN HACER LAS DOVELAS DE SOPORTE TANTO PARA MUROS, COMO VIGAS DE AMARRE.
SE DA INICIO HACIENDO LAS PERFORACIONES PARA LOS ANCLAJES, SE APLICÓ EL EPÓXIDO Y SE INSTALAN LAS VARILLAS DE ANCLAJE.
SE COMENZÓ HACER LOS MUROS EN LADRILLO ESTRUCTURAL DEL CUARTO DE AGUA POTABLE, A LA VEZ SE DA INICIO CON LA REPARACIÓN DE FACHADA Y PINTURA DE LA MISMA DEL EDIFICIO OPERATIVO.
SE HIZO LA DEMOLICIÓN DE LA PLACA MACIZA DEL CARCAMO DE LA SUBESTACION PROYECTADA.

SE EJECUTÓ LA RADICACIÓN DE PROYECTO SERIE 3 ANTE ENEL CODENSA, A LA VEZ SE DA COMIENZO CON LA VERIFICACIÓN DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS DE LOS TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN DEL EDIFICIO OPERATIVO Y ALOJAMIENTOS.
SE ESTÁ HACIENDO LA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS INTERNOS DE LOS EDIFICIOS OPERATIVO Y ALOJAMIENTO.
SE PROCEDE A FUNDIR LAS VIGAS AEREAS Y LAS DOVELAS QUE CONFORMAN EL CUARTO DE MÁQUINAS DE AGUA POTABLE.
SE DA TERMINACIÓN A LA INSTALACIÓN DE LA ESTRUCTURA METALICA CORRESPONDIENTE PARA LA TEJA TERMOACÚSTICA CON ESTO LA TEJA TERMO ACÚSTICA SE PROCEDE A SER INSTALADA ESTA ACTIVIDAD SE DESARROLLA EN EL CUARTO BOMBA AGUA POTABLE.
LLEGARÓN LOS MATERIALES A OBRA PARA EMPEZAR A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS; DE LOS CUARTOS DE MAQUINAS DE AGUA POTABLE Y DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIOS. ENTRE ESTOS MATERIALES LLEGA LA LAMPARA A PRUEBA TIPO TORTUGA.
SE HIZÓ LA APERTURA O DEMOLICION DE MUROS PARA LOS DESFOGUES DEL CUARTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA.
EN EL CUARTO DE MAQUINAS BOMBA AGUA POTABLE, SE HICIERÓN LOS PAÑETES, FILOS Y DILATACIONES TAMBIEN LOS VANOS DE LAS VENTANAS DEL CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA.
CON LAS OBSERVACIONES DADAS POR ENEL CODENSA ANTE EL PROYECTO SERIE 3 SE PROCEDE A DAR SOLUCIÓN A ESTAS, CON EL FIN DE VOLVER A RADICARLAS Y SEGUIR EL PROCESO DE ESTE TRÁMITE.

SE SIGUIO CON LA REPARACIÓN DE LA FACHADA Y PINTURA DEL EDIFICIO OPERATIVO POR OTRO LADO SE SIGUE CON LA ACTUALIZACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS DE LOS EDIFICIOS OPERATIVO Y ALOJAMIENTOS Y ALUMBRADO EXTERIOR.
SE CULMINÓ LAS ACTIVIDADES DE INSTALACION DE LAS CELOSIA DEL CUARTO DE BOMBA AGUA POTABLE Y DEL CUARTO PLANTA, EL TUBO SANITARIO DE 4" PARA EL DESAGUE DE CAJAS ELÉCTRICAS.
SE APLICÓ LA PINTURA TIPO VINILO SOBRE PAÑETE EN DOS MANOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS AGUA POTABLE Y EN EL CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA SE APLICO ESTUCO Y PINTURA TRES MANOS.
DURANTE ESTA SEMANA SE ALISTA LA IMPERMEABILIZADO DE PISOS EN EL CUARTO DE BOMBA RED CONTRA INCENDIOS. SE HACE EL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA DE PROTECCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y SE HIZÓ ASEO EN LAS ÁREAS DEL EDIFICIO OPERATIVO Y ALOJAMIENTOS.
INSTALACIÓN DE LA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA Y DE LA CELOSIA, A SU VEZ SE LLEGA A OBRA EL SUMINISTRO DE UN MARCO Y PUERTA PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN TABLERO PARCIALES DE 12 CIRCUITOS EL CUAL VA UBICADO EN EL CUARTO MAQUINAS BOMBA AGUA POTABLE.
HACER LA EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA PARA COLOCACIÓN DE TUBO DE DRENAJE PARA LAS CAJAS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS.
SE REALIZA EL PAGO DEL MEDIDOR DEL GAS NATURAL Y VISITA RETIE

SE HACE INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA CONDUIT 3" LA CUAL ESTA UBICADA EN EL CUARTO ELECTRICO Y CUARTOS EQUIPOS DE MEDIA Y TGD, ESTA ACTIVIDAD HACE PARTE DE LOS IMPREVISTOS QUE SE DESARROLLARON EN OBRA.
SE HACE LA COMPRA E INSTALACIÓN DE LOS DOS FLOTADORES MECÁNICOS PARA TANQUES DE 1" LOS CUALES VAN A ESTAR UBICADOS EN EL TANQUE DE AGUA POTABLE Y TANQUE RED CONTRA INCENDIOS, ESTA ACTIVIDAD HACE PARTE DE LOS IMPREVISTOS QUE SE DESARROLLARON EN OBRA.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA***
(CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y FINANCIERO)

SE VERIFICÓ CON AYUDA DEL PROFESIONAL EN SST QUE EL PERSONAL ENCARGADO EN DESARROLLAR CADA ACTIVIDAD HACE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE UNA MANERA CORRECTA.
EL INTERVENTOR ENCARGADO HACE EL DEBIDO ACOMPAÑAMIENTO EN LA APERTURA O DEMOLICIÓN DE LOS MUROS DE VANOS DE LOS DESFOGUES DEL CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA PARA COLOCAR LAS VENTANAS ALLÍ REQUERIDAS. TAMBIÉN SUPERVISA EN EL REPLANTEO DEL CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PARA LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.


SE HIZO EL ACOMPAÑAMIENTO A LA CULMINACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS AGUA POTABLE CON EL FIN DE COMPROBAR QUE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD FUERA ACORDE A LOS PLANOS APROBADOS.
SE EVIDENCIA LA INSTALACION DE LA TRANSFERENCIA, CELOSIA, MARCO Y PUERTA, TAMBIEN SE VERIFICA LA EVOLUCIÓN DE LOS VINILOS, PINTURAS Y PAÑETES QUE SE ESTAN DESARROLLANDO PARA DETERMINAR QUE SU APLICACIÓN SEA LA CORRECTA.
SE PROCEDIÓ A VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE LLEGARON A OBRA LOS CUALES SON PINTURA, ACERO FIGURADO,CEMENTO, LADRILLO ESTRUCTURAL Y LA PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES DE MINA COMO ARENA Y GRAVILLA ESTOS SERÁN UTILIZADOS PARA DESARROLLAR DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
SE HIZO EL ACOMPAÑAMIENTO EN EL REPLANTEO DE LA CONTRUCCIÓN DEL CUARTO DE MAQUINAS AGUA POTABLE TENIENDO ENCUENTA EL PLANO APROBADO DEL CUARTO.
SE HACE UN RECORRIDO POR LA OBRA; PARA VERIFICAR QUE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEA LA CORRECTA Y A LA VEZ SE EVIDENCIA EL AVANCE DE ESTAS.
LA INTERVENTORIA DA AVAL A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL





PERIODO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1-25	92,00%	25,61%	66,39%
SEM 26	3,00%	0,64%	2,36%



SEM 27	4,50%	1,86%	2,64%
SEM 28	0,00%	0,00%	0,00%
ACUM. SEM 26-28	32,94%	19,57%	13,37%
SEM 29	12,73%	17,29%	-4,56%
SEM 30	0,00%	0,00%	0,00%
SEM 31	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO MES	12,73%	17,29%	-4,56%
ACUMULADO TOTAL	45,67%	36,86%	8,81%

MODIFICATORIO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Replanteo de ubicación cuarto de agua potable y materiales para inicio cuarto.







Perforaciones, aplicación de epoxico e instación de varillas de anclaje



Construcción de muros cuarto de agua potable.







Construcción muros estructurales y vigas aereas cuarto







Instalación de estructura metalica trapezoidal, teja termoacustica y celosia cuarto de agua potable





Demolición y apertura de huecos ventanas para los desfogues de planta de emergencia e instalación celocidas en aluminio





Instalacion tubo sanitario de 4" desague cajas electricas





Vinilo para exteriores tipo uno - fachadas edificios CRIR



Pintuta tipo vinilo sobre pañete dos manos cuarto de agua potable



Tablero parciales de 12 Circuitos en cuarto bomba agua potable y tomas en EMT







Cerramiento con malla eslabonada de la subestacion electrica










Tubería acero negro 6" sch-40 (incluye accesorios y soportes)




Tubería PVC Conduit 3"

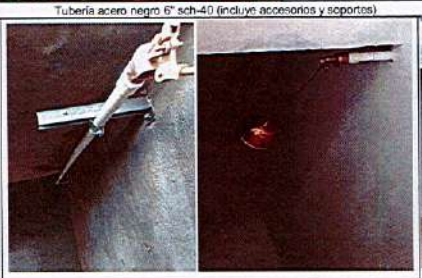

Flotadores mecanicos para tanques 1"



Puerta en lamina y marco metalico Cal. 18

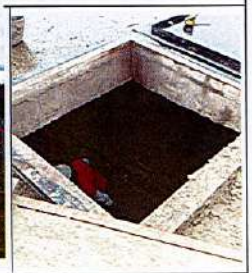

Alistado pisos cuarto maquinas bombas contra incendios

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQINARIA				REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)			
PERSONAL EN OBRA		EQUIPO EN OBRA		FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
DIRECTOR	1	RETRO	N.A.	14/08/2023	1,00	8,00	NO
RESIDENTE	1	VOLQUETA	N.A.	15/08/2023	3,00	6,00	NO
INSPECTOR	1	PILOTEADORA	N.A.	16/08/2023	-	9,00	NO
ASESOR SST	1	MEZCLADOR	N.A.	17/08/2023	2,00	7,00	NO
MAESTRO	1	BOMBA CONCRETO	N.A.	18/08/2023	1,00	8,00	NO
OFICIALES	1	OTROS		19/08/2023	-	3,00	NO
AYUDANTES	0						
OTROS	#				7,00	41,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUENTE SEMANA

SE ESPERA PARA LA PROXIMA SEMANA DAR INICIO CON LA INSTALACIÓN DE LA DUCTERIA RANURADA PARA LA RED CONTRA INCENDIOS,LA LAMPARA A PRUEBA DE HUMEDAD TIPO TORTUGA.

SE SIGUE CON LA REPARACIÓN DE LAS FACHADAS Y APLICACIÓN DE LA PINTURA SE HACE ÉNFASIS QUE ESTA ACTIVIDAD HA SIDO EXTENSO SU DESARROLLO, YA QUE SE REQUIERE DE ARMAR ARMARIOS Y TRASLADARLOS, ESTO HACE QUE LA ACTIVIDAD SEA MAS DEMORADA PARA CULMINARLA.

SE TIENE PROYECTADO INICIAR CON LA INSTALACION DE LAS SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS DE LOS CUARTOS DE MAQUINAS: BOMBA AGUA POTABLE Y BOMBA RED CONTRA INCENDIOS.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

SE RECOMIENDA PEDIR CON ANTICIPACIÓN LOS EQUIPOS A INSTALAR YA QUE ALGUNOS REQUIEREN TIEMPOS SIGNIFICATIVOS DE CONSTRUCCIÓN Y ESTO PUEDE ATRASAR EL DESARROLLO DE VARIAS ACTIVIDADES.

SE RECOMIENDA EL ASEO EN LAS AREAS DE TRABAJO, ESPECIALMENTE EN LAS QUE SE ENCUENTRAN ESCOMBROS DE LAS DEMOLICIONES REALIZADAS, YA QUE PUEDE OCASIONAR ACCIDENTES Y MUCHAS VECES ES DIFICIL EL ACCESO A ESTOS LUGARES.Y AVANZAR CON EL FIN DE IGUALAR EL PROCENTAJE DE PROYECTADO VS EJECUTADO

MARTHA JOHANNA SANCHEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

No. MAT: _____

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

INFORME SEMANAL DE AVANCE

CODIGO: GI-F-019
VERSION: 03
FECHA: AGOSTO DE 2023

INFORMACIÓN GENERAL

SEMANA No.	30	OJBETO DEL CONTRATO DE OBRA	% AVANCE ACUMULADO
FECHA INFORME	28/08/2023	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ	38,10%
DESDE	21/08/2023		% AVANCE SEMANA
HASTA	27/08/2023		1,23%

CONTRATO DE OBRA	CTO 440 MT 2022	VALOR COSTO DIRECTO	$ 552.184.528,46	PLAZO	6 MESES	FECHA DE INICIO	7/07/2022	FECHA VENCIMIENTO	9/10/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA	CTO 459 MT 2022	VALOR	$ 44.696.400,00	PLAZO	6 MESES	FECHA DE INICIO	7/07/2022	FECHA VENCIMIENTO	9/11/2023

CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANT	VR. UNITARIO	PROGR.	%	EJECUT.	%
NPE-3	Lámpara a prueba de humedad tipo tortuga	UN	4,00	$ 56.754,00	2,00	0,021%	2,00	0,021%
NPE-4	Salida lámpara toma emt completa	UN	4,00	$ 98.308,25	3,00	0,053%	2,00	0,036%
NPE-5	Salida toma emt completa	UN	4,00	$ 125.977,75	3,00	0,068%	2,00	0,046%
NPO-18	Estuco y vinilo 3 manos	ML	25,20	$ 13.497,00	25,20	0,062%	25,20	0,062%
NPO-30	Vinilo tipo uno para Exteriores a 2 manos, sobre pintura existente	M2	1391,02	$ 18.505,14	1.881,00	6,304%	156,00	0,523%
NPS-3	Tubería acero negro ranurada 6" sch-40 (incluye accesorios y soportes)	ML	54,00	$ 553.728,60	27,00	2,708%	5,44	0,546%
				TOTAL	$ 50.885.335	9,22%	$ 6.801.290	1,23%

CONTROL FINANCIERO DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA
(REGISTRE MOVIMIENTOS - PAGOS AUTORIZADOS Y RADICADOS ANTE LA ENTIDAD FIDUCIARIA)

No DE AUTORIZACIÓN	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FECHA RADICADO	FECHA PAGO REAL	VALOR BRUTO	DESCUENTOS Y RETENCIONES	PAGO NETO
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ -	$ -	$ -


ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA
(TÉCNICAS, LEGALES, ADMINISTRATIVAS - SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, GESTION AMBIENTAL, GESTION DE CALIDAD)

LLEGARON A OBRA LOS MATERIALES FALTANTES PARADAR POR TERMINADA LA EJECUCIÓN DE LAS SALIDAS DE ALUMBRADO Y TOMAS DE LOS CUARTOS DE MAQUINAS DE AGUA POTABLE Y DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIOS.
SE SIGUE DESARROLLANDO LA REPARACIÓN DE FACHADA Y PINTURA DE LOS EDIFICIOS TANTO ADMINISTRATIVO COMO DE ALOJAMIENTO.
SE APLICÓ LA PINTURA TIPO VINILO SOBRE PAÑETE EN DOS MANOS EN EL CUARTO DE MAQUINAS AGUA POTABLE Y EN EL CUARTO PLANTA DE EMERGENCIA SE APLICO ESTUCO Y PINTURA TRES MANOS.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA***
(CONTROL Y SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, JURIDICO Y FINANCIERO)

SE PROCEDIÓ A VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUE LLEGARON A OBRA LOS CUALES HACEN PARTE DEL ALUMBRADO Y TOMAS; ESTO SE HACE PARA PODER PROCEDER CON LA INSTALACIÓN FALTANTE DE ESTOS MATERIALES.
SE VERIFICÓ CON AYUDA DEL PROFESIONAL EN SST QUE EL PERSONAL ENCARGADO EN DESARROLLAR CADA ACTIVIDAD HACE USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE UNA MANERA CORRECTA.
EL INTERVENTOR HACE ACOMPAÑAMIENTO EN LA APLICACIÓN DE PAÑETES Y PINTURA DE FACHADA PARA VERIFICAR EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PLANOS Y ALCANCE CONTRACTUAL DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS, GARANTIZANDO LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS.
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) Y DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO.

GRÁFICA DE AVANCE - SEGUIMIENTO SEMANAL



PERIODO	PROYECTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1-25	92,00%	25,61%	66,39%
SEM 26	3,94%	0,64%	3,30%
SEM 27	5,92%	1,86%	4,06%
SEM 28	0,00%	0,00%	0,00%
ACUM. SEM 26-28	32,94%	19,57%	13,37%
SEM 29	12,73%	17,29%	-4,56%
SEM 30	9,22%	1,23%	7,98%
SEM 31	0,00%	0,00%	0,00%
ACUMULADO MES	21,95%	18,52%	3,43%
ACUMULADO TOTAL	54,89%	38,10%	16,79%


MODIFICATORIO

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Pintura Fachada


Aplicación de vinilo sobre pañete



Lámpara a prueba de humedad tipo tortuga



Salida toma




Tubería acero negro 6" sch-40 (incluye accesorios y soportes)







Vinilo tipo uno para exteriores



Estuco y vinilo tres manos en cuato planta emergencia

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQINARIA					REGISTRO DEL ESTADO DEL TIEMPO (HORAS)			
PERSONAL EN OBRA			EQUIPO EN OBRA		FECHA	LLUVIA	SECO	DETUVO TRABAJOS
DIRECTOR		1	RETRO	N.A.	21/08/2023	1,50	8,00	NO
RESIDENTE		1	VOLQUETA	N.A.	22/08/2023	3,00	6,00	NO
INSPECTOR		1	PILOTEADORA	N.A.	23/08/2023	-	8,00	NO
ASESOR SST		1	MEZCLADOR	N.A.	24/08/2023	2,00	7,00	NO
MAESTRO		1	BOMBA CONCRETO	N.A.	25/08/2023	1,00	8,00	NO
OFICIALES		1	OTROS		26/08/2023	2,00	3,00	NO
AYUDANTES		0			27/08/2023	-	-	-
OTROS		#				9,50	40,00	



ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUENTE SEMANA

SE DARA INICIO A LA INSTALACIÓN DEL GABINETE TIPO III Y LA SIAMESA YA QUE LOS SUMINISTROS DE ESTAS YA SE ENCUENTRAN EN OBRA PERO HACE FALTA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN

SE SIGUE CON LA REPARACIÓN DE LAS FACHADAS Y APLICACIÓN DE LA PINTURA SE HACE ÉNFASIS QUE ESTA ACTIVIDAD HA SIDO EXTENSO SU DESARROLLO, YA QUE SE REQUIERE DE ARMAR ARMARIOS Y TRASLADARLOS, ESTO HACE QUE LA ACTIVIDAD SEA MAS DEMORADA PARA CULMINARLA.

INSTALAR MURO SUPERBOARD DOBLE CARA PARA CUARTO COMUNICACIONES ESTA UBICADO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

DAR INICIOA LAS REPARACIONES DE DRYWALL QUE SE DETECTARON EN LOS EDIFICIOS, CAUSADAS POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA HIDRAULICO Y FILTRACIONES DEL TEJADO

SE REALIZA LAS PERFORACIONES MECANICAS EN CONCRETO DE 2" Y 4" EN EL TANQUE DE AGUA POTABLE Y EN EL CUARTO DE MAQUINAS.

INSTALAR EL SWITCH FLOTADOR ELÉCTRICO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA / CONTRATISTA

EL INTERVENTOR MANIFIESTA EL BUEN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS YA QUE SE ESTAN HACIENDO EN LOS TIEMPOS ACORDADOS Y POR EL MOMENTO SIN INCONVENIENTES PRESENTADOS, POR OTRO LADO ESPERA LA PRONTA ACTUALIZACIÓN

SE RECOMIENDA EL ASEO EN LAS ÁREAS DE TRABAJO YA QUE PUEDE OCASIONAR LA OCURRENCIA DE ACCIDENTES.

MARTHA JOHANNA SANCHEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

No. MAT: _____

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR COPIA DE LA BITACORA EN LA SEMANA CORRESPONDIENTE
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMA EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO
*** ESTE APARTE SE DILIGENCIA EN CASO QUE EL CONTRATO TENGA INTERVENTORIA

ANEXO G

enel	RESPUESTA A SOLICITUD DE REVISIÓN DISEÑO ELECTRICO						
Fecha Solicitud Validación de Diseño	2023-07-31 15:24:00	Fecha Respuesta	2023-08-18	Resultado Solicitud	Rejected	Número Validación de Diseño	1500346883

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD			
Número de Solicitud de Servicio	1500199183	Tipo de Solicitud	Acc independization
Tipo Industria	0 - ACTIVIDAD NO ESPECIFICA	Trámite	New

HISTORIAL DE LA SOLICITUD		
Fecha Solicitud	Fecha Respuesta	Resultado de la Solicitud
2023-07-31 15:24:00	2023-08-18	Rejected

INFORMACIÓN DEL PROYECTO			
Nombre	VICTOR GONZALO PULIDO		
Dirección	MP TOCANCIPA VDA VERGANZO ST COLEGIO INDUSTRIAL L		
Departamento	CUNDINAMARCA	Localidad / Municipio	TOCANCIPÁ
Barrio/Vereda	Tocancipá	Estrato	Socioeconomic status 0
Indicaciones de Acceso al Predio	EDIFICIO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS		

REVISIÓN DEL DISEÑO ELÉCTRICO

ASPECTOS DOCUMENTALES:

Validar guia de presentación de proyectos: Al no requerir una licencia de construcción vigente, se debe adjuntar el certificado de libertad del predio.

ASPECTOS TÉCNICOS:

1. Toda canalización debe llevar un conductor de tierra, indicarlo claramente.
2. En la planilla no se encontró la hoja con los cálculos de las redes de baja tensión, completar planilla de cálculos.
3. Transformador de corriente de la BCI no cumple el dimensionamiento para CTs. Recuerde que la elección del CT debe estar entre el 80% y el 120% de corriente nominal. Si se seleccionó por razones comerciales indicarlo en el plano.
4. Validar la información que se indica en el unifilar. Validar impedancia, capacidad de CTs, tipo de CTs, ajuste de corriente magnética.
5. Incluir diagrama de flujo del deslastre de cargas para la BCI.
6. Se debe incluir el gráfico de coordinación de protecciones como lo indica la guia de presentación de proyectos.

PLANOS:

1. Validar la información indicada del punto de conexión ya que el proyecto se conecta del seccionador de maniobras que es el punto de conexión según serie 1 aprobado. Indicar esto en el plano.
2. En la tabla resumen debe ser de este serie 3 que se está presentando, quiere decir que se debe quitar todo lo que tiene que ver con la otra subestación. En este radicado sólo se está presentando 2 cuentas, un transformador de 45kva, una potencia instalada máxima de 45, y conductores y cámaras que solo tienen que ver con este serie 3.
3. Completar antecedentes del proyecto con la información del serie 1 aprobado.
4. Completar el plano de planta con la iluminación, recorrido de redes, fosos de aceite, caracteristicas de las puertas. Completar cortes con la misma información.
5. Validar convenciones del TGA como se indica en el plano.
6. La información de la plancha 4 es redundante y no es necesario agregarla. Ajustar el plano para que no tenga tantas planchas que hacen complicado el manejo de la información.

OBSERVACIONES:

Se enviaron observaciones al diseñador, al correo electrónico vgonzalopc@yahoo.es el 3/08/2023, con recordatorio el 8/08/2023 y no se obtuvo respuesta. Ajustar las observaciones y radicar nuevamente.

206

Número validación de Diseño No.

TOCANCIPÁ
TRABAJAMOS Para Ti

ALCALDÍA DE
TOCANCIPÁ

Tocancipá, 14 de agosto del 2023

AMT-DA 292

Señores
ENEL COLOMBIA
Ciudad

REF: **OBSERVACIONES CON RADICADO No 1500346883 DEL PROYECTO SERIE 3 -CRIR- TOCANCIPA.**

ASUNTO: **AUTORIZACIÓN CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PROYECTADA EN CENTRO INTEGRAL DE RESPUESTA - CRIR – TOCANCIPÁ.**

Cordial saludo

Por medio de la presente, y en calidad de Representante Legal del Municipio de Tocancipá yo **JORGE ANDRES PORRAS VARGAS** identificado con c.c. **79.882.688 de Bogotá D.C.**, autorizo la construcción de la subestación eléctrica proyectada para el **CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTA -CRIR** del Municipio de Tocancipá, como está proyectada en plano aprobado por ENEL CODENSA No 1500199183_S1_00_1500312553 con fecha 05_06_2023, Ubicada por la parte norte contigua a la edificación de los cuartos eléctricos y por el costado izquierdo del Edificio Operativo entre los ejes B y C de este.

Agradezco de antemano la atención a la presente,

Cordialmente,

JORGE ANDRES PORRAS VARGAS
Alcalde Municipio de Tocancipá
C.C. 79.882.688 de Bogotá D.C

Proyectó: Arq. Fruccy Magaly Merchán Barbosa - Profesional Universitario
Revisó y aprobó: Ing. Mario Enrique Suanca Pulido - Secretario de Infraestructura

Bogotá, D.C. 2023-06-05

Nombre Proyecto VICTOR GONZALO PULIDO
No. Factibilidad 1500199183
No. Caso 1500312553 2023-06-05
Referencia **Diseño Aprobado**

Le informamos que, de acuerdo a la revisión efectuada a los documentos asociados al proyecto de la referencia, su diseño ha sido **APROBADO** con una vigencia establecida en el plano.

A partir de este momento, usted cuenta con asesoría especializada durante la etapa constructiva de su proyecto. Solicítela a través de servicioalcliente.empresarial@enel.com, como **Visita de Control de Obra**.

Una vez las obras estén construidas conforme al diseño **APROBADO** y las normas de construcción pertinentes, usted puede iniciar sus trámites para la solicitud de conexión y recibo de obra del servicio de energía, considerando la siguiente información:

- Según lo dispuesto en la Resolución CREG 070 de 1998, la calidad, integridad y criterios de seguridad del diseño eléctrico son competencia del diseñador.
- El número de cuentas a instalar y la capacidad máxima aprobados por Enel Colombia S.A ESP. deben ser los correspondientes al proyecto **APROBADO**.
- Las obras a ejecutar deberán cumplir con lo establecido en el reglamento técnico de Instalaciones Eléctricas "RETIE" vigente. La certificación plena, que es requisito para la energización del proyecto, deberá tener como base el diseño **APROBADO** por Enel Colombia S.A. E.S.P.
- En la construcción de las obras eléctricas incluidas en el presente proyecto se debe dar cumplimiento a todas las disposiciones que garanticen la seguridad de las personas; de la vida animal y vegetal; de la preservación del medio ambiente; y de la protección de equipos eléctricos, contempladas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE y RETILAP vigente.
- El proyecto aprobado cuenta con la firma digital implementada por Enel Colombia para la verificación de autenticidad y seguridad en la información.

Es de resaltar, que la firma digital tiene por objeto facilitar la verificación de la aprobación del diseño al solicitante ó autorizado declarados en el FORMATO SOLICITUD DE REVISIÓN DE PROYECTO DE CONEXIÓN, por lo tanto, su uso adecuado para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del mismo es de su exclusiva responsabilidad.

"PARA REALIZAR SU SOLICITUD DE CONEXIÓN NO ES NECESARIO PRESENTAR SUS DISEÑOS IMPRESOS, SE DEBE ANEXAR COPIA DE ESTE DOCUMENTO CON LA CUAL SE REALIZARÁ VISITA DE VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBRA."

Reiteramos nuestro deseo de servirle,

Cordialmente,

Departamento de Conexiones Complejas Colombia
Infraestructura y Redes

208

Bogotá, D.C. 2023-04-26

Nombre Proyecto VICTOR GONZALO PULIDO
No. Factibilidad 1500199183
No. Caso 1500300751 2023-04-26
Referencia **Cierre de diseño eléctrico**

De acuerdo a la revisión efectuada al proyecto radicado de la referencia, le informamos que se requiere completar las recomendaciones sugeridas en el archivo "ACTA DE REVISIÓN" anexo a la presente comunicación. Por lo enunciado anteriormente no es posible continuar con el proceso de evaluación de su diseño.

Una vez realizadas las modificaciones, los cambios deberán ser radicados **EN FORMATO DIGITAL**, manteniendo como referencia el número de factibilidad, y consignando toda la información solicitada en el "ACTA DE REVISIÓN".

Por otro lado, le invitamos a visitar nuestra página web:

www.enel.com.co

En la cual encontrará nuestra **GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS** y sus archivos anexos, que le guiarán en el proceso de organización y presentación de su proyecto eléctrico.

Además, le invitamos a comunicarse a través de nuestras líneas de atención telefónica 601-5801000, donde con gusto atenderemos sus consultas sobre la prestación del servicio de energía.

Reiteramos nuestro deseo de servirle,

Cordialmente,

Firmado digitalmente Departamento de Conexiones Complejas Colombia
Infraestructura y Redes

Bogotá, D.C. 2023-08-18

Nombre Proyecto VICTOR GONZALO PULIDO
No. Factibilidad 1500199183
No. Caso 1500346883 2023-08-18
Referencia **Cierre de diseño eléctrico**

De acuerdo a la revisión efectuada al proyecto radicado de la referencia, le informamos que se requiere completar las recomendaciones sugeridas en el archivo "ACTA DE REVISIÓN" anexo a la presente comunicación. Por lo enunciado anteriormente no es posible continuar con el proceso de evaluación de su diseño.

Una vez realizadas las modificaciones, los cambios deberán ser radicados **EN FORMATO DIGITAL**, manteniendo como referencia el número de factibilidad, y consignando toda la información solicitada en el "ACTA DE REVISIÓN".

Por otro lado, le invitamos a visitar nuestra página web:

www.enel.com.co

En la cual encontrará nuestra **GUIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS** y sus archivos anexos, que le guiarán en el proceso de organización y presentación de su proyecto eléctrico.

Además, le invitamos a comunicarse a través de nuestras lineas de atención telefónica 601-5801000, donde con gusto atenderemos sus consultas sobre la prestación del servicio de energía.

Reiteramos nuestro deseo de servirle,

Cordialmente,

Firmado digitalmente Departamento de Conexiones Complejas Colombia
Infraestructura y Redes

enel	RESPUESTA A SOLICITUD DE REVISIÓN DISEÑO ELECTRICO						
Fecha Solicitud Validación de Diseño	2023-04-14 12:37:00	Fecha Respuesta	2023-04-26	Resultado Solicitud	Rechazado	Número Validación de Diseño	1500300751

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número de Solicitud de Servicio	1500199183	Tipo de Solicitud	Independización de cuentas
Tipo Industria	0 - ACTIVIDAD NO ESPECIFICA	Trámite	Nueva

HISTORIAL DE LA SOLICITUD

Fecha Solicitud	Fecha Respuesta	Resultado de la Solicitud
2023-04-14 12:37:00	2023-04-26	Rechazado

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre	VICTOR GONZALO PULIDO		
Dirección	MP TOCANCIPA VDA VERGANZO ST COLEGIO INDUSTRIAL L		
Departamento	CUNDINAMARCA	Localidad / Municipio	TOCANCIPÁ
Barrio/Vereda	Tocancipá	Estrato	No aplica
Indicaciones de Acceso al Predio	EDIFICIO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS		

REVISIÓN DEL DISEÑO ELÉCTRICO

ASPECTOS DOCUMENTALES:

LICENCIA DE URBANISMO (LU):

- Debe anexar registro fotográfico a la carta de NO LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN donde se evidencie la construcción ya finalizada.

ASPECTOS TÉCNICOS:

Sin observaciones

PLANOS:

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA:

- Verificar y ajustar aspectos marcados en planos.
- Agregar la siguiente nota: «Con el proyecto serie 1 se valida la interconexión de las subestaciones y se muestra una ruta tentativa de la red eléctrica de media tensión, pero en cada serie 3 se deberá validar con el plano aprobado en la licencia de construcción, la ruta especifica de MT, y la ubicación de cad a subestación»
- Agregar nota indicando lo siguiente: «Las protecciones indicadas para cada transformador en el presente proyécto (Serie 1), son una referencia en b ase a la norma, sin embargo, se debe verificar su selección en cada uno de los proyectos de subestación por medio de la respectiva coordinación de protecci ones».
- Agregar la siguiente nota: «Se debe presentar proyecto serie 5 para cada uno de los transformadores proyectados»
- El cuadro de equivalencias CU AWG - AL AWG - AL mm² debe contemplar los conductores utilizados para el proyecto.
- Verificar que el listado de equipos sea consecuente entre planchas. Para este tipo de casos se recomienda tener un solo listado de equipos y copiar el mismo viewport en las diferentes planchas para no tener incongruencias con la información.

FORMATO (ajustar correcciones en las planchas que aplique):

- Actualizar fecha.
- Verificar y ajustar contenido por cada una de las planchas.
- Indicar coordenadas del predio y vías aledañas mas visibles.
- Verificar resumen. Se marcan algunos aspectos del resumen, pero es importante que se verifique en su totalidad para ajustarlo a lo que se proyecta.
- Actualizar información de la factibilidad.
- Verificar convenciones.

LOCALIZACIÓN GENERAL REDES:

- Agregar nota de punto de conexión tal como se indica en la factibilidad: «XXXXXXXXXX»
- Agregar normas para el punto de conexión.
- Utilizar en esta vista de localización de redes la convención de subestación pedestal e indicar el CD92724 y características como potencia, tensione s, corrientes, etc.

Número validación de Diseño No. 211

- Agregar (P) para proyectado para la infraestructura eléctrica según aplique.
- Verificar convenciones de tuberia, dibujas como proyectada
- Verificar convenciones de S/E.
- Delimite claramente el límite del predio, es recomendable hacerlo con linea punteada y hacer un llamado de atención.

VISTAS O DETALLES ADICIONALES:
- Agregar detalle de ingreso al predio.

DIAGRAMA UNIFILAR:
- Utilizar en esta vista de localización de redes la convención de subestación pedestal e indicar el CD92724 y características como potencia, tensiones, corrientes, etc.
- Agregar nota de punto de conexión tal como se indica en la factibilidad: «XXXXXXXXXX»
- Agregar normas para el punto de conexión.
- Agregar GENERALIDADES 7.5
- GENERALIDADES 7.4.3. GENERALIDADES 7.4.3.
- Indicar que estas cajas son proyectadas debido a que esta red no ha sido entregada a ENEL.
- Listado de equipos. Tener en cuenta la numeración del listado para el posterior S3

OBSERVACIONES:

Se envió correo al diseñador el 20-04-2023 solicitando correcciones. Se reenvió correo al diseñador el 24-04-2023 solicitando correcciones. No se reciben correcciones en el tiempo establecido y se cierra proyecto.

Número validación de Diseño No. 212

enel	CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO						
Fecha Solicitud Servicio	2023-03-22 08:00:00	Fecha Respuesta	2023-03-29	Fecha Vencimiento	2024-03-28	Número Solicitud de Servicio	1500199183

Apreciado cliente, de acuerdo con su solicitud para la instalación y/o adecuación del servicio de energía eléctrica en su predio , a continuación, le informamos los requerimientos y trámites que usted debe cumplir para la prestación del servicio:

DIRECCIÓN DEL PREDIO			
Dirección	MP TOCANCIPA VDA VERGANZO ST COLEGIO INDUSTRIAL L		
Departamento	CUNDINAMARCA	Barrio/Vereda	Tocancipá
Localida/Municipio	TOCANCIPÁ	Estrato	No aplica
Indicaciones de Acceso al Predio	EDIFICIO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS		

DETALLE SERVICIO SOLICITADO			
Nombre Inicial del Proyecto	VICTOR GONZALO PULIDO		
Servicio Solicitado	Independización de cuentas		
Estado Actual de la Cuenta		Carga Existente	
Actividad Económica Asociada a la Solicitud		0 - ACTIVIDAD NO ESPECIFICA	

DETALLE CARGA APROBADA			
Voltaje Aprobado	120/208 V	Potencia Máxima Aprobada	90.00
¿Su proyecto contempla algún sistema de generación?			No

Tipo Cuentas Aprobadas	Monofásicas	Bifásicas	Trifásicas
Residenciales	0	0	0
Comerciales	0	0	0
Industriales	0	0	0
Oficiales	0	0	2
Provisional obra	0	0	0
Transitorio	0	0	0
Total Tipo	0	0	2
TOTAL	2.0		

Punto de Conexión	Código	Punto Físico	Dirección
Red de media tensión	92724	PF42128911	MP TOCANCIPA VDA VERGANZO ST COLEGIO INDUSTRIAL (04 ,96171-74,92550) .

El servicio podrá suministrarse únicamente cuando usted cumpla con los requisitos técnicos y legales indicados anteriormente y realice los trámites que se indican a continuación:

Enel-Codensa está en disponibilidad de suministrar el servicio de energía eléctrica al predio de la solicitud, para tal fin usted deberá cumplir con lo siguiente:

Presente un proyecto de Subestación (SERIE 3) en configuración de Derivación, que contenga los requisitos técnicos y legales indicados en la Guía Para la Presentación de Proyectos de Conexión.

En caso de requerir instalar más de una subestación, debe presentar proyecto de redes de Media Tensión (SERIE 1) y por cada subestación a instalar un proyecto SERIE 3.

Para proyectos urbanísticos que contemplen predios transferidos al municipio con destino a zonas verdes, parques y equipamiento comunal público (zona de cesión tipo A) elija una de las siguientes opciones:
a. Incluir una subestación exclusiva de alumbrado público en el proyecto de redes de Media Tensión (Serie 1) y posteriormente presentar el proyecto Alumbrado Público con Subestación (Serie 6).
b. En caso de existir redes de Alumbrado Público cerca al predio, solicitar una nueva factibilidad donde se asignará condiciones de servicio

para su proyecto de AP.

Solicite las curvas de protección y corrientes de cortocircuito en la Línea de Atención 601-5801000 o a través del correo electrónico servicioalcliente.empresarial@enel.com.

Punto de Conexión: Se mantiene punto de conexión actual para el CD92724 PFILEGIBLE_1, que viene de la red aérea de MT con PF42128911 ubicada cerca al predio sobre la VEREDA VERGANZO MP TOCANCIPA (04,96171-74,92550) . Centro de distribución referencia CD92724.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
En el predio existen 2 cuentas.
El predio queda con 4 cuenta(s) y una carga total de 165 kW.

Estimado cliente a continuación le informamos los siguientes aspectos que debe tener en cuenta:

Trámites revisión y aprobación de proyectos de conexión:

PASO 1: Cargue su proyecto de conexión en una nube para transferencia de archivos.

PASO 2: Descargue el Formato de Solicitud de Proyectos de Conexión que encontrará en la Guía de presentación de proyectos de conexión y envíelo al correo electrónico servicioalcliente.empresarial@enel.com junto con el link de descarga de sus archivos y a vuelta de correo recibirá su número de solicitud. Tenga en cuenta que el asunto del correo electrónico debe ser: Radicación Proyecto de Conexión Factibilidad #(Número de factibilidad del proyecto) Proyecto (Nombredelproyecto).

PASO 3: Una vez cuente con el Proyecto de Conexión aprobado, realice la construcción de la obra a su cargo. Si algún factor no permite que la construcción se realice conforme al diseño aprobado, se debe solicitar modificación al proyecto de conexión. Tenga en cuenta que solo Enel-Codensa podrá intervenir las redes energizadas.

PASO 4: Una vez construida y certificada la obra solicite su conexión de acuerdo con la Guía Para Solicitudes de Conexión disponible en nuestra página web. Puede solicitar acompañamiento especializado durante su etapa constructiva comunicándose a la línea 601-5801000 (Solicitela como visita de control de obra).

Si está interesado en que Enel X realice cualquiera de los pasos por usted, solicítelo a través del correo servicioalcliente.empresarial@enel.com indicando el número de esta factibilidad.

enel	CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO						
Fecha Solicitud Servicio	2023-03-06 08:51:00	Fecha Respuesta	2023-03-14	Fecha Vencimiento	2024-03-13	Número Solicitud de Servicio	1500199183

Apreciado cliente, de acuerdo con su solicitud para la instalación y/o adecuación del servicio de energía eléctrica en su predio , a continuación, le informamos los requerimientos y trámites que usted debe cumplir para la prestación del servicio:

DIRECCIÓN DEL PREDIO			
Dirección	MP TOCANCIPA VDA VERGANZO ST COLEGIO INDUSTRIAL L		
Departamento	CUNDINAMARCA	Barrio/Vereda	Tocancipá
Localida/Municipio	TOCANCIPÁ	Estrato	No aplica
Indicaciones de Acceso al Predio	EDIFICIO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS		

DETALLE SERVICIO SOLICITADO			
Nombre Inicial del Proyecto	VICTOR GONZALO PULIDO		
Servicio Solicitado	Independización de cuentas		
Estado Actual de la Cuenta		Carga Existente	
Actividad Económica Asociada a la Solicitud		0 - ACTIVIDAD NO ESPECIFICA	

DETALLE CARGA APROBADA			
Voltaje Aprobado	120/208 V	Potencia Máxima Aprobada	90.00
¿Su proyecto contempla algún sistema de generación?			No

Tipo Cuentas Aprobadas	Monofásicas	Bifásicas	Trifásicas
Residenciales	0	0	0
Comerciales	0	0	2
Industriales	0	0	0
Oficiales	0	0	0
Provisional obra	0	0	0
Transitorio	0	0	0
Total Tipo	0	0	2
TOTAL	2.0		

Punto de Conexión	Código	Punto Físico	Dirección
Red de media tensión	92724	PF42128911	MP TOCANCIPA VDA VERGANZO ST COLEGIO INDUSTRIAL (04 ,96171-74,92550) .

El servicio podrá suministrarse únicamente cuando usted cumpla con los requisitos técnicos y legales indicados anteriormente y realice los trámites que se indican a continuación:

Enel-Codensa está en disponibilidad de suministrar el servicio de energía eléctrica al predio de la solicitud, para tal fin usted deberá cumplir con lo siguiente:

Presente un proyecto de Subestación (SERIE 3) en configuración Entrada-Salida/Derivación, que contenga los requisitos técnicos y legales indicados en la Guía Para la Presentación de Proyectos de Conexión.

En caso de requerir instalar más de una subestación, debe presentar proyecto de redes de Media Tensión (SERIE 1) y por cada subestación a instalar un proyecto SERIE 3.

Para proyectos urbanísticos que contemplen predios transferidos al municipio con destino a zonas verdes, parques y equipamiento comunal público (zona de cesión tipo A) elija una de las siguientes opciones:
a. Incluir una subestación exclusiva de alumbrado público en el proyecto de redes de Media Tensión (Serie 1) y posteriormente presentar el proyecto Alumbrado Público con Subestación (Serie 6).
b. En caso de existir redes de Alumbrado Público cerca al predio, solicitar una nueva factibilidad donde se asignará condiciones de servicio

para su proyecto de AP.

Solicite las curvas de protección y corrientes de cortocircuito en la Línea de Atención 601-5801000 o a través del correo electrónico servicioalcliente.empresarial@enel.com.

Punto de Conexión: Se mantiene punto de conexión actual para el CD92724 PFILEGIBLE_1, que viene de la red aérea de MT con PF42128911 ubicada cerca al predio sobre la VEREDA VERGANZO MP TOCANCIPA (04,96171-74,92550) . Centro de distribución referencia CD92724.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS:
El predio queda con 2 cuentas y una carga total de 165 kW.

Estimado cliente a continuación le informamos los siguientes aspectos que debe tener en cuenta:

Trámites revisión y aprobación de proyectos de conexión:

PASO 1: Cargue su proyecto de conexión en una nube para transferencia de archivos.

PASO 2: Descargue el Formato de Solicitud de Proyectos de Conexión que encontrará en la Guía de presentación de proyectos de conexión y envíelo al correo electrónico servicioalcliente.empresarial@enel.com junto con el link de descarga de sus archivos y a vuelta de correo recibirá su número de solicitud. Tenga en cuenta que el asunto del correo electrónico debe ser: Radicación Proyecto de Conexión Factibilidad #(Número de factibilidad del proyecto) Proyecto (Nombredelproyecto).

PASO 3: Una vez cuente con el Proyecto de Conexión aprobado, realice la construcción de la obra a su cargo. Si algún factor no permite que la construcción se realice conforme al diseño aprobado, se debe solicitar modificación al proyecto de conexión. Tenga en cuenta que solo Enel-Codensa podrá intervenir las redes energizadas.

PASO 4: Una vez construida y certificada la obra solicite su conexión de acuerdo con la Guía Para Solicitudes de Conexión disponible en nuestra página web. Puede solicitar acompañamiento especializado durante su etapa constructiva comunicándose a la línea 601-5801000 (Solicítela como visita de control de obra).

Si está interesado en que Enel X realice cualquiera de los pasos por usted, solicítelo a través del correo servicioalcliente.empresarial@enel.com indicando el número de esta factibilidad.

Bogotá D.C. 28 de abril de 2023

Señor
VICTOR GONZALO PULIDO C.
Bogotá D.C.

Asunto: Radicados nro. 394199907
26 de abril de 2023
Proyecto: Bomberos Tocancipá
Cliente nro. 7351632-9

Respetado Señor Gonzalo, reciba un cordial saludo.

Hemos recibido su comunicación en la cual solicita información sobre el número de aprobación del proyecto serie 3, revisado y energizado en el 2020 por Enel Colombia S.A ESP cuyo equipo de medida correspondiente al nro. del cliente 7351632-9 el cual pertenece a la Alcaldía Municipio Tocancipá vereda El Verganzo sector Colegio Industrial estación de Bomberos.

Al respecto, le indicamos que para validar la información requerida es indispensable conocer el numero de la factibilidad de servicio, ahora bien, de requerir copia de los planos sería necesario adjuntar también una carta de autorización emitida por el propietario, el constructor o el ingeniero diseñador del proyecto. Esta autorización debe acompañarse con la fotocopia de cédula y/o matrícula profesional del ingeniero diseñador o demás documentos que comprueben la calidad en la que actúa.

Lo anterior, dado que es nuestra obligación proteger la autoría intelectual del proyecto. Por esto enviamos esta información únicamente al propietario, el constructor o el ingeniero diseñador del proyecto, o en su defecto, a un tercero autorizado previamente.

Reiteramos nuestra disposición de servirle.

Atentamente,

Servicio al Cliente B2B[1]

[1] Respetado cliente, le informamos que conforme la ley 1581 del 2012 y la política de tratamiento de datos personales, las empresas del Grupo Enel en Colombia tratan sus datos personales para todos los fines relacionados con la gestión de su solicitud, sus productos activos, la prestación del servicio público de energía eléctrica de acuerdo con el contrato de servicio público en los términos de la Ley 142 de 1994 y la Ley 1437 de 2011, y para la generación, almacenamiento, comercialización y distribución de recursos energéticos.
Recuerde que tiene derecho a conocer, actualizar, rectificar y cuando proceda, suprimir sus datos y revocar la autorización dada para su tratamiento, a través de los canales indicados en la política publicada en www.enel.com.coen la cual también encontrará la identificación de las empresas que pertenecen al Grupo Enel en Colombia.
AVISO LEGAL: La información contenida en este documento o en cualquiera de sus anexos es considerada CONFIDENCIAL y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario.

Estimado Cliente. Le informamos que el prestador del servicio es Enel Colombia S.A ESP con NIT 860.063.875-8. A través de la Escritura Pública No. 562 del 1 de marzo de 2022 de la Notaría 11 del Círculo de Bogotá, ENEL COLOMBIA S.A. ESP (antes Emgesa S.A. ESP y sociedad absorbente) perfeccionó la fusión mediante la cual absorbió a las sociedades CODENSA S.A. ESP, ENEL GREEN POWER COLOMBIA S.A.S. ESP y ESSA2 SpA (sociedades absorbidas). De acuerdo con lo previsto en la mencionada escritura y como consecuencia de la fusión que se solemniza por medio de este instrumento, la absorbente adquiere todos los bienes y derechos de las absorbidas y asume todos sus pasivos y obligaciones.

217

ANEXO H

	SEGUIMIENTO A INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA	CODIGO GEF-017 VERSION 01 FECHA DIC DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 459 DE 2022 — NIT / C.C.: 820.002.625-7

NOMBRE / RAZON SOCIAL: INGELCO PROYECTOS E.U.

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DETOCANCIPÁ

ASISTENCIA EN EL MES DE: JULIO DE 2023

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	% DE DEDICACIÓN	CEDULA	FECHA EXPEDICIÓN	ING	RET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PERSONAL OPERATIVO	Jorge	Pulido Cuadros	Representante Legal		4.221.036	26/09/1990	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X			X	X	X	X	X	X	X
	Victor Gonzalo	Pulido Cuadros	Residente	100%	72.324.965	28/11/1985	X																									X	X	X	X	X	X		X
	Darley	Forero	Sisa	50%	1.049.602.789	12/05/2004	X																									X	X	X	X	X	X		X
	Martha Johanna	Sanchez Nompaque	Director de Interventoria	50%	1.049.604.665	4/11/2004	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X
PERSONAL AUXILIAR	Laura	Contreras	Auxiliar de Residente		1.077.091.462	18/08/1998	X																									X	X	X	X	X	X		X
PERSONAL OPERATIVO																																							

SEGUIMIENTO A INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

CODIGO	GYF-017
VERSION	01
FECHA	DIC DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 459 DE 2022

NOMBRE / RAZON SOCIA:	INGELCO PROYECTOS E.U.	NIT / C.C.:	820.002.825-7
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ		

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	% DE DEDICACIÓN	CEDULA	FECHA EXPEDICIÓN	ING	RET	ASISTENCIA EN EL MES DE: AGOSTO 2023																												
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PERSONAL OFERTADO	Jorge	Pulido Cuadros	Representante Legal		4.221.038	28/09/1990	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
	Victor Gonzalo	Pulido Cuadros	Residente	100%	72.324.965	26/11/1985	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
	Darley	Forero	Sisa	50%	1.049.602.789	12/05/2004	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
	Martha Johanna	Sanchez Nampaque	Director de Interventoria	50%	1.049.604.665	4/11/2004	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X
PERSONAL ADICIONAL	Laura	Contreras	Auxiliar de Residente		1.077.091.462	18/08/1998		X	X	X	X																												
PERSONAL OPERATIVO																																					
MANO DE OBRA CALIFICADA "A"																																					
MANO DE OBRA CALIFICADA "B"																																					
SUBCONTRATISTA "C"																																					

JOSE GUILLERMO ACERO ALBARRACIN
RESIDENTE SST DE OBRA
15926-034454BYC

DARLEY MAURICIO FORERO ACOSTA
RESIDENTE SST DE INTERVENTORIA
2150

CODIGO GIF-018
VERSION 08
FECHA: MAYO DE 2023

CONTROL A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO INTERVENTORIA No 450 DE 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	INGELCO PROYECTOS E U.	NIT / C.C.:	820.002.626-7
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ		

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	RIESGO ARL	PLANILLA No.	IBC	ING	RET	IND	COTIZACION PENSION 16%	FONDO PENSIONAL DE SOLIDARIDAD	FONDO PENSIONAL DE SUBSISTENCIA	COTIZACION SALUD 4% / 12.5%	COTIZACION ARL	APORTE CCF 4% / 2%	APORTE SENA 2%	APORTE ICBF 3%	VALOR DEL APORTE TOTAL	PERIODO DE PAGO SALUD	PERIODO DE PAGO PENSION	DIAS DE MORA
PERSONAL CONTRATADO	Jorge	Pulido Cuadros	Representante Legal	V	9454817680	$ 1.100.000,00	X			$ 185.600,00	$ -	$ -	$ 46.400,00	$ 80.500,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	$ 359.200,00			3,00
	Victor Manuel	Pulido Cuadros	Residente	V	9454817680	$ 350.000,00	X			$ 56.000,00	$ -	$ -	$ 14.000,00	$ 24.400,00	$ 14.000,00	$ -	$ -	$ 108.400,00			3,00
	Darley	Forero	Siso	V	9455317384	$ 270.567,00	X			$ 43.400,00	$ -	$ -	$ 10.900,00	$ 18.200,00	$ 10.900,00	$ -	$ -	$ 84.100,00			27,00
	Martha Johanna	Sanchez Numpaque	Director de Interventoria	V	4530427792	$ 1.150.000,00	X			$ 207.000,00	$ -	$ -	$ 163.200,00	$ 90.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 460.200,00			113,00
PERSONAL ADICIONAL	Laura	Contreras	Auxiliar de Residente	V	9454817680	$ 270.567,00	X			$ 43.400,00	$ -	$ -	$ 10.900,00	$ 18.200,00	$ 10.900,00	$ -	$ -	$ 84.100,00			3,00
PERSONAL CONTRATO "A"																					
PERSONAL CONTRATO "B"																					
PERSONAL CONTRATO "C"																					

MARTHA JOHANA SANCHEZ NUMPAQUE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 15202-185750

DARLEY MAURICIO FORERO ACOSTA
RESIDENTE SST CR INTERVENTORIA
Licencia No. 2150

JOSE GUILLERMO ACERO
RESIDENTE SST DE OBRA
Licencia No. 15926-03449BYC

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. Diligenciar el cuadro de acuerdo con lo reportado en planillas de pago de seguridad social del personal vinculado al desarrollo del proyecto (Profesional, operativo, personal tercerizado)
2. Para el caso del personal de obra será el contratista de obra quien allegue la información la cual será revisada, verificada y avalada por la Interventoria y presentada de manera mensual.
3. Para el caso de interventoria la información será diligenciada por el contratista de interventoria y será revisada, verificada y avalada por la supervisión del contrato.

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

AGOSTO

CONTROL A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

CODIGO GIP-018
VERSION 03
FECHA MAYO DE 2023

CONTRATO INTERVENTORIA No 459 DE 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	INGELCO PROYECTOS S.U.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
NIT / C.C.:	820.002.826-7

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	RIESGO ARL	PLANILLA No.	IBC	ING	RET	IND	COTIZACION PENSION 16%	FONDO PENSIONAL DE SOLIDARIDAD	FONDO PENSIONAL DE SUBSISTENCIA	COTIZACION SALUD 4% / 12.5%	COTIZACION ARL	APORTE CCF 4% / 2%	APORTE SENA 2%	APORTE ICBF 3%	VALOR DEL APORTE TOTAL	PERIODO DE PAGO SALUD	PERIODO DE PAGO PENSION	DIAS DE MORA
PERSONAL OBLIGADO	Jorge	Pulido Cuadros	Representante Legal	V	9456565454	$ 1.160.000,00				$ 185.600,00	$ -	$ -	$ 46.400,00	$ 50.600,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	$ 359.200,00			-
	Mazar Gonzalo	Pulido Cuadros	Residente	V	9456565454	$ 1.500.000,00				$ 240.000,00	$ -	$ -	$ 60.000,00	$ 104.400,00	$ 80.000,00	$ -	$ -	$ 484.400,00			-
	Darley	Forero	Sst	V	9456565454	$ 1.160.000,00				$ 185.600,00	$ -	$ -	$ 46.400,00	$ 50.600,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	$ 359.200,00			-
	Martha Johanna	Sanchez Nurpaque	Director de Interventoria	V	4530427718	$ 1.160.000,00				$ 201.400,00	$ -	$ -	$ 157.400,00	$ 87.700,00	$ -	$ -	$ -	$ 446.500,00			83,00
PERSONAL ADICIONAL	Laura	Contreras	Auxiliar de Residente	V	9456565454	$ 116.000,00		X		$ 18.600,00	$ -	$ -	$ 4.700,00	$ 8.100,00	$ 4.700,00	$ -	$ -	$ 36.100,00			-
PERSONAL OPERATIVO																					
SUBCONTRATISTA "A"																					
SUBCONTRATISTA "B"																					
SUBCONTRATISTA "C"																					

MARTHA JOHANA SANCHEZ NURPAQUE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
No Mat. 16202-185750

DARLEY MAURICIO FORERO ACOSTA
RESIDENTE SST DE INTERVENTORIA
Licencia No. 2150

JOSE GUILLERMO ACERO
RESIDENTE SST DE OBRA
Licencia No. 16926-034-19YC

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. Diligenciar el cuadro de acuerdo con la relación en planillas de pago de seguridad social del personal vinculado al desarrollo del proyecto (Profesional, operativo, personal tercerizado).
2. Para el caso del personal de obra será el contratista de obra quien proporcione la información a cual será revisada, verificada y avalada por la interventoría y presentada de manera mensual.
3. Para el caso de interventoría la información será diligenciada por el contratista de interventoría será revisada, verificada y avalada por la supervisión del contrato.

1 ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
1* EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

222

SEGUIMIENTO A INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL EN OBRA

CODIGO:	GI-F-017
VERSION:	01
FECHA:	DIC DE 2022

CONTRATO DE OBRA No 440 DE 2022

NOMBRE / RAZON SOCIA:	CONSORCIO TOCANCIPA IT.	**NIT / C.C.:**	901.571.272-4
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DETOCANCIPÁ		

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	% DE DEDICACIÓN	CEDULA	FECHA EXPEDICIÓN	ING	RET	ASISTENCIA EN EL MES DE: JULIO DE 2023																														
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PERSONAL OFERTADO	Oscar Julio	Pérez Panqueva	Representante Legal / Técnico Electricista	100%	7.165.049	28/09/1990	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
	Cesar Augusto	Cardozo Arevalo	Director	50%	7.173.308	17/11/1995	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
	Byron Fernando	Ruiz Mondragón	Residente 1	100%	9.869.866	27/06/2001	X																											X	X	X	X		X
	Fabio	Vargas Avila	Residente 2	100%	7.163.503	5/07/1989	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
	Jose Guillermo	Acero	SST	100%	74.374.878	10/12/1997	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
	Lida Irene	Bernal Hernandez	Asesor Eléctrico	50%	33.378.870	18/09/2003	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
	Alvaro	Sua Carreño	Asesor Hidrosanitario	50%	80.085.072	12/06/1998	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
PERSONAL ADICIONAL																																							
PERSONAL OPERATIVO	Jeferson	Pérez	Electricita	100%	1.049.648.093	25/11/2014	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
	Nolder	Suarez	Tecnologa obras civiles	100%	23.292.660	24/05/1999	X		X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
	Edwin	Rojas Cuervo	Arquitecto	100%	7.183.179	5/07/2001		X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X
SUBCONTRATISTA "A"																																							
SUBCONTRATISTA "B"																																							
SUBCONTRATISTA "C"																																							

JOSE GUILLERMO ACERO ALBARRACIN
RESIDENTE SST DE OBRA
15926-034454BYC

DARLEY MAURICIO FORERO ACOSTA
RESIDENTE SST DE INTERVENTORIA
2150

CONTROL A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

CODIGO: GI-F-015
VERSION: 01
FECHA: MAYO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No 440 DE 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TOCANCIPA I.T.
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
NIT / C.C.:	901.571.272-4

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	RIESGO ARL	PLANILLA No.	IBC	ING	RET	IND	COTIZACION PENSION 16%	FONDO PENSIONAL DE SOLIDARIDAD	FONDO PENSIONAL DE SUBSISTENCIA	COTIZACION SALUD 4% Y 12,5%	COTIZACION ARL	APORTE CCF 4% / 2%	APORTE SENA 2%	APORTE ICBF 3%	VALOR DEL APORTE TOTAL	PERIODO DE PAGO SALUD	PERIODO DE PAGO PENSION	DIAS DE MORA
PERSONAL DIRECTO	Oscar Julio	Pérez Pantoja	Representante Legal N	V	9153820325	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00			$ 145.000,00	$ 82.800,00	$ 46.400,00			$ 359.200,00			4,00
	Cesar Augusto	Cardozo Acevedo	Director	I	2330457821	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00			$ 145.000,00	$ 6.100,00	$ -	$ -	$ -	$ 336.700,00			
	Cesar Augusto	Cardozo Acevedo	Director	V	174154848									$ 85.500,00				$ 85.500,00	ASOCIADA		
	Duvan Fernando	Ruiz Mudragón	Residente 1	I	4517521971	$ 195.000,00	X			$ 30.900,00			$ 25.000,00	$ 1.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 57.100,00			
	Duvan Fernando	Ruiz Mudragón	Residente 1	V	4530818874		X							$ 8.300,00				$ 8.300,00	ASOCIADA		
	Fabio	Vargas Avila	Residente 2	V	9155005141	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00			$ 145.000,00	$ 82.800,00	$ 46.400,00			$ 359.200,00			
	Jose Guillermo	Acero	SST	V	4530383680	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00			$ 145.000,00	$ 82.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 456.800,00			110,00
	Lina Maria	Bernal Hernandez	Asesor Electrico	I	4514277378	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00			$ 145.000,00	$ 6.100,00				$ 336.700,00			
	Alvaro	Ruiz Cañaño	Asesor Hidrosanitario	V	4530340703	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00			$ 145.000,00	$ 82.800,00				$ 411.400,00			111,00
PERSONAL ADICIONAL										$ -								$ -			
										$ -											
										$ -											
										$ -					$ -						
										$ -					$ -						
PERSONAL OPERATIVO	Jeferson	Pérez	Electricista	V	9153820325	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00			$ 145.000,00	$ 82.800,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	$ 359.200,00			4,00
	Javier	Suarez	Tecnologo obras	V	9155005141	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00	$ -	$ -	$ 145.000,00	$ 82.800,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	$ 359.200,00			
	Edwin	Cubino	Arquitecto	V	9155005141	$ 1.160.000,00			X	$ 185.600,00	$ -	$ -	$ 145.000,00	$ 82.800,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	$ 359.200,00			
SUBCONTRATISTA "B"																					
SUBCONTRATISTA "C"																					
SUBCONTRATISTA "X"																					

MARTHA JOHANA SANCHEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
N/a Mat. 15202-185760

DARLEY MAURICIO FORERO ACOSTA
RESIDENTE SST DE INTERVENTORIA
Licencia No 2150

JOSE GUILLERMO ACERO
RESIDENTE SST DE OBRA
15926-034454SYC

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. Diligenciar el cuadro de acuerdo con lo reportado en planillas de pago de seguridad social del personal vinculado al desarrollo del proyecto (Profesional, operativo, personal temporal).
2. Para el caso del personal de obra que se contrate en obra pueden diligenciar la información la cual será revisada, verificada y avalada por la interventoría y presentada de manera mensual.
3. Para el caso de Interventoría la información debe ser diligenciada por el contratista de interventoría y será revisada, verificada y avalada por la supervisión del contrato.

* ADJUNTO CON ESTE FORMATO SE DEBE ENTREGAR LAS CORRESPONDIENTES PLANILLAS DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
** EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE SER ENTREGADO CON FIRMAS EN ORIGINAL PARA SER ACEPTADO

224

SEGUIMIENTO A INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL EN OBRA

CODIGO	GI-F-017
VERSION	01
FECHA	DIC DE 2022

CONTRATO DE OBRA No 440 DE 2023

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TOCANCIPA IT.	NIT / C.C.:	901.671.272-4
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ		

ASISTENCIA EN EL MES DE: JULIO DE 2023

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	% DE DEDICACIÓN	CEDULA	FECHA EXPEDICIÓN	ING	RET	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PERSONAL CRETADO	Oscar Julia	Perez Parqueva	Representante Legal / Tecnico Electricista		7.165.049	28/09/1990			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
	Cesar Augusto	Cardozo Arevalo	Director	50%	7.173.306	17/11/1995																																		
	Byron Fernando	Ruiz Mondragón	Residente 1	100%	9.869.866	27/08/2001																																		
	Fabio	Vargas Avila	Residente 2	100%	7.163.503	5/07/1989																																		
	Jose Guillermo	Acero	SST	100%	74.374.878	10/12/1997																																		
	Lida Ineth	Bernal Hernandez	Asesor Eléctrico		33.378.870	18/09/2003																																		
	Alvaro	Sua Carreño	Asesor Hidrosanitario		80.085.072	12/06/1998																																		
PERSONAL ADICIONAL																																							
PERSONAL OPERATIVO	Leforson	Perez	Electricita		1.048.648.093	25/11/2014			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
	Oscar Arcerio	Suarez Torres	Ayudante		4.043.530	29/05/1992																																		
	Andres	Fonseca Piña	Ayudante		1.049.628.439	1/02/2019																																		
	Jose Alfredo	Vargas Rodriguez	Maestro		7.167.879	29/05/1992																																		
	Jesica	Duran	Auxiliar Sisa		1.002.457.500														X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
SUBCONTRATISTA "A"																																							
SUBCONTRATISTA "B"																																							
SUBCONTRATISTA "C"																																							

Guillermo Acero
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RESIDENTE SST DE OBRA
Licencia No XXXXXXXXXXXXX

Mauricio Forero
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RESIDENTE SST DE INTERVENTORIA
Licencia No XXXXXXXXXXXX

ANEXOS

1. Cuando se realice el ingreso del personal se debe anexar certificados medicos de ingreso
2. Cuando se realice el retiro del personal se debe anexar certificados medicos de egreso
3. Cuando se realice el retiro de personal se debe anexar paz y salvo del trabajador

225

SEGUIMIENTO A INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL EN OBRA

CODIGO:	GHF-017
VERSION:	01
FECHA:	DIC DE 2022

CONTRATO DE OBRA No 440 DE 2022

NOMBRE / RAZON SOCIA: CONSORCIO TOCANCIPA IT. **NIT / C.C.:** 901.571.272-4

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DETOCANCIPÁ

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	% DE DEDICACIÓN	CEDULA	FECHA EXPEDICIÓN	ING	RET	ASISTENCIA EN EL MES DE: AGOSTO 2023																										
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PERSONAL OFERTADO	Oscar Julio	Pérez Panqueva	Representante Legal / Técnico Electricista		7.165.049	28/09/1990	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
	Cesar Augusto	Cardozo Arevalo	Director	50%	7.173.308	17/11/1995	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
	Byron Fernando	Ruiz Mondragón	Residente 1	100%	9.869.866	27/08/2001	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
	Fabio	Vargas Avila	Residente 2	100%	7.163.503	5/07/1989	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
	Jose Guillermo	Acero	SST	100%	74.374.878	10/12/1997	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
	Lida Irene	Bernal Hernandez	Asesor Eléctrico		33.378.870	18/09/2003	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
	Alvaro	Sua Carreño	Asesor Hidrosanitario		80.085.072	12/06/1998	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
PERSONAL ADICIONAL																																							
PERSONAL OPERATIVO	Jeferson	Pérez	Electricita		1.049.648.093	25/11/2014	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
	Oscar Arcello	Suarez Torres	Ayudante		4.043.530	29/05/1992	X											X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
	Andres	Fonseca Piña	Ayudante		1.049.628.439	1/02/2010	X	X										X	X	X																			
	Jose Alfredo	Vargas Rodriguez	Maestro		7.167.679	29/05/1992	X											X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
	Adrian	Castelblanco	Electricita		11.251.210	17/01/1976	X																								X	X	X	X		X	X	X	
	Neider	Suarez	Tecnologa obras	100%	23.292.660	24/05/1999	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
	Edwin	Cuervo	Arquitecto	100%	7.183.179	5/07/2001	X															X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	
SUBCONTRATISTA "A"																																							
SUBCONTRATISTA "B"																																							
SUBCONTRATISTA "C"																																							

JOSE GUILLERMO ACERO ALBARRACIN
RESIDENTE SST DE OBRA
15926-034454BYC

DARLEY MAURICIO FORERO ACOSTA
RESIDENTE SST DE INTERVENTORIA
2150

226

CODIGO GIF-01-5
VERSION 03
FECHA MAYO DE 2023

CONTROL A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

CONTRATO DE OBRA No 440 DE 2022

NOMBRE / RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TOCANCIPA IT
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
NIT / C.C.:	901.571.372-4

	NOMBRES	APELLIDOS	CARGO	RIESGO ARL	PLANILLA No.	IBC	ING	RET	IND	COTIZACION PENSION 16%	FONDO PENSIONAL DE SOLIDARIDAD	FONDO PENSIONAL DE SUBSISTENCIA	COTIZACION SALUD 4% / 12,5%	COTIZACION ARL	APORTE CCF 4% / 2%	APORTE SENA 2%	APORTE ICBF 3%	VALOR DEL APORTE TOTAL	PERIODO DE PAGO SALUD	PERIODO DE PAGO PENSION	DIAS DE MORA
PERSONAL OPERATIVO	Cesar Julio	Perez Pacqueva	Representante Legal -I	V	9457356157	$ 1.160.000,00			X	$ 185.600,00			$ 46.400,00	$ 80.800,00	$ 46.400,00			$ 359.200,00			4,00
	Cesar Augusto	Cardozo Alvarez	Director	1	2330400381	$ 1.160.000,00			X	$ 185.600,00			$ 145.000,00	$ 8.100,00	$ -	$ -	$ -	$ 80.400,00	ASOCIADA		
	Cesar Augusto	Cardozo Alvarez	Director	V	17416647111				X					$ 80.800,00							
	Byron Fernando	Ruiz Manzaragón	Residente 1	V	4531966654	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00			$ 145.000,00	$ 80.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 359.200,00			
	Fabio	Vargas Avila	Residente 2	V	9456227836	$ 1.160.000,00		X		$ 185.600,00			$ 46.400,00	$ 80.800,00	$ 46.400,00			$ 359.200,00			
	Jose Guillermo	Acero	SST	V	4580364253	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00			$ 145.000,00	$ 80.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 411.400,00			46,00
	Lida Rene	Barrera Hernandez	Asesor Electrico	1	4018455443	$ 557.334,00		X		$ 105.700,00			$ 82.200,00	$ 3.500,00				$ 100.900,00			
	Alvaro	Sua Garzon	Asesor Hidrosanitario	V	4580369170	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00			$ 145.000,00	$ 80.800,00				$ 411.400,00			49,00
PERSONAL ADICIONAL										$ -					$ -	$ -	$ -	$ -			
										$ -					$ -	$ -	$ -	$ -			
										$ -					$ -	$ -	$ -	$ -			
										$ -					$ -	$ -	$ -	$ -			
										$ -					$ -	$ -	$ -	$ -			
										$ -					$ -	$ -	$ -	$ -			
PERSONAL OPERATIVO	Ibferson	Perez	Electricista	V	9457356157	$ 1.160.000,00			X	$ 185.600,00	$ -	$ -	$ 46.400,00	$ 80.800,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	$ 359.200,00			4,00
	Oscar Arcelio	Suarez Torres	Ayudante	V	9457356157	$ 348.000,00		X		$ 55.700,00	$ -	$ -	$ 14.000,00	$ 24.300,00	$ 14.000,00	$ -	$ -	$ 108.000,00			
	Jose Alfredo	Vargas Rodriguez	Maestro	V	9457356157	$ 812.000,00	X			$ 130.000,00	$ -	$ -	$ 32.500,00	$ 56.800,00	$ 32.500,00	$ -	$ -	$ 251.800,00			
	Adrian	Castellanos	Electricista	V	9457356157	$ 1.160.000,00		X		$ 185.600,00	$ -	$ -	$ 46.400,00	$ 80.800,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	$ 359.200,00			
	Heiber	Suarez	Tecnologo obras	V	9458027836	$ 1.160.000,00	X			$ 185.600,00	$ -	$ -	$ 46.400,00	$ 80.800,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	$ 359.200,00			
	Edwin	Cuervo	Arquitecto	V	9458027836	$ 1.160.000,00			X	$ 185.600,00	$ -	$ -	$ 46.400,00	$ 80.800,00	$ 46.400,00	$ -	$ -	$ 359.200,00			

ANEXO I

aport en lín

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820002625	7	INGELCO PROYECTOS E.U.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CRA 9A # 60-44	TUNJA-BOYACA	7451210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9454817960	9454817960	E	2023/08/08	2023/08/11	BANCO DE BOGOTA	3	$554,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA (3 Afiliados)						$1,780,667	$285,000			$1,780,667	$71,300			$1,780,667	$71,300			$1,780,667		$124,100		$0	$0		$551,700
Centro de Trabajo: TUNJA (3 Afiliados)						$1,780,667	$285,000			$1,780,667	$71,300			$1,780,667	$71,300			$1,780,667		$124,100		$0	$0		$551,700
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)						$1,780,667	$285,000			$1,780,667	$71,300			$1,780,667	$71,300			$1,780,667		$124,100		$0	$0		$551,700
1	CC	1077091462	CONTRERAS LAURA	230301	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF10	7	$270,667	$10,900	14-23	7	$270,667	6.960%	$18,900	7	$0	$0	SI	$84,100
2	CC	4221036	PULIDO JORGE	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	92334965	PULIDO VICTOR	230301	7	$350,000	$56,000	EPS005	7	$350,000	$14,000	CCF10	7	$350,000	$14,000	14-23	7	$350,000	6.960%	$24,400	7	$0	$0	SI	$108,400
Total	Afiliados(3)					$1,780,667	$285,000			$1,780,667	$71,300			$1,780,667	$71,300			$1,780,667		$124,100		$0	$0		$551,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820002625	7	INGELCO PROYECTOS E.U.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CRA 9A # 60-44	TUNJA-BOYACA	7451210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9454817960	9454817960	E	2023/08/08	2023/08/11	BANCO DE BOGOTA	3	$554,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$285,000	$1,100	$0	$286,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$700	$0	$186,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$99,400	$400	$0	$99,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$124,100	$500	$0	$124,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$124,100	$500	$0	$124,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$71,300	$300	$0	$71,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	$71,300	$300	$0	$71,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	$71,300	$400	$0	$71,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$200	$0	$46,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$10,900	$100	$0	$11,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$14,000	$100	$0	$14,100
TOTAL				3	$551,700	$2,300	$0	$554,000

229

2023/08/11 10:38 AM

OK

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820002625	7	INGELCO PROYECTOS E.U.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CRA 9A # 60-44	TUNJA-BOYACA	7451710	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9455917384	9455917384	E	2023/08/08	2023/09/04	BANCO DE BOGOTA	27	$86,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA (1 Afiliados)						$270,667	$43,400			$270,667	$10,900			$270,667	$10,900			$270,667		$18,900		$0	$0		$84,100
Centro de Trabajo: TUNJA (1 Afiliados)						$270,667	$43,400			$270,667	$10,900			$270,667	$10,900			$270,667		$18,900		$0	$0		$84,100
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$270,667	$43,400			$270,667	$10,900			$270,667	$10,900			$270,667		$18,900		$0	$0		$84,100
1	CC 1049602739	FORERO DARLEY	X	23030 1	F	$270,667	$43,400	EPS005	F	$270,667	$10,900	CCF10	F	$270,667	$10,900	14-23	F	$270,667	6.960%	$18,900	F	$0	$0	Si	$84,100
Total Afiliados(1)						$270,667	$43,400			$270,667	$10,900			$270,667	$10,900			$270,667		$18,900		$0	$0		$84,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820002625	7	INGELCO PROYECTOS E.U.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CRA 9A # 60-44	TUNJA-BOYACA	7451710	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	9455917384	9455917384	E	2023/08/08	2023/09/04	BANCO DE BOGOTA	27	$86,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,400	$1,400	$0	$44,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$43,400	$1,400	$0	$44,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,900	$600	$0	$19,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$18,900	$600	$0	$19,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,900	$400	$0	$11,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$10,900	$400	$0	$11,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,900	$400	$0	$11,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$10,900	$400	$0	$11,300
TOTAL				**1**	**$84,100**	**$2,800**	**$0**	**$86,900**

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049604665
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			MARTHA JOHANNA SANCHEZ NUMPAQUE SANCHEZ NUMPAQUE
CIUDAD Y MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	TRS 1 ND 71-11	TELÉFONO	7452261
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4530427769	TIPO DE PLANILLA			E-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2023
DIAS DE MORA			113				
FECHA PAGO (aa/mm/dd)			2023/12/07	NUMERO AUTORIZACIÓN:			999891808

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000	$ 0	$ 185.600	$ 22.000	$ 207.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 22.000	$ 207.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 17.200	$ 0	$ 145.000	$ 17.200	$ 0	$ 162.200
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 17.200	$ 0	$ 162.200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 80.800	$ 9.600	$ 0	$ 90.400
SUBTOTALES:									$ 80.800	$ 9.600	$ 0	$ 90.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

en li

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820002625	7	INGELCO PROYECTOS E.U.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CRA 9A # 60-44	TUNJA-BOYACA	7451210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	9455965454	9455965454	E	2023/09/07	2023/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	$1,218,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación		Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: TUNJA (4 Afiliados)							$3,936,000	$629,800			$3,936,000	$157,500			$3,936,000	$157,500			$3,936,000		$274,100		$0	$0		$1,218,900
Centro de Trabajo: TUNJA (4 Afiliados)							$3,936,000	$629,800			$3,936,000	$157,500			$3,936,000	$157,500			$3,936,000		$274,100		$0	$0		$1,218,900
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)							$3,936,000	$629,800			$3,936,000	$157,500			$3,936,000	$157,500			$3,936,000		$274,100		$0	$0		$1,218,900
1	CC	1077091462	CONTRERAS LAURA		230301	3	$118,000	$18,600	EPS037	3	$176,000	$4,700	CCF10	3	$118,000	$4,700	14-23	3	$118,000	6.960%	$8,100	3	$0	$0	SI	$36,100
2	CC	1049602785	FORERO DARLEY		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
3	CC	6221036	PULIDO JORGE		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-23	30	$1,160,000	6.960%	$80,800	30	$0	$0	SI	$359,200
4	CC	72324565	PULIDO VICTOR		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF10	30	$1,500,000	$60,000	14-23	30	$1,500,000	6.960%	$104,400	30	$0	$0	SI	$464,400
Total	Afiliados(4)						$3,936,000	$629,800			$3,936,000	$157,500			$3,936,000	$157,500			$3,936,000		$274,100		$0	$0		$1,218,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 820002625	7	INGELCO PROYECTOS E.U.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA	CRA 9A # 60-44	TUNJA-BOYACA	7451210	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	9455965454	9455965454	E	2023/09/07	2023/09/05	BANCO DE BOGOTA	0	$1,218,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$629,800	$0	$0	$629,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$0	$0	$185,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$444,200	$0	$0	$444,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$274,100	$0	$0	$274,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$274,100	$0	$0	$274,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$157,500	$0	$0	$157,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	4	$157,500	$0	$0	$157,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$157,500	$0	$0	$157,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$46,400	$0	$0	$46,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$4,700	$0	$0	$4,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$106,400	$0	$0	$106,400
TOTAL				**4**	**$1,218,900**	**$0**	**$0**	**$1,218,900**

2023/09/05 12:37 PM

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1049604965
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARTHA JOHANNA SANCHEZ NUMPAQUE SANCHEZ NUMPAQUE
CIUDAD/MUNICIPIO	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	TRS 1 NO 71-11	TELEFONO:	7452261
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	4530427718	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto AÑO	2023
DIAS DE MORA	83				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023/12/07	NUMERO AUTORIZACIÓN:			9996914818

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.800	$ 0	$ 185.600	$ 15.800	$ 201.400
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 15.800	$ 201.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 12.400	$ 0	$ 145.000	$ 12.400	$ 0	$ 157.400
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 12.400	$ 0	$ 157.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN			DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 80.800	$ 6.900	$ 0	$ 87.700
SUBTOTALES:									$ 80.800	$ 6.900	$ 0	$ 87.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETENCIÓN REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COL	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN			FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD						ARP						DÍAS COT.	IBC	CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																									ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	CAP. EMPLEADOR	EMPLEADO			ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC 1049604965	SANCHEZ NUMPAQUE SANCHEZ MARTHA JOHANNA	INDEPENDIENTE COTIZANTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000			NO																	220301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 104060465	$ 80.800	0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 446.500

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7173308
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 BIS A N 4E-31	TELEFONO	7400006
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	2330427521		TIPO DE PLANILLA:				1-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES	julio AÑO	2023
DIAS DE MORA:		62					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				999B059182

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.700	$ 0	$ 185.600	$ 12.700	$ 198.300
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 12.700	$ 198.300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 10.000	$ 0	$ 145.000	$ 10.000	$ 0	$ 155.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 10.000	$ 0	$ 155.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 500	$ 0	$ 6.600
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 500	$ 0	$ 6.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7173308
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
CIUDAD/MUNICIPIO	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN	CALLE 4 B IS A N 4E-31	TELÉFONO	7400004
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA		1741546948	TIPO DE PLANILLA		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	p/ej: AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	p/ej: AÑO 2023
DIAS DE MORA		139			
FECHA PAGO (aa/mm/dd)		2023/12/26	NUMERO AUTORIZACIÓN		9997108072
NUMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA		2330427521	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA		2023/10/04

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 74.700	$ 74.700	$ 10.900	$ 0	$ 85.600
SUBTOTALES:									$ 74.700	$ 10.900	$ 0	$ 85.600


LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES					
																								PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RENTA TRIBUTARIA	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7173308	CARDOZO AREVALO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO							A										230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	17112	$ 85.100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7173308	CARDOZO AREVALO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO							C										230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	17112	$ 85.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 7173308	CARDOZO AREVALO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000				NO							R										230301-PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0	17112	$ 74.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 85.600

735

OK

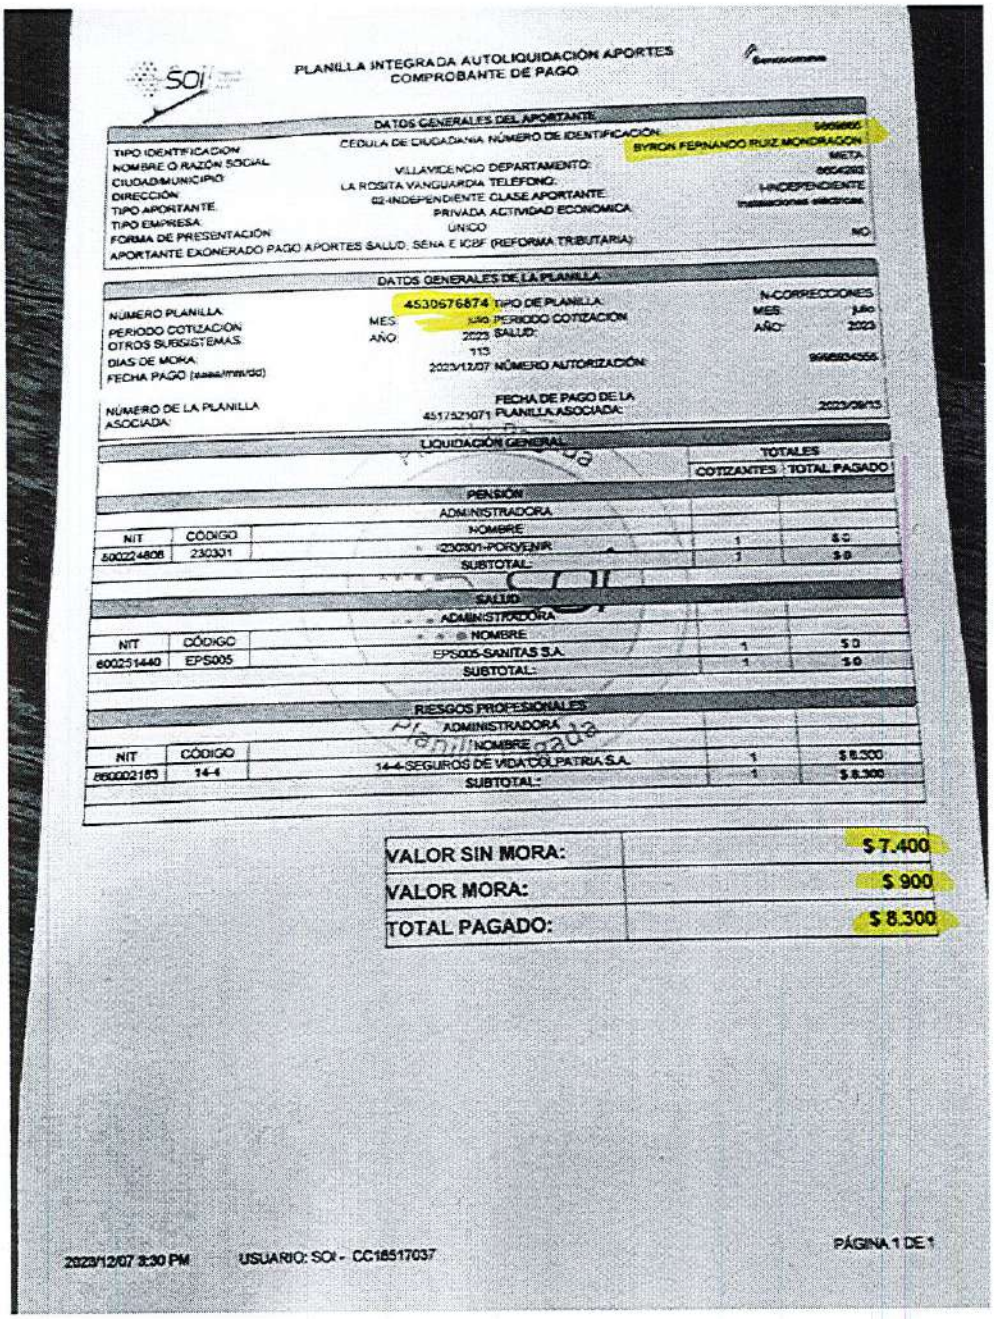

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	[illegible]
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			BYRON FERNANDO RUIZ MONDRAGON
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	LA ROSITA VANGUARDIA	TELÉFONO:	6624282
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	[illegible]
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	45306768 74	TIPO DE PLANILLA:		N.CORRECCIONES:	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	JUIO	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	Julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DIAS DE MORA:		113			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/12/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		[illegible]
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		45173210 71	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2023/08/15

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 0
		SUBTOTAL:	1	$ 0
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 0
		SUBTOTAL:	1	$ 0
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 8.300
		SUBTOTAL:	1	$ 8.300

VALOR SIN MORA:	$ 7.400
VALOR MORA:	$ 900
TOTAL PAGADO:	$ 8.300

2023/12/07 3:30 PM USUARIO: SOI - CC18517037 PÁGINA 1 DE 1



EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.993-1
ORDEN DE SERVICIO

OV: 002929
N. OS: 9445395702 110263 PTA RECAUDO
Cliente: 07/12/2023 15:22:40
Fecha: 903932
PAP: 9869866
Identificacion: BRAYA
Nombre: RUIZ
Apellido 1: NAA
Apellido 2: CEDULA DE CIUDADANIA
TIPO DOCUMENTO: 5555555555
TELEFONO: 4530676874
Codigo Planilla: 2023707
Periodo Pago: 0
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision:
Referencia: 9869866 Valor: $8.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que BYRON FERNANDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 9869866, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) BYRON FERNANDO RUIZ MONDRAGON con documento CC 9869866, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4530676874	Tipo de Planilla	N-CORRECCIONES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2023	Periodo Cotización Salud	JULIO/2023
Fecha Pago	2023/12/07	Número de Autorización	9996934555

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	5	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	5	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-4 - AXA COLPATRIA
Días	5	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80085072
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALVARO HERNANDO SUA CARREÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 163 N. 72-61 INT 80	TELÉFONO:	8932595
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4530274504	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/12/05	110	$ 6.400	$ 61.600
2023/12/06	111	$ 6.600	$ 61.800
2023/12/07	112	$ 6.600	$ 61.800
2023/12/11	116	$ 6.800	$ 62.000
2023/12/12	117	$ 6.800	$ 62.000
2023/12/13	118	$ 6.900	$ 62.100

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 31.000
		SUBTOTAL:	1	$ 31.000
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 24.200
		SUBTOTAL:	1	$ 24.200

TOTAL POR PAGAR: $ 61.600

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74374878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE GUILLERMO ACERO ALBARRACIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:		CENTRO TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4530266315	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: julio	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/12/05	109	$ 6.400	$ 61.600
2023/12/06	110	$ 6.400	$ 61.600
2023/12/07	111	$ 6.500	$ 61.700
2023/12/11	115	$ 6.800	$ 62.000
2023/12/12	116	$ 6.800	$ 62.000
2023/12/13	117	$ 6.800	$ 62.000

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
X																

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 31.000
		SUBTOTAL:	1	$ 31.000
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 24.200
		SUBTOTAL:	1	$ 24.200

TOTAL POR PAGAR: $ 61.600

240

aporte en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163821	8	TECNICOS ELECTROMECANICOS PEREZ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	KRA 21B 31 10	TUNJA-BOYACA	7407304	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	90004469	9453820325	E	2023/08/04	2023/08/08	BANCOLOMBIA	4	$1,668,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$928,000	$4,400	$0	$932,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$900	$0	$186,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,600	$900	$0	$186,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$556,800	$2,600	$0	$559,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$268,700	$1,300	$0	$270,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	$268,700	$1,300	$0	$270,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$232,000	$1,100	$0	$233,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$232,000	$1,100	$0	$233,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$232,000	$1,300	$0	$233,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$46,400	$300	$0	$46,700
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$46,400	$300	$0	$46,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$139,200	$700	$0	$139,900
TOTAL				**5**	**$1,660,700**	**$8,100**	**$0**	**$1,668,800**

241

2023/08/07 07:35 PM

aporte en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901163821	8	TECNICOS ELECTROMECANICOS PEREZ CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	KRA 21B 31 10	TUNJA-BOYACA	7407304	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	90004469	9453820325	E	2023/08/04	2023/08/08	BANCOLOMBIA	4	$1,668,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (5 Afiliados)						**$5,800,000**	**$928,000**			**$5,800,000**	**$232,000**			**$5,800,000**	**$232,000**			**$5,800,000**	**$268,700**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$46,400			$1,160,000	$6,100		$0	$0
1	CC	40045830	NUÑEZ ANA	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)						**$2,320,000**	**$371,200**			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			**$2,320,000**	$101,000		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						**$2,320,000**	**$371,200**			$2,320,000	$92,800			$2,320,000	$92,800			**$2,320,000**	$101,000		$0	$0
2	CC	93402250	NIÑO EIDER	25-14	30	$1,160,000	$185,600	MIN002	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
3	CC	80223363	ROA NELSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ELECTRICISTAS (2 Afiliados)						**$2,320,000**	**$371,200**			**$2,320,000**	**$92,800**			$2,320,000	$92,800			**$2,320,000**	$161,600		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						**$2,320,000**	**$371,200**			**$2,320,000**	**$92,800**			$2,320,000	$92,800			**$2,320,000**	$161,600		$0	$0
4	CC	1049648093	PEREZ JEFERSON	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
5	CC	7165049	PEREZ OSCAR	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF10	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$80,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(5)**			$5,800,000	$928,000			**$5,800,000**	**$232,000**			**$5,800,000**	**$232,000**			$5,800,000	$268,700		**$0**	**$0**

292

2023/08/07 07:35 PM

04

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901366179	9	INGECOM S&D S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA COMFABOY	CL 79 1 A 15 ESTE	TUNJA-BOYACA	3191009	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-07	2023-08	109968987	9455005141	E	2023/08/18	2023/08/18	BANCOLOMBIA	0	$9,108,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	trl	Fecha Inicio trl	Fecha Fin trl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$4,607,200						$1,243,700
																				$4,236,000						$1,150,400
																				$4,236,000						$1,150,400
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		SANITAS	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		FAMISANAR	29	$1,121,334	4%	$44,900	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	29	$1,121,334	16%	SIN RIESGO	$179,500	$0	$0	$0	$0	$0	$179,500		NUEVA EPS MOVILIDAD	29	$1,121,334	4%	$44,900	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	29	$1,121,334	16%	SIN RIESGO	$179,500	$0	$0	$0	$0	$0	$179,500		NUEVA E.P.S.	29	$1,121,334	4%	$44,900	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	23	$889,334	16%	SIN RIESGO	$142,300	$0	$0	$0	$0	$0	$142,300		NUEVA EPS MOVILIDAD	23	$889,334	4%	$35,600	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	29	$1,121,334	16%	SIN RIESGO	$179,500	$0	$0	$0	$0	$0	$179,500		NUEVA EPS MOVILIDAD	29	$1,121,334	4%	$44,900	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		SANITAS	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$2,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
																				$371,200						$92,800	

2023/09/08 12:35 p.m.

OK

244

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,243,200						$1,243,200						$2,014,900				$0		$0		$0		$0	
	$1,150,400						$1,150,400						$2,002,700				$0		$0		$0		$0	
	$1,150,400						$1,150,400						$2,002,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$44,900		COMFABOY	29	$1,121,334	4%	$44,900	ARL SURA	29	$1,121,334	6.96%	5	$78,100	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$44,900		COMFABOY	29	$1,121,334	4%	$44,900	ARL SURA	29	$1,121,334	6.96%	5	$78,100	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$44,900		COMFABOY	29	$1,121,334	4%	$44,900	ARL SURA	29	$1,121,334	6.96%	5	$78,100	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$35,600		COMFABOY	23	$889,334	4%	$35,600	ARL SURA	23	$889,334	6.96%	5	$61,900	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$44,900		COMFABOY	29	$1,121,334	4%	$44,900	ARL SURA	29	$1,121,334	6.96%	5	$78,100	29	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$100,000		COMFABOY	30	$2,500,000	4%	$100,000	ARL SURA	30	$2,500,000	6.96%	5	$174,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$92,800						$92,800						$12,200				$0		$0		$0		$0	

245

86

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	Vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotizacion	Cotización Voluntaria Empleador	Cotizacion Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$371,200						$92,800	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
																				$4,607,200						$1,243,200	

2023/09/08 12:35 PM

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$92,800						$92,800						$12,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	0.522%	1	$6,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	0.522%	1	$6,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$1,243,200						$1,243,200						$2,014,900				$0		$0		$0		$0	

2023/09/08 12:35 PM

248

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33378570
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			LIDA IRENE BERNAL HERNANDEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCION:	CRA 6 NO 03-17	TELÉFONO:	7454545
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4514977228		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	MES AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	MES AÑO 2023
DIAS DE MORA:		12			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/08/29	NUMERO AUTORIZACIÓN:		9999591422

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.600	$ 0	$ 185.600	$ 2.600	$ 188.200
SUBTOTALES:												

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 145.000	$ 2.000	$ 0	$ 147.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 2.000	$ 0	$ 147.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25 COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 100	$ 0	$ 6.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80085072
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ALVARO HERNANDO SUA CARREÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 163 N. 72-61 INT 80	TELÉFONO:	8932595
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4530274830	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO

FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/12/05	78	$ 26.500	$ 357.100
2023/12/06	79	$ 26.800	$ 357.400
2023/12/07	80	$ 27.100	$ 357.700
2023/12/11	84	$ 28.400	$ 359.000
2023/12/12	85	$ 28.700	$ 359.300
2023/12/13	86	$ 29.000	$ 359.600

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**

TOTAL POR PAGAR: $ 357.100

250

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74374878
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			JOSE GUILLERMO ACERO ALBARRACIN
CIUDAD MUNICIPIO	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELEFONO	9999999
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA			4536383206	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2023
DIAS DE MORA			78				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2023/12/06	NUMERO AUTORIZACIÓN:			999691949

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800	$ 0	$ 185.600	$ 14.800	$ 200.400
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 14.800	$ 200.400

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 11.600	$ 0	$ 145.000	$ 11.600	$ 0	$ 156.600
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 11.600	$ 0	$ 156.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 80.800	$ 80.800	$ 6.500	$ 0	$ 87.300
SUBTOTALES:									$ 80.800	$ 6.500	$ 0	$ 87.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES					
																										PENSIÓN						SALUD					ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COT	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74374878	JOSE GUILLERMO ACERO ALBARRACIN	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000			NO																	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS008-COMPENSAR	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 74374878	$ 80.800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 444.300

Planilla Pagada

2023/12/07 11:55 USUARIO SOI: CC74374878

251

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
RECIBO PARA PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	743[illegible]1878
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOSE GUILLERMO ACERO ALBARRACIN
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	4530266498	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA LIMITE DE PAGO	DIAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2023/12/05	77	$ 26.100	$ 356.700
2023/12/06	78	$ 26.400	$ 357.000
2023/12/07	79	$ 26.700	$ 357.300
2023/12/11	83	$ 28.000	$ 358.600
2023/12/12	84	$ 28.300	$ 358.900
2023/12/13	85	$ 28.700	$ 359.300

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 185.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 145.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 145.000**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 356.700**

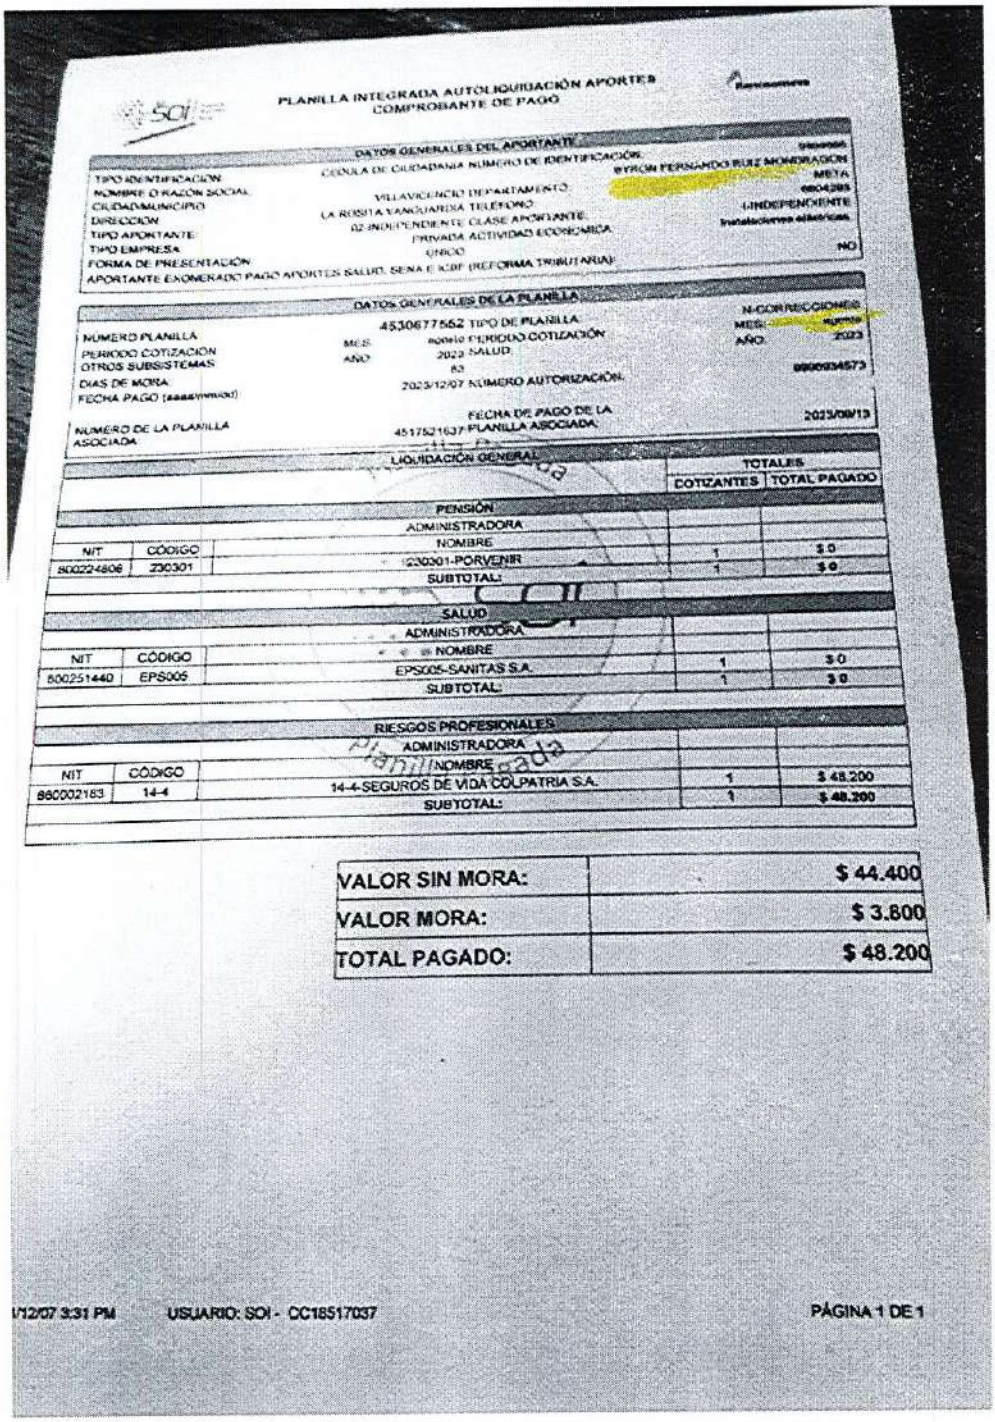

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	[illegible]
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			EYRON FERNANDO RUIZ MONDRAGON
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCION:	LA ROSITA VANGUARDIA	TELEFONO:	6804285
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	4-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Instaladores eléctricos
FORMA DE PRESENTACION:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	4530677552	TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES:	
PERIODO COTIZACION	MES:	Febrero	PERIODO COTIZACION	MES:	Agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2023	SALUD:	AÑO:	2023
DIAS DE MORA:		83			1000034573
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/12/07	NUMERO AUTORIZACION:		
NUMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		4517521637	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2023/09/13

LIQUIDACIÓN GENERAL			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	Z30301	Z30301-PORVENIR	1	$ 0
		SUBTOTAL:	1	$ 0
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 0
		SUBTOTAL:	1	$ 0
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 48.200
		SUBTOTAL:	1	$ 48.200

VALOR SIN MORA:	$ 44.400
VALOR MORA:	$ 3.800
TOTAL PAGADO:	$ 48.200

/12/07 3:31 PM USUARIO: SOI - CC18517037 PÁGINA 1 DE 1



NIT: 830.731.993-1
ORDEN DE SERVICIO
OS: 9445395703
DV: 754031
110263 PILA RECAUDO
07/12/2023 15:25:40
903932
9869866
Cliente: BYRON
Fecha: RUIZ
PAP: NOA
Identificacion:
Nombre:
Apellido 1:
Apellido 2:
Tipo Documento: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 5555555555
Codigo Planilla: 4530677552
Codigo Pago: 2023708
Periodo Pago: 0
Valor Comision: 0
Valor Iva Comision:
Referencia: 9869866 Valor: $48.200,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que BYRON FERNANDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 9869866, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) BYRON FERNANDO RUIZ MONDRAGON con documento CC 9869866, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4530677552	Tipo de Planilla	N-CORRECCIONES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2023	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2023
Fecha Pago	2023/12/07	Número de Autorización	9996934573

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-4 - AXA COLPATRIA
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901366179	9	INGECOM S&D S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA COMFABOY	CL 79 1 A 15 ESTE	TUNJA-BOYACA	3191009	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	184148853	9456566531	E	2023/09/19	2023/09/27	BANCOLOMBIA	8	$4,553,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$2,290,300						$619,500	
																				$2,055,200						$560,700	
																				$2,055,200						$560,700	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$38,667	16%	SIN RIESGO	$6,200	$0	$0	$0	$0	$0	$6,200		FAMISANAR	1	$38,667	4%	$1,600	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	28	$1,082,667	16%	SIN RIESGO	$173,300	$0	$0	$0	$0	$0	$173,300		FAMISANAR	28	$1,082,667	4%	$43,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		SANITAS	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$38,667	16%	SIN RIESGO	$6,200	$0	$0	$0	$0	$0	$6,200		NUEVA E.P.S.	1	$38,667	4%	$1,600	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$309,334	16%	SIN RIESGO	$49,500	$0	$0	$0	$0	$0	$49,500		NUEVA EPS MOVILIDAD	8	$309,334	4%	$12,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$309,334	16%	SIN RIESGO	$49,500	$0	$0	$0	$0	$0	$49,500		FAMISANAR	8	$309,334	4%	$12,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	1	$38,667	16%	SIN RIESGO	$6,200	$0	$0	$0	$0	$0	$6,200		FAMISANAR	1	$38,667	4%	$1,600	
						$1,160,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA EPS MOVILIDAD	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PROTECCION	1	$38,667	16%	SIN RIESGO	$6,200	$0	$0	$0	$0	$0	$6,200		NUEVA E.P.S.	1	$38,667	4%	$1,600	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$38,667	16%	SIN RIESGO	$6,200	$0	$0	$0	$0	$0	$6,200		NUEVA EPS MOVILIDAD	1	$38,667	4%	$1,600	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	17	$657,334	16%	SIN RIESGO	$105,200	$0	$0	$0	$0	$0	$105,200		SANITAS	17	$657,334	4%	$26,300	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$2,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	1	$83,334	16%	SIN RIESGO	$13,400	$0	$0	$0	$0	$0	$13,400		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	1	$83,334	4%	$3,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$38,667	16%	SIN RIESGO	$6,200	$0	$0	$0	$0	$0	$6,200		NUEVA E.P.S.	1	$38,667	4%	$1,600	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$309,334	16%	SIN RIESGO	$49,500	$0	$0	$0	$0	$0	$49,500		COMPENSAR	8	$309,334	4%	$12,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	15	$580,000	16%	SIN RIESGO	$92,800	$0	$0	$0	$0	$0	$92,800		NUEVA E.P.S.	15	$580,000	4%	$23,200	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
																				$235,100						$58,800	
																				$235,100						$58,800	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$309,334	16%	SIN RIESGO	$49,500	$0	$0	$0	$0	$0	$49,500		FAMISANAR	8	$309,334	4%	$12,400	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		FAMISANAR	30	$1,160,000	4%	$46,400	
																				$2,290,300						$619,500	

2023/10/11 08:47 a.m.

252

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$619,500						$619,500						$983,500				$0		$0		$0		$0	
	$560,700						$560,700						$975,700				$0		$0		$0		$0	
	$560,700						$560,700						$975,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$1,600		COMFABOY	1	$38,667	4%	$1,600	ARL SURA	1	$38,667	6.96%	5	$2,700	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$43,400		COMFABOY	28	$1,082,667	4%	$43,400	ARL SURA	28	$1,082,667	6.96%	5	$75,400	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$1,600		COMFABOY	1	$38,667	4%	$1,600	ARL SURA	1	$38,667	6.96%	5	$2,700	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$12,400		COMFABOY	8	$309,334	4%	$12,400	ARL SURA	8	$309,334	6.96%	5	$21,600	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$12,400		COMFABOY	8	$309,334	4%	$12,400	ARL SURA	8	$309,334	6.96%	5	$21,600	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$1,600		COMFABOY	1	$38,667	4%	$1,600	ARL SURA	1	$38,667	6.96%	5	$2,700	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$1,600		COMFABOY	1	$38,667	4%	$1,600	ARL SURA	1	$38,667	6.96%	5	$2,700	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$1,600		COMFABOY	1	$38,667	4%	$1,600	ARL SURA	1	$38,667	6.96%	5	$2,700	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$26,300		COMFABOY	17	$657,334	4%	$26,300	ARL SURA	17	$657,334	6.96%	5	$45,800	17	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$3,400		COMFABOY	1	$83,334	4%	$3,400	ARL SURA	1	$83,334	6.96%	5	$5,900	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$1,600		COMFABOY	1	$38,667	4%	$1,600	ARL SURA	1	$38,667	6.96%	5	$2,700	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$12,400		COMFABOY	8	$309,334	4%	$12,400	ARL SURA	8	$309,334	6.96%	5	$21,600	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$23,200		COMFABOY	15	$580,000	4%	$23,200	ARL SURA	15	$580,000	6.96%	5	$40,400	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	6.96%	5	$80,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$58,800						$58,800						$7,800				$0		$0		$0		$0	
	$58,800						$58,800						$7,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$12,400		COMFABOY	8	$309,334	4%	$12,400	ARL SURA	8	$309,334	0.522%	1	$1,700	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
$0	$46,400		COMFABOY	30	$1,160,000	4%	$46,400	ARL SURA	30	$1,160,000	0.522%	1	$6,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	SI
	$619,500						$619,500						$983,500				$0		$0		$0		$0	

2023/10/11 08:47 a.m.

852

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901366179	9	INGECOM S&D S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TUNJA COMFABOY	CL 79 1 A 15 ESTE	TUNJA-BOYACA	3191009	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-09	184148853	9456566531	E	2023/09/19	2023/09/27	BANCOLOMBIA	8	$4,553,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$2,290,300	$20,300	$0	$2,310,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$185,600	$1,700	$0	$187,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$13,400	$200	$0	$13,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$1,893,300	$16,600	$0	$1,909,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$198,000	$1,800	$0	$199,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$983,500	$8,700	$0	$992,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$983,500	$8,700	$0	$992,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$619,500	$5,500	$0	$625,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	24	$619,500	$5,500	$0	$625,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				24	$619,500	$5,800	$0	$625,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$12,400	$200	$0	$12,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$49,800	$500	$0	$50,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$164,200	$1,500	$0	$165,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$260,000	$2,300	$0	$262,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$60,400	$600	$0	$61,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$72,700	$700	$0	$73,400
TOTAL				**24**	**$4,512,800**	**$40,300**	**$0**	**$4,553,100**

2023/10/11 08:47 AM

252

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	33378870
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			LEMIRENE BERNAL HERNANDEZ
CIUDAD/UBICACIÓN:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CRA 8 NO 8-3-17	TELÉFONO:	7454545
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades legislativas y actividades de la ad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4516546674			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2023			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/12			NUMERO AUTORIZACIÓN:	989580781

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
23020	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
4-25	4-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100
SUBTOTALES:									$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 6.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	RETIRADA TRASLADA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	PENSIÓN IBC	PENSIÓN DOTACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTES	PARAFISCALES IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 33378870	LEMIRENE BERNAL HERNANDEZ	03-DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000			NO															230301-PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	4-25-COLMENA	$ 1.160.000	$ 6.100		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 336.700

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN:	7173308
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			CESAR AUGUSTO CARDOZO AREVALO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 4 BIS A N 4 E-31	TELÉFONO:	7430004
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		1741546998	TIPO DE PLANILLA:		N.CORRECCIONES:
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES agosto AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2023
DIAS DE MORA:		105			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/12/20	NUMERO AUTORIZACIÓN:		999108062
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		7883755103	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2023/08/30

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:										$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	VALOR ADRES	COTIZACION	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
SUBTOTALES:													$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 74,700	$ 74,700	$ 8,200	$ 0	$ 82,900
SUBTOTALES:									$ 74,700	$ 8,200	$ 0	$ 82,900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																												PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COM	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 7173308	CARDOZO AREVALO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000			NO	01						A										230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	7173308	$ 8,100	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 7173308	CARDOZO AREVALO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000			NO	01						C										230301-PORVENIR	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,160,000	$ 145,000	$ 0	$ 145,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,160,000	7173308	$ 82,800	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 7173308	CARDOZO AREVALO CESAR AUGUSTO	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.160.000			NO	01						R										230301-PORVENIR	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 0	EPS037-NUEVA EPS	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 0	7173308	$ 74,700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 82.900

planilla pagada
SOI

1 de 2
