SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

INFORME FINAL DE EJECUCION ACTIVIDADES CONTRATO DE OBRA N° SAMC-MC-012-2025

OBJETO:

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO".

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
R.L. CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
C.C. 94.513.754 de Cali.
CONTRATISTA

DICIEMBRE DE 2025

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

CONTENIDO

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO 3
2. ALCANCE DEL DOCUMENTO 3
3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 3
4. OBJETO DEL PROYECTO 7
   4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 7
5. LUGAR DE EJECUCION 7
6. ESPECIFICACIONES TECNICAS ..... ¡Error! Marcador no definido.
7. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 8
   7.1. PRESUPUESTO DEL CONTRATO 8
8. RALCION DE POLIZAS DEL CONTRATO 10
9. BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO 12
10. EQUIPO Y PERSONAL PARA EL PROYECTO 12
11. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 13
12. RELACION DE DOCUMENTOS SUSCRITOS 13
13. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS 13
14. CONTRATIEMPOS Y/O ATRASOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 16
15. SABANA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 18
16. REGISTRO FOTOGRAFICO ..... ¡Error! Marcador no definido.
17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA N° MC-MA-012-2025	
PROCESO DE SELCCION	SAMC- MA-012-2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	**"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO".**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO, BOYACÁ NIT: 800.063.791-1
CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901.510.145-6
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HOMER ALVIS MENDOZA C.C. 94.513.754 de Cali.
SUPERVISOR	AQR. CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA supervisor.
VALOR INICIAL	SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($62.938.268,00)**
FECHA DE INICIO	Trece (13) de noviembre de 2025
PLAZO	Un (01) mes y quince (15) días
FECHA DE TERMINACION	28 de diciembre de 2025.

2. ALCANCE DEL DOCUMENTO

El alcance del presente documento se encuentra orientado a informar de manera detallada, técnica y verificable las actividades administrativas, técnicas y operativas desarrolladas para el cumplimiento integral del **Contrato de Obra N° MC-MA-012-2025**, suscrito entre el municipio de **ARCABUCO – BOYACÁ** y la empresa **DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.**

En este sentido, el documento describe y sustenta las actuaciones realizadas durante la ejecución contractual, incluyendo la planeación, supervisión, control

y seguimiento de las actividades ejecutadas, la verificación del cumplimiento del objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y las obligaciones contractuales pactadas. Así mismo, se incorporan los aspectos relacionados con el avance físico y financiero, la gestión documental, la atención de requerimientos de la supervisión, y la aplicación de los lineamientos normativos y contractuales vigentes, con el propósito de garantizar la correcta inversión de los recursos públicos, la calidad de las obras ejecutadas y la satisfacción de las necesidades para las cuales fue celebrado el contrato.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Administración Municipal de Arcabuco debe priorizar y ejecutar el mantenimiento del Patinódromo Municipal debido al notable deterioro que actualmente presenta esta infraestructura, que representa uno de los escenarios deportivos más importantes del municipio, especialmente para la práctica del patinaje, una disciplina que ha ganado protagonismo entre niños, jóvenes y adultos de la comunidad. Este espacio cumple una función social, deportiva y recreativa fundamental, no solo como lugar de formación deportiva, sino también como entorno de encuentro comunitario y promoción de estilos de vida saludables.

Uno de los aspectos más críticos es el desgaste de la pintura de demarcación de la pista, la cual ha perdido visibilidad y definición por el uso constante, las condiciones climáticas y la falta de mantenimiento preventivo. La ausencia de una señalización clara compromete directamente la seguridad de los deportistas, ya que dificulta la orientación, la medición de distancias y el desarrollo adecuado de maniobras técnicas. Este factor no solo afecta el rendimiento deportivo, sino que aumenta el riesgo de accidentes, especialmente en los más jóvenes. La correcta demarcación es indispensable para cumplir con estándares mínimos de seguridad y funcionalidad, y su intervención debe ser inmediata.

Así mismo, el cerramiento perimetral del escenario, compuesto por estructuras metálicas en tubo y tablas de madera, presenta un alto grado de deterioro. La pintura se encuentra en mal estado, hay presencia de óxido y algunas partes de la estructura muestran signos de debilidad. Esto representa un riesgo tanto estructural como estético, ya que el deterioro avanza con rapidez cuando no se toman medidas correctivas. El mantenimiento de esta estructura es necesario para preservar su integridad física, vitar accidentes y garantizar que el escenario se mantenga cerrado y protegido adecuadamente.

Otro aspecto fundamental es la estructura metálica de la cubierta. Esta ha estado expuesta de forma continua a la intemperie, lo cual ha generado corrosión en varias de sus partes. Si no se realiza una intervención oportuna de limpieza, tratamiento anticorrosivo y pintura, se corre el riesgo de un deterioro mayor que comprometa la estabilidad estructural y derive en reparaciones más costosas a futuro. La cubierta no solo proporciona sombra y protección frente a las condiciones climáticas, sino que también es esencial para que el escenario pueda usarse durante todo el año. Su conservación es indispensable para asegurar la durabilidad de toda la instalación.

Las graderías también requieren intervención, ya que su pintura está deteriorada y la estructura presenta manchas, y suciedad acumulada. Dado que estas áreas son de uso frecuente por parte de acompañantes, familiares y espectadores durante entrenamientos y competencias, su mantenimiento contribuye a brindar un entorno digno, seguro y adecuado para toda la comunidad, además de mejorar la imagen del escenario deportivo.

En cuanto a los servicios sanitarios, se evidencia una necesidad urgente de instalar unidades sanitarias en condiciones funcionales y salubres. Actualmente, los baños no cuentan con el mobiliario adecuado ni con las condiciones mínimas de higiene, lo que genera incomodidad a los usuarios y limita el tiempo de permanencia en el lugar. Además, se ha identificado que personas ajenas ingresan a estas instalaciones para hacer uso indebido de las mismas, causando daños y fomentando actos de Vandalismo. Para mitigar esta situación, se requiere la instalación de láminas metálicas que permita el control del acceso, garantizando el cuidado de las unidades sanitarias y su uso exclusivo por parte de los usuarios autorizados.

El mantenimiento integral solicitado no solo busca mejorar las condiciones físicas del lugar, sino también preservar el patrimonio público, evitar accidentes, fomentar el uso adecuado de la infraestructura y promover la práctica deportiva como herramienta de desarrollo social. Además, permite proyectar una imagen positiva del municipio, al mostrar un compromiso claro con el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes.

De igual forma la Administración Municipal de Arcabuco debe adelantar la instalación de una guaya y una malla de nylon en el Centro de Integración Ciudadana (CIC) con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia tanto para los usuarios del escenario deportivo como para los residentes de la Urbanización Tejar, ubicada de manera contigua a dicho centro. En la actualidad, se presenta de forma constante la salida de balones y otros objetos desde la cancha del CIC hacia las viviendas y espacios comunes de la urbanización vecina, generando molestias reiteradas, posibles afectaciones a la

propiedad privada y situaciones de riesgo para la integridad de las personas que transitan o residen en esta zona.

Este tipo de situaciones ha generado quejas por parte de la comunidad residente, ya que los balones pueden impactar ventanas, vehículos, jardines o incluso personas, afectando negativamente la relación entre los usuarios del CIC y los vecinos colindantes. Así mismo, se presentan interrupciones frecuentes en el desarrollo de las actividades deportivas, debido a que los participantes deben abandonar el área de juego para recuperar los elementos, lo cual disminuye la calidad y continuidad de los entrenamientos o partidos.

La instalación de una guaya resistente a lo largo del borde sur de la cancha, acompañada de una malla de nylon de alta durabilidad y resistencia, permitirá contener los balones dentro del perímetro del escenario sin afectar la visibilidad ni el entorno estético del lugar. Esta medida no solo contribuirá a la seguridad de los residentes de la Urbanización Tejar, sino que también garantizará una práctica deportiva más ordenada, segura y eficiente dentro del CIC.

Además, esta intervención refleja el compromiso de la Administración Municipal con la preservación de la armonía comunitaria, el uso adecuado de los espacios públicos y el fomento de escenarios deportivos que funcionen bajo condiciones técnicas adecuadas y respetuosas del entorno urbano. La instalación de este tipo de cerramientos livianos se constituye como una solución efectiva, de bajo impacto y alta funcionalidad, que previene conflictos vecinales y protege tanto a la comunidad como a la infraestructura.

De igual forma el municipio de Arcabuco, en cumplimiento de sus competencias constitucionales y legales en materia de promoción de la cultura, educación y el acceso equitativo a los espacios comunitarios y de aprendizaje, requiere adelantar un proceso de mantenimiento y adecuación de la Biblioteca Municipal, infraestructura que constituye un eje fundamental para el desarrollo académico, recreativo y cultural de la población, en especial de niños, jóvenes y estudiantes que hacen uso constante de sus instalaciones. Actualmente, la Biblioteca presenta un deterioro evidente en su infraestructura física, lo cual afecta la prestación adecuada del servicio, limita la comodidad de los usuarios y pone en riesgo la conservación de los bienes bibliográficos y tecnológicos allí dispuestos.

Con el propósito de garantizar un espacio digno, seguro y funcional, se hace necesario llevar a cabo obras de mejoramiento que incluyan actividades de mantenimiento correctivo y adecuaciones locativas. Entre ellas, se proyecta el suministro e instalación de vinilo tipo I sobre pañete o estuco a tres manos, con el fin de renovar los acabados interiores y asegurar superficies más resistentes y de

fácil limpieza. Igualmente, se requiere el suministro e instalación de pintura Koraza o similar para fachadas, en tres manos, buscando recuperar la imagen institucional del edificio, proteger los muros de la intemperie y aportar a la estética urbana del municipio.

De igual manera, se proyecta el suministro e instalación de esmalte en lámina lineal, aplicado en tres manos, lo que permitirá garantizar la durabilidad de superficies metálicas y de madera expuestas, prolongando su vida útil y mejorando la presentación general. Se contempla además el suministro e instalación de cerradura doble cilindro tipo Yale 105 o similar.

4. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es: **"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO".**

4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Ejecutar las actividades de mantenimiento y adecuación física en las instalaciones donde funcionan el patinódromo municipal, el Centro de Integración Ciudadana y la biblioteca municipal, garantizando el mejoramiento de sus condiciones estructurales, funcionales y de seguridad, conforme a las especificaciones técnicas definidas y a la normativa vigente.

- Fortalecer la prestación de los servicios deportivos, recreativos, culturales y comunitarios, mediante la optimización de los espacios intervenidos, asegurando su adecuada operatividad, accesibilidad y uso continuo por parte de la comunidad, en cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo municipal.

- Contribuir al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo "Por la Dignidad de Arcabuco", específicamente las relacionadas con la realización de dos (2) mejoramientos y/o adecuaciones a escenarios deportivos y recreativos durante el periodo de gobierno, así como la garantía del funcionamiento anual de la biblioteca municipal, promoviendo el bienestar social, la integración ciudadana y el acceso a la cultura.

5. LUGAR DE EJECUCION

La realización de los trabajos se lleva a cabo en el área urbana del municipio de arcabuco – Boyacá.

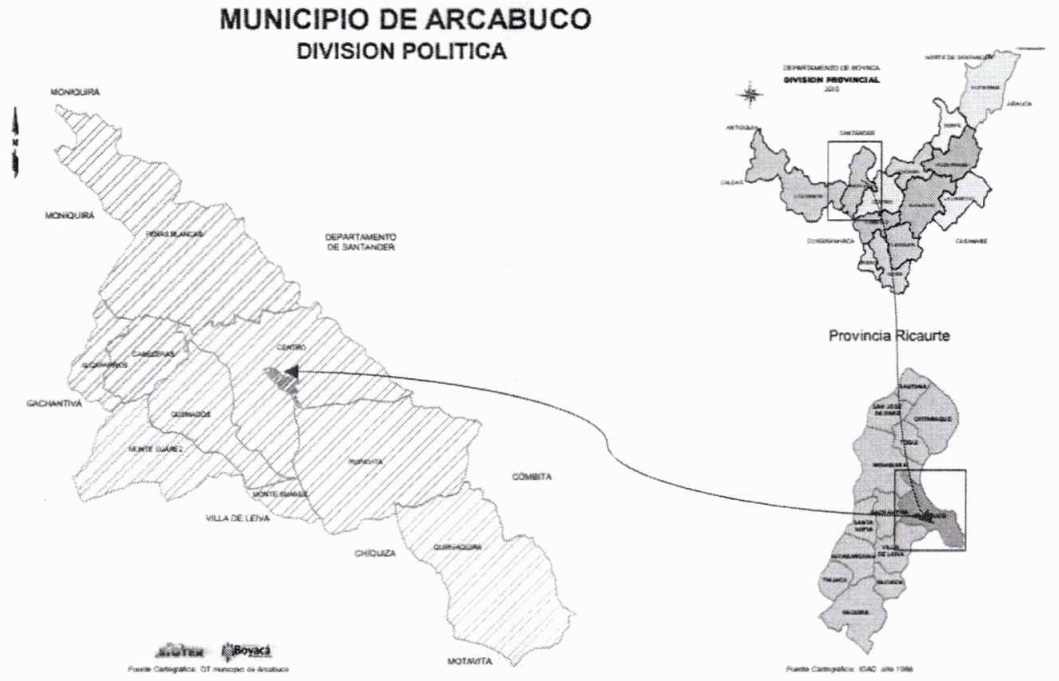


Imagen 1: municipio de Arcabuco

6. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

6.1. PRESUPUESTO DEL CONTRATO

El valor del presupuesto del presente contrato es: ***TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIETNOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 31.451.274,36)***, representado en los siguientes items y cantidades:

CONDICIONES ORIGANLES DEL CONTRATO					
Capitulo o -Ítem	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**MANTENIMIENTO BIBLIOTECA**				**$13.153.554,00**
1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	188,65	$10.744,00	$2.026.856,00
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O	M2	40,24	$18.832,00	$757.800,00

	SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS				
1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	312,6	$7.815,00	$2.442.969,00
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	1	$124.299,00	$124.299,00
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UND	2	$19.667,00	$39.334,00
1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	M2	10,2	$65.626,00	$669.385,00
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	2	$675.698,00	$1.351.396,00
1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	UND	2	$612.284,00	$1.224.568,00
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM	M2	18	$115.412,00	$2.077.416,00
1,10	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	6	$35.108,00	$210.648,00
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA SOBRE LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE E= 10 MM.	M2	5	$222.507,00	$1.112.535,00
1,12	PARED EN CERAMICA	M2	12,88	$86.673,00	$1.116.348,00
2	**PISTA DE PATINAJE**				**$24.684.778,00**
2,01	DEMARCACION DE LINEA INTERNA EN PINTURA TIPO TRAFICO ANTIDESLIZANTE PARA CANCHAS PISTA DE PATINAJE, E=0.12	ML	204	$8.704,00	$1.775.616,00
2,02	PINTURA EN ESMALTE PARA EL CERRAMIENTO METALICO DE LA PISTA DE PATINAJE INCL. ANTICORROSIVO.	ML	1167,3	$7.814,00	$9.121.282,00
2,03	PINTURA EN ESAMALTE PARA LAS COLUMNAS Y VIGAS DE LA CUBIERTA DE LA GRADERIA EN LA PISTA	M2	217,76	$20.220,00	$4.403.107,00

	DE PATINAJE INC. ANTICORROSIVO				
2,04	PINTURA EN TRAFICO PARA GRADERIA PISTA DE PATINAJE (2 MANOS)	M2	97,7	$22.430,00	$2.191.411,00
2,05	SUMINISTRO DE TABLA TIPO CARROCERIA DE L: 2M, E: 0.08 M, INCLUYE TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA	UND	58	$26.885,00	$1.559.330,00
2,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	235,2	$10.081,00	$2.371.051,00
2,07	APLIACION DE SOLDADURAS 6013 PARA REPARACION DE FISURAS	KG	10	$55.100,00	$551.000,00
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	49,68	$18.832,00	$935.574,00
2,09	COMBO SANITARIO COMPLETO, INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS	UND	2	$675.698,00	$1.351.396,00
2,10	INSTALACION DE LAMINA METALICA DE CALIBRE 22 PARA PROTECCION DE VENTANAS	M2	1,8	$236.117,00	$425.011,00
3	**CIC**				**$10.575.720,00**
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN NAYLON RETORCIDO, TEJIDO EN CUADROS DE 10 CM	M2	351	$20.000,00	$7.020.000,00
3,02	SUMINISTRO E INTALACION DE GUAYA DE 3/8" PARA INSTALACION DE MALLA EN NAYLON	ML	140	$25.398,00	$3.555.720,00
Total, costos directos					**$48.414.052,00**
		Administración		22%	$10.651.091,00
		Imprevistos		3%	$1.452.422,00
		Utilidad		5%	$2.420.703,00
		SUBTOTAL AIU		30%	$14.524.216,00
Costo total obra					**$62.938.268,00**

7. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.

Durante la ejecución del contrato fue necesario el análisis, aprobación y formalización del acta de modificación de cantidades de obra, motivado por lo expuesto en el oficio de fecha 12 de diciembre de 2025, donde se hace la

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

solicitud y explicación de las razones que dieron origen a las modificaciones de cantidades.

Las cantidades actualizadas son las siguientes:

SABANA DE MODIFICACION DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO N° SAMC-MA-012-2025												
CONDICIONES ORIGANLES DEL CONTRATO						MODIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CANTIDADES ACTUALZIADAS	
Capitulo o -Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDAD	VALOR TOTAL
						CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL		
1	**MANTENIMIENTO BIBLIOTECA**				**$13.153.554,00**		**$5.783.756,00**		**-$5.783.756,00**		**$13.153.554,00**
1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	188,65	$10.744,00	$2.026.856,00			-90,21	-$969.217,00	98,44	$1.057.639,00
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	40,24	$18.832,00	$757.800,00	16,57	$312.046,00			56,81	$1.069.846,00
1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	312,6	$7.815,00	$2.442.969,00	578,14	$4.518.164,00			890,74	$6.961.133,00
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	1	$124.299,00	$124.299,00					1,00	$124.299,00
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UND	2	$19.667,00	$39.334,00					2,00	$39.334,00
1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	M2	10,2	$65.626,00	$669.385,00	14,53	$953.546,00			24,73	$1.622.931,00
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	2	$675.698,00	$1.351.396,00			-1,00	-$675.698,00	1,00	$675.698,00
1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	UND	2	$612.284,00	$1.224.568,00			-2,00	-$1.224.568,00	0,00	$0,00
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM	M2	18	$115.412,00	$2.077.416,00			-6,07	-$700.551,00	11,93	$1.376.865,00
1,10	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	6	$35.108,00	$210.648,00			-6,00	-$210.648,00	0,00	$0,00
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA SOBRE LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE E= 10 MM.	M2	5	$222.507,00	$1.112.535,00			-3,99	-$886.726,00	1,01	$225.809,00
1,12	PARED EN CERAMICA	M2	12,88	$86.673,00	$1.116.348,00			-12,88	-$1.116.348,00	0,00	$0,00
2	**PISTA DE PATINAJE**				**$24.684.778,00**		**$2.371.051,00**		**-$1.609.111,00**		**$25.446.718,00**
2,01	DEMARCACION DE LINEA INTERNA EN PINTURA TIPO TRAFICO ANTIDESLIZANTE PARA CANCHAS PISTA DE PATINAJE, E=0,12	ML	204	$8.704,00	$1.775.616,00					204,00	$1.775.616,00
2,02	PINTURA EN ESMALTE PARA EL CERRAMIENTO METALICO DE LA PISTA DE PATINAJE INCL. ANTICORROSIVO.	ML	1167,3	$7.814,00	$9.121.282,00					1167,30	$9.121.282,00
2,03	PINTURA EN ESAMALTE PARA LAS COLUMNAS Y VIGAS DE LA CUBIERTA DE LA GRADERIA EN LA PISTA DE PATINAJE INC. ANTICORROSIVO	M2	217,76	$20.220,00	$4.403.107,00			-41,26	-$834.277,00	176,50	$3.568.830,00
2,04	PINTURA EN TRAFICO PARA GRADERIA PISTA DE PATINAJE (2 MANOS)	M2	97,7	$22.430,00	$2.191.411,00			-7,47	-$167.552,00	90,23	$2.023.859,00
2,05	SUMINISTRO DE TABLA TIPO CARROCERIA DE L: 2M, E: 0.08 M, INCLUYE TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA	UND	58	$26.885,00	$1.559.330,00					58,00	$1.559.330,00
2,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	235,2	$10.081,00	$2.371.051,00	235,20	$2.371.051,00			470,40	$4.742.102,00
2,07	APLIACION DE SOLDADURAS 6013 PARA REPARACION DE FISURAS	KG	10	$55.100,00	$551.000,00			-6,00	-$330.600,00	4,00	$220.400,00
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	49,68	$18.832,00	$935.574,00			-14,69	-$276.682,00	34,99	$658.892,00
2,09	COMBO SANITARIO COMPLETO, INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS	UND	2	$675.698,00	$1.351.396,00					2,00	$1.351.396,00
2,10	INSTALACION DE LAMINA METALICA DE CALIBRE 22 PARA PROTECCION DE VENTANAS	M2	1,8	$236.117,00	$425.011,00					1,80	$425.011,00
3	**CIC**				**$10.575.720,00**		**$0,00**		**-$761.940,00**		**$9.813.780,00**
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN NAYLON	M2	351	$20.000,00	$7.020.000,00					351	$7.020.000,00

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

	RETORCIDO, TEJIDO EN CUADROS DE 10 CM										
3,02	SUMINISTRO E INTALACION DE GUAYA DE 3/8" PARA INSTALACION DE MALLA EN NAYLON	ML	140	$25.398,00	$3.555.720,00			-30,00	-$761.940,00	110	$2.793.780,00
Total costos directos					$48.414.052,00		$8.154.807,00		-$8.154.807,00		$48.414.052,00
		Administración	22%		$10.651.091,00		$1.794.058,00		-$1.794.058,00		$10.651.091,00
		Imprevistos	3%		$1.452.422,00		$244.644,00		-$244.644,00		$1.452.422,00
		Utilidad	5%		$2.420.703,00		$407.740,00		-$407.740,00		$2.420.703,00
		SUBTOTAL AIU	30%		$14.524.216,00		$2.446.442,00		-$2.446.442,00		$14.524.216,00
Costo total obra					$62.938.268,00		$10.601.249,00		-$10.601.249,00		$62.938.268,00

8. RELACION DE POLIZAS DEL CONTRATO

pólizas actualizadas según Acta de inicio del 13 de noviembre de 2025.

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL					
ANEXO	**N° DE POLIZA**	**CONCEPTO**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**	**VALOR ASEGURADO/ ACTUAL**
2	**39-46-101017478**	Cumplimiento del contrato	13/11/2025	10/05/2026	$ 6.293.826,80
		Estabilidad y calidad de la obra	Si ampara 2 años, 0 meses 1 días.		$ 6.293.826,80
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	13/11/2025	08/01/2029	$ 12.587.653,60
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.					
2	**39-54-101002921**	Predios labores y operaciones	13/11/25	09/01/2025	$ 284.700.000,00

9. BALANCE FINACIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL		
RELACION ACTAS PARCIALES	**DEBITO**	**CRÉDITO**
VALOR CONTRATO	$ 62.938.268,00	
VR. A COBRAR ACTA DE RECCIBO FINAL		**$ 62.938.268,00**
VALOR POR EJECUTAR		$ 00,00
SUMAS IGUALES	**$ 62.938.268,00**	**$ 62.938.268,00**

10. EQUIPO Y PERSONAL PARA EL PROYECTO

PERSONAL EN OBRA

- DIRECTOR DE OBRA
- RESIDENTE DE OBRA

- PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
- MAESTRO DE OBRA

11. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Para la ejecución del contrato se efectuaron las siguientes actividades de carácter administrativo:

- Elaboración de propuesta económica
- Afiliación del personal al sistema de seguridad social
- Recopilación de información y elaboración de informes

12. RELACION DE DOCUMENTOS SUSCRITOS

FECHA	ACTA/DOCUMENTO	OBSERVACIONES
Cinco (05) de diciembre de 2025.	CONTRATO	Se firma por quienes intervienen Elaborado por la entidad
Trece (13) de diciembre de 2025.	ACTA DE INICIO	Se firma por quienes intervienen Elaborado por la entidad

13. EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

A continuación, se presenta la descripción técnica detallada del proceso de ejecución de cada una de las actividades desarrolladas, conforme a las condiciones reales de las instalaciones intervenidas.

ÍTEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
1	MANTENIMINETO DE BIBLIOTECA	
1.01	Suministro e instalación de vinilo tipo I sobre pañete o estuco a tres manos	Se realizó la preparación de superficies mediante limpieza mecánica y corrección de imperfecciones menores en muros en bloque a la vista y zonas en placa. Posteriormente se aplicó sellador cuando fue requerido y se procedió a la aplicación de pintura vinilo tipo I en tres manos uniformes, respetando los tiempos de secado entre capas, logrando una terminación homogénea y conforme al color autorizado por la supervisión.

1.02	Suministro e instalación de pintura Koraza o similar para fachadas tres manos	En fachadas exteriores se efectuó limpieza, resane y verificación de adherencia del sustrato. Se aplicó pintura tipo Koraza o equivalente en tres manos continuas, garantizando resistencia a la intemperie y adecuada protección de los muros exteriores de la biblioteca.
1.03	Suministro e instalación de esmalte lámina lineal tres manos	Los elementos metálicos y superficies en lámina fueron lijados para eliminar óxido y contaminantes. Se aplicó una mano base cuando fue necesario y posteriormente tres manos de esmalte lámina lineal, asegurando cubrimiento uniforme y protección anticorrosiva.
1.04	Suministro e instalación de cerradura doble cilindro tipo Yale 105 o similar	Se desmontó la cerradura existente, se verificaron medidas y alineación de la puerta, y se instaló cerradura doble cilindro tipo Yale 105 o similar, asegurando correcto funcionamiento mecánico y condiciones de seguridad para la biblioteca.
1.05	Suministro e instalación de tomacorriente doble monofásico	Se realizó la adecuación del punto eléctrico, verificación de conductores, instalación de caja y tomacorriente doble monofásico, garantizando correcta polaridad, fijación y cumplimiento de normas eléctricas vigentes.
1.06	Suministro e instalación de manto asfáltico de 3 mm para impermeabilizaciones	En la viga canal posterior se efectuó limpieza profunda, secado y aplicación de imprimante asfáltico. Posteriormente se instaló manto asfáltico de 3 mm mediante termofusión en toda el área, asegurando traslapos adecuados y continuidad del sistema impermeabilizante.
1.07	Suministro e instalación de combo sanitario (no incluye griferías y accesorios)	Se desmontó el sanitario existente, se adecuaron puntos hidráulicos y sanitarios y se instaló el nuevo combo sanitario, verificando correcta nivelación, fijación y evacuación.
1.08	Suministro e instalación de sanitario infantil	No se ejecuta la actividad

1.09	Suministro e instalación de cubierta en teja de policarbonato alveolar de 8 mm	Se verificó la estructura de soporte, se instalaron las tejas de policarbonato alveolar de 8 mm con fijaciones adecuadas, sellos y traslapos, garantizando iluminación natural y protección contra la intemperie.
1.10	Demolición de mesón en concreto	No se ejecuta la actividad
1.11	Suministro e instalación de teja de barro tipo española sobre lámina de fibrocemento	Se verificó la base en lámina de fibrocemento, se instalaron las tejas de barro tipo española respetando alineación, pendientes y traslapos, garantizando estanqueidad y estabilidad.
1.12	Pared en cerámica	No se ejecuta la actividad
2	**PISTA DE PATINAJE**	
2.01	Demarcación de línea interna en pintura tipo tráfico antideslizante	En la pista de patinaje se efectuó limpieza de la superficie y se aplicó pintura tipo tráfico antideslizante para demarcación interna, cumpliendo dimensiones reglamentarias.
2.02	Pintura en esmalte para cerramiento metálico de la pista	El cerramiento en tubo metálico fue lijado, limpiado y pintado con esmalte anticorrosivo, garantizando protección y acabado uniforme.
2.03	Pintura en esmalte para columnas y vigas de la cubierta	Se realizó mantenimiento de pintura en columnas y vigas de la estructura de cubierta y graderías, aplicando esmalte con propiedades anticorrosivas.
2.04	Pintura en tráfico para gradería pista de patinaje (2 manos)	Las graderías fueron limpiadas y se aplicaron dos manos de pintura tipo tráfico, mejorando visibilidad y durabilidad.
2.05	Suministro de tabla tipo carrocería	Se suministraron e instalaron tablas tipo carrocería en el cerramiento, fijadas con tornillería de 3" con arandela y tuerca, asegurando rigidez y alineación.
2.06	Suministro e instalación de esmalte madera lineal tres manos	Las tablas de madera fueron lijadas y protegidas mediante la aplicación de tres manos de esmalte para madera, aumentando su vida útil.
2.07	Aplicación de soldaduras 6013 para reparación de fisuras	Se realizó soldadura con electrodo 6013 en puntos fisurados del cerramiento y

		estructura metálica, garantizando continuidad estructural.
2.08	Pintura Koraza o similar para fachadas tres manos	Se ejecutó pintura exterior en zonas del patinódromo con Koraza o similar, previa preparación de superficies.
2.09	Combo sanitario completo, incluye griferías y accesorios	En el patinódromo se realizó el reemplazo del combo sanitario completo, incluyendo griferías y accesorios, verificando funcionamiento hidráulico.
2.10	Instalación de lámina metálica calibre 22 para protección de ventanas	Se instalaron láminas metálicas calibre 22 en ventanas, fijadas mecánicamente para protección y seguridad.
3	**C.I.C.**	
3.01	Suministro e instalación de malla en nylon retorcido	En el C.I.C. se instaló malla en nylon retorcido, tejida en cuadros de 10 cm, como sistema de contención, asegurada a la estructura existente.
3.02	Suministro e instalación de guaya de 3/8"	Se instaló guaya de 3/8" como elemento de soporte y tensión para la malla de nylon, garantizando estabilidad y resistencia del sistema.

14. CONTRATIEMPOS Y/O ATRASOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

A la fecha se presenta un avance de ejecución del 100 % respecto del valor total del contrato.

Dentro de las actividades ejecutadas no se han presentado contratiempos ni atrasos, si bien ha surgido situaciones, se han solucionado de manera puntual y efectiva con el fin de dar continuidad y termino a satisfacción al alcance del contrato.

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. La ejecución de las actividades contempladas en el contrato se desarrolló de manera satisfactoria, permitiendo dar cumplimiento integral al objeto y alcance contractual, conforme a las especificaciones técnicas, cronograma establecido y lineamientos impartidos por la supervisión. Los trabajos realizados en la biblioteca municipal, el patinódromo y el Centro de Integración Ciudadana se ejecutaron bajo procedimientos técnicos adecuados, garantizando la correcta aplicación de materiales, la calidad de los acabados y el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas.

B. Las intervenciones ejecutadas contribuyeron de manera significativa al mejoramiento de las condiciones físicas, funcionales y de seguridad de las instalaciones, optimizando su operatividad y prolongando la vida útil de la infraestructura existente. En la biblioteca municipal se logró la recuperación de muros, columnas y zonas en placa mediante sistemas de pintura autorizados, la adecuación del área de baños con el reemplazo de elementos sanitarios y la impermeabilización integral de la viga canal posterior, mitigando riesgos de filtraciones y deterioro estructural.
C. En el patinódromo municipal se efectuó el mantenimiento del cerramiento, la estructura de cubierta y las graderías, incluyendo reparaciones estructurales, aplicación de soldaduras, sistemas de pintura anticorrosiva y demarcaciones reglamentarias en la pista, mejorando las condiciones de uso, seguridad y presentación del escenario deportivo. Así mismo, se realizó el reemplazo del combo sanitario completo, garantizando servicios adecuados para los usuarios y el correcto funcionamiento de las instalaciones complementarias.
D. Finalmente, en el Centro de Integración Ciudadana se ejecutó la instalación de malla en nylon con su respectivo sistema de sujeción y tensión, mejorando el control, la contención y la seguridad del espacio intervenido. En conjunto, las actividades desarrolladas permitieron fortalecer los espacios deportivos, culturales y comunitarios del municipio, contribuyendo al cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo "Por la Dignidad de Arcabuco" y asegurando una inversión eficiente y responsable de los recursos públicos.

Presenta;

CARLOS HOLMER ALVIS MENDOZA
R.L. DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATISTA

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

16. SABANA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES

SABANA DE EJECUCION DE CANTIDADES DE OBRA CONTRATO Nº SAMC-MA-012-2025													Porcentaje Ejecuatdo	100,0%
CONDICIONES ORIGANLES DEL CONTRATO						MODIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA				CANTIDADES ACTUALZIADAS		CANTIDADES EJECUTADAS		
Capitulo o -Item	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	MAYORES CANTIDADES		MENORES CANTIDADES		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
						CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL				
1	**MANTENIMIENTO BIBLIOTECA**				**$13.153.554,00**		**$5.783.756,00**		**-$5.783.756,00**		**$13.153.554,00**		**$13.153.554,00**
1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	188,65	$10.744,00	$2.026.856,00			-90,21	-$969.217,00	98,44	$1.057.639,00	98,44	$1.057.639,00
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	40,24	$18.832,00	$757.800,00	16,57	$312.046,00			56,81	$1.069.846,00	56,81	$1.069.846,00
1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	312,6	$7.815,00	$2.442.969,00	578,14	$4.518.164,00			890,74	$6.961.133,00	890,74	$6.961.133,00
1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	1	$124.299,00	$124.299,00					1,00	$124.299,00	1,00	$124.299,00
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	UND	2	$19.667,00	$39.334,00					2,00	$39.334,00	2,00	$39.334,00
1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	M2	10,2	$65.626,00	$669.385,00	14,53	$953.546,00			24,73	$1.622.931,00	24,73	$1.622.931,00
1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	2	$675.698,00	$1.351.396,00			-1,00	-$675.698,00	1,00	$675.698,00	1,00	$675.698,00
1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	UND	2	$612.284,00	$1.224.568,00			-2,00	-$1.224.568,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM	M2	18	$115.412,00	$2.077.416,00			-6,07	-$700.551,00	11,93	$1.376.865,00	11,93	$1.376.865,00
1,10	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	6	$35.108,00	$210.648,00			-6,00	-$210.648,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA SOBRE LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE E= 10 MM.	M2	5	$222.507,00	$1.112.535,00			-3,99	-$886.726,00	1,01	$225.809,00	1,01	$225.809,00
1,12	PARED EN CERAMICA	M2	12,88	$86.673,00	$1.116.348,00			-12,88	-$1.116.348,00	0,00	$0,00	0,00	$0,00
2	**PISTA DE PATINAJE**				**$24.684.778,00**		**$2.371.051,00**		**-$1.609.111,00**		**$25.446.718,00**		**$25.446.718,00**
2,01	DEMARCACION DE LINEA INTERNA EN PINTURA TIPO TRAFICO ANTIDESLIZANTE PARA CANCHAS PISTA DE PATINAJE, E=0.12	ML	204	$8.704,00	$1.775.616,00					204,00	$1.775.616,00	204,00	$1.775.616,00
2,02	PINTURA EN ESMALTE PARA EL CERRAMIENTO METALICO DE LA PISTA DE PATINAJE INCL. ANTICORROSIVO.	ML	1167,3	$7.814,00	$9.121.282,00					1167,30	$9.121.282,00	1167,30	$9.121.282,00
2,03	PINTURA EN ESAMALTE PARA LAS COLUMNAS Y VIGAS DE LA CUBIERTA DE LA GRADERIA EN LA	M2	217,76	$20.220,00	$4.403.107,00			-41,26	-$834.277,00	176,50	$3.568.830,00	176,50	$3.568.830,00

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

	PISTA DE PATINAJE INC. ANTICORROSIVO												
2,04	PINTURA EN TRAFICO PARA GRADERIA PISTA DE PATINAJE (2 MANOS)	M2	97,7	$22.430,00	$2.191.411,00			-7,47	-$167.552,00	90,23	$2.023.859,00	90,23	$2.023.859,00
2,05	SUMINISTRO DE TABLA TIPO CARROCERIA DE L: 2M, E: 0.08 M, INCLUYE TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA	UND	58	$26.885,00	$1.559.330,00					58,00	$1.559.330,00	58,00	$1.559.330,00
2,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	ML	235,2	$10.081,00	$2.371.051,00	235,20	$2.371.051,00			470,40	$4.742.102,00	470,40	$4.742.102,00
2,07	APLIACION DE SOLDADURAS 6013 PARA REPARACION DE FISURAS	KG	10	$55.100,00	$551.000,00			-6,00	-$330.600,00	4,00	$220.400,00	4,00	$220.400,00
2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	49,68	$18.832,00	$935.574,00			-14,69	-$276.682,00	34,99	$658.892,00	34,99	$658.892,00
2,09	COMBO SANITARIO COMPLETO, INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS	UND	2	$675.698,00	$1.351.396,00					2,00	$1.351.396,00	2,00	$1.351.396,00
2,10	INSTALACION DE LAMINA METALICA DE CALIBRE 22 PARA PROTECCION DE VENTANAS	M2	1,8	$236.117,00	$425.011,00					1,80	$425.011,00	1,80	$425.011,00
3	**CIC**				**$10.575.720,00**		**$0,00**		**-$761.940,00**		**$9.813.780,00**		**$9.813.780,00**
3,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN NAYLON RETORCIDO, TEJIDO EN CUADROS DE 10 CM	M2	351	$20.000,00	$7.020.000,00					351	$7.020.000,00	351,00	$7.020.000,00
3,02	SUMINISTRO E INTALACION DE GUAYA DE 3/8" PARA INSTALACION DE MALLA EN NAYLON	ML	140	$25.398,00	$3.555.720,00			-30,00	-$761.940,00	110	$2.793.780,00	110,00	$2.793.780,00
Total costos directos					**$48.414.052,00**		**$8.154.807,00**		**-$8.154.807,00**		**$48.414.052,00**		**$48.414.052,00**
	Administración	22%			$10.651.091,00		$1.794.058,00		-$1.794.058,00		$10.651.091,00		$10.651.091,00
	Imprevistos	3%			$1.452.422,00		$244.644,00		-$244.644,00		$1.452.422,00		$1.452.422,00
	Utilidad	5%			$2.420.703,00		$407.740,00		-$407.740,00		$2.420.703,00		$2.420.703,00
	SUBTOTAL AIU	30%			$14.524.216,00		$2.446.442,00		-$2.446.442,00		$14.524.216,00		$14.524.216,00
Costo total obra					**$62.938.268,00**		**$10.601.249,00**		$10.601.249,00		**$62.938.268,00**		**$62.938.268,00**

A la fecha se presenta un avance del 100 % de acuerdo la información antes relacionada y sustentada con las memorias de cantidades de obra adjuntas y que hacen parte integral de este informe.

El valor total ejecutado es de: SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE. **($62.938.268,00)**

DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES
R.L. CARLOS HOMER ALVIS MENDOZA
CONTRATISTA


ARQ. CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

ANEXO A. REGISTRO FOTOGRAFICO.

REGISTRO FOTOGRAFICO MANTENIMIENTO BIBLIOTECA

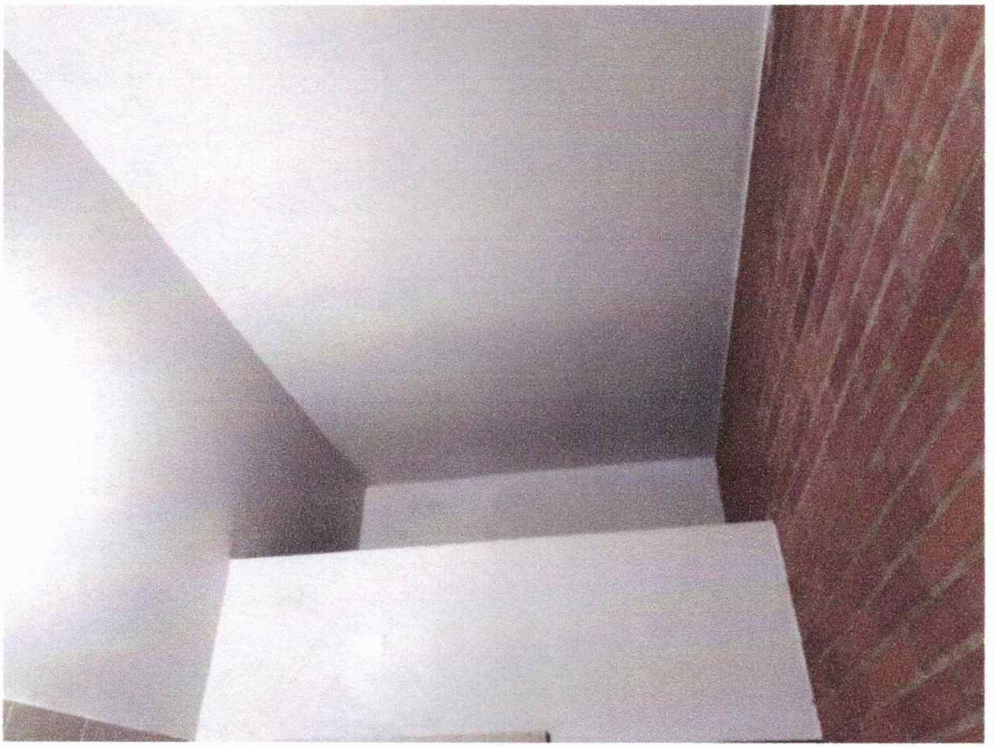





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES






CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



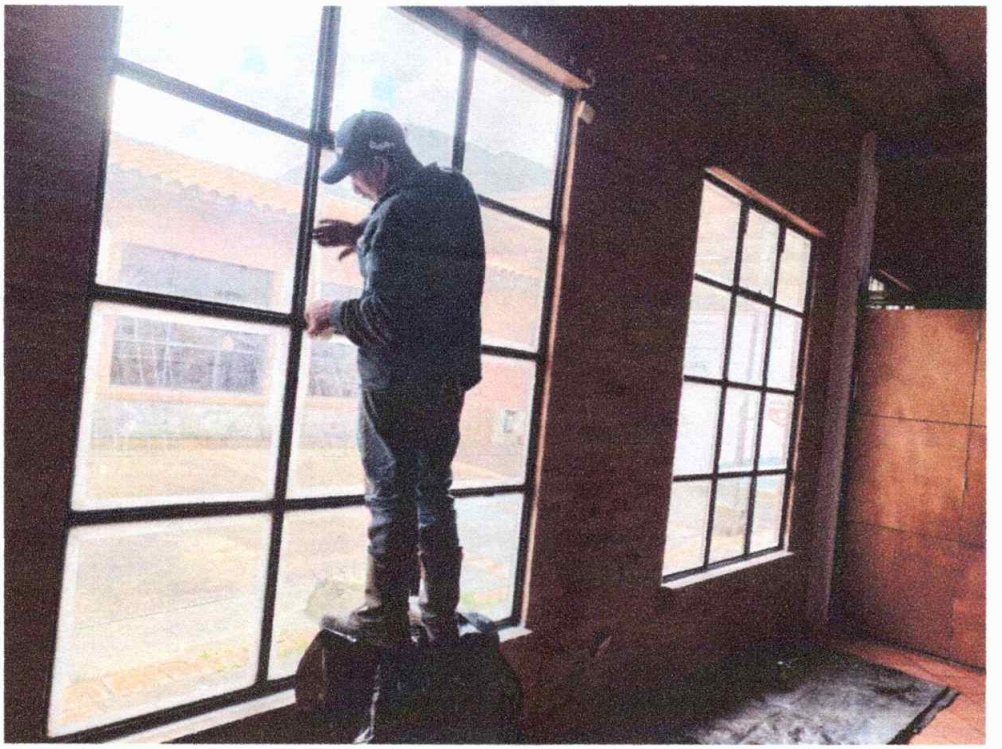

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES












CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560


DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

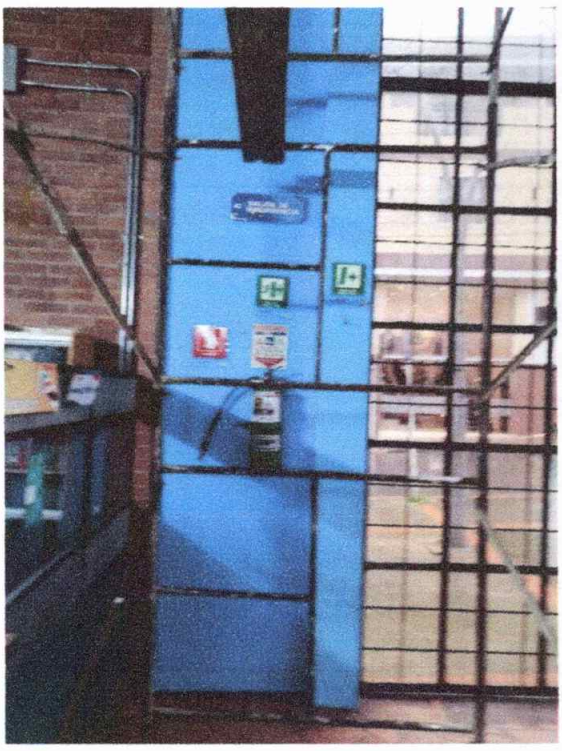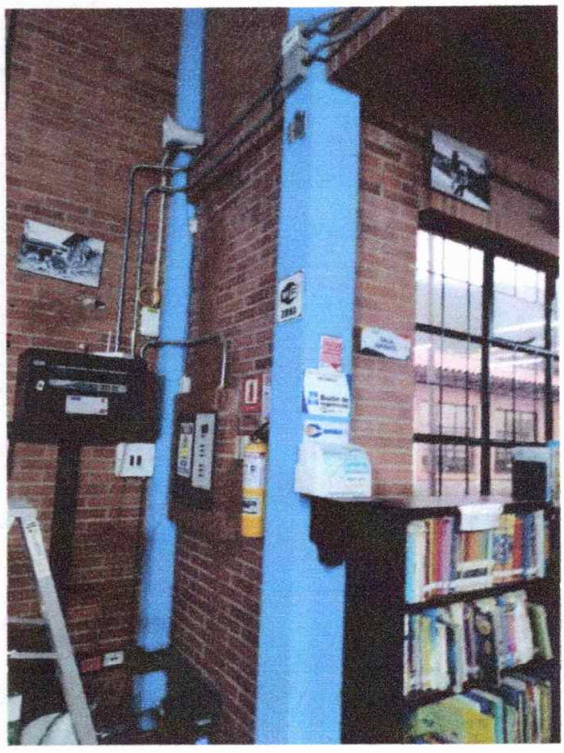


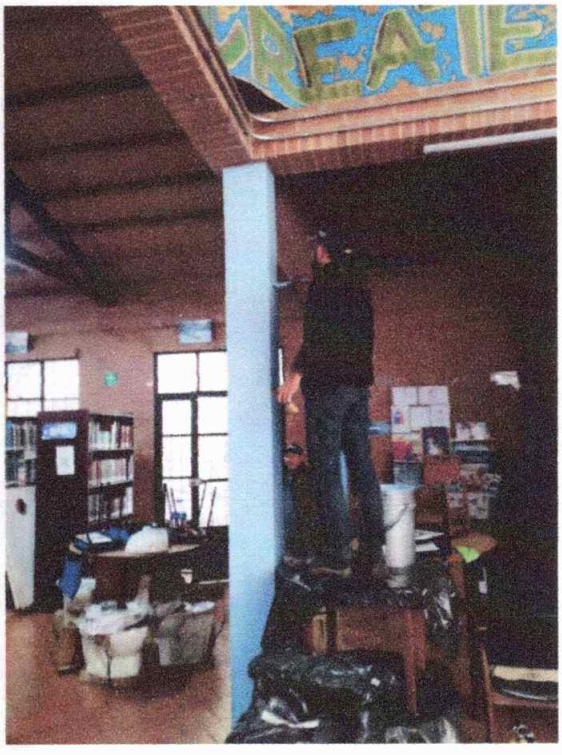CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



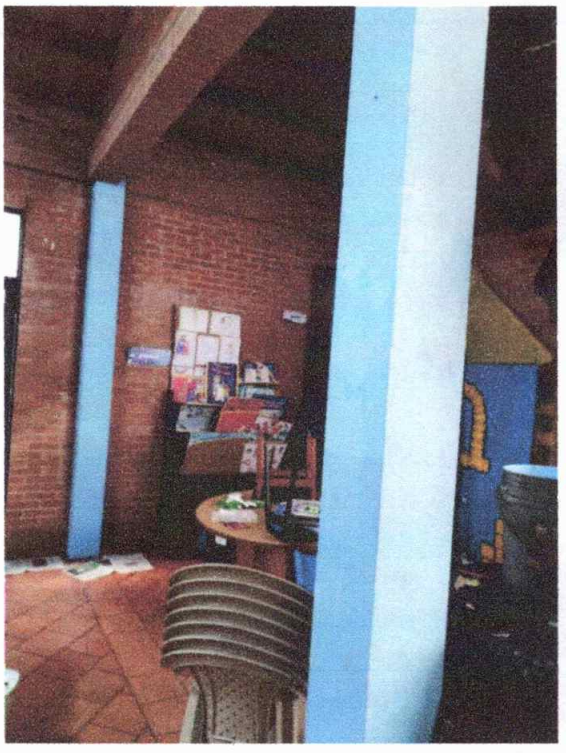


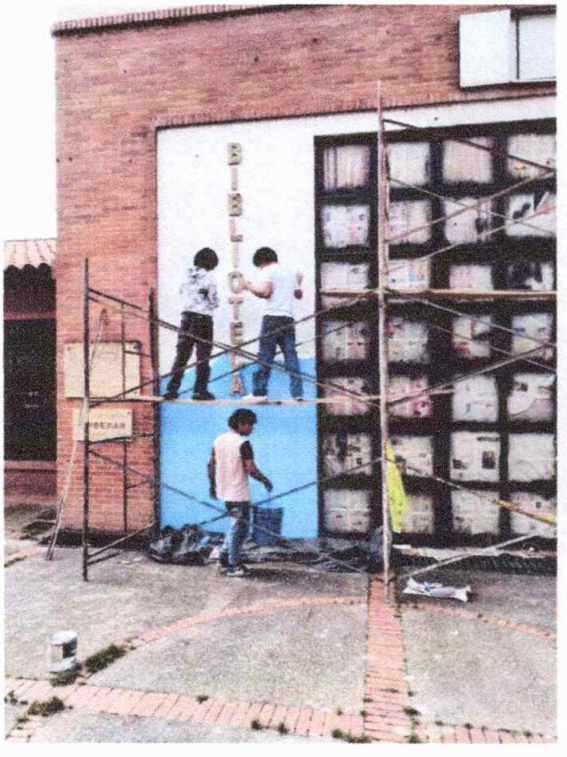





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

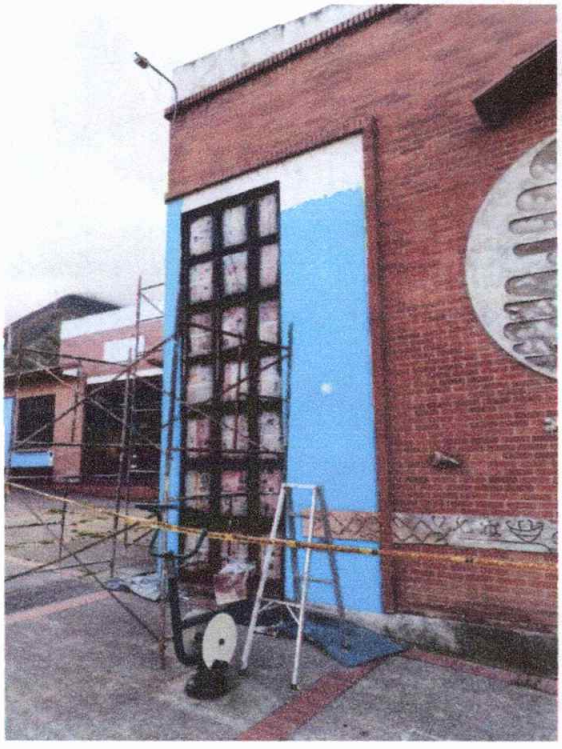

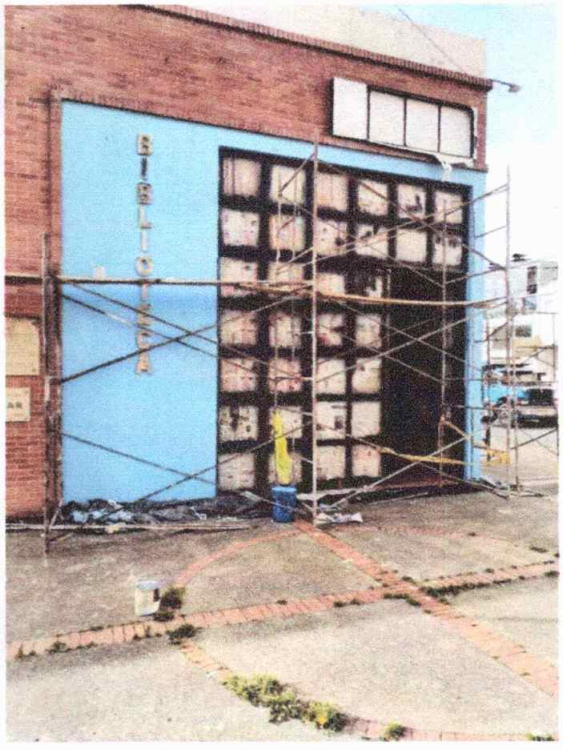


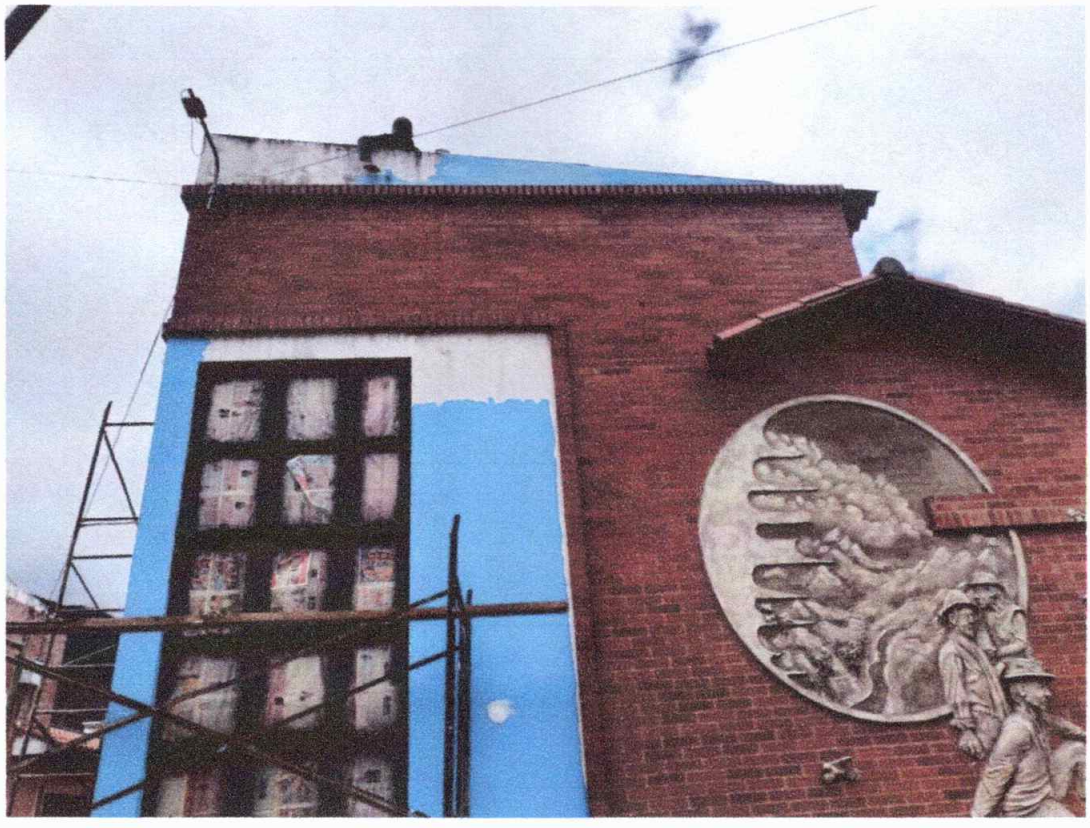

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



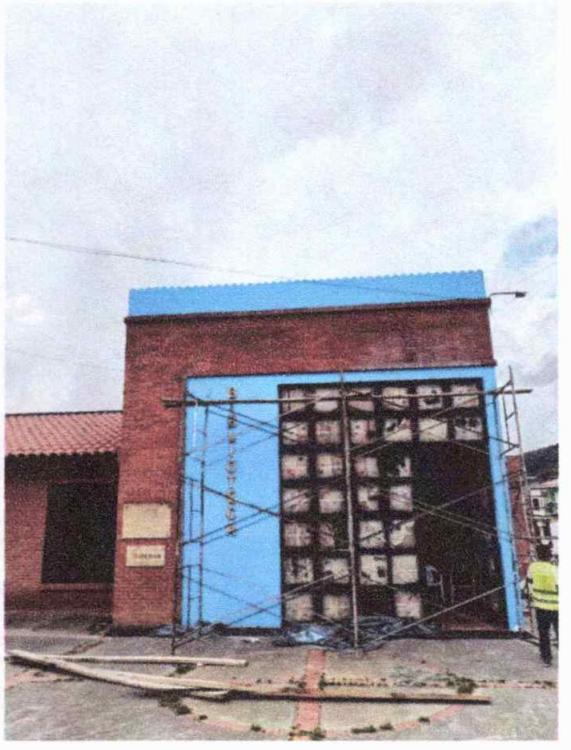



CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560


DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES




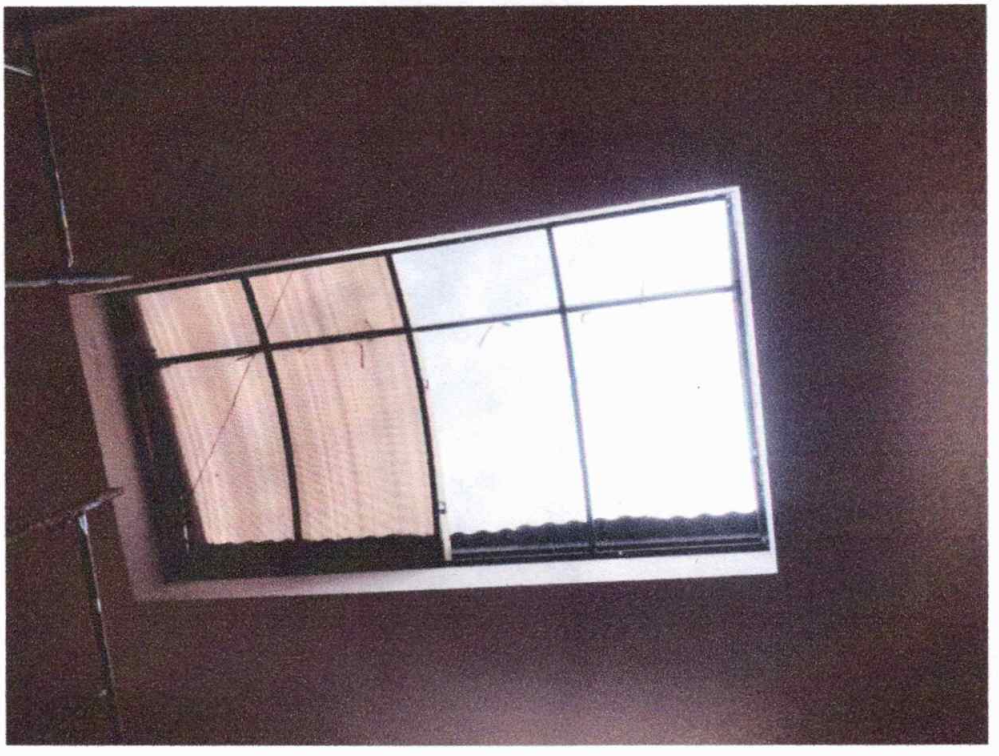

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES




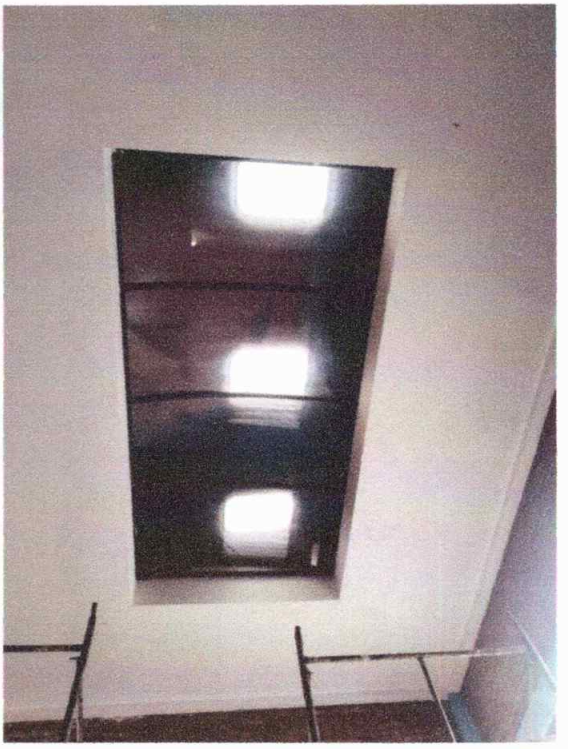





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

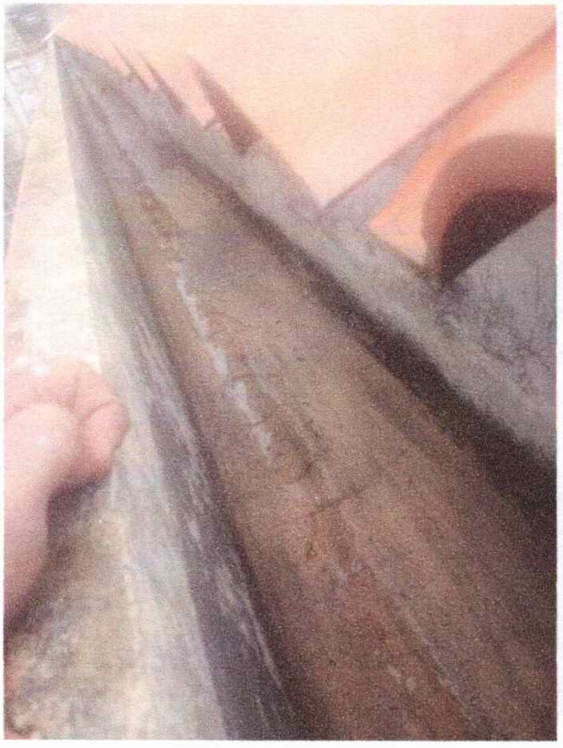

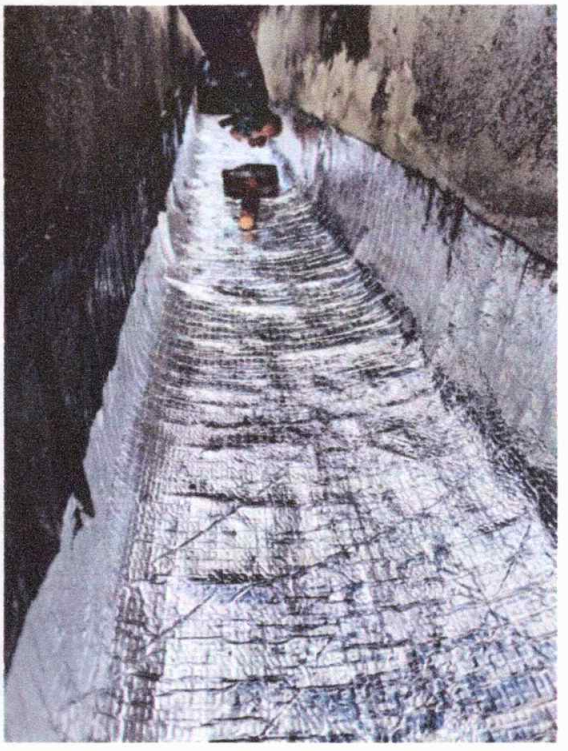




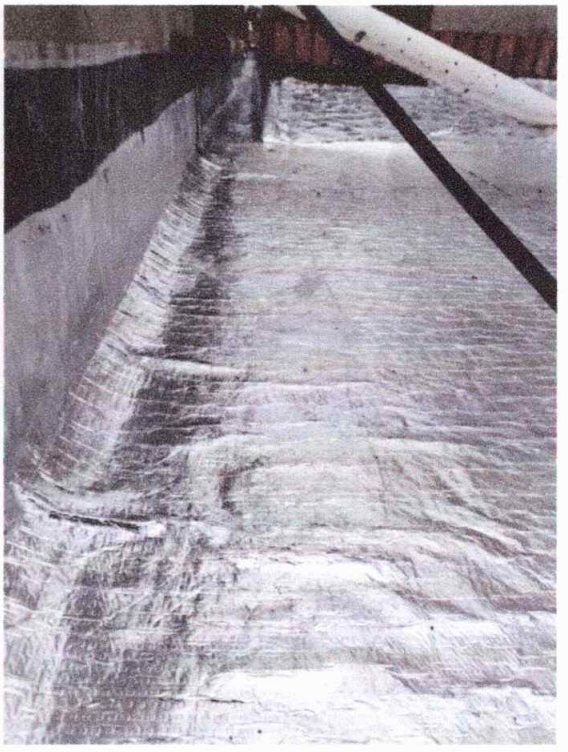

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES




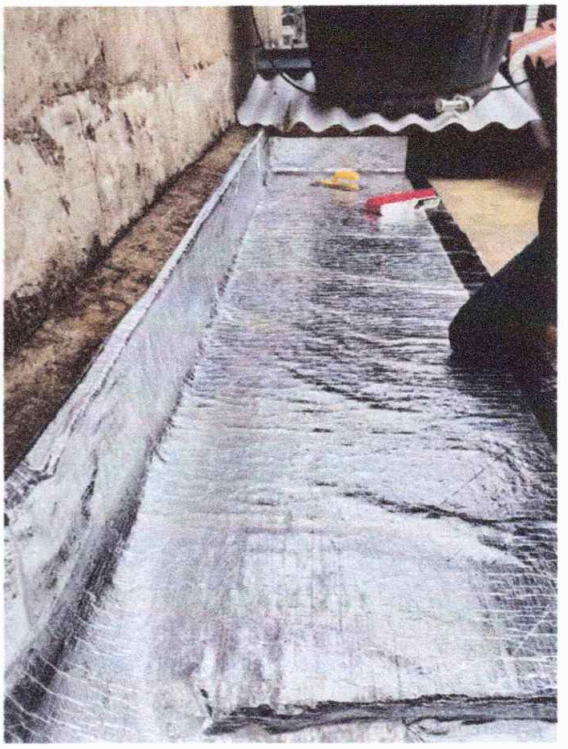


CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560


DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

MANTENIMINETO PISTA DE PATINAJE (PATINODROMO)

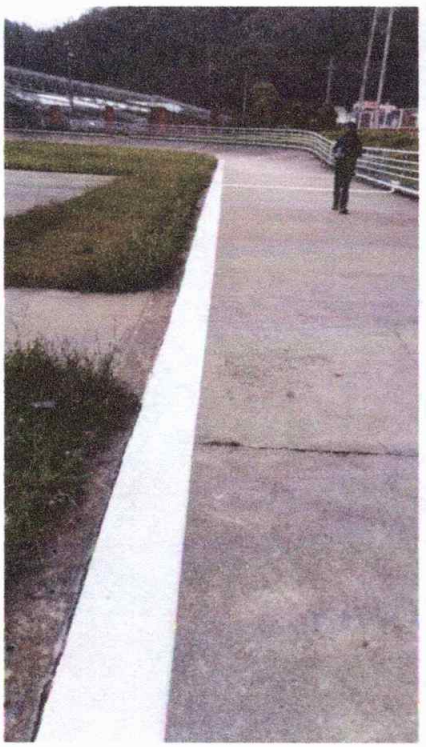



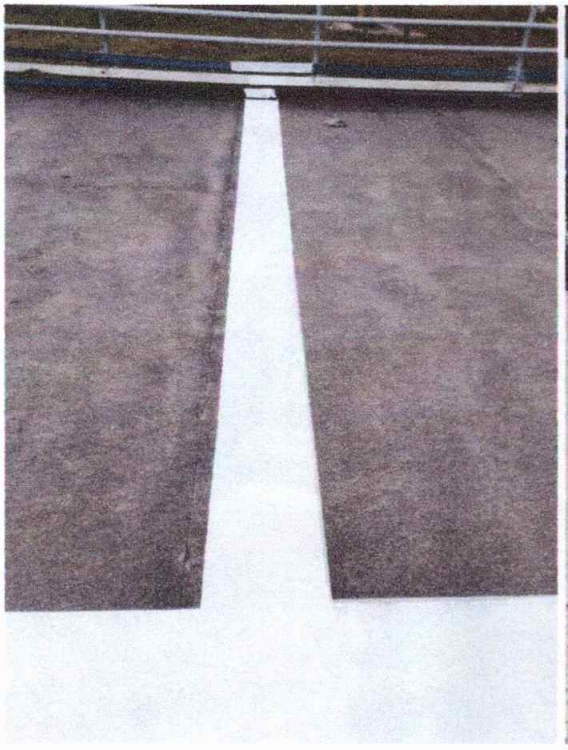

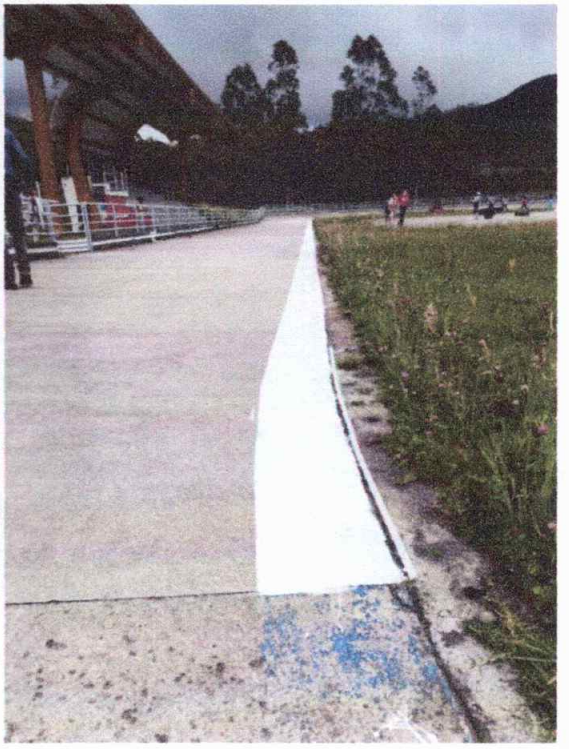

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES






CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560


DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES






CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

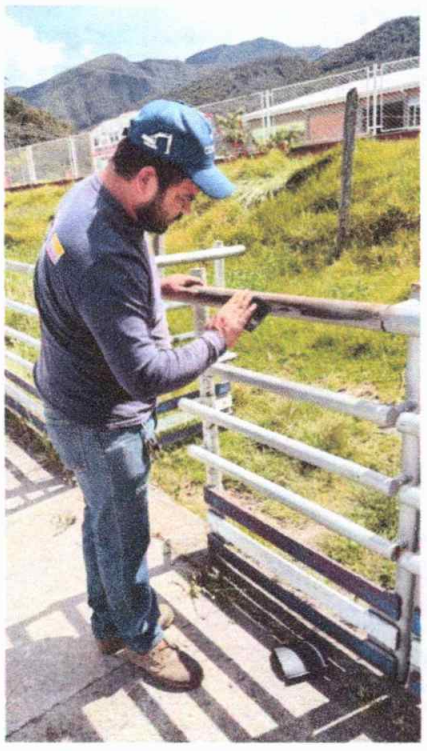






CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



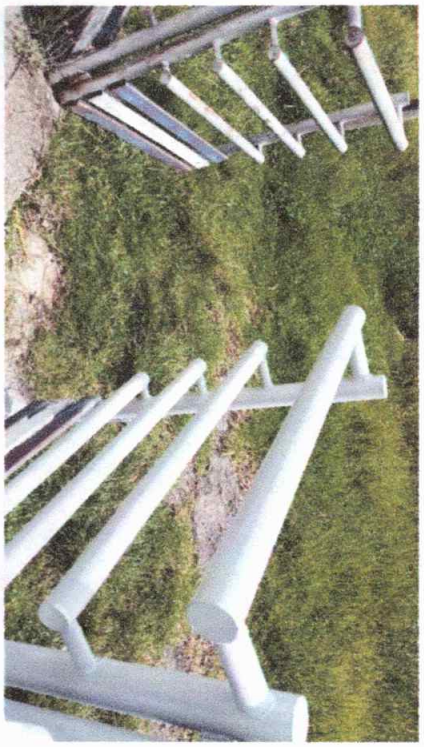






CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

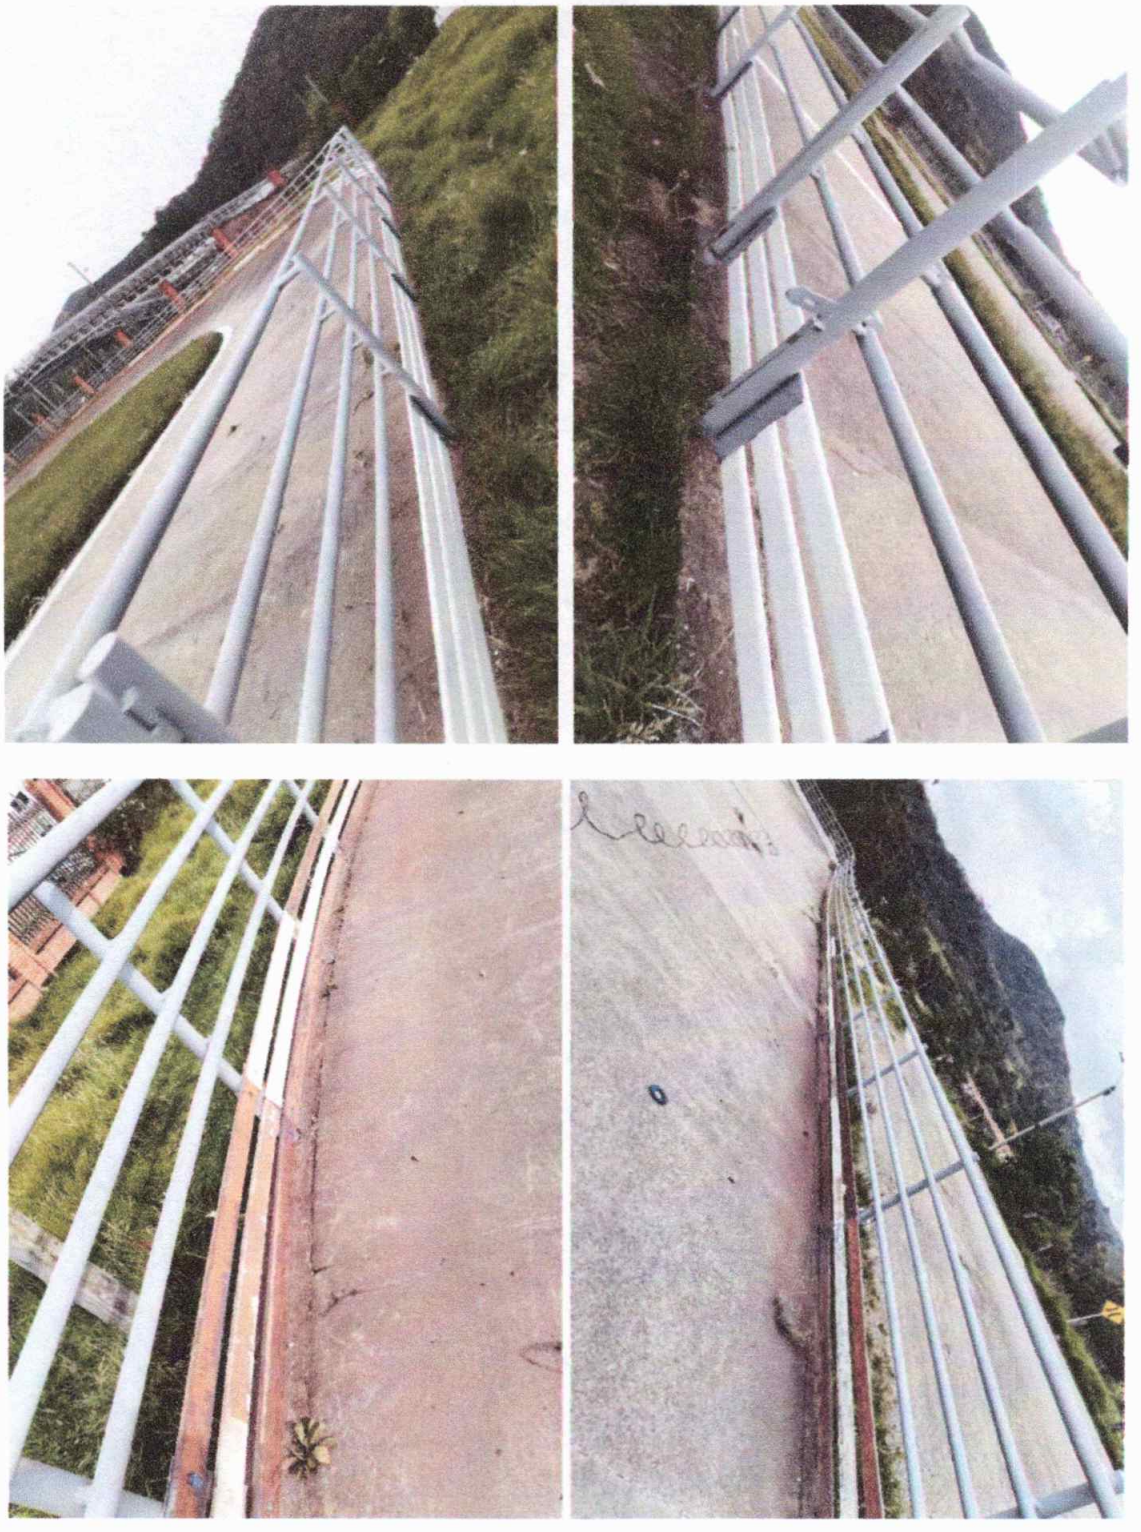

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560


DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

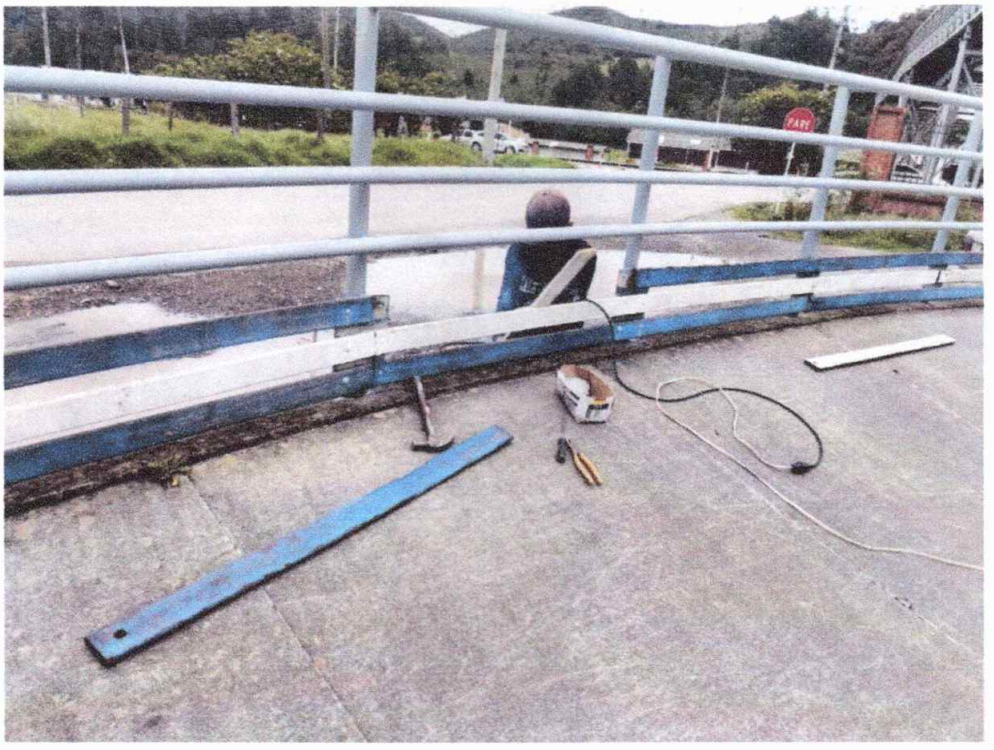



CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560


DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

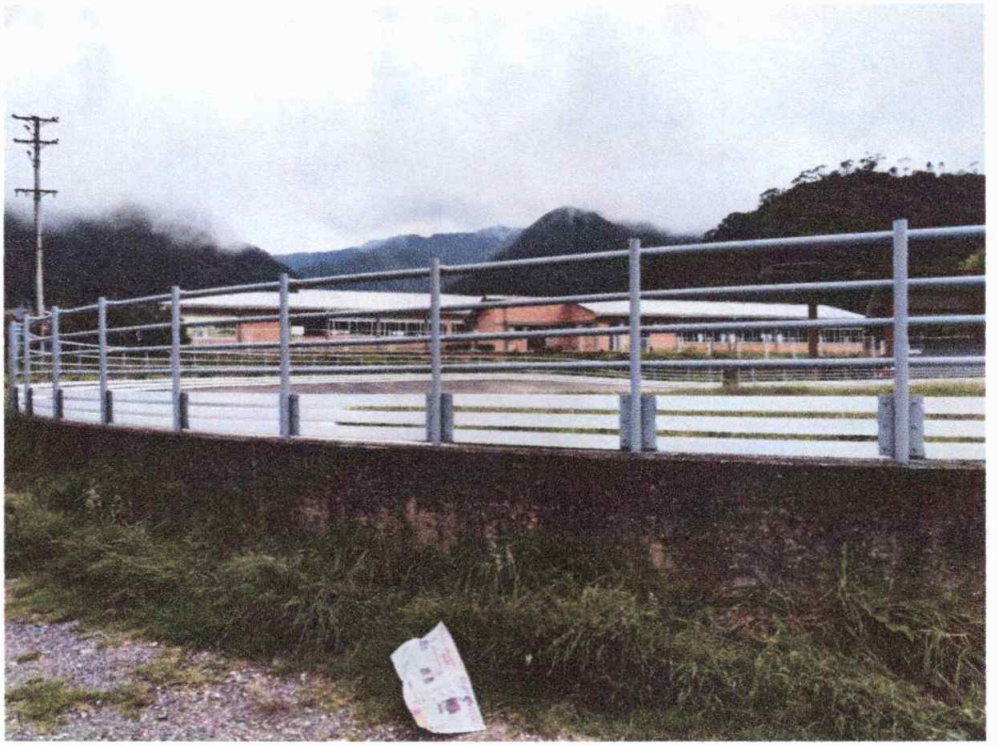





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES



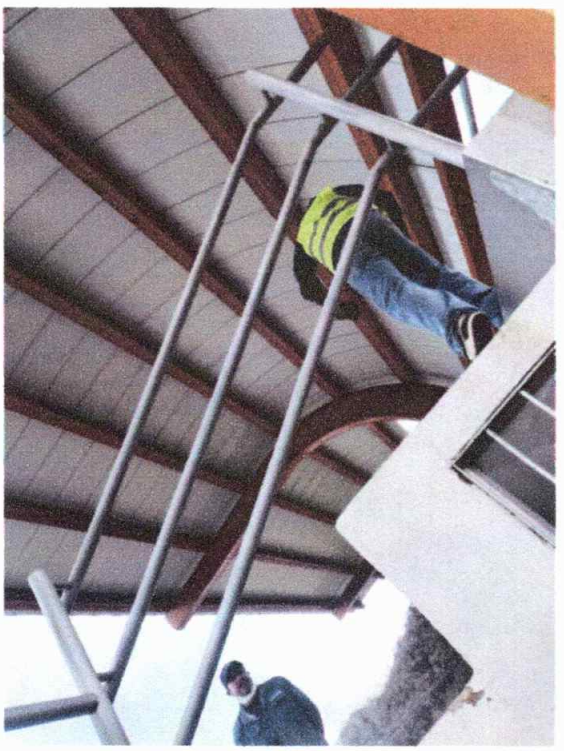

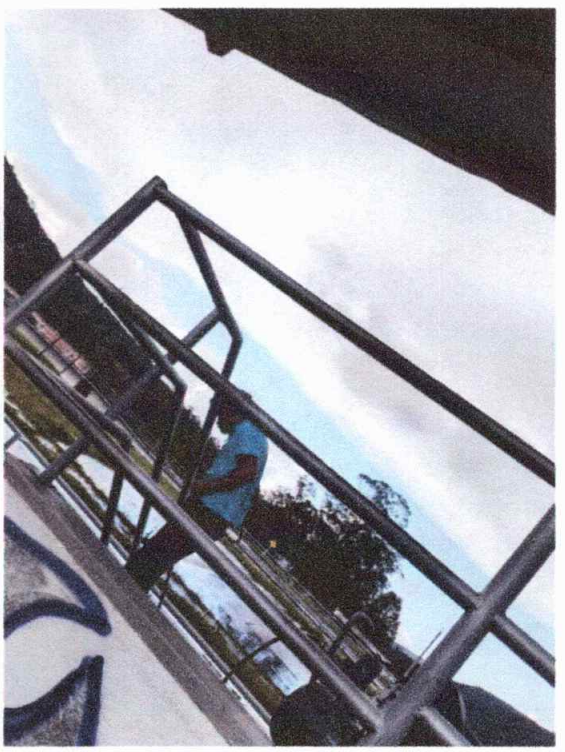



CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





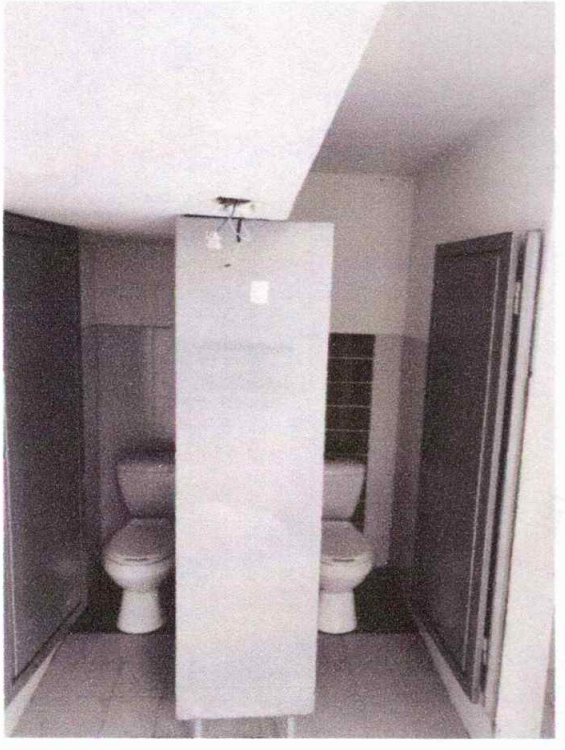

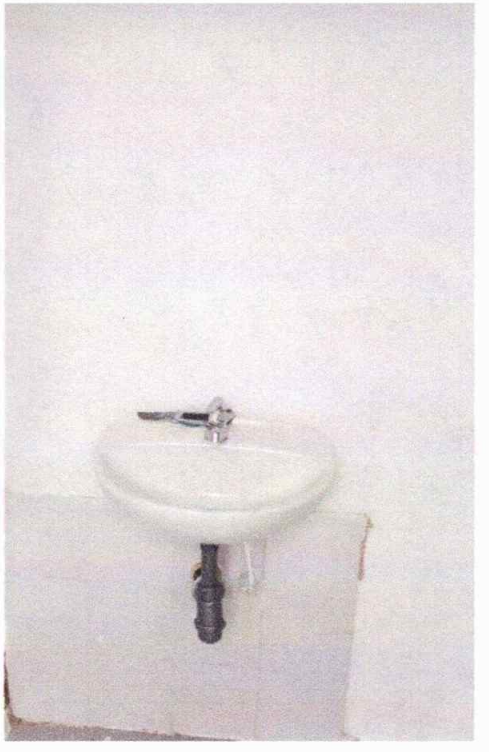

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES






CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





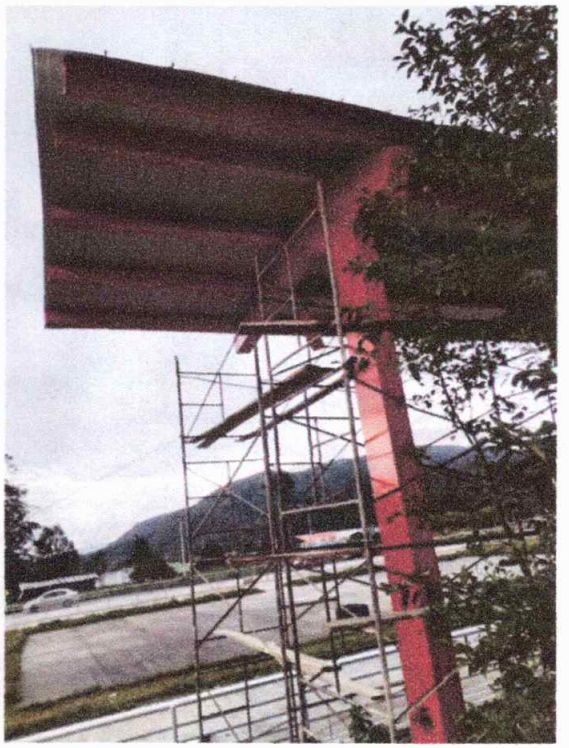

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

INSTALACION MALLA EN C.I.C.





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560


DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES





CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

DYS
SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES

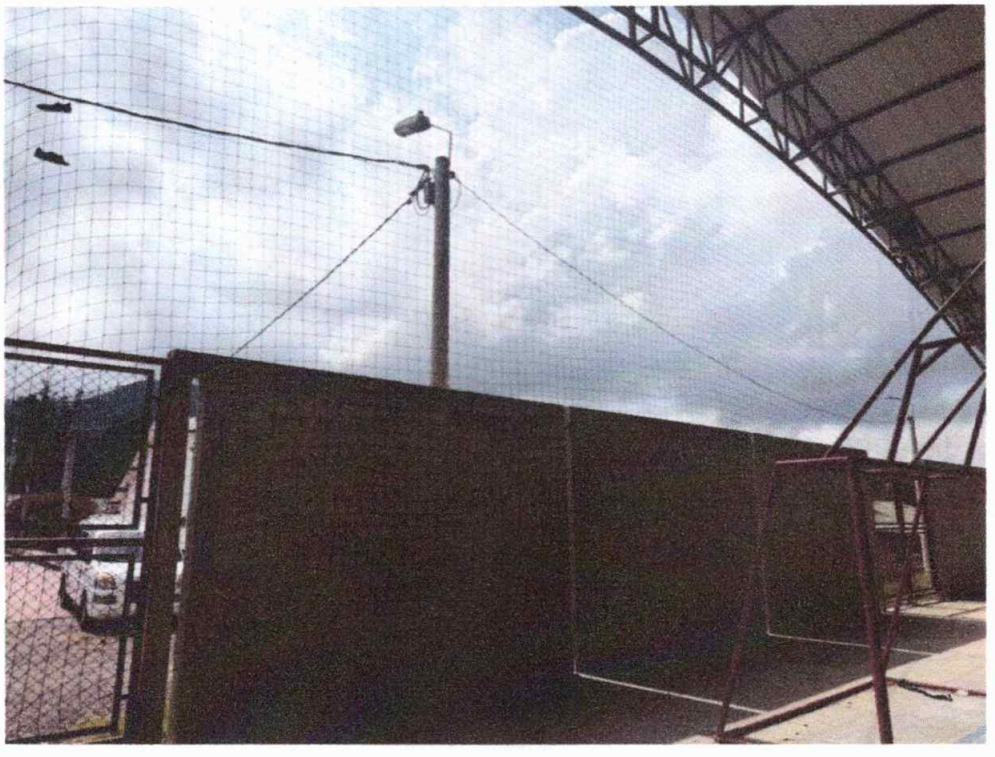

CONTACTANOS
DIR: TRASVERSAL 5 # 11-00 KM 1 VIA MONIQUIRA – TUNJA
dys.suministrosyconstrucciones@gmail.com
CEL: 310 769 0560

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS					UNIDAD	M2

Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
Pintura interna - biblioteca								
columnas	3,77	0,5				9	m2	16,97
columna	6,8	0,5				1	m2	3,4
columna	6,8	0,3				2	m2	4,08
pared patio	1,67	3,67				1	m2	6,13
pared principal cara interna	0,84	5,8				1	m2	4,87
pared lateral iz cara interna	1,68	5				1	m2	8,4
viga perimetral	5,73	0,3				1	m2	1,72
placa de techo								
placa de techo	7,2	5,1				1	m2	36,72
area policarbonato	4,2	2,84				1	m2	-11,928
BAÑOS								
baños infatiles -lavamanos	1,7	4,15				2		7,055
baños infatiles -lavamanos	1,5	3,3				1		4,95
baños infatiles -lavamanos	1,5	0,5				2		0,75
baños infatiles -lavamanos	1,5	1,16				2		1,74
baños infatiles -lavamanos	3,2	1,13				2		3,616
baños infatiles -lavamanos	1,5	1,13				2		1,695
zona de lavado y baño	0,86	0,7				1		0,602
zona de lavado y baño	0,9	0,7				1		0,63
zona de lavado y baño	3,2	1,14				1		3,648
zona de lavado y baño	1,13	3				1		3,39
							TOTAL	98,44

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS					UNIDAD	M2

Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
Fachada bliclioteca								
pared fachada	1,1	5,85				1		6,44
pared lateral izq	1,68	5				1		8,4
muro superior fachada	7,8	0,8				1		6,24
zocalo-lateral	9,2	0,3				1		2,76
Fachada 2 bliclioteca								
fachada	6,2	0,7				1		4,34
fachada	1,15	5				1		5,75
lateral	22	0,8				1		17,6
espacios laterales	2,2	0,8				3		5,28
							TOTAL	56,81

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO			CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS			
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00			FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025			
CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS					UNIDAD	0

Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
ventanas								
ventanas -bliblioteca perimetro	2,25	1,8				11		89,1
ventanas -biblioetca-divisiones internas vericales		1,8				11		39,6
ventanas -biblioetca-divisiones internas horizontales	2,25					11		49,5
Reja interna								
perimetro	2,25	1,8				11		89,1
divison vertical		1,8				11		217,8
division horizontal	2,25					11		74,25
puerta principla								
perimetro	4,17	4,75						17,84
divisiones - verticales		4,75				5		23,75
divisiones - horizontales	4,17					6		25,02
Reja interna								
perimetro	4,17	4,75						17,84
divisiones - verticales		4,75				20		95
divisiones - horizontales	4,17					8		33,36
ventanal lateral								
perimetro	1,6	4,75						12,7
divisiones - verticales		4,75				2		9,5
divisiones - horizontales	1,6					6		9,6
Reja interna								
perimetro	1,6	4,75						12,7
divisiones - verticales		4,75				8		38
divisiones - horizontales	1,6					8		12,8
puerta patio								
perimetro	1,8	2,67						8,94
divisiones - verticales		2,67				2		5,34
divisiones - horizontales	1,8					5		9
							TOTAL	890,74

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA				FECHA	DICIEMBRE DE 2025	
ITEM	1,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR				UNIDAD	UND	

Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
cerradura						1	Und	1
							TOTAL	1,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA					UNIDAD	UND
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
tomacorriente						2	Und	2
							TOTAL	2,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.					UNIDAD	M2
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
Placa y viga canal								
placa	7,2	2,06					m2	14,83
viga canal	18	0,55					m2	9,9
							TOTAL	24,73

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	1,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS					UNIDAD	UND
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
Combo Sanitario						1	Und	1
							TOTAL	1,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO			CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS			
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00			FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025			
CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	1,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL					UNIDAD	UND
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
							TOTAL	0,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO	CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00	FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025

CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA	FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	1,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM	UNIDAD	M2

Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
Domo en Policarbonato	4,2	2,84				1	m2	11,93
							TOTAL	11,93

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	1,1	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)					UNIDAD	M2
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
							m2	
							TOTAL	0,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	1,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO TIPO ESPAÑOLA SOBRE LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE E= 10 MM.					UNIDAD	M2
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
TEJA ESPAÑOLA- TEJADO							m2	1,01
							TOTAL	1,01

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	1	MANTENIMIENTO BIBLIOTECA					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	1,12	PARED EN CERAMICA					UNIDAD	M2
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
							m2	
							TOTAL	0,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	2	PISTA DE PATINAJE					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	2,01	DEMARCACION DE LINEA INTERNA EN PINTURA TIPO TRAFICO ANTIDESLIZANTE PARA CANCHAS PISTA DE PATINAJE, E=0.12					UNIDAD	ML
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
LINEA PISTA DE PATINAJE								
LINEA	204							204
LINEA DE META	5							0
							TOTAL	204,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS	
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025	

CAPITULO	2	PISTA DE PATINAJE	FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	2,02	PINTURA EN ESMALTE PARA EL CERRAMIENTO METALICO DE LA PISTA DE PATINAJE INCL. ANTICORROSIVO.	UNIDAD	M2

Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
PISTA DE PATINAJE								
CERRRAMIENTO EN TUBO	235					4	ML	940
TUBOS VERTICALES	1,2					118	ML	141,6
GRADERIA								
BARANDA GRADERIA	85,7					1		85,7
							TOTAL	1167,30

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	2	PISTA DE PATINAJE				FECHA	DICIEMBRE DE 2025	
ITEM	2,03	PINTURA EN ESAMALTE PARA LAS COLUMNAS Y VIGAS DE LA CUBIERTA DE LA GRADERIA EN LA PISTA DE PATINAJE INC. ANTICORROSIVO				UNIDAD	M2	

Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
COLUMNAS								
col laterales	7,5	1,5				2		22,5
col centrales	9,3	2,6				2		48,36
VIGAS								
vigas largas	30	0,6				5		90
vigas cortas	9,7	0,6				2		11,64
canal	10	0,4				1		4
							TOTAL	176,50

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	2	PISTA DE PATINAJE					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	2,04	PINTURA EN TRAFICO PARA GRADERIA PISTA DE PATINAJE (2 MANOS)					UNIDAD	M2

Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
grada 1	13,7	0,63				1		8,631
grada 2	14,5	0,79				1		11,455
grada 3	14,1	1,2				1		16,92
grada 4	14,1	1,6				1		22,56
grada 5	7,3	1,2				1		8,76
grada 6	7,3	1,35				1		9,855
grada 7	7,3	1,65				1		12,045
							TOTAL	90,23

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	2	PISTA DE PATINAJE					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	2,05	SUMINISTRO DE TABLA TIPO CARROCERIA DE L: 2M, E: 0.08 M, INCLUYE TORNILLO DE 3" CON ARANDELA Y TUERCA					UNIDAD	UND
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
Tablas cerramiento						58	Und	58
							TOTAL	58,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CEÑNA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	2	PISTA DE PATINAJE					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	2,06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS					UNIDAD	ML
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
tablas cerramiento cara frontal	235,2					2	ML	470,4
							TOTAL	470,40

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	2	PISTA DE PATINAJE					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	2,07	APLIACION DE SOLDADURAS 6013 PARA REPARACION DE FISURAS					UNIDAD	KG

Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
ARREGLO PUERTAS				5		1		5
							TOTAL	5,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	2	PISTA DE PATINAJE					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	2,08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS					UNIDAD	M2
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
FACHADA BATERIA DE BAÑOS								
	3	1,57136701				2		9,42820203
	3,14	2,76				2		17,3328
	1,72	2,77				1		4,7644
	1,25	2,77				1		3,4625
							TOTAL	34,99

OBSEREVACIONES

34,98790203

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	2	PISTA DE PATINAJE					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	2,09	COMBO SANITARIO COMPLETO, INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS					UNIDAD	UND
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
Combo sanitario						2	Und	2
							TOTAL	2,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	2	PISTA DE PATINAJE					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	2,10	INSTALACION DE LAMINA METALICA DE CALIBRE 22 PARA PROTECCION DE VENTANAS					UNIDAD	M2
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
VENTANAS	1	0,9				2	m2	1,8
							TOTAL	1,80

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	3	C.I.C					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN NAYLON RETORCIDO, TEJIDO EN CUADROS DE 10 CM					UNIDAD	M2

Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
CIC								
AREA FRONTAL C.IC.	43,88		8					351
							TOTAL	351,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.

FORMATO MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA								
N° DE CONTRATO	SAMC-MA-012-2025	OBJETO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL PATINÓDROMO MUNICIPAL, EL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA Y LA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME A LOS INDICADORES: "REALIZAR DOS (2) MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DURANTE EL PERIODO DE GOBIERNO" Y "GARANTIZAR ANUALMENTE EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL" DEL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO					
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ARCABUCO		CONTRATISTA	DYS SUMINISTROS Y CONSTRUCCIOENS SAS				
VALOR DEL CONTRATO	$62.938.268,00		FECHA DE INCIO	jueves, 13 de noviembre de 2025				
CAPITULO	3	C.I.C					FECHA	DICIEMBRE DE 2025
ITEM	3.02	SUMINISTRO E INTALACION DE GUAYA DE 3/8" PARA INSTALACION DE MALLA EN NAYLON					UNIDAD	ML
Área/lugar/elemento	longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Peso (kg)	VR. Parcial	N° DE ELEMENTOS	unidad	TOTAL
C.I.C								
PERIEMTRO	110					1	ML	110
							TOTAL	110,00

OBSEREVACIONES

Elaboro y calculo

ING. DIEGO FERNANDO CETINA
MP. 68202-323904 STD

Vo.Bo.
