CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH 391 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA

INFORME MENSUAL N°1

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ING. KAROLL LISSETH BUITRAGO HERNANDEZ	**ENTIDAD**	INDERHUILA
CONTRATO INTERVENTORIA No.	CMCIH 391	**DE**	2023
OBJETO	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".	**PERIODO DEL INFORME**	Entre el 29 de noviembre al 29 de diciembre de 2023
CONTRATISTA	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	**NIT**	7.711.430-0
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	**C.C**	7.711.430

FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A)	09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A)	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN (D/M/A)	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS

	DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	N/A
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES
VALOR INICIAL	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($16.748.356,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($16.748.356,00) M/CTE.


1. INFORMACIÓN CONTRATO DE (OBRA/CONSULTORIA)

CONTRATO DE (OBRA/CONSULTORIA) No.	CSAMCIH431 de 2023
OBJETO	"CONSTRUCCION Y ADECUACION PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"
CONTRATISTA	CONSORCIO LA ESPERANZA
REPRESENTANTE LEGAL	RAMIRO POLANIA FERNANDEZ
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A)	07 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO (D/M/A)	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPESIÓN (D/M/A)	29 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A): (Si aplica)	N/A
PLAZO TOTAL	TRES (03) MESES
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SECENTA PESOS ($287.286.960) M/CTE
VALOR ADICIONAL No.1) (D/M/A): (si aplica)	N/A
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SECENTA PESOS ($287.286.960) M/CTE.


2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en dos Municipios del Departamento del Huila

1. Ubicación: RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA

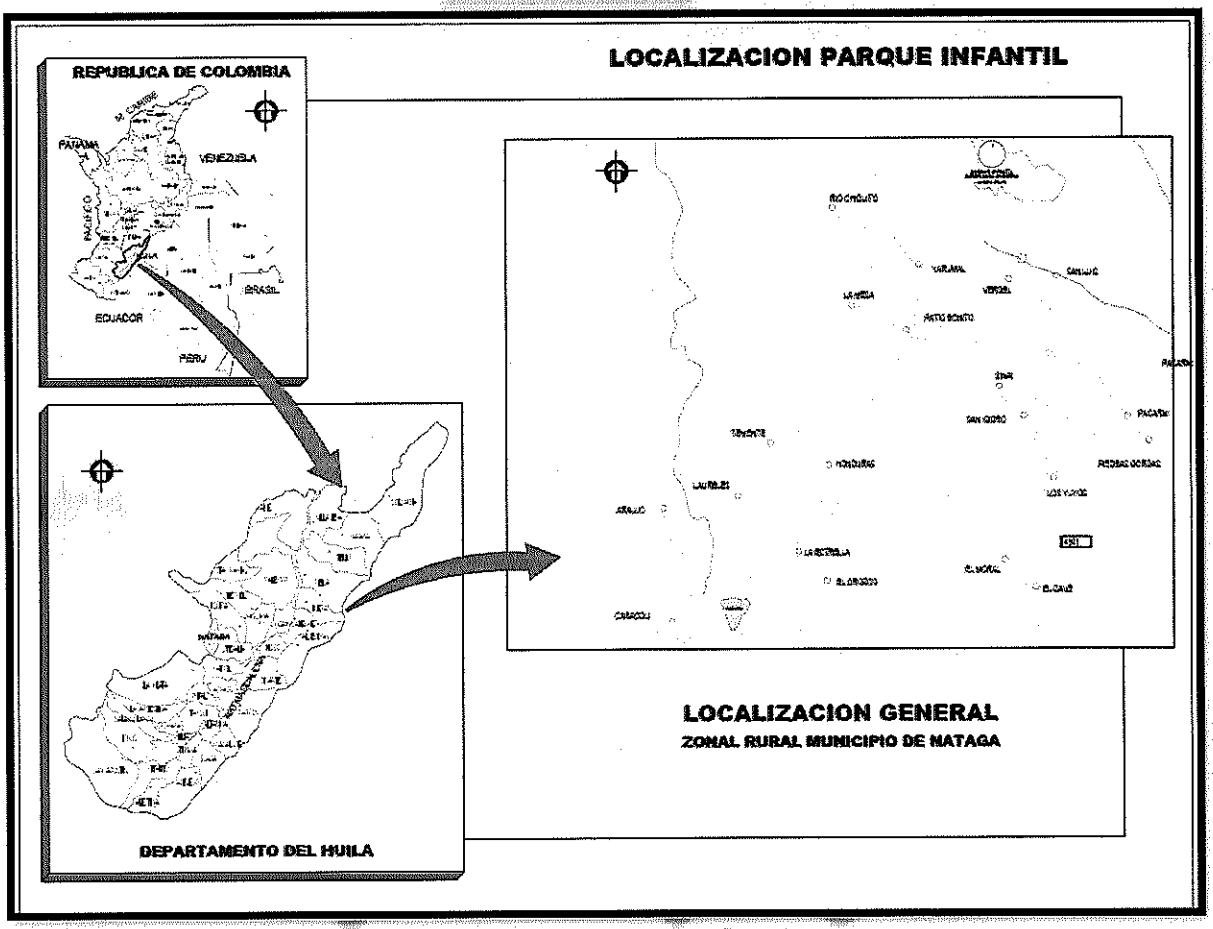

2. Ubicación: RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

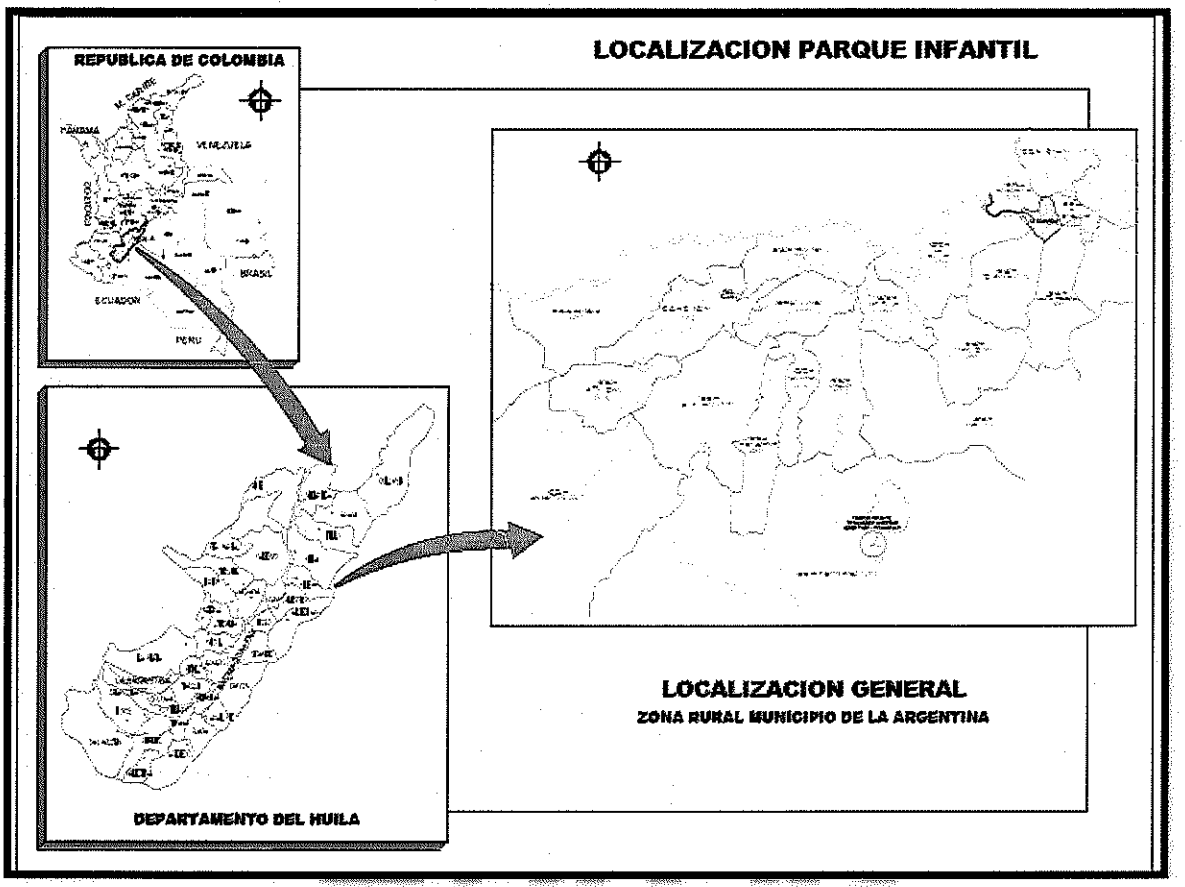

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consta de la construcción de dos (2) parques infantiles, uno en el Resguardo indígena llano buco del municipio de Nátaga, y el segundo parque ubicado Resguardo Indígena Nasa Paez - Pickwe ikh en el Municipio de la Argentina , los parques infantiles contemplan actividades de localización y replanteo, excavaciones para la conformación de vigas de cimentación, para mejoramiento del terreno con recebo seleccionado para cunetas, zonas verdes y pedestales para juegos infantiles y baranda perimetral también dentro de su alcance contempla el relleno en recebo seleccionado compactado en capas horizontales de 15 cm.

Dentro del proyecto encontramos solado de limpieza en áreas de vigas de cimentación y áreas de los pedestales de anclaje de juegos infantiles, también el parque contempla actividades de acero en varilla 3/8" para vigas de cimentación, placa de contrapiso, pedestales para mobiliario de juegos infantiles y pedestales para baranda perimetral

Otras de las actividades del proyecto, se encuentra vigas de cimentación de 0.25m x 0.25 m de sección ubicadas en los extremos de la placa de contrapiso en sentido longitudinal, también encontramos una placa de contrapiso con espesor de 12 cm en un área de 7 metros de ancho por 15 metros de largo, dicha placa contempla acabado en pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie cuyos colores van según diseño y figuras.

Contemplamos unas cunetas en forma de V cubriendo el área de la placa para recoger las aguas lluvia, estas cunetas se caracterizan por tener una dimensión de 0.40 m x 15 m y otra en el lateral derecho de dimensión de 0.40 m x 15 m.

Para proteger las zonas verdes se tendrá una baranda metálica en tubo de 2" que incluye anticorrosivo y pintura con una longitud de 46,17 ml.

Las zonas verdes están ubicadas al rededor del parque infantil en las cuales se plantarán en tierra negra tipos de plantas como lo son: Ornamentales durantas, plantas Ixoras y Bismarckia.

En el parque infantil está ubicada una rampa en concreto de 3.000 PSI con una longitud de 2.00 m x 5.00 m y un espesor de 0.10 m, esta rampa esta reforzada con malla electrosoldada y nos dará acceso a 7 juegos infantiles que constan de: circuito de juego, modulo recreativo, carrusel, columpio inclusivo, triqui inclusivo, ábaco inclusivo y módulo de piano inclusivo.

4. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

En el mes de diciembre del año 2023 se realizaron las actividades de localización y replanteo del área del parque, delimitación de rampa de acceso con una cantidad ejecutada de 126,80 m2, en el municipio de argentina ya que en el municipio de Nátaga la ubicación del parque cambio.

5. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO

CONTROL Y SEGUIMIENTO ACTIVIDADES OPERATIVAS	En el presente lapso del informe, establecido desde el 29 de noviembre de 2023 a 29 de diciembre de 2023, se realizaron las siguientes actividades operativas:
CONTROL Y SEGUIMIENTO A ENSAYO DE LABORATORIOS	Durante este periodo no se tomaron muestras de laboratorio.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE ANTICIPO	Durante este periodo no se radico el anticipo del contrato de obra.

ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	MUNICIPIO
Localización y replanteo del terreno a intervenir	126,80 m2	Argentina

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	**CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL** / **CARGO** Alexander Joven Yustres — Director de Obra Maira Bonilla Ramos — Residente de Obra Nataga Elkin Ramiro Polania Bernal — Residente de Obra 2 La Argentina
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	Sin equipos que requieran seguimiento y control a la fecha. Solo excavaciones manuales.
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Solo se han realizado actividades preliminares (replanteos y excavaciones)
CONTROL Y SEGUIMIENTO A APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	**PLANILLA RELACIONADA -CONSORCIO LA ESPERANZA** **NRO. DE PLANILLA 28425592** PENSION: $ 700.000 SALUD: $ 251.500 ARL: $436.000 CCF: $ 251.300 Periodo pagado: 2023-11 Fecha de pago: 2023/12/15 **PLANILLA RELACIONADA- RAELJA INGENIERIA SAS (Consorciado)** **NRO. DE PLANILLA 28409966** PENSION: $ 864.500 SALUD: $ 216.400 ARL: $ 376.300 CCF: $ 216.300 Periodo pagado: 2023-11 Fecha de pago: 2023/12/11 **PLANILLA RELACIONADA -CONSORCIO LA ESPERANZA** **NRO. DE PLANILLA 28782329** PENSION: $ 631.200 SALUD: $ 250.700 ARL: $436.400 CCF: $ 250.700 Periodo pagado: 2023-12 Fecha de pago: 2024/01/15 **PLANILLA RELACIONADA- RAELJA INGENIERIA SAS (Consorciado)** **NRO. DE PLANILLA 28781756** PENSION: $ 655.600 SALUD: $ 163.900

	ARL: $ 285.400 CCF: $ 163.900 Periodo pagado: 2023-12 Fecha de pago: 2024/01/15
SEGUIMIENTO A POLIZAS DE GARANTIAS	

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-44-101431024	0	24/11/2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/02/2029
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/02/2029
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	17/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	17/11/2023	17/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-40-101223087	0	24/11/2023	17/11/2023	17/02/2024

RELACION DE ACTAS REALIZADAS estas actas son las de justificación/adición/suspensión o parciales o las de comités


TIPO	N°	FECHA
Acta de inicio	1	29 de noviembre de 2023
Acta de suspensión	1	29 de diciembre de 2023
Acta de comité	1	06 de diciembre de 2023
Acta de comité	2	13 de diciembre de 2023
Acta de comité	3	20 de diciembre de 2023
Acta de comité	4	27 de diciembre de 2023

6. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO


- **RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA**

Las temperaturas máximas diarias son alrededor de 26 °C, rara vez bajan a menos de *23 °C* o exceden *28 °C*.

Las temperaturas mínimas diarias son alrededor de 17 °C, rara vez bajan a menos de *16 °C* o exceden *18 °C*. La temperatura mínima promedio diaria más baja es *17 °C* el *20 de diciembre*.

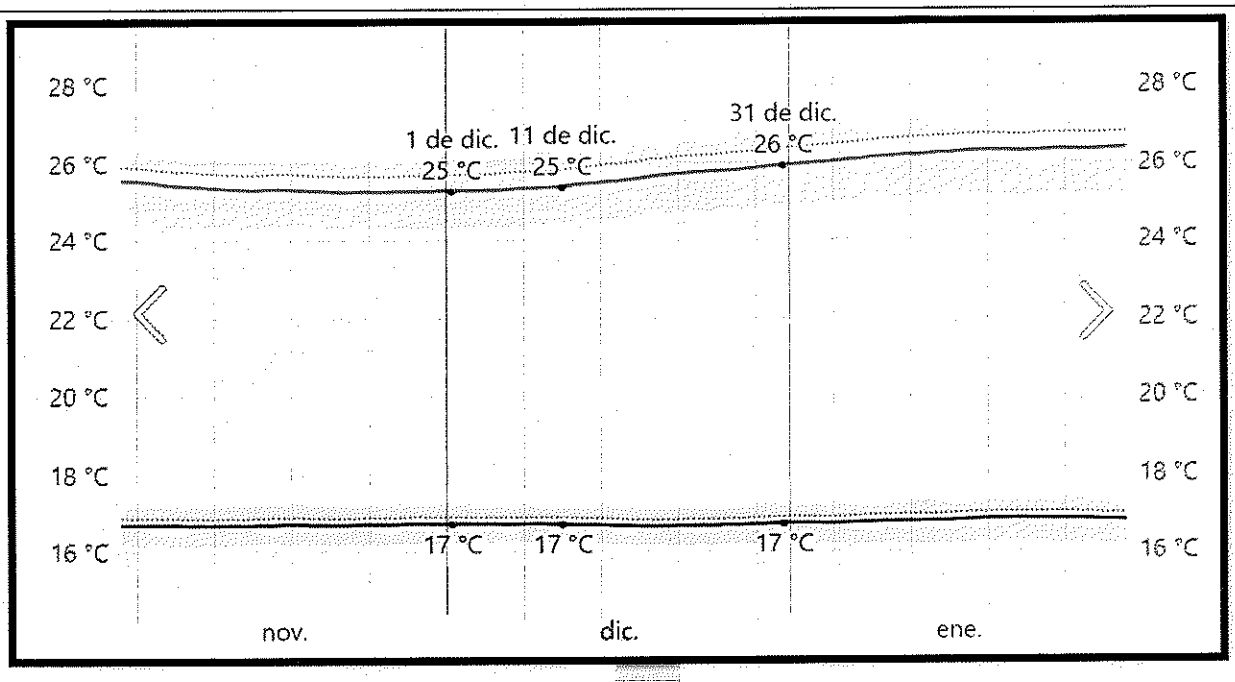

- **RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA**

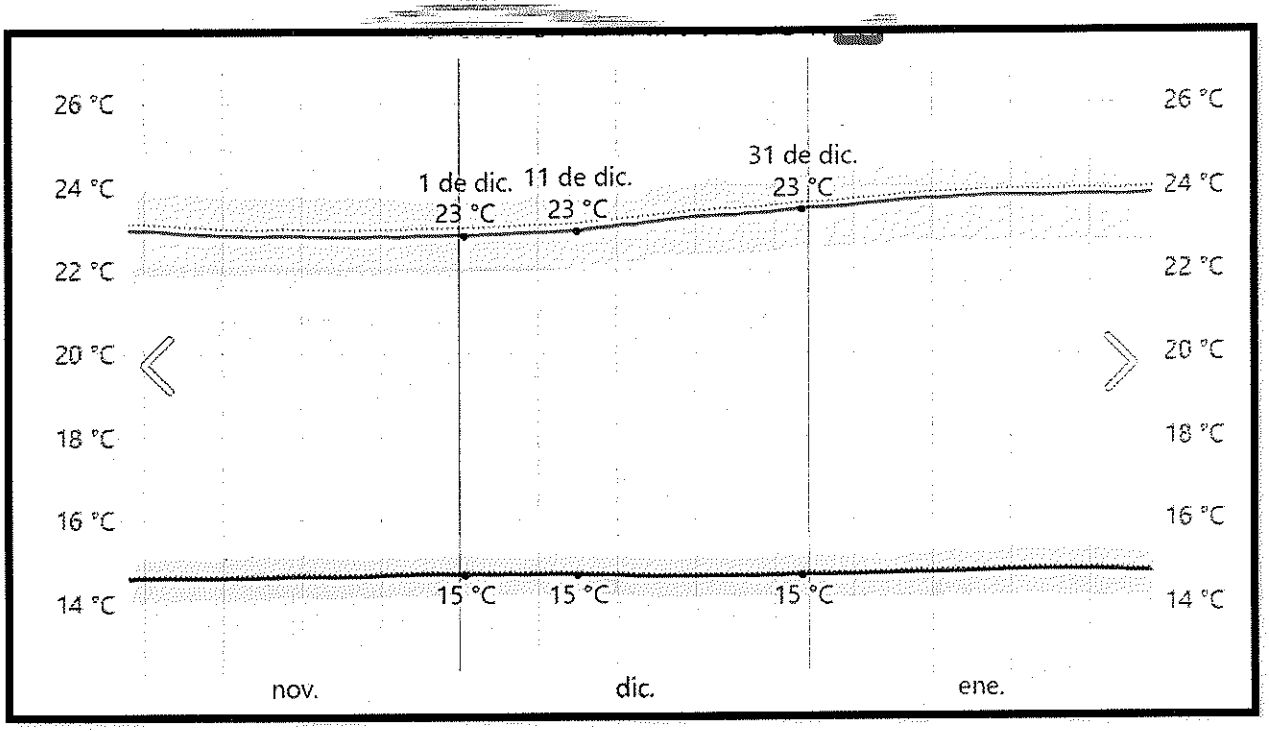

7. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

PROYECTO: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA — **AVANCE DE OBRA 1**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES DEL PROYECTO				NOVIEMBRE - DICIEMBRE		
		UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VALOR / TOTAL	%
1	**PRELIMINARES**							
1.01	Localización y replanteo	M2	126,80	$ 3.632,046	$ 575.679,00		$ -	0,00 %
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 575.679,00**		**$ -**	
2,02	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	43,40	$ 46.957,514	$ 2.547.445,00		$ -	0,00 %
2,03	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	27,50	$ 85.589,276	$ 2.942.131,00		$ -	0,00 %
3	**CIMENTACIÓN**				**$ 5.489.576,00**		**$ -**	
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	110,00	$ 34.718,230	$ 4.773.757,00		$ -	0,00 %
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	4,05	$ 645.426,944	$ 3.267.474,00			0,00 %
3.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	KG	3.316,00	$ 7.886,478	$ 32.689.451,00			0,00 %
4	**ZONA VERDE**				**$ 40.730.682,00**		**$ -**	

202

4.1	Jardines perimetrales	M2	28,00	$ 90.788,488	$ 3.177.597,00		0,00 %
5	**PLACA DE CONTRAPISO**				**$ 3.177.597,00**	**$ -**	
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	110,00	$ 85.770,440	$ 11.793.436,00		0,00 %
5.02	Pintura en acrilico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	110,00	$ 24.376,298	$ 3.351.741,00		0,00 %
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	28,00	$ 85.592,198	$ 2.995.727,00		0,00 %
6	**INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**				**$ 18.140.904,00**	**$ -**	
6.01	suministro, transporte e instalacion de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 7.667.482,866	$ 9.584.354,00		0,00 %
6.02	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 13.060.204,316	$ 16.325.255,00		0,00 %
6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 11.993.869,116	$ 14.992.336,00		0,00 %
6.04	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 13.326.788,116	$ 16.658.485,00		0,00 %
6.05	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 1.996.976,616	$ 2.496.221,00		0,00 %

6.06	Suministro, transporte e instalación de modulo abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 4.129.647,016	$ 5.162.059,00			0,00 %
6.07	Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 3.562.623,176	$ 4.453.279,00			0,00 %
7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 69.671.989,00**		**$ -**	
7.01	Muro de contención en concreto ciclopeo - 3000 psi	M3	10,00	$ 324.900,102	$ 4.061.251,00			0,00 %
7.02	Baranda metalica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	9,00	$ 159.626,912	$ 1.795.803,00			0,00 %
					$ 5.857.054,00		**$ -**	
					$ 143.643.480,00		**$ -**	**0,00 %**

PROYECTO: CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA NASA PÁEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA — **AVANCE DE OBRA 1**

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES DEL PROYECTO				NOVIEMBRE - DICIEMBRE		
		UND	CANT	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANT	VALOR / TOTAL	%
1	**PRELIMINARES**							
1.01	Localización y replanteo	M2	126,80	$ 3.632,046	$ 575.679,00		$ 575.679,00	0,40 %
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**$ 575.679,00**		**$ -**	

2,02	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	43,40	$ 46.957,514	$ 2.547.445,00	$ -	0,00 %
2,03	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	27,50	$ 85.589,276	$ 2.942.131,00	$ -	0,00 %
3	**CIMENTACIÓN**				**$ 5.489.576,00**	**$ -**	
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	110,00	$ 34.718,230	$ 4.773.757,00	$ -	0,00 %
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	4,05	$ 645.426,944	$ 3.267.474,00		0,00 %
3.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	KG	3.316,00	$ 7.886,478	$ 32.689.451,00		0,00 %
4	**ZONA VERDE**				**$ 40.730.682,00**	**$ -**	
4.1	Jardines perimetrales	M2	28,00	$ 90.788,488	$ 3.177.597,00		0,00 %
5	**PLACA DE CONTRAPISO**				**$ 3.177.597,00**	**$ -**	
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	110,00	$ 85.770,440	$ 11.793.436,00		0,00 %
5.02	Pintura en acrilico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	110,00	$ 24.376,298	$ 3.351.741,00		0,00 %
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	28,00	$ 85.592,198	$ 2.995.727,00		0,00 %
6	**INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**				**$ 18.140.904,00**	**$ -**	

6.01	suministro, transporte e instalacion de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 7.667.482,866	$ 9.584.354,00		0,00 %
6.02	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 13.060.204,316	$ 16.325.255,00		0,00 %
6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 11.993.869,116	$ 14.992.336,00		0,00 %
6.04	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 13.326.788,116	$ 16.658.485,00		0,00 %
6.05	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 1.996.976,616	$ 2.496.221,00		0,00 %
6.06	Suministro, transporte e instalación de modulo abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 4.129.647,016	$ 5.162.059,00		0,00 %
6.07	Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 3.562.623,176	$ 4.453.279,00		0,00 %
7	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 69.671.989,00**	$ -	
7.01	Muro de contención en concreto ciclopeo - 3000 psi	M3	10,00	$ 324.900,102	$ 4.061.251,00		0,00 %
7.02	Baranda metalica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	9,00	$ 159.626,912	$ 1.795.803,00		0,00 %
					$ 5.857.054,00	$ -	
					$ 143.643.480,00	$ 575.679,00	**0,40 %**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

ING. **ALEXANDER JOVEN YUSTRES**
DIRECTOR DE OBRA

ING. **FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

8. CONTROL DE ANTICIPO – INTERVENTORIA

N/A

9. RELACION DE PERSONAL – INTERVENTORIA

PROFESIONAL	CARGO
FAIVER EDUARDO PERDOMO	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

10. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Acta No./Anticipo)	No. COMPROBANTE	FECHA
N/A		__/__/____

11. RELACIÓN DE PAGOS DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – INTERVENTORIA

NOVIEMBRE 2023

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES
FAIVER EDUARDO PERDOMO	$516.400	$403.500	$17.000	$	$

DICIEMBRE 2023

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES
FAIVER EDUARDO PERDOMO	$185.600	$145.000	$28.300	$	$

12. POLIZAS DE GARANTIA – INTERVENTORIA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010185	0	10/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Calidad del servicio	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

			FECHA	VIGENCIA

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002047	0	10/11/2023	09/11/2023	09/02/2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:


POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010185	2	06-12-2023	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	29/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/11/2023	01/03/2027
				Calidad del servicio	29/02/2024	01/03/2029


POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002047	2	06-12-2023	29/11/2023	29/02/2024

13. REGISTRO FOTOGRAFICO

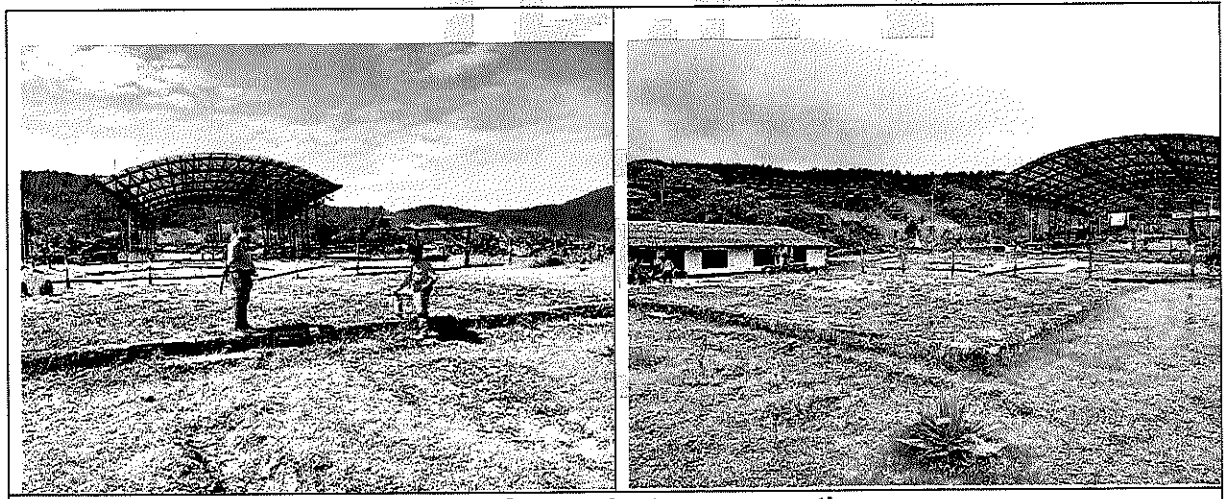

Localización y replanteo en argentina

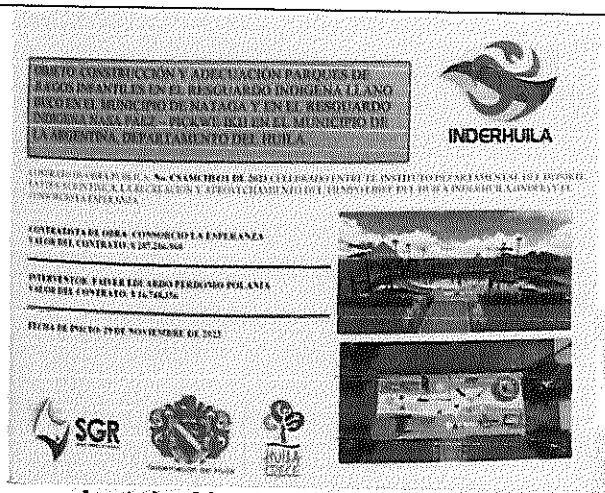

instalación de valla informativa

14. ANEXOS

- Seguridad Social
- Bitácora
- Comité
- Correspondencia recibida y enviada

ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	(06/02/2024)	ING. KAROLL LISSETH BUITRAGO HERNANDEZ
FIRMA INTERVENTOR	**FECHA DE ENTREGA**	**VoBo SUPERVISOR**
