
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH 391 de 2023

INFORME MENSUAL No. 03 DE SUPERVISION

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por los Contratista de Obra e Interventoría desde el 01 **de OCTUBRE DE 2024** hasta el 28 **de OCTUBRE DE 2024.**

PARCIAL [X] **FINAL** [ ]

OBJETO: **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

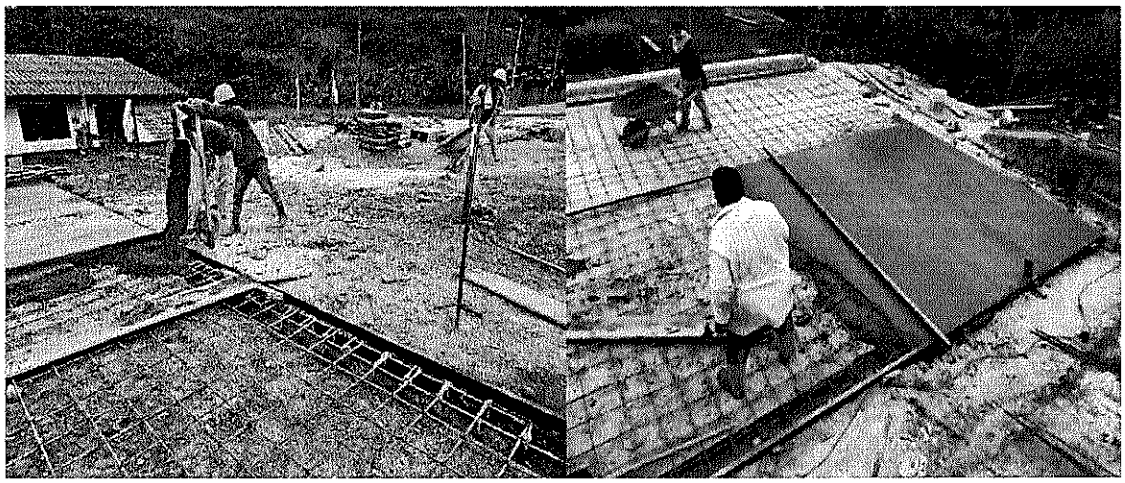

MUNICIPIO: **NATAGA – LA ARGENTINA**

DEPARTAMENTO: **HUILA**

humano. Por consiguiente, el crear una cultura de fomento que permita el desarrollo de actividades no cotidianas, da apertura al diseño de hábitos participativos que fomenten los programas que el mismo gobierno viene desarrollando, lo que motivaría al disfrute y participación de ciudadanos que no se encuentran familiarizados con dichos espacios. El esfuerzo físico y la recreación no va ligado solamente al desarrollo de un deporte de alta competencia, si no a la dedicación que se proyecte el individuo para el logro de un objetivo, que domine ante cualquier adversidad, esa sensación de satisfacción y conlleve al mejoramiento del estado psicológico del mismo.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objetivo la construcción de dos (02) parques infantiles, el primero localizado en el Resguardo indígena llano buco del municipio de Nátaga, y el segundo parque localizado en el Resguardo Indígena Nasa Páez - PICKWE IKH en el Municipio de la Argentina,, los cuales tienen las características de brindar a la comunidad infantil, adultos mayores con movilidad reducida escenarios para la recreación con las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar, mejorar y mantener la capacidad motriz a los de niños, jóvenes y adultos de la población de nuestro departamento; en donde se contempla en la instalación de móviles infantiles para dicho objetivo.

3.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en dos Municipios del Departamento del Huila

1. **RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA**

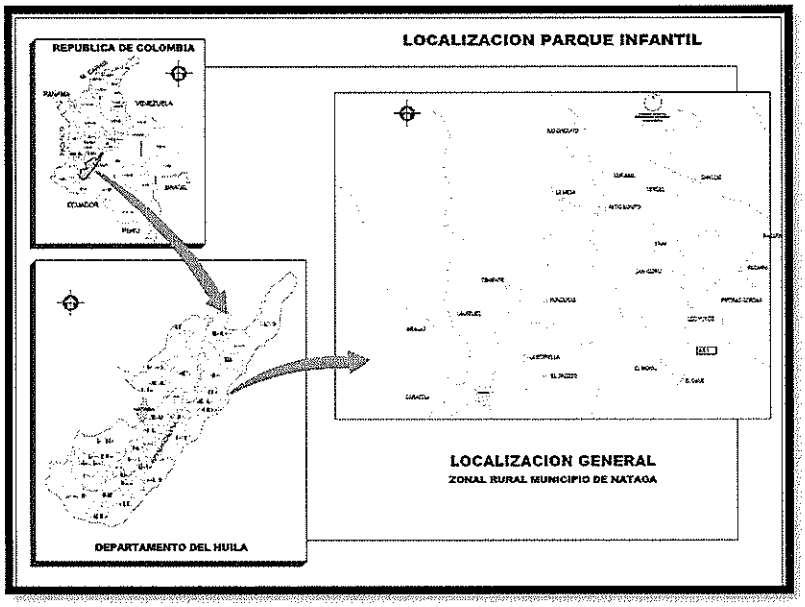

Que mediante carta de aceptación CMCIH391 de 2023, la entidad dio apertura al procedimiento de selección número IPMCH012 – 2023, la entidad adjudico al contratista **FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA.**

CONTRATO No.	CMCIH 391 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO 4CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".
CONTRATISTA:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA CC: 7.711.430 Celular: 313 294 9534 Correo Electrónico: faiverperdomo1@gmail.com
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (**$16.748.356,00**) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (**$16.748.356,00**) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	09 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
OTROSÍ MODIFICATORIO N°1: 02-09-2024	Modificación a la cláusula 2 – plazo de contrato –
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2024.
FECHA DE INICIO:	**29 de noviembre de 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO 1:	02 de septiembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28 de octubre de 2023
FECHA TERMINACION:	**01 de noviembre de 2024**

ACTA DE JUSTIFICACION *N°* 1 A LA SUSPENSIÓN *N°* 1	1	29 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN *N°* 1	1	29 de diciembre de 2023
ACTA DE JUSTIFICACION *N°* 2 A LA REINICIO *N°* 1	2	02 de septiembre de 2024
ACTA DE REINICIO *N°* 1	1	02 de septiembre de 2024
Otro si No. 1 Modificación a la cláusula 2 – plazo de contrato –	3	02 de septiembre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACION *N°* 4 A LA SUSPENSIÓN *N°* 2	4	28 de octubre de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN *N°* 2	2	28 de octubre de 2024

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000681	VALOR	VIGENCIA
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2023000704 DE OCTUBRE 06 DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410138- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F2022.		$ 8.374.178.00	2023
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2023000703 DE OCTUBRE 06 DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410139- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F2022.		$ 8.374.178.00	2023

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2024000492	VALOR	VIGENCIA
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2024000492 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2024, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410138- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F2022.		$ 8.374.178.00	2024
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2024000492 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2024, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN		$ 8.374.178.00	

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010185	2	06/12/2023	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	29/08/2024	$3.349.671,20
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/02/2024	01/03/2029	$1.674.835,60
				Calidad del Servicio	5 años, 0 meses y 0 día a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra objeto de la Interventoría.		$3.349.671,20

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA		
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002047	2	06/12/2023	29/11/2023	29/02/2024	$ 232.000.000

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado			
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010185	3	20/09/2024	Cumplimiento del contrato	02/09/2024	05/05/2025	$3.349.671,20
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/09/2024	02/09/2024	$1.674.835,60
				Calidad del Servicio	05/11/2024	05/11/2024	$3.349.671,20

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA		
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002047	3	20/09/2024	29/11/2023	05/11/2024	$ 232.000.000

Póliza actualizada x OTRO SI MODIFICATORIO VIGENCIA FISCAL:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado			
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
	CHU-100010185	4	20/09/2024	Cumplimiento del contrato	02/09/2024	05/05/2025	$3.349.671,20

	aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la presente vigencia fiscal.
OTROSÍ MODIFICATORIO N°1: 02-09-2024	Modificación a la cláusula 4 – plazo de contrato- y clausula 6 -anticipo-
OTROSÍ MODIFICATORIO N°2: 21-10-2024	Modificación clausula 3 -alcance del objeto-
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución, y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la presente vigencia fiscal 2024
FECHA DE INICIO:	**29 de noviembre de 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO 1:	02 de septiembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28 de octubre de 2023
FECHA TERMINACION:	**01 de noviembre de 2024**

Estado Financiero del Contrato de Obra			**CSAMCIH 431 DE 2023**	
Objeto: "CONSTRUCCION Y ADECUACION PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA , DEPARTAMENTO DEL HUILA "				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización 25%**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (25%)	12/09/2024	$ 71.821.740,00	$ 0,00	$ 71.821.740,00
Acta Parcial No. 1				
Acta Parcial No. 2				
Acta Recibo Final No.4				
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 287.286.960,00	$ 0,00	$ 287.286.960,00	$ 0,00	$ 0,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	**FECHA (dd/mm/aaaa)**	**DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
Firma Contrato	27 de octubre de 2023			
Iniciación	29 de noviembre de 2023			28 de febrero de 2024
Suspensión No. 1	29 de diciembre de 2024	30	248	
Reiniciación No. 1	02 de septiembre de 2024			01 de noviembre de 2024

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000699	VALOR	VIGENCIA
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2023000687 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410139- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES – F2022.		$ 143.643.480,00	2023

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2024000512	VALOR	VIGENCIA
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2024000491 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410138- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES – F2022.		$ 143.643.480,00	2024
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2024000491 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410139- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES – F2022.		$ 143.643.480,00	

4.4. RELACION PERSONAL

PROFESIONAL OBRA		
NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
GERMAN TRUJILLO TRUJILLO	12122087	DIRECTOR DE OBRA
ALEXANDER JOVEN YUSTRES	12137786	RESIDENTE DE OBRA 1
ELKIN RAMIRO POLANIA BERNAL	1075238943	RESIDENTE DE OBRA 2
LEONARDO RAMIREZ TROCHEZ	12272765	MAESTRO DE OBRA
JOB DANIEL CAICEDO BUITRAGO	1075300058	OFICIAL
MARIA FERNANDA GUAHUÑA PEÑA	1010242828	AYUDANTE
DIEGO ROBERTO DIMATE	80071073	AYUDANTE

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-40-101223067		06/09/2024	17/11/2023	02/11/2024

POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO No. 01

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-44-101431024		06/09/2024	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	02/05/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/02/2029
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/11/2023	02/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	29/02/2024	01/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-40-101223067		06/09/2024	17/11/2023	02/11/2024

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- En el mes de noviembre del 2023, la Ingeniera **KAROLL LISSETH BUITRAGO HERNANDEZ** es designada mediante oficio por la Directora del INDERHUILA la Arquitecta **MIGDONIA PATIÑO ARIAS**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH391 – 2023** cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA", mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. IPMCIH012-2023.

- El día 16 de febrero del 2024, el arquitecto **BRAULIO ABSALON CEDEÑO ORTIZ** es designado mediante oficio por el Director del INDERHUILA el señor **FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH391 – 2023** cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN

- Se fundió el Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi en el parque de resguardo indígena de Nátaga Huila.
- Se realizo los Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.
- Se realizo los Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts, en las vigas de cimentación.
- Se realizo la figuración del Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. para las vigas y la placa.
- Se realizo la Construcción de las vigas de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI.
- Se realizo la instalación de las platinas para pedestal de juego (incluye 4 pernos ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/4").
- Se fundieron las Placas de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm par las rampas de acceso.
- Se realizo la Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño en el resguardo de Nátaga Huila.
- Se fundieron las Placas de piso para área de Juegos en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts, incluye corte de juntas y sello.
- Se construyó los pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad).

	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 40.730.682,00**		**$ 15.212.106,00**					
4	ZONA VERDE											
4.01	Jardines perimetrales	M2	28,00	$ 90.788,488	$ 3.177.597,00							0,00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3.177.597,00**		**$ 15.212.106,00**					
5	PLACA DE CONTRAPISO											
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	110,00	$ 85.770,440	$ 11.793.436,00	6,40	$ 686.164,00	6,40	$ 686.164,00	0,48%	6,40	0,48%
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	110,00	$ 24.376,298	$ 3.351.741,00	111,40	$ 3.394.399,00					0,00%
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	28,00	$ 85.592,198	$ 2.995.727,00	30,60	$ 3.273.902,00	30,60	$ 3.273.902,00	2,28%	30,60	2,28%
N.P 5.04	Placa de piso para área de Juegos en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts, incluye corte de juntas y sello	M2		$ 126.306,316		97,50	$ 15.393.582,00	97,50	$ 15.393.582,00	10,72%	97,50	10,72%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 18.140.904,00**		**$ 22.748.047,00**					
6	**INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**	UND	1,00	$ 7.667.482,866	$ 9.584.354,00	1,00	$ 9.584.354,00					
6.01	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$13.060.204,316	$ 16.325.255,00	1,00	$ 16.325.255,00					
6.02	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$11.993.869,116	$ 14.992.336,00	1,00	$ 14.992.336,00					
6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según	UND	1,00	$13.326.788,116	$ 16.658.485,00	1,00	$ 16.658.485,00					

N.P 7.04	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thiner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	ML		$ 229.658,767		17,00	$ 4.880.249,00	17,00	$ 4.880.249,00	3,40%	17,00	3,40%
N.P 7.05	Anclaje para baranda, Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)	UND		$ 75.684,291		15,00	$ 1.419.080,00	15,00	$ 1.419.080,00	0,99%	15,00	0,99%
N.P 7.06	Transporte de material pétreo y cemento	M3-KM		$ 1.153,000		3338,98	$ 4.812.301,00	3338,98	$ 4.812.301,00	3,35%	3338,98	3,35%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 5.857.054,00**		**$ 18.769.971,00**					
										38,90%		**45,95%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente cuadro, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.



Valor ejecutado estimado del Periodo:	$ 55.875.014,00
Valor total ejecutado acumulado:	**$ 66.001.522,00**

	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 40.730.682,00**		**$ 15.585.333,00**					
4	**ZONA VERDE**											
4.01	Jardines perimetrales	M2	28,00	$ 90.788,488	$ 3.177.597,00	24,19	$ 2.745.217,00					0,00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3.177.597,00**		**$ 2.745.217,00**					
5	**PLACA DE CONTRAPISO**											
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	110,00	$ 85.770,440	$ 11.793.436,00	15,43	$ 1.654.297,00	15,43	$ 1.654.297,00	1,15%	15,43	1,15%
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	110,00	$ 24.376,298	$ 3.351.741,00	116,96	$ 3.563.815,00					0,00%
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	28,00	$ 85.592,198	$ 2.995.727,00							0,00%
N.P 5.04	Placa de piso para área de Juegos en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts, incluye corte de juntas y sello	M2		$ 126.306,316		97,50	$ 15.393.582,00	96,98	$ 15.311.483,00	10,66%	96,98	10,66%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 18.140.904,00**		**$ 20.611.694,00**					
6	**INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**	UND	1,00	$ 7.667.482,866	$ 9.584.354,00	1,00	$ 9.584.354,00					
6.01	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$13.060.204,316	$ 16.325.255,00	1,00	$ 16.325.255,00					
6.02	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$11.993.869,116	$ 14.992.336,00	1,00	$ 14.992.336,00					
6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según	UND	1,00	$13.326.788,116	$ 16.658.485,00	1,00	$ 16.658.485,00					



N.P 7.04	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thiner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	ML		$ 229.658,767		63,88	$ 18.338.253,00	62,97	$ 18.077.016,00	12,58%	62,97	12,58%
N.P 7.05	Anclaje para baranda, Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)	UND		$ 75.684,291		12,00	$ 1.135.264,00	12,00	$ 1.135.264,00	0,79%	12,00	0,79%
N.P 7.06	Transporte de material pétreo y cemento	M3-KM		$ 1.153,000		1668,32	$ 2.404.461,00	1668,32	$ 2.404.461,00	1,67%	1.668,32	1,67%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 5.857.054,00**		**$ 28.756.267,00**					
												89,16469929578430%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente cuadro, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


Valor ejecutado estimado del Periodo:	$ 5.084.098,00
Valor total ejecutado acumulado:	**$ 5.659.780,00**

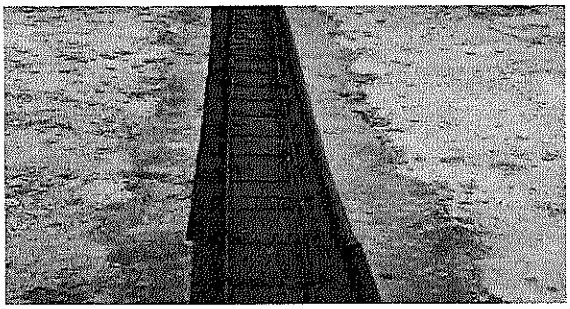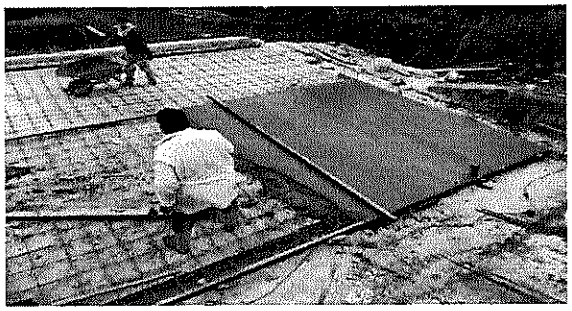Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I

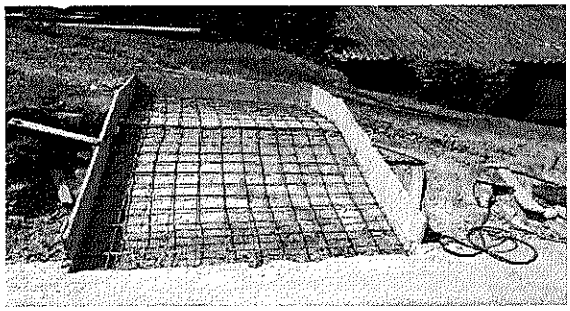
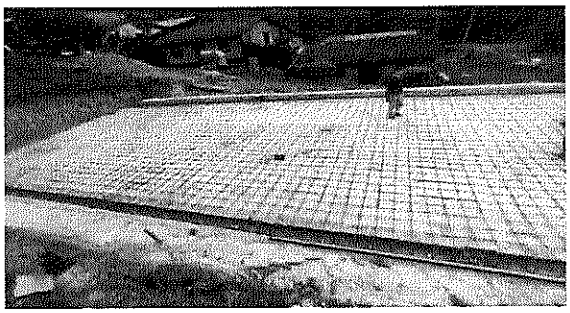



Placa de piso en concreto (rampa de acceso)

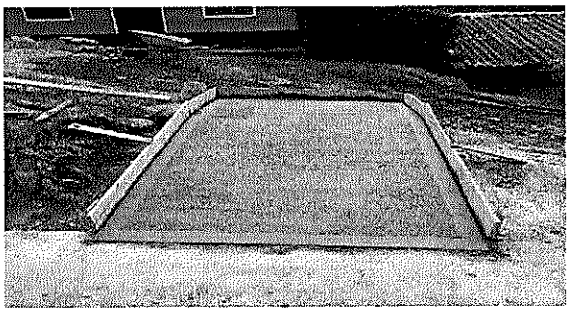



Cuneta en concreto


Construcción de pedestales en concreto

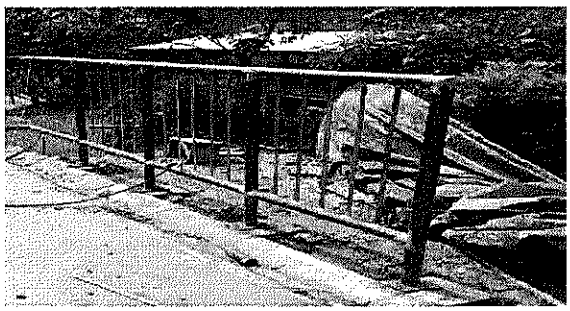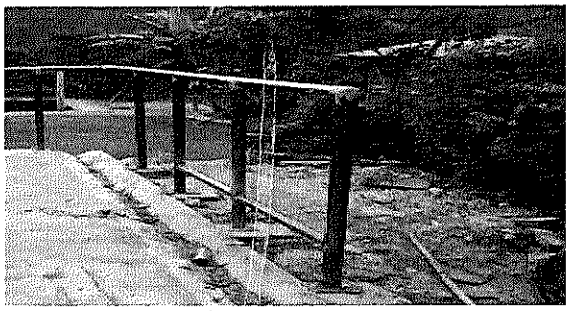Suminstro e instalacion de baranda metálica

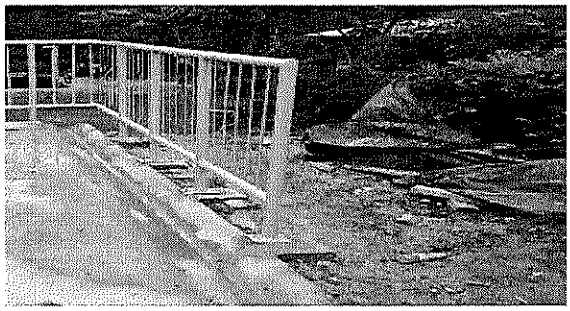



Anclaje para baranda

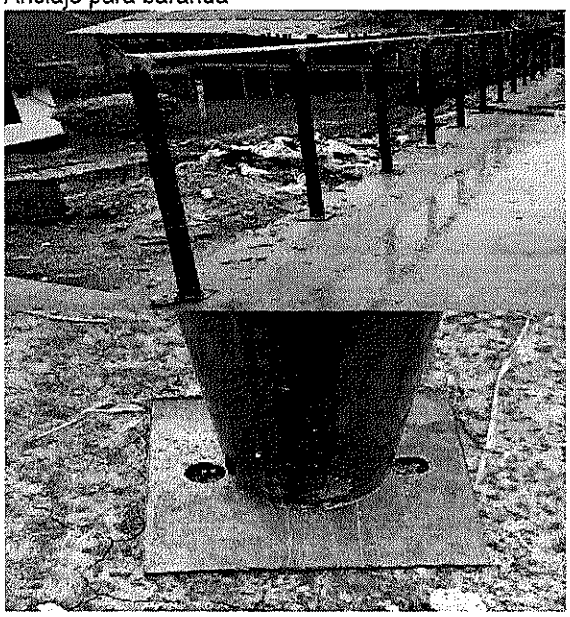



RESGUARDO INDÍGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH, MUNICIPIO DE LA ARGENTINA





Placa de piso en concreto (rampa de acceso)

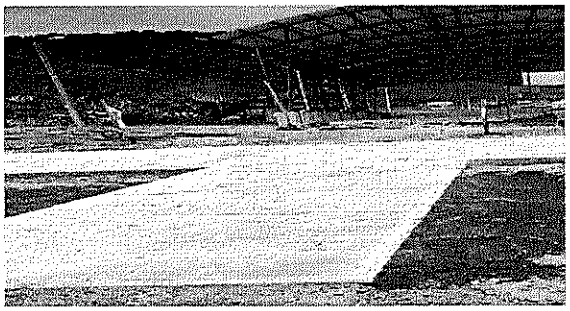


Placa de piso para area de Juegos en concreto

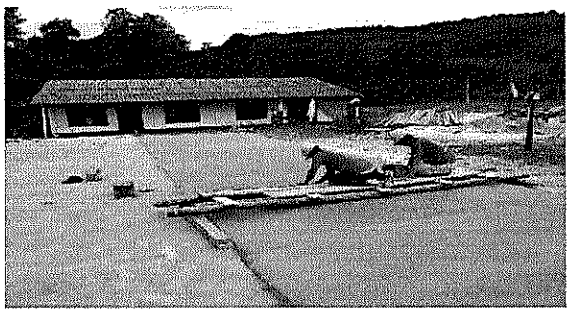


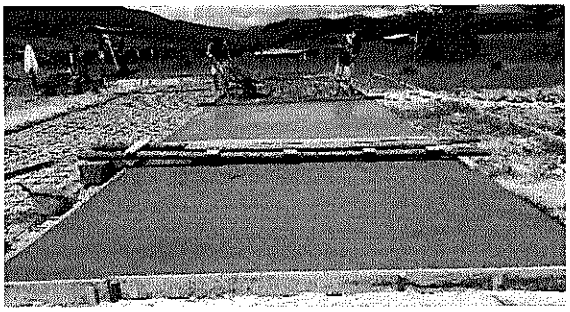

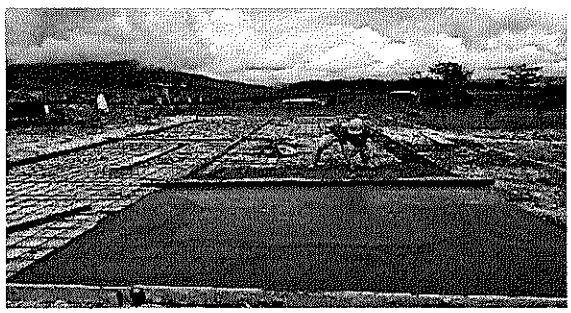



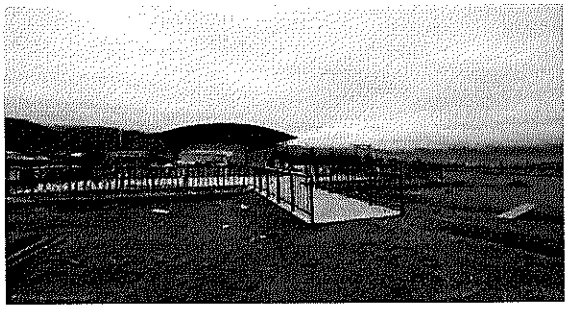

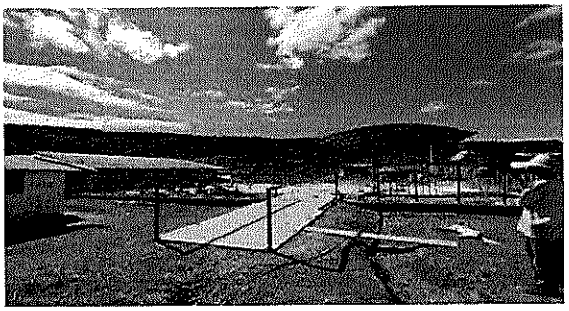



ARQ. BRAULIO ABSALON CEDEÑO ORTIZ	28/10/2024	Ing. KAROLL LISSETH BUITRAGO HERNANDEZ
FIRMA ORIGINAL **APOYO A LA SUPERVISIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo. Bo CONTRATISTA GESTIÓN INFRAESTRUCTURA**
