
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH 391 de 2023


INFORME MENSUAL No. 04 DE SUPERVISION

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por los Contratista de Obra e Interventoría desde el 03 **de DICIEMBRE DE 2024** hasta el 06 **de DICIEMBRE DE 2024.**

PARCIAL [X] **FINAL** [ ]

OBJETO: **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

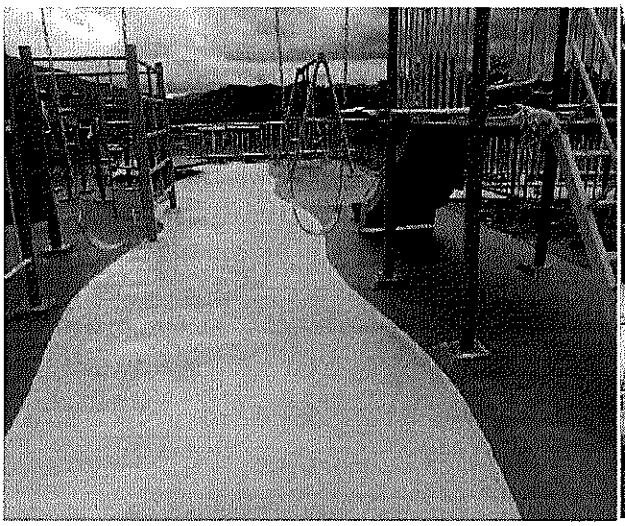

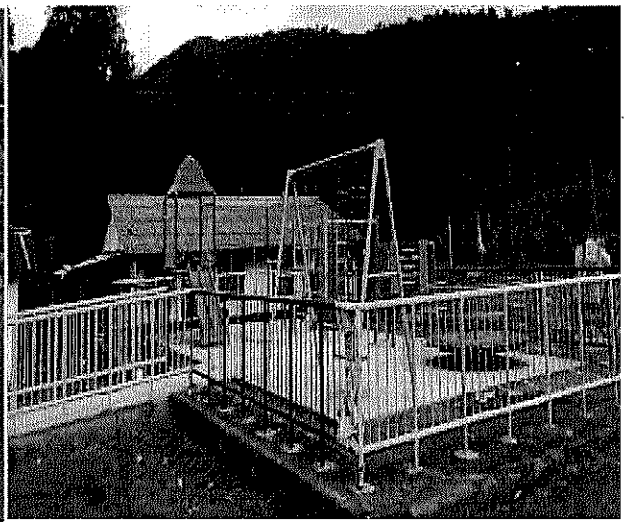

MUNICIPIO: NATAGA – LA ARGENTINA

DEPARTAMENTO: HUILA

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde el **03 de DICIEMBRE de 2024** hasta el **06 de DICIEMBRE de 2024**, en cumplimiento del contrato general de "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para lo cual se efectuará en el Resguardo Indígena Llano Buco en el Municipio de Nátaga y en el Resguardo Indígena Nasa Páez-PICKWE IKH en el municipio de La Argentina: LA **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Mediante cuadros anexos y registro fotográfico se pretende dejar constancia de los trabajos adelantados por la interventoría hasta lograr la culminación de los trabajos. En este informe se da a conocer las obras ejecutadas a la fecha de cada una de las actividades con un registro fotográfico mostrando la obra en ejecución.

2. JUSTIFICACIÓN

El espacio público es un lugar de uso colectivo y de convivencia social, donde se convierte en un elemento estructurante de la calidad de vida con los **PARQUES INFANTILES los cuales tienen el objetivo de brindar a la comunidad infantil con movilidad reducida escenarios para la recreación con las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar, mejorar y mantener la capacidad motriz, en un dinamizador de la ciudad y en un elemento que da soporte a los diferentes procesos y dinámicas del espacio urbano.** Por su parte, el ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, tienen como función la formación integral de las personas, preservar y mejorar la salud del ser humano. El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen un gasto público social, en la Constitución Política de Colombia, se constituye el derecho de todas las personas a la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre.

La baja práctica de deportes y la recreación en los diferentes municipios del Departamento del Huila, se relaciona con el mal estado de los escenarios recreativos o con la inexistencia de los mismos, y la falta de incentivos para la práctica a la recreación, lo que ocasiona incremento en los índices de sedentarismo que desembocan problemas de obesidad y que tienen como desenlace graves problemas de salud en la población Huilense.

El activar los espacios y escenarios recreativos de fácil acceso, desarrolla comportamientos saludables que reducen la inactividad física, estos están equipados para el acondicionamiento y desarrollo del bienestar

humano. Por consiguiente, el crear una cultura de fomento que permita el desarrollo de actividades no cotidianas, da apertura al diseño de hábitos participativos que fomenten los programas que el mismo gobierno viene desarrollando, lo que motivaría al disfrute y participación de ciudadanos que no se encuentran familiarizados con dichos espacios. El esfuerzo físico y la recreación no va ligado solamente al desarrollo de un deporte de alta competencia, si no a la dedicación que se proyecte el individuo para el logro de un objetivo, que domine ante cualquier adversidad, esa sensación de satisfacción y conlleve al mejoramiento del estado psicológico del mismo.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto tiene por objetivo la construcción de dos (02) parques infantiles, el primero localizado en el Resguardo indígena llano buco del municipio de Nátaga, y el segundo parque localizado en el Resguardo Indígena Nasa Páez - PICKWE IKH en el Municipio de la Argentina,, los cuales tienen las características de brindar a la comunidad infantil, adultos mayores con movilidad reducida escenarios para la recreación con las condiciones adecuadas para que puedan desarrollar, mejorar y mantener la capacidad motriz a los de niños, jóvenes y adultos de la población de nuestro departamento; en donde se contempla en la instalación de móviles infantiles para dicho objetivo.


3.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en dos Municipios del Departamento del Huila

1. **RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA**

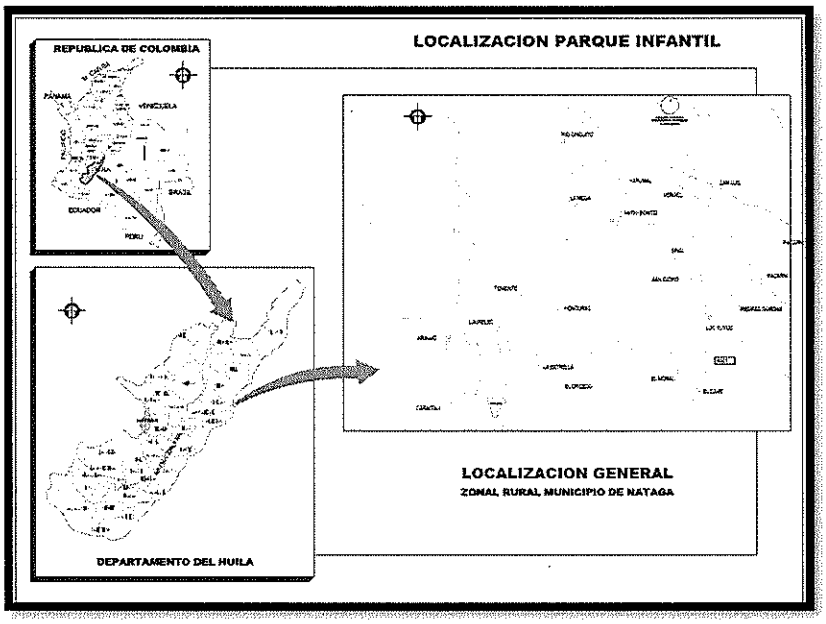

2. RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

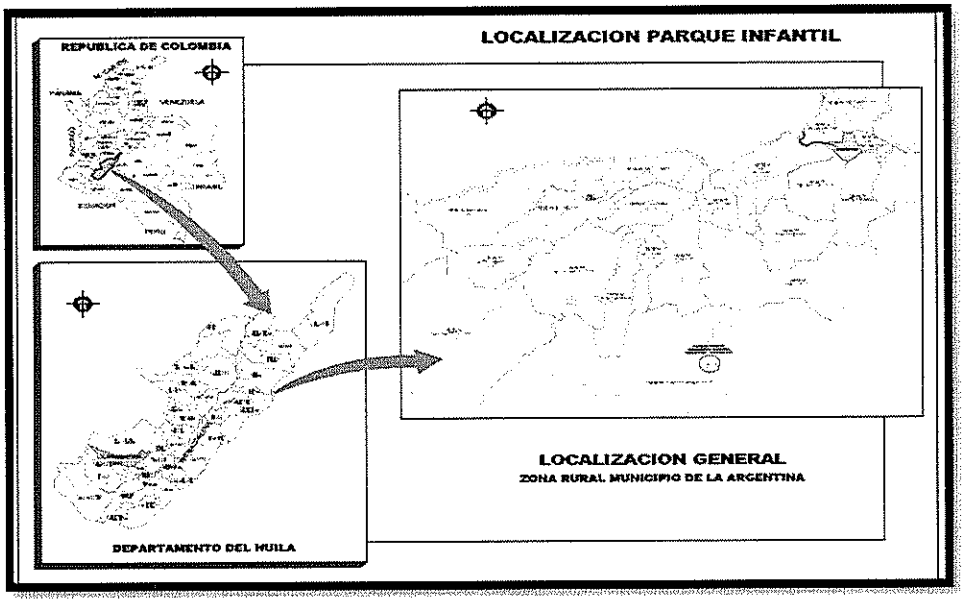

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Se realizará la construcción de dos (2) parques infantiles, los cuales contarán con la placa de contrapiso pintada y juegos infantiles que garanticen el esparcimiento en la utilización de los parques en su totalidad del escenario sin que se vea afectado por el horario del sector para la práctica deportiva en los municipios de Nátaga y La Argentina – departamento del Huila. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:

- PRELIMINARES
- MOVIMIENTO DE TIERRA
- CIMENTACIÓN
- ZONA VERDE
- PLACA DE CONTRAPISO
- INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES
- OBRAS COMPLEMENTARIAS

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

937

Que mediante carta de aceptación CMCIH391 de 2023, la entidad dio apertura al procedimiento de selección número IPMCH012 – 2023, la entidad adjudico al contratista **FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA.**

CONTRATO No.	CMCIH 391 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO 4CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".
CONTRATISTA:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA CC: 7.711.430 Celular: 313 294 9534 Correo Electrónico: faiverperdomo1@gmail.com
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (**$16.748.356,00**) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS (**$16.748.356,00**) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	09 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
OTROSÍ MODIFICATORIO N°1: 02-09-2024	Modificación a la cláusula 2 – plazo de contrato –
PLAZO TOTAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2024.
FECHA DE INICIO:	**29 de noviembre de 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO 1:	02 de septiembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28 de octubre de 2023
FECHA DE REINICIO 2:	03 de diciembre de 2024

FECHA TERMINACION:	07 de diciembre de 2024

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			CMCIH 391 DE 2023	
Objeto: " INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA " CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA , DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización 0%**	**Valor pagado**
Valor Anticipo		N.A		
Acta Parcial No. 1				
Acta Parcial No. 2				
Acta Recibo Final				
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$16.748.356,00	**$ 0**	**$16.748.356,00**	**$ 0**	**$16.748.356,00**

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	**FECHA (dd/mm/aaaa)**	**DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACION**
Firma Contrato	09 de noviembre de 2023			
Iniciación	29 de noviembre de 2023	30		28 de febrero de 2024
Suspensión No. 1	29 de diciembre de 2024		248	
Reiniciación No. 1	02 de septiembre de 2024	56		01 de noviembre de 2024
Otro si No. 1 Modificación a la cláusula 2 – plazo de contrato –	02 de septiembre de 2024			
Suspensión No. 2	28 de octubre de 2024		36	
Reiniciación No. 2	03 de diciembre de 2024	4		07 de diciembre de 2024
Terminación Cto.	**07 de diciembre de 2024**			
TOTAL DIAS		**90**	**284**	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

434

Tipo de Acta	No.	Fecha
FIRMA CONTRATO	1	09 de noviembre de 2023
ACTA DE INICIO	1	29 de noviembre de 2023
ACTA DE JUSTIFICACION *N°* 1 A LA SUSPENSIÓN *N°* 1	1	29 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN *N°* 1	1	29 de diciembre de 2023
ACTA DE JUSTIFICACION *N°* 2 A LA REINICIO *N°* 1	2	02 de septiembre de 2024
ACTA DE REINICIO *N°* 1	1	02 de septiembre de 2024
Otro si No. 1 Modificación a la cláusula 2 – plazo de contrato –	3	02 de septiembre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACION *N° 4* A LA SUSPENSIÓN *N° 2*	4	28 de octubre de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN *N° 2*	2	28 de octubre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACION *N° 5* A LA REINICIO *N° 2*	2	03 de diciembre de 2024
ACTA DE REINICIO *N° 2*	1	03 de diciembre de 2024

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000681	VALOR	VIGENCIA
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2023000704 DE OCTUBRE 06 DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410138- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F2022.		$ 8.374.178.00	2023
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2023000703 DE OCTUBRE 06 DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410139- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F2022.		$ 8.374.178.00	2023

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2024000492	VALOR	VIGENCIA
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2024000492 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2024, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410138- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F2022.		$ 8.374.178.00	2024
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2024000492 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2024, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410139- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F2022.		$ 8.374.178.00	

4.1.2. RELACION PERSONAL

PROFESIONAL INTERVENTORÍA		
NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
FAIVER EDUARDO PERDOMO (R.L)	7.711.430	Representante legal- Director Noviembre 2023 - Diciembre 2023
DIEGO ALEJANDRO PEREZ GONZALEZ	1193596072	Director de interventoría desde septiembre 2024 - Diciembre 2024

4.1.3. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533016968		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010185	0	10/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	10/08/2024	$3.349.671,20
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/11/2023	02/02/2027	$1.674.835,60
				Calidad del Servicio	5 años, 0 meses y 0 día a partir de la suscripción del acta de recibo		$3.349.671,20

435

					de la obra objeto de la Interventoria.		
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					**No. Certificado**	533016972	
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**		**VIGENCIA**		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002047	0	10/11/2023		09/11/2023	09/02/2024	$ 232.000.000

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				**No. Certificado**			
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010185	2	06/12/2023	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	29/08/2024	$3.349.671,20
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/02/2024	01/03/2029	$1.674.835,60
				Calidad del Servicio	5 años, 0 meses y 0 día a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra objeto de la Interventoria.		$3.349.671,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					**No. Certificado**		
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**		**VIGENCIA**		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002047	2	06/12/2023		29/11/2023	29/02/2024	$ 232.000.000

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				**No. Certificado**			
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010185	3	20/09/2024	Cumplimiento del contrato	02/09/2024	05/05/2025	$3.349.671,20
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/09/2024	02/09/2024	$1.674.835,60
				Calidad del Servicio	05/11/2024	05/11/2024	$3.349.671,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					**No. Certificado**		
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**		**VIGENCIA**		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002047	3	20/09/2024		29/11/2023	05/11/2024	$ 232.000.000

Póliza actualizada x OTRO SI MODIFICATORIO VIGENCIA FISCAL:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				**No. Certificado**			
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010185	4	20/09/2024	Cumplimiento del contrato	02/09/2024	05/05/2025	$3.349.671,20
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	02/09/2024	02/09/2024	$1.674.835,60
				Calidad del Servicio	05/11/2024	05/11/2024	$3.349.671,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					**No. Certificado**		
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**		**VIGENCIA**		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002047	3	20/09/2024		29/11/2023	29/02/2024	$ 232.000.000

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 2 - ACTA DE REINICIO No. 2:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				**No. Certificado**			
ASEGURADORA	**No.**	**ENDOZO**	**FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	**DESDE (dd/mm/aaaa)**	**VALOR ASEGURADO**
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010185	4	04/12/2024	Cumplimiento del contrato	03/12/2024	10/06/2025	$3.349.671,20
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	N.A	N.A	
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	03/12/2024	05/12/2027	$1.674.835,60

436

				Calidad del Servicio	03/12/2024	10/12/2029	$3.349.671,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					No. Certificado		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002047	4	20/09/2024		29/11/2023	10/12/2024	$ 232.000.000

4.2. CONTRATO DE OBRA

Que mediante la Resolución 316 del 26 de septiembre de 2023 la Entidad abrió el Proceso de Contratación No. SAMCIH008-2023, Que por medio de la Resolución 412 del 07 de noviembre de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **CONSORCIO LA ESPERANZA**

CONTRATO No.	CSAMCIH431 de 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	"CONSTRUCCION Y ADECUACION PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA"
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA ESPERANZA NIT: 901.736.950-1. Representante Legal: **RAMIRO POLANIA FERNANDEZ** Celular: 3182916697 Correo Electrónico: consorciolaesperanza@hotmail.com
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (**$287.286.960,00**) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (**$287.286.960,00**) M/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	07 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la presente vigencia fiscal.
OTROSÍ MODIFICATORIO N°1: 02-09-2024	Modificación a la cláusula 4 – plazo de contrato- y clausula 6 -anticipo-

OTROSÍ MODIFICATORIO N°2: 21-10-2024	Modificación clausula 3 -alcance del objeto-
PLAZO TOTAL:	TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución, y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la presente vigencia fiscal 2024
FECHA DE INICIO:	**29 de noviembre de 2023**
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	29 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO 1:	02 de septiembre de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	28 de octubre de 2023
FECHA DE REINICIO 2:	03 de diciembre de 2024
FECHA TERMINACION:	**07 de diciembre de 2024**

Estado Financiero del Contrato de Obra			**CSAMCIH 431 DE 2023**	
Objeto: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA , DEPARTAMENTO DEL HUILA "				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización 25%**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (25%)	12/09/2024	$ 71.821.740,00	$ 0,00	$ 71.821.740,00
Acta Parcial No. 1	06/12/2024	$ 256.216.798,00	$ 64.054.199,50	$ 192.162.598,50
Acta Parcial No. 2				
Acta Parcial No. 3				
Acta Recibo Final No.4				
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 287.286.960,00	$ 0,00	$ 287.286.960,00	$ 256.216.798,00	$ 31.070.162,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	**FECHA (dd/mm/aaaa)**	**DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
Firma Contrato	27 de octubre de 2023			
Iniciación	29 de noviembre de 2023	30		28 de febrero de 2024
Suspensión No. 1	29 de diciembre de 2024		248	
Reiniciación No. 1	02 de septiembre de 2024	56		01 de noviembre de 2024
Otro si No. 1 Modificación a la	02 de septiembre de 2024			

437

cláusula 2 – plazo de contrato –				
Otro si No. 2 Modificación clausula 3 -alcance del objeto	21 de octubre de 2024		36	
Suspensión No. 2	28 de octubre de 2024	4		
Reiniciación No. 2	03 de diciembre de 2024			07 de diciembre de 2024
Terminación Cto.	**07 de diciembre de 2024**	**90**	**284**	
TOTAL DIAS		90		

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
FIRMA CONTRATO		07 de noviembre de 2023
ACTA DE INICIO	1	29 de noviembre de 2023
ACTA DE JUSTIFICACION *N°* 1 A LA SUSPENSIÓN *N°* 1	1	29 de diciembre de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN *N°* 1	1	29 de diciembre de 2023
ACTA DE JUSTIFICACION *N°* 2 A LA REINICIO *N°* 1	2	02 de septiembre de 2024
ACTA DE REINICIO *N°* 1	1	02 de septiembre de 2024
Otro si No. 1 Modificación a la cláusula 2 – plazo de contrato –	3	02 de septiembre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACION *N° 4* MAYORES Y MENORES CANTIDADES Y CREACION ITEM NO PREISTOS.	4	10 de octubre de 2024
Otro si No. 2 Modificación clausula 3 -alcance del objeto	4	21 de octubre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACION *N° 5* A LA SUSPENSIÓN *N° 2*	5	28 de octubre de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN *N° 2*	2	28 de octubre de 2024
ACTA DE JUSTIFICACION *N° 6* A LA REINICIO *N° 2*	2	03 de diciembre de 2024
ACTA DE REINICIO *N° 2*	1	03 de diciembre de 2024

4.3. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000698	VALOR	VIGENCIA
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2023000686 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410138- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN		$ 143.643.480,00	2023

EL MUNICIPIO DE NATAGA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES – F2022.		

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000699	VALOR	VIGENCIA
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2023, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2023000687 DE SEPTIEMBRE 22 DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410139- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES – F2022.		$ 143.643.480,00	2023

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2024000512	VALOR	VIGENCIA
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2024000491 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410138- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES – F2022.		$ 143.643.480,00	2024
EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGARÁ CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024, CONFORME SE DESPRENDE DEL CDP NO. 2024000491 DE SEPTIEMBRE 30 DE 2023, RUBRO 2.3.2.02.02.005 DENOMINADO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN – PROYECTO 2023004410139- CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA - DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES – F2022.		$ 143.643.480,00	

4.4. RELACION PERSONAL

PROFESIONAL OBRA		
NOMBRE YAPELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
GERMAN TRUJILLO TRUJILLO	12122087	DIRECTOR DE OBRA
ALEXANDER JOVEN YUSTRES	12137786	RESIDENTE DE OBRA 1
ELKIN RAMIRO POLANIA BERNAL	1075238943	RESIDENTE DE OBRA 2

438

LEONARDO RAMIREZ TROCHEZ	12272765	MAESTRO DE OBRA
JOB DANIEL CAICEDO BUITRAGO	1075300058	OFICIAL
MARIA FERNANDA GUAHUÑA PEÑA	1010242828	AYUDANTE
DIEGO ROBERTO DIMATE	80071073	AYUDANTE
SABOGAL URUEÑA ANDRES FELIPE	1075314032	AYUDANTE

4.5. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-44-101431024		24/11/2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	17/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	17/02/2024	17/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-40-101223067		24/11/2023	17/11/2023	17/02/2024

POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-44-101431024		06/09/2024	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	29/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	29/11/2023	29/08/2024

				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/11/2023	01/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	29/02/2024	01/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-40-101223067		06/09/2024	17/11/2023	02/11/2024

POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO No. 01

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-44-101431024		06/09/2024	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	02/05/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/02/2029
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/11/2023	02/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	29/02/2024	01/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-40-101223067		06/09/2024	17/11/2023	02/11/2024

POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE SUSPENCIÓN Y REINICIO No. 02

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-44-101431024		03/12/2024	Cumplimiento del contrato	29/11/2023	08/06/2025

639

				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	08/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	29/11/2023	08/12/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	29/02/2024	01/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL					
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
Seguros del estado	21-40-101223067		03/12/2024	17/11/2023	08/12/2024

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- En el mes de noviembre del 2023, la Ingeniera **KAROLL LISSETH BUITRAGO HERNANDEZ** es designada mediante oficio por la Directora del INDERHUILA la Arquitecta **MIGDONIA PATIÑO ARIAS**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH391 – 2023** cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA", mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. IPMCIH012-2023.

- El día 16 de febrero del 2024, el arquitecto **BRAULIO ABSALON CEDEÑO ORTIZ** es designado mediante oficio por el Director del INDERHUILA el señor **FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH391 – 2023** cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA", mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. IPMCIH012-2023.

- El día 10 de julio del 2024, el arquitecto **BRAULIO ABSALON CEDEÑO ORTIZ** es designado mediante oficio por el Director del INDERHUILA el señor **FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH391 – 2023** cuyo objeto es la INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA Y EN EL RESGUARDO INDÍGENA NASA

PÁEZ-PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA", mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. IPMCIH012-2023.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO POR EL APOYO A LA SUPERVISION

Dentro de las actividades desarrolladas se tiene las siguientes:

1. Se suscribe acta de Reiniciación No. 2, de fecha 03 de diciembre de 2024.

2. Se presenta acta parcial No.1 de fecha 06 de diciembre de 2024.

3. Que durante el presente periodo se ha venido teniendo contacto vía telefónica y mediante correo con el interventor **FAIVER PERDOMO POLANIA.**

4. Se le solicito a la interventoría conforme a lo establecido en el contrato y el cronograma de trabajo, se requiere la entrega de los informes de obra e interventoría correspondientes al mes en curso. Dicha entrega deberá realizarse con una antelación de cinco (5) días antes del vencimiento del mes, conforme a los plazos establecidos para el correcto seguimiento y evaluación de los avances de la obra.

7. DECRIPCIÓN DEL AVANCE DEL PERIODO D ELAS ACTIVIDADES DE OBRA / INTERVENTORIA

- Instalación de platina para pedestal de juego (incluye 4 pernos ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/4")
- Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.
- Jardines perimetrales en el resguardo de la Argentina.
- Se instalaron los siete móviles de los parques infantiles de los resguardos de Nátaga y La Argentina.
- Se instalo la baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thiner, anticorrosivo y pintura.

8. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUCION DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	% EJECUCION
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO EN EL MUNICIPIO DE NATAGA, DEPARTAMENTO DEL HUILA												
1	PRELIMINARES											
1.01	Localización y replanteo.	M2	126,80	$ 3.632,046	$ 575.679,00	130,75	$ 593.613,00				130,75	0,41%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 575.679,00**		**$ 593.613,00**					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	43,40	$ 46.957,514	$ 2.547.445,00	62,42	$ 3.663.860,00				62,42	2,55%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	27,50	$ 85.589,276	$ 2.942.131,00	121,36	$ 12.983.893,00				121,36	9,04%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 5.489.576,00**		**$ 16.647.753,00**					
3	CIMENTACIÓN											
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	110,00	$ 34.718,230	$ 4.773.757,00	9,66	$ 419.223,00				9,66	0,29%
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	4,05	$ 645.426,944	$ 3.267.474,00	1,88	$ 1.516.753,00				1,88	1,06%
3.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	KG	3.316,00	$ 7.886,478	$ 32.689.451,00	882,58	$ 8.700.560,00				882,58	6,06%
NP-3.04	Suministro e instalación de platina para pedestal de juego (incluye 4 pernos ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/4")	UND		$ 152.519,000		24,00	$ 4.575.570,00	24,00	$ 4.575.570,00	3,19%	24,00	3,19%

446

	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 40.730.682,00**		**$ 15.212.106,00**					
4	**ZONA VERDE**											
4.01	Jardines perimetrales	M2	28,00	$ 90.788,488	$ 3.177.597,00							0,00%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3.177.597,00**		**$ 15.212.106,00**					
5	**PLACA DE CONTRAPISO**											
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	110,00	$ 85.770,440	$ 11.793.436,00	6,40	$ 686.164,00				6,40	0,48%
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	110,00	$ 24.376,298	$ 3.351.741,00	111,40	$ 3.394.399,00	111,40	$ 3.394.399,00	2,36%	111,40	2,36%
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	28,00	$ 85.592,198	$ 2.995.727,00	30,60	$ 3.273.902,00				30,60	2,28%
N.P 5.04	Placa de piso para área de Juegos en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts, incluye corte de juntas y sello	M2		$ 126.306,316		97,50	$ 15.393.582,00				97,50	10,72%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 18.140.904,00**		**$ 22.748.047,00**					
6	**INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**	UND	1,00	$ 7.667.482,866	$ 9.584.354,00	1,00	$ 9.584.354,00	1,00	$ 9.584.354,00	6,67%	1,00	6,67%
6.01	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$13.060.204,316	$ 16.325.255,00	1,00	$ 16.325.255,00	1,00	$ 16.325.255,00	11,37%	1,00	11,37%
6.02	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$11.993.869,116	$ 14.992.336,00	1,00	$ 14.992.336,00	1,00	$ 14.992.336,00	10,44%	1,00	10,44%
6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según	UND	1,00	$13.326.788,116	$ 16.658.485,00	1,00	$ 16.658.485,00	1,00	$ 16.658.485,00	11,60%	1,00	11,60%

	especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación											
6.04	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 1.996.976,616	$ 2.496.221,00	1,00	$ 2.496.221,00	1,00	$ 2.496.221,00	1,74%	1,00	1,74%
6.05	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 4.129.647,016	$ 5.162.059,00	1,00	$ 5.162.059,00	1,00	$ 5.162.059,00	3,59%	1,00	3,59%
6.06	Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 3.562.623,176	$ 4.453.279,00	1,00	$ 4.453.279,00	1,00	$ 4.453.279,00	3,10%	1,00	3,10%
6.07	Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 7.667.482,866	$ 9.584.354,00	1,00	$ 9.584.354,00	1,00	$ 9.584.354,00	6,67%	1,00	6,67%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 69.671.989,00**		**$ 69.671.989,00**					
7	**BRAS COMPLEMENTARIAS**											
7.01	Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	M3	10,00	$ 324.900,102	$ 4.061.251,00	17,88	$ 7.261.517,00				17,88	5,06%
7.02	Baranda metálica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	9,00	$ 159.626,912	$ 1.795.803,00							0,00%
N.P 7.03	Construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)	UND		$ 105.819,831		3,00	$ 396.824,00				3,00	0,28%

N.P 7.04	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thiner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	ML		$ 229.658,767		17,00	$ 4.880.249,00				17,00	3,40%
N.P 7.05	Anclaje para baranda, Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)	UND		$ 75.684,291		15,00	$ 1.419.080,00				15,00	0,99%
N.P 7.06	Transporte de material pétreo y cemento	M3-KM		$ 1.153,000		3338,98	$ 4.812.301,00				3338,98	3,35%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 5.857.054,00**		**$ 18.769.971,00**					
										54,05%		**100,00%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente cuadro, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

Valor ejecutado estimado del Periodo:	$ 77.641.958,00
Valor total ejecutado acumulado:	**$ 143.643.480,00**

CONDICIONES CONTRACTUALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		EJECUCION DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	% EJECUCION
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA NASA PÁEZ - PICKWE IKH EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA												
1	PRELIMINARES											
1.01	Localización y replanteo.	M2	126,80	$ 3.632,046	$ 575.679,00	194,50	$ 883.041,00				184,93	0,58%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 575.679,00**		**$ 883.041,00**					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	43,40	$ 46.957,514	$ 2.547.445,00	48,41	$ 2.841.517,00				48,17	1,97%
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	27,50	$ 85.589,276	$ 2.942.131,00	23,82	$ 2.548.421,00				23,71	1,77%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 5.489.576,00**		**$ 5.389.938,00**					
3	CIMENTACIÓN											
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	110,00	$ 34.718,230	$ 4.773.757,00	9,66	$ 419.223,00				9,66	0,29%
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	4,05	$ 645.426,944	$ 3.267.474,00	1,88	$ 1.516.753,00				1,88	1,06%
3.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	KG	3.316,00	$ 7.886,478	$ 32.689.451,00	920,44	$ 9.073.787,00				918,98	6,31%
NP-3.04	Suministro e instalación de platina para pedestal de juego (incluye 4 pernos ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/4")	UND		$ 152.519,000		24,00	$ 4.575.570,00	24,00	$ 4.575.570,00	3,19%	24,00	3,19%

	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 40.730.682,00**		**$ 15.585.333,00**					
4	**ZONA VERDE**											
4.01	Jardines perimetrales	M2	28,00	$ 90.788,488	$ 3.177.597,00	24,19	$ 2.745.217,00	24,19	$ 2.745.217,00	1,91%		1,91%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 3.177.597,00**		**$ 2.745.217,00**					
5	**PLACA DE CONTRAPISO**											
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	110,00	$ 85.770,440	$ 11.793.436,00	15,43	$ 1.654.297,00				15,43	1,15%
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	110,00	$ 24.376,298	$ 3.351.741,00	116,96	$ 3.563.815,00	116,44	$ 3.547.970,00	2,47%	116,44	2,47%
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	28,00	$ 85.592,198	$ 2.995.727,00						0,00	0,00%
N.P 5.04	Placa de piso para área de Juegos en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts, incluye corte de juntas y sello	M2		$ 126.306,316		97,50	$ 15.393.582,00				96,98	10,66%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 18.140.904,00**		**$ 20.611.694,00**					
6	**INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**											
6.01	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 7.667.482,866	$ 9.584.354,00	1,00	$ 9.584.354,00	1,00	$ 9.584.354,00	6,67%	1,00	6,67%
6.02	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$13.060.204,316	$ 16.325.255,00	1,00	$ 16.325.255,00	1,00	$ 16.325.255,00	11,37%	1,00	11,37%
6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según	UND	1,00	$11.993.869,116	$ 14.992.336,00	1,00	$ 14.992.336,00	1,00	$ 14.992.336,00	10,44%	1,00	10,44%

	especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación											
6.04	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$13.326.788,116	$ 16.658.485,00	1,00	$ 16.658.485,00	1,00	$ 16.658.485,00	11,60%	1,00	11,60%
6.05	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 1.996.976,616	$ 2.496.221,00	1,00	$ 2.496.221,00	1,00	$ 2.496.221,00	1,74%	1,00	1,74%
6.06	Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 4.129.647,016	$ 5.162.059,00	1,00	$ 5.162.059,00	1,00	$ 5.162.059,00	3,59%	1,00	3,59%
6.07	Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	$ 3.562.623,176	$ 4.453.279,00	1,00	$ 4.453.279,00	1,00	$ 4.453.279,00	3,10%	1,00	3,10%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 69.671.989,00**		**$ 69.671.989,00**					
7	**BRAS COMPLEMENTARIAS**											
7.01	Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	M3	10,00	$ 324.900,102	$ 4.061.251,00						0,00	0,00%
7.02	Baranda metálica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	9,00	$ 159.626,912	$ 1.795.803,00						0,00	0,00%
N.P 7.03	Construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)	UND		$ 105.819,831		52,00	$ 6.878.289,00				50,00	4,60%

N.P 7.04	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thiner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	ML		$ 229.658,767		63,88	$ 18.338.253,00				62,97	12,58%
N.P 7.05	Anclaje para baranda, Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)	UND		$ 75.684,291		12,00	$ 1.135.264,00				12,00	0,79%
N.P 7.06	Transporte de material pétreo y cemento	M3-KM		$ 1.153,000		1668,32	$ 2.404.461,00				1.668,32	1,67%
	SUB-TOTAL CAPITULO				**$ 5.857.054,00**		**$ 28.756.267,00**					
										56,07%		**99,51%**

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente cuadro, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.


Valor ejecutado estimado del Periodo:	$ 80.540.747,00
Valor total ejecutado acumulado:	**$ 142.936.054,00**



444

1. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO


RESGUARDO INDIGENA LLANO BUCO, MUNICIPIO DE NATAGA

Suministro e instalación de platina para pedestal de juego

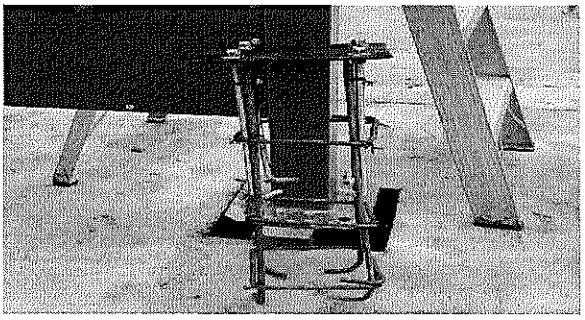

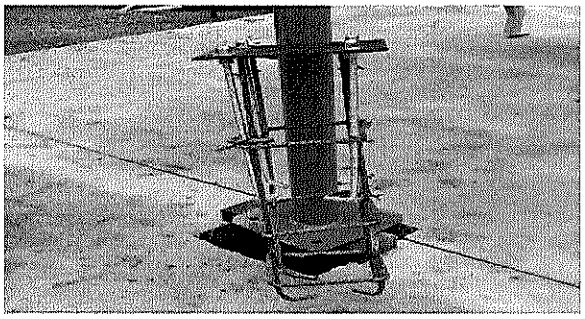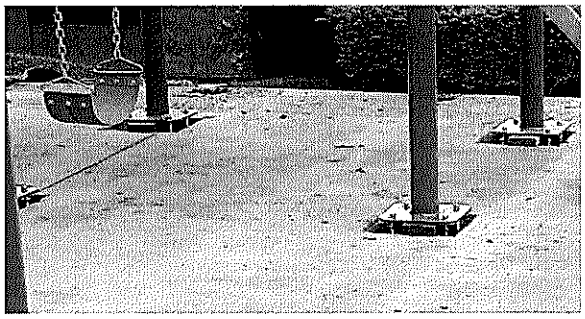Suministro e instalación de baranda metálica

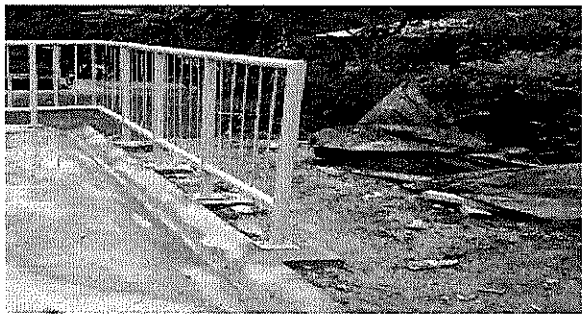


Módulos infantiles recreativos










445


RESGUARDO INDÍGENA NASA PAEZ - PICKWE IKH, MUNICIPIO DE LA ARGENTINA

Suministro e instalación de platina para pedestal de juego

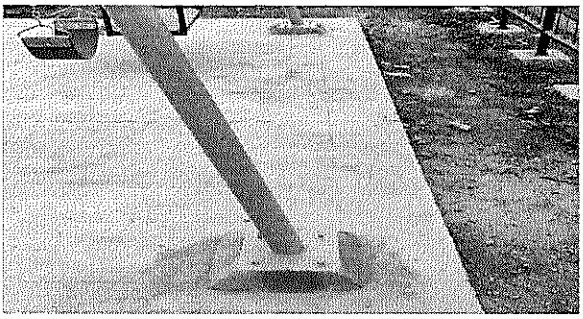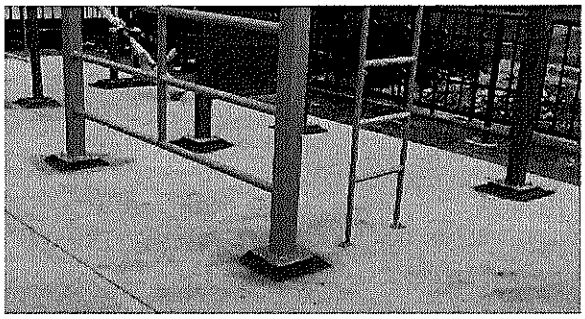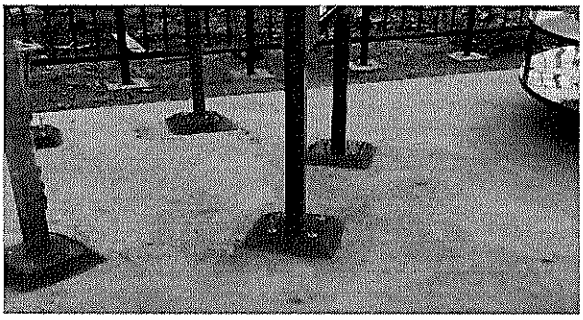


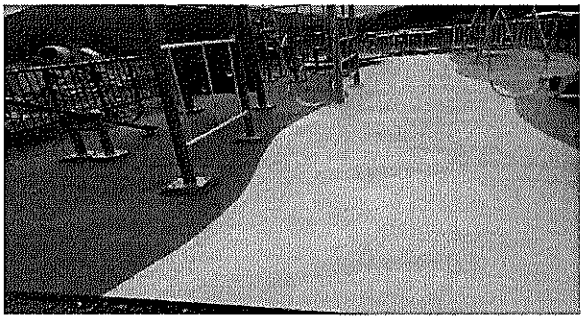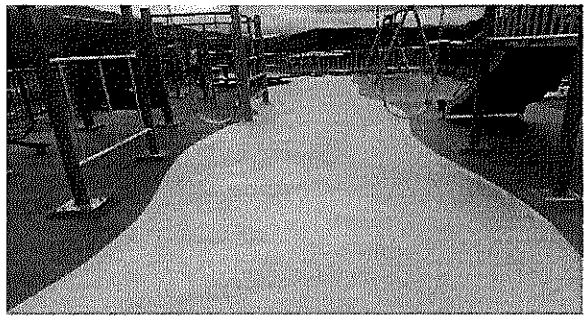



Pintura en acrílico antideslizante

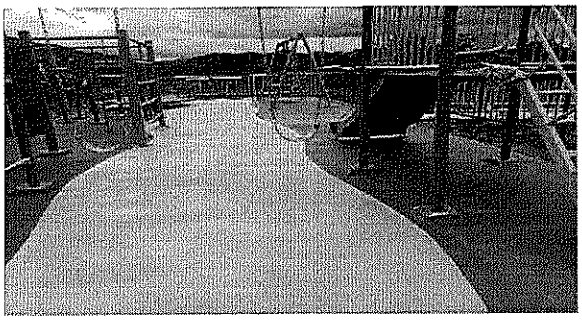



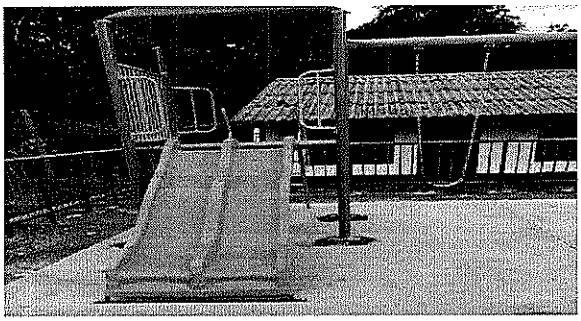


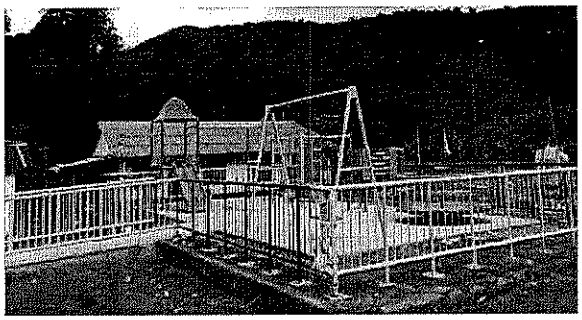Módulos infantiles recreativos




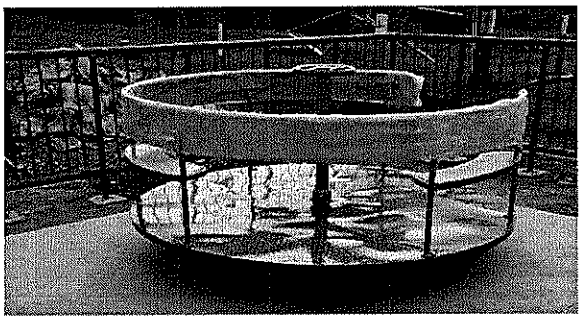

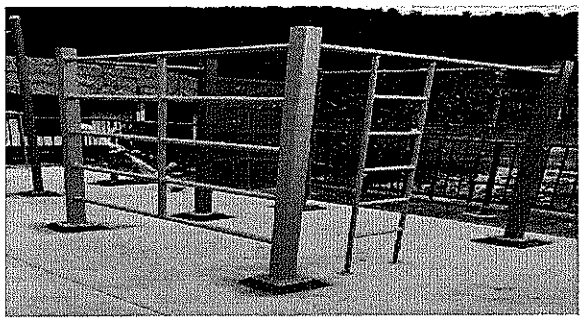



446

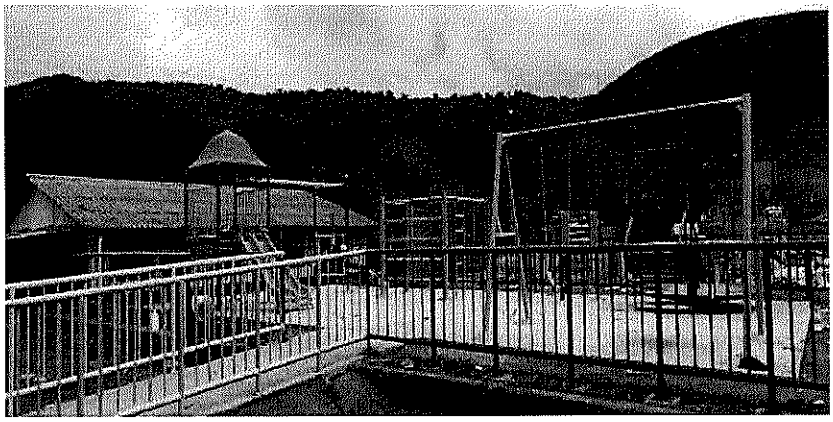

ARQ. BRAULIO ABSALON CEDEÑO ORTIZ	06/12/2024	Ing. KAROLL LISSETH BUITRAGO HERNANDEZ
FIRMA ORIGINAL **APOYO A LA SUPERVISIÓN**	**FECHA DE ENTREGA**	FIRMA ORIGINAL **Vo. Bo CONTRATISTA GESTIÓN INFRAESTRUCTURA**
