MINCULTURA-CONT-/- N°15/2025

Ibagué, 4 de diciembre de 2025

Señores
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio e Interventoría RYM
Bogotá, D C.

REF: CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 3)".

Asunto: Solicitud de prorroga al contrato 1749-2025

Cordial saludo

Mediante el presente nos permitimos presentar los diferentes argumentos por los cuales se hace necesaria una prórroga al contrato, teniendo en cuenta diversas razones donde debe prevalecer el principio de planeación el cual fue claramente establecido dentro del pliego de condiciones donde se establece que el proyecto tenía un plazo de ejecución de seis (6) meses.

Lo anterior se puede evidenciar claramente en el anexo "*013_Estudio Previo*" más precisamente en la página 10 del mencionado documento en el inciso d del numeral 2. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR como se muestra a continuación:

d. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de cada contrato será acorde a cada proyecto contados a partir de la fecha de inicio del contrato en SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

LOTE	PROYECTO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DEL CONTRATO
1	Biblioteca Pública en Atanquez	Cinco (5) meses	Cinco (5) meses
	Centro Cultural de Santa Rosa del Sur	Cinco (5) meses	
2	Casa de saberes ancestrales Villa Rica	Cinco (5) meses	Cinco (5) meses
	Casa de saberes ancestrales Guachené	Cinco (5) meses	
3	Centro Cultural de Novita	Cinco (5) meses	Seis (6) meses
	Centro Cultural de Jurado	Seis (6) meses	

Ilustración 1. Extraída del documento 013_Estudio Previo pagina 10.

De la misma forma se indica claramente el plazo planificado por la entidad contratante en el documento "*003_Documento Base-Pliego de condiciones Definitivo MC-LPO-0001-2025*", más específicamente en el numeral 1. CAPITULO I INFORMACIÓN GENERAL, de la página 6 del documento antes mencionado, como se muestra a continuación:

DOCUMENTOS TIPO – LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

1. CAPÍTULO I INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETO, PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO Y UBICACIÓN

El objeto, Presupuesto Oficial, plazo y ubicación del proyecto objeto del Proceso de Contratación se identifican en la siguiente tabla:

Número de lote	Objeto del proyecto, lote o grupo	Plazo del Contrato	Valor Presupuesto Oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del Contrato
1	**Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias.**	Cinco (5) meses	$ 2.087.127.804 (1.466,19 SMMLV)	• Biblioteca Atanquez Valledupar - Cesar. • Centro Cultural Santa Rosa del Sur - Bolívar. (Zona Urbana)
2	**Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias.**	Cinco (5) meses	$ 2.441.345.760 (1,715,03 SMMLV)	• Casa de Saberes ancestrales Villa Rica – Cauca • Casa de saberes ancestrales Guachené (Cauca) (Zona Urbana)
3	**Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias.**	Seis (6) meses	$ 2.902.416.311 (2.038,93 SMMLV)	• Centro Cultural Novita – Chocó • Centro cultural Jurado – Chocó (Zona Urbana)

Ilustración 2. Extraída del documento 003_Documento Base-Pliego de condiciones Definitivo MC-LPO-0001-2025 pagina 6.

Lo anterior se ilustra con el ánimo de que la interventoría del contrato que nos atañe y la entidad contratante en este caso el MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, tengan presente que la prórroga requerida resulta ser una necesidad inobjetable para el debido cumplimiento del contrato de obra, teniendo en cuenta que el acta de inicio del contrato se realizó hasta el día 27 de octubre del presente año, es decir, realmente y de acuerdo a la planificación realizada por la entidad el plazo de finalización debería ser hasta el 27 de abril del 2026.

De igual forma resulta importante mencionar que por temas de vigencias del presente año, el contrato indica que la finalización es al 31 de diciembre del año en curso, sin embargo, es de conocimiento pleno por las partes que ejecutar una obra de la magnitud del presente contrato (Obra nueva) y en los sitios de difícil acceso como lo es Novita y Jurado, resultaría una fecha irreal y fuera de todo concepto técnico por el que inicialmente se contempló el plazo de 6 meses.

Ahora bien, resulta claro que el proyecto requiere de un plazo mínimo de cinco meses para el cumplimiento a cabalidad de su alcance, adicional me permito relacionar todas las fechas y posibles

circunstancias que han dado lugar a iniciar el contrato noventa (90) días posterior a la fecha de suscripción, lo cual hace que la prórroga tenga un fundamento adicional al mencionado previamente.

- 18 de julio de 2025: El proceso fue adjudicado.
- 29 de julio de 2025: Firma del contrato.
- 4 de agosto de 2025: Reunión en oficinas del ministerio de cultura.
- 9 de agosto de 2025: Entregas de oficios 1, 2 y 3 (referentes a observaciones por inconsistencias en planos estructurales de ambos frentes).
- 28 de agosto de 2025: Visita al municipio de jurado por presuntos problemas de orden público en compañía del ministerio y la interventoría.
- 29 de agosto de 2025: Entrega parcial de documentación frente Jurado (Respuesta a observaciones estructurales, incluyendo entrega de planos estructurales de cimentación con ajustes, planos de implantación necesarios para el inicio efectivo en obra).
- 1 de septiembre de 2025: Entrega oficio 4 trata de solicitud de reiteración de respuestas de fondo realizadas en oficios precios 1, 2 y 3.
- 15 de septiembre de 2025: Envió por parte del ministerio de “EYD AJUSTADOS JURADÓ”
- 15 de septiembre de 2025: Respuesta A Oficio02 por parte del ministerio Observaciones Técnicas De Juradó
- 25 de septiembre de 2025: Traslado de nuevas observaciones a los planos recibidos por parte de la entidad el pasado 15 de septiembre.
- 6 de octubre de 2025: Respuesta por parte del ministerio a observaciones eléctricas del frente Juradó.
- 7 de octubre de 2025: Respuesta por parte del ministerio a observaciones técnicas del frente Novita.
- 9 de octubre de 2025: Entrega por parte del ministerio de planos ajustados choco.
- 16 de octubre de 2025: Actas de entrega de los lotes de ambos frentes Juradó y Novita.
- 27 de octubre de 2025: Acta de inicio del proyecto.

En las fechas antes descritas se puede evidenciar que, desde la adjudicación del proceso, al acta de inicio pasaron más de 3 meses, donde dicho tiempo fue necesario para que el ministerio de cultura realizara las debidas aclaraciones y mesas de trabajo en conjunto para solventar todos los planos suministrados, los cuales por medio de oficios enviados y en reuniones sostenidas se evidenciaban algunas inconsistencias ajenas tanto a la interventoría como al contratista, las cuales era imperativo resolverlas previo a dar un inicio efectivo de labores.

De igual forma aun persistían actividades de demoliciones de edificaciones en los predios a intervenir, dicha responsabilidad recae en la Alcaldía de cada municipio, por lo que también resultó ser un impedimento de peso para la firma del acta de inicio del proyecto, dicha causa resulto ser ajena a la entidad, contratista e interventoría.

Por ultimo y no menos importante desde el inicio de labores en sitio se han presentado incontables imprevistos y nuevas observaciones a planos de cimentación, estructurales entre otros, que han hecho se dilaten los tiempos previstos para ejecución y los rendimientos se vean ralentizados, a esto se le agrega el clima adverso, por lo que me permito relatar de la manera más resumida posible, a continuación:

- En jurado se encontraba el plano de implantación necesario para realizar la localización y replanteo al revés, por lo que fue necesario realizar un segundo replanteo, tomando más de 10 días dicha actividad, teniendo en cuenta que el topógrafo estaba fuera de Juradó y que el ministerio envió por correo el plano ajustado.

- En novita fue necesaria la realización de rocería e ingreso de maquinaria pesada para terminar de evacuar vegetación existente, la cual no fue totalmente terminada por la alcaldía del municipio.


- Adicional desde el inicio del contrato principalmente en el frente de Juradó las lluvias han sido constantes, y de manera fuerte en la mayoría de los días (Se adjunta registro detallado de las precipitaciones presentadas), a pesar de que se previó lluvias por ser el pacífico colombiano, donde se instalaron carpas por parte del contratista de más de 12 metros para proteger la cimentación en proceso, no se contaba con inundaciones por desbordamiento de los ríos: Juradó, Jampabadó y Curiche (Se adjunta comunicado de la Alcaldía).

- Complementando el punto anterior en la semana 1 del 27 al 31 de octubre, se imposibilito trabajar 4 días por precipitaciones fuertes al nivel de tormenta, según se reportó por la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres en la zona por coletazo del Huracán Melissa. De igual forma la semana 2, se imposibilita el trabajo de 4 días, y en la semana 3 se presentan lluvias fuertes por 3 días consecutivos. (Ver anexo Registro semanal de lluvias).

Por todo lo anterior argumentado y expuesto solicito de manera formal y respetuosa se realice una prórroga por el termino inicial previsto y planificado para el proyecto, teniendo en cuenta las múltiples complicaciones que se encuentran durante la ejecución y en vista de las obras robustas que requiere el contrato, sin dejar de lado que ambos frentes son de difícil acceso y adicional como es bien sabido en fechas festivas que se acercan a partir del 20 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, la actividad comercial como ferreterías, transportes marítimos necesarios para frentes como jurado se paralizan, lo cual dificultara el transporte de material y personal, por lo que resulta totalmente necesario y con toda la responsabilidad técnica que requiere el proyecto la prórroga al plazo inicial, es decir, cinco (5) meses a partir del acta de inicio, dando como fecha de finalización del proyecto al 27 de marzo del 2026.

Agradezco su atención y quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,



Arq. Hawer Alberto Herrera Rodríguez
Representante Legal
H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S

República de Colombia

Libertad y Orden

1131

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

RESOLUCIÓN NÚMERO

18 JUL 2025

"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"

LA SECRETARIA GENERAL

En ejercicio de las facultades conferidas en por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, el Decreto 1082 de 2015, sus normas reglamentarias y complementarias, y especialmente la Resolución Nro. 1851 del 21 de junio de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia establece que *"Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución"*

Que el numeral 1° del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, atribuye la competencia para ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y demás procesos de selección para escoger a contratistas, al representante legal de la entidad respectiva.

Que el Ministerio de Cultura, hoy Ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, mediante Resolución 1851 del 21 de junio de 2019, delegó en la Secretaria General la facultad de tramitar y culminar las actuaciones administrativas propias de la actividad contractual, con cargo al presupuesto del Ministerio.

Que la Ley 397 de 1997-Ley general de Cultura-, en desarrollo del artículo 72 constitucional, incorpora normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura y crea el Ministerio de Cultura (hoy Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes). En su artículo 4, la Ley 397 de 1997, establece que el patrimonio cultural de la Nación se compone de todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, incluyendo los bienes materiales de especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico, los cuales se encuentran regidos por disposiciones especiales orientadas a salvaguardar su integridad como testimonio de la identidad cultural nacional.

Que la Coordinadora del Grupo de Infraestructura Cultural, solicitó iniciar el trámite de un proceso de selección con el objeto de "*Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados de compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias*", presentando los siguientes argumentos como justificación de la necesidad de la contratación:

"(...)

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Se espera que la ejecución de acciones en este sentido, motiven la organización y participación de las Instituciones, los agentes del sector y la sociedad civil en general, para mejorar las condiciones de formación, creación, investigación y difusión de las expresiones y prácticas artísticas, así como las oportunidades de producción, circulación, gestión y apropiación de los bienes y servicios de la infraestructura cultural. Dicho componente tiene como prioridad trabajar en asociación con las alcaldías y demás entidades territoriales sus correspondientes direcciones u oficinas de cultura, con el objetivo de realizar esfuerzos mancomunados que permitan que la infraestructura local existente sea mejorada y acondicionada para el desarrollo de las prácticas artísticas y culturales, lo cual permitirá cualificar procesos artísticos, culturales y pedagógicos.

Así la cosas, el GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, en concordancia con la misión de fortalecer el sector cultural colombiano, avanza en el objetivo de implementar, en todo el territorio nacional, obras culturales dignas, adecuadas y que reconozcan las particularidades de las regiones. Esto, en el entendido de lograr escenarios para la promoción de la cultura y donde se desarrollen proyectos educativos, culturales y de integración social, permitiendo de esta manera un crecimiento de los municipios y departamentos beneficiados.

Cabe resaltar, que la mayor parte de los municipios de Colombia carecen de una infraestructura cultural adecuada y en muchos de ellos ni siquiera existen infraestructuras culturales, tales como bibliotecas públicas, casas de cultura, teatros o auditorios, o escuelas de música, razón por la cual, las expresiones y prácticas culturales se desarrollan en su mayor parte al aire libre o en espacios diseñados y previstos para otros fines.

Dada la enorme necesidad de remediar la ausencia de espacios culturales adecuados, los esfuerzos que se han hecho para dotar a Colombia de una infraestructura cultural adecuada y moderna son fundamentales y deben mantenerse en el tiempo.

Teniendo en cuenta la ubicación de los proyectos a ejecutar en el marco del presente proceso de selección y con la finalidad de una mayor eficiencia administrativa, se organizará por ***lotes*** *para la contratación de la ejecución.*

Cada lote, tiene como prioridad para la agrupación de proyectos la localización geográfica, que permitan un ágil desplazamiento entre los proyectos y la posibilidad de que se presenten oferentes con conocimientos de cada territorio, es así como los lotes se agrupan de la siguiente manera:

Lote 1. región caribe específicamente en los departamentos de Bolívar y Cesar
Lote 2. departamento del Cauca
Lote 3. departamento del Chocó

LOTE 1:

- ***Construcción de la Biblioteca Pública en Atanquez - Resguardo Kankuamo.***

El exhorto décimo segundo de la sentencia de Justicia y paz proferida por el tribunal superior del distrito Judicial de Barranquilla, Atlántico mediante el acta 40 del 26 de agosto de 2016, establece la culminación de la biblioteca del Corregimiento de Atanquez:

DÉCIMO SEGUNDO: EXHRTAR al Ministerio de Educación, la Unidad Administrativa Especial para la Acción y Reparación de las Victimas – UARIV – y a las entidades que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de la Víctimas -SNARIV-, para que elabore un proyecto mediante el cual se culmine, en coordinación con los entes territoriales, la Biblioteca del Corregimiento de Atanquez,

Teniendo en cuenta que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes hace parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a las Víctimas y que la infraestructura no da servicio a una institución Educativa si

no a la comunidad del resguardo Kankuamo se estableció que el cumplimiento de dicho Exhorto se encuentra a cargo de esta cartera Ministerial.

Adicionalmente, en jornada interinstitucional de concertación y seguimiento en el marco de la formulación del plan integral de reparación colectiva del Sujeto de reparación colectiva del Pueblo Kankuamo desarrollada el 14 y 15 de septiembre de 2023 se estableció el siguiente compromiso:

"(...) Realizar el estudio de viabilidad técnica y presupuestal para la construcción y dotación de una biblioteca denominada dentro del pueblo kankuamo "KANKUAKA", en la Comunidad de Atanquez; una vez aprobado el estudio de viabilidad se procederá con la ejecución del proyecto teniendo en cuenta el diseño concertado. (...)"

Lo anterior se acordó ya que la acción reparadora requerida por el pueblo era la adquisición y adecuación de espacios físicos propios en cada uno de los 11 asentamientos y ciudades donde está hoy asentada la población Kankuama.

Acorde a lo anterior y en cumplimiento de la sentencia del acta No. 40, del 26 de agosto de 2016, y acorde al plan integral de reparación colectiva suscrita en septiembre de 2023, con la presente contratación se busca efectuar la construcción de una nueva Biblioteca para el pueblo Kankuamo en el Corregimiento de Atánquez, jurisdicción del municipio de Valledupar, Departamento del Cesar, la cual corresponde a diseños desarrollados por el GRUPO DE INFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, y concertados con la comunidad.

El alcance del proyecto esta definido en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte del proceso de selección.

- ***Construcción del Centro Cultural de Santa Rosa del Sur, Bolívar.***

El 9 de diciembre de 2023 el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ratificó el acuerdo con la ciudadanía y las organizaciones, identidades y actores culturales del Magdalena Medio, en los municipios de Yondó (Antioquia); Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití (Bolívar) y Barrancabermeja (Santander), a través del pacto cultural por la vida y por la paz Magdalena medio; dentro de las acciones, se incluyó la de viabilizar proyectos para la construcción, adecuación o mantenimiento de infraestructura cultural de los municipios priorizados, entre ellos Santa Rosa del Sur.

El 13 de junio de 2024 se recibió solicitud por parte del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar para la construcción de casa de la cultura indicando que el municipio contaba con diferentes procesos de formación, pero no contaban con un espacio para su desarrollo; desde el grupo de infraestructura se solicitaron los contratos de los formadores, con el fin de verificar la existencia de los procesos de formación, encontrando que el municipio cuenta con los siguientes procesos:

- *Escuela de Cine, se encuentra creada por medio de Acuerdo Municipal 001 del 17 de febrero de 2023.*
- *Escuela de música.*
- *Escuela de artes plásticas.*
-

Adicionalmente se realizó la verificación de la ficha de gestores culturales identificando:

"(...) Un salón medianamente acondicionado en el Centro Comunitario contiguo a la Biblioteca Municipal, en condiciones precarias para prestar el servicio a la comunidad por falta de buena ventilación y zonas acústicas, donde reciben clases niños, niñas y jóvenes de diferentes edades desde 7 a 18 años. con una instructora de la administración municipal con contrato de prestación de servicios (...)

Así mismo en la ficha diagnóstico se incluyen los siguientes procesos de formación con sus coberturas:

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proceso	***Asistencia***			
	N° niños y Jóvenes	***N° Adultos***	***N° Días a la semana***	***N° Horas a la semana***
DANZA	*100*		*3*	*12*
MÚSICA	*61*		*3*	*12*
ARTES PLASTICAS	*140*		*3*	*12*
CINE	*30*	*10*	*3*	*12*

LOTE 2:

- ***Construcción de la Casa de saberes ancestrales Villa Rica, Cauca.***

En el marco de la Mesa Interétnica del Norte del Cauca y en cumplimiento de lo establecido en la resolución 1691 de 2022 del Ministerio del Interior mediante la cual se crea la Mesa de Diálogo en el Norte del Departamento del Cauca, la cual tiene como objetivo facilitar el diálogo entre diferentes actores de la región. Esta mesa de diálogo se creó como un espacio para abordar las problemáticas y necesidades de la población en el norte del Cauca.. De acuerdo con la enunciada resolución, se estableció el compromiso para la construcción de 14 casas de saberes en diferentes municipios entre ellos Villa Rica.

El municipio remitió la solicitud de la infraestructura el 22 de mayo de 2024, indicando que el municipio cuenta con diferentes celebraciones:

- *Celebra culturalmente su cumpleaños en el mes de febrero mediante las jugas y adoraciones al niño Dios.*
- *Fiestas de la virgen del Carmen.*
- *Encuentro interétnico del suroccidente afrocolombiano*
- *Tiene entre sus costumbres la conservación de la salud ancestral a través de la medicina tradicional.*

Adicionalmente, remitieron acuerdo del Concejo del 4 de abril de 2024 donde autorizan a la alcaldesa la destinación de un predio para efectuar la Construcción dela casa de saberes, donde se espera se realicen los siguientes programas:

- *Atención comunitaria de lo Sabedores.*
- *Etnoeducación de sabedores*
- *Intercambios generacionales, plantas medicinales.*
- *Intercambios generacionales, Parteras.*
- *Intercambios generacionales, Sobaderos.*
- *Intercambios generacionales, Medico tradicional.*

El proyecto fue revisado por el Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes, dando como resultado la viabilización del proyecto el 7 de noviembre de 2024. Mediante comunicado No. MC39928S2024.

- ***Construcción de la Casa de saberes ancestrales Guachené, Cauca.***

En el marco de la Mesa Interétnica del Norte del Cauca y en cumplimiento de lo establecido en la resolución 1691 de 2022 del Ministerio del Interior mediante la cual se crea la Mesa de Diálogo en el Norte del Departamento del Cauca, la cual tiene como objetivo facilitar el diálogo entre diferentes actores de la región. Esta mesa de diálogo se creó como un espacio para abordar las problemáticas y necesidades de la población en el norte del Cauca. De acuerdo a la enunciada resolución; se estableció el compromiso para la construcción de 14 casas de saberes en diferentes municipios entre ellos Guachené.

El municipio remitió la solicitud de la infraestructura el 10 de abril de 2024, en la misma relacionan la existencia de los siguientes procesos e instancias de cultura:

- *Concejo Municipal de Cultura*

- *La escuela de formación artística la cual aborda todas las zonas del municipio, tanto rural como urbano llevando la práctica de la danza, la música, la pintura, el manejo de talla en madera, el teatro y el baile moderno, también se cuenta con una banda marcial y una banda de música de vientos.*
- *Grupos de cantadoras (2)*
- *Grupos de violines caucanos (2)*
- *Orquestas (2)*
- *Artistas de música (30)*
- *Asociación cultural (1)*

Así mismo indican que dada la alta demanda cultural, se requieren más espacios para el fortalecimiento a las fiestas tradicionales y patronales como acervo ancestral, además de garantizar que se conserven las costumbres, las tradiciones y los saberes ancestrales.

En este sentido dispusieron de un predio en zona rural para el funcionamiento de la casa de saberes, infraestructura donde se espera se realicen los siguientes programas:

- *Fortalecimiento de la medicina tradicional. (hierbas y plantas medicinales)*
- *Apoyo y fortalecimiento a los curanderos, parteras y sobanderos del municipio.*
- *Promoción y difusión de los saberes ancestrales del Municipio.*

El proyecto fue revisado por el Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes, dando como resultado la viabilización del proyecto el 1 de octubre de 2024. Mediante comunicado No. MC39532S2024.

LOTE 3:

- ***Construcción del Centro Cultural de Novita, Chocó.***

El 30 de enero de 2024, el municipio de NOVITA departamento de CHOCÓ, en cabeza del alcalde municipal, solicita al MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, la colaboración para la construcción de un espacio para el funcionamiento del museo Huellas Etnográficas y Arqueológicas y que permita el desarrollo de prácticas de danza, teatro y otras actividades que busquen el fortalecimiento de saberes ancestrales y práctica de oficios como lo son la elaboración de artesanías, canto de alabaos entre otros.

El MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, como parte del proceso de viabilización del proyecto del CENTRO CULTURAL DE NOVITA – CHOCÓ, realizó la verificación de la ficha del Sistema de Información de Fomento Regional (SIFO) del municipio, donde se evidenció que en el municipio no cuenta con una casa de cultura y requiere espacios adecuados para el desarrollo de los procesos de formación artísticos y culturales y que a su vez permita la exposición que hacen parte del museo, actualmente los procesos se desarrollan en el Centro de Integración Ciudadana de la cabecera municipal y en las instalaciones de la alcaldía; el museo funciona en una infraestructura construida en 1960 que no cumple con lo requerido en la NSR-10 y presenta un estado de deterioro considerable, la cubierta cuenta con filtraciones, se evidencia presencia de grietas, entre otros.

Es pertinente resaltar, que el municipio de NOVITA, CHOCÓ, cuenta con un proceso de formación de danza que incluye bailes como la jota, el pasillo, abozao entre otros con un enfoque a las danza folclóricas y articulado con herramientas de formación en teatro; uno de los principales eventos de circulación de los productos de los procesos de formación es la representación de los evangelios en las eucaristías dominicales y celebración de semana santa y en las festividades del municipio; cuentan con la apuesta de llevar la oferta a los corregimientos, la de escuela de formación artística EFA del municipio se encuentra creada mediante acuerdo 7 del 12 de abril de 2013 incluyendo las áreas artísticas de Teatro, Artes visuales, Danzas, Pintura, dibujo, escultura y fotografía. Adicional a los procesos de formación se realizan fortalecimiento

de oficios como la elaboración de sombreros con hojas de árbol de uva y Yarumo; este conocimiento es transmitido por los mayores que cuentan con el conocimiento.

Al momento de la estructuración, el municipio indicó los programas de formación cuentan con los siguientes beneficiarios

Proceso	**Asistencia**			
	N° niños y Jóvenes	**N° Adultos**	**N° Días a la semana**	**N° Horas a la semana**
Escuela de formación en danzas	204	1	5	10
Escuela de formación en teatro	97	10	5	10
Alabaos y Gualies	39	10	2	4
Escuela de Música	25	0	3	6

Teniendo en cuenta la necesidad de brindar espacios adecuados para las actividades culturales de la población, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, y el MUNICIPIO DE NOVITA – CHOCÓ, se articulan para generar la iniciativa de desarrollo cultural con el fin de incentivar los procesos culturales, brindando una infraestructura adecuada y especial, que coadyuve al crecimiento y fortalecimiento de la economía.

Surtido el proceso de viabilización, el 14 de junio mediante MC20111S2024 se expidió el respectivo concepto de Viabilidad Técnica y priorización del Proyecto ***"Municipio de Novita, Chocó",*** *en el predio localizado el predio localizado en el Barrio Rosario, identificado con la matricula inmobiliaria 184-13564, con un área del predio destinada para el proyecto de 720 m2. (El área indicada anteriormente corresponde al área del predio y no al área construida).*

Así las cosas, para poder suplir las necesidades de la población de NOVITA, CHOCÓ, es viable la implementación de un proyecto prototipo de casa de cultura del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES ajustado para un CENTRO CULTURAL.

Dado lo anterior y considerando que actualmente el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES cuenta con recursos para apoyar el proyecto, se adelantó la suscripción del convenio 3834-2024 con el municipio de Novita, para llevar a cabo la construcción del centro cultural

- ***Construcción del Centro Cultural de Juradó, Chocó.***

En septiembre de 2023 se estableció el compromiso del viabilización del proyecto de casa de la cultura del municipio de Juradó, en espacio de concertación de planes específicos de atención y protección desarrollado en el marco de lo ordenado en el Auto 005 de 2009, así mismo este compromiso fue reafirmado en jornada de gobierno con el pueblo.

El de abril de 2024 el municipio remitió solicitud formal para la viabilización del centro cultural, remitieron registro de la infraestructura actual la cual presenta un grave estado de deterioro por lo que se encuentra sin uso, esta información fue corroborada en la ficha de gestores culturales del ministerio, la cual indica lo siguiente:

" (...) La casa de la cultura, Apolonia Moreno Ballesteros, está ubicada en la avenida la Playa frente al kiosco turístico municipal, es una infraestructura con uso exclusivo para el sector. Los espacios con los que cuenta son: salón múltiple, biblioteca, sala de danzas, música sala para primera infancia, cuatro (4) oficinas administrativas, patio interno, tiene servicio de energía, y espacio suficiente para ampliación de la edificación, la infraestructura en general está en mal estado por las afectaciones causadas por las condiciones climáticas de la región (olas de más de 8 metros de altura causaron inundaciones que afectó a más de 5.000 personas en junio de 2017) esta infraestructura se encuentra en proceso de demolición debido a su avanzado estado de deterioro. Los

procesos artísticos y culturales como servicios bibliotecarios se están desarrollando en una casa en arrendamiento mientras construyen la nueva sede de biblioteca municipal (...)"

El municipio informó que los procesos que se desarrollan y requieren un espacio adecuado para su continuidad son los siguientes:

- *Taller de danza folclórica.*
- *Curso de historia del arte.*
- *Taller de fotografía de paisajes.*
- *Diplomado en culturas indígenas,*
- *Curso de musica tradicional.*

Acorde a lo anterior desde el Grupo de Infraestructura del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes, se desarrollaron los diseños para la construcción del Centro Cultural del Municipio de Juradó, Departamento del Chocó, acorde a las condiciones del predio facilitado por el municipio para tal fin, surtiendo el proceso de viabilización, por lo cual se emitió carta de viabilidad técnica mediante radicado No. MC41915S2024.

CONCLUSIÓN

Es importante resaltar que, una vez analizados los proyectos por el equipo técnico del grupo de Infraestructura de Cultural, teniendo en cuenta que los proyectos a ejecutar parten de los prototipos, prototipos ajustados y diseños propios del MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES, que presentan características similares, y en pro de una eficiencia administrativa, se determinó realizar la contratación para la ejecución de los proyectos, en un mismo proceso por lotes:

LOTE 1:

- *Construcción de la Biblioteca Pública en Atanquez - Resguardo Kankuamo.*
- *Construcción del Centro Cultural de Santa Rosa del Sur, Bolívar.*

LOTE 2:

- *Construcción de la Casa de saberes ancestrales Villa Rica, Cauca.*
- *Construcción de la Casa de saberes ancestrales Guachené, Cauca.*

LOTE 3:

- *Construcción del Centro Cultural de Novita, Chocó.*
- *Construcción del Centro Cultural de Jurado, Chocó.*

En virtud de lo anteriormente mencionado, el MINISTERIO DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y LOS SABERES tiene previsto suscribir convenios interadministrativos con cada ente territorial cuyos objetos consisten en "AUNAR ESFUERZOS, ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS, LOGÍSTICOS, JURÍDICOS Y FINANCIEROS PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE CADA PROYECTO", con el fin de garantizar la debida ejecución del proceso contractual que se pretende adelantar con el presente documento (...)

Que el Proceso de Contratación se estructuró por grupos, y contempló la selección de Contratistas para la ejecución de los siguientes Contratos de Obra Pública:

- **Grupo 1:** Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias, Biblioteca Atanquez Valledupar - Cesar y Centro Cultural Santa Rosa del Sur - Bolívar (Zona Urbana).

- **Grupo 2:** Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias, Casa de Saberes ancestrales Villa Rica – Cauca y Casa de saberes ancestrales Guachené (Cauca) (Zona Urbana).

- **Grupo 3:** Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias, Centro Cultural Novita – Chocó y Centro cultural Jurado – Chocó (Zona Urbana).

Que la modalidad de selección para el proceso es la licitación pública, prevista en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007; que corresponde a la regla general para la escogencia de contratistas.

Que, teniendo en cuenta que la contratación comporta la construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, en el proceso de selección se dio aplicación de los documentos tipo vigentes para licitación pública de obras de infraestructura social –sector cultura, recreación y deporte– adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, mediante Resolución 219 de 2021, con las modificaciones de la Resolución 275 de 2022, expedidas con fundamento en el artículo 1 de la Ley 2022 de 2020, por la cual se modifica el artículo 4° de la Ley 1882 de 2018.

Que de conformidad con lo señalado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes realizó los estudios y documentos previos requeridos para adelantar el proceso de selección , así como con la totalidad de requisitos de orden jurídico, técnico y financiero para la apertura del proceso.

Que, para el presente Proceso de Contratación, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes realizó los trámites para la obtención de las licencias de construcción para cada uno de las infraestructuras culturales, objeto de esta Licitación de Obra Pública, de conformidad con las disposiciones del artículo 2.2.6.1.1.9 del Decreto 1077 de 2015, según se describe en los Estudios Previos del proceso de selección, todas las cuales a la fecha se encuentran expedidas y en firme.

Que el proceso de contratación fue presentado al Comité Asesor de Contratación en sesión del 2 de mayo del 2025, siendo aprobado por unanimidad.

Que el 13 de mayo de 2025, se publicaron en SECOP II, los estudios previos, anexos, formatos y aviso de convocatoria y el documento base complementario al Proyecto de Pliego Electrónico de condiciones del proceso de selección por Licitación de Obra Pública N° MC-LPO-0001 de 2025.

Que los interesados en el proceso de contratación de Licitación de Obra Pública N° MC-LPO-0001 de 2025 presentaron observaciones a los Documentos del Proceso, las cuales fueron respondidas por escrito y mediante mensaje público a través de la Plataforma SECOP II.

Que el presupuesto oficial estimado para la presente contratación, se estableció en la suma total de **SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.430.889.875,00)**, distribuido por lotes así:

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Número de lote	Objeto del proyecto, lote o grupo	Valor Presupuesto Oficial (pesos incluido IVA)	Lugar(es) de ejecución del Contrato
1	**Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias.**	$ 2.087.127.804 (1.466,19 SMMLV)	• Biblioteca Atanquez Valledupar - Cesar. • Centro Cultural Santa Rosa del Sur - Bolívar. (Zona Urbana)
2	**Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias.**	$ 2.441.345.760 (1,715,03 SMMLV)	• Casa de Saberes ancestrales Villa Rica – Cauca • Casa de saberes ancestrales Guachené (Cauca) (Zona Urbana)
3	**Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias.**	$ 2.902.416.311 (2.038,93 SMMLV)	• Centro Cultural Novita – Chocó • Centro cultural Jurado – Chocó (Zona Urbana)

El valor del presupuesto incluye gastos, costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones de ley y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos del presente proceso.

Que para respaldar los compromisos que resultaran del proceso y los contratos que del mismo se deriven, se cuenta con una apropiación presupuestal en la vigencia 2025, con cargo al siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
204325	28 de marzo de 2025	7.430.889.875,00

Que el proceso NO fue limitado a Mipyme, en razón a que la cuantía definida conforme al presupuesto oficial supera el umbral establecido de conformidad con artículo 2.2.1.2.4.2.2 del Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021, el cual para la vigencia 1 de enero de 2024 hasta 31 de diciembre de 2025, determinada por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, equivale a la suma de COP $532.338.092.

Que según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal, mediante Resolución

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

No. 0824 del 30 de mayo de 2025, ordenó la apertura del proceso de selección por licitación de obra pública N° MC-LPO-0001 de 2025.

Que en consideración a que el proceso se adelantó a través de la plataforma SECOP II, el cronograma del mismo fue el establecido para dicho efecto en la plataforma referida.

Que el día treinta 04 del mes junio de 2025, a las 10:00 a.m., y de acuerdo con la convocatoria publicada en debida forma por la Entidad en el SECOP II, se adelantó mediante el servicio de Teams, la AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS, del proceso de selección por Licitación de Obra Pública No. MC-LP-0001-2025, según consta en la respectiva acta publicada en el secop.

Que, dentro del término de publicación del pliego de condiciones definitivo, se recibieron observaciones al mismo por parte de los interesados, las cuales fueron respondidas por la entidad mediante documentos de respuesta publicados en el SECOP II. Asimismo, se recibieron observaciones extemporáneas las cuales fueron respondidas por la Entidad mediante documentos publicados en el SECOP II.

Que, de acuerdo con las reglas del Proceso de Selección, la Entidad emitió las Adendas 1, 2, 3 y 4, a la Licitación Pública No. MC-LP-0001-2025, las cuales fueron publicadas en el SECOP II.

Que revisadas las observaciones presentadas relacionadas con el formulario de la oferta económica del Lote de Novita y el formulario 1 Presupuesto Oficial del Lote de Santa Rosa, de acuerdo con lo señalado por el Grupo de Infraestructura mediante oficio remitido 10 de junio de 2025, se encontró que en efecto, en el formulario 1 del Oferta Económica del proyecto de Novita no se incluyó el ítem *"8.07.20 Suministro e instalación de LUMINARIA DE DESCOLGAR DECORATIVA y accesorios de fijación"*. Así mismo, se evidenció que, en las cantidades de los ítems, formulario 1 de la oferta económica del proyecto de Novita para los ítems *"1.01.03 LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA" y "2.01 DESCAPOTE A MÁQUINA Y/O MANUAL PROFUNDIDAD 0.30 m", incluye selección de cespedones con almacenamiento y retiro de material sobrante hasta botadero autorizado*, por un error de digitación, se incluyó un valor diferente al contenido en el Formulario 1 del presupuesto oficial. No obstante, los valores y las cantidades correspondiente a los ítems anteriormente citados, se encontraban contenidos de manera correcta en el formulario del presupuesto oficial.

Que adicionalmente, al verificar los Estudios Previos, el Pliego de Condiciones Definitivo y demás documentos del proceso, se evidenció un error en el valor del presupuesto oficial consignado en el formulario 1, por un error en la digitación, al duplicar el precio unitario del ítem 8.10.03 en el ítem 8.10.04 .

Que, de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del numeral 5 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 89 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, no resultaba posible enmendar mediante Adenda el error de forma anteriormente señalado, por lo que, atendiendo a lo establecido en el artículo 49 de la Ley 80 de 1993, la entidad mediante resolución No 0881 del 10 de junio de 2025, procedió a sanear dicha situación de forma a efectos de cumplir con el deber de claridad propia de la administración pública.

Que, una vez surtida cada una de las etapas del proceso de selección, el día 17 de junio de 2025 a las 08:30 AM., se surtió el cierre mencionado del proceso de selección, quedando constancia en la plataforma del SECOP II, de la presentación de 79 ofertas, en los diferentes grupos en que estructuró la licitación, así:

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

NOMBRE DE PROPONENTE		NATURALEZA JURIDICA	LOTES OFERTADOS
1	CONSORCIO ATP 565	CONSORCIO	LOTE 2
2	CONSORCIO OBRA CULTURAL 2025	CONSORCIO	LOTE 2
3	RAING PROYECTOS SAS	PERSONA JURIDICA	LOTES 1 Y 2
4	TCONSTRUYE INGENIERIA SAS	PERSONA JURIDICA	LOTE 1
5	CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA	CONSORCIO	LOTE 3
6	BERMUDEZ SAS	PERSONA JURIDICA	LOTES 1 Y 2
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	CONSORCIO	LOTE 1
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL	CONSORCIO	LOTE 3
9	CONSORCIO PACIFICO	CONSORCIO	LOTE 2
10	UNI-GER	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT	CONSORCIO	LOTE 2
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	PERSONA JURIDICA	LOTE 1
13	CONSORCIO BIG-CONSTRUCCION	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
14	CONSORCIO PANORAMA	CONSORCIO	LOTE 1
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	UNIÓN TEMPORAL	LOTES 1 Y 2
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	CONSORCIO	LOTE 1
17	Consorcio 18 SANTA VIVIANA	CONSORCIO	LOTES 1 Y 3
18	CONSORCIO B&C 2025	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25	CONSORCIO	LOTE 2
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS	PERSONA JURIDICA	LOTES 2 Y 3
21	MLG INGENIERIA SAS	PERSONA JURIDICA	LOTE 1
22	2 CONSORCIO OP	CONSORCIO	LOTE 1
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
25	CONSORCIO WC-8E M	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
26	CONSORCIO MGD	CONSORCIO	LOTE 1
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
28	CONSORCIO CULTURA	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
29	CONSORCIO CASPRO CULTURAL	CONSORCIO	LOTE 1
30	CORPORACION DE INGENIERIA DEL CARIBE SAS	PERSONA JURIDICA	LOTE 1
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
33	CONSORCIO CULTURAL VALLEDUPAR 3	CONSORCIO	LOTE 1
34	CONSORCIO CULTURALES	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
35	INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES R2 SAS	PERSONA JURIDICA	LOTE 1
36	CONSORCIO CREANDO PROYECTOS	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
37	UT CULTURA BOGOTÁ	UNIÓN TEMPORAL	LOTE 1
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
39	9 CONSORCIO SAJS	CONSORCIO	LOTE 1

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

NOMBRE DE PROPONENTE		NATURALEZA JURIDICA	LOTES OFERTADOS
40	CONSORCIO VASA	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS HE 2025	CONSORCIO	LOTE 2
42	HCG CONSTRUCCIONES LTDA	PERSONA JURIDICA	LOTE 1
43	3 CONSORCIO DUOVAL 0001	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
44	CONSORCIO PROCULTURA	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
45	Consorcio AG3 MC 0001	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
46	CONSORCIO CULTURA	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
47	CONSORCIO CULTURAL ED	CONSORCIO	LOTE 1
48	8 CONSORCIO INFRACULTURAL SR 01	CONSORCIO	LOTE 1
49	GESTION RURAL Y URBANA S.A.S	PERSONA JURIDICA	TODOS LOS LOTES
50	1616 INGENIERIA S.A.S	PERSONA JURIDICA	TODOS LOS LOTES
51	Consorcio CULTURAL-IN5	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
52	2 CONSORCIO ORIENTE	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025	CONSORCIO	LOTE 2
54	Consorcio CYC CONSTRUCCIONES	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
55	CONSORCIO ARES ED	CONSORCIO	LOTES 1 Y 3
56	CONSORCIO CE OBRAS CULTURALES	CONSORCIO	LOTE 1
57	CONSORCIO VIRREY	CONSORCIO	LOTES 2 Y 3
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2025	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	PERSONA JURIDICA	TODOS LOS LOTES
60	CONSORCIO W&A	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
61	CONSORCIO FORTUNE MC	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
62	CONSORCIO ORIMEG 2025	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
63	CONSORCIO 2025 INCIARCO - BESUTO	CONSORCIO	LOTE 1
64	EUT S.A.S	PERSONA JURIDICA	TODOS LOS LOTES
65	CONSORCIO ECO 2025	CONSORCIO	LOTE 1
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	CONSORCIO	LOTE 1
68	8 CONSORCIO IP MINCULTURA 25	CONSORCIO	LOTE 1
69	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	PERSONA JURIDICA	LOTES 1 Y 3
70	UNION TEMPORAL MC 2025	UNIÓN TEMPORAL	LOTE 1
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	CONSORCIO	LOTE 1
72	2 CONSORCIO CULT 25	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
73	CONSORCIO CIVIL 2025	CONSORCIO	LOTE 1
74	CONSORCIO CULTURA LM	CONSORCIO	LOTE 2
75	CONSORCIO CULTURA ING	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

NOMBRE DE PROPONENTE		NATURALEZA JURIDICA	LOTES OFERTADOS
76	CONSORCIO LVSXXV	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2
78	CONSORCIO MINCULTURA FAO	CONSORCIO	TODOS LOS LOTES
79	9 CONSORCIO MIN CULTURA 001	CONSORCIO	LOTES 1 Y 2

Que una vez designado el comité evaluador del presente proceso por parte de la Secretaria General, se realizó la verificación de los requisitos habilitantes y los requisitos de calificación de los factores diferentes al económico conforme lo previsto en la Ley 1882 de 2018 y en el pliego de condiciones.

Que el día 25 de junio fue publicado en el SECOP II, el informe de evaluación preliminar, con el siguiente resultado en su consolidado:

EVALUACIÓN PRELIMINAR LOTE 1

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
1	CONSORCIO ATP 565		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
2	CONSORCIO OBRA CULTURAL 2025		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
3	RAING SAS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
4	TCONSTRUYE	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
5	CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA			X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
6	BERMUDEZ SAS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL			X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
9	CONSORCIO PACIFICO		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
10	UNI-GER	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,5	HABILITADO
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
13	CONSORCIO BIG-CONSTRUCCION	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
14	CONSORCIO PANORAMA	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	X		X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
18	CONSORCIO B&C 2025	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS		X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
21	MLG	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
22	CONSORCIO OP	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
25	CONSORCIO WC-8E M	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
26	CONSORCIO MGD	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
28	CONSORCIO CULTURA	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
29	CONSORCIO CASPRO CULTURAL	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
30	CIC	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
33	CONSORCIO CULTURAL VALLEDUPAR 3	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
34	CULTURALES	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
35	INVECOR2	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
36	CONSORCIO CREANDO PROYECTOS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
37	UT CULTURA BOGOTÁ	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
39	CONSORCIO SAJS	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
40	CONSORCIO VASA	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS HE 2025		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
42	HCG CONSTRUCCIONES	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,25	HABILITADO
44	CONSORCIO PROCULTURA	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
46	CONSORCIO CULTURA	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
47	CONSORCIO CULTURAL ET	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
48	CONSORCIO INFRACULTURAL SR 01	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
49	GRU S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
50	1616 INGENIERIA S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
52	CONSORCIO ORIENTE	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LPO-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
55	CONSORCIO ARES ED	X		X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
56	CONSORCIO CE OBRAS CULTURALES	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
57	CONSORCIO VIRREY		X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2025	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
60	CONSORCIO W&A	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
61	C FORTUNE MC	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
62	ORIMEG 2025	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
63	CONSORCIO 2025 INCIARCO - BESUTO	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
64	EUT S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
65	CONSORCIO ECO 2025	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
69	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	X		X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
70	UNION TEMPORAL MC 2025	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
72	CONSORCIO CULT 25	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
73	CONSORCIO CIVIL 2025	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
74	CONSORCIO CULTURA LM		X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
75	CONSORCIO CULTURA ING	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
76	CONSORCIO LVSXXV	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
78	CONSORCIO MINCULTURA FAO	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

EVALUACIÓN PRELIMINAR LOTE 2

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 2					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
1	CONSORCIO ATP 565		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 2					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
2	CONSORCIO OBRA CULTURAL 2025		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
3	RAING SAS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
4	TCONSTRUYE	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
5	CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA			X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
6	BERMUDEZ SAS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL			X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
9	CONSORCIO PACIFICO		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
10	UNI-GER	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,5	HABILITADO
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
13	CONSORCIO BIG-CONSTRUCCION	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
14	CONSORCIO PANORAMA	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 2					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	X		X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
18	CONSORCIO B&C 2025	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS		X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
21	MLG	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
22	CONSORCIO OP	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
25	CONSORCIO WC-8E M	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
26	CONSORCIO MGD	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
28	CONSORCIO CULTURA	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
29	CONSORCIO CASPRO CULTURAL	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
30	CIC	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 2					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
33	CONSORCIO CULTURAL VALLEDUPAR 3	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
34	CULTURALES	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
35	INVECOR2	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
36	CONSORCIO CREANDO PROYECTOS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
37	UT CULTURA BOGOTÁ	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
39	CONSORCIO SAJS	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
40	CONSORCIO VASA	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS HE 2025		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
42	HCG CONSTRUCCIONES	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,25	HABILITADO
44	CONSORCIO PROCULTURA	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
46	CONSORCIO CULTURA	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 2					
Nº oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
47	CONSORCIO CULTURAL ET	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
48	CONSORCIO INFRACULTURAL SR 01	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
49	GRU S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
50	1616 INGENIERIA S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
52	CONSORCIO ORIENTE	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
55	CONSORCIO ARES ED	X		X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	NO HABILITADO		LOTE NO OFERTADO
56	CONSORCIO CE OBRAS CULTURALES	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
57	CONSORCIO VIRREY		X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2025	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
60	CONSORCIO W&A	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
61	C FORTUNE MC	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 2					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
62	ORIMEG 2025	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
63	CONSORCIO 2025 INCIARCO - BESUTO	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
64	EUT S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
65	CONSORCIO ECO 2025	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
69	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	X		X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
70	UNION TEMPORAL MC 2025	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
72	CONSORCIO CULT 25	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
73	CONSORCIO CIVIL 2025	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
74	CONSORCIO CULTURA LM		X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
75	CONSORCIO CULTURA ING	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
76	CONSORCIO LVSXXV	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 2					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
78	CONSORCIO MINCULTURA FAO	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

EVALUACIÓN PRELIMINAR LOTE 3

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 3					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
1	CONSORCIO ATP 565		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
2	CONSORCIO OBRA CULTURAL 2025		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
3	RAING SAS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
4	TCONSTRUYE	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
5	CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA			X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
6	BERMUDEZ SAS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL			X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 3					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
9	CONSORCIO PACIFICO		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
10	UNI-GER	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
13	CONSORCIO BIG-CONSTRUCCION	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
14	CONSORCIO PANORAMA	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	X		X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
18	CONSORCIO B&C 2025	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS		X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
21	MLG	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
22	CONSORCIO OP	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 3					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
25	CONSORCIO WC-8E M	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
26	CONSORCIO MGD	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
28	CONSORCIO CULTURA	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
29	CONSORCIO CASPRO CULTURAL	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
30	CIC	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
33	CONSORCIO CULTURAL VALLEDUPAR 3	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
34	CULTURALES	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
35	INVECOR2	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
36	CONSORCIO CREANDO PROYECTOS	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
37	UT CULTURA BOGOTÁ	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 3					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
39	CONSORCIO SAJS	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
40	CONSORCIO VASA	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS HE 2025		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
42	HCG CONSTRUCCIONES	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
44	CONSORCIO PROCULTURA	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
46	CONSORCIO CULTURA	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
47	CONSORCIO CULTURAL ET	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
48	CONSORCIO INFRACULTURAL SR 01	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
49	GRU S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
50	1616 INGENIERIA S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
52	CONSORCIO ORIENTE	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025		X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

1131 18 JUL 2025

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 3					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
55	CONSORCIO ARES ED	X		X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
56	CONSORCIO CE OBRAS CULTURALES	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
57	CONSORCIO VIRREY		X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2025	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
60	CONSORCIO W&A	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
61	C FORTUNE MC	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
62	ORIMEG 2025	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
63	CONSORCIO 2025 INCIARCO - BESUTO	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
64	EUT S.A.S	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
65	CONSORCIO ECO 2025	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo		EVALUACIÓN LOTE 3					
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
69	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	X		X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
70	UNION TEMPORAL MC 2025	X			100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
72	CONSORCIO CULT 25	X	X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
73	CONSORCIO CIVIL 2025	X			100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
74	CONSORCIO CULTURA LM		X		100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
75	CONSORCIO CULTURA ING	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
76	CONSORCIO LVSXXV	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
78	CONSORCIO MINCULTURA FAO	X	X	X	100,00 %	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	X	X		100,00 %	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Que, dentro del término de traslado del informe de evaluación preliminar, previsto en el cronograma del proceso de selección, los proponentes presentaron subsanes y observaciones al mismo, de acuerdo con los documentos y escritos aportados y que se encuentran debidamente publicados en la plataforma del Secop II.

Que de conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones y cronograma del proceso, el día 7 de diciembre de 2024 y previo a la audiencia de adjudicación, se publicó el informe de evaluación de requisitos habilitantes y de calificación de los factores ponderables diferentes al económico y el consolidado definitivo, junto con las respuestas a las observaciones presentadas al informe de evaluación preliminar de las propuestas, con el siguiente resultado en su consolidado:

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

EVALUACIÓN DEFINITIVA LOTE 1

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
1	CONSORCIO ATP 565		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
2	CONSORCIO OBRA CULTURAL 2025		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
3	RAING SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
4	TCONSTRUYE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
5	CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
6	BERMUDEZ SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
9	CONSORCIO PACIFICO		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
10	UNI-GER	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,5	HABILITADO
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
13	CONSORCIO BIG-CONSTRUCCION	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
14	CONSORCIO PANORAMA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,25	HABILITADO
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
18	CONSORCIO B&C 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
21	MLG	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
22	CONSORCIO OP	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
25	CONSORCIO WC-8E M	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
26	CONSORCIO MGD	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
28	CONSORCIO CULTURA	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
29	CONSORCIO CASPRO CULTURAL	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
30	CIC	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
33	CONSORCIO CULTURAL VALLEDUPAR 3	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
34	CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
35	INVECOR2	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
36	CONSORCIO CREANDO PROYECTOS	X	X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
37	UT CULTURA BOGOTÁ	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
39	CONSORCIO SAJS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
40	CONSORCIO VASA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS HE 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
42	HCG CONSTRUCCIONES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
44	CONSORCIO PROCULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
46	CONSORCIO CULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
47	CONSORCIO CULTURAL ET	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
48	CONSORCIO INFRACULTURAL SR 01	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
49	GRU S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
50	1616 INGENIERIA S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
52	CONSORCIO ORIENTE	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
55	CONSORCIO ARES ED	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
56	CONSORCIO CE OBRAS CULTURALES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
57	CONSORCIO VIRREY		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
60	CONSORCIO W&A	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
61	C FORTUNE MC	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
62	ORIMEG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
63	CONSORCIO 2025 INCIARCO - BESUTO	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
64	EUT S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,25	HABILITADO
65	CONSORCIO ECO 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
69	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
70	UNION TEMPORAL MC 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
72	CONSORCIO CULT 25	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
73	CONSORCIO CIVIL 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	20,5	HABILITADO
74	CONSORCIO CULTURA LM		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
75	CONSORCIO CULTURA ING	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
76	CONSORCIO LVSXXV	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
78	CONSORCIO MINCULTURA FAO	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

EVALUACIÓN DEFINITIVA LOTE 2

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
1	CONSORCIO ATP 565		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
2	CONSORCIO OBRA CULTURAL 2025		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
3	RAING SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
4	TCONSTRUYE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
5	CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
6	BERMUDEZ SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
9	CONSORCIO PACIFICO		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
10	UNI-GER	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,5	HABILITADO
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
13	CONSORCIO BIG-CONSTRUCCION	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
14	CONSORCIO PANORAMA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,25	HABILITADO
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

1131 18 JUL 2025

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
18	CONSORCIO B&C 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,25	HABILITADO
21	MLG	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
22	CONSORCIO OP	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
25	CONSORCIO WC-8E M	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
26	CONSORCIO MGD	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
28	CONSORCIO CULTURA	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
29	CONSORCIO CASPRO CULTURAL	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
30	CIC	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
33	CONSORCIO CULTURAL VALLEDUPAR 3	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
34	CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
35	INVECOR2	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
36	CONSORCIO CREANDO PROYECTOS	X	X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,25	NO HABILITADO
37	UT CULTURA BOGOTÁ	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
39	CONSORCIO SAJS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
40	CONSORCIO VASA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS HE 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
42	HCG CONSTRUCCIONES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
44	CONSORCIO PROCULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
46	CONSORCIO CULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
47	CONSORCIO CULTURAL ET	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
48	CONSORCIO INFRACULTURAL SR 01	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFER

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
												TADO
49	GRU S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
50	1616 INGENIERIA S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
52	CONSORCIO ORIENTE	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
55	CONSORCIO ARES ED	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	HABILITADO		LOTE NO OFERTADO
56	CONSORCIO CE OBRAS CULTURALES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
57	CONSORCIO VIRREY		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
60	CONSORCIO W&A	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
61	C FORTUNE MC	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
62	ORIMEG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
63	CONSORCIO 2025 INCIARCO - BESUTO	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
64	EUT S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,25	HABILITADO
65	CONSORCIO ECO 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
69	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
70	UNION TEMPORAL MC 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
72	CONSORCIO CULT 25	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
73	CONSORCIO CIVIL 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
74	CONSORCIO CULTURA LM		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
75	CONSORCIO CULTURA ING	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
76	CONSORCIO LVSXXV	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
78	CONSORCIO MINCULTURA FAO	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

EVALUACIÓN DEFINITIVA LOTE 3

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
1	CONSORCIO ATP 565		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
2	CONSORCIO OBRA CULTURAL 2025		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
3	RAING SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
4	TCONSTRUYE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
5	CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
6	BERMUDEZ SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,5	HABILITADO
9	CONSORCIO PACIFICO		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
10	UNI-GER	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
13	CONSORCIO BIG-CONSTRUCCION	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
14	CONSORCIO PANORAMA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
18	CONSORCIO B&C 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,25	HABILITADO
21	MLG	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
22	CONSORCIO OP	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO		NO HABILITADO
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
25	CONSORCIO WC-8E M	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
26	CONSORCIO MGD	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
28	CONSORCIO CULTURA	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
29	CONSORCIO CASPRO CULTURAL	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
30	CIC	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
33	CONSORCIO CULTURAL VALLEDUPAR 3	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
34	CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
35	INVECOR2	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
36	CONSORCIO CREANDO PROYECTOS	X	X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
37	UT CULTURA BOGOTÁ	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
39	CONSORCIO SAJS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
40	CONSORCIO VASA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS HE 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

1131 18 JUL 2025

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
42	HCG CONSTRUCCIONES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
44	CONSORCIO PROCULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
46	CONSORCIO CULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
47	CONSORCIO CULTURAL ET	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
48	CONSORCIO INFRACULTURAL SR 01	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
49	GRU S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
50	1616 INGENIERIA S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
52	CONSORCIO ORIENTE	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
55	CONSORCIO ARES ED	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
56	CONSORCIO CE OBRAS CULTURALES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

1131 18 JUL 2025

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
57	CONSORCIO VIRREY		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
60	CONSORCIO W&A	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
61	C FORTUNE MC	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
62	ORIMEG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
63	CONSORCIO 2025 INCIARCO - BESUTO	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
64	EUT S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,25	HABILITADO
65	CONSORCIO ECO 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
69	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
70	UNION TEMPORAL MC 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
72	CONSORCIO CULT 25	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
73	CONSORCIO CIVIL 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
74	CONSORCIO CULTURA LM		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
75	CONSORCIO CULTURA ING	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
76	CONSORCIO LVSXXV	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
78	CONSORCIO MINCULTURA FAO	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		NO HABILITADO
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Que, de conformidad con el cronograma del proceso, el pliego de condiciones, así como lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 artículo 30 numeral 12 parágrafo 3, Ley 1150 de 2007 articulo 9, Ley 1882 de 2018 y el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015, el día 16 de julio de 2025 a las 9:00 a.m., y previo aviso publicado en el Secop, se dio inicio a la Audiencia de Adjudicación y/o Declaratoria de Desierta del proceso de selección, de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, de la cual se deja constancia en la respectiva acta y archivos de las grabaciones de la misma.

Que se procedió a dar cumplimiento al orden del día tal como consta en las grabaciones y el acta de audiencia, así:

1. Presentación de los funcionarios asistentes por parte del Ministerio.
2. Presentación de los proponentes y personas que asisten a la audiencia; y designación de los voceros que actuarán como representantes de los proponentes dentro de misma.
3. Verificación de asistencia de veedurías ciudadanas
4. Lectura de las reglas de la Audiencia Pública de Adjudicación y de la Intervención de los asistentes.
5. Intervención de los proponentes por una sola vez por el término máximo de cinco (5) minutos para que se pronuncien sobre las respuestas dadas por el Ministerio a las observaciones presentadas y del informe de evaluación definitivo.
6. Uso de la palabra por una única vez de los proponentes que así lo soliciten y por un término máximo de tres (3) minutos para que

respondan a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.

7. Pronunciamiento del Ministerio respecto de las observaciones y aclaraciones recibidas en la audiencia.
8. Apertura en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II del Sobre No. 2 Anexo Económico – PROPUESTA ECONÓMICA.
9. Determinación y aplicación del método o fórmula para la ponderación de la propuesta económica, numeral 4.1.4. del documento complemento al pliego de condiciones para cada uno de los grupos.
10. Verificación de propuestas económicas y corrección aritmética (si a ello hay lugar) y evaluación de la oferta económica.
11. Intervención de los proponentes por una sola vez por el término máximo de tres (3) minutos para que se pronuncien únicamente sobre el informe de evaluación económica.
12. Respuesta a las observaciones recibidas en audiencia al informe de evaluación económica.
13. Aplicación del numeral 4.7. CRITERIOS DE DESEMPATE del documento complemento al pliego de condiciones, en el evento de resultar propuestas empatadas.
14. Recomendación del Comité Asesor y Evaluador al Ordenador del Gasto de la adjudicación o declaratoria de desierto.
15. Adjudicación o declaratoria de desierto.
16. Cierre de la audiencia

Que acto seguido, una vez identificados los funcionarios y contratistas del Ministerio, así como los Participantes en la audiencia, se otorgó la palabra a los proponentes para que por un término de 5 minutos realizaran observaciones al informe de evaluación definitivo y de ponderación de las ofertas, todas las cuales, así como las recibidas en el curso de la audiencia a través de la plataforma Secop II fueron atendidas en el desarrollo de la misma.

Que, una vez finalizadas las observaciones al informe de evaluación de requisitos habilitantes y factores de ponderación diferentes al económico y otorgadas las respuestas a las mismas, la entidad publicó en la plataforma SECOP II, el informe de evaluación de requisitos habilitantes y de ponderación diferentes al económico con los ajustes procedentes a los requisitos habilitantes, jurídicos, financieros , técnicos y requisitos de puntaje, según lo debatido en la audiencia, como se muestra a continuación:

EVALUACIÓN FINAL AUDIENCIA LOTE 1

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
1	CONSORCIO ATP 565		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
2	CONSORCIO OBRA CULTURAL 2025		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
3	RAING SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
4	TCONSTRUYE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
5	CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
6	BERMUDEZ SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
9	CONSORCIO PACIFICO		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
10	UNI-GER	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,5	HABILITADO
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
13	CONSORCIO BIG-CONSTRUCCION	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
14	CONSORCIO PANORAMA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,25	HABILITADO
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
18	CONSORCIO B&C 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
21	MLG	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
22	CONSORCIO OP	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
25	CONSORCIO WC-8E M	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
26	CONSORCIO MGD	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
28	CONSORCIO CULTURA	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
29	CONSORCIO CASPRO CULTURAL	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
30	CIC	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
33	CONSORCIO CULTURAL VALLEDUPAR 3	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
34	CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
35	INVECOR2	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
36	CONSORCIO CREANDO PROYECTOS	X	X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
37	UT CULTURA BOGOTÁ	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
39	CONSORCIO SAJS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
40	CONSORCIO VASA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS HE 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
42	HCG CONSTRUCCIONES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
44	CONSORCIO PROCULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
46	CONSORCIO CULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
47	CONSORCIO CULTURAL ET	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
48	CONSORCIO INFRACULTURAL SR 01	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO	NO HABILITADO		RECHAZADO
49	GRU S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
50	1616 INGENIERIA S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
52	CONSORCIO ORIENTE	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
55	CONSORCIO ARES ED	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
56	CONSORCIO CE OBRAS CULTURALES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
57	CONSORCIO VIRREY		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
60	CONSORCIO W&A	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
61	C FORTUNE MC	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
62	ORIMEG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
63	CONSORCIO 2025 INCIARCO - BESUTO	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
64	EUT S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,25	HABILITADO
65	CONSORCIO ECO 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 1			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 1	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 1	PONDERABLES LOTE 1 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 1
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
69	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
70	UNION TEMPORAL MC 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
72	CONSORCIO CULT 25	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
73	CONSORCIO CIVIL 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	20,5	HABILITADO
74	CONSORCIO CULTURA LM		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
75	CONSORCIO CULTURA ING	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
76	CONSORCIO LVSXXV	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
78	CONSORCIO MINCULTURA FAO	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

EVALUACIÓN FINAL AUDIENCIA LOTE 2

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 2			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 2	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 2	PONDERABLES LOTE 2 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 2

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 2			
1	CONSORCIO ATP 565		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
2	CONSORCIO OBRA CULTURAL 2025		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
3	RAING SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
4	TCONSTRUYE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
5	CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
6	BERMUDEZ SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
9	CONSORCIO PACIFICO		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
10	UNI-GER	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,5	HABILITADO
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
13	CONSORCIO BIG-CONSTRUCCION	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
14	CONSORCIO PANORAMA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,25	HABILITADO
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
18	CONSORCIO B&C 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 2			
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,25	HABILITADO
21	MLG	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
22	CONSORCIO OP	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
25	CONSORCIO WC-8E M	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO		RECHAZADO
26	CONSORCIO MGD	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
28	CONSORCIO CULTURA	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
29	CONSORCIO CASPRO CULTURAL	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
30	CIC	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
33	CONSORCIO CULTURAL VALLEDUPAR 3	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
34	CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
35	INVECOR2	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
36	CONSORCIO CREANDO PROYECTOS	X	X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,25	RECHAZADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 2			
37	UT CULTURA BOGOTÁ	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
39	CONSORCIO SAJS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
40	CONSORCIO VASA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS HE 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
42	HCG CONSTRUCCIONES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
44	CONSORCIO PROCULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
46	CONSORCIO CULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
47	CONSORCIO CULTURAL ET	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
48	CONSORCIO INFRACULTURAL SR 01	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
49	GRU S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
50	1616 INGENIERIA S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
52	CONSORCIO ORIENTE	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 2			
55	CONSORCIO ARES ED	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	HABILITADO		LOTE NO OFERTADO
56	CONSORCIO CE OBRAS CULTURALES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
57	CONSORCIO VIRREY		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
60	CONSORCIO W&A	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
61	C FORTUNE MC	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
62	ORIMEG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
63	CONSORCIO 2025 INCIARCO - BESUTO	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
64	EUT S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,25	HABILITADO
65	CONSORCIO ECO 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
69	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
70	UNION TEMPORAL MC 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
72	CONSORCIO CULT 25	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 2			
73	CONSORCIO CIVIL 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
74	CONSORCIO CULTURA LM		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
75	CONSORCIO CULTURA ING	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
76	CONSORCIO LVSXXV	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
78	CONSORCIO MINCULTURA FAO	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO

EVALUACIÓN FINAL AUDIENCIA LOTE 3

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 3			
N° oferta	**Oferente**	**lote 1**	**lote 2**	**lote 3**	**Porcentaje**	**Tipo de Oferente**	**KRC**	**JURIDICA**	**EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3**	**EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3**	**PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)**	**ESTADO FINAL LOTE 3**
1	CONSORCIO ATP 565		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
2	CONSORCIO OBRA CULTURAL 2025		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
3	RAING SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
4	TCONSTRUYE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
5	CONSORCIO DAZA ARQUITECTURA			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
6	BERMUDEZ SAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 3			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL			X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,5	HABILITADO
9	CONSORCIO PACIFICO		X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
10	UNI-GER	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
13	CONSORCIO BIG-CONSTRUCCION	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
14	CONSORCIO PANORAMA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
18	CONSORCIO B&C 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,25	HABILITADO
21	MLG	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
22	CONSORCIO OP	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO		RECHAZADO

1131 18 JUL 2025

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 3			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
25	CONSORCIO WC-8E M	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
26	CONSORCIO MGD	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
28	CONSORCIO CULTURA	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
29	CONSORCIO CASPRO CULTURAL	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
30	CIC	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
33	CONSORCIO CULTURAL VALLEDUPAR 3	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
34	CULTURALES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
35	INVECOR2	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
36	CONSORCIO CREANDO PROYECTOS	X	X		100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
37	UT CULTURA BOGOTÁ	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
39	CONSORCIO SAJS	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 3			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
40	CONSORCIO VASA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
41	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS HE 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
42	HCG CONSTRUCCIONES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
44	CONSORCIO PROCULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
46	CONSORCIO CULTURA	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
47	CONSORCIO CULTURAL ET	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
48	CONSORCIO INFRACULTURAL SR 01	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	NO HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
49	GRU S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
50	1616 INGENIERIA S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
52	CONSORCIO ORIENTE	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
55	CONSORCIO ARES ED	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO

1131 18 JUL 2025

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 3			
Nº oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
56	CONSORCIO CE OBRAS CULTURALES	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
57	CONSORCIO VIRREY		X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
58	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS CULTURALES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
60	CONSORCIO W&A	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
61	C FORTUNE MC	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
62	ORIMEG 2025	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	40,5	HABILITADO
63	CONSORCIO 2025 INCIARCO - BESUTO	X			100,00%	Proponente Plural	NO HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
64	EUT S.A.S	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	HABILITADO	39,25	HABILITADO
65	CONSORCIO ECO 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
69	O & L PROYECTOS DE INGENIERIA SAS	X		X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
70	UNION TEMPORAL MC 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Proponente		Lotes Ofertados			Participación y Tipo				EVALUACIÓN LOTE 3			
N° oferta	Oferente	lote 1	lote 2	lote 3	Porcentaje	Tipo de Oferente	KRC	JURIDICA	EVALUACIÓN TÉCNICA LOTE 3	EVALUACIÓN FINANCIERA LOTE 3	PONDERABLES LOTE 3 (Solo oferentes Habilitados)	ESTADO FINAL LOTE 3
72	CONSORCIO CULT 25	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
73	CONSORCIO CIVIL 2025	X			100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
74	CONSORCIO CULTURA LM		X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
75	CONSORCIO CULTURA ING	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
76	CONSORCIO LVSXXV	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO
78	CONSORCIO MINCULTURA FAO	X	X	X	100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	NO HABILITADO	HABILITADO		RECHAZADO
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	X	X		100,00%	Proponente Plural	HABILITADO	HABILITADO	LOTE NO OFERTADO	LOTE NO OFERTADO		LOTE NO OFERTADO

Que el día 17 de julio de 2025 siendo las 7:30 a.m., y previo aviso publicado en el SECOP II, se dio continuidad con el orden del día de la audiencia de adjudicación o declaratoria de desierta y se continuó con el numeral 8. *Apertura en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II del Sobre No. 2 Anexo Económico – PROPUESTA ECONÓMICA,* procediendo en dicha sesión a la apertura de sobres económicos de las ofertas habilitadas, con el fin de realizar la evaluación de las mismas.

Que abiertos los sobres, la audiencia se suspendió para que el comité evaluador técnico y económico verificara las ofertas económicas, hiciera la verificación aritmética de las mismas, validara la necesidad de requerir por precios artificialmente bajos y la posible incursión en causales de rechazo .

Que una vez abiertos los sobres, la verificación de la presentación de las ofertas económicas y determinada la TRM vigente aplicable para la ponderación económica de las ofertas (correspondiente a la TRM del día 17/07/2025), a través de los profesionales designados para la evaluación económica de las ofertas, y conforme lo establecido en el orden del día y en el numeral 2.6 del pliego de condiciones, se procedió a evaluar las ofertas económicas a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio aplicable de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1. del Pliego de Condiciones, así:

Superintendencia Financiera de Colombia

La validez de este documento puede verificarse en la página www.superfinanciera.gov.co con el número de PIN

Certificado Generado con el Pin No: 0844390355580555

Generado el 17 de julio de 2025 a las 16:01:17

EL DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 11.2.1.4.15 del Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 0416 de 2006 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

CERTIFICA:

Que la Tasa de Cambio Representativa del Mercado certificada para los días señalados, es

FECHA (DIA/MES/AÑO)	TASA DE CAMBIO REPRESENTATIVA DEL MERCADO COP/USD
18/07/2025	$4,016.44

Expedida en Bogotá, D.C el jueves 17 de julio de 2025

0844390355580555

FRANCISCO JAVIER DUQUE SANDOVAL
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO (E)

"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto tiene plena validez para todos los efectos legales."

COPIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Rango (inclusive)	Número	Método
De 0.00 a 0.24	1	Mediana con valor absoluto
De **0.25 a 0.49**	2	**Media geométrica**
De 0.50 a 0.74	3	Media aritmética baja
De 0.75 a 0.99	4	Menor valor

Que, conforme con lo establecido en el numeral 4.1.4 del pliego de condiciones, el cual dispone que "*en los Procesos de Contratación estructurados por grupos, la TRM definirá el método con el cual se asignará el puntaje para el primer grupo a adjudicar, según el orden definido por la Entidad. Para la adjudicación del segundo grupo se tomará el siguiente método de acuerdo con la tabla anterior, en orden ascendente, y así sucesivamente; teniendo en cuenta que se reiniciará desde el primer método en caso de agotarse el último método*" y teniendo en cuenta que el orden de adjudicación fue el definido en el numeral 1.1 del pliego de condiciones, según lo previsto en el numeral 2.6 del pliego de condiciones, se estableció en la audiencia el método de ponderación económica de las ofertas para cada uno de los grupos así:

GRUPO	MÉTODO
Lote 1	**Media geométrica**
Lote 2	**Media aritmética baja**
Lote 3	**Menor valor**

Que en el curso de la audiencia, en sesión del 17 de julio de 2025, la entidad publicó en la plataforma SECOP II con el asunto *Informe de evaluación económica y ponderación de ofertas*, procediendo a publicar los documentos denominados "*Evaluación económica Formulario 1 - LOTE 1 - RES SANEAMIENTO; Evaluación económica Formulario 1 – LOTE 2 - RES SANEAMIENTO; Evaluación*

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LPO-0001-2025"*

económica Formulario 1 - LOTE 3 - RES SANEAMIENTO" y "EVALUACION Y PONDERACION FINAL - LPO 0001-2025", con el siguiente resultado:

INFORME EVALUACIÓN ECONOMICA LOTE 1

Nº OFERTA	PROPONENTE	ESTADO REVISIÓN ATANQUEZ	ESTADO REVISIÓN SANTA ROSA S	ESTADO FINAL
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
3	RAING SAS	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
10	UNI-GER	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
18	CONSORCIO B&C 2025	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
50	1616 INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
47	CONSORCIO CULTURAL ET	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
25	CONSORCIO WC-8E M	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
61	C FORTUNE MC	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
28	CONSORCIO CULTURA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
49	GRU S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
44	CONSORCIO PROCULTURA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
62	ORIMEG 2025	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
46	CONSORCIO CULTURA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
73	CONSORCIO CIVIL 2025	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
65	CONSORCIO ECO 2025	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
26	CONSORCIO MGD	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
34	CULTURALES	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
40	CONSORCIO VASA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
30	CIC	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
72	CONSORCIO CULT 25	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO REVISIÓN ATANQUEZ	ESTADO REVISIÓN SANTA ROSA S	ESTADO FINAL
52	CONSORCIO ORIENTE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
39	CONSORCIO SAJS	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
4	TCONSTRUYE	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
14	CONSORCIO PANORAMA	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
56	CONSORCIO CE OBRAS CULTURALES	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
60	CONSORCIO W&A	NO CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
64	EUT S.A.S	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO

INFORME EVALUACIÓN ECONOMICA LOTE 2

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO REVISIÓN GUACHENE	ESTADO REVISIÓN VILLA RICA	ESTADO FINAL
3	RAING SAS	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
6	BERMUDEZ SAS	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
10	UNI-GER	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
18	CONSORCIO B&C 2025	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
28	CONSORCIO CULTURA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
34	CULTURALES	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
40	CONSORCIO VASA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
44	CONSORCIO PROCULTURA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
46	CONSORCIO CULTURA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
49	GRU S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
50	1616 INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
52	CONSORCIO ORIENTE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
57	CONSORCIO VIRREY	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
60	CONSORCIO W&A	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LPO-0001-2025"*

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO REVISIÓN GUACHENE	ESTADO REVISIÓN VILLA RICA	ESTADO FINAL
61	C FORTUNE MC	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
62	ORIMEG 2025	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
64	EUT S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
72	CONSORCIO CULT 25	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
74	CONSORCIO CULTURA LM	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**

INFORME EVALUACIÓN ECONOMICA LOTE 3

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO REVISIÓN NOVITA	ESTADO REVISIÓN JURADO	ESTADO FINAL
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
20	CAMOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS	CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
34	CULTURALES	NO CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
40	CONSORCIO VASA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
44	CONSORCIO PROCULTURA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
46	CONSORCIO CULTURA	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
49	GRU S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
50	1616 INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
57	CONSORCIO VIRREY	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
61	C FORTUNE MC	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
62	ORIMEG 2025	NO CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
64	EUT S.A.S	NO CUMPLE	NO CUMPLE	RECHAZADO

Determinado lo anterior, la entidad procedió a ponderar las ofertas en el factor económico, así:

PONDERACIÓN ECONÓMICA LOTE 1

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	Media geométrica	TOTAL PONDERABLES	PUNTAJE FINAL
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	HABILITADO	57,456772110	40,50	97,956772110
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	HABILITADO	57,896875873	40,50	98,396875873
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	HABILITADO	57,998339567	40,50	98,498339567

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	Media geométrica	TOTAL PONDERABLES	PUNTAJE FINAL
39	CONSORCIO SAJS	HABILITADO	58,130190188	40,50	98,630190188
52	CONSORCIO ORIENTE	HABILITADO	58,312237357	40,50	98,812237357
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	HABILITADO	58,356122706	40,50	98,856122706
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	HABILITADO	58,366347858	40,50	98,866347858
72	CONSORCIO CULT 25	HABILITADO	58,734360099	40,50	99,234360099
16	CONSORCIO MASTER CULTURA	HABILITADO	59,025084508	40,50	99,525084508
30	CIC	HABILITADO	59,129550371	40,50	99,629550371
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	HABILITADO	59,200690580	40,50	99,700690580
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	HABILITADO	59,237856372	40,50	99,737856372
40	CONSORCIO VASA	HABILITADO	59,252296097	40,50	99,752296097
34	CULTURALES	HABILITADO	59,256835081	40,50	99,756835081
26	CONSORCIO MGD	HABILITADO	59,282158942	40,50	99,782158942
65	CONSORCIO ECO 2025	HABILITADO	59,315232672	40,50	99,815232672
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	HABILITADO	59,315754130	40,50	79,815754130
73	CONSORCIO CIVIL 2025	HABILITADO	59,344436321	20,50	99,844436321
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	HABILITADO	59,383563959	40,50	99,883563959
46	CONSORCIO CULTURA	HABILITADO	59,409340410	40,50	99,909340410
38	**CONSORCIO CULTURAL ARSAF**	**HABILITADO**	**59,414484556**	**40,50**	**99,914484556**
62	ORIMEG 2025	HABILITADO	59,393426511	40,50	99,893426511
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	HABILITADO	59,385012683	40,50	99,885012683
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	HABILITADO	59,364348205	40,50	99,864348205
44	CONSORCIO PROCULTURA	HABILITADO	59,327510804	40,50	99,827510804
49	GRU S.A.S	HABILITADO	59,286067540	40,50	99,786067540
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	HABILITADO	59,228859830	40,50	99,728859830
28	CONSORCIO CULTURA	HABILITADO	59,149073890	40,50	99,649073890
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	HABILITADO	59,139779457	40,50	99,639779457
61	C FORTUNE MC	HABILITADO	59,133180028	40,50	99,633180028
25	CONSORCIO WC-8E M	HABILITADO	59,107198299	40,50	99,607198299
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	HABILITADO	58,993193978	40,50	99,493193978
47	CONSORCIO CULTURAL ET	HABILITADO	58,961925090	40,50	99,461925090
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	HABILITADO	58,936820770	40,50	99,436820770
50	1616 INGENIERIA S.A.S	HABILITADO	58,814862357	40,50	99,314862357

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	Media geométrica	TOTAL PONDERABLES	PUNTAJE FINAL
18	CONSORCIO B&C 2025	HABILITADO	58,645975750	40,50	98,895975750
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	HABILITADO	58,585301220	40,25	98,085301220
10	UNI-GER	HABILITADO	58,577242318	39,50	99,077242318
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	HABILITADO	58,540487082	40,50	99,040487082
3	RAING SAS	HABILITADO	58,427798558	40,50	98,927798558
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	HABILITADO	58,349543433	40,50	98,849543433
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	HABILITADO	58,049479271	40,50	98,549479271
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	HABILITADO	57,671871765	40,50	57,671871765

PONDERACIÓN ECONÓMICA LOTE 2

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	Media aritmética baja	TOTAL PONDERABLES	PUNTAJE FINAL
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	HABILITADO	58,274288011	40,5	98,774288011
60	CONSORCIO W&A	HABILITADO	58,313812947	40,5	98,813812947
57	CONSORCIO VIRREY	HABILITADO	58,621848811	40,5	99,121848811
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	HABILITADO	58,647288970	40,5	99,147288970
72	**CONSORCIO CULT 25**	**HABILITADO**	**59,323224710**	**40,5**	**99,823224710**
34	CULTURALES	HABILITADO	58,914470903	40,5	99,414470903
40	CONSORCIO VASA	HABILITADO	58,900420309	40,5	99,400420309
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	HABILITADO	58,851953257	40,5	99,351953257
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	HABILITADO	58,822310970	40,5	99,322310970
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	HABILITADO	58,663423410	40,5	99,163423410
46	CONSORCIO CULTURA	HABILITADO	58,638946200	40,5	99,138946200
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	HABILITADO	58,632701625	40,5	99,132701625
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	HABILITADO	58,488518586	40,5	98,988518586
49	GRU S.A.S	HABILITADO	58,441702935	40,5	98,941702935
18	CONSORCIO B&C 2025	HABILITADO	58,416987208	40,5	98,916987208
44	CONSORCIO PROCULTURA	HABILITADO	58,414729971	40,5	98,914729971
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025	HABILITADO	58,263865076	40,5	98,763865076
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	HABILITADO	58,183093751	40,5	98,683093751
28	CONSORCIO CULTURA	HABILITADO	58,182258468	40,5	98,682258468
6	BERMUDEZ SAS	HABILITADO	58,178184005	40,5	98,678184005

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	Media aritmética baja	TOTAL PONDERABLES	PUNTAJE FINAL
61	C FORTUNE MC	HABILITADO	58,145425705	40,5	98,645425705
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT	HABILITADO	58,114490710	40,5	98,614490710
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	HABILITADO	58,038271128	40,5	98,538271128
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	HABILITADO	57,953230216	40,5	98,453230216
52	CONSORCIO ORIENTE	HABILITADO	57,944227087	40,5	98,444227087
62	ORIMEG 2025	HABILITADO	57,902647247	40,5	98,402647247
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	HABILITADO	57,842328118	40,5	98,342328118
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	HABILITADO	57,616156419	40,25	97,866156419
3	RAING SAS	HABILITADO	57,456140990	40,5	97,956140990
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25	HABILITADO	57,295277374	40,5	97,795277374
50	1616 INGENIERIA S.A.S	HABILITADO	57,272401831	40,5	97,772401831
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	HABILITADO	57,265924992	40,5	97,765924992
10	UNI-GER	HABILITADO	57,174776365	39,5	96,674776365
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	HABILITADO	56,690968634	40,5	97,190968634
74	CONSORCIO CULTURA LM	HABILITADO	56,644206994	40,5	97,144206994
64	EUT S.A.S	HABILITADO	55,058341946	39,25	94,308341946

PONDERACIÓN ECONÓMICA LOTE 3

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	Menor Valor	TOTAL PONDERABLES	PUNTAJE FINAL
59	**H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S**	**HABILITADO**	**59,500000000**	**40,5**	**100**
57	CONSORCIO VIRREY	HABILITADO	58,978367383	40,5	99,47836738
40	CONSORCIO VASA	HABILITADO	57,463742643	40,5	97,96374264
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	HABILITADO	57,439089418	40,5	97,93908942
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	HABILITADO	57,288112214	40,5	97,78811221
46	CONSORCIO CULTURA	HABILITADO	57,261847822	40,5	97,76184782
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	HABILITADO	57,256611261	40,5	97,75661126
44	CONSORCIO PROCULTURA	HABILITADO	57,085074228	40,5	97,58507423
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	HABILITADO	57,065511974	40,5	97,56551197
49	GRU S.A.S	HABILITADO	57,018011330	40,5	97,51801133
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL	HABILITADO	56,543269965	39,5	96,04326996

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° OFERTA	PROPONENTE	ESTADO FINAL	Menor Valor	TOTAL PONDERABLES	PUNTAJE FINAL
61	C FORTUNE MC	HABILITADO	56,317625817	40,5	96,81762582
50	1616 INGENIERIA S.A.S	HABILITADO	56,229861281	40,5	96,72986128
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	HABILITADO	55,532900334	40,5	96,03290033
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	HABILITADO	55,315075208	40,5	95,81507521

Así mismo, el 17 de julio de 2025, se realizó publicación en el secop del requerimiento por encontrarse, presuntamente, en precios artificialmente bajos, en los siguientes términos:

El MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES, luego de realizada la verificación y evaluación de las propuestas económicas del ***LOTE 3*** *de los proponentes habilitados dentro del proceso de LICITACION PÚBLICA DE OBRA No. 001 DE 2025, y de acuerdo con las indicaciones de la GUÍA PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN expedida por Colombia Compra Eficiente, se permite requerir las aclaraciones de los siguientes proponentes:*

DIRIGIDA A:

1. PROPONENTE 57 CONSORCIO VIRREY

VALOR OFERTA LOTE 3: $ 2.660.166.719,00

2. PROPONENTE 59 HAH CONSTRUCCIONES SAS

VALOR OFERTA LOTE 3: $ 2.636.845.211,00

REQUERIMIENTO:

Revisadas sus propuestas económicas y realizado el análisis respectivo, nos permitimos solicitar se sirvan aclarar y/o justificar el valor Total Ofertado, toda vez que presentan un Valor de Oferta Económica por debajo del "Valor Mínimo Aceptable" ***($2.695.916.001,99)****; dicho valor fue calculado por la entidad, a través de la herramienta "Comparación Relativa" de acuerdo con los parámetros establecidos por Colombia Compra Eficiente en la Guía para el manejo de precios artificialmente bajos, teniendo en cuenta que el VALOR DE PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO PARA EL LOTE 3 ES DE* ***$ 2.902.416.311,00.***

De conformidad con el informe de evaluación del proceso del asunto, y dando aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 que establece que la Entidad Estatal debe solicitar aclaraciones al proponente que presenta una oferta que parece artificialmente baja, se requiere a LOS PROPONTENTES 57 Y 59 para que expliquen por escrito y de manera detallada ***(insumos, equipos, herramientas, mano de obra y transportes)*** *su oferta económica. La explicación del proponente debe ser completa para permitir el análisis completo de la oferta y su sostenibilidad durante la vigencia del contrato.*

Colombia Compra Eficiente recomienda incluir en la solicitud de aclaración de la oferta la siguiente desagregación de su precio:

Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) +gastos generales+imprevistos+utilidad

La Entidad Estatal analizará la desagregación de los precios ofertados dentro de cada presupuesto con base en el Estudio del Sector y la información del mercado disponible.

La Entidad Estatal puede solicitar aclaraciones tantas veces como lo considere necesario.

Igualmente se solicita ampliar su manifestación con respecto de los siguientes temas:

* *Que la oferta económica presentada responde a circunstancias objetivas.*

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LPO-0001-2025"*

* *Que la oferta económica presentada no ha superado el punto de no pérdida.*
* *Que el proponente no desmejorará la calidad de los bienes objeto del contrato.*
* *Que el proponente responderá por todo daño que se pueda presentar en virtud de una indebida cuantificación de su oferta económica.*

Respecto a cada una de las anteriores inquietudes, se solicita respetuosamente a los proponentes aportar la documentación que justifique y acredite los argumentos que sustentan al valor de su oferta, atendiendo lo indicado en la guía de Colombia Compra Eficiente, de lo contrario, su oferta sería rechazada y se continuará con el orden de elegibilidad.

Asimismo, con la respuesta dada, se considera bajo la gravedad de juramento y acompañado de la respectiva evidencia por parte del oferente, que en caso de ser aceptados sus argumentos y de ser adjudicado el contrato, mantendrá los precios durante la vigencia del contrato y que los mismos no constituirán de ningún modo desequilibrio económico en la futura relación contractual.

El término para allegar su respuesta deberá darse a más tardar, el 18 de julio de 2025 a las 11:00 am.

Que el 18 de julio de 2025, siendo las 8:00 a.m., se reinició la audiencia de adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso de licitación de obra pública MC LPO 0001 2025, en la cual se informó a los proponentes e interesados de la publicación del informe de evaluación económico y del requerimiento realizado a los precios artificialmente bajos. Para ello se corrió traslado a los proponentes, del informe de evaluación económico de los Lotes 1 y 2, para que a las 9:30 a.m., presentarán las observaciones al mismo.

En relación con el Lote 3, se otorgó un plazo hasta las 11:00 a.m., del 18 de julio de 2025, para que los proponentes requeridos por presuntos precios artificialmente bajos, para que presentaran la respuesta o justificación al mismo.

Que a las 9:30 a.m., se reinició la audiencia otorgándole la palabra a los proponentes habilitados, por el término de 3 minutos, para que presentaran sus observaciones al informe de evaluación económica. Posteriormente, terminada la intervención de los proponentes, se suspendió la audiencia hasta las 12:00 p.m., con el fin que el comité evaluador analizará y otorgara respuesta a las observaciones formuladas al informe de evaluación de las propuestas económicas de los lotes 1 y 2.

Que, en atención a las observaciones que fueron realizadas en la audiencia en sesión del 18 de julio de 2025, a las 12:15 P.M. se otorgó respuesta a las observaciones presentadas y de acuerdo a ello se procedió a publicar el informe de evaluación final de las ofertas económicas y ponderación de las mismas y su orden de elegibilidad.

Del informe de elegibilidad presentado y publicado en la plataforma SECOP II, se corrió traslado en audiencia a los proponentes quienes no manifestaron observaciones al mismo.

Que, en consecuencia, en el marco del proceso de selección por licitación pública No. MC-LPO-0001 de 2025, y en concordancia con el pliego de condiciones, y el artículo 2.2.1.1.2.2.6. del Decreto 1082 de 2015, el comité asesor y evaluador recomendó a la ordenadora del gasto, la adjudicación de los contratos derivados del proceso de selección por licitación pública No. MC-LPO-0001 de 2025 cuyo objeto es "*Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados de compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias*", estructurada por lotes, a los proponentes cuyas ofertas cumplieron con los requisitos habilitantes exigidos y obtuvieron la máxima calificación y cumplieron los demás requisitos del documento base del pliego de condiciones para ser adjudicatarios en cada uno de los grupos en que está estructurada la licitación en el orden del numeral 1.1 del pliego de condiciones, conforme los resultados y el orden de elegibilidad según se presentó en la audiencia de adjudicación así:

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

Lote 1:

N° OFERTA	PROPONENTE	PUNTAJE FINAL
62	**ORIMEG 2025**	**100,000000000**
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	99,903149074
46	CONSORCIO CULTURA	99,898005909
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	99,896386418
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	99,875725883
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	99,872234377
44	CONSORCIO PROCULTURA	99,838895510
73	CONSORCIO CIVIL 2025	99,833114204
65	CONSORCIO ECO 2025	99,803916125
49	GRU S.A.S	99,797460153
26	CONSORCIO MGD	99,770848706
34	CULTURALES	99,745529677
40	CONSORCIO VASA	99,740991559
67	CONSORCIO CULTURA CARIBE	99,740263357
7	CONSORCIO C CULTURAL 25	99,726554589
77	CONSORCIO ADECUACIONES 2025	99,689395887
28	CONSORCIO CULTURA	99,660492639
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	99,651199979
61	C FORTUNE MC	99,644601810
25	CONSORCIO WC-8E M	99,618625038
30	CIC	99,618269250
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	99,504642467
47	CONSORCIO CULTURAL ET	99,473379544
12	CONSTRUCTORA ZURIA SAS	99,448280014
50	1616 INGENIERIA S.A.S	99,326344869
72	CONSORCIO CULT 25	99,223154375
10	UNI-GER	99,088770165
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	99,052021942
3	RAING SAS	98,939354917
18	CONSORCIO B&C 2025	98,907490484
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	98,861114722
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	98,855212346
71	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA CULTURAL JAZU	98,844989145
52	CONSORCIO ORIENTE	98,801112169
39	CONSORCIO SAJS	98,619099732
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	98,561107808
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	98,487274266
68	CONSORCIO IP MINCULTURA 25	98,385829930
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	98,096827530
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	97,945810133
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	79,804437484
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	57,683572345

Lote 2:

N° OFERTA	PROPONENTE	PUNTAJE FINAL
72	**CONSORCIO CULT 25**	**99,823224710**
34	CULTURALES	99,414470903
40	CONSORCIO VASA	99,400420309
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	99,351953257
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	99,322310970
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	99,163423410
59	H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S	99,147288970
46	CONSORCIO CULTURA	99,138946200
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	99,132701625
57	CONSORCIO VIRREY	99,121848811
66	CONSORCIO EDIFICACIONES CULTURALES	98,988518586
49	GRU S.A.S	98,941702935
18	CONSORCIO B&C 2025	98,916987208
44	CONSORCIO PROCULTURA	98,914729971
60	CONSORCIO W&A	98,813812947
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	98,774288011
53	CONSORCIO CREACAUCA 2025	98,763865076
79	CONSORCIO MIN CULTURA 001	98,683093751
28	CONSORCIO CULTURA	98,682258468
6	BERMUDEZ SAS	98,678184005

Continuación de la Resolución *"Por la cual se ordena la adjudicación de la licitación Pública No. MC-LP0-0001-2025"*

N° OFERTA	PROPONENTE	PUNTAJE FINAL
61	C FORTUNE MC	98,645425705
11	CONSORCIO OBRAS MIN CULTURA DT	98,614490710
43	CONSORCIO DUOVAL 0001	98,538271128
32	CONSORCIO CULTURAL M&C	98,453230216
52	CONSORCIO ORIENTE	98,444227087
62	ORIMEG 2025	98,402647247
23	CONSORCIO OBRAS CULTURALES	98,342328118
3	RAING SAS	97,956140990
15	UNIÓN TEMPORAL V&E	97,866156419
19	CONSORCIO MINCULTURA FC 25	97,795277374
50	1616 INGENIERIA S.A.S	97,772401831
24	CONSORCIO TECNIOBRAS	97,765924992
27	CONSORCIO INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE.	97,190968634
74	CONSORCIO CULTURA LM	97,144206994
10	UNI-GER	96,674776365
64	EUT S.A.S	94,308341946

Lote 3:

N° OFERTA	PROPONENTE	
59	**H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S**	**100**
57	CONSORCIO VIRREY	99,47836738
40	CONSORCIO VASA	97,96374264
45	CONSORCIO AG3 MC 0001	97,93908942
31	CONSORCIO INGENIEROS CULTURALES PM-BG 2025	97,78811221
46	CONSORCIO CULTURA	97,76184782
38	CONSORCIO CULTURAL ARSAF	97,75661126
44	CONSORCIO PROCULTURA	97,58507423
17	CONSORCIO 18 SANTA VIVIANA	97,56551197
49	GRU S.A.S	97,51801133
8	CONSORCIO SVB-CULTURAL	96,04326996
61	C FORTUNE MC	96,81762582
50	1616 INGENIERIA S.A.S	96,72986128
54	CONSORCIO CYC CONSTRUCCIONES	96,03290033
51	CONSORCIO CULTURAL-IN5	95,81507521

Que la ordenadora del gasto acogió la recomendación del comité evaluador.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1.-: Adjudicar el proceso de selección por licitación pública No. MC-LPO-0001 de 2025 cuyo objeto es "*Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados de compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias,* estructurado por Lotes, a los proponentes cuyas ofertas cumplieron con los requisitos habilitantes exigidos y obtuvieron la máxima calificación y cumplieron los demás requisitos del documento base del pliego de condiciones, para ser adjudicatarios en cada uno de los lotes en que está estructurada la licitación, en el orden del numeral 1.1 del pliego de condiciones, así:

Lote 1: por un valor total de **MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 1.976.833.551)**, al proponente número 62- **CONSORCIO ORIMEG 2025**, representado por NICOLÁS SANABRIA NIETO con cédula de ciudadanía N° 1090387773, integrado por PROYECTOS Y CONSULTORÍAS ORIÓN SAS con NIT 901.503.188-3, con una participación del 50%, MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN SAS, con NIT 900.874.949-9, con una participación del 50%, quien

obtuvo una calificación de 100 puntos en este lote y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 2: por un valor total de **DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.278.508.984.00),** al proponente número 72- **CONSORCIO CULT 25**, representado por WILVER FRANCINY RUSSY LADINO identificado con cédula de ciudadanía número 80212380, integrado por WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS, con NIT 900.702.141-8 con una participación del 10%, WRUSSY INGENIEROS SAS con NIT 901.109.885-1 con una participación del 90%, quien obtuvo una calificación de 99.82 puntos en este grupo y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

Lote 3: por un valor total **DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($ 2.636.845.211.00)**, al proponente número 59- **H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S.**, con NIT 900.431.716-9 representado por HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ con cédula de ciudadanía número 93.365.845 quien obtuvo una calificación de 100 puntos en este grupo y el primer lugar en el orden de elegibilidad.

ARTÍCULO 2.-: Para respaldar los compromisos que resulten de este proceso y los contratos que del mismo se deriven, se cuenta con una apropiación presupuestal en la vigencia 2025, con cargo al siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Número Certificado Disponibilidad Presupuestal	Fecha Certificado Disponibilidad Presupuestal	Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal
204325	28 de marzo de 2025	7.430.889.875,00

ARTÍCULO 3.-: La presente Resolución se notifica a los adjudicatarios en audiencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, inciso primero, de la Ley 1150 de 2007 y artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y a los demás interesados se les comunicará mediante la publicación de la presente decisión a través del Secop II.

ARTÍCULO 4.-: De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en la vía gubernativa.

ARTÍCULO 5.- Publíquese el presente acto administrativo en el Sistema Electrónico para la Contratación pública (SECOP), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1., del Decreto 1082 de 2015.

Dada en Bogotá, D.C., a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2025.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

LUISA FERNANDA TRUJILLO BERNAL
Secretaria General

Proyectó: Otto Gabriel Forero Vanegas – Abogado Grupo Contratos y Convenios
Revisó: Carmenza Duran Alfonso. Abogada Grupo Contratos y Convenios
Aprobó: Jenny Carolina Velandia Martínez. Coordinadora Grupo Contratos y Convenios

TIPO:	CONTRATO DE OBRA No.1747 DE 2025
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 3)"
LUGAR:	NÓVITA – JURADÓ (DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ)
CONTRATISTA / PARTES:	H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.
FECHA DE INICIO:	27 DE OCTUBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO:	DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($2.636.845.211,00 M/CTE).
VALOR EN PROYECTO NÓVITA:	MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($ 1.510.213.955,46 M/CTE)
VALOR EN PROYECTO JURADÓ	MIL CIENTO VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($1.126.631.255,71 M/CTE)
ANTICIPO TOTAL CONTRATO	SETECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE ($791.053.563,30 M/CTE)
ANTICIPO PROYECTO NÓVITA	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($453.064.186,61 M/CTE)
ANTICIPO PROYECTO JURADÓ	TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($337.989.376,69 M/CTE)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. *(Si aplica)***:**	1753 DE 2025
INTERVENTOR *(Si aplica)***:**	R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.

GARANTÍAS:						
AMPAROS	**PÓLIZA N°**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ASEGURADORA**	**%**
		DESDE	**HASTA**			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21-44-101476485	29/07/2025	01/05/2026	$527.369.042,20	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	21-44-101476485	29/07/2025	01/05/2026	$791.053.563,30	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	100%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	21-44-101476485	29/07/2025	31/12/2028	$131.842.260,55	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	5%
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	21-44-101476485	31/12/2025	31/12/2030	$527.369.042,20	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	21-44-101476485	31/12/2025	31/12/2028	$527.369.042,20	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	20%
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-40-101259554	29/07/2025	31/12/2025	$427.050.000,00	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	200 SMMLV

En Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de octubre del 2025, se reunieron: el señor HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ, Representante legal del Contratista de obra H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S. en calidad de Contratista de obra, el señor CÉSAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, Representante Legal de la Interventoría R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S., la Arquitecta JULIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ, Supervisora Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Arquitecto FABIO ENRIQUE FLÓREZ MONTESINO como Apoyo a la Supervisión del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; con el fin de iniciar el Contrato de Obra No.1749-2025 anteriormente citado. Se deja constancia de los siguientes aspectos:

1. Los comités de obra deberán ser llevados a cabo una (1) vez a la semana o mínimo dos (2) veces al mes.

2. Se deberán presentar los primeros cinco (5) días del mes, las actas parciales de obra (previamente revisadas y aprobadas por la interventoría).

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Iniciación del Contrato de Obra 1749-2025, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, en Bogotá D.C. a los veintisiete (27) días del mes de octubre del 2025.

CONTRATISTA DE OBRA
HAWER ALBERTO HERRERA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTORÍA
CÉSAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS S.A.S.

SUPERVISIÓN
JULIANA RAMÍREZ RODRÍGUEZ
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

APOYO A LA SUPERVISIÓN
FABIO ENRIQUE FLÓREZ MONTESINO
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES

Culturas	**ACTA DE RECIBO DE LOTE**	Página **1** de **1**
	☒ **Público** ☐ **Clasificado** ☐ **Reservado**	**Código:** F-GIN-094 **Versión:** 2 **Fecha:** 24/Abr/2019

Por medio de la presente, certificamos que el lote ubicado en el Barrio Pueblo Nuevo, entre Calle 1ra y 2da en el municipio de Juradó, departamento del Chocó, se encuentra descapotado y nivelado según compromisos adquiridos por la Alcaldía Municipal para con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

A continuación, se detallan observaciones del resultado de la visita de verificación al lote:

- El municipio realizó el retiro de los cimientos y la demolición del pozo séptico, entregando el lote completamente limpio para iniciar la obra.

Por lo anterior, se recibe el lote por parte de la Interventoría y se hace entrega física al Contratista de Obra.

Para Constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año 2025.

Alcalde Municipal
DENIO JIMÉNEZ RIVAS

Planeación Municipal
YACER JAVIER ARIAS MENA

Director de Interventoría
CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ

Director de Obra
GUSTAVO CASTRO LÓPEZ

Por medio de la presente, certificamos que el lote ubicado en el Barrio Rosario en el municipio de Novita, departamento del Chocó, se encuentra descapotado y nivelado según compromisos adquiridos por la Alcaldía Municipal para con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

A continuación, se detallan observaciones del resultado de la visita de verificación al lote:

- El municipio realizó el retiro de vegetación, de cercas o quinchas que se encontraban dentro del predio.

- Se encuentra pendiente que se realice por parte del municipio la gestión de adecuación de los desagües de aguas lluvias, sanitarias y red eléctrica que se encuentran al costado de la casa de la señora Eustolia Mena.

Por lo anterior, se recibe el lote por parte de la Interventoría y se hace entrega física al Contratista de Obra.

Para Constancia se firma a los dieciséis (16) días del mes de octubre del año 2025.

Alcalde Municipal
ALBERTO WILLIANMS RIVAS ASPRILLA

Planeación Municipal
YEIMAR IBARGüEN MOSQUERA

Director de Interventoría
CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ

Director de Obra
GUSTAVO CASTRO LÓPEZ

MINCULTURA-CONT-/- N°01/2025

Ibagué, 8 de agosto de 2025

Señores
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio
Bogotá, D C.

REF: *CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 3)".*

Asunto: *Solicitud de aclaraciones y/o Revisión de precios oficiales de la entidad que sirvieron de base para la presentación de nuestra propuesta y posterior formalización del contrato, puesto que a nuestro criterio consideramos que la entidad cometió errores en la estimación de costos del contrato.*

Respetuoso saludo

Como tuve oportunidad de manifestar en la reunión del pasado lunes 4 de agosto, aunque nuestra voluntad como empresa contratista del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes, es llevar a buen término el contrato de la referencia, no es menos importante indicar a ustedes las enormes preocupaciones que nos asisten, teniendo en cuenta las inconsistencias y observaciones que hemos identificado en esta fase previa para el inicio del contrato y que adelante relaciono para su análisis y posterior respuesta.

Partimos de que, para el estudio de mercado y la posterior identificación de precios, la entidad por medio de su equipo estructurador debió establecer los precios oficiales teniendo en cuenta la ubicación geográfica, condiciones de transporte terrestre, marítimo y logística que impactan enormemente en los costos de materiales e insumos, que se requieren para ejecutar las obras en los municipios de Nóvita, pero especialmente en Juradó en el departamento de Chocó.

En este orden de ideas, a continuación, presento los APUs de las actividades e insumos e ítems más representativos que impactan negativamente respecto a los precios que la entidad publicó como oficiales y que sirvieron de base para nuestra propuesta.

Teniendo en cuenta que los dos (2) proyectos contemplan cimentación y estructura en concreto, las actividades correspondientes a estos items pesan bastante en el presupuesto, por lo que a continuación relaciono los Análisis de precios unitarios de estas actividades, donde encontramos diferencias en promedio del -29,82% entre el valor real respecto a los precios que la entidad estimó para la elaboración del presupuesto oficial.

Desafortunadamente en los documentos publicados por la entidad, en estos ítems, no se encuentran los precios de los insumos básicos para la elaboración del concreto, sin embargo, en el respectivo APU elaborado por nosotros presentamos el respectivo valor.

CAPITULO:	1	APU BASICOS	
ÍTEM:		CONCRETO DE 3.500 PSI GRAVA COMÚN, PREPARADO EN SITIO	UNIDAD: M3

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 7.204,55	1,00	$ 7.204,55
VIBRADOR DE CONCRETO	H	$ 15.000,00	0,75	$ 11.250,00
MEZCLADORA DIESEL	H	$ 22.500,00	0,90	$ 20.250,00
				$ 38.704,55

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
CEMENTO GRIS	kg	$ 630,00	350	$ 220.500,00
ARENA LAVADA DE PEÑA	m3	$ 218.076,00	0,6	$ 130.845,60
AGUA	L	$ 10,00	170	$ 1.700,00
GRAVA 1"	m3	$ 170.200,00	0,76	$ 129.352,00
				$ 482.397,60

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
AA	CUADRILLA AA (Albañilería)	1	hc	$ 31.700,00	0,22	$ 144.090,91
						$ 144.090,91

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR	1,50 %	$ 35.000,00	1,0	$ 35.000,00
				$ 35.000,00

TOTAL PRECIO UNITARIO:	$ 700.193,05



Argos
Cemento Argos Gris 50kg
Código 13846
4.7 (60)
$31.500 und
$630,00 kilogramo
Agregar al c
Especificaciones principales
- Tipo : Cemento Gris
- Ancho : 52 cm
- Alto : 62.5 cm
- Largo : 12 cm
- Color : Gris

Ver más especificaciones

ANTISOL ROJO

VALOR KG	TRANSP. POR BULTO DE 50KG
$ 630,00	$ 5.000,00

VALOR BULTO DE CEMENTO EN JURADÓ	$ 36.500,00
VALOR TRANSP. TON. B/TURA-JURADÓ	$ 1.000.000
$ 100 VALOR KG DE TRANSPORTE	

PRECIO OFICIAL	DESFASE	
$ 461.641,00	-$ 238.552,05	-51,67%

En este orden de ideas, presento los APUs de los ítems correspondientes a la cimentación y estructura en concreto, donde se indican las diferencias de precios de insumos respecto a los precios publicados por la entidad en desarrollo del proceso.

CAPITULO:	3	CIMENTACIÓN	
ÍTEM:	3.04	ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.500 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	UNIDAD: m3

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 9.324,00	1,00	$ 9.324,00
VIBRADOR DE CONCRETO	H	$ 15.000,00	0,75	$ 11.250,00
				$ 20.574,00

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
CONCRETO 28 MPA (3500 PSI) GRAVA COMÚN	m3	$ 700.193,05	1,050	$ 735.202,71
PUNTILLA CON CABEZA 1"	lb	$ 5.606,00	0,050	$ 280,30
TABLA CHAPA 30 X 1,8 A 2,0 cm X 2,90 m, ORDINARIO	u	$ 21.694,00	1,400	$ 30.371,60
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 cm X 3,00 m, EUCALIPTO	u	$ 7.811,00	0,500	$ 3.905,50
SIKA Plastocrete Dm Aditivo Reductor De Agua	kg	$ 21.179,00	2,100	$ 44.475,90
				$ 814.236,01

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
AA	CUADRILLA AA (Albañilería)	1	hc	$ 31.700,00	0,26	$ 121.472,53
						$ 121.472,53

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
ACARREO MATERIALES	viaje	$ 105.000,00	0,01	$ 1.050,00
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR	1,50 %	$ 8.899,00	1,5	$ 13.348,50
				$ 14.398,50

TOTAL PRECIO UNITARIO:	$ 970.681,04

CONCRETO 28 MPA (3500 PSI) GRAVA COMÚN

VALOR M3	PRESUP. OFICIAL	DIFERENCIA	
$ 700.193,05	$ 461.641,00	-238.552,05	-51,67%

ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.500 PS

PRECIO OFICIAL	DESFASE	
$ 792.181,00	-$ 178.500,04	-22,53%

CAPITULO:	5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	UNIDAD:
ÍTEM:	5.11	COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=3.500 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de	m3

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 13.824,50	1,00	$ 13.824,50
VIBRADOR DE CONCRETO	día	$ 22.427,00	0,13	$ 2.915,51
FORMALETA PARA COLUMNA CON ACCESORIOS	mes	$ 41.948,00	0,50	$ 20.974,00
PARAL METÁLICO TELESCÓPICO DE HASTA 3,3 M	día	$ 250,00	56,00	$ 14000,00
				$ 51.714,01

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
CONCRETO (3500 PSI) GRAVA COMÚN	m3	$ 700.193,05	1,050	$ 735.202,71
DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	kg	$ 33.125,00	0,200	$ 6.625,00
				$ 741.827,71

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
AA	CUADRILLA AA (Albañilería)	1	hc	$ 31.700,00	0,11	$ 276.489,98
						$ 276.489,98

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
ACARREO MATERIALES	viaje	$ 105.000,00	0,02	$ 2.100,00
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR	1,50 %	$ 7.772,00	1,5	$ 11.658,00
				$ 13.758,00

TOTAL PRECIO UNITARIO: $ 1.083.789,70



Nuevo
Desmoldatoc X 16kg
$ 530.000
12 cuotas de $ 44.167 con 0% interés
Entrega a acordar con la tienda
Martires, Bogotá D.C.
Ver formas de entrega
Voltaje: **N/A**
El vendedor necesita 5 días para tener lis producto.
Cantidad: **1 unidad** (5 disponibles)

DESENCOFRANTE DESMOLDATOC (16KG)

VALOR KG	PRESUP. OFICIAL	DIFERENCIA	
$ 33.125,00	$ 19.498,00	-13.627,00	-69,89%

PRECIO OFICIAL $ 927.765,00

DESFASE	
-$ 156.024,70	-16,82%

CAPITULO:	5	ESTRUCTURAS EN CONCRETO	UNIDAD:
ÍTEM:	5.15	VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=3.5000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 14.606,62	1,00	$ 14.606,62
VIBRADOR DE CONCRETO	día	$ 22.427,00	0,13	$ 2.915,51
CERCHA METÁLICA DE 3 M, ALQUILER	día	$ 179,00	7,00	$ 1.253,00
PARAL METÁLICO TELESCÓPICO DE HASTA 3,3 M	día	$ 250,00	56,00	$ 14.000,00
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUI	día	$ 17.868,00	2,00	$ 35.736,00
				$ 68.511,13

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
CONCRETO (3500 PSI) GRAVA COMÚN	m3	$ 700.193,05	1,050	$ 735.202,71
DESENCOFRANTE EMULSIONADO DESMOLDATOC (16KG)	kg	$ 33.125,00	0,200	$ 6.625,00
PUNTILLA 1-1/2"	lb	$ 7.132,00	1,000	$ 7.132,00
TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO	u	$ 12.478,00	1,000	$ 12.478,00
DURMIENTE 4 X 4 cm X 2,90 m, ORDINARIO	u	$ 6.955,00	1,000	$ 6.955,00
ALAMBRE NEGRO N° 17	kg	$ 6.715,00	0,100	$ 671,50
				$ 769.064,21

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
AA	CUADRILLA AA (Albañilería)	1	hc	$ 31.700,00	0,11	$ 292.132,33
						$ 292.132,33

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
ACARREO MATERIALES	viaje	$ 105.000,00	0,02	$ 2.100,00
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR	1,50 %	$ 8.181,00	1,5	$ 12.271,50
				$ 14.371,50

TOTAL PRECIO UNITARIO: $ 1.144.079,16



Nuevo
Desmoldatoc X 16kg
$ 530.000
12 cuotas de $ 44.167 con 0% inte
Entrega a acordar con la tienda
Martires, Bogotá D.C.
Ver formas de entrega
Voltaje: **N/A**
El vendedor necesita 5 días para tene producto.
Cantidad: **1 unidad** (5 disponibles)

)ESENCOFRANTE DESMOLDATOC (16KG

VALOR KG	PRESUP. OFICIAL	DIFERENCIA	
$ 33.125,00	$ 19.498,00	-13.627,00	-69,89%

PRECIO OFICIAL $ 994.406,00

DESFASE	
-$ 149.673,16	-15,05%

ÍTEM:	5.18	LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3.500 PSI (e=0.07) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	UNIDAD: m2

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 3.341,15	1,00	$ 3.341,15
VIBRADOR DE CONCRETO	día	$ 22.427,00	0,13	$ 2.915,51
FORMALETA INDICE GENERAL. INCLUYE PARALES, CERCHAS Y CAMI	m2	$ 10.736,00	1,00	$ 10.736,00
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUI	día	$ 17.868,00	0,10	$ 1.786,80
				$ 18.779,46

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
CONCRETO (3500 PSI) GRAVA COMÚN	m3	$ 700.193,05	0,125	$ 87.524,13
PUNTILLA 1-1/2"	lb	$ 7.132,00	0,050	$ 356,60
TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm X 2,90 m, ORDINARIO	u	$ 12.478,00	0,950	$ 11.854,10
ANTISOL ROJO	kg	$ 38.472,00	0,200	$ 7.694,40
				$ 107.429,23


C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
AA	CUADRILLA AA (Albañilería)	1	hc	$ 31.700,00	0,47	$ 66.823,04
						$ 66.823,04

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
ACARREO MATERIALES	viaje	$ 105.000,00	0,02	$ 2.100,00
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR	1,50 %	$ 1.003,00	1,5	$ 1.504,50
				$ 3.604,50
		TOTAL PRECIO UNITARIO:		**$ 196.636,23**



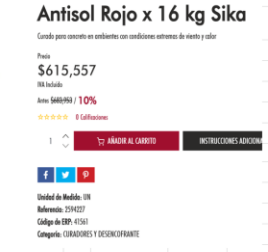

ANTISOL ROJO

VALOR KG	PRESUP. OFICIAL	DIFERENCIA	
$ 38.472,00	$ 18.044,00	-20.428,00	-113,21%

PRECIO OFICIAL	DESFASE	
$ 171.158,00	-$ 25.478,23	-14,89%

En cuanto a otro Item representativo en el frente de Juradó es la cubierta en teja shingle, al respecto elaboramos el APU encontrando estas diferencias importantes en el insumo principal como es la teja shingle

CAPITULO:	11	CUBIERTAS Y CIELO RASOS	
ÍTEM:	4.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SHINGLE REFERENCIA DYNASTY O SIMILAR O MEJOR CALIDAD color a definir, incluye Caballetes, machimbre de 9mm, manto asfaltico sin foil, perfiles de inicio y corta gotera, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: M2

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 1.603,29	1,00	$ 1.603,29
KIT PARA TRABAJOS EN ALTURA	gb	$ 24.500,00	0,05	$ 1.225,00
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUI	día	$ 17.868,00	0,15	$ 2.680,20
				$ 5.508,49

B. MATERIALES


DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
TEJA SHINGLE	M2	$ 79.000,00	1,050	$ 82.950,00
MACHIMBRE PINO Esp = 9mm	M2	$ 39.500,00	1,050	$ 41.475,00
TORNILLO CUBIERTA AUTOPERFRANTE CON ARANDELA DE NEOPRENO	UNIDAD	$ 380,00	8,000	$ 3.040,00
MANTO PROTECTOR 2 mm	M2	$ 21.450,00	1,050	$ 22.522,50
CABALLETE PARA TEJA SHINGLE	ML	$ 22.500,00	0,200	$ 4.500,00
				$ 154.487,50


C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
BB	CUADRILLA BB (Instalaciones)	1	hc	$ 34.870,00	2,00	$ 17.435,00
DD	CUADRILLA DD (Carpintería)	1	hc	$ 38.040,00	2,60	$ 14.630,77
						$ 32.065,77

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
ACARREO MATERIALES	viaje	$ 105.000,00	0,008	$ 840,00
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR	3,00 %	$ 4.634,63	2,0	$ 9.269,25
				$ 10.109,25
		TOTAL PRECIO UNITARIO:		$ 202.171,01





TEJA SHINGLE DYNASTY

VALOR M2	PRESUP. OFICIAL	DIFERENCIA	
$ 79.000,00	$ 62.065,00	-16.935,00	-27,29%

PRECIO OFICIAL	DESFASE	
$ 170.066,00	-$ 32.105,01	-18,88%

El asunto de fondo, es que hay grandes diferencias (Todas en contra del contratista), entre el valor de los insumos y productos estimados por la entidad y el costo real en sitio, según los precios de la entidad versus la adquisición en el mercado, el costo real de los productos es mayor; como ustedes pueden verificar para los ítems aquí relacionados.

Dicho de otro modo, el valor contratado cubre apenas un porcentaje del costo actual de los precios del mercado en esos sitios, lo que nos generará unas pérdidas económicas significativas de no encontrar un acuerdo entre las partes, con el correspondiente desgaste jurídico que esto conllevaría.

Agradezco se sirvan estudiar esta situación, para encontrar los mecanismos que permitan la posibilidad de ajustes y/o revisiones para restablecer el equilibrio que debe prevalecer en toda relación contractual.

Agradezco la atención y estudio a la presente solicitud y quedo atento a la respuesta formal.

Cordialmente,



Arq. Hawer Alberto Herrera Rodríguez
Representante Legal
H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S

cc. *R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S* *Interventor*
Arq. Fabio Enrique Florez Montesino *Apoyo a la Supervisión*

MINCULTURA-CONT-/- N°02/2025

Ibagué, 8 de agosto de 2025

Señores
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio
Bogotá, D C.

REF: *CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 3)".*

Asunto: *Solicitud de aclaraciones y/o correcciones de la información técnica publicada por la entidad para la ejecución del contrato. (Juradó).*

Respetuoso saludo

En el proceso de revisión de la información técnica que reposa en el proceso contractual, hemos encontrado numerosas inconsistencias entre las especificaciones técnicas, el presupuesto y los planos, así como falta de información necesaria para desarrollar el contrato, por lo que de manera respetuosa solicitamos aclaración, complementación y ampliación de las observaciones a continuación relacionadas.

En cuanto a los planos, revisada la información técnica del proyecto Juradó, encontramos sesenta y siete (67) observaciones que requieren definición para poder ejecutar el contrato.


En cuanto a los APUs encontramos veintinueve (29) observaciones que requieren definición para poder ejecutar el contrato.

En cuanto a las Especificaciones técnicas, encontramos treinta y una (31) observaciones que requieren definición para poder ejecutar el contrato.

A continuación, se relacionan dichas observaciones:


OBSERVACIONES

1. En el plano de Detalles A-200 Planta de Detalle, Muros y Pisos especifica lo siguiente: Piso en Listones de Madera 1"x 4".

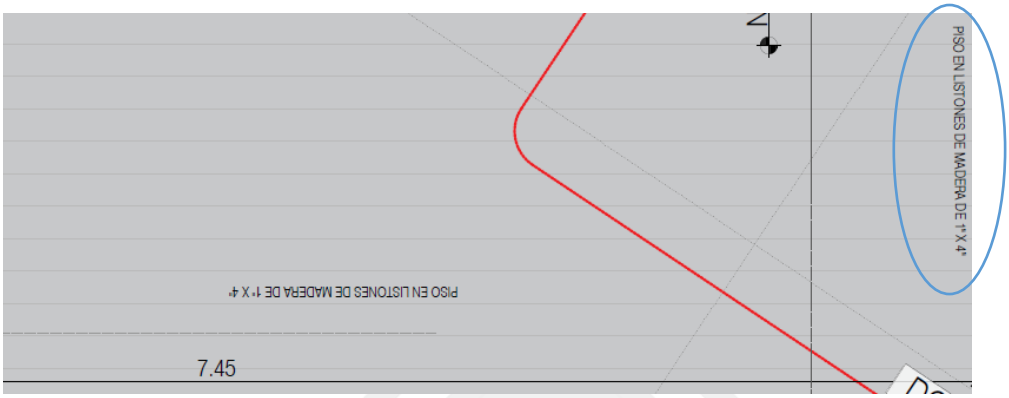


Pero en Excel donde se encuentran los ítems a ejecutar no hay ninguna especificación que coincida con la del plano. El ítem más cercano es el 13.04.03

2. En la categoría de Planos Eléctricos, los planos se encontraban en formato .dwg al abrirlos se encontraba en la pestaña del Plano A – 503 Diagrama Unifilar. El cual permitió pasarlo al formato pdf.

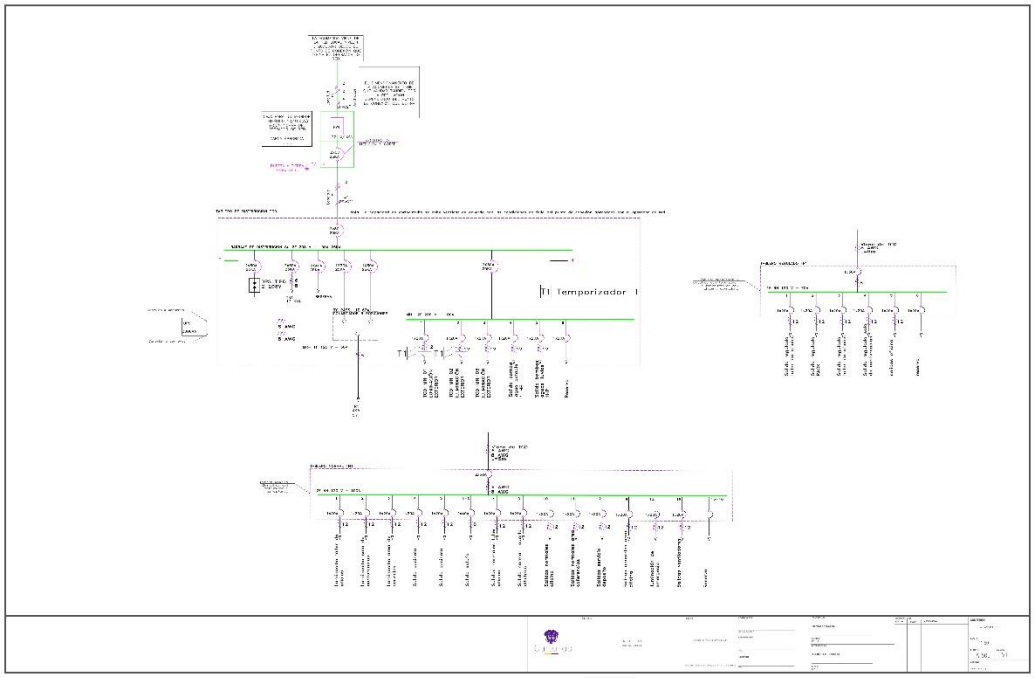

13.04	Pisos en madera
13.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA CHOIBA 1" x 3" CEPILLADA, distanciados cada 9 cm (sobre madera y elementos en concreto según diseño), incluye inmunizado, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.


Sin embargo, los planos A-501, A-502, A-504, A-505, A506 se encontraban en el formato DWG pero solo sus rótulos y convenciones. No hay planos con detalles

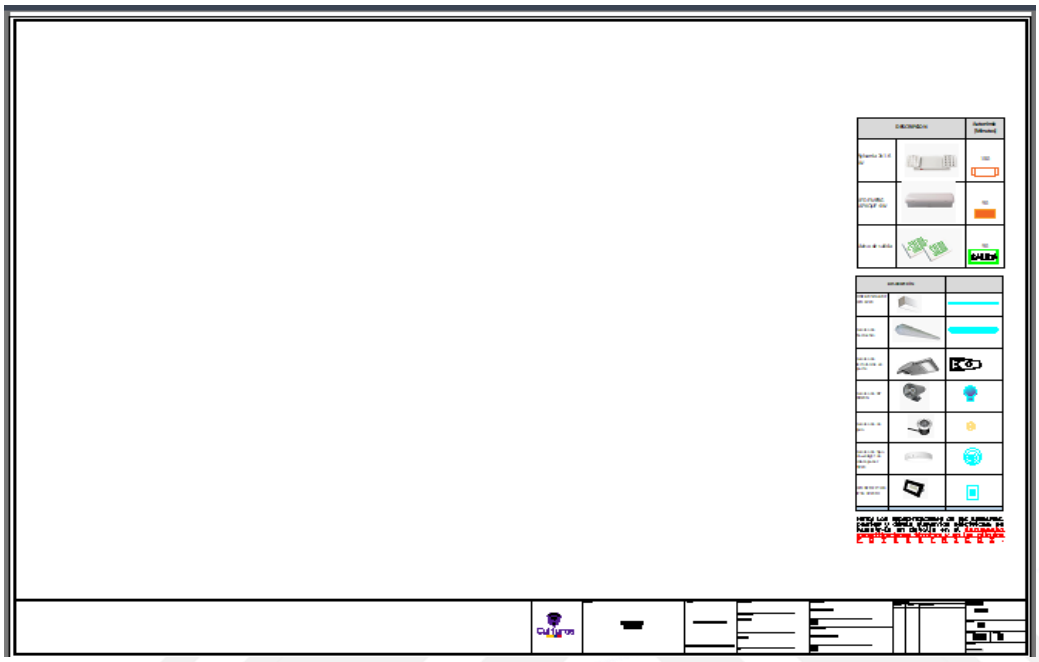


3. La nomenclatura en rotulo del plano y nombre del pdf en el plano no coinciden. Por ejemplo, en el pdf del listado aparece Plano A-601 Redes Hidráulicas, Agua Potable y Reutilización de Agua Lluvia y en el rotulo del plano su nomenclatura aparece como Plano 01 de 05.

4. Los planos de redes si se encuentran como aparece en el listado. Pero falta especificaciones, detalles, alturas, cortes, etc.

5. En el presupuesto también aparece la instalación de Tanque de reserva, pero en planos de redes no existe ningún tipo de especificación ni detalle

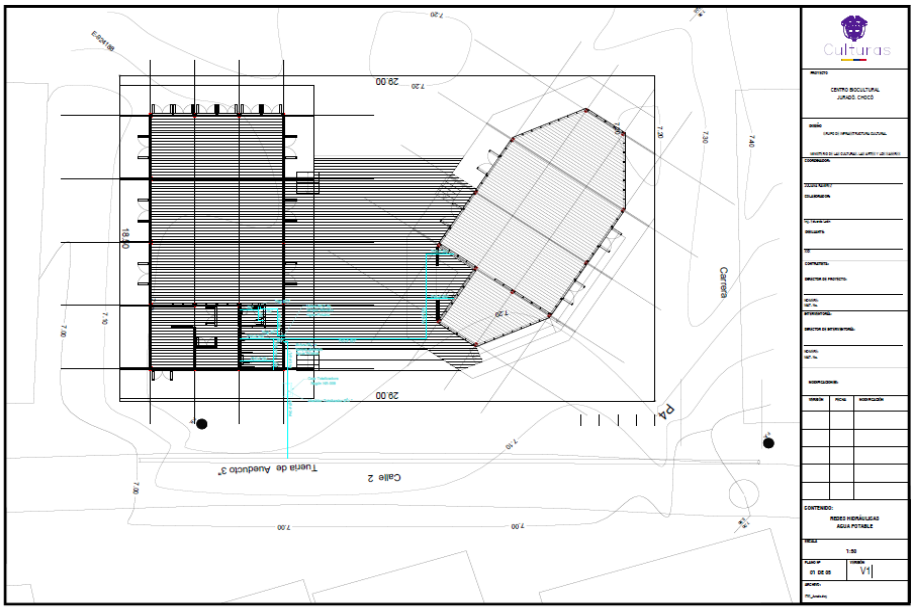


6. En planos de Redes Hidrosanitarias, hace falta especificaciones de los bajantes para el desagüe de cubierta, como lo son plantas, cortes, alzados para ubicar y especificar la instalación de todos los bajantes y cuantificarlos. PLANO REDES DESAGUES AGUA RESIDUALES Y LLUVIAS N.º 02 de 05

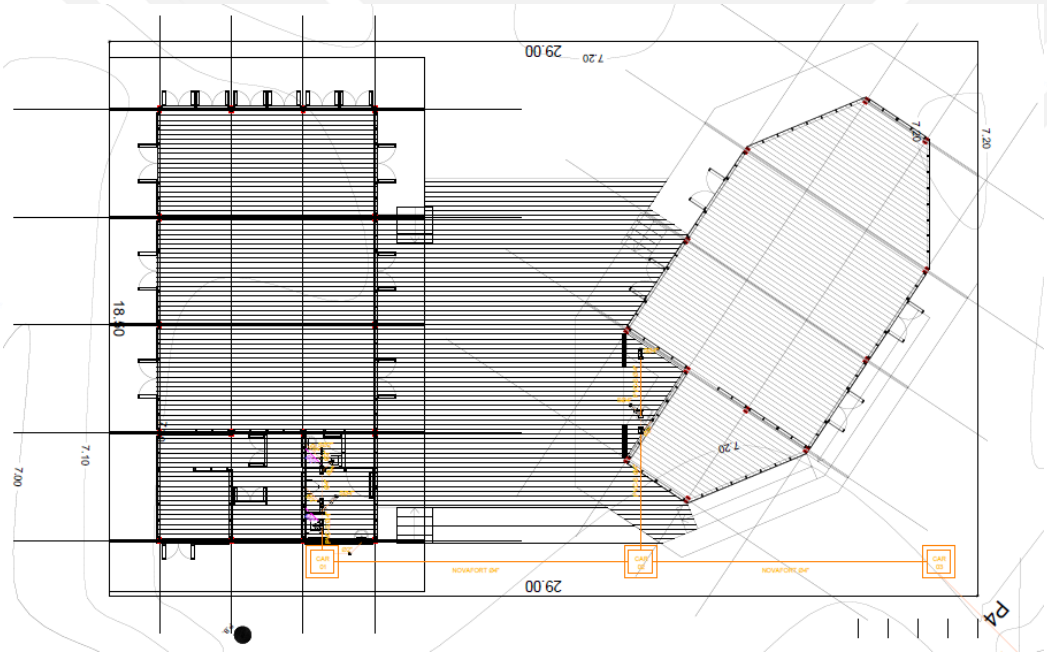


7. En los planos de REDES hace falta la ubicación de la bomba, planos de detalle para su instalación y medidas respectivas de la misma


8. En planimetría para REDES también falta el detalle y ubicación de la poceta a realizar, con respectivas medidas y redes de suministro de agua y desagüe

9. PLANO E001 – ESTRUCTURAL: Del eje N° 3 al eje N°4 se evidencia dos zapatas las cuales estan normbradas con signo de interrogacion y no es clara esta nomenclatura a que se refiere.

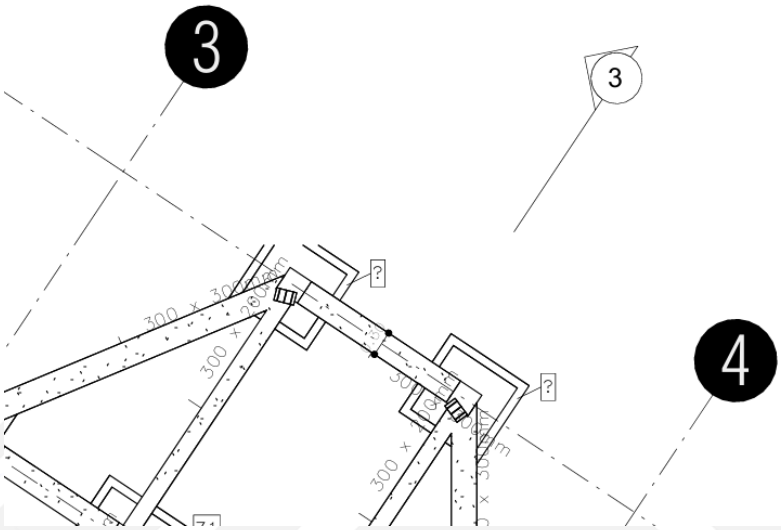


10. En los planos ESTRUCUTURALES no se especifica el detalle de la zapata, tampoco el acero, su respectiva separación, despiece y demás elementos que son necesarios para la correcta construcción y cuantificación en obra.

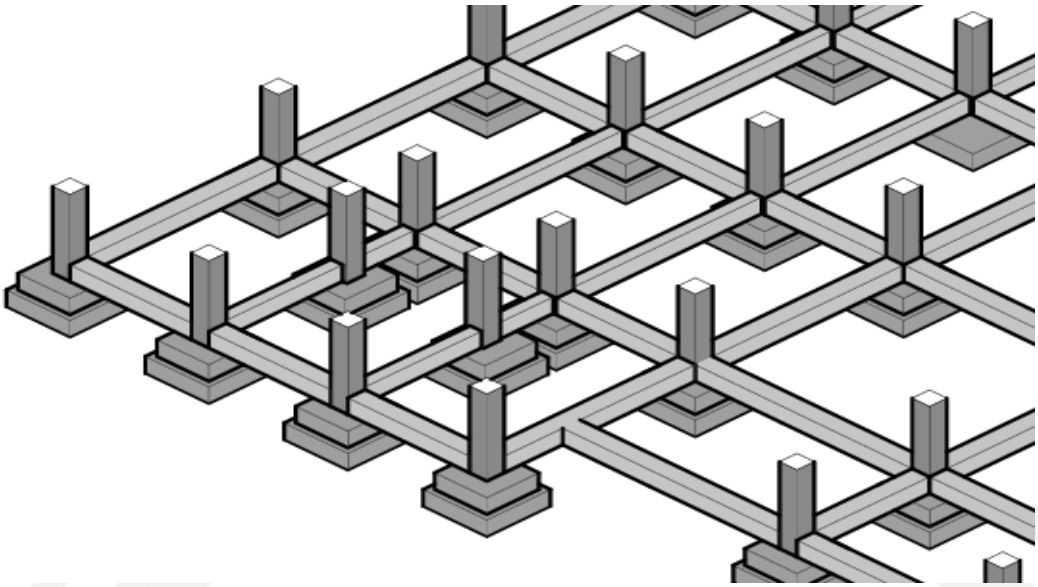


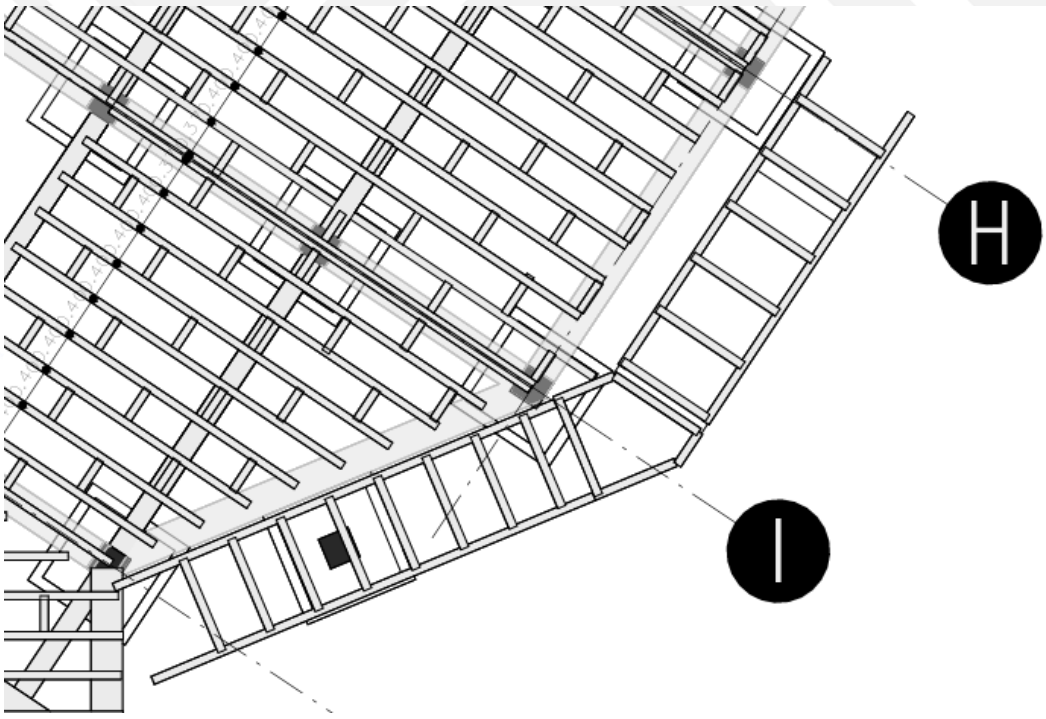


11. En los planos ESTRUCUTURALES, no se observa vistas a detalle donde se vea la rampa con su respectivo despiece y/o elementos y materiales necesarios para su correcta construcción.

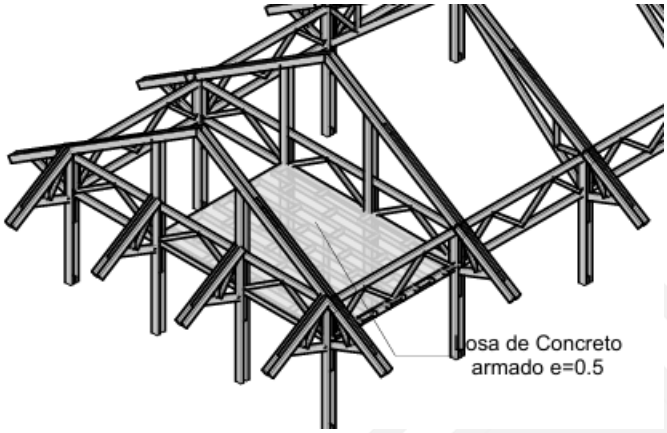


12. En los planos ESTRUCTURALES, no se observa vistas a detalle donde se vea la losa de concreto armado para el tanque de almacenamiento, con su respectivo despiece y/o elementos que la componen para su correcta contruccion en obra.

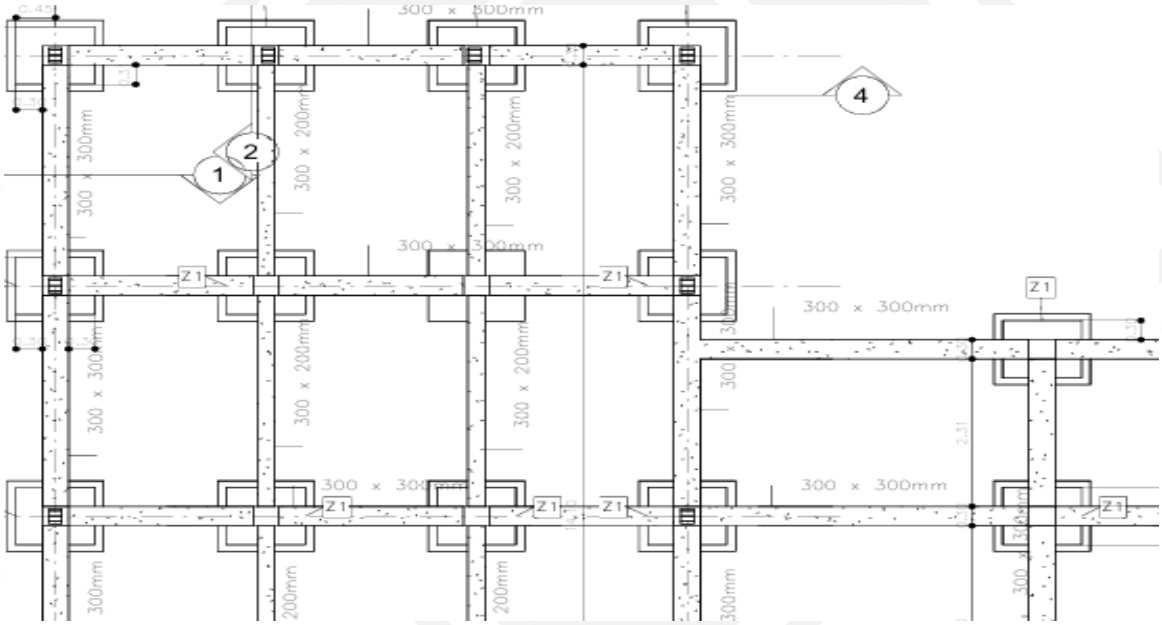


13. En los planos ESTRUCTURALES no se especifica vistas a detalle de las vigas, como su acero, su respectiva separacion, despiece y demas elementos que son necesarios para la correcta contruccion y cuantificacion en obra.

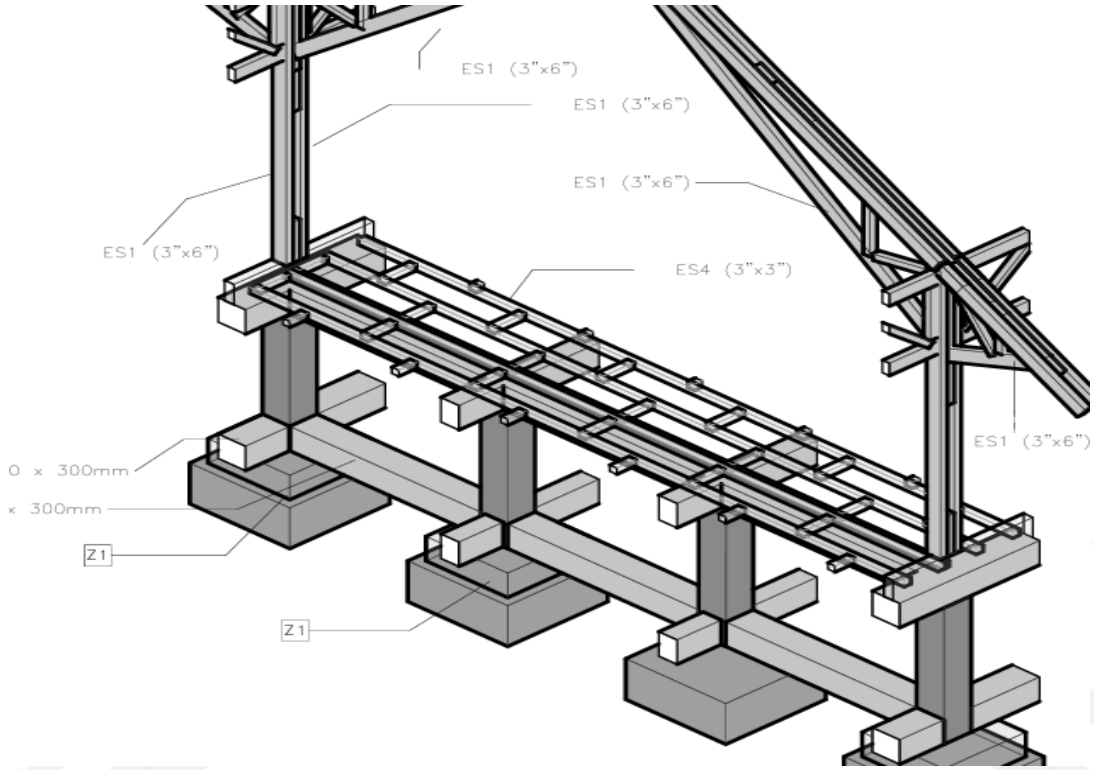


14. En los planos ESTRUCTURALES no se especifica vistas a detalle de las columnas y/o pedestales, como su acero, su respectiva separacion, despiece y demas elementos que son necesarios para la correcta contruccion y cuantificacion en obra.

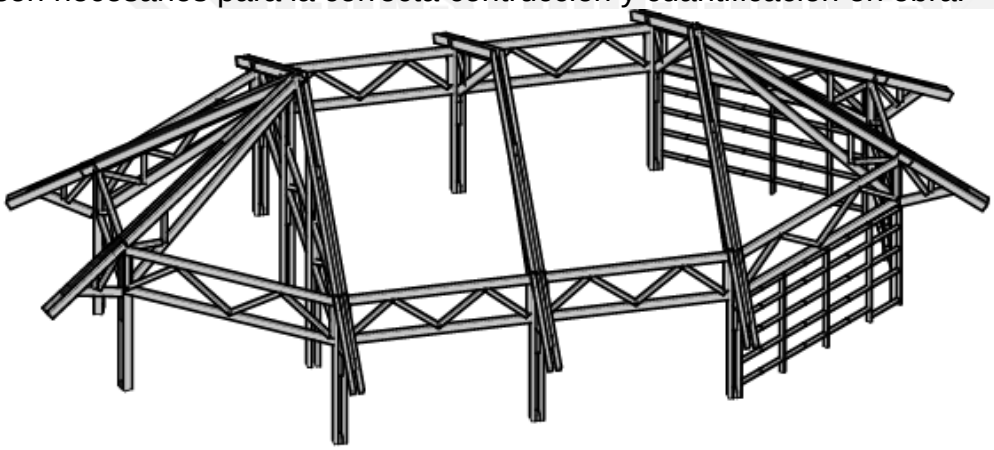

15. En los planos ESTRUCTURALES no se especifica vistas a detalle de los elementos compuestos en maderas ni su respectivo despiece y/o demas elementos que son necesarios para la correcta contruccion y cuantificacion en obra.

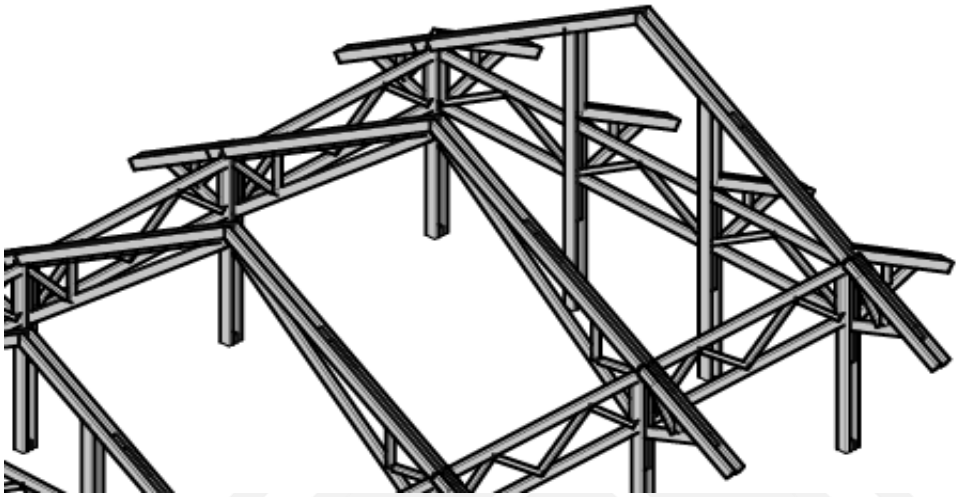

16. En los planos ESTRUCTURALES no se especifica vistas a detalle de las cerchas ni su respectivo despiece, tipo de material, separacion, cotas y/o demas elementos que son necesarios para la correcta contruccion y cuantificacion en obra.

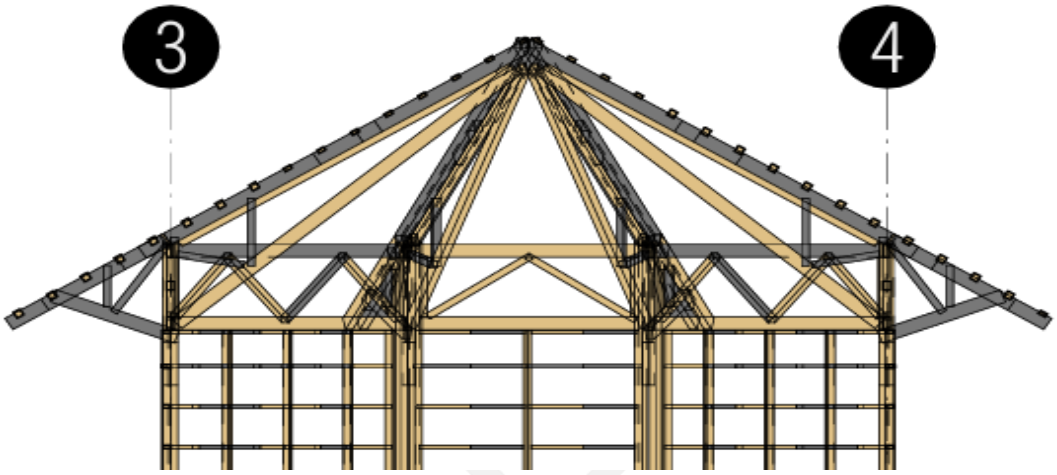

17. En los planos ESTRUCTURALES no se especifica vistas a detalle de los elementos compuestos en perfil de acero ni su respectivo despiece y/o demas elementos que son necesarios para la correcta contruccion y cuantificacion en obra.

18. Adicionalmente los planos ESTRUCTURALES carecen de cotas en general, despieces especificos de materiales que componen elementos estructurales y sus respectivos detalles.

19. CIMENTACION – REFUERZO – ESTRUCTURAS EN CONCRETO – ESTRUCTURA METALICA Y DE MADERA

En las especificaciones técnicas de cada ítem, se expone la revisión de los detalles y despieces tanto estructurales como arquitectónicos para su construcción y desarrollo en obra. Ya que estos son el punto de partida para su revisión y aprobación por la interventoría y la supervisión del Ministerio de Cultura.

En los ítems que a continuación se describen no se cuenta con los planos, despieces y detalles anteriormente mencionados. Se describe y se cita de manera textual los ítems en donde para la ejecución se requieren planimetría, detalles técnicos y estructurales. *(DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS)*

4.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (Desperdicio incluido en el valor del APU)

"…estructuras y demás obras que requieran de este elemento, de conformidad con los diseños y detalles mostrados en los planos…"

"…Listas y diagramas de despiece: Los planos de detalles estructurales deben ser revisados por parte del contratista antes de la elaboración de listas y diagramas de despieces. Deberá verificar que cuente con la información suficiente para ejecutar esta actividad…"

20. 4.02 Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU)

Colocación de la malla:

"…La malla se instalará según lo especificado en los planos estructurales y respetando los recubrimientos indicados en planos…"

"…todo el acero de refuerzo se colocará en la posición exacta mostrada en los planos…"

Recubrimiento del refuerzo:

"…El recubrimiento de las mallas electrosoldada será el indicado en los planos, y donde no se especifique…"

21. 4.4. ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERFORACION Ø 5/8" PROF MAX 0,30 M FIJADO MEDIANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXO-TROPICO

"…Los anclajes deben realizarse según se especifican en los planos de diseño…"

22. 5.12. COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=3.500 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad

"…de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales. Se usará concreto de 3500 PSI…"
"…Consultar y verificar diseños estructurales. Verificar niveles en planos arquitectónicos…"
"…Se deben verificar dimensiones de los elementos, según los diseños…"

23. **5.15. VIGA AEREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=3.5000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad**
"…de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales…"
"…Consultar y verificar diseños estructurales. Verificar niveles en planos arquitectónicos…"
"…Se deberá figurar, armar y colocar el refuerzo de acuerdo con las recomendaciones y especificaciones del diseño estructural…"

24. **5.18. LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 4000 PSI (e=0.12) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.**
"…la construcción de la losa maciza de entrepiso incluye la instalación de la malla electrosoldada de acuerdo con los detalles consignados en los planos estructurales…"
"…Consultar Planos Arquitectónicos. Consultar Planos Estructurales…"
"…de acuerdo con los planos de detalle, especificación técnica…"

25. **6.1.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA ASTM A500 GR C (NTC 4526) y/o ASTM A572 GR 50 SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL., incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.**
"…Las estructuras deberán construirse de acuerdo con los planos de diseño de la estructura, e ingeniería de detalle y deberá protegerse a la corrosión según se especifique en los planos estructurales…"

26. **6.2.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN Platina Alumidi 120, con anclajes Vin fix ENTRE ESTRUCTURA DE CONCRETO Y CUBIERTA DE MADERA y pasadores STA ROTHOBLASS O SIMILAR ENTRE LA PLATINA Y LA ESTRUCTURA DE MADERA, incluye anclajes epóxico entre concreto y platina, neopreno entre madera y concreto, arandelas, tuercas y todo los equipos y elementos necesarios para la correcta instalación.**
"…Revisión de planos estructurales y detalles de conexión. Ubicación de platinas Alumidi 120…"

"…elemento debidamente instalado y ejecutados de acuerdo con los planos de detalle, especificación técnica…"

27. **6.2.9. ARRANQUE DE COLUMNAS EN MADERA, CON PLATINA XS10160 ROTHOBLAAS, incluye instalación de anclajes embebidos, espigas, tornillos, según lo define el proveedor, incluye equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.**
    "…Revisar planos estructurales y detalles de arranque de columnas…"
    "…elemento debidamente instalado y ejecutados de acuerdo con los planos de detalle, especificación técnica…"
28. **6.2.11. PLATINA CORREAS CUBIERTA EN MADERA, CON PLATINA WBO090 (según diseño estructural) incluye la instalación, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.**
    "…Revisión de planos estructurales y detalles de conexión…"
    "…elemento debidamente instalado y ejecutados de acuerdo con los planos de detalle, especificación técnica…"

29. **6.2.12. VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" 0.50m**
30. **6.2.13. VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 0.50m**
    ***"…**Revisión y verificación del diseño estructural y arquitectónico…"*
    "…Revisión de planos estructurales y detalles de conexión…"
    "…elemento debidamente instalado y ejecutados de acuerdo con los planos de detalle, especificación técnica…"
31. **"6.2.17" – "6.02.20" CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS**
    "…Revisar planos estructurales y detalles de conexiones…"
    "…elemento debidamente instalado y ejecutados de acuerdo con los planos de detalle, especificación técnica…"

32. **REDES HIDROSANITARIAS**
    En las especificaciones técnicas de cada ítem, se expone la revisión de los detalles y despieces tanto estructurales como arquitectónicos para su construcción y desarrollo en obra. Ya que estos son el punto de partida para su revisión y aprobación por la interventoría y la supervisión del Ministerio de cultura, en los ítems que a continuación se describen no se cuenta con los planos, despieces y detalles anteriormente mencionados. Se describe y se cita de manera textual los ítems que solicitan planimetría, detalles técnicos y estructurales. *(DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS)*

33. **CAJAS, POZOS, CARCAMOS**

    7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000

PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos. CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos. CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

"…Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las cajas de inspección…"

"…de acuerdo con los planos de detalle…"

34. **7.1.4. CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.**

"…Revisar los planos de redes sanitarias para localizar los puntos donde deben ir las cajas…"

"…de acuerdo con los planos de detalle…"

35. **REDES SANITARIAS**

7.2.1. 7.2.2. 7.2.3. 7.2.4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC S ø 6" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC S ø 3" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)

"…Revisar planos de redes sanitarias para empezar a ubicarla…"


"…de acuerdo con los planos de detalle, especificación técnica…"

36. **INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION**


No se suministraron planos a detalle, despieces, planos de destrucción y/o planimetría en general para INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION, por ende, no fue posible la revisión precisa

37. **PLANOS HIDROSANITARIOS**


No se encontró plano de convenciones y los planos existentes no son lo suficientemente claros para el desarrollo adecuado de las actividades en obra.

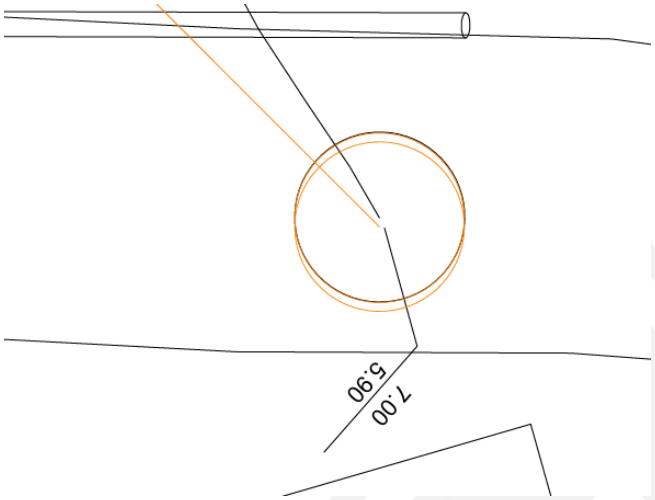


38. No se cuenta con el suficiente despiece detallado de los elementos a intervenir, en el plano de redes Hidrosanitarias la línea “magenta” no tiene nomenclatura ni convenciones.

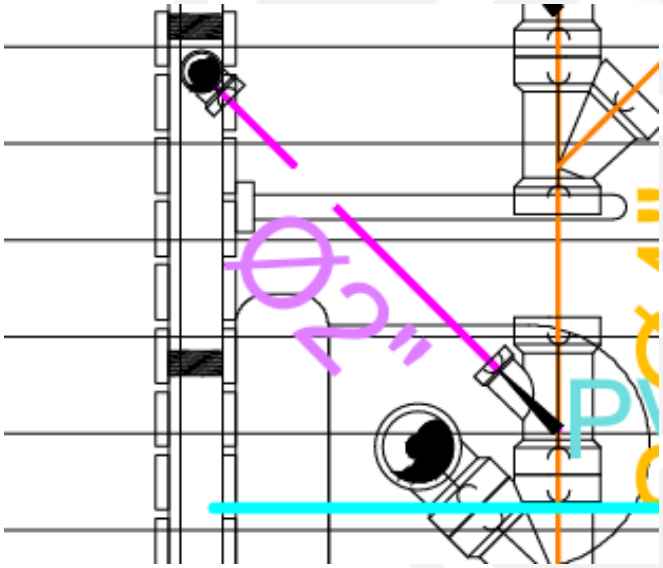


39. El plano no cuenta con isométricos completos, se observan elementos faltantes:

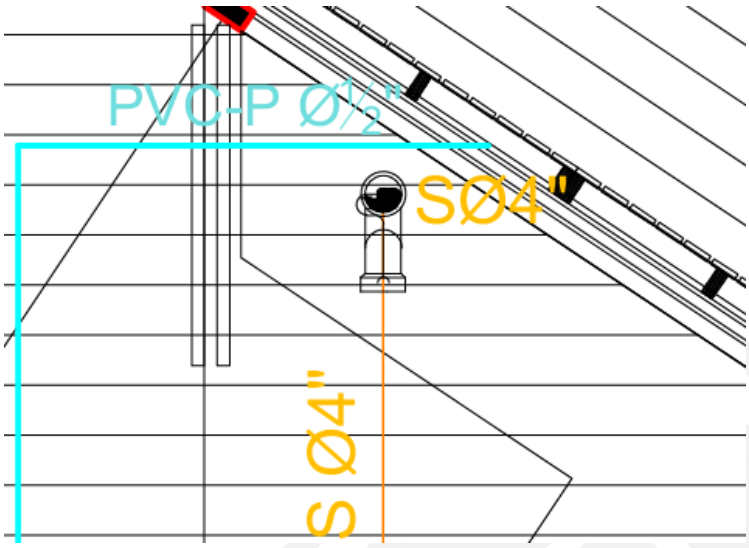

40. Los planos no cuentan con un despiece claro y/o detalle del sistema de recolección y distribución de la red aguas lluvias.

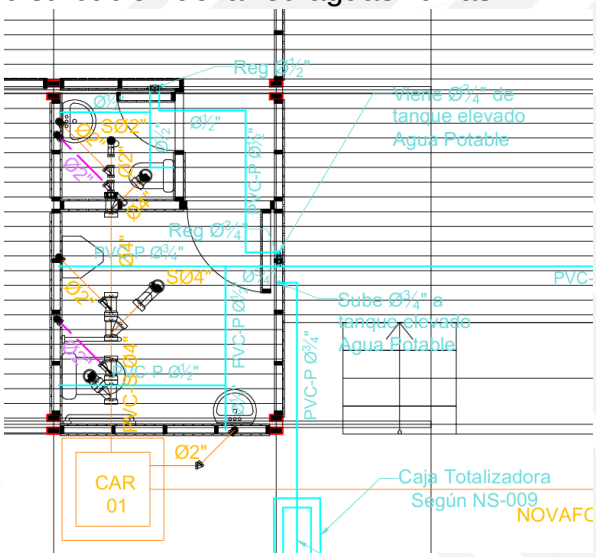

41. Los planos no cuentan con una descripción detallada para la instalación de las tuberías de ventilación

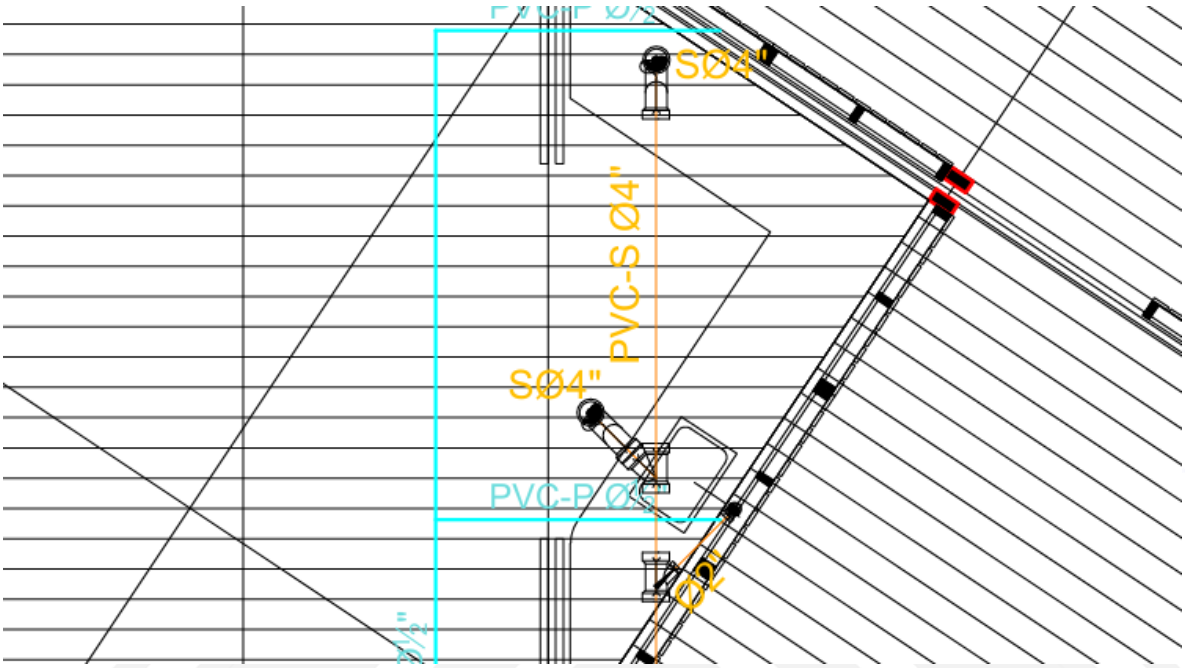

42. MAMPOSTERÍA

En los planos suministrados no se encontró vista del detalle y/o el despiece grafico específico del ítem ***10.09 LISTÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al muro retrocedido el espesor del pañete.***

43. En los planos suministrados no se encontró vista del detalle y/o el despiece grafico específico del ítem ***10.11 Muro Superboard 10mm Acabado 2 caras + Aislante Tipo Sonowall o similar.***

44. CUBIERTAS Y CIELO RASOS

En los planos suministrados no se encontró vista del detalle y/o el despiece grafico específico del ítem ***11.01.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SHINGLE REFERENCIA DYNASTY O SIMILAR O MEJOR CALIDAD color a definir, incluye Caballetes, machimbre de 9mm, manto asfaltico sin foil, perfiles de inicio y corta gotera, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.***

45. PISOS Y ENCHAPES

En los planos suministrados no se encontró vista del detalle y/o el despiece grafico específico del ítem ***13.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA CHOIBA 1" x 3" CEPILLADA, distanciados cada 9 cm (sobre madera y elementos en concreto según diseño), incluye inmunizado, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.***

46. En los planos suministrados no se encontró vista del detalle y/o el despiece grafico específico del ítem ***13.05.01 MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido en sitio, forma y dimensiones según diseño (a= +-0.60), incluye refuerzo y anclajes según planos; incluye enchape en granito pulido grano fino e = 2 cm, color A DEFINIR, con salpicadero de 10 cm tanto atrás como en los laterales y faldón de 12 cm; incluye formaleta y todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución***

47. CARPINTERÍA METÁLICA

En los planos suministrados no se encontró vista del detalle y/o el despiece grafico específico del ítem ***15.03.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO GATO EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO DE 1" PARA ACCESO A TANQUE DE AGUA, incluye pintura anticorrosiva y esmalte de protección ambientes salinos, pernos, topes de caucho y todo lo necesario para su correcta instalación***

48. En los planos suministrados no se encontró vista del detalle y/o el despiece grafico específico del ítem ***15.03.02 BARANDA, PASAMANOS EN TUBO CERRAMIENTO 2", TRES TUBOS DE 1/2" PLATINAS VERTICALES, acabado pintura electrostática negra, fijación a piso y pared con platinas y tornillos para metal (Según diseño)***

49. En el ítem 6.02.17 en el presupuesto no coincide con el ítem 6.02.17 de especificaciones
50. En el ítem 6.02.18 en el presupuesto no coincide con el ítem 6.02.17 de especificaciones

6.02.17	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL CHOIBA 3"X6" CEPILLADA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.

6.2.17. CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS

6.02.18	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL NISPERILLO 3"X3"CEPILLADA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.

6.2.18. ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL TIPO, ACORDE A LA ESPECIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO O SIMILAR, 3"X6" CEPILLADA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.

51. En el ítem 6.02.19 en el presupuesto no coincide con el ítem 6.02.17 de especificaciones

6.02.19	ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL NISPERILLO 2"X4"CEPILLADA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.


6.2.19. ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL TIPO, ACORDE A LA ESPECIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO O SIMILAR, 3"X3"CEPILLADA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.

52. En el ítem 6.02.20 en el presupuesto no coincide con el ítem 6.02.17 de especificaciones


6.02.20	CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS


6.2.20. ESTRUCTURA EN MADERA ESTRUCTURAL TIPO, ACORDE A LA ESPECIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO O SIMILAR, 2"X4"CEPILLADA, SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.

53. Cotas Remontadas en Plano Arquitectónico PLANTA MUROS A200

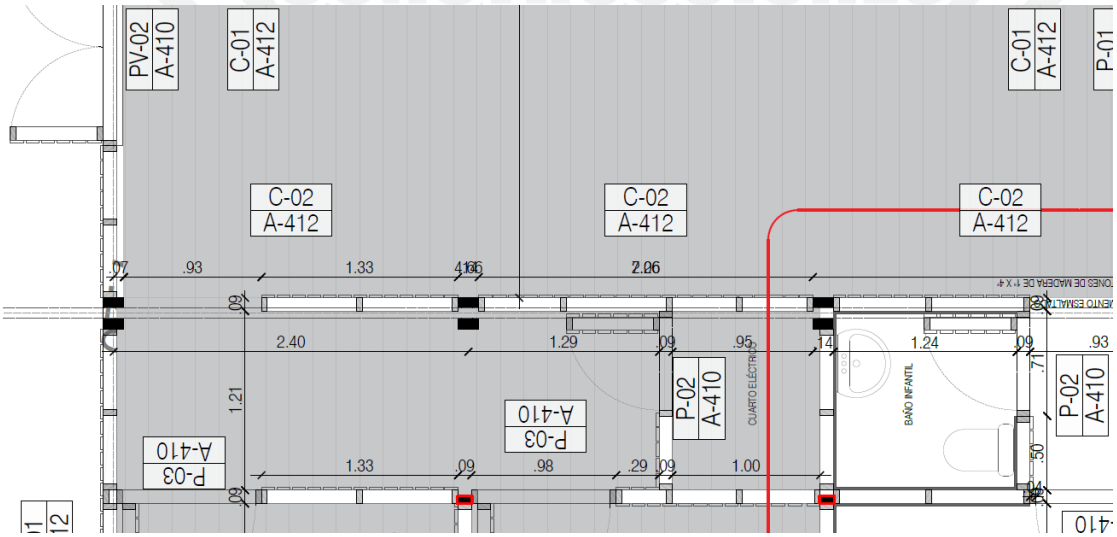

54. Faltan Medidas Perimetrales en Plano Muros A200

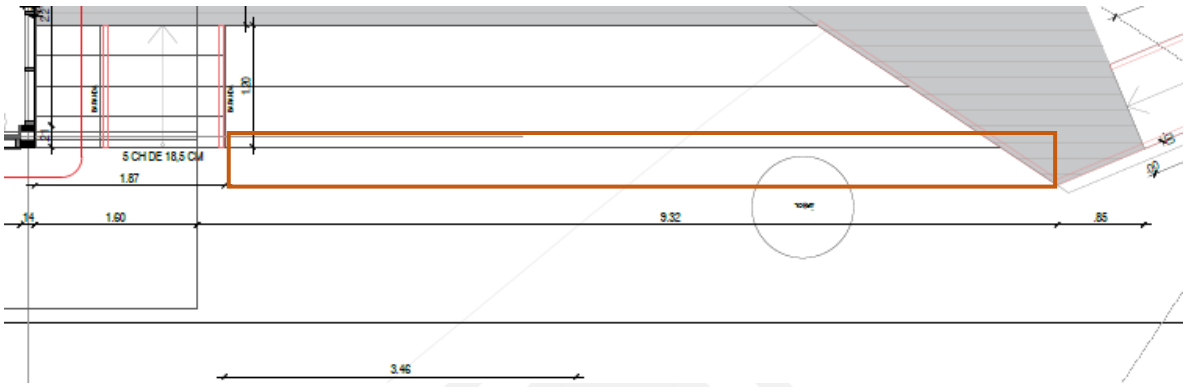

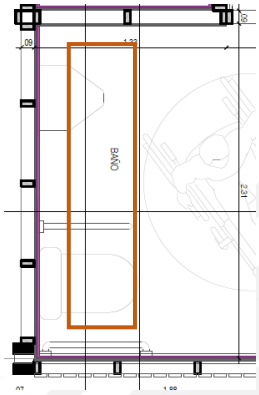


55. Faltan Cotas en Plano de detalle de baños – PLANO VENTANAS A- 210


- Como distancia del ancho en cada baño.
- Distancia de muro a eje del Inodoro para instalación.

56. Especificaciones y planos de detalle de la madera estructural a instalar (Especificaciones de instalación con platinas, etc.)


57. Faltan Cotas en Plano CUBIERTAS A102, como medidas perimetrales, diagonales y otras en Cubierta

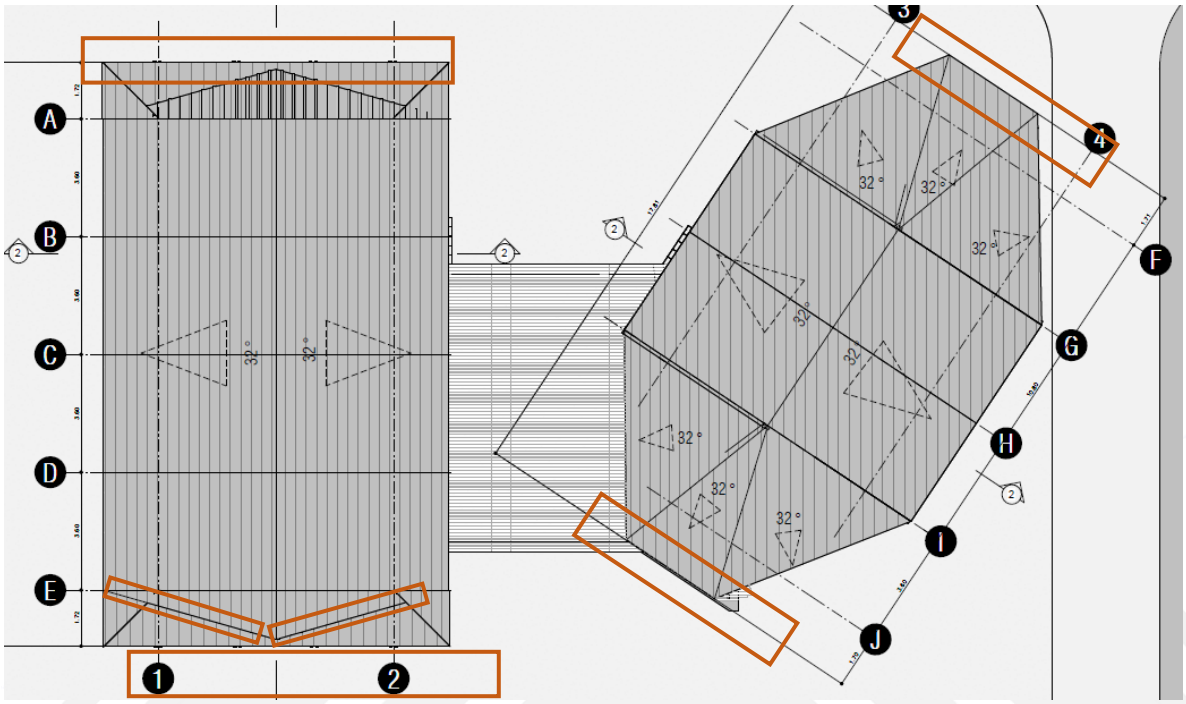

58. En plano de FACHADAS A110 No especifica ni se ve reflejadas ninguna ventana ni su ubicación

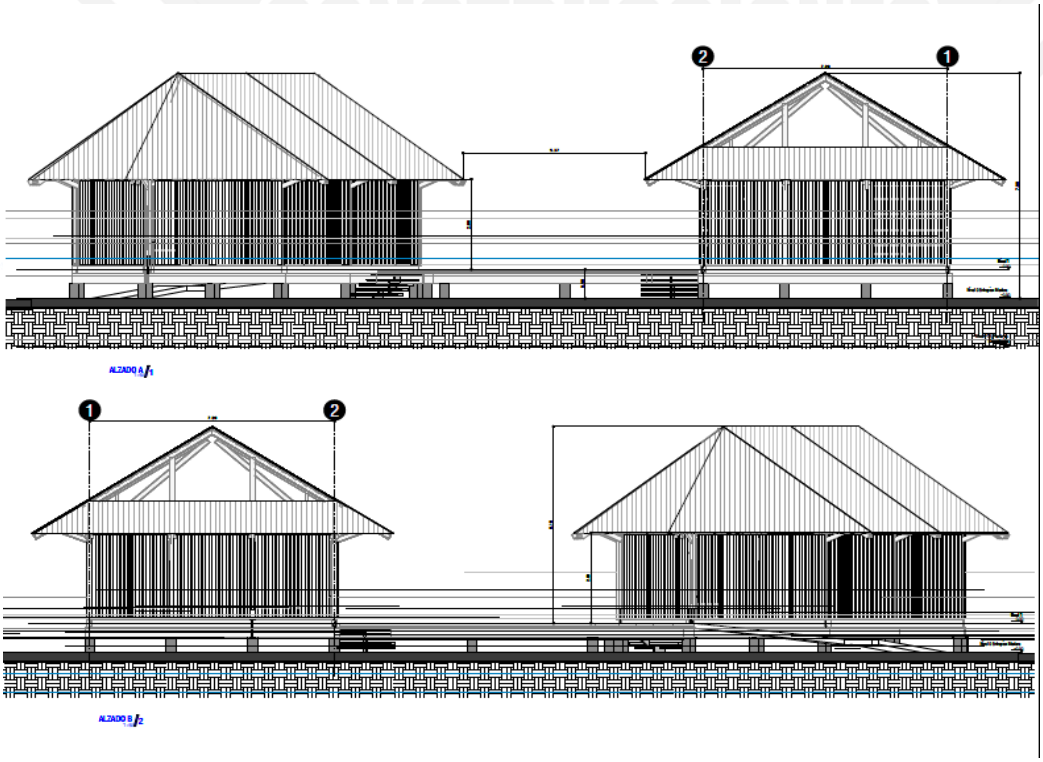

59. Falta Detalle de Cerca o Estructura portante para Cubierta del Plano A120 CORTES

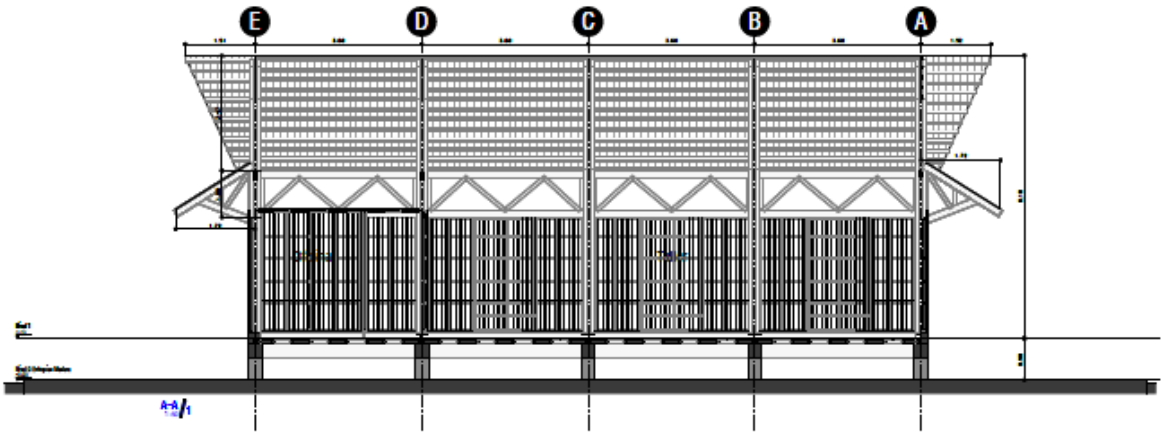

60. En el presupuesto aparece como 8.4.6 Suministro e Instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F # 10 + 1N #10 + 1T # 10 AWG, etc.
Pero en la especificación del ítem 8.4.6 aparece como Suministro e Instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8 + 1N #8 + 1T #8AWG, etc.

8.4.6. Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F# 8+1N #8 + 1T #8AWG, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos.

No sabríamos qué # del cable se debería instalar.

61. En el presupuesto hay una inconsistencia en el ítem 8.07.01, ya que en el presupuesto aparece Tubería EMT de ¾" a la vista, Caja de aluminio inyectado rawelt, accesorios tuberías…, etc.

8.07.01	Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" a la vista, caja de aluminio inyectado rawelt, accesorios de tubería, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas,

8.7.1. SumSuministro de materiales y mano de obra para instalación de salida para interruptor sencillo; (incluye interruptor, cableado en cable 2x12 AWG LSZH, conductor de continuidad, tubería Conduit PVC empotrada en muro hasta altura h=0.9m, tubería EMT de 3/4" en techo a la vista, accesorios de tubería, regatas, resanes, cajas de paso, conectores para empalme, soportería necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, regatas y demás elementos consumibles para su correcta instalación). Altura de instalación h=0.9 m

Pero en las especificaciones del ítem 8.7.1 no especifican ninguna caja de aluminio inyectado radwelt, pero además en la especificación aparece una tubería Conduit PVC empotrada, regatas y resanes que no nombran en el presupuesto. Entonces el presupuesto y la especificación no son estrictamente similares y estarían sujetos a diferentes interpretaciones.

62. En el ítem 8.7.2 también presentaría la misma irregularidad especificada del ítem anterior 8.7.1.

63. En el presupuesto el ítem 13.04.03 donde especifica el Suministro e Instalación de piso en Madera Choiba 1" x 3" Cepillada …etc.

13.04.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA CHOIBA 1" x 3" CEPILLADA, distanciados cada 9 cm (sobre madera y elementos en concreto según diseño), incluye inmunizado, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

No coincide dimensiones de la madera con el pdf. de especificaciones del ítem 13.4.3 que aparece como Suministro e Instalación de Entrepiso en Madera de 2" x 4", Acabado en Listones de 1" x 4", etc.

13.4.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPISO EN MADERA de 2" x 4", ACABADO EN LISTONES DE 1" X 4", distanciados cada 9 cm (sobre madera y elementos de concreto según diseño), incluye inmunizado, herrajes, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

64. En el presupuesto el ítem 14.05 especifica un Tablero en Choiba de 1" x 4" de madera Cepillada, pero en las especificaciones no aparece ningún tablero.

14.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA BATIENTE DE MADERA MARCO EN NISPERO O SIMILAR DE 2" x 4" Y TABLERO EN CHOIBA DE 1" x 4" MADERA CEPILLADAsegún diseños, marco, contramarco, 3 perfiles de baranda incrustados al marco, todo inmunizado, parales, herrajes, bisagras, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

14.5. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA BATIENTE DE MADERA TIPO CAIMITO O SIMILAR DE 2" x 4" según diseños, marco, contramarco, 3 perfiles de baranda incrustados al marco, todo inmunizado, parales, herrajes, bisagras, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

65. En el presupuesto el ítem 18.8 especifica que se realiza la aplicación de esmalte para madera en altura menores a 1 metro, pero en las especificaciones no hay altura definida

18.08	APLICACIÓN DE DOS MANOS de esmalte para madera o metal. Para muros interiores y exteriores, incluye filos, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra

18.8. APLICACIÓN DE DOS MANOS de esmalte para madera o metal. interiores y exteriores, incluye filos, dilataciones todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución

66. El presupuesto aparece en el ítem 22.2 una cantidad especifica de avisos y en las especificaciones la cantidad de avisos no coincide.

67. En el archivo PDF para

22.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportados con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio, así: (1) Un aviso Porta Plano de evacuación compuesto por dos acrílicos cristal 2 mm, medidas 50 x 35 cm, para plano tamaño tabloide, indicando las salidas de emergencia, incluye plano a color. (10) Nueve avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 20 cm X 20 cm, con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y texto, con sistema de relieve (braille) en la parte inferior. (baño hombres, baño mujeres, baño niños, baño niñas, baño PMR, cuarto eléctrico, deposito, cuarto basuras, Cocineta, cuarto de Aseo). (2) Dos avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 15 cm X 15 cm. (extintor, con indicaciones). (3) Tres avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 11 cm X 12 cm. cuerpo reflectivo (salida emergencia)


22.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRUPO DE AVISOS DE SEÑALIZACIÓN E INFORMACIÓN elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, soportados con cuatro (4) distanciadores pequeños en aluminio

Descripción

- Dos (2) aviso Porta Plano de evacuación compuesto por dos acrílicos cristal 2 mm, medidas 50 x 35 cm, para plano tamaño tabloide, indicando las salidas de emergencia, incluye plano a color.
- Diez (10) avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 20 cm X 20 cm, con vinilo al espejo (parte posterior) incluye imagen y texto, con sistema de relieve (braille) en la parte inferior. (baño hombres, baño mujeres, baño niños, baño niñas, baño PMR, cuarto eléctrico, deposito, cuarto basuras, Cocineta, cuarto de Aseo).
- Cinco (5) avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 20 cm X 20 cm. (extintor, con indicaciones).
- Siete (7) avisos elaborados en acrílico cristal Cal. 2 mm, medidas 15 cm X 30 cm. cuerpo reflectivo (salida emergencia)

OBSERVACIONES A LOS APU

1. En el APU 1.01.01 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución. El ítem de **TELA VERDE X 2.10 m ANCHO 55 gr/m2** aparece unidad por m de $ 1.517, pero el material tiene incidencia por precio debajo del mercado

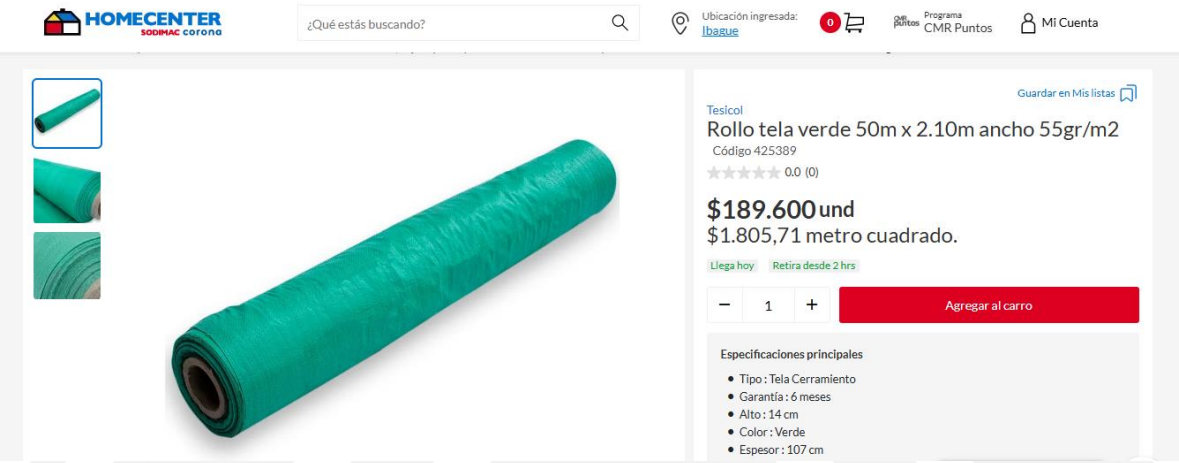


2. En el APU 1.01.05 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador.
   - En el ítem **Cable de Cobre Aislado N.º 8 AWG Libre de Halógenos Color** con precio por unidad m de $6.647, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado



- En el ítem **Borna de Ponchar Estañada Nº8** con precio por unidad de $ 1.245, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado.



3. En el APU 2.04 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes. En el ítem **VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA RANA 40 X 70 CM** en donde especifica el día a $35.571 la cual tiene incidencia por precio debajo del mercado.

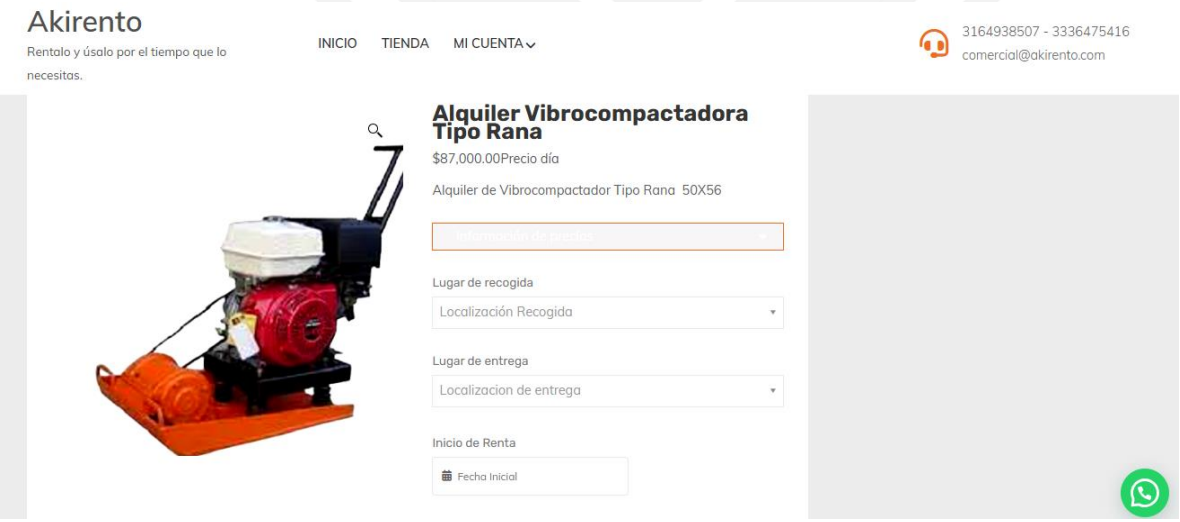

4. En el APU 3.01 SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales. El ítem **CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e

indicaciones suministradas por el supervisor del Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI

5. En el APU 3.02 CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad

   - En el ítem **CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e indicaciones suministradas por el supervisor del Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI.
   - En el ítem **PIEDRA MEDIA ZONGA** con el precio por m3 $79.112, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado



6. Para los ítems de cimentación y estructura en concreto, en los que el insumo fundamental es el concreto de 3.500 PSI, la entidad no publicó el APU básico que permitiera conocer los precios con los cuales basaron su estimación de este insumo fundamental, por lo tanto, presentamos el APU correspondiente a este insumo teniendo en cuenta los costos de transporte y demás, donde se refleja la diferencia entre el valor de los insumos y productos estimados por la entidad y el costo real en sitio, como ustedes pueden verificar, el costo real del item es mayor a los estimativos realizados por la entidad, lo cual pueden verificar para las actividades aquí relacionadas.

CAPITULO:	1	APU BASICOS		
ÍTEM:		CONCRETO DE 3.500 PSI GRAVA COMÚN, PREPARADO EN SITIO		UNIDAD: M3

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 7.204,55	1,00	$ 7.204,55
VIBRADOR DE CONCRETO	H	$ 15.000,00	0,75	$ 11.250,00
MEZCLADORA DIESEL	H	$ 22.500,00	0,90	$ 20.250,00
				$ 38.704,55

B. MATERIALES


DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
CEMENTO GRIS	kg	$ 630,00	350	$ 220.500,00
ARENA LAVADA DE PEÑA	m3	$ 218.076,00	0,6	$ 130.845,60
AGUA	L	$ 10,00	170	$ 1.700,00
GRAVA 1"	m3	$ 170.200,00	0,76	$ 129.352,00
				$ 482.397,60

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
AA	CUADRILLA AA (Albañilería)	1	hc	$ 31.700,00	0,22	$ 144.090,91
						$ 144.090,91

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENT	VALOR UNITARIO
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR	1,50 %	$ 35.000,00	1,0	$ 35.000,00
				$ 35.000,00
		TOTAL PRECIO UNITARIO:		$ 700.193,05

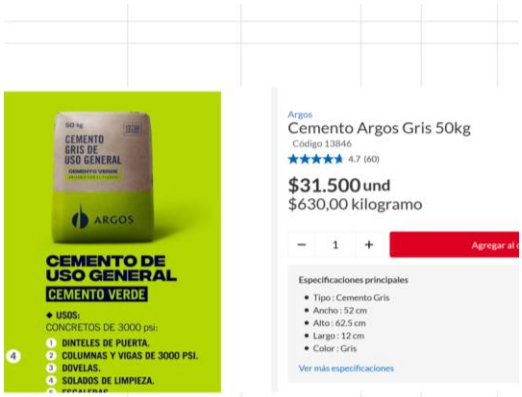

ANTISOL ROJO

VALOR KG	TRANSP. POR BULTO DE 50KG
$ 630,00	$ 5.000,00

VALOR BULTO DE CEMENTO EN JURADÓ	$ 36.500,00
VALOR TRANSP. TON. B/TURA-JURADÓ	$ 1.000.000
$ 100 VALOR KG DE TRANSPORTE	

PRECIO OFICIAL	DESFASE	
$ 461.641,00	-$ 238.552,05	-51,67%

El ítem de **Vibrador de Concreto** con precio al día de $ 22.427, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado



El ítem de **SIKA Plastocrete Dm Aditivo Reductor de Agua** aparece con valor de $21.179, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado

- En el ítem **CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e indicaciones suministradas por el supervisor del

Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI.




7. En el APU 4.02 Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSOLDADA (Desperdicio incluido en el valor del APU). En el ítem de la Malla Electrosoldada con valor por M de $6.916, pero el material tiene incidencia por precio debajo del mercado





8. En el APU 4.04 ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERFORACIÓN Ø 5/8" PROF MAX 0,30 M FIJADO MEDIANTE EPÓXICO DE DOS COMPONENTES 100% SOLIDOS INSENSIBLE A LA HUMEDAD Y TIXOTRÓPICO. En el ítem de **TALADRO PERCUTOR** aparece de valor por día de $ 26.750, pero tiene incidencia por precio por debajo del mercado

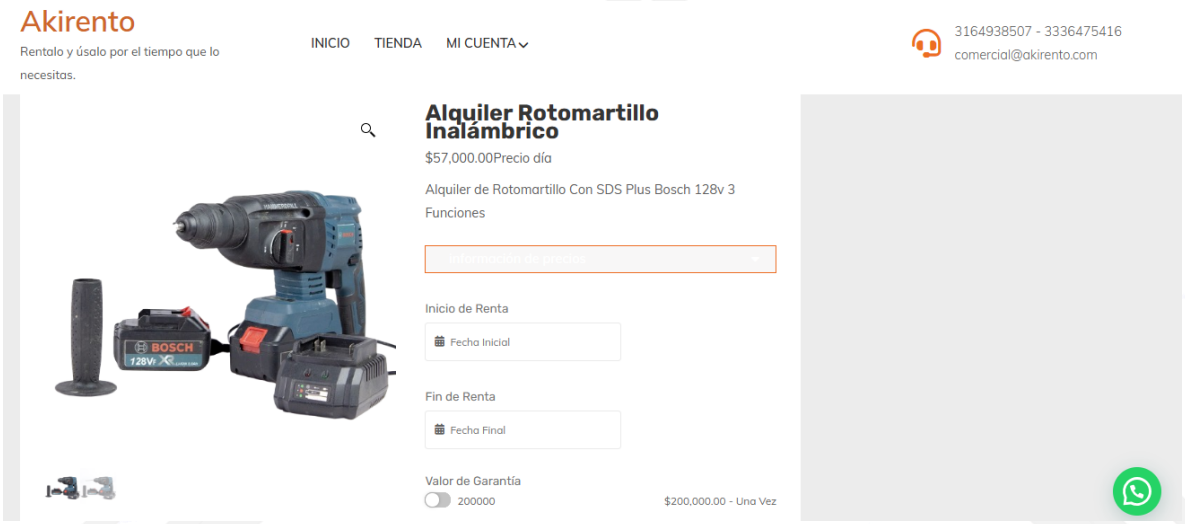


9. El APU 5.12 No aparece, el APU mas parecido es el APU 5.11 COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=4000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta metálica acabo liso, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.

   - El ítem de **Vibrador de Concreto** con precio al día de $ 22.427, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado

   - En el ítem **CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e indicaciones suministradas por el supervisor del Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI

- En el ítem **Desencofrante Emulsionado DESMOLDATOC (16KG)** con valor por kg de $19.498, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado

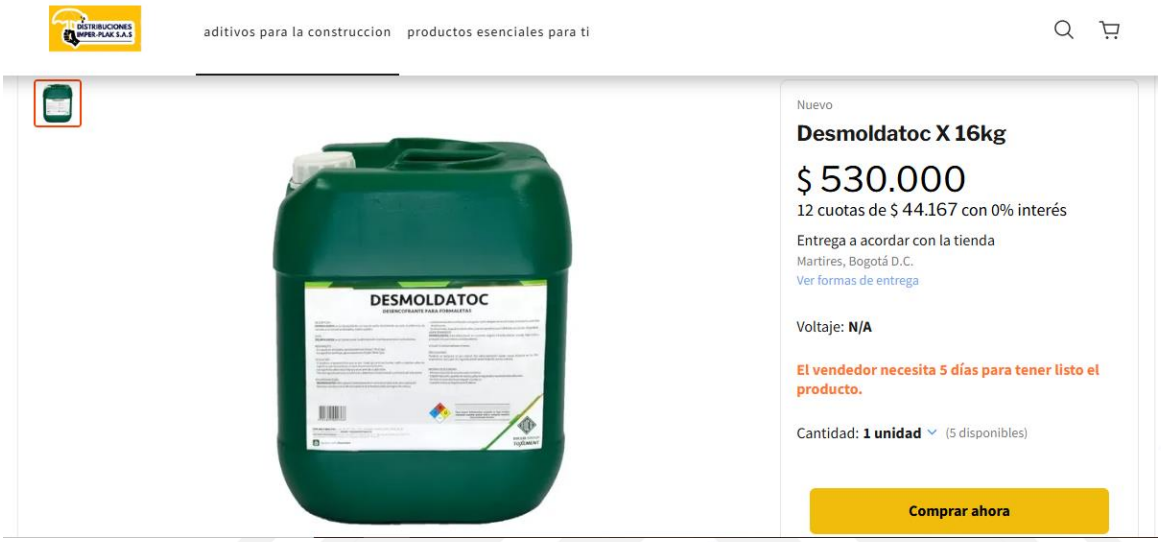

10. En el APU 5.18 LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3.500 PSI (e=0.07) Según diseños, dimensiones y detalles según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad.

    - El ítem de **Vibrador de Concreto** con precio al día de $ 22.427, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado


    - En el ítem **CONCRETO 28 MPA (4000 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e indicaciones suministradas por el supervisor del Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI

    - En el ítem **TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm x 2,90 m, ORDINARIO.** El valor por unidad es de $12.478, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado.




- En el ítem **ANTISOL ROJO** el valor por kg es de $18.044, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado. El valor de mercado en ciudad capital es de $38.472



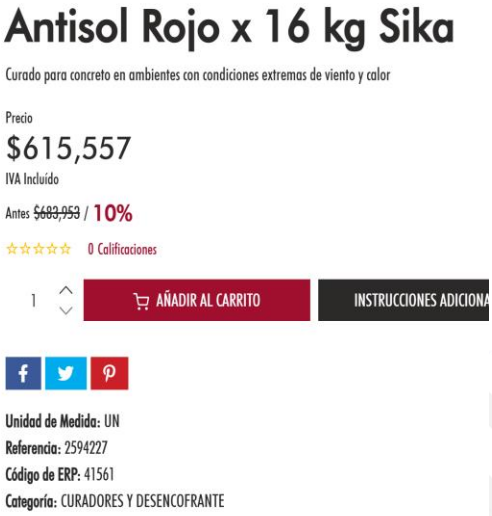


11. En el APU 6.01.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.

- En el ítem de **WASH PRIMER A PINTURA** el valor por gl es de $ 115.560, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado

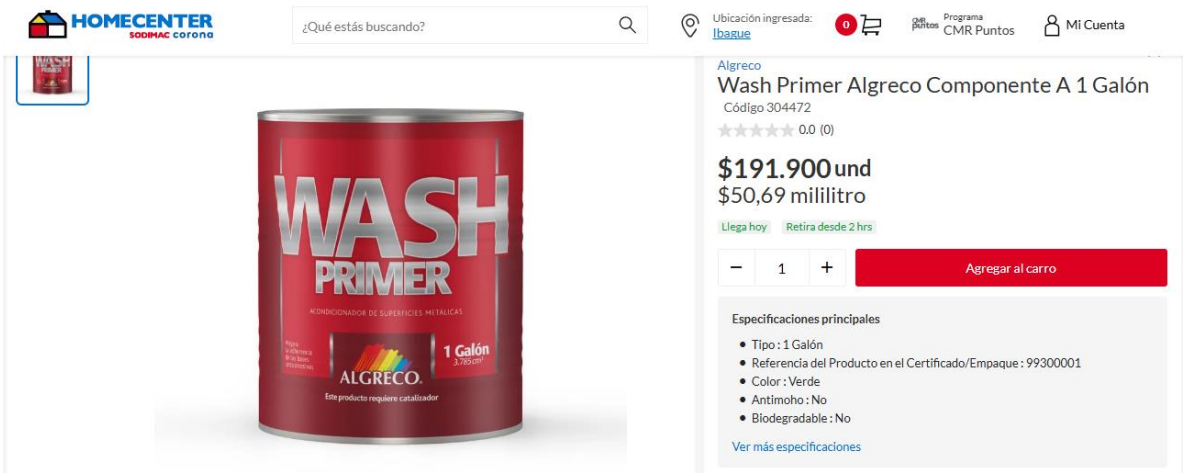

- En el ítem **PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)** el cual tiene valor de gl. es de $82.241, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado

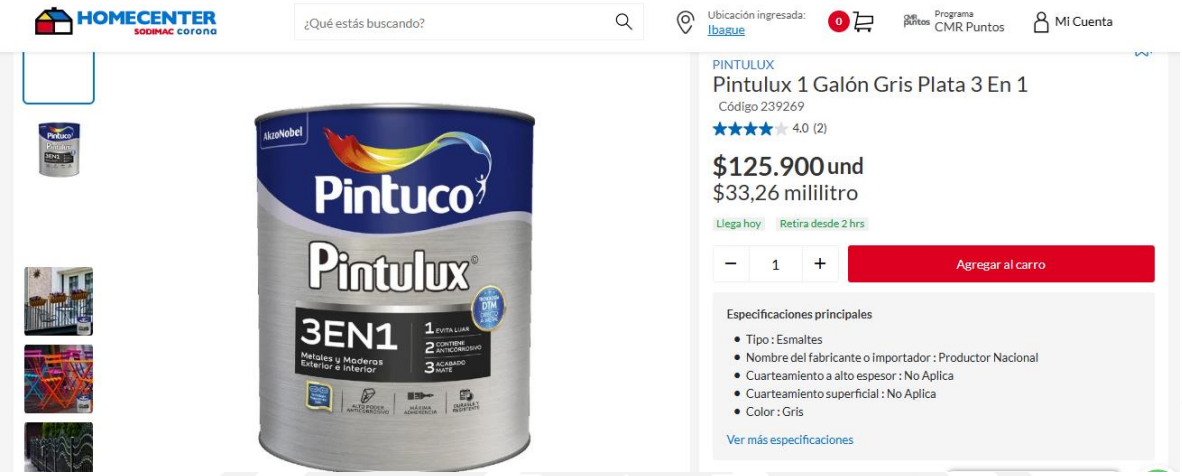

12. En el APU 7.01.01 CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.


- El ítem de **Vibrador de Concreto** con precio al día de $ 22.427, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado

- En el ítem **CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e indicaciones suministradas por el supervisor del Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI
- En el ítem **CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e indicaciones suministradas por el supervisor del Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI

- En el ítem de la Malla Electrosoldada con valor por M de $6.916, pero el material tiene incidencia por precio debajo del mercado

- En el ítem **TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm x 2,90 m, ORDINARIO.** El valor por unidad es de $12.478, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado.

- En el ítem **LADRILLO MACIZO PRENSADO 24 X12 X 6CM** el cual tiene valor por unidad de $1.017 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado.

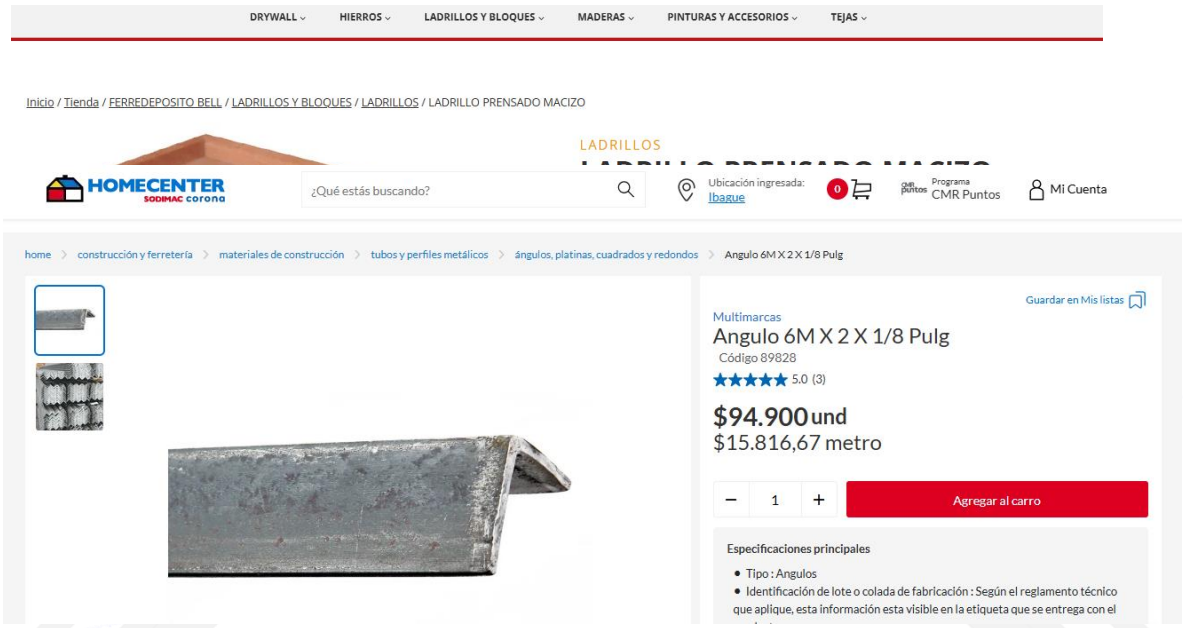

- En el ítem **ANGULO 2” X 1/8”** el cual tiene valor por metro de $11.067 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado.

13. En el APU 7.01.03 CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.
    - El ítem de **Vibrador de Concreto** con precio al día de $ 22.427, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado

    - En el ítem **LADRILLO MACIZO PRENSADO 24 X12 X 6CM** el cual tiene valor por unidad de $1.017 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado
    - En el ítem **CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e indicaciones suministradas por el supervisor del Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI

    - En el ítem **CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e indicaciones suministradas por el supervisor del

Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI

- En el ítem de la Malla Electrosoldada con valor por M de $6.916, pero el material tiene incidencia por precio debajo del mercado
- En el ítem **TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm x 2,90 m, ORDINARIO.** El valor por unidad es de $12.478, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado.
- En el ítem **ANGULO 2" X 1/8"** el cual tiene valor por metro de $11.067 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado


14. En el APU 7.01.04 CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.
    - El ítem de **Vibrador de Concreto** con precio al día de $ 22.427, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado

    - En el ítem **LADRILLO MACIZO PRENSADO 24 X12 X 6CM** el cual tiene valor por unidad de $1.017 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado
    - En el ítem **CONCRETO 14 MPA (2000 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e indicaciones suministradas por el supervisor del Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI

    - En el ítem **CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e indicaciones suministradas por el supervisor del Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI

    - En el ítem de la Malla Electrosoldada con valor por M de $6.916, pero el material tiene incidencia por precio debajo del mercado
    - En el ítem **TABLA BURRA 15 X 2,2 A 2,7 cm x 2,90 m, ORDINARIO.** El valor por unidad es de $12.478, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado.
    - En el ítem **ANGULO 2" X 1/8"** el cual tiene valor por metro de $11.067 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado
    - En el ítem de **WASH PRIMER A PINTURA** el valor por gl es de $ 115.560, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado
    - En el ítem **PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)** el cual tiene valor de gl. es de $82.241, pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado

15. En el APU 7.02.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta instalación)
    - En el ítem **REJILLA METALICA CON SOSCO 3X2”** tiene un valor unitario de $20.900 pero el material tiene incidencia por precio por debajo del mercado

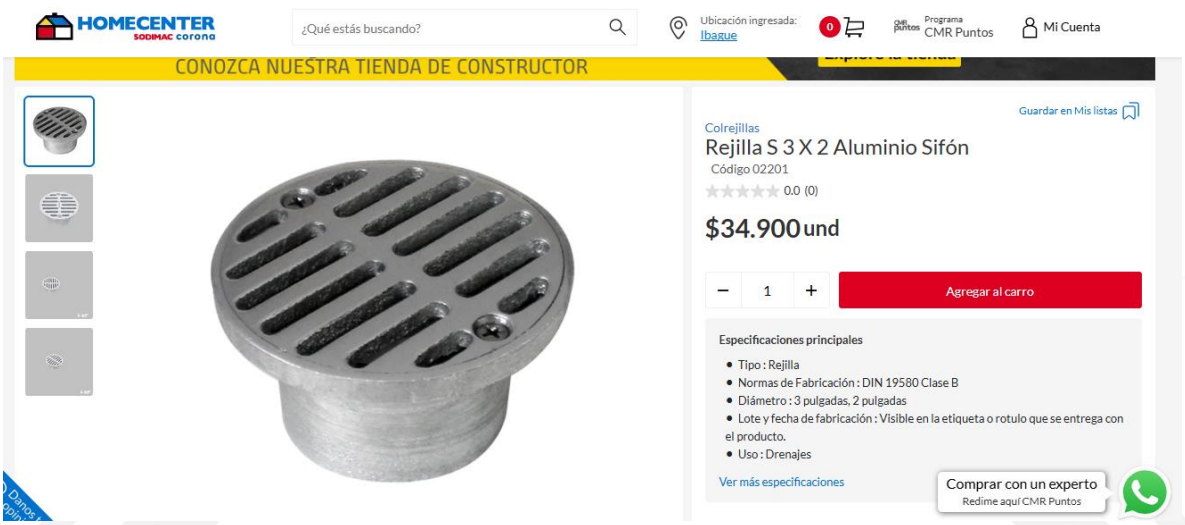


16. En el APU 7.04.05 PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálico 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según planos de diseño).

    - En el ítem **UNION BAJANTE PARA CANAL AMAZONAS** el cual tiene valor por unidad $19.900 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado




- En el ítem **REJILLA 5” X 4” CUPULA – TRAGANTE ALUMINIO** el cual tiene valor por unidad de $22.363 el cual tiene incidencia por precio po debajo del mercado

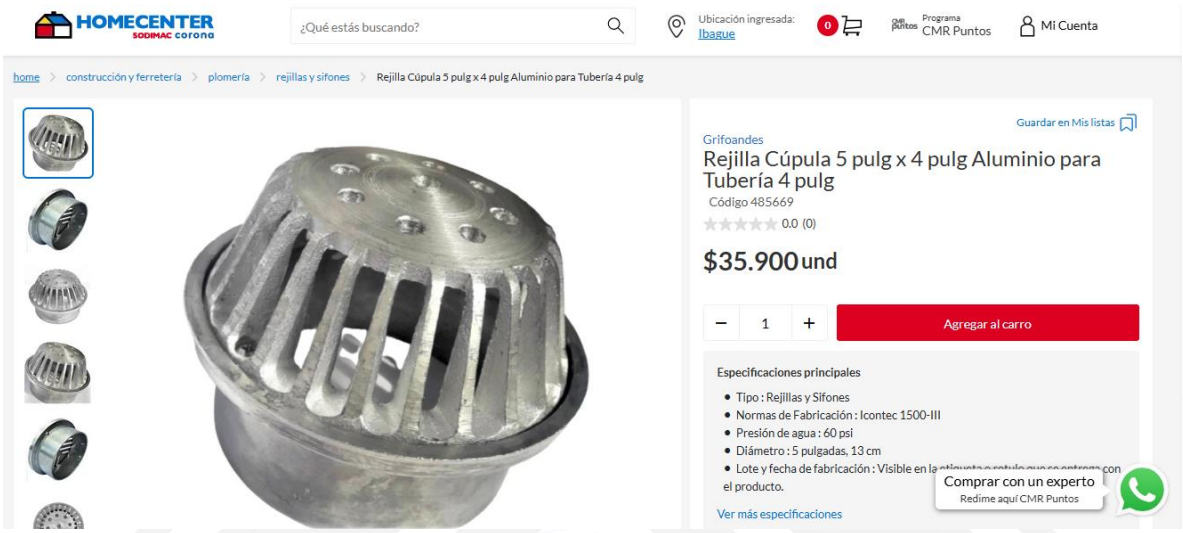

17. En el APU 7.05.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALMACENAMIENTO BAJO (volumen de 2000 lt + incluye transporte, anclajes, mano de obra, flotador, válvulas, herramienta y demás materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, incluye pruebas de estanqueidad)

- En el ítem **TANQUE PLASTICO BAJITO 2000 LT** el cual tiene valor por unidad de $1.212.582 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado

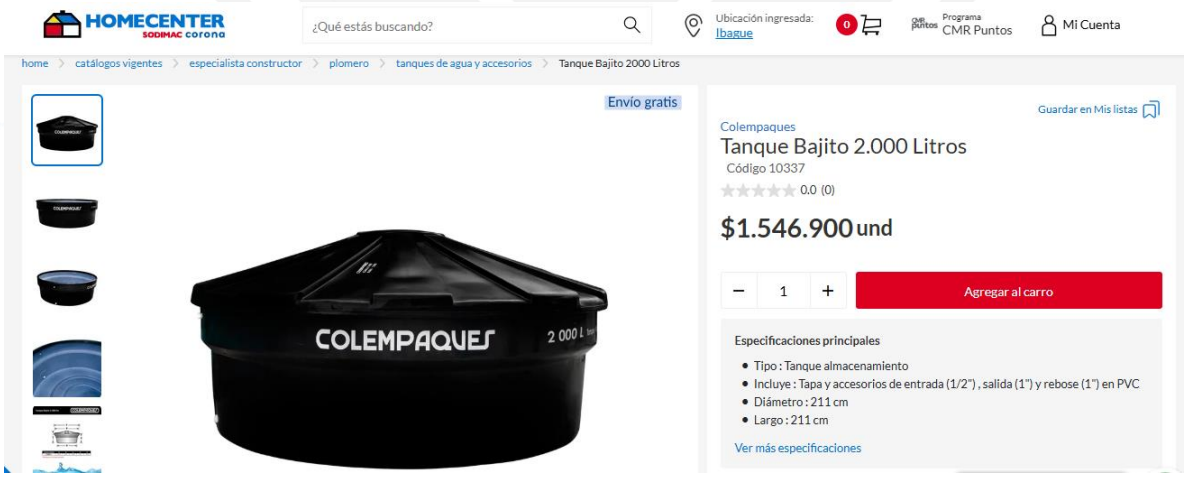

18. En el APU 8.01.01 Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1N de acuerdo con especificación técnica del operador de red, incluye medidor con protocolos vigentes. En el ítem **CAJA PARA MEDIDOR BIFASICO** tiene como valor unitario de $150.000 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado





Caja Contador Compac Macromedicion Con Lupa ET919

Escribe una reseña

$ 182.650

IVA incluido (precio sujeto a existencias - no incluye transporte este se calculara al finalizar la compra)

COMPAC

Código Interno :	150016000002
En stock :	9
Unidad de medida:	Unidad
Conozca marcas disponibles para esta cantidad	
Peso :	4.0000 kg
Dimensiones :	Anchura 0.4300 Mts. – Altura 0.2850 Mts. – Profundidad 0.2550 Mts.

Cantidad

1 COMPRAR

19. En el APU 8.02.03 Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274 o equivalente según norma. incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje, marco, tapa, terminales tipo campana, pañete y demás accesorios necesarios para su adecuada instalación.


    - En el ítem **CONCRETO 17,5 MPA (2500 PSI) GRAVA COMUN** tendría cambios de acuerdo a las especificaciones e indicaciones suministradas por el supervisor del Ministerio de Cultura de que todos los concretos de los elementos estructurales son de 3500 PSI


20. En el APU 8.03.02 Materiales y mano para la instalación de tablero de distribución bifásico enchufable para 18 Circuitos con espacio para totalizador, incluye barraje de neutro, barraje de tierra, puerta y chapa, totalizado bifásico tipo DRX de 40A 2F 65 KA 208V; doce (12) interruptores 1x20A; (incluye elementos consumibles para su correcta instalación, empotrado).
    - En el ítem **INTERRUPTOR TOTALIZADOR BIPOLAR DRX TERMOMAGNETICO** no aparece precio unitario

21. En el APU 8.04.06 Suministro e instalación de acometida en cable de cobre encauchetado 1F# 10+1N #10 + 1T #10 AWG, LSZH, incluye termo encogible, terminales de ponchar, cinta y demás accesorios para su correcto funcionamiento, incluye conexión en los dos extremos. Entrada y salida de UPS conexión borneras


    - En el ítem **CABLE ENCAUCHETADO 3 X10AWG 600V 90 GRADOS** tiene como valor por metro de $17.910 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado

- En el ítem **TERMINAL N.º 10** tiene como valor unitario $870 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado

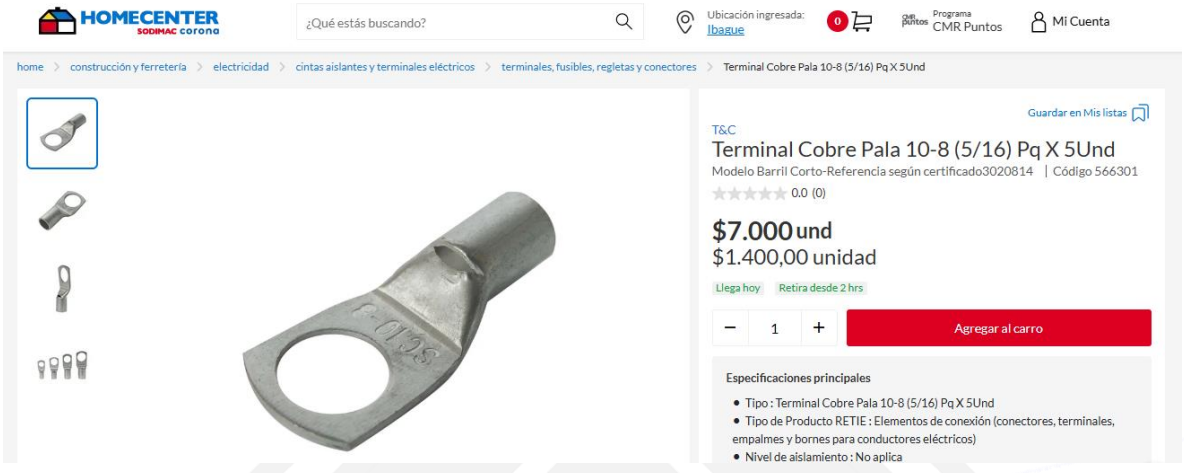

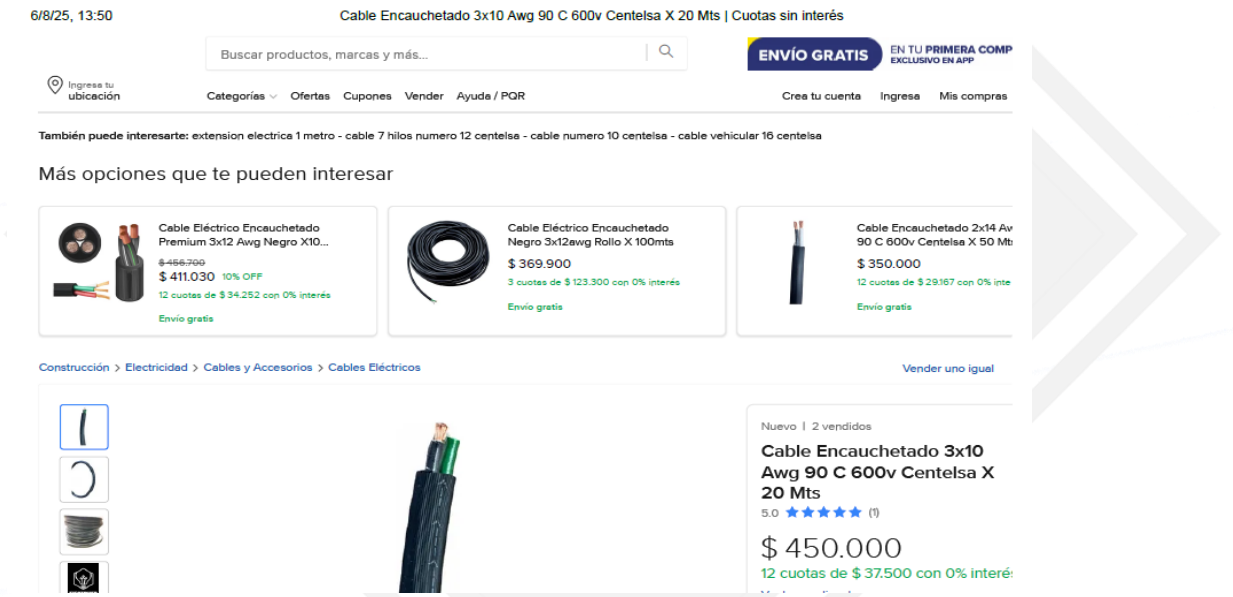

- En el ítem **Cinta Termo encogible** tiene como valor unitario $1.695 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado

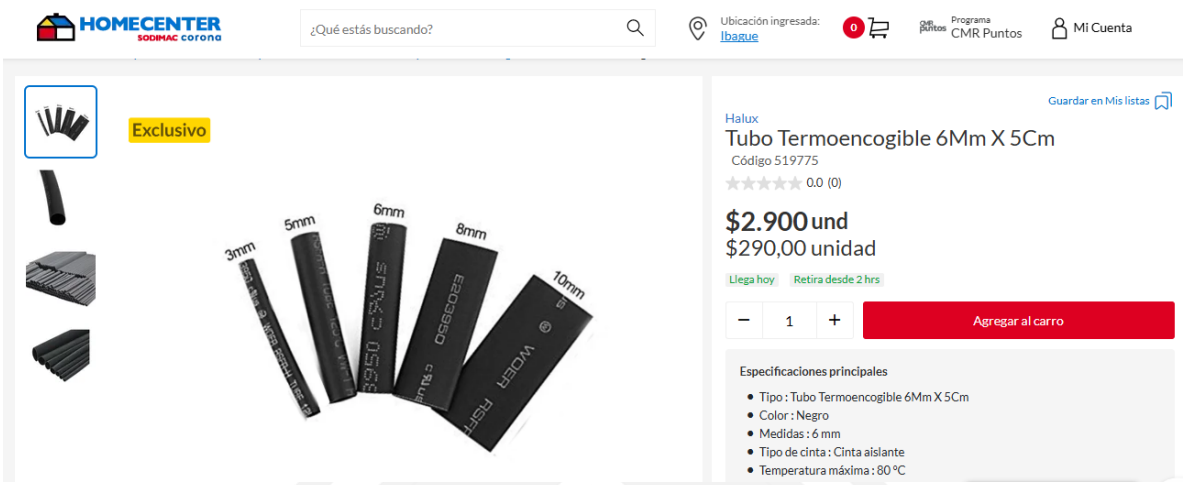

22. En el APU 8.05.06 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo o pared a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color naranja con polo a tierra aislado, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).
    - En el ítem **CAJA 2X4 GALVANIZADA CALIBRE 20 C (5800)** aparece con precio unitario de $2.364 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado




    - En el ítem **TAPA P/TOMA DOBLE - NARANJA NYLON** . aparece con precio unitario de $ 2.571 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado


23. En el APU 8.07.07 Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEAL CONTINUUM 2,27m montaje para descolgar , vida útil mínimo de 60.000 Horas, 60W,

5500 Lúmenes, de acuerdo con especificaciones del diseño de iluminación, Incluye cable encauchetado y clavija para conexión, kit de guayas aceradas para descolgar y demás elementos necesarios para su correcta instalación.

- En el ítem **Luminaria línea led continuum 30-60w nw sp24** tiene como valor unitario $ 608.603 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado

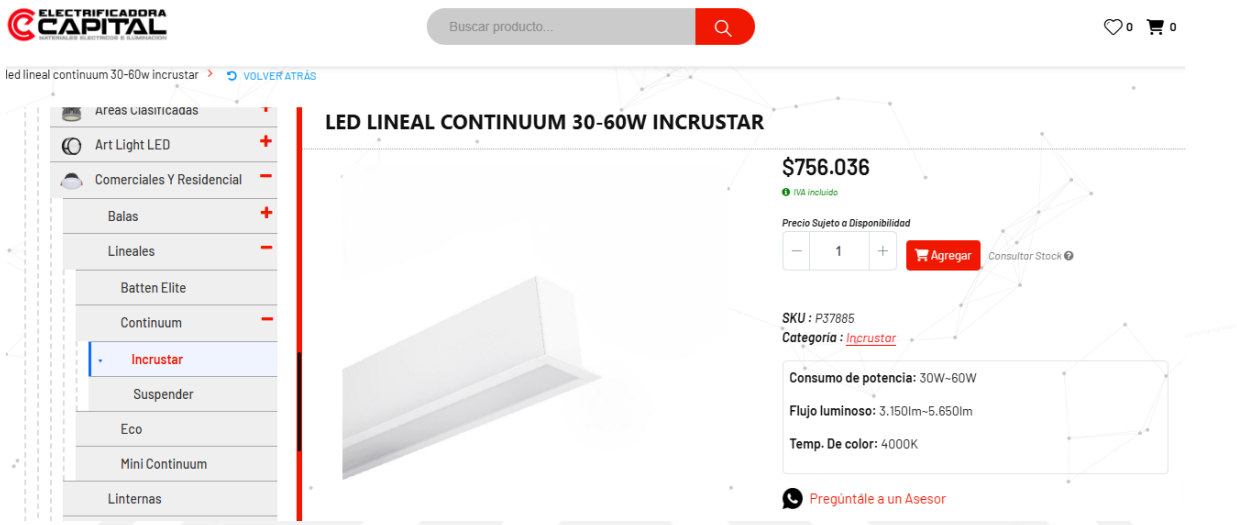


- En el ítem **KIT DE GUAYAS ACERADAS PARA DESCOLGAR EN TECHO** tiene como valor unitario $12.000 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado

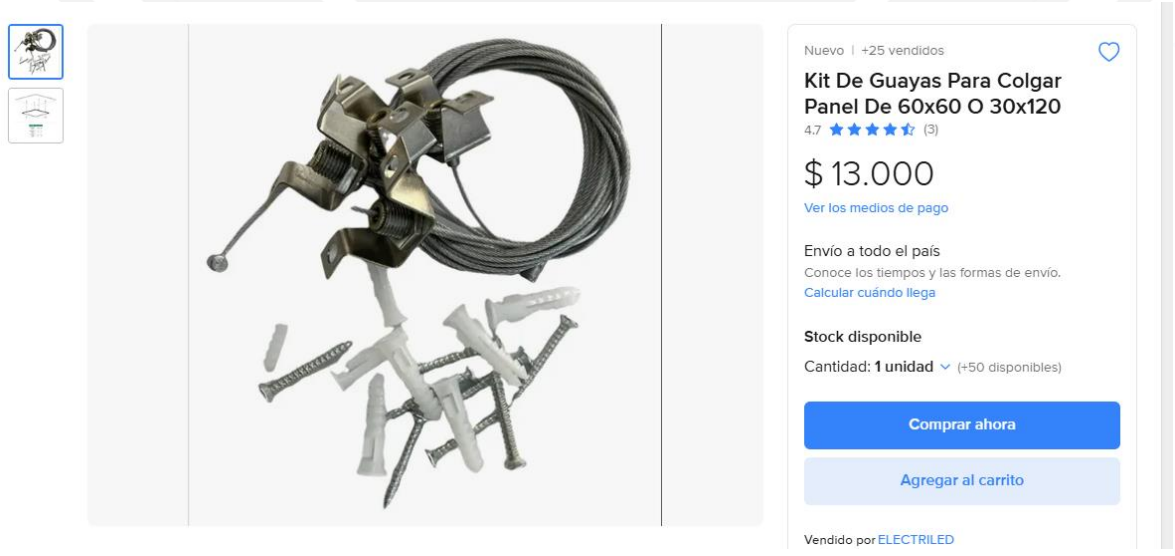

24. En el APU 8.08.06 Suministro e instalación de poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf, brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla., (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado RETILAP
    - En el ítem **POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACIÓN 3m, 150KGF** aparece con precio unitario de $849.000 el cual tiene incidencia por precio por


debajo del mercado. El cual no se ve bien la referencia y podría ser el de la siguiente imagen que fue cotizado

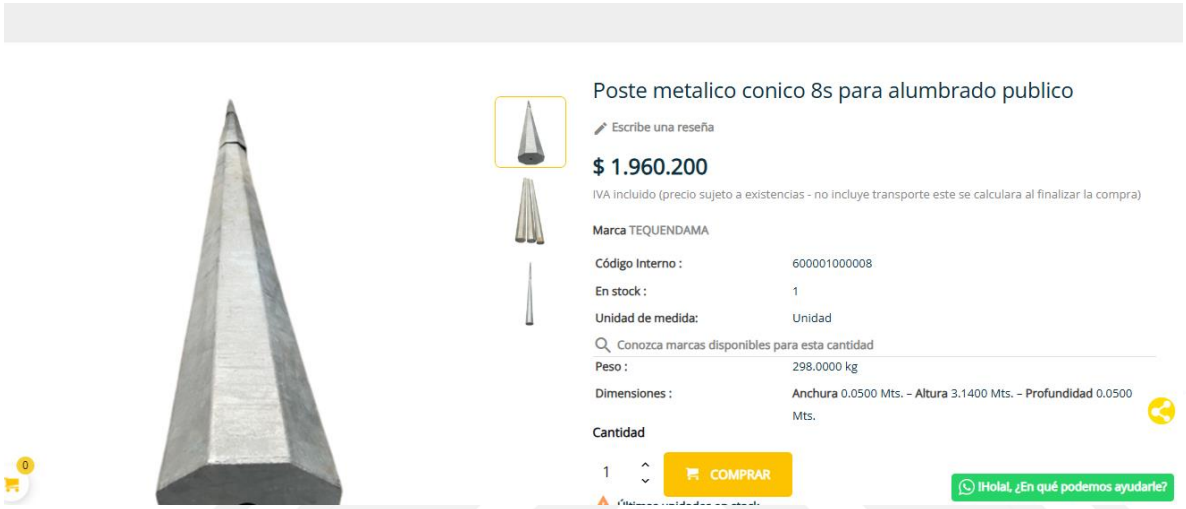

25. En el APU 8.10.04 suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red
    - En el ítem **TAPA DE INSPECCION 30X30** el precio unitario esta de $ 29.476 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado.




26. En el APU Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, online doble conversión salida 120V AC, conexión bornera, incluye cable encauchetado 3x10 AWG para entrada y salida
    - En el ítem CABLE ENCAUCHETADO 3X10AWG 600V 90 GRADOS aparece con precio por metro de $17.910 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado.

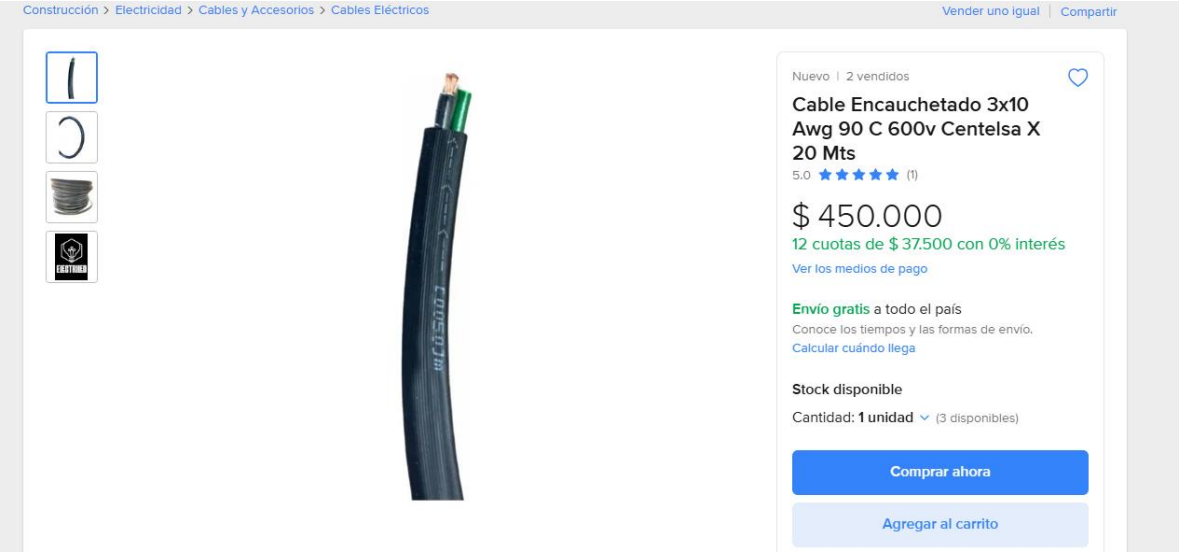


precio metro en el mercado de $ 22.500.

27. ITEM 6.02.12 VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" 0.50m (El precio en el presupuesto es unidad de $ 9.437,50 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado. Y además no incluye ni tuercas, ni arandelas)

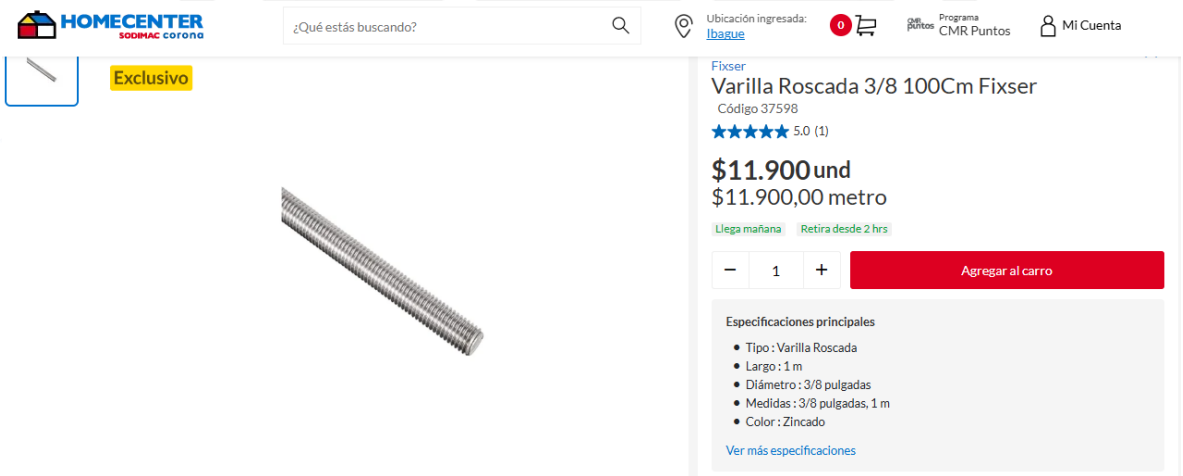

28. ITEM 6.02.13 VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 0.50m (El precio en el presupuesto es unidad de $ 13.423,09 el cual tiene incidencia por precio por debajo del mercado. Y además no incluye ni tuercas, ni arandelas)

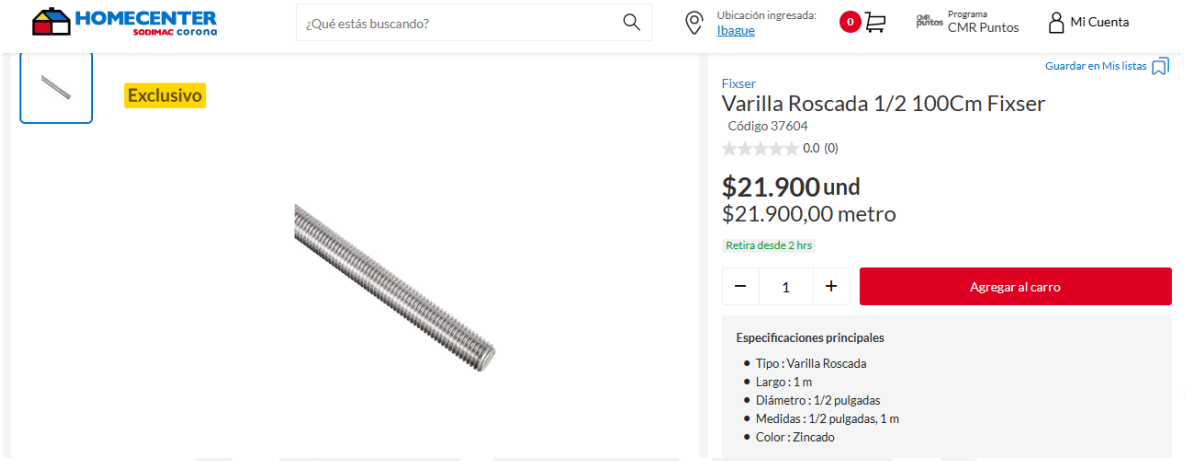

EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Revisando el archivo 004-Especificaciones técnicas, no se encuentran los siguientes ítems.

1. 8.05.09 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

2. 8.06.04 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC SCH 40 GRIS de 1 1/2"; incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación

3. 8.06.06 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soporte necesario, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

4. 8.7.19 Suministro e instalación de CINTA LED 120V rollo por 5 metros conexión con adaptador 3000K min 18lm/m, incluye perfil de aluminio (5m) y accesorios de fijación

5. 8.8.13 Suministro e instalación de luminaria LED con KIT SOLAR incluye Luminaria LED 50W-6000lm- 50000 horas de vida útil, Panel solar fotovoltaico policristalino 50W, batería, brazo y accesorios de soporte, incluye sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m, cable de cobre, conectores, tratamiento.

   Los siguientes Items presentan inconsistencias entre las especificaciones técnicas y el presupuesto oficial.

6. ITEM 6.02.20 CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS

7. ITEM 7.01.02 CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

8. ITEM 7.02.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 10" o 254 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.

9. ITEM 7.02.17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 8" o 203 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen funcionamiento.

10. ITEM 8.05.07 Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente normal, 1F+N+T 15A 120V instalación en techo a la vista tubería EMT ; (incluye: tomacorriente color blanco con polo a tierra, cableado en cable trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG, blanco-verde-rojo LSZH HF, CT, 600V, 80°C, tapa, conectores de empalme, marcación de salida, caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT 3/4 elementos de fijación y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

11. ITEM 8.05.09 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tomacorriente 15A 120V 1F+N+T DOBLE BLANCO CON TAPA GFCI (incluye Tomacorriente doble 20 A 120V 1F+N+T GFCI blanca, tapa, cable de cobre trenzado 1F#12+1N#12+1T#12 AWG LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) blanco-verde-azul

marcación de salida en acrílico, conectores de empalme para derivaciones de circuito caja galvanizada 2400, tubería EMT DE 3/4", accesorios EMT y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

12. ITEM 8.06.04 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit PVC SCH 40 GRIS de 1 1/2"; incluye cajas de paso, curvas, uniones, curvas, uniones, regatas, resanes, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación y demás elementos consumibles para su correcta instalación

13. ITEM 8.06.06 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de tubería Conduit EMT de 3/4"; (incluye cajas de paso, curvas, uniones, soporte necesario, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas, conductor de continuidad y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

14. ITEM 8.07.04 Suministro de materiales y mano de obra para Instalación de salida de iluminación en techo a la vista en tubería IMC; (incluye tomacorriente normal 15A 120V 1F+N+T,caja RAWELT 2400 mínimo 2 salidas, cableado en cable de cobre 3x12 AWG LSZH, conductor de continuidad en alambre desnudo N° 12 AWG, tubería IMC de 3/4" con accesorios, cajas de paso, conectores para empalme, soporte necesaria, perfiles riel Chanel donde se requiera, grapas, pernos de anclaje, abrazaderas y demás elementos consumibles para su correcta instalación).

15. ITEM 8.07.09 Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobreponer 24W Flujo Luminoso mínimo 1680 Lúmenes Temperatura De Color 4000K CRI 120 Ángulo De Apertura 120°, 120 V, Vida Útil De 25.000 Horas.

16. ITEM 8.07.19 Suministro e instalación de CINTA LED 120V rollo por 5 metros conexión con adaptador 3000K min 18lm/m, incluye perfil de aluminio (5m) y accesorios de fijación

17. ITEM 8.08.08 Suministro e instalación de luminaria tipo bolardo de 0,8 m, temperatura de color máximo 3000K, 6W, grado de protección mínimo de IP54, vida útil mínimo de 30000 horas, ángulo de apertura 90°

18. ITEM 8.08.13 Suministro e instalación de luminaria LED con KIT SOLAR incluye Luminaria LED 50W-6000lm- 50000 horas de vida útil, Panel solar fotovoltaico

policristalino 50W, batería, brazo y accesorios de soporte, incluye sistema de puesta a tierra con varilla de cobre 2,4m, cable de cobre, conectores, tratamiento

19. ITEM 8.12.01 Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ante la ONAC

20. ITEM 8.12.03 Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones de conexión definitivas asignadas por el operador de red, incluye: medición de resistividad del terreno y elaboración de informe, diagnóstico del sistema de apantallamiento, y demás cálculos establecidos en el artículo 10.1 del RETIE, la entidad entrega un pre diseño eléctrico que incluye un plano con distribución de circuitos, cuadro de cargas, cálculo de regulación. los demás cálculos que se requieran los debe completar el contratista, debe entregar memorias y planos firmados.

21. ITEM 8.12.04 Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condiciones de servicio para la conexión del proyecto, presentación del proyecto ante el operado de red y aprobación del proyecto, conexión.

22. ITEM 10.09 LISTÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 3000 PSI, dimensiones según diseño, incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad. LISTÓN INFERIOR H: 10cm, ancho igual al muro retrocedido el espesor del pañete.

23. ITEM 10.11 Muro Superboard 10mm Acabado 2 caras + Aislante Tipo Sonowall o similar

24. ITEM 11.01.15 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA SHINGLE REFERENCIA DYNASTY O SIMILAR O MEJOR CALIDAD color a definir, incluye Caballetes, machimbre de 9mm, manto asfaltico sin foil, perfiles de inicio y corta gotera, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

25. ITEM 13.04.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN MADERA CHOIBA 1" x 3" CEPILLADA, distanciados cada 9 cm (sobre madera y elementos en concreto según diseño), incluye inmunizado, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

26. ITEM 14.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA BATIENTE DE MADERA MARCO EN NISPERO O SIMILAR DE 2" x 4" Y TABLERO EN CHOIBA DE 1" x 4" MADERA CEPILLADA según diseños, marco, contramarco, 3 perfiles de baranda incrustados al marco, todo inmunizado, parales, herrajes, bisagras,

elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

27. ITEM 14.06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA BATIENTE DE MADERA MARCO EN NISPERO O SIMILAR DE 2" x 4" Y TABLERO EN CHOIBA DE 1" x 4" MADERA CEPILLADA según diseños, marco, contramarco, todo inmunizado, parales, herrajes, bisagras, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.

28. ITEM 14.08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS DE MADERA MARCO EN NISPERO O SIMILAR DE 2" x 4" Y TABLERO EN CHOIBA 1" x 4" MADERA CEPILLADA según diseños, acabado en pintura tipo esmalte, todo inmunizado, parales, herrajes, elementos de sujeción, protección con laca poro abierta tipo Profilan natural a dos manos.


29. ITEM 15.03.02 BARANDA, PASAMANOS EN TUBO CERRAMIENTO 2", TRES TUBOS DE 1/2" PLATINAS VERTICALES, acabado pintura electrostática negra, fijación a piso y pared con platinas y tornillos para metal (Según diseño)

30. ITEM 16.04 CERROJO DE SOBREPONER MATE YALE, STANLEY O SCHLAGE, incluye tres llaves, montaje, accesorios, materiales, mano de obra, herramientas y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento

31. ITEM 18.08 APLICACIÓN DE DOS MANOS de esmalte para madera o metal. Para muros interiores y exteriores, incluye filos, dilataciones y alturas menores a 1.00 m; incluye todos elementos, materiales, equipos y mano de obra requerida para su correcta ejecución

Teniendo en cuenta las observaciones y/o inconsistencias que hemos identificado en esta fase previa para el inicio del contrato, respetuosamente solicitamos a la entidad, aclarar, complementar y/o corregir la información técnica, para poder hacer los despieces, pedidos de materiales, anticipos, etc, necesarios para la iniciación del contrato.

Cordialmente,



Arq. Hawer Alberto Herrera Rodríguez
Representante Legal
H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S

MINCULTURA-CONT-/- N°03/2025

Ibagué, 14 de agosto de 2025

Señores
Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes
Grupo de Infraestructura Cultural del Ministerio
Bogotá, D C.

REF: *CONTRATO DE OBRA "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, DERIVADOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y/O SENTENCIAS (LOTE 3)".*

Asunto: *Solicitud de aclaraciones y/o correcciones de la información técnica publicada por la entidad para la ejecución del contrato. (Nóvita).*


Respetuoso saludo

En el proceso de revisión de la información técnica que reposa en el proceso contractual, hemos encontrado numerosas inconsistencias entre las especificaciones técnicas, el presupuesto y los planos, así como falta de información necesaria para desarrollar el contrato, por lo que de manera respetuosa solicitamos aclaración, complementación y ampliación de las observaciones a continuación relacionadas.


A continuación, se relacionan dichas observaciones:

OBSERVACIONES


1. En los planos arquitectónicos, específicamente en los detalles de corte fachada, no se evidencia las cotas correspondientes a Los distanciamientos entre las correas de la cubierta

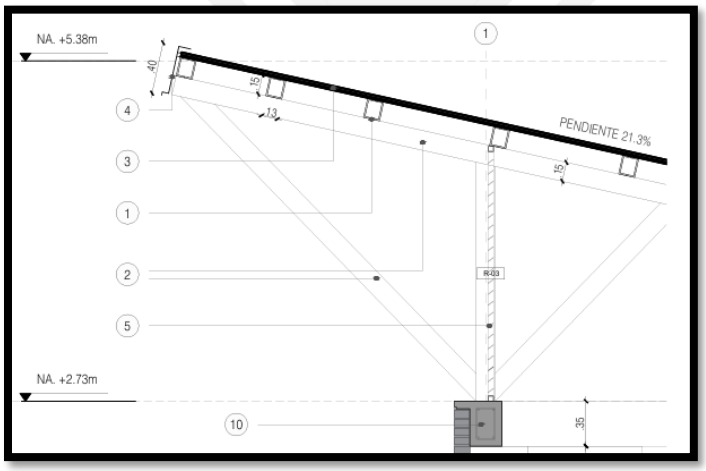


2. las medidas y distancias relacionadas entre ejes el PLANO GENERAL y el PLANO ESTRUCTURAL, no coinciden en los siguientes puntos:
    - *DISTANCIA ENTRE EJES 1-2*
    - *DISTANCIA ENTRE EJES 2-3*
    - *DISTANCIA ENTRE EJES 5-6*
    - *DISTANCIA ENTRE EJES 6-7*
    - *DISTANCA ENTRE EJES C-D*
    - *DISTANCIA ENTRE EJES D-E*

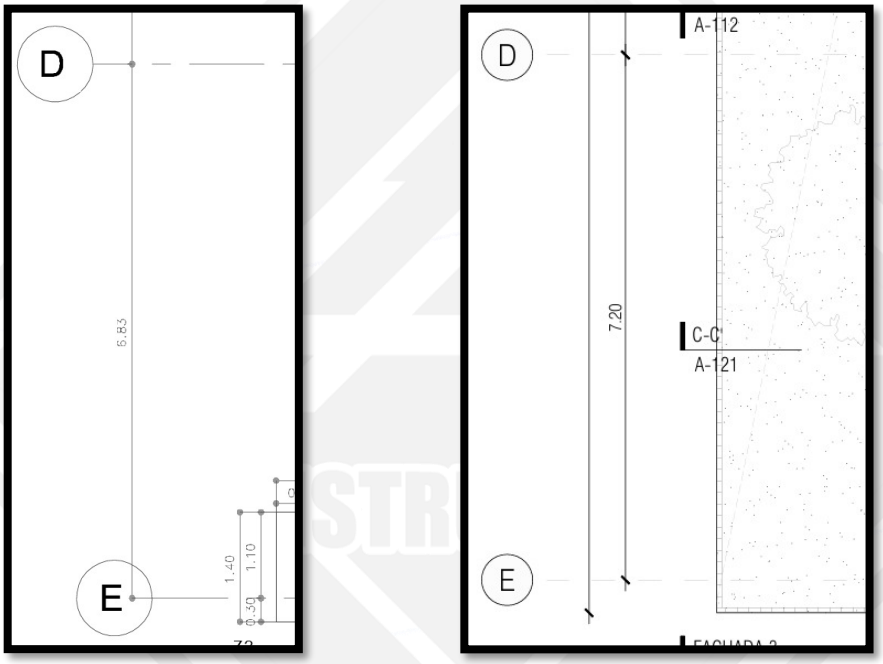


3. en los planos estructurales se evidencia un error en la viga 207, provocando problemas en la futura ejecución de la obra

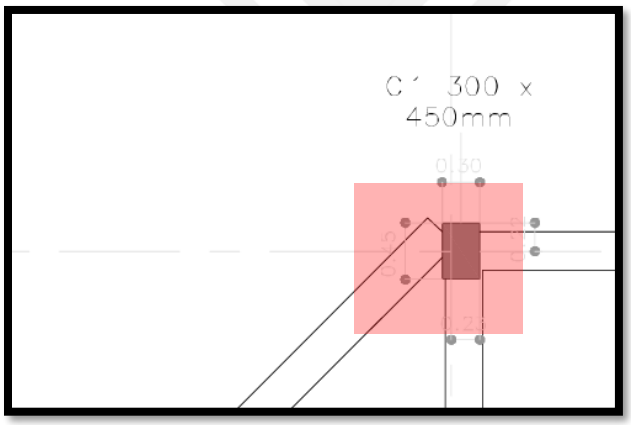

4. en el plano arquitectónico se evidencia la ausencia de columnas que se encuentran presentes en el plano estructural

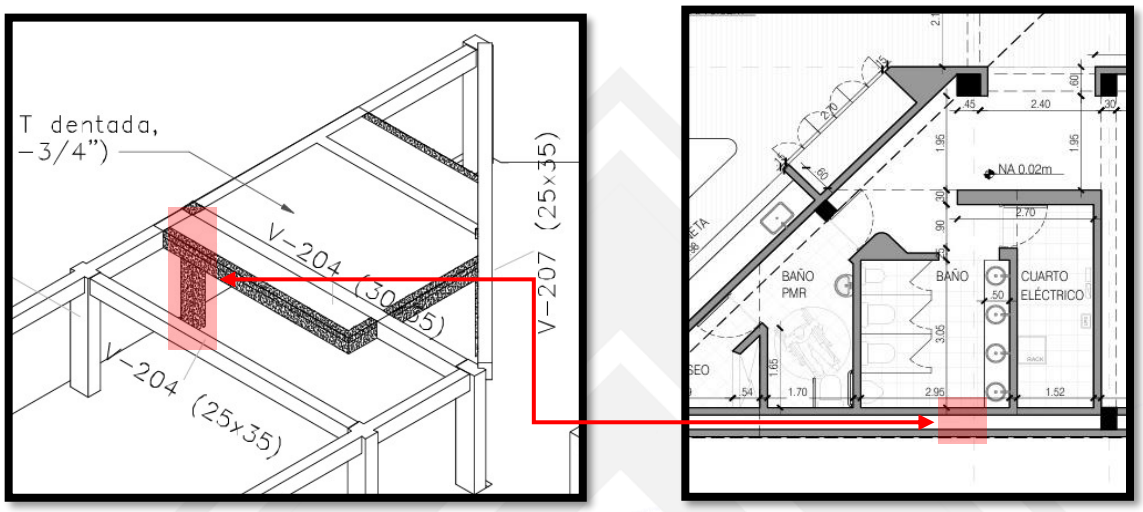


5. en el plano arquitectónico y estructural hay discrepancias entre las medidas de algunas columnas, no es claro cuales deberían ser las medidas ya que no coinciden

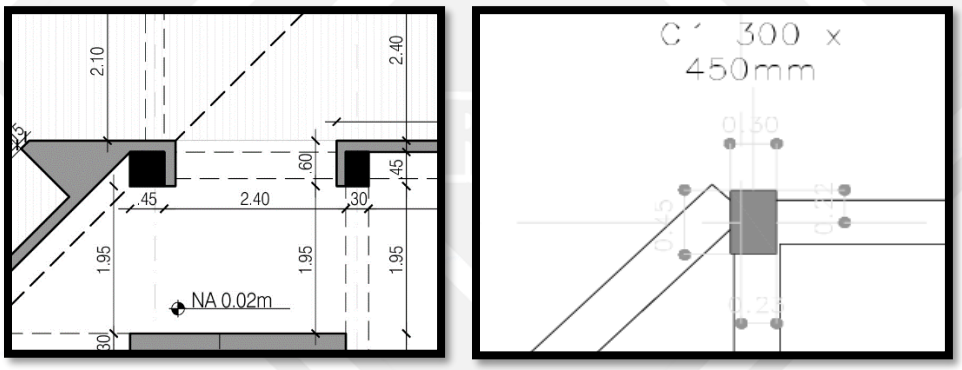

6. En el consolidado de planos estructurales no se encuentra en detalles E-104 – E-105




7. En el presupuesto se relacionan 6 tanque s de almacenamiento de 2.000 litros y 1 de 5.000 litros pero en los planos arquitectónicos e redes hidráulicas solo se evidencian 4 tanques de 2.000 litros

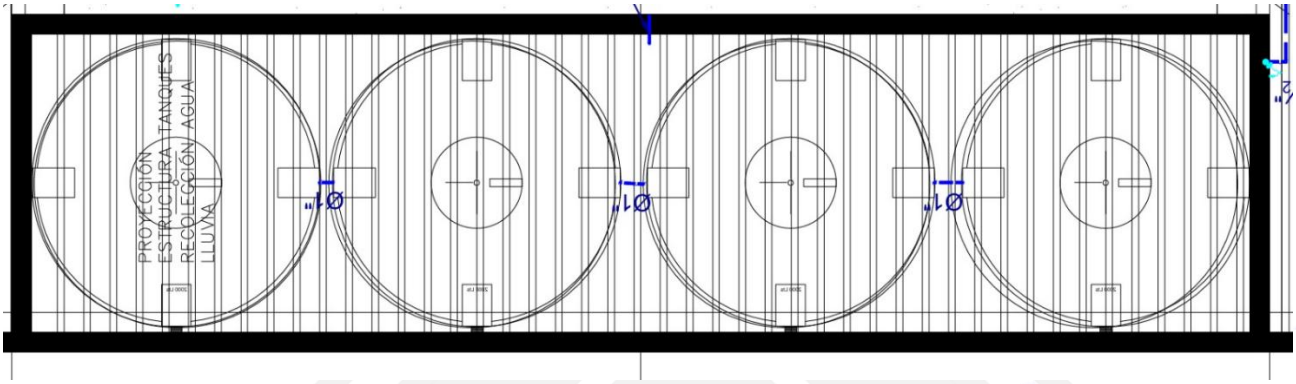


8. *En el paquete de planos eléctricos encontramos que los siguientes planos no contienen la información correspondiente:*
   - *PLANO DE REDES*
   - *PLANO DE VENTILACIÓN*
   - *PLANO DE RED DE DATOS*

9. *En el plano eléctrico de la iluminación no se tiene evidencia de la ubicación de los diferentes interruptores y tipo de interruptores necesarios*

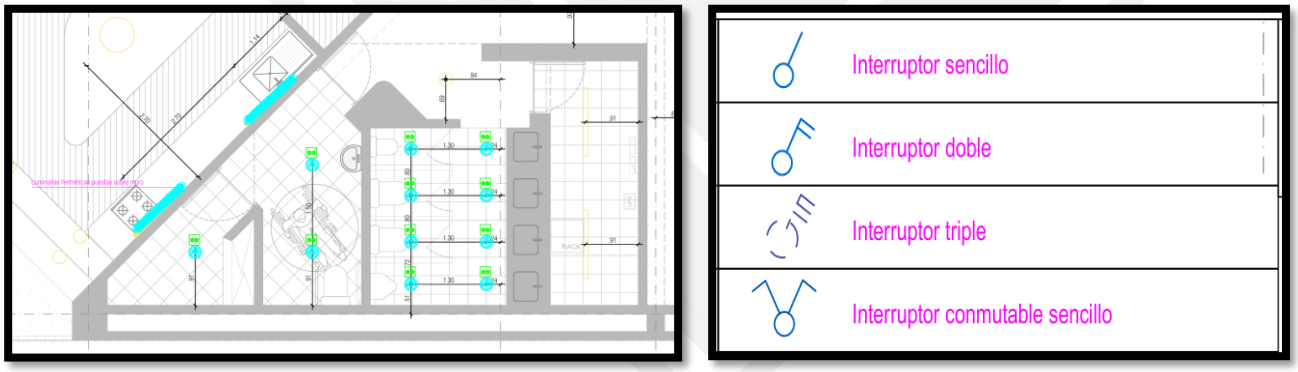


10. *En los detalles de la zapata hace falta información correspondiente a los aceros de refuerzo, no se especifica la separación de los flejes, no tiene la suficiente información para la ejecución constructiva*

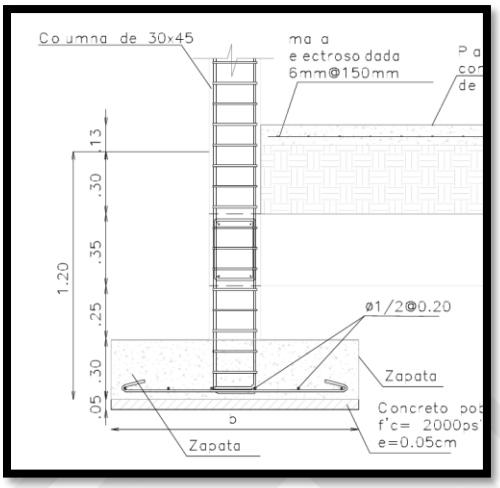


11. *En el mismo detalle tampoco se especifica la información del refuerzo de la columna, no se referencia la distancia entre flejes, no es claro sobre las especificaciones de estos refuerzos*

12. *En planta de ubicación de columnas se evidencian errores en los dibujos de las vigas, creando confusiones y evidenciando que el plano no es claro*

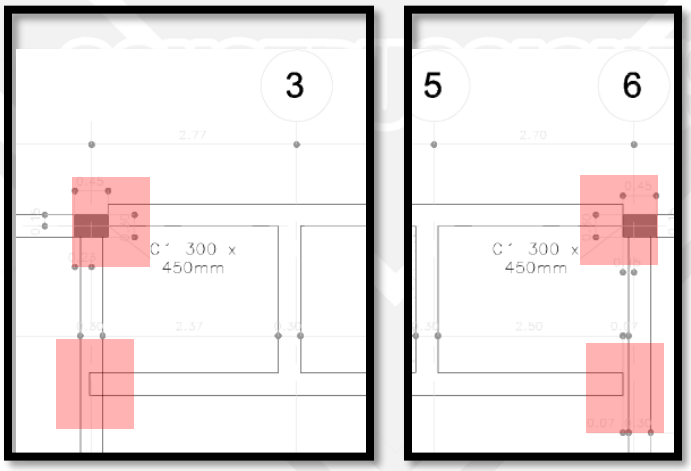


13. *Revisando todos los planos estructurales, no se encuentra ningún detalle sobre las vigas de cimentación o vigas aérea, no hay especificaciones sobre sus refuerzos, se hace necesaria esta información para la ejecución del proyecto*


14. *En los planos arquitectónicos no se evidencian cotas respecto a los espacios interiores, medidas de circulaciones etc.*

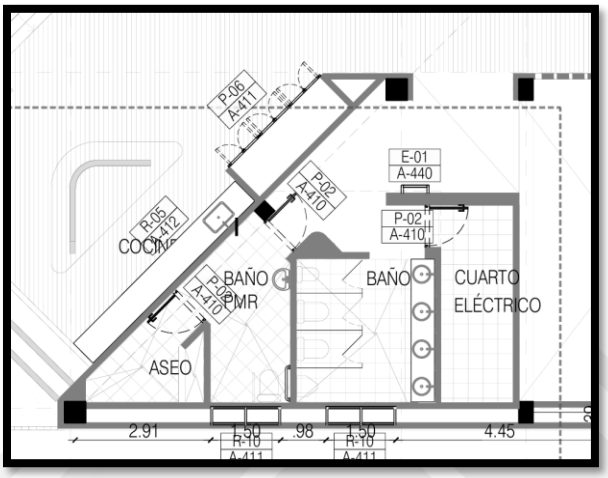


15. *En los planos arquitectónicos no es clara la ventanería del proyecto, no se evidencia la ubicación de las ventanas o aberturas de iluminación y ventilación*

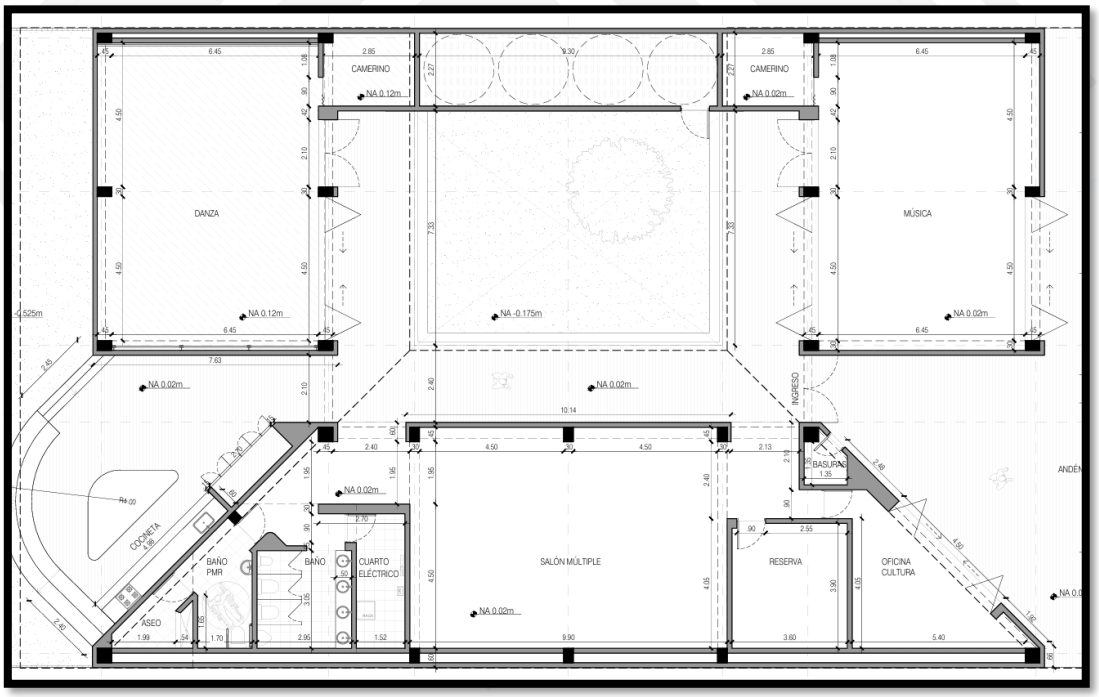

16. *En los planos eléctricos no se puede contrastar las distancias de cableado o tubería con respecto al presupuesto oficial, ya que en los planos no se tienen estas distancias ni referencias al respecto.*

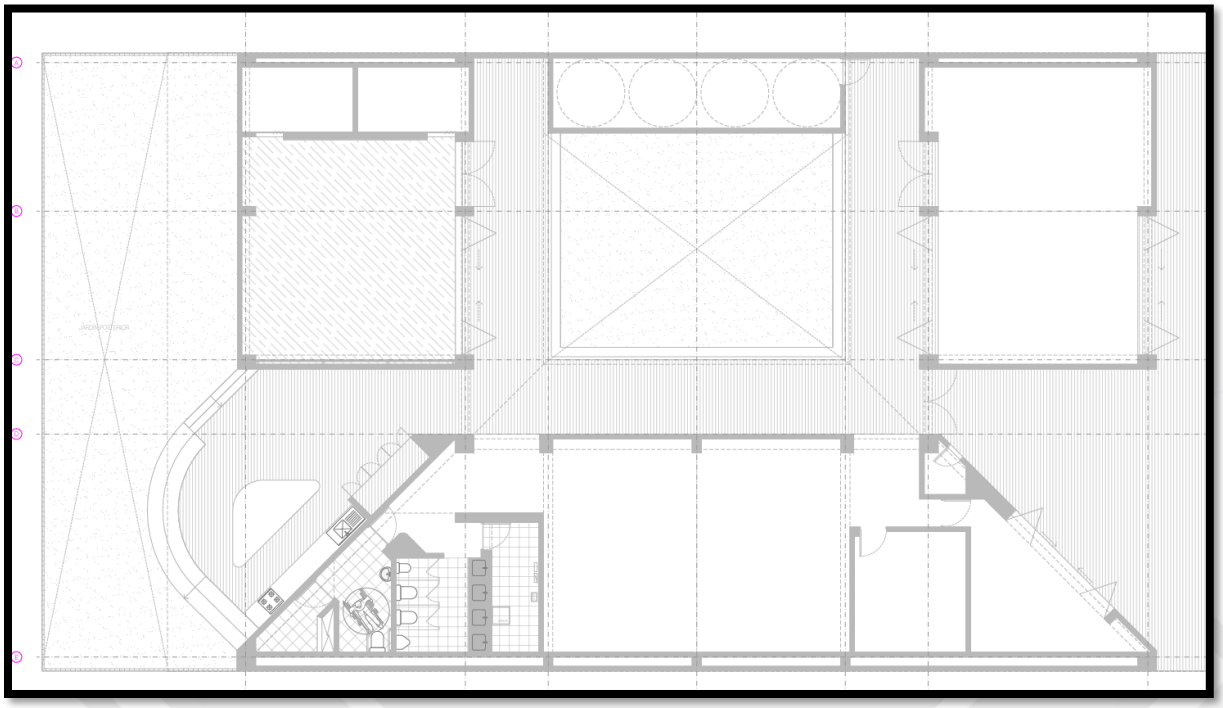

17. *En los planos hidrosanitarios no se tienen detalles de la caja totalizadora*

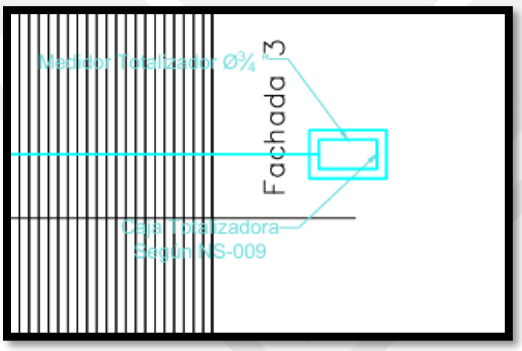

18. *En los planos de aguas residuales no se encuentran detalles respecto a las cajas de inspección y tampoco se encuentran acotadas con sus respectivas dimensiones*



19. *En el consolidado de planos eléctricos tampoco se encuentra ubicado en tablero de distribución normal y regulado*

20. *Según presupuesto oficial se tienen contempladas mas de 6 cajas de inspección y tipo sumidero, pero en los planos hidrosanitarios solo se logran observar 6 pero no están acotadas ni especificadas sobre a cual corresponde cada una, es necesario aclarar las faltantes, su ubicación y sus detalles*

7.01	CAJAS, POZOS, CARCAMOS		
7.01.01	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	2,00
7.01.02	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	4,00
7.01.03	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.	u	2,00
7.01.04	CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m. tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	4,00

Página 2

OBSERVACIONES A LOS APU'S / PRESUPUESTO

1. Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por nuestra parte con respecto a los precios que la entidad toma en el concreto para el frente de juradó, podemos evidenciar también que en el frente de novita también presentado un desfase que se relaciona a continuación

CAPITULO:	1	APU BÁSICOS			
ÍTEM:		CONCRETO 3,000 PSI PREPARADO EN SITIO			UNIDAD: M3

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIEN	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 7.204,55	1,00	$ 7.204,55
VIBRADOR DE CONCRETO	H	$ 15.000,00	0,75	$ 11.250,00
MEZCLADORA DIESEL	H	$ 22.500,00	0,90	$ 20.250,00
				$ 38.704,55

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
CEMENTO GRIS	kg	$ 640,00	400	$ 256.000,00
ARENA LAVADA DE PEÑA	m3	$ 218.076,00	0,4	$ 87.230,40
AGUA	L	$ 10,00	190	$ 1.900,00
GRAVA 1"	m3	$ 170.200,00	0,6	$ 102.120,00
				$ 447.250,40

C. MANO DE OBRA


CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIEN	VALOR UNITARIO
AA	CUADRILLA AA (Albañilería)	1	hc	$ 31.700,00	0,22	$ 144.090,91
						$ 144.090,91

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIEN	VALOR UNITARIO
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (%		$ 5.000,00	1,0	$ 5.000,00
				$ 5.000,00

		PRECIO OFICIAL	DESFASE	
TOTAL PRECIO UNITARIO:	$ 635.045,85	$ 433.071,00	-$ 201.974,85	-46,64%

2. Por otra parte, se observa en el presupuesto que para los elementos estructurales se toma en consideración un concreto de 4.000PSI pero revisando y haciendo un análisis de prueba con concreto de 3.500 PSI evidenciamos que hay desbalances económicos en todos los precios relacionados a:
    - Zapatas
    - Columnas
    - Vigas
    - Placas de Piso
    - Escaleras

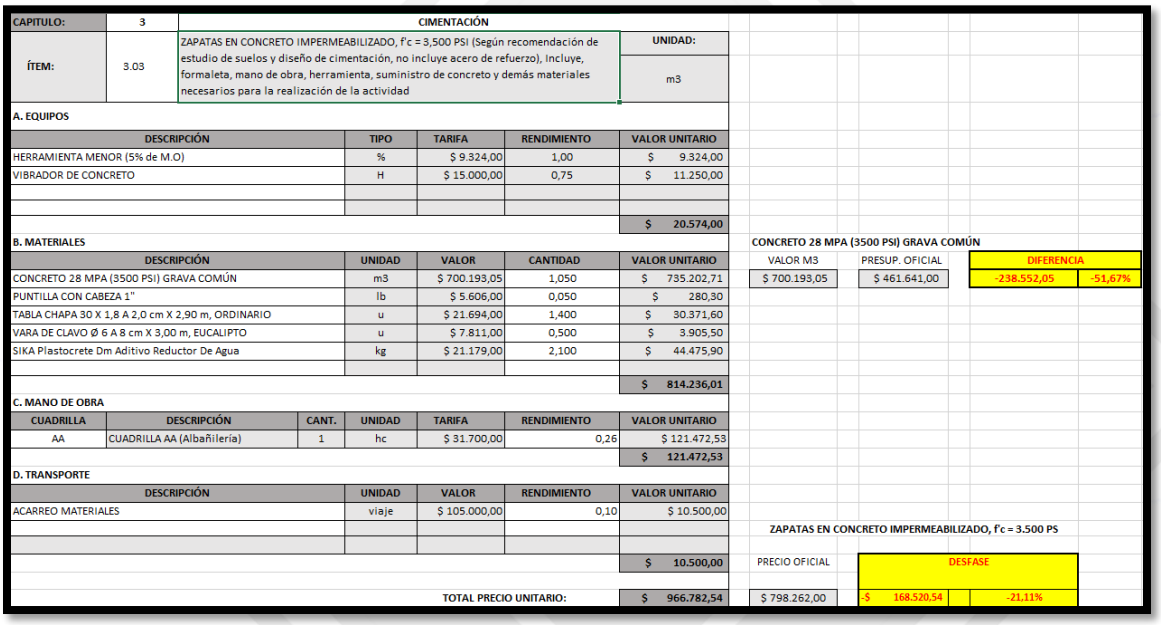

CAPITULO:	3	CIMENTACIÓN			
ÍTEM:	3.03	ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3,500 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad			UNIDAD: m3

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 9.324,00	1,00	$ 9.324,00
VIBRADOR DE CONCRETO	H	$ 15.000,00	0,75	$ 11.250,00
				$ 20.574,00

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
CONCRETO 28 MPA (3500 PSI) GRAVA COMÚN	m3	$ 700.193,05	1,050	$ 735.202,71
PUNTILLA CON CABEZA 1"	lb	$ 5.606,00	0,050	$ 280,30
TABLA CHAPA 30 X 1,8 A 2,0 cm X 2,90 m, ORDINARIO	u	$ 21.694,00	1,400	$ 30.371,60
VARA DE CLAVO Ø 6 A 8 cm X 3,00 m, EUCALIPTO	u	$ 7.811,00	0,500	$ 3.905,50
SIKA Plastocrete Dm Aditivo Reductor De Agua	kg	$ 21.179,00	2,100	$ 44.475,90
				$ 814.236,01

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
AA	CUADRILLA AA (Albañilería)	1	hc	$ 31.700,00	0,26	$ 121.472,53
						$ 121.472,53

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
ACARREO MATERIALES	viaje	$ 105.000,00	0,10	$ 10.500,00
				$ 10.500,00
		TOTAL PRECIO UNITARIO:		$ 966.782,54


CONCRETO 28 MPA (3500 PSI) GRAVA COMÚN

VALOR M3	PRESUP. OFICIAL	DIFERENCIA	
$ 700.193,05	$ 461.641,00	-238.552,05	-51,67%

ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, f'c = 3.500 PS

PRECIO OFICIAL	DESFASE	
$ 798.262,00	-$ 168.520,54	-21,11%

3. Solicitamos amablemente a la entidad aclararnos la exigencia del ítem 6.01.01 ya que en los detalles de la cubierta podemos ver que la entidad propone una tubería estructural de 180x65 mm pero revisando con proveedores podemos observar lo poco comercial que esta tubería, esto podría causar retrasos en el momento de la ejecución

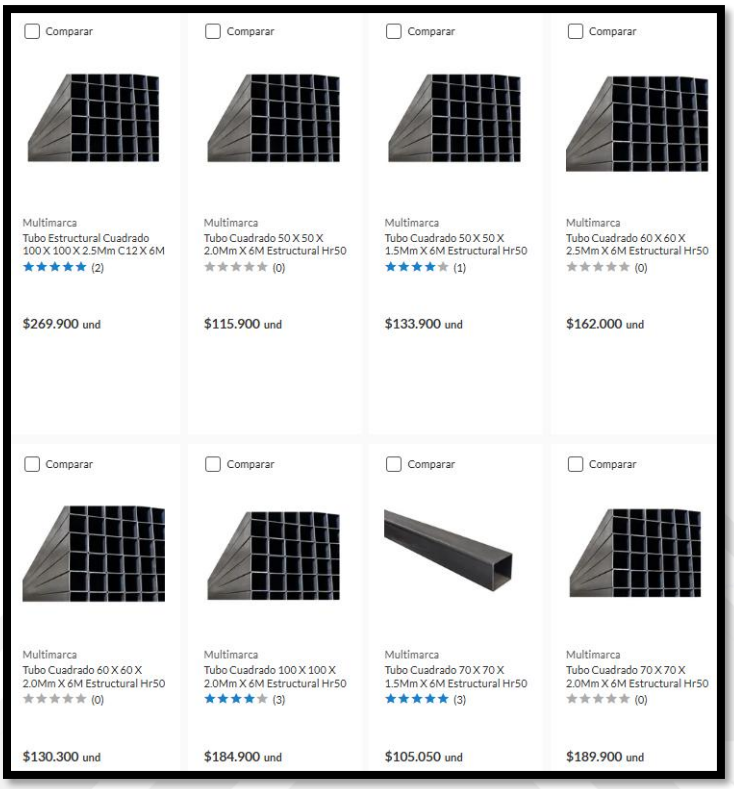

4. Adicionalmente en los ítems de estructura metálica, podemos evidenciar que en el presupuesto oficial mencionan la pintura anticorrosiva pero no logramos evidenciar que se haya contemplado en los APU'S elaborados por la entidad, esto genera un desbalance en la concepción del ítem ya que hay exigencias que la entidad no contempló

PROYECTO:		MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE NOVITA, CHOCÓ	
CAPITULO:	6	ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA	
ÍTEM:	6.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. ASTM A653 SS-GR 50, incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	UNIDAD: kg

A. EQUIPOS


DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 233,00	1,00	$ 233,00
ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL 1.40 X 3.00 ALTURA 2.00 M - ALQUILER	día	$ 17.868,00	0,10	$ 1.787,00
EQUIPO DE SOLDADURA 220 AMP. ELÉCTRICO	día	$ 52.413,00	0,01	$ 524,00
				$ 2.544,00

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 653 SS-GR 50	kg	$ 5.663,00	1,050	$ 5.946,00
WASH PRIMER A PINTURA	gl	$ 115.560,00	0,010	$ 1.156,00
PINTURA ESMALTE A BASE DE ACEITE (PARA METAL O MADERA)	gl	$ 82.241,00	0,010	$ 822,00
SOLDADURA ELÉCTRICA E6013	kg	$ 27.900,00	0,050	$ 1.395,00
CEPILLO DE GRATA CON 64 PINCELES DE 3.2 CM LARGO 27 CM	u	$ 17.013,00	0,010	$ 170,00

5. Solicitamos amablemente a la entidad en lo posible de reenviarnos el APU correspondiente al ítem 8.03.01 que contempla el suministro e instalación de tablero en lamina cold rolled pero en el APU suministrado por la entidad no se evidencia el

desglose de costos de los elementos del tablero, ya que con los otros tableros si se desglosa

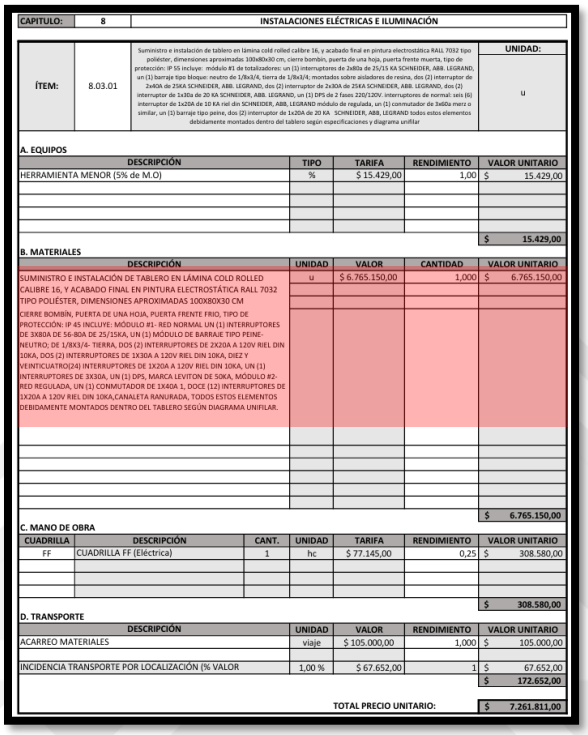

CAPITULO:	8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	
ÍTEM:	8.03.01	Suministro e instalación de tablero en lámina coldrolled calibre 16, y acabado final en pintura electrostática RALL 7032 tipo poliéster, dimensiones aproximadas 100x80x30 cm, cierre bombín, puerta de una hoja, puerta frente muerta, tipo de protección: IP 55 incluye: módulo #1 de totalizadores: un (1) interruptores de 2x80a de 25/15 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) barraje tipo bloque: neutro de 1/8x3/4, tierra de 1/8x3/4; montados sobre aisladores de resina, dos (2) interruptor de 2x40A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 2x30A de 25KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, dos (2) interruptor de 1x30a de 20 KA SCHNEIDER, ABB. LEGRAND, un (1) DPS de 2 fases 220/120V. interruptores de normal: seis (6) interruptor de 1x20A de 10 KA riel din SCHNEIDER, ABB, LEGRAND módulo de regulada, un (1) conmutador de 3x60a mero o similar, un (1) barraje tipo peine, dos (2) interruptor de 1x20A de 20 KA. SCHNEIDER, ABB, LEGRAND todos estos elementos debidamente montados dentro del tablero según especificaciones y diagrama unifilar	UNIDAD: u

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 15.429,00	1,00	$ 15.429,00
				$ 15.429,00

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 16, Y ACABADO FINAL EN PINTURA ELECTROSTÁTICA RALL 7032 TIPO POLIÉSTER, DIMENSIONES APROXIMADAS 100X80X30 CM CIERRE BOMBÍN, PUERTA DE UNA HOJA, PUERTA FRENTE FRIO, TIPO DE PROTECCIÓN: IP 45 INCLUYE: MÓDULO #1- RED NORMAL UN (1) INTERRUPTORES DE 3X80A DE 56-80A DE 25/15KA, UN (1) MÓDULO DE BARRAJE TIPO PEINE-NEUTRO; DE 1/8X3/4- TIERRA, DOS (2) INTERRUPTORES DE 2X20A A 120V RIEL DIN 10KA, DOS (2) INTERRUPTORES DE 1X30A A 120V RIEL DIN 10KA, DIEZ Y VEINTICUATRO(24) INTERRUPTORES DE 1X20A A 120V RIEL DIN 10KA, UN (1) INTERRUPTORES DE 3X30A, UN (1) DPS, MARCA LEVITON DE 50KA, MÓDULO #2- RED REGULADA, UN (1) CONMUTADOR DE 1X40A 1, DOCE (12) INTERRUPTORES DE 1X20A A 120V RIEL DIN 10KA,CANALETA RANURADA, TODOS ESTOS ELEMENTOS DEBIDAMENTE MONTADOS DENTRO DEL TABLERO SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR.	u	$ 6.765.150,00	1,000	$ 6.765.150,00
				$ 6.765.150,00


C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
FF	CUADRILLA FF (Eléctrica)	1	hc	$ 77.145,00	0,25	$ 308.580,00
						$ 308.580,00

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
ACARREO MATERIALES	viaje	$ 105.000,00	1,000	$ 105.000,00
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR	1,00 %	$ 67.652,00	1	$ 67.652,00
				$ 172.652,00
			TOTAL PRECIO UNITARIO:	$ 7.261.811,00

6. En el ítem 8.08.06 podemos ver un error en la estructuración del presupuesto de novita ya que en el presupuesto establecen un valor unitario de **$123.319** a un ítem que está valorado en más de **$1.000.000**, como se puede ver en el presupuesto de Juradó, esto se debe por que en el APU no contemplaron el valor del poste que sobre pasa el valor por mas de **$950.000** solicitamos a la entidad revisar y hacer el ajuste correspondiente

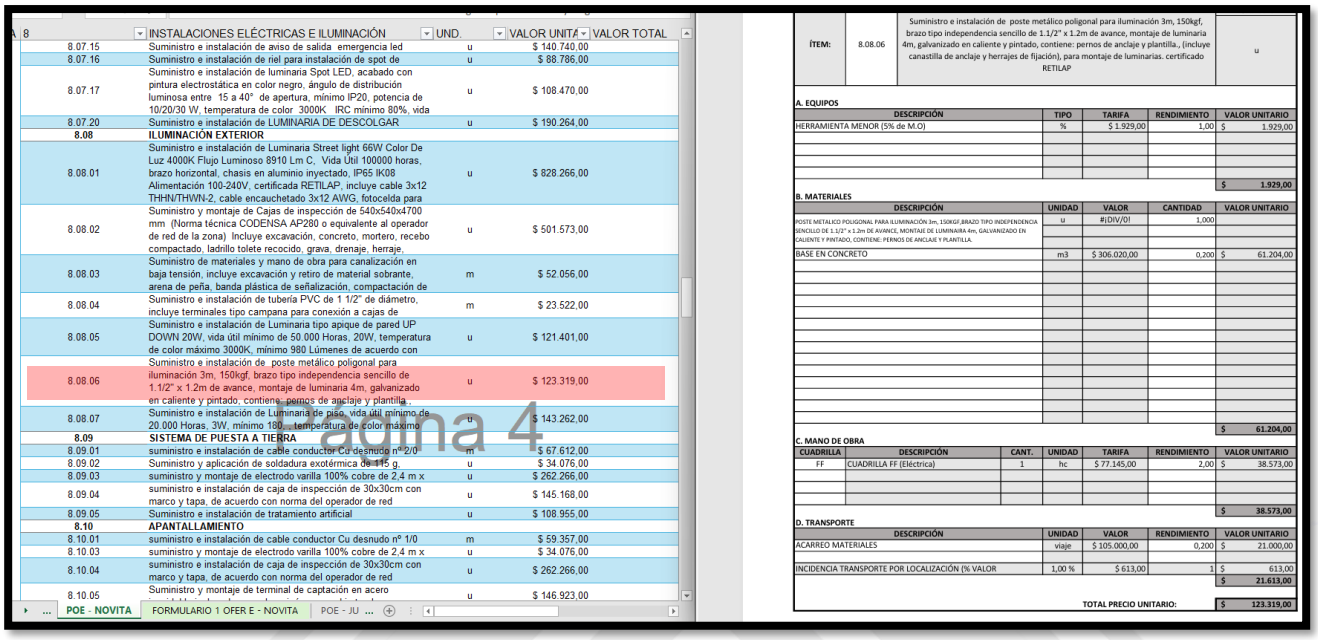

8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN	UND.	VALOR UNITA	VALOR TOTAL
8.07.15	Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led	u	$ 140.740,00	
8.07.16	Suministro e instalación de riel para instalación de spot de	u	$ 88.786,00	
8.07.17	Suministro e instalación de luminaria Spot LED, acabado con pintura electrostática en color negro, ángulo de distribución luminosa entre 15 a 40° de apertura, mínimo IP20, potencia de 10/20/30 W, temperatura de color 3000K IRC mínimo 80%, vida	u	$ 108.470,00	
8.07.20	Suministro e instalación de LUMINARIA DE DESCOLGAR	u	$ 190.264,00	
8.08	ILUMINACIÓN EXTERIOR			
8.08.01	Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Color De Luz 4000K Flujo Luminoso 8910 Lm C, Vida Útil 100000 horas, brazo horizontal, chasis en aluminio inyectado, IP65 IK08 Alimentación 100-240V, certificada RETILAP, incluye cable 3x12 THHN/THWN-2, cable encauchetado 3x12 AWG, fotocelda para	u	$ 828.266,00	
8.08.02	Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4700 mm (Norma técnica CODENSA AP280 o equivalente al operador de red de la zona) Incluye excavación, concreto, mortero, recebo compactado, ladrillo tolete recocido, grava, drenaje, herraje,	u	$ 501.573,00	
8.08.03	Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de	m	$ 52.056,00	
8.08.04	Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diámetro, incluye terminales tipo campana para conexión a cajas de	m	$ 23.522,00	
8.08.05	Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared UP DOWN 20W, vida útil mínimo de 50.000 Horas, 20W, temperatura de color máximo 3000K, mínimo 980 Lúmenes de acuerdo con	u	$ 121.401,00	
8.08.06	Suministro e instalación de poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf, brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla.,	u	$ 123.319,00	
8.08.07	Suministro e instalación de Luminaria de paso, vida útil mínimo de 20.000 Horas, 3W, mínimo 180 temperatura de color máximo	u	$ 143.262,00	
8.09	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA			
8.09.01	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 2/0	m	$ 67.612,00	
8.09.02	Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g.	u	$ 34.076,00	
8.09.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x	u	$ 262.266,00	
8.09.04	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 145.168,00	
8.09.05	Suministro e instalación de tratamiento artificial	u	$ 108.955,00	
8.10	APANTALLAMIENTO			
8.10.01	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0	m	$ 59.357,00	
8.10.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x	u	$ 34.076,00	
8.10.04	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 262.266,00	
8.10.05	Suministro y montaje de terminal de captación en acero	u	$ 146.923,00	

POE - NOVITA | FORMULARIO 1 OFER E - NOVITA | POE - JU ...

ÍTEM:	8.08.06	Suministro e instalación de poste metálico poligonal para iluminación 3m, 150kgf, brazo tipo independencia sencillo de 1.1/2" x 1.2m de avance, montaje de luminaria 4m, galvanizado en caliente y pintado, contiene: pernos de anclaje y plantilla., (incluye canastilla de anclaje y herrajes de fijación), para montaje de luminarias. certificado RETILAP	u

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 1.929,00	1,00	$ 1.929,00
				$ 1.929,00

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
POSTE METALICO POLIGONAL PARA ILUMINACIÓN 3m, 150KGF,BRAZO TIPO INDEPENDENCIA SENCILLO DE 1.1/2" x 1.2m DE AVANCE, MONTAJE DE LUMINARIA 4m, GALVANIZADO EN CALIENTE Y PINTADO, CONTIENE: PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA.	u	#¡DIV/0!	1,000	
BASE EN CONCRETO	m3	$ 306.020,00	0,200	$ 61.204,00
				$ 61.204,00

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
FF	CUADRILLA FF (Eléctrica)	1	hc	$ 77.145,00	2,00	$ 38.573,00
						$ 38.573,00

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
ACARREO MATERIALES	viaje	$ 105.000,00	0,200	$ 21.000,00
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR	1,00 %	$ 613,00	1	$ 613,00
				$ 21.613,00
			TOTAL PRECIO UNITARIO:	$ 123.319,00

aoma 4

7. En el ítem 8.10.03 del frente de novita debemos informar a la entidad que hay inconsistencias en la estructuración, debido a que el APU que suministra la entidad para el item no tiene nada que ver con la actividad a ejecutar y menos su costo, ya que en el presupuesto podemos observar lo siguiente:

8.10	**APANTALLAMIENTO**		
8.10.01	suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº 1/0	m	$ 59.357,00
8.10.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x	u	$ 34.076,00
8.10.04	suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm con marco y tapa, de acuerdo con norma del operador de red	u	$ 262.266,00
8.10.05	Suministro y montaje de terminal de captación en acero inoxidable incluye base en hormigón para cubierta plana, o	u	$ 146.923,00
8.10.06	suministro y montaje de anillo superior para sistema de captación en alambrón de aluminio desnudo 8 mm de diámetro, incluye	m	$ 40.730,00
8.10.07	suministro e instalación de caja plástica para empalme SIPRA, IP 65 incluye caja plástica, conector bimetálico, platina en cobre, conector de cobre, accesorios de fijación y demás consumibles	u	$ 123.104,00
8.11	**VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN**		
8.11.01	Suministro e instalación salida eléctrica en muro (2,0m aprox) embebida en muro para ventiladores a instalar en pared, incluye salida en tubería PVC 3/4 (instalación embebido), cable No 12	u	$ 151.904,00

la entidad establece como valor unitario para el **ITEM 8.10.03** un costo de **$34.076** y los justifican con el siguiente APU, en el cual solo se esta contemplando una soldadura exotérmica.

PROYECTO:	MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE NOVITA, CHOCÓ
CAPITULO: 8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM:	8.10.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	UNIDAD: u

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 772,00	1,00	$ 772,00
				$ 772,00

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
SOLDADURA EXOTERMICA 115 GRS THERMOWELD #115	u	$ 17.594,00	1,000	$ 17.594,00
				$ 17.594,00

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
FF	CUADRILLA FF (Eléctrica)	1	hc	$ 77.145,00	5,00	$ 15.429,00
						$ 15.429,00

D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
ACARREO MATERIALES	viaje	$ 105.000,00	0,001	$ 105,00
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR	1,00 %	$ 176,00	1	$ 176,00
				$ 281,00
		TOTAL PRECIO UNITARIO:		$ 34.076,00

Por otra parte, si revisamos los APU'S del mismo ítem pero de otros frentes de trabajo, evidenciamos el verdadero valor del ítem, por ende tanto en novita como juradó el ítem debe ser ajustado al valor real el cual corresponde **$265.009**

PROYECTO:	MC-LPO-0001-2025 CENTRO CULTURAL DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
CAPITULO: 8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN

ÍTEM:	8.10.03	suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8", incluye excavación y retiro de material	UNIDAD: u

A. EQUIPOS

DESCRIPCIÓN	TIPO	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR (5% de M.O)	%	$ 1.929,00	1,00	$ 1.929,00
				$ 1.929,00

B. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
VARILLA TIERRA 14.00MM X 2.4 MT 100% COBRE	u	$ 219.464,00	1,000	$ 219.464,00
				$ 219.464,00

C. MANO DE OBRA

CUADRILLA	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	TARIFA	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
FF	CUADRILLA FF (Eléctrica)	1	hc	$ 77.145,00	2,00	$ 38.573,00
						$ 38.573,00


D. TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR	RENDIMIENTO	VALOR UNITARIO
ACARREO MATERIALES	viaje	$ 105.000,00	0,001	$ 105,00
INCIDENCIA TRANSPORTE POR LOCALIZACIÓN (% VALOR	1,50 %	$ 3.292,00	1,5	$ 4.938,00
				$ 5.043,00
		TOTAL PRECIO UNITARIO:		$ 265.009,00

Agradezco se sirvan estudiar esta situación, para encontrar los mecanismos que permitan la posibilidad de ajustes y/o revisiones para restablecer el equilibrio que debe prevalecer en toda relación contractual.

Agradezco la atención y estudio a la presente solicitud y quedo atento a la respuesta formal.

Cordialmente,



_____

Arq. Hawer Alberto Herrera Rodríguez
Representante Legal
H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S


ALERTA EN JURADÓ
COMUNICADO DE PRENSA
Con respuestas a las fuertes lluvias que se vienen presentando en el territorio, desde la alcaldía municipal de Juradó, emitimos la alerta temprana por la inundación y posible desbordamiento de los ríos: Juradó, Jampabadó y Curiche.
Invitamos a las comunidades cercanas a estos ríos a estar atentos y activos a cualquier variación de sus caudales.
Les agradecemos su atención.
Alcaldía de Juradó
Gestión de Riesgo y Desastres Municipal
#PuroCorazónPorJuradó

Entidad Estatal

MINCULTURA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Proveedor Seleccionado

H.A.H CONSTRUCCIONES S.A.S

COLOMBIA, Ibagué

0 Recomendación (es)

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Hawer Herrera *Fecha de aprobación:* 29/07/2025 10:51:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: Oscar Javier Fonseca Gómez *Fecha de aprobación:* 29/07/2025 5:54:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_8115644_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_8115644_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Licitación pública (Obra pública)
Unidad de contratación	GRUPO DE CONTRATOS Y CONVENIOS
Proceso de Contratación	Construcción de infraestructuras culturales a Nivel Nacional, derivados de compromisos asumidos por el Gobierno Nacional y/o Sentencias (Fase de Selección (Presentación de ofertas))
Título de la oferta	MC-LPO-0001-2025 - H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.
Cuantía del contrato	2.636.845.211,00 COP

REGISTRO SEMANAL DE LLUVIAS

Proyecto / Obra:	CENTRO CULTURAL DE JURADO
Ubicación:	JURADO - CHOCO
Semana del:	27 AL 31 DE OCTUBRE 2025
Contratista:	HAH CONSTRUCCIONES S.A.S


CONVENCIONES DE CLASIFICACIÓN


	Lluvia suave	Llovizna ligera o intermitente
	Lluvia moderada	Constante de corta o media duración
	Lluvia fuerte	Intensa o prolongada

Día de la semana	Fecha	Hora	Clasificación	Mañana	Clasificación	Tarde	Clasificación	Noche	Total (Sí)	Suave	Moderada	Fuerte
Lunes	27 DE OCTUBRE 2025	11: 00am - 1:00 pm y 3:00 pm a 4:00pm	Fuerte	Sí	Moderada	Sí	Fuerte	Sí	3	0	1	2
Martes	28 DE OCTUBRE	7:00 am (Todo el dia) Inundación	Moderada	Sí	Fuerte	Sí	Fuerte	Sí	3	0	1	2
Miércoles	29 DE OCTUBRE	10:00 am - 2:00 pm	Fuerte	Sí	Fuerte	No	Fuerte	Sí	2	0	0	2
Jueves	30 DE OCTUBRE	7:00 am Lluvias leves - 9:00 am	Suave	Sí	Suave	No	Suave	Sí	2	2	0	0
Viernes	31 DE OCTUBRE	2:00 pm Lluvias fuertes hasta la noche	Fuerte	No	Fuerte	Sí	Fuerte	Sí	2	0	0	2

Jornada	Jornadas con lluvia (✓)	Jornadas sin lluvia (X)	Observaciones
Mañana	4	1	
Tarde	3	2	
Noche	5	0	
Totales	12	3	

Gráfico: Frecuencia de lluvia por día

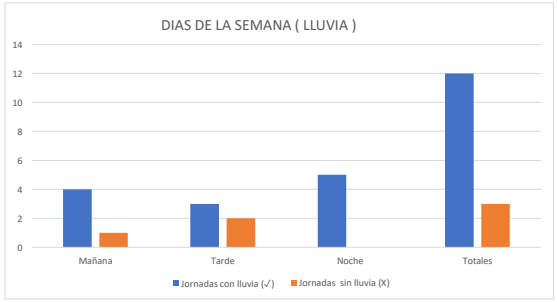

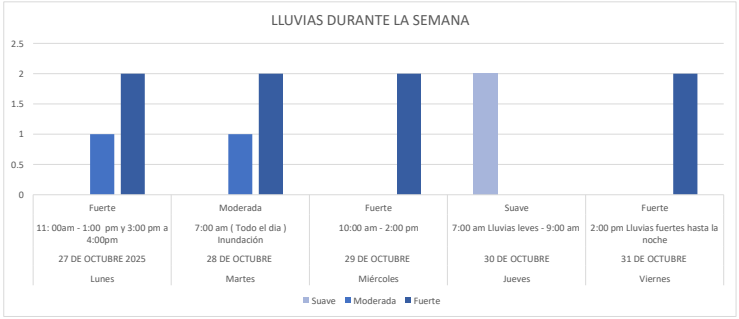

REGISTRO SEMANAL DE LLUVIAS

Proyecto / Obra:	CENTRO CULTURAL DE JURADO
Ubicación:	JURADO - CHOCO
Semana del:	1 AL 7 DE NOVIEMBRE 2025
Contratista:	HAH CONSTRUCCIONES S.A.S


CONVENCIONES DE CLASIFICACIÓN


Lluvia suave	Llovizna ligera o intermitente
Lluvia moderada	Constante de corta o media duración
Lluvia fuerte	Intensa o prolongada

Día de la semana	Fecha	Hora	Clasificación	Mañana	Clasificación	Tarde	Clasificación	Noche	Total (Sí)	Suave	Moderada	Fuerte
Sábado	1 DE NOVIEMBRE	11:00 am - 2:00 pm	Fuerte	Sí	Fuerte	Sí	Fuerte	No	2	0	0	2
Domingo	2 DE NOVIEMBRE	9:00 am - 10:00 am	Moderada	Sí	Moderada	No	Moderada	Sí	2	0	2	0
Lunes	3 DE NOVIEMBRE	3:00 pm - 5:00 pm	Suave	No	Fuerte	Sí	Moderada	Sí	2	0	1	1
Martes	4 DE NOVIEMBRE	11:00 am - 1:00 pm	Moderada	Sí	Suave	No	Suave	Sí	2	2	2	0
Miercoles	5 DE NOVIEMBRE	Lluvia en la noche	Fuerte	No	Fuerte	No	Fuerte	Sí	1	0	0	1
Jueves	6 DE NOVIEMBRE	11:30 am - 12:30 pm	Moderada	Sí	Moderada	No	Fuerte	No	1	0	1	0
Viernes	7 DE NOVIEMBRE	10:00 am - 11:00 am y 4:00 a 7:00 pm	Fuerte	Sí	Fuerte	Sí	Moderada	Sí	3	0	1	2

Jornada	Jornadas con lluvia (✓)	Jornadas sin lluvia (X)	Observaciones
Mañana	5	2	
Tarde	3	4	
Noche	5	2	
Totales	13	8	

Gráfico: Frecuencia de lluvia por día



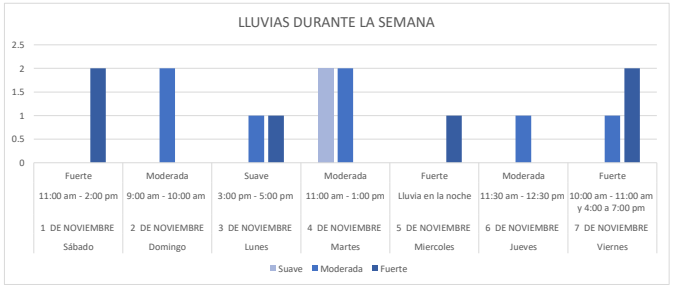

REGISTRO SEMANAL DE LLUVIAS

Proyecto / Obra:	CENTRO CULTURAL DE JURADO
Ubicación:	JURADO - CHOCO
Semana del:	8 AL 14 DE NOVIEMBRE 2025
Contratista:	HAH CONSTRUCCIONES S.A.S

CONVENCIONES DE CLASIFICACIÓN

Lluvia suave	Llovizna ligera o intermitente
Lluvia moderada	Constante de corta o media duración
Lluvia fuerte	Intensa o prolongada

Día de la semana	Fecha	Hora	Clasificación	Mañana	Clasificación	Tarde	Clasificación	Noche	Total (Sí)	Suave	Moderada	Fuerte
Sábado	8 DE NOVIEMBRE	Tormenta Electica en la noche	Suave	No	Moderada	No	Fuerte	Sí	1	0	0	1
Lunes	10 DE NOVIEMBRE	11:00 am - 2:00 pm	Fuerte	Sí	Moderada	Sí	Moderada	Sí	3	0	2	1
Martes	11 DE NOVIEMBRE	3:20 pm - 5:30 pm	Suave	Sí	Moderada	Sí	Fuerte	Sí	3	1	1	1
Miercoles	12 DE NOVIEMBRE	11:00 am - 3:00 pm y 4:00pm a 6:00 pm	Moderada	Sí	Fuerte	Sí	Fuerte	Sí	3	0	1	2
Jueves	13 DE NOVIEMBRE	8:00 am - 2:00 pm	Fuerte	Sí	Moderada	Sí	Fuerte	No	2	0	0	2
Viernes	14 DE NOVIEMBRE	-	Fuerte	No	Fuerte	No	Moderada	No	0	0	0	0

Jornada	Jornadas con lluvia (✓)	Jornadas sin lluvia (X)	Observaciones
Mañana	4	1	
Tarde	4	1	
Noche	4	1	
Totales	12	3	




Gráfico: Frecuencia de lluvia por día

