ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

Consorcio GS	CONSORCIO GS	**FECHA**	lunes, 14 de abril de 2025	**SEMANA No.**	**1**	DEL	**7-abr-25**	AL	**13-abr-25**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Municipio de Bojacá, Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CT0-242 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CT0-262 DE 2025
PLAZO INICIAL:	121 días	**PLAZO INICIAL:**	121 días
CONTRATISTA:	CONSORCIO GS	**CONTRATISTA:**	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	7 de abril de 2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	7 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	6 de agosto de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	6 de agosto de 2025
PLAZO ACTUALIZADO:	121 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	121 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	6 días (4,96%)	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	6 días (4,96%)
VALOR INICIAL :	$ 299.970.440	**VALOR INICIAL :**	$ 2.751.562.197
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 299.970.440	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 2.751.562.197
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 299.970.440	**VALOR POR PAGAR:**	$ 2.751.562.197
VALOR ANTICIPO:	$ 44.995.566	**VALOR ANTICIPO:**	$ 550.312.439
SUPERVISOR:	Ing. Laura Daniela Nieto Gutierrez	**SUPERVISOR:**	N/A

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana del presente Informe se adelantaron la siguiente actividades:

FECHA	ACTIVIDADES
26/03/2025	Reunión inicial en oficinas del ICCU entre Contratista de obra, Interventoría y Entidad.
1/04/2025	Recorrido Inicial por el tramo entre Contratista de Obra, Interventoría y Entidad.
7/04/2025	Revisión por parte de Interventoría de documentos contractuales a entregar por el Contratista: Hojas de vida personal mínimo, Plan de inversión de anticipo, Presentación reunión de inicio.
	Mesa trabajo de revisión de presentación para reunión de inicio entre Contratista, Interventoría e ICCU.
	Firma de actas de Inicio del Contrato de obra y de Interventoría.
8/04/2025	Remisión de concepto con observaciones de las hojas de vida del Contratista (CGS-COR_BOJ-25-025), Concepto de revisión del Plan de inversión de anticipo del Contratista (CGS-COR_BOJ-25-027).
9/04/2025	Remisión del Concepto con observaciones del Plan de Calidad del Contratista (CGS-COR_BOJ-25-022), además se remitió apremio al Contratista por el Incumplimiento en las obligaciones previas al inicio de la obra (CGS-COR_BOJ-25-031)
	Se realizó la reunión de inicio con la comunidad, dicha reunión se realizó en el auditorio dela Casa de la Cultura del Municipio del Bojacá
10/04/2025	Recepción y revisión de atención de observaciones de las hojas de vida del Contratista, del Plan de Manejo Ambienta (PAGA) y de la Subsunción del PMT.
	Remisión de Concepto con observaciones de las obligaciones Contractuales iniciales como presentación de porcentaje de personal mínimo de mano de obra no calificada, Organigrama del Proyecto, Relación de equipo mínimo, Información sobre la ubicación del campamento, Informe detallado de salarios y tipos de vinculación. De igual forma se emitió concepto aprobatorio a la obligación respecto a la solicitud de personal disponible a la ARN. (CGS-COR_BOJ-25-029)
	Remisión de observaciones al Plan de Gerencia y al Cronograma del Proyecto. (CGS-COR_BOJ-25-032)
11/04/2025	Respuesta con copia a la Entidad, mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-034 a la solicitud de suspensión realizada por el Contratista de obra el 10/04/2025.
	Recepción e inicio de revisión de documentos: Modelo de valla, Subsanación de Hojas de vida de topógrafo y cadenero. Remisión de observaciones a las hojas de vida del personal de topografía (CGS-COR_BOJ-25-035)
	Remisión al ICCU de hoja de vida de Inspector de Interventoría (CGS-COR_BOJ-25-036)

A continuación se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida durante el periodo:

N°	Comunicado	Fecha del oficio	Remitente	Asunto	CGS	COPIA	Fecha de recibo	
							Fecha correo	Fecha Radicado
22	Ad-021	7-abr-25	C. PROESCO SAS	Subsanación de hojas de vida.	X		7/04/2025	7/04/2025
23	Ad-022	7-abr-25	C. PROESCO SAS	Acta de inicio	X		7/04/2025	7/04/2025
24	Ad-023	7-abr-25	C. PROESCO SAS	Plan de Inversion de Anticipo	X		7/04/2025	7/04/2025
25	Ad-024	7-abr-25	C. PROESCO SAS	Presentación Socialización	X		7/04/2025	7/04/2025
27	Correo electrónico	7-abr-25	ICCU	ACTA DE INICIO DE INT - SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS ICCU-CT0-242 DE 2025	X		7/04/2025	8/04/2025
28	Correo electrónico	7-abr-25	ICCU	ACTA DE INICIO DE CONTRATO DE OBRA - SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS ICCU-CT0-262 DE 2025		X	7/04/2025	8/04/2025
29	Ad-025	8-abr-25	C. PROESCO SAS	Inicio de actividad de topografía	X		8/04/2025	8/04/2025
30	Ad-026	8-abr-25	C. PROESCO SAS	DOCUMENTOS REQUERIDOS - Respuesta oficio CGS-COR_BOJ-25-015	X		8/04/2025	8/04/2025
31	Ad-027	8-abr-25	C. PROESCO SAS	Documentos iniciales	X		8/04/2025	9/04/2025
32	Ad-028	8-abr-25	C. PROESCO SAS	Contrato de Fiducia de Contratista	X		8/04/2025	9/04/2025
33	Ad-029	10-abr-25	C. PROESCO SAS	Subsanación de Hojas de Vida	X		10/04/2025	10/04/2025
34	Ad-030	10-abr-25	C. PROESCO SAS	Solicitud de Suspensión	X		10/04/2025	10/04/2025
35	Ad-031	10-abr-25	C. PROESCO SAS	subsanación Plan de Manejo Ambiental - PAGA	X		10/04/2025	10/04/2025
36	Ad-032	10-abr-25	C. PROESCO SAS	SUBSANACION PMT	X		10/04/2025	11/04/2025
37	Ad-033	11-abr-25	C. PROESCO SAS	MODELO VALLA	X		11/04/2025	11/04/2025
38	Ad-034	11-abr-25	C. PROESCO SAS	Apreciaciones punto 1, del Oficio CGS-COR_BOJ-25-029	X		11/04/2025	11/04/2025
39	Ad-035	11-abr-25	C. PROESCO SAS	documentos requeridos	X		11/04/2025	11/04/2025
40	Correo electrónico	11-abr-25	C. PROESCO SAS	SUBSANACION DE HOJAS DE VIDA - HV Cadenero	X		11/04/2025	11/04/2025
41	Ad-036	11-abr-25	C. PROESCO SAS	Respuesta OFI-162-0023-2025 - Respuesta alcaladía	X		11/04/2025	11/04/2025

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	POR	DIRIGIDO A
9-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-022	Respuesta a su comunicado Ad-019. Observaciones al plan de calidad.	MCH	C. PROESCO SAS
7-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-023	Remisión de actas de inicio correspondientes a los contratos No. ICCU-CTO-242 de 2025 y CTO-ICCU-262 de 2025.	AAQ	C. PROESCO SAS
7-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-024	Solicitud de remisión presentación correspondiente para la reunión de inicio de obra.	AAQ	C. PROESCO SAS
8-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-025	Respuesta a sus comunicados Ad-021 y Ad-019. Subsanación de hojas de vida profesionales del Contratista y presentación de las hojas de vida del inspector vial.	MCH	C. PROESCO SAS
8-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-027	Respuesta a su comunicado Ad-022. Concepto de revisión del plan de inversión de anticipo.	MCH	C. PROESCO SAS
8-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-028	Respuesta a su comunicado Ad-025. Inicio de actividades de topografía.	MCH	C. PROESCO SAS
10-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-029	Respuesta a su comunicado Ad-026. Documentos iniciales.	MCH	C. PROESCO SAS
9-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-030	Alcance al oficio de Interventoría CGS-COR_BOJ-25-028 del 8 de abril de 2025. Respuesta a su comunicado Ad-025. Inicio de actividades de topografía	MCH	C. PROESCO SAS
9-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-031	Apremio por incumplimiento en las obligaciones previo al inicio de las obras del contrato ICCU-CTO-262 de 2025.	MCH	C. PROESCO SAS
10-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-032	Respuesta a su comunicado Ad-011. Observaciones al plan de gerencia del contratista y comunicado Ad-027 - Programación de obra	MCH	C. PROESCO SAS
11-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-033	Respuesta a su comunicado Ad-026. Observaciones a los APUs contractuales remitidos por el Contratista. 2da Revisión.	MCH	C. PROESCO SAS
11-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-034	Respuesta a su comunicado Ad-030. Solicitud suspensión.	AAQ	C. PROESCO SAS
11-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-035	Respuesta a sus comunicados Ad-029. Subsanación de hojas de vida.	MCH	C. PROESCO SAS
11-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-036	Su comunicado 20250404. Remisión de hoja de vida de inspector de obra, aclaración de dedicación profesional gestor social y solicitud de concepto hoja de vida Ing. Apoyo.	MCH	ICCU

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por	**Fecha Final por actividad	Días		
	A la fecha no se cuenta con Cronograma de Obra Aprobado. El Cronograma de obra fue entregado por el Contratista mediante comunicado Ad-027 del 9 de abril de 2025, y fue observado por Interventoría mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-032 del 10 de abril de 2025. Sin respuesta del Contratista a la fecha.								

Plazo del proyecto: 1 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	0,00%	0,00%	0,00%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

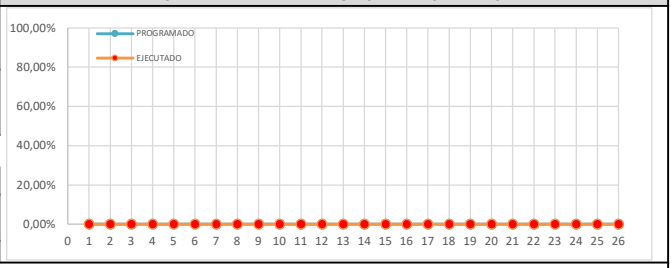

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
121	7,00	114	0,00

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

0%


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- Durante el periodo del presente informe, se revisó el Plan de Gestión Ambiental (PAGA) remitido por el Contratista mediante el comunicado AD-011 del 31 de marzo de 2025, lo cual fue observado por esta Interventoría mediante el oficio CGS-COR_BOJ-25-018 del 4 de abril de 2025.

Posteriormente, el Contratista envió respuesta a las observaciones formuladas, mediante el comunicado AD-031 del 10 de abril de 2025. A la fecha, dicho documento se encuentra en proceso de revisión por parte de la Interventoría.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Se realizó la reunión de socialización del proyecto con la comunidad en el auditorio de la Casa de la Cultura del municipio de Bojacá. El evento contó con la presencia de autoridades locales, entre ellas el Alcalde Municipal, el Secretario de Obras Públicas y varios Concejales, así como con la asistencia de miembros de la comunidad.

Durante la reunión se llevó a cabo la presentación general del proyecto, en la cual se expusieron los alcances, el valor, el plazo de ejecución, las empresas responsables de la obra y el equipo técnico a cargo. Adicionalmente, se atendieron inquietudes de la comunidad y de las autoridades locales, destacándose los siguientes temas:

- El inicio de las obras se programará posterior a la Semana Santa.

- Se deberá tener en cuenta, dentro del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la programación de horarios de trabajo y posibles cierres viales, especialmente en las franjas horarias de ingreso y salida de los habitantes del municipio.

- Se solicitó precaución en la disposición de materiales, especialmente en zonas destinadas a ciclorrutas y andenes peatonales.

- Se hizo especial énfasis en el manejo del material de recebo en la curva cercana al Colegio Fernando Borrero, debido a que este tiende a acumularse sobre la vía, generando riesgo para los usuarios.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

- Durante el período del presente informe, el Contratista solicitó a la Interventoría, mediante el comunicado AD-025 del 08 de abril de 2025, autorización para iniciar las actividades de topografía. La Interventoría, mediante los oficios CGS-COR_BOJ-25-028 y CGS-COR_BOJ-25-030 del 9 de abril de 2025, con copia a la Entidad, indicó al Contratista que, para dar inicio a dichas actividades, se requiere la presentación de la totalidad de la documentación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del personal que ejecutará las labores de campo. Asimismo, se precisó que no se autorizará el inicio de las actividades hasta tanto no se haya entregado dicha documentación, se cuente con el visto bueno de la Interventoría y se hayan aprobado las hojas de vida del personal. Al corte del 13 de abril de 2025, el Contratista no ha entregado la documentación requerida.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

- Los pliegos de la licitación pública ICCU-LP-039 de 2024, indicaban como factor de calidad:

1)IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS:

A corte del presente informe, el Contratista remitió la primera versión del Programa de Gerencia de Proyectos mediante Ad-011 del 31/03/2025, la Interventoría revisó y observó el documento mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-032 del 10/04/2025. En atención de observaciones de parte del Contratista.

2)PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO PARA EL PROYECTO:

A corte del presente informe, el Contratista remitió la primera versión del Plan de Calidad especifico para el Proyecto mediante Ad-009 del 28/03/2025, la Interventoría revisó y observó el documento mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-022 del 09/04/2025. En atención de observaciones de parte del Contratista.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

A la fecha no se cuenta con Cronograma de Obra Aprobado. El Cronograma de obra fue entregado por el Contratista mediante comunicado Ad-027 del 9 de abril de 2025, y fue observado por Interventoría mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-032 del 10 de abril de 2025. Sin respuesta del Contratista a la fecha.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

A la fecha no se han ejecutado trabajos de obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha no se han ejecutado trabajos de obra.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A la fecha no se han ejecutado trabajos de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

El Contratista no ha clasificado el proyecto según lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Modo Carretero, con el fin de determinar su tipo (1, 2, 3 o 4) y nivel de complejidad (baja, media-baja, media-alta o alta). Esta clasificación permitirá definir la pertinencia de elaborar un PAGA o, en su defecto, la aplicación de las medidas de manejo establecidas en la guía.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

A la fecha no se han ejecutado trabajos de obra, sin embargo a la fecha el Contratista no ha entregado la documentación requerida por la Interventoría, mediante los oficios CGS-COR_BOJ-25-028 y CGS-COR_BOJ-25-030 del 9 de abril de 2025, con copia a la Entidad, donde se indicó al Contratista de obra que, para dar inicio a dichas actividades, se requiere la presentación de la totalidad de la documentación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del personal que ejecutará las labores de campo. Asimismo, se precisó que no se autorizará el inicio de las actividades hasta tanto no se haya entregado dicha documentación, se cuente con el visto bueno de la Interventoría y se hayan aprobado las hojas de vida del personal. Al corte del 13 de abril de 2025, el Contratista no ha entregado la documentación requerida.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

A la fecha no se han ejecutado trabajos de obra, sin embargo a la fecha el Contratista no ha entregado la documentación requerida por la Interventoría, mediante los oficios CGS-COR_BOJ-25-028 y CGS-COR_BOJ-25-030 del 9 de abril de 2025, con copia a la Entidad, donde se indicó al Contratista de obra que, para dar inicio a dichas actividades, se requiere la presentación de la totalidad de la documentación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del personal que ejecutará las labores de campo. Asimismo, se precisó que no se autorizará el inicio de las actividades hasta tanto no se haya entregado dicha documentación, se cuente con el visto bueno de la Interventoría y se hayan aprobado las hojas de vida del personal. Al corte del 13 de abril de 2025, el Contratista no ha entregado la documentación requerida.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Durante el periodo del presente informe no se tuvieron problemáticas desde el componente social.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
A la fecha no se cuenta con Cronograma de Obra Aprobado. El Cronograma de obra fue entregado por el Contratista mediante comunicado Ad-027 del 9 de abril de 2025, y fue observado por Interventoría mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-032 del 10 de abril de 2025. Sin respuesta del Contratista a la fecha.	N.A.	N.A.

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha no se han ejecutado actividades de obra.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- Es importante señalar que, si bien el Contratista ha entregado versiones iniciales de la mayoría de los documentos requeridos contractualmente para el inicio del proyecto, estos no presentan la estructuración ni el contenido específico requerido para el proyecto. En su mayoría, se trata de documentos en versiones preliminares que han requerido múltiples revisiones por parte de la Interventoría.

Asimismo, se ha evidenciado que el Contratista atiende de manera parcial las observaciones realizadas, lo cual ha generado reprocesos y retrasos en la validación definitiva de la documentación técnica y administrativa necesaria para el inicio adecuado de las actividades de obra.

- De igual forma se han revisado las hojas de vida remitidas por el Contratista de obra, algunas hasta en 4 ocasiones, dado que el Contratista no realiza la atención integral de las observaciones, sin embargo mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-035 del 11/4/2025 y después de 5 revisiones, se logró la aprobación de todo el personal exceptuando la hoja de vida del Cadenero.

- El Contratista mediante comunicado Ad-025 realizó la solicitud del inicio de actividades de topografía. La Interventoría, mediante los oficios CGS-COR_BOJ-25-028 y CGS-COR_BOJ-25-030 del 9 de abril de 2025, con copia a la Entidad, indicó al Contratista que, para dar inicio a dichas actividades, se requiere la presentación de la totalidad de la documentación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del personal que ejecutará las labores de campo. Asimismo, se precisó que no se autorizará el inicio de las actividades hasta tanto no se haya entregado dicha documentación, se cuente con el visto bueno de la Interventoría y se hayan aprobado las hojas de vida del personal. Al corte del 13 de abril de 2025, el Contratista no ha entregado la documentación requerida.

- Mediante comunicado Ad-030 el Contratista solicitó la suspensión del Contrato de obra entre el 11/4/2025 al 22/4/2025 en consideración de lo siguiente:

"De acuerdo al "Plan Vigía: movilidad, seguridad y gestión del riesgo en Semana Santa", implementado por la Gobernación de Cundinamarca, el cual fue difundido el día de hoy por los diferentes medios de comunicación, solicito se articule el contrato en referencia en concordancia al plan, suspendiéndolo a partir del día 11 de abril del 2025 hasta el día martes 22 de los presentes, para garantizar el plan retorno.

Cabe resaltar que el Municipio de Bojacá, es reconocido como sitio de peregrinación religiosa vehicular, lo que en la semana mayor se incrementa la afluencia de manera considerable.
Lo anterior en aras de no contrariar la estrategia de movilidad, seguridad y gestión del riesgo departamental y municipal, y su vez, garantizar la correcta ejecución del contrato."

A esto la Interventoría mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-034 del 11 de abril de 2025, expuso el análisis técnico y jurídico a la solicitud realizada por el Contratista, y concluye que:

"En mérito de lo expuesto, esta Interventoría NO recomienda la aprobación de la suspensión solicitada, por cuanto:

•No se encuentra acreditado una causa válida de suspensión conforme al ordenamiento jurídico ni al clausulado contractual.
•El contratista cuenta con plena capacidad para continuar con las actividades sin que ello contraríe las medidas adoptadas por el Plan Vigía de la Gobernación de Cundinamarca para la temporada de semana santa.
•Proceder con la suspensión generaría una afectación a la eficiencia, legalidad y oportunidad en la ejecución del contrato."

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fotografía No. 1 - Medición de cunetas, recorrido del 1/04/2025



Fotografía No. 2 - Recorrido inicial en el tramo 1/04/2025



Fotografía No. 3 - Recorrido inicial en el tramo 1/04/2025



Fotografía No. 4 - Recorrido inicial en el tramo 1/04/2025



Fotografía No. 5 - Palabras del Alcalde de Bojacá en reunión de inicio del Proyecto.



Fotografía No. 6 - Presentación por parte de la Representante Legal del Contratista de Obra en reunión de Inicio del Proyecto.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Miguel Chunza Camelo
