ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

Consorcio GS	CONSORCIO GS	**FECHA**	28/04/2025	**SEMANA No.**	**3**	DEL	**21/04/2025**	AL	**27/04/2025**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Municipio de Bojacá, Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CT0-242 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CT0-262 DE 2025
PLAZO INICIAL:	121 días	**PLAZO INICIAL:**	121 días
CONTRATISTA:	CONSORCIO GS	**CONTRATISTA:**	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	7/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	7/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	6/08/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	6/08/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	121 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	121 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	20 días (16,53%)	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	20 días (16,53%)
VALOR INICIAL :	$ 299.970.440	**VALOR INICIAL :**	$ 2.751.562.197
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 299.970.440	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 2.751.562.197
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 299.970.440	**VALOR POR PAGAR:**	$ 2.751.562.197
VALOR ANTICIPO:	$ 44.995.566	**VALOR ANTICIPO:**	$ 550.312.439
SUPERVISOR:	Ing. Laura Daniela Nieto Gutierrez	**SUPERVISOR:**	N/A

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana del presente Informe se adelantaron la siguiente actividades:

FECHA	ACTIVIDADES
21/04/2025	**Recibo e inicio de revisión de documentos del Contratista:** Plan de Gerencia, Plan de Calidad, PAGA, Organigrama, Metodología, Equipo mínimo.
22/04/2025	**Remisión de conceptos de documentos del Contratista:** APUs Contractuales.
	Mesa de trabajo SST
23/04/2025	**Remisión de conceptos de documentos Contratista:** Organigrama, Equipo mínimo, Plan de gerencia, Cronograma, Manual SGSST, observaciones a Informe de personal del Contratista.
	Recibo e inicio de revisión de documentos Contratista: Plan de Gestión Social, Manual SGSST, Subsanación maquinaria y equipo tercera revisión.
	Remisión al ICCU de las cotizaciones de ensayos de laboratorio y del informe de presunto incumplimiento.
24/04/2025	Se continuo con la revisión de documentos.
25/04/2025	**Recibo e inicio de revisión de documentos del Contratista:** PMT y Organigrama
	Remisión de conceptos de documentos del Contratista: Plan de Gestión Social y PAGA.
	Comité Técnico de Seguimiento ICCU con la asistencia del Contratista, Interventoría y Entidad.
26/04/2025	**Recibo e inicio de revisión de documentos del Contratista:** Afiliaciones de personal
27/04/2025	Domingo.

A continuación se presenta la relación de correspondencia enviada y recibida durante el periodo:

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO
22-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-051	Respuesta a su comunicado Ad-040. Verificación a los APU´s contractuales remitidos por el Contratista. 4ta Revisión.
23-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-052	Respuesta a su comunicado Ad-045. Organigrama. - Segunda versión
23-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-053	Respuesta a su comunicado Ad-047. Equipo mínimo.
23-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-054	Remisión de Cotizaciones de Ensayos de Laboratorios.
23-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-055	Respuesta a su comunicado Ad-051. Respuesta Oficio - CGS-COR_BOJ-25-053 - Equipo mínimo.
24-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-056	Su comunicado Ad-054. Solicitud del Contratista de Obra de cambio de comité técnico presencial a virtual.
23-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-057	Observaciones al plan de gerencia del contratista y Programación de obra
23-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-058	Respuesta a su comunicado No. Ad-049. Observaciones al Manual SSTG - Tercera revisión
23-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-059	Respuesta a sus comunicados Ad-044 y Ad-053. Informe con nombre, salario y/u honorarios del personal mínimo requerido.
23-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-060	Respuesta a su comunicado Ad-052. Respuesta Oficio CGS-COR_BOJ-029 - Mano de obra no calificada
23-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-061	Envío de informe de presunto incumplimiento - Contrato ICCU-CT0-262 de 2025
25-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-062	Respuesta a su comunicado Ad-048. Revisión del Plan de Gestión Social.
25-abr-25	CGS-COR_BOJ-25-063	Respuesta a su comunicado Ad-043. tercera revisión del PAGA Contrato I

N°	Comunicado	Fecha del oficio	Remitente	Asunto
47	Ad-041	21-abr-25	C. PROESCO SAS	Entrega PMP
48	Ad-042	21-abr-25	C. PROESCO SAS	Respuesta comunicado CGS-COR_BOJ-25-22-Observaciones Plan de Calidad
49	Ad-043	21-abr-25	C. PROESCO SAS	PAGA
50	Ad-044	21-abr-25	C. PROESCO SAS	Informe con nombre, salario y/u honorarios del personal mínimo requerido
51	Ad-045	21-abr-25	C. PROESCO SAS	Organigrama
52	iccu-jud-001	21-abr-25	C. PROESCO SAS	Comunicado - Respuesta notificación inicio presunto incumplimiento
53	Ad-046	21-abr-25	C. PROESCO SAS	Documentos requeridos - Subsanación de la Metodología
54	Ad-047	21-abr-25	C. PROESCO SAS	SUBSANACIÓN EQUIPO MINIMO
55	20250421	21-abr-25	ICCU	Observación plan de anticipo
56	Ad-048	23-abr-25	C. PROESCO SAS	PLAN DE GESTION SOCIAL
57	Ad-049	23-abr-25	C. PROESCO SAS	SUBSANACIONES AL MANUAL SSTG
58	Ad-050	24-abr-25	C. PROESCO SAS	SOLICITUD - Remisión de APUs Firmados
59	Correoe electrónico	23-abr-25	C. PROESCO SAS	CONTRATO BORRADOR PARA FIDUCIA DE PALN DE ANTICIPO - Obs de la fiducia
60	Ad-051	23-abr-25	C. PROESCO SAS	Respuesta Oficio - CGS-COR_BOJ-25-053
61	Ad-052	23-abr-25	C. PROESCO SAS	OFICIO DE RESPUESTA - Vacantes APE
62	Ad-053	23-abr-25	C. PROESCO SAS	Personal minimo
63	Ad-054	24-abr-25	C. PROESCO SAS	comité técnico
64	Ad-055	25-abr-25	C. PROESCO SAS	RESPUESTA AL OFICIO CGS-COR_BOJ-25-052-49 - PMT
65	Ad-056	25-abr-25	C. PROESCO SAS	Respuesta a oficio CGS-COR_BOJ-25-052 - ORGANIGRAMA
66	Ad-057	26-abr-25	C. PROESCO SAS	Afiliaciones del personal minimo

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.1	Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).	7/04/2025	22/04/2025	15	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-52	-37
1.2	Demolición concreto estructural. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km).	23/04/2025	24/04/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-36	-35
2.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante.	25/04/2025	26/04/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-34	-33
2.2	Afirmado.	28/04/2025	29/04/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-31	-30
2.3	Sub base granular.	14/05/2025	17/05/2025	3	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-15	-12
2.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.	19/05/2025	20/05/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-10	-9
2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19. (Incluye cemento asfáltico).	21/05/2025	22/05/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-8	-7
2.6	Geotextil NT 2500.	30/04/2025	15/05/2025	15	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-29	-14
3.1	Cuneta de concreto Clase E, 3.500 psi con refuerzo en fibra	23/05/2025	6/08/2025	75	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-6	69

Plazo del proyecto: 122 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	11,00%	0,00%	-11,00%
Durante el periodo	8,00%	0,00%	-8,00%
Acumulado Actual	19,00%	0,00%	-19,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
121	21,00	100	-23,00

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

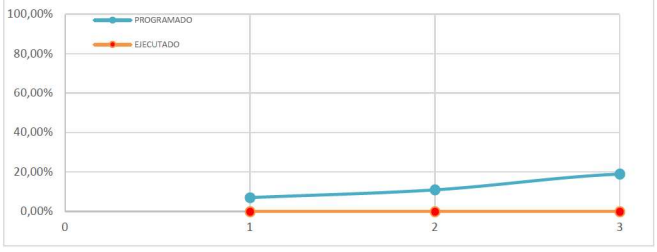

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

0%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

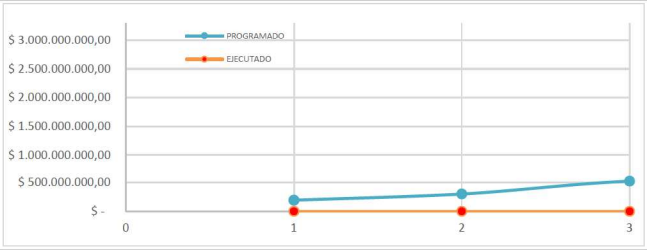


AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- El Plan de Gestión Ambiental (PAGA) remitido por el Contratista mediante el comunicado AD-011 del 31 de marzo de 2025, lo cual fue observado por esta Interventoría mediante el oficio CGS-COR_BOJ-25-018 del 4 de abril de 2025.

Posteriormente, el Contratista envió respuesta a las observaciones formuladas, mediante el comunicado AD-031 del 10 de abril de 2025. Dicho documento no se había atendido las observaciones realizadas, por consiguiente fue devuelto mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-045 del 16/04/2025.

- Durante el periodo del presente informe, se revisó el Plan de Gestión Ambiental (PAGA) remitido por el Contratista mediante el comunicado AD-043 del 21 de abril de 2025, lo cual fue observado por esta Interventoría mediante el oficio CGS-COR_BOJ-25-063 del 25 de abril de 2025.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

-Durante el periodo del presente informe el Contratista, remitio el Plan de Gestión Social en primera versión, mediante comunicado Ad-048 del 23/04/2025. La Interventoría una vez revisó el documento remitio mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-062 del 25/4/2025 observaciones al documento.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

- Durante el período del presente informe, se realizó el 21/04/2025, mesa de trabajo entre Contratista e Interventoría con el fin de socializar las observaciones, sin embargo a dicha mesa se presento una profesional la cual no era la aprobada por esta Interventoría, esta profesional es quien tomo la vocería para la socialización de parte del Contratista a lo que la Interventoría indico que si bien se entiendo que se tenga un apoyo, la interacción se haría con la profesional aprobada para el cargo.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

- Los pliegos de la licitación pública ICCU-LP-039 de 2024, indicaban como factor de calidad:

1)IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS:

A corte del presente informe, el Contratista remitió la primera versión del Programa de Gerencia de Proyectos mediante Ad-011 del 31/03/2025, la Interventoría revisó y observó el documento mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-032 del 10/04/2025. El Contratista remite la versión 2 del documento, remitiendo un documento completamente nuevo mediante Ad-041 del 21/04/2025, la Interventoríar mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-057 del 23/04/2025 emitio observaciones nuevas dado que este es un documento completamente nuevo.

2)PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO PARA EL PROYECTO:

A corte del presente informe, el Contratista remitió la primera versión del Plan de Calidad especifico para el Proyecto mediante Ad-009 del 28/03/2025, la Interventoría revisó y observó el documento mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-022 del 09/04/2025. El contratista remitio la atención a observaciones mediante comunicado Ad-042 del 22/04/2025, en revisión de Interventoría.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El Cronograma del Proyecto fue aprobado medainte oficio CGS-COR_BOJ-25-057 del 23/04/2025, sin embargo dado que no se ha dado inicio a las actividades de obra con motivo de que el Contratista no ha subsanado los documentos previos, así como que no ha remitido la documentación SST del personal, se cuenta con un atraso del 19% con corte al presente Informe. Razón por la cual esta Interventoría Solicitará al Contratista la remisión de un plan de Contingencia para subsanar el atraso presentado.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

A la fecha no se han ejecutado trabajos de obra.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha no se han ejecutado trabajos de obra.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A la fecha no se han ejecutado trabajos de obra.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (SI aplica)

El Contratista no ha clasificado el proyecto según lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura Modo Carretero, con el fin de determinar su tipo (1, 2, 3 o 4) y nivel de complejidad (baja, media-baja, media-alta o alta). Esta clasificación permitirá definir la pertinencia de elaborar un PAGA o, en su defecto, la aplicación de las medidas de manejo establecidas en la guía.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

A la fecha no se han ejecutado trabajos de obra, sin embargo a la fecha el Contratista no ha entregado la documentación requerida por la Interventoría, mediante los oficios CGS-COR_BOJ-25-028 y CGS-COR_BOJ-25-030 del 9 de abril de 2025, con copia a la Entidad, donde se indicó al Contratista de obra que, para dar inicio a dichas actividades, se requiere la presentación de la totalidad de la documentación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del personal que ejecutará las labores de campo. Asimismo, se precisó que no se autorizará el inicio de las actividades hasta tanto no se haya entregado dicha documentación, se cuente con el visto bueno de la Interventoría y se hayan aprobado las hojas de vida del personal. Al corte del 25 de abril de 2025, el Contratista no ha entregado la documentación requerida.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

A la fecha no se han ejecutado trabajos de obra, sin embargo a la fecha el Contratista no ha entregado la documentación requerida por la Interventoría, mediante los oficios CGS-COR_BOJ-25-028 y CGS-COR_BOJ-25-030 del 9 de abril de 2025, con copia a la Entidad, donde se indicó al Contratista de obra que, para dar inicio a dichas actividades, se requiere la presentación de la totalidad de la documentación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del personal que ejecutará las labores de campo. Asimismo, se precisó que no se autorizará el inicio de las actividades hasta tanto no se haya entregado dicha documentación, se cuente con el visto bueno de la Interventoría y se hayan aprobado las hojas de vida del personal. Al corte del 25 de abril de 2025, el Contratista no ha entregado la documentación requerida.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

Durante el periodo del presente informe no se tuvieron problemáticas desde el componente social.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Dado el atraso presentado por el no inicio de las actividades de obra, la Interventoría solicitará al Contratista el Plan de Contingencia, con el fin de que se subsane el atraso presentado.	Interventoría	2/05/2025

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha no se han ejecutado actividades de obra.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

- Es importante señalar que, si bien el Contratista ha entregado versiones iniciales de la mayoría de los documentos requeridos contractualmente para el inicio del proyecto, estos no presentan la estructuración ni el contenido específico requerido para el proyecto. a la fecha solo se cuenta con la aprobación de los APUs contractuales, el Cronograma para el proyecto y la relación de equipo mínimo.

Asimismo, se ha evidenciado que el Contratista atiende de manera parcial las observaciones realizadas, lo cual ha generado reprocesos y retrasos en la validación definitiva de la documentación técnica y administrativa necesaria para el inicio adecuado de las actividades de obra.


Por esta razón la Interventoría mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-061 del 23/04/2025, remitio a la Entidad el Informe de Presunto Incumplimiento del Contratista por la no entrega de la documentación para el inicio de la obra.

- A la fecha se cuenta con la aprobación de la totalidad de las hojas de vida del personal clave y mínimo del Contratista de obra.

- El Contratista mediante comunicado Ad-025 realizó la solicitud del inicio de actividades de topografía. La Interventoría, mediante los oficios CGS-COR_BOJ-25-028 y CGS-COR_BOJ-25-030 del 9 de abril de 2025, con copia a la Entidad, indicó al Contratista que, para dar inicio a dichas actividades, se requiere la presentación de la totalidad de la documentación en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) del personal que ejecutará las labores de campo. Asimismo, se precisó que no se autorizará el inicio de las actividades hasta tanto no se haya entregado dicha documentación, se cuente con el visto bueno de la Interventoría y se hayan aprobado las hojas de vida del personal. Al corte del 25 de abril de 2025, el Contratista no ha entregado la documentación requerida. A la fecha el Contratista de obra ha entregado la siguiente documentación SST de su personal:

Obligación	Cargo	Profesional propuesto	Revisiones de la HV xx	Estado Hojas de Vida	ESTADO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN SST									
					EPS	ARL	AFP	CCF	EPS	Contrato	EMO	EPP	Inducción	ESTADO SST
Personal Clave Evaluable	Director de Obra	Manuel Alberto Martínez Rodrígue	4	APROBADA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE
	Gerente de Proyectos	Oscar Andrés Pereira Garzón	3	APROBADA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE
	Residente de obra	Daniel Oswaldo Rodríguez Holguí	4	APROBADA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE
	Esp. Pavimentos	Teófilo Carlos Yidi Villareal	4	APROBADA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE
Personal mínimo adicional al Clave evaluable	Esp. Estructuras	Nelson Hernando Mendoza Arias	5	APROBADA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE
	Esp. Ambiental	Hency Alejandra Torres	3	APROBADA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE
	Esp. Hidráulico	Abelino García Guacaneme	3	APROBADA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE
	Gestor social	Francy Alejandra Becerra Fiallo	3	APROBADA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE
	Profesional SISO	Margarita Rosa Duarte Oyaga	4	APROBADA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE
	Inspector	Luz Karime Pacheco Llanes	3	APROBADA	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE
	Topógrafo	John Wilton Rico Saavedra	4	APROBADA	!	!	!	!	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE
	Cadenero	Camilo Andres Giraldo Medina	3	APROBADA	✓	!	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	PENDIENTE

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA

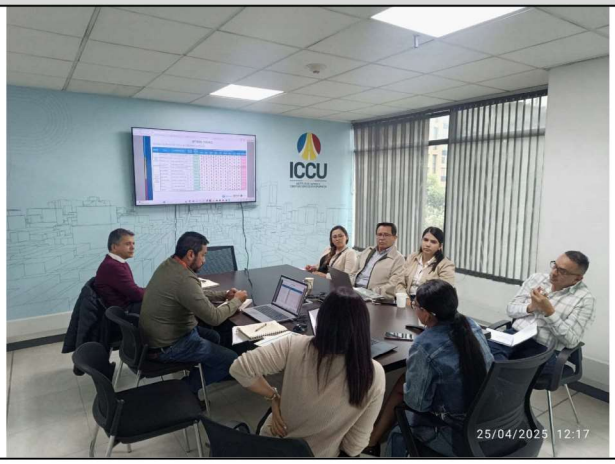

Comité técnico de Seguimiento ICCU - 25/04/2025



Reunión de Inicio del Proyecto con la Comunidad- 09/04/2025



Reunión de Inicio del Proyecto con la Comunidad- 09/04/2025



Reunión de Inicio del Proyecto con la Comunidad- 09/04/2025




Reunión de Inicio del Proyecto con la Comunidad- 09/04/2025

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Miguel Chunza Camelo


CONTRATO DE OBRA No. ICCU-262 DE 2025

Id	EDT	Nombre de tarea	Costo de línea base	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	% Programad	% completado
0		**MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**	**$ 2.751.562.197,01**	**99 días**	**lun 7/04/25**	**mié 6/08/25**		**19%**	**0%**
1		Acta de inicio	$ 0,00	0 días	lun 7/04/25	lun 7/04/25		100%	100%
2	**1**	**Capítulo 1. Explanación y Excavaciones.**	**$ 303.629.060,00**	**24 días**	**lun 7/04/25**	**mié 7/05/25**		**78%**	**0%**
3		Inicio capítulo 1	$ 0,00	0 días	lun 7/04/25	lun 7/04/25	1	100%	0%
4	1.1	Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5	$ 115.500.000,00	12 días	lun 7/04/25	mar 22/04/25	3	100%	0%
5	1.2	Demolición concreto estructural. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de	$ 5.555.460,00	2 días	mié 23/04/25	jue 24/04/25	4	100%	0%
6	1.3	Transporte de materiales prov. de explanación, canales, préstamos, sobreacarreos y	$ 182.573.600,00	22 días	mié 9/04/25	mié 7/05/25	4FC-10 días	64%	0%
7		Fin capítulo 1	$ 0,00	0 días	mié 7/05/25	mié 7/05/25	2	0%	0%
8	**2**	**Capítulo 2. Estructura de pavimento.**	**$ 592.604.544,01**	**23 días**	**jue 24/04/25**	**jue 22/05/25**		**8%**	**0%**
9		Inicio capítulo 2	$ 0,00	0 días	jue 24/04/25	jue 24/04/25	5	100%	0%
10	2.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante.	$ 4.195.740,00	2 días	vie 25/04/25	sáb 26/04/25	9	100%	0%
11	2.2	Afirmado.	$ 14.108.164,00	2 días	lun 28/04/25	mar 29/04/25	10	0%	0%
12	2.3	Sub base granular.	$ 355.265.000,00	4 días	mié 14/05/25	sáb 17/05/25	15FC-2 días;6	0%	0%
13	2.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.	$ 7.170.684,00	2 días	lun 19/05/25	mar 20/05/25	12	0%	0%
14	2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19. (Incluye cemento asfáltico).	$ 182.160.000,00	2 días	mié 21/05/25	jue 22/05/25	13	0%	0%
15	2.6	Geotextil NT 2500.	$ 29.704.956,00	13 días	mié 30/04/25	jue 15/05/25	11	0%	0%
16		Fin capítulo 2	$ 0,00	0 días	jue 22/05/25	jue 22/05/25	8	0%	0%
17	**3**	**Capítulo 3. Obras de arte y Estructuras de contención**	**$ 1.745.131.000,00**	**62 días**	**jue 22/05/25**	**mié 6/08/25**		**0%**	**0%**
18		Inicio capítulo 3	$ 0,00	0 días	jue 22/05/25	jue 22/05/25	14	0%	0%
19	3.1	Cuneta de concreto Clase E, 3.500 psi con refuerzo en fibra	$ 1.745.131.000,00	62 días	vie 23/05/25	mié 6/08/25	18	0%	0%
20		Fin capítulo 3	$ 0,00	0 días	mié 6/08/25	mié 6/08/25	17	0%	0%
21		Plan de manejo de tráfico	$ 32.358.982,00	99 días	lun 7/04/25	mié 6/08/25	3	16%	0%
22		Plan de adaptación de la guía ambiental	$ 27.838.611,00	99 días	lun 7/04/25	mié 6/08/25	21FC-99 días	16%	0%
23		Provisión para ajuste por posible variación costos en insumos	$ 50.000.000,00	99 días	lun 7/04/25	mié 6/08/25	22FC-99 días	16%	0%
24		Acta de terminación	$ 0,00	0 días	mié 6/08/25	mié 6/08/25	23;20	0%	0%

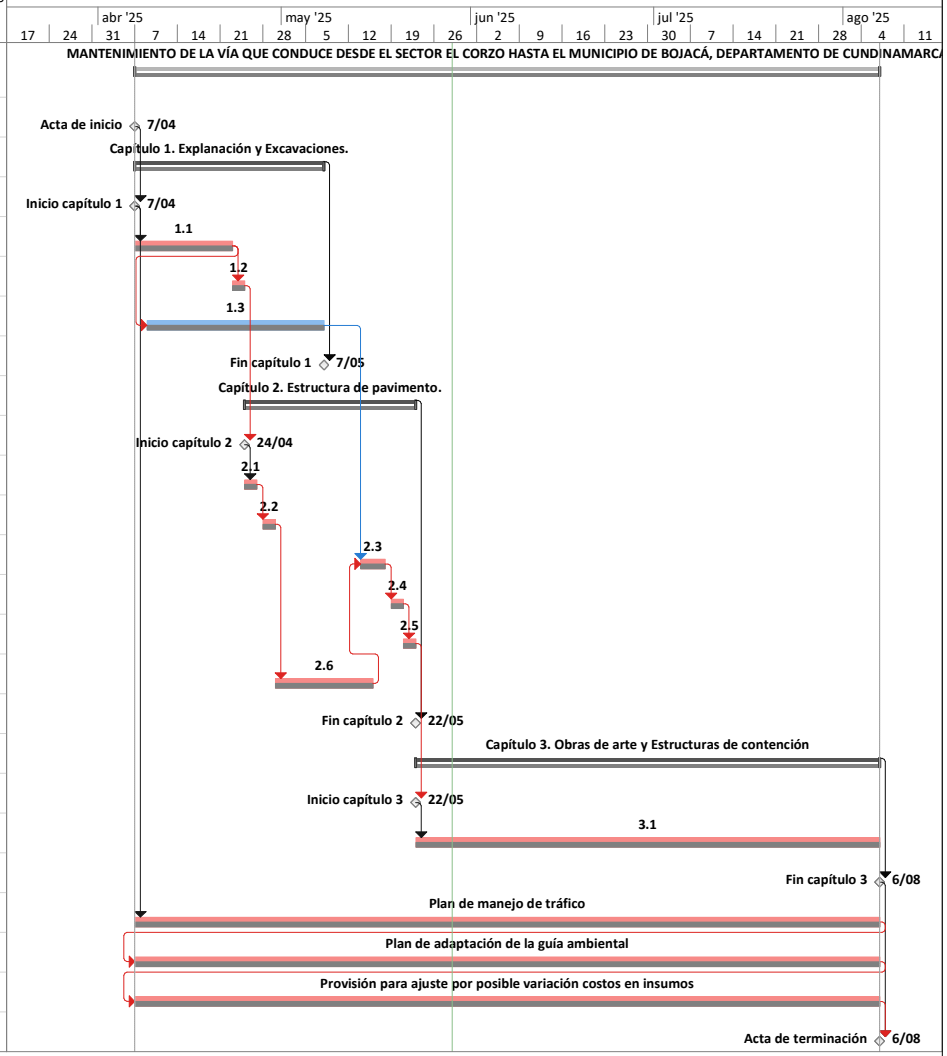

Proyecto: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base			
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base			
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso			
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual			
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base				

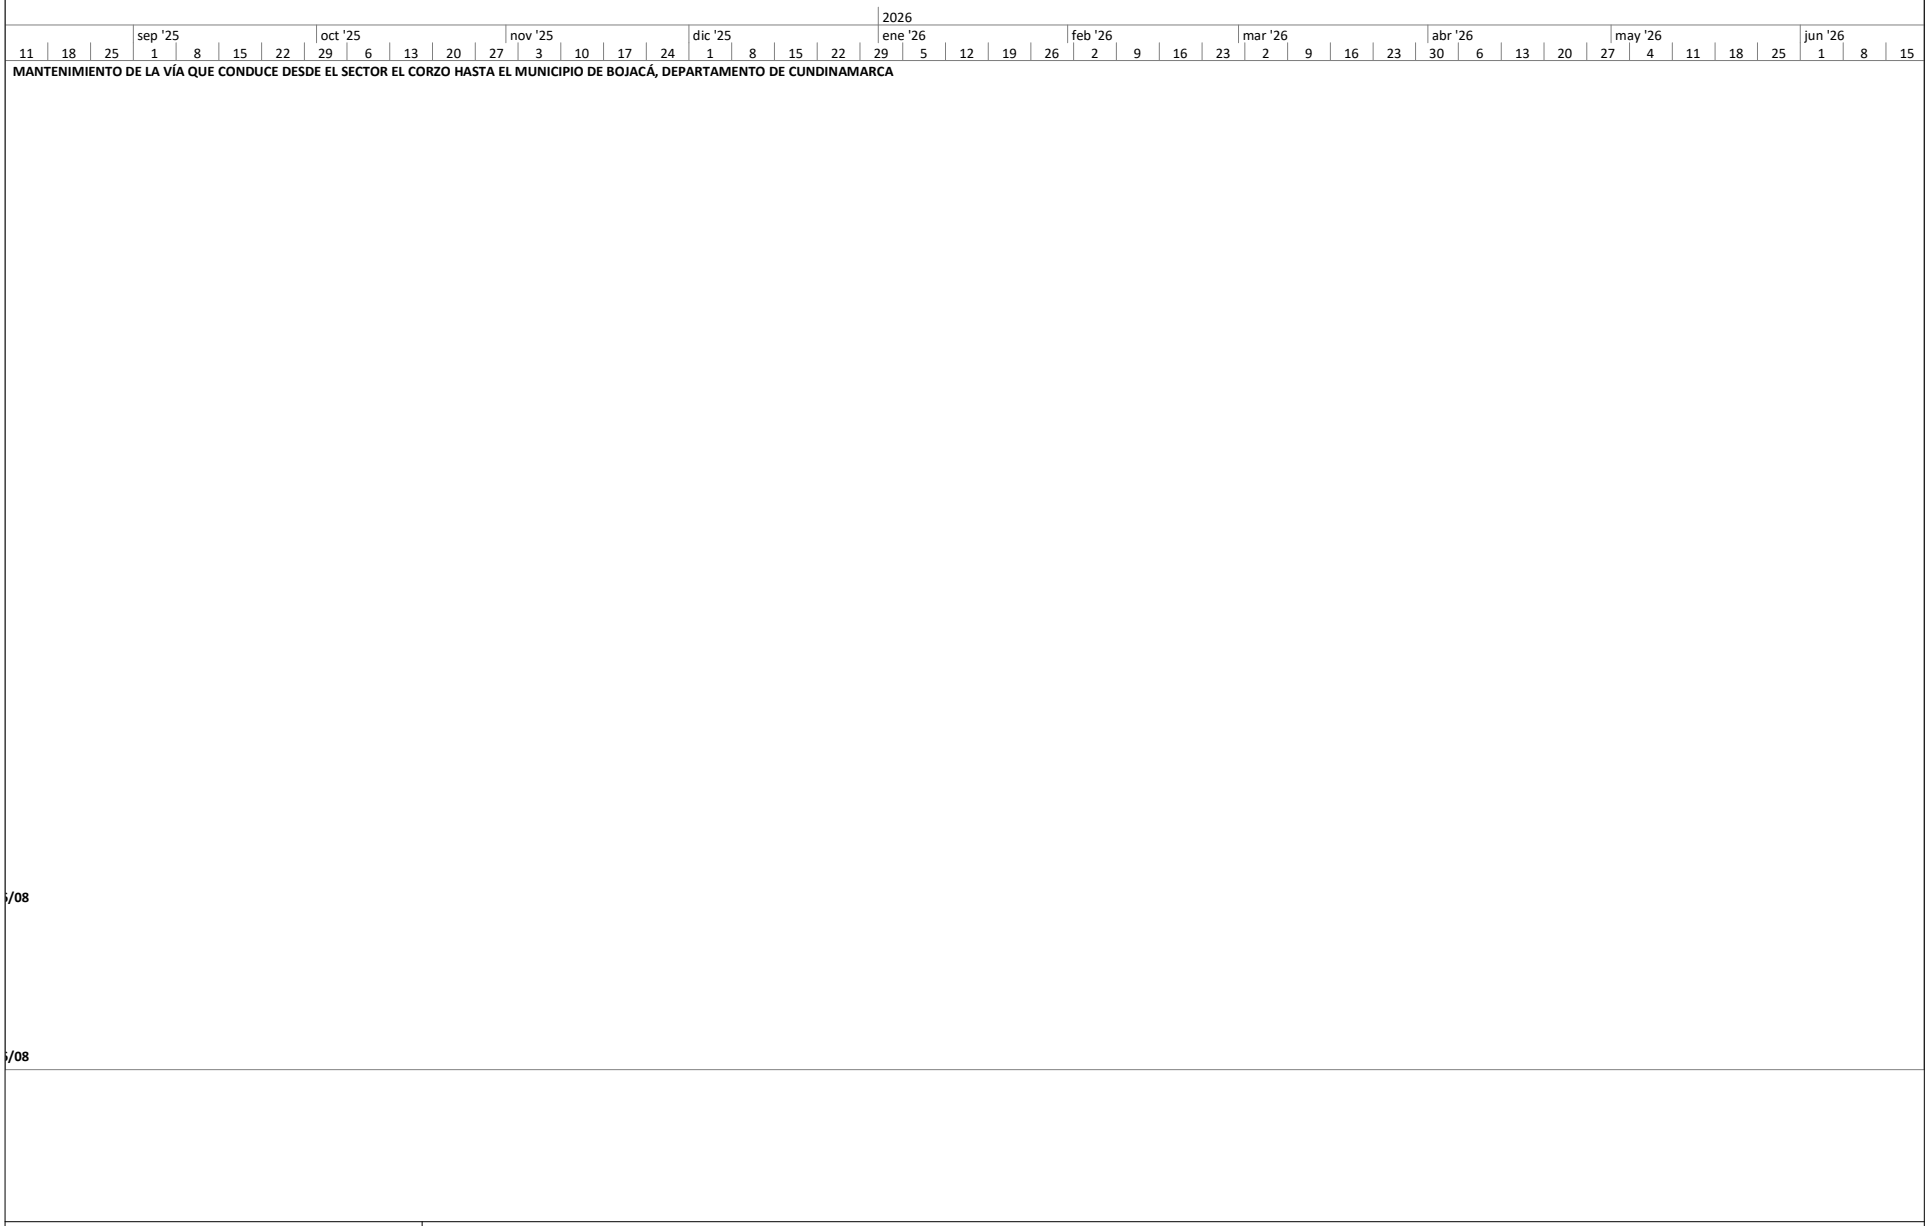

Proyecto: MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Hito de línea base
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite	Resumen de línea base
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas	Progreso
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica	Progreso manual
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Línea base	
