Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2025.
CGS-COR_BOJ-25-272

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Atención: Ingeniera Sandra Rocío Castillo.
Subdirectora Técnica
Calle 26 No 51-53, Torre Central Piso 6.
Ciudad.

Referencia: Contrato ICCU-CTO-242 de 2025. Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al proyecto "mantenimiento de la vía que conduce desde el sector El Corzo hasta el Municipio de Bojacá, Departamento de Cundinamarca".

Asunto: **Su comunicado ICCU-I-2025-0007594.** Informes Semanales de Interventoría 12 al 17 y 20 al 22.

Respetados Señores:

En atención al comunicado del asunto y en atención a lo tratado en la mesa de trabajo llevada a cabo el día 04 de septiembre del 2025, en las oficinas del ICCU, en la cual se socializaron las observaciones a los informes semanales, se remiten los informes ajustados 12, 13, 14, 15 y 16 para su revisión y fines pertinentes:

N° Informe	Comunicado
12	ICCU-S-2025-0006012
13	ICCU-S-2025-0006024
14	ICCU-S-2025-0006054
15	ICCU-S-2025-0005268
16	ICCU-I-2025-0007311

De igual forma y en consideración de los ajustes indicados, se remiten los informes semanales 17, 20, 21, y 22.

En Consecuencia, se remiten los documentos mencionados en el siguiente Link: **CGS-COR_BOJ-25-272_ANX**

Cordialmente,

CONSORCIO GS
NIT. 901.920.369-8

Miguel Chanza Camelo
Director de Interventoría

Anexos: Lo enunciado en un (1) link.
C.C.:

- C.C.: Ingeniera Sandra Rocío Castillo González, Supervisora del Contrato ICCU-CTO-242 de 2025.
- Consecutivo

Proyectó: LGB
Elaboró: JMM
Revisó: MCH

Consorcio.GS@sesac.com.co
Carrera 55 # 152B-68
Centro Empresarial MAZ Torre A Oficina 901
Bogotá D.C.

ICCU-E-2025-0012010

Asunto:
272 - Su comunicado ICCU-I-2025-0007594. Informes Semanales de Interventoría 12 al 17 y 20 al 22.

Remitente:
LIBEY GARCIA

Destinatarios:
Contacto Instituto de Infraestructura y Concesiones (contactenosiccu@cundinamarca.gov.co) Sandra Milena Castañeda Medina (sandra.castaneda@cundinamarca.gov.co) sandra.castillo@cundinamarca.gov.co (sandra.castillo@cundinamarca.gov.co)

Con copia a:
Consorcio GS Bojacá (Consorcio.GS@sesac.com.co) Miguel Francisco Chunza Camelo (miguel.chunza@sesac.com.co) 'Edgar Alba' (edgar.santiago.alba.parra@gmail.com) SESAC S.A. Comercial (Comercial@sesac.com.co)

Fecha de Recibido:
13/09/2025 09:46:57 AM

Correo Peticionario: Consorcio GS Bojacá(Consorcio.GS@sesac.com.co)
De (Remitente): LIBEY GARCIA (libey.garcia@sesac.com.co)
Enviado el: 13/09/2025 9:46:57 a. m.
Para: contactenosiccu@cundinamarca.gov.co
Asunto: 272 - Su comunicado ICCU-I-2025-0007594. Informes Semanales de Interventoría 12 al 17 y 20 al 22.

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
Atención: Ingeniera Sandra Rocío Castillo Gonzalez.
Supervisora del Contrato ICCU-CTO-242 de 2025.
Calle 26 No. 51-53, Torre Central Piso 6.
Ciudad.

Referencia: Contrato ICCU-CTO-242 de 2025. Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y legal al proyecto "mantenimiento de la vía que conduce desde el sector El Corzo hasta el municipio de Bojacá, departamento de Cundinamarca".

Respetada Ingeniera,

Adjunto al presente se hace envío del oficio CGS-COR_BOJ-25-272, mediante el cual se remiten los informes Semanales 12 al 17 y 20 al 22.

Cordialmente,

ICCU-E-2025-0012010

Libey García Bohórquez
Coordinador de Interventoría
CONSORCIO GS

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

Consorcio GS	CONSORCIO GS	FECHA	28/07/2025	SEMANA No.	16	DEL	21/07/2025	AL	27/07/2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Municipio de Bojacá, Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	
CONTRATO No.:	ICCU-CT0-242 DE 2025	**CONTRATO No.:**	ICCU-CT0-262 DE 2025
PLAZO INICIAL:	122 días	**PLAZO INICIAL:**	122 días
CONTRATISTA:	CONSORCIO GS	**CONTRATISTA:**	SOCIEDAD CONSORCIO PROESCO SAS
FECHA DE INICIACIÓN:	7/04/2025	**FECHA DE INICIACIÓN:**	7/04/2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A.
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	6/08/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	6/08/2025
PLAZO ACTUALIZADO:	122 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	122 días
PLAZO TRANSCURRIDO:	112 días (91.74%)	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	112 días (91.74%)
VALOR INICIAL :	$ 299.970.440	**VALOR INICIAL :**	$ 2.751.562.197
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 299.970.440	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 2.751.562.197
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 299.970.440	**VALOR POR PAGAR:**	$ 2.751.562.197
VALOR ANTICIPO:	$ 44.995.566	**VALOR ANTICIPO:**	$ 550.312.439
SUPERVISOR:	Ing. Sandra Rocío Castillo González	**SUPERVISOR:**	N/A

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Avance de actividades a corte del presente informe:

META FÍSICA

Construcción de cunetas

Total estimado (M3)		Ejecutado (M3)	Ejecutado (%)	Observación
Costado derecho	**700.00**	473.11	67.59%	**Frente 1:** K0+673 a K2+280. **Frente 2:** K0+858 a K1+685. **Frente 3:** K2+323 a K2+410.
Costado izquierdo	**1033.00**	0.00	0.00%	N/A

Sobre carpeta

Total estimado (KM/Carril)		Ejecutado (KM/Carril)	Ejecutado (%)	Observación
Carril derecho	**0.30**	0.00	0.00%	Sin iniciar
Carril izquierdo	**0.30**	0.00	0.00%	Sin iniciar
Total	**0.60**	**0.00**	**0.00%**	**Sin iniciar**

PRESUPUESTO OFICIAL CTO ICCU 262-2025					EJECUTADO	Abscisado parcial ejecutado		% AVANCE	OBSERVACIÓN
CAPÍTULO 1. EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES									
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACUMULADO INFORME ANTERIOR**	**ACUMULADO SEMANA 16**	**ACUMULADO TOTAL**	**Abscisa Inicial**	**Abscisa Final**		
1.1	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	3.300	1.158	95,31	1.253	K+673	K2+840	37,98%	Entre el 21 de Julio y el 27 de Julio se realizaron trabajos de sobre excavación para mejoramiento de subrasante y otras excavaciones, todo esto en diferentes tramos comprendidos entre el K2+680 y el K2+840. Las actividades mencionadas fueron ejecutadas por el frente 3 de trabajo.
1.2	Demolición concreto estructural (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	20	26,3294	-	26,3294	K2+349	K4+944	131,65%	Entre 21 de Julio y el 27 de Julio no se realizaron trabajos de demolición de concreto.
CAPÍTULO 2. ESTRUCTURA DE PAVIMENTO									
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACUMULADO INFORME ANTERIOR**	**ACUMULADO SEMANA 16**	**ACUMULADO TOTAL**				
2.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante	20	12,187	-	12,187	K1+072	K1+206	60,93%	Entre el 21 de Julio y el 27 de Julio no se realizaron trabajos de mejoramiento de subrasante.
2.2	Afirmado	107	3,482	-	3,482	K1+072	K1+206	3,25%	Entre el 21 de Julio y el 27 de Julio no se trabajó en el afirmado.
2.3	Sub base granular	1.733	492	32,55	525	K+673	K2+690	30,27%	Entre el 21 de Julio y el 27 de Julio se realizaron trabajos de subbase granular en diferentes tramos comprendidos entre el K1+275 y el K2+690. Las actividades mencionadas fueron ejecutadas por el frente 1 de trabajo entre el K1+275 y el K1+319 , por el frente de trabajo 2 entre el K1+390 y el K1+400 y por el frente 3 entre el K2+420 y el K2+690
CAPÍTULO 3. OBRAS DE ARTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN									
ITEM DE PAGO	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**ACUMULADO INFORME ANTERIOR**	**ACUMULADO SEMANA 16**	**ACUMULADO TOTAL**				
3.1	Cuneta de concreto clase E, 3500 psi con refuerzo en fibra	1.733	456	17,34	473	K+673	K2+410	27,30%	Entre el 21 de Julio y el 27 de Julio se realizaron trabajos de instalación de concreto de cunetas en diferentes tramos comprendidos entre el K1+254 y el K1+477. Las actividades mencionadas fueron ejecutadas por el frente 1 de trabajo entre el K1+254 y el K1+303 y por el frente de trabajo 2 entre el K1+375 y el K1+477.

Durante la semana del presente Informe se adelantaron la siguiente actividades:

FECHA	ACTIVIDADES
21/07/2025	Se reciben los comunicados ICCU-S-2025-0004830, ICCU-S-2025-0004832 e ICCU-S-2025-0004834 con la aprobación de los informes semanales 009, 010 y 011 de interventoría. Clima: Seco. Frente 1(K1+253): Se libera por topografía la capa de subbase granular entre K1+275 y K1+318,50 (43,50 m – a= 1,35 m – e= 0,15 m). Se funden 7 losas de cunetas entre K1+253,50 y K1+285 (17,50 m – a= 1,913 m). Frente 2 (K1+387): Se libera por topografía la capa de subbase granular entre K1+390 y K1+400 (10 m – a= 1,227 m – e= 0,15 m). Se funden 5 losas de cunetas en concreto de 3500 PSI con fibra, entre K1+387,50 y K1+415 (12,50 m - a= 1,526 m). Frente 3 (K2+410): Se está a la espera que el contratista termine de organizar la subbase y recompactar donde no cumplieron densidades, para poder liberar y que continúen con el proceso constructivo. El sábado 19 de julio de 2025, se hizo acompañamiento a la señalización de los sectores en intervención, quedando organizado en la vía y contra el espacio público: K4+375 y K4+944, K2+410 y K2+700, K1+342 y K1+480 y K1+250 y K1+320. Presentándose ausencia de los delineadores de tráfico ubicados contra el espacio público en: K2+410 y K2+700, K1+342 y K1+480, estos delineadores fueron hurtados al parecer en la madrugada del día 21 de julio de 2025. El contratista informó que colocaría la denuncia sobre esta situación, teniendo en cuenta que superaban las 70 unidades de estos elementos.
22/07/2025	Se realiza envío del informe semanal 015 de interventoría mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-205 con radicado ICCU-E-2025-0009186. Clima: Seco. Frente 1(K1+260): Se funden 9 losas de cunetas entre K1+260 y K1+302,50 (22,50 m – a= 1,649 m), incluye losas intermedias. Frente 2 (K1+375): Se funden 6 losas de cunetas en concreto de 3500 PSI con fibra, entre K1+375 y K1+402,50 (15,00 m - a= 1,498 m). Se funde 1 losa entre K1+474 y K1+476,50 (2,50 m – a= 1,40 m). Frente 3 (K2+410): Se libera por topografía la capa de subbase granular entre K1+420 y K1+510 (90 m – a= 1,474 m), con el fin que puedan tomar densidades y continuar con el proceso constructivo.
23/07/2025	Se remitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-206, mediante el cual se solicitó al contratista indicar el procedimiento que implementará para la reparación de las losas de cuneta en concreto que presentan empozamiento de aguas en el costado derecho, específicamente en las abscisas K1+200, K0+980, K1+000, K1+010, K1+140 y K1+480, de acuerdo con lo evidenciado en el registro fotográfico del oficio. Clima: Seco. Frente 1(K1+260): Quitan formaleta de losas fundidas el día anterior. Se continúa la instalación de formaleta adelante del K1+305, para la fundida de cunetas. Frente 2 (K1+375): Quitan formaleta de las losas fundidas el día anterior. Se continúa con la instalación de formaletas desde K1+405 hacia menores, quedando listo para la fundida de concreto para cunetas. Frente 3 (K2+410): Realizan excavación hasta K2+770, la compactación inicia en las horas de la tarde sobre la subbase granular, después de arreglar el vibrocompactador (estaba varado), desde K2+510 hacia mayores, se indica al contratista la aplicación de agua para evitar la segregación de la subbase. Se toman densidades K1+410 y K1+510 (100 m), quedando listo para continuar con el proceso constructivo.
24/07/2025	Clima: Seco. Frente 1(K1+260): Se encuentra con formaleta entre K1+285 y K1+320, pendiente suministro de concreto para fundir cunetas. - Frente 2 (K1+375): Se encuentra con formaleta entre K1+342 y K1+375, pendiente suministro de concreto para fundir cunetas. - Frente 3 (K2+410): Instalan formaleta para fundir cunetas entre K2+410 y K2+510. Se solicita organizar sector adelante del K2+510, ya que se presenta segregación sobre la subbase granular para poder liberar este sector. Se revisa y libera excavación entre K2+680 y K2+770 (90 ml – a= 1,508 m).
25/07/2025	Clima: Seco. Frente 1(K1+285): Se encuentra con formaleta entre K1+285 y K1+320, pendiente suministro de concreto para fundir cunetas. Frente 2 (K1+342): Se encuentra con formaleta entre K1+342 y K1+375, pendiente suministro de concreto para fundir cunetas. Frente 3 (K2+410): Se revisa y libera subbase granular entre K2+510 y K2+690 (180 ml – a= 1,529 m). Instalan formaleta para fundir cunetas entre K2+510 y K2+600 (sector pendiente de toma de densidades). Se revisa y libera excavación entre K2+770 y K2+840 (70 ml – a= 1,465 m).
26/07/2025	Clima: Seco. Frente 1(K1+285): Se encuentra con formaleta entre K1+285 y K1+320, pendiente suministro de concreto para fundir cunetas.Frente 2 (K1+342): Se encuentra con formaleta entre K1+342 y K1+375, pendiente suministro de concreto para fundir cunetas.Frente 3 (K2+410): Se encuentra con formaleta entre K2+410 y K2+600, pendiente de toma de densidades entre K2+510 y K2+690. El contratista no instala delineadores tubulares entre la excavación y el espacio público desde el K2+410 y K2+800, quedando desprotegida esta zona para los peatones y los biciusuarios, de igual forma no queda protegido todo este sector de obra con plástico.
27/07/2025	Domingo

1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	DIRIGIDO A
21-jul-25	CGS-COR_BOJ-25-203	Respuesta a su comunicado Ad-165. Solicitud de Prórroga al Contrato de Obra ICCU-262 de 2025.	C. PROESCO SAS
22-jul-25	CGS-COR_BOJ-25-204	Respuesta a su comunicado Ad-165. Solicitud de Prórroga al Contrato de Obra ICCU-262 de 2025.	C. PROESCO SAS
22-jul-25	CGS-COR_BOJ-25-205	Informe Semanal de Interventoría No. 015.	ICCU
23-jul-25	CGS-COR_BOJ-25-206	Procedimiento arreglo losas de cuneta en concreto que presentan empozamiento de aguas	C. PROESCO SAS
24-jul-25	CGS-COR_BOJ-25-207	Respuesta a sus comunicados Ad-167. sus oficios CGS-COR_BOJ-25-187, subsanación al plan de calidad - Versión 7.	C. PROESCO SAS

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

COMUNICADO	FECHA DEL OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
Ad-168	21-jul-25	C. PROESCO SAS	Alcance con NP-respuesta a oficio CGS-COR-BOJ-25-202.
ICCU-S-2025-0004830	21-jul-25	ICCU	Aprobación informe semanal 009 de interventoría.
ICCU-S-2025-0004832	21-jul-25	ICCU	Aprobación informe semanal 010 de interventoría.
ICCU-S-2025-0004834	21-jul-25	ICCU	Aprobación informe semanal 011 de interventoría.
Ad-169	22-jul-25	C. PROESCO SAS	Respuesta a oficio CGS-COR BOJ-25-203.
Ad-170	21-jul-25	C. PROESCO SAS	Solicitud de Prórroga al Contrato de Obra ICCU-262 de 2025.
Ad-170-B	23-jul-25	C. PROESCO SAS	Respuesta CGS-182_Horario laboral.
Ad-171	25-jul-25	C. PROESCO SAS	Acreditación de la mano de obra informal.
Ad-172	25-jul-25	C. PROESCO SAS	Subsanación del Acta Parcial No 1.

COMUNICADO	FECHA DEL OFICIO	REMITENTE	ASUNTO
Ad-173	25-jul-25	C. PROESCO SAS	Solicitud de certificación de residencia trabajadores Mano de Obra No Calificada, vinculado al proyecto.
Ad-174	26-jul-25	C. PROESCO SAS	Solicitud de Modificación No. 1 para la inclusión de ítems no previstos y solicitud de Prórroga No. 1 al contrato de obra.
Ad-175	26-jul-25	C. PROESCO SAS	Documento finales Plan de Calidad

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.1	Excavaciones varias sin clasificar. (Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km).	7/04/2025	22/04/2025	15	28-may-25	Pendiente	Pendiente	51	-96
1.2	Demolición concreto estructural. (Incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5 km).	23/04/2025	24/04/2025	1	27-jun-25	Pendiente	Pendiente	65	-94
2.1	Rajón para mejoramiento de la subrasante.	25/04/2025	26/04/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-93	-92
2.2	Afirmado.	28/04/2025	29/04/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-90	-89
2.3	Sub base granular.	14/05/2025	17/05/2025	3	29-may-25	Pendiente	Pendiente	15	-71
2.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1.	19/05/2025	20/05/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-69	-68
2.5	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19. (Incluye cemento asfáltico).	21/05/2025	22/05/2025	1	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-67	-66
2.6	Geotextil NT 2500.	30/04/2025	15/05/2025	15	Sin iniciar	Pendiente	Pendiente	-88	-73
3.1	Cuneta de concreto Clase E, 3.500 psi con refuerzo en fibra	23/05/2025	6/08/2025	75	4-jun-25	Pendiente	Pendiente	12	10

Plazo del proyecto: 122 días


** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	86,00%	25,59%	-60,41%
Durante el periodo	5,00%	1,10%	-3,90%
Acumulado Actual	91,00%	26,69%	-64,31%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

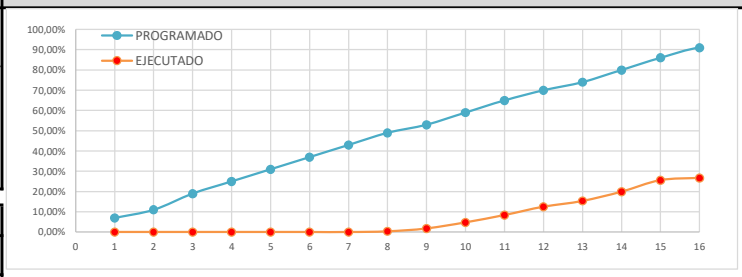

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
122	112,00	10,00	-78,00

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 2.366.343.489	$ 704.168.817	30%
Durante el periodo	$ 137.578.110	$ 30.240.553	22%
Acumulado Actual	$ 2.503.921.599	$ 734.409.370	29,33%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

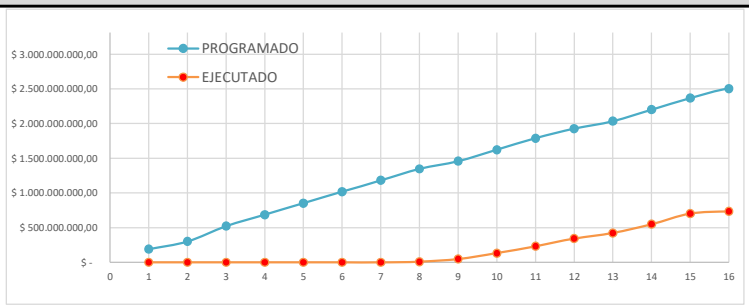


AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-71%

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior			0%
Durante el periodo			0%
Acumulado Actual	$ -	$ -	0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

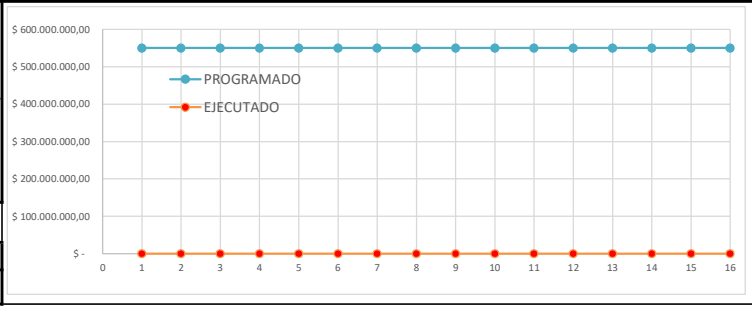

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-71%

4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

- PAGA:
El 8 de julio de 2025 se emitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-171, mediante el cual se informó a la entidad sobre el concepto de aprobación condicionada emitido por la interventoría en el oficio CGS-COR_BOJ-25-154 del 16 de junio de 2025. Esta comunicación se expidió en atención a los oficios ICCU-S-2025-0004131 e ICCU-I-2025-0002301, a través de los cuales se solicitaban las observaciones a la cuarta revisión del informe PAGA y la versión final del documento.

El 11 de julio de 2025 se emitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-192 con concepto de aprobación al PAGA y se requirió al contratista la entrega del presupuesto correspondiente que fue allegado mediante comunicado Ad-166 del 18 de Julio de 2025 que a la fecha de corte del presente informe se encuentra en revisión por parte de la interventoría.

- Donación de residuos de Excavación:
Se encuentra en espera la respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-173 del 2 de julio de 2025 mediante el cual la interventoría dio respuesta al comunicado Ad-136 del contratista referente a la donación de residuos de excavación.

- Revisión de documentación ambiental de plantas y fuentes de material: El 11 de julio de 2025 se recibió el comunicado Ad-161, mediante el cual el contratista remitió nuevamente los documentos ambientales de las plantas de concreto y asfalto, los cuales actualmente se encuentran en revisión por parte de la Interventoría. Dicho comunicado fue emitido en respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-169 del 8 de julio de 2025, elaborado por la Interventoría, en el que se realizaron observaciones a los documentos ambientales de las plantas de suministro previamente entregados mediante el comunicado Ad-113 del contratista y que a la fecha del presente informe semanal se encuentra en proceso de subsanación por parte del contratista.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el 21 de Julio y el 27 de julio de 2025, la interventoría adelantó seguimiento a los compromisos en materia de gestión social, dando continuidad a requerimientos efectuados en semanas anteriores de la siguiente manera:

- Actas de vecindad: Se encuentra pendiente la respuesta del contratista al oficio CGS-COR_BOJ-25-159, mediante el cual se realizaron observaciones a las actas de vecindad el 9 de julio de 2025, en atención al comunicado Ad-134 del 17 de junio de 2025.

- PQRS: A la fecha no se tienen PQRS pendientes de respuesta.

- Acreditación de Mano de Obra No Calificada: Se recibe el 10 de Julio el comunicado Ad-159 haciendo entrega de información del personal
de mano de obra no calificada vinculado al proyecto y de los soportes de lugar de residencia en respuesta al oficio CGS-COR BOJ-25-162 de interventoría mediante el cual fue solicitado. En respuesta al comunicado mencionado, se remitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-201 del 18 de Julio de 2025 mediante el cual se formularon observaciones a la documentación MONC.

Posteriormente, el 25 de julio de 2025, el contratista remitió el comunicado Ad-171, mediante el cual dio respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-201 de la interventoría, en el que se presentaron observaciones a la documentación MONC revisada. A la fecha de corte del presente informe, dicho comunicado se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

En complemento a lo anterior, el 25 de julio de 2025 el contratista remitió a la Alcaldía de Bojacá el comunicado Ad-173, mediante el cual solicitó la expedición de la certificación de ocho trabajadores vinculados al proyecto.

- Valla Informativa: Mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-162 del 9 de julio de 2025, la interventoría solicitó al contratista la correcta instalación de la valla informativa del contrato, teniendo en cuenta las deficientes condiciones en que fue encontrada en reiteradas visitas realizadas los días 26/05/2025, 28/06/2025, 07/07/2025 y 08/07/2025, tal como se evidencia en el registro fotográfico del oficio. A la fecha de corte del presente informe no se ha recibido respuesta formal de parte del contratista al oficio descrito.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

- A la fecha se continua pendiente la subsanación completa de los documentos SST observados mediante oficios CGS-COR_BOJ-25-125 y CGS-COR_BOJ-25-142.

A la fecha de corte del presente informe semanal se sigue a la espera de la respuesta por parte del contratista a los oficios CGS-COR_BOJ-25-176 del 26 de Junio, CGS-COR_BOJ-25-167 del 25 de Junio y CGS-COR_BOJ-25-181 del 8 de Julio referentes a temas de documentación, EPP's y otros relacionados con el área SST.

El 23 de julio de 2025, en atención al oficio CGS-COR_BOJ-25-182 de la interventoría, mediante el cual se formularon observaciones a la modificación propuesta por el contratista con el propósito de garantizar el cumplimiento de la Ley 2466 de 2025 (Reforma Laboral), este remitió el comunicado Ad-170, en el que planteó un horario de jornada reducida de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 3:45 p. m. y los sábados de 7:00 a. m. a 11:15 a. m., para un total de 44 horas efectivas de trabajo semanal. A la fecha de corte del presente informe, dicho comunicado se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

El 18 de julio de 2025, en atención al comunicado Ad-148 del contratista, mediante el cual se entregó el Informe Mensual No. 2, se remitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-200 con observaciones al Informe en lo respectivo a SST y el componente Social. A la fecha de corte del presente informe semanal, dichas observaciones se encuentran en proceso de subsanación por parte del contratista.
'Se continúa a la espera de la respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-189 con la subsanación de observaciones respecto a la documentación de la volqueta doble troque.

Se continúa a la espera de los oficios CGS-COR_BOJ-25-184 (8 de Julio) y CGS-COR_BOJ-25-19 (19 de Julio), mediante los cuales la interventoría formuló observaciones al comunicado Ad-152, en el que se informó sobre el subcontrato de obra suscrito entre PROESCO y la empresa Real Estate Global Service S.A.S., incluyendo el personal vinculado por el subcontratista. Dichas observaciones están relacionadas con el área de SST y con el contrato suscrito entre las mencionadas empresas.

- El 24 de julio de 2025 se solicitó al contratista de obra señalizar y realizar el lleno de materiales en los accesos de los predios del K0+000 al K2+800 para evitar accidentes tanto del personal de obra como de las personas que se desplazan por estos sitios, debido que a la fecha no se han fundido en concreto.

- El 25 de julio de 2025 se llevó a cabo un recorrido en compañía del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), a partir del cual se generaron las siguientes observaciones y comentarios:

1. Solamente está habilitado el frente de obra 3 ubicado en el K2+590.
2. Se realiza toma de asistencia del personal del contratista, asistiendo un total de 25 trabajadores.
3. Se observa que no todo el personal tiene dotación institucional y equipo EPP completo
4. Faltan carpas, señalización, punto de hidratación, botiquín en el frente de obra.
5. La maquinaria no cuenta con la inspección preoperacional.
6. No se realizó charla de seguridad.
7. No se encontro en campo el profesional SST del contratista.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

'- Los pliegos de la licitación pública ICCU-LP-039 de 2024, indicaban como factor de calidad:

1)IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS:

Este documento, establecido como una obligación desde los pliegos del proceso licitatorio y asumido como compromiso por parte del proponente —ahora contratista de la obra—, ha requerido múltiples revisiones y reprocesos debido a la baja calidad de su contenido y a la falta de atención integral a las observaciones emitidas por la interventoría. En desarrollo de este proceso, se han sostenido espacios de trabajo y se han emitido conceptos de aprobación condicionada a ajustes de forma, como el emitido mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-160 del 19/06/2025, con el fin de orientar al contratista hacia la consolidación de un documento ajustado a las exigencias contractuales.

La interventoría a través del oficio CGS-COR_BOJ-25-188 del 8 de julio de 2025 emitió concepto de aprobación al Plan de Gerencia.

El 14 de Julio se recibe el comunicado Ad-164 del contratista con informes de gerencia correspondientes al informe de control N° 5 de ejecución, informe de control semanal del 26 de Mayo al 01 de Junio, del 02 de Junio al 08 de Junio y del 09 de Junio al 15 de Junio de 2025 los cuales a la fecha de corte del presente informe semanal se encuentran en revisión por parte de la interentoría.

En complemento a lo anteriormente expuesto, el 15 de julio el contratista remitió el informe de control semanal correspondiente al periodo del 23 al 29 de junio del presente año, como alcance al comunicado Ad-164. Dicho informe, al igual que los anteriores, se encuentra en revisión por parte de la interventoría a la fecha de corte del presente informe semanal.

2)PLAN DE CALIDAD ESPECIFICO PARA EL PROYECTO:
De igual forma que el Plan de Gerencia, este documento constituye una obligación contractual establecida en los pliegos del proceso licitatorio y asumida como compromiso por parte del proponente -ahora contratista de la obra—-al momento de la presentación de la oferta.

En este sentido, C. PROESCO S.A.S. presentó nuevamente el documento mediante comunicado AD-147 del 25 de junio de 2025, atendiendo las observaciones previamente formuladas. Dicha subsanación fue respondida por la interventoría a través del oficio CGS-COR_BOJ-25-187 del 15 de julio de 2025, en el cual se reiteran algunas observaciones, mientras que otras se dan por atendidas. Adicionalmente, se solicitó en este oficio que el plan de calidad del proyecto se encuentre coordinado y articulado con lo establecido en el plan de gerencia, así como con la metodología prevista para la ejecución de los trabajos.

Posteriormente, el contratista dio respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-187 a través del comunicado Ad-167 del 18 de julio de 2025, mediante el cual presentó la subsanación de las observaciones pendientes que luego de la revisión realizada fue aprobado por la interventoría en su séptima versión mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-207 del 24 de Julio de 2025 y por medio del cual se solicitó al contratista remitir la versión final aprobada debidamente firmada y consolidar sus anexos allegada por el contratista mediante comunicado Ad-175 del 26 de Julio de 2025.

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que están originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El cronograma del proyecto fue aprobado mediante el oficio CGS-COR_BOJ-25-057 del 23 de abril de 2025. Si bien el Contrato tiene fecha de acta de inicio del 7/04/2025, solo hasta el 28/05/2025 se iniciaron las actividades de obra en el tramo. Ante esta situación, la Interventoría solicitó al Contratista, mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-074 del 2 de mayo de 2025, la presentación de un plan de contingencia que permita superar el atraso identificado.

En respuesta, el Contratista remitió el comunicado Ad-078 del 8 de mayo de 2025, a través del cual presentó el referido plan de contingencia, el cual fue observado por esta Interventoría mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-104 del 15/05/2025, dado que el plan presentado no mostraba de forma clara el incremento en frentes de obras, recursos adicionales, además que el plan básicamente reprogramaba las actividades del cronograma con lo cual se estaba generando una nueva línea base de este. El 6/06/2025 mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-141, apremio al Contratista por la no entrega del Plan de Contingencia ajustado.

Finalmente, el 24/06/2025 el contratista remitió el comunicado Ad-145 en el cual se presentó subsanación al plan de contingencia. En este sentido la Interventoría, procederá a realizar el seguimiento del mismo de acuerdo con las medidas propuestas por el Contratista para superar el atraso.

El 18 de julio de 2025, el contratista remitió el comunicado Ad-165, mediante el cual formalizó la solicitud de prórroga al Contrato de Obra ICCU-262 de 2025, previamente planteada en el comité de obra del 12 de julio de 2025. Frente a ello, la interventoría emitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-203 del 21 de julio de 2025, solicitando las memorias técnicas que sustentaran dicha solicitud.

En atención al requerimiento previamente mencionado, el contratista presentó una corrección de la solicitud mediante comunicado Ad-170 del mismo 21 de julio de 2025. No obstante, el 22 de julio de 2025 la interventoría, mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-204, reiteró la solicitud al contratista para que aportara de manera inmediata y detallada los soportes técnicos que acreditaran la existencia de hechos o circunstancias externas con incidencia directa y comprobable en los retrasos del contrato. Se indicó que dichos soportes eran indispensables para que la entidad contara con fundamentos técnicos al momento de analizar la justificación de la prórroga solicitada. Así mismo, se dejó expresamente señalado que la eventual aprobación de la prórroga no exime al contratista de su responsabilidad frente a los atrasos ya generados, ni limita la facultad de la entidad para adelantar las actuaciones administrativas correspondientes en caso de verificarse un incumplimiento parcial o total del contrato.

Ante lo anteriormente descrito, el contratista allegó el comunicado Ad-174 del 26/07/2025 con la justificación técnica solicitada, la solicitud N° 1 para la inclusión de ítems no previstos y la solicitud de Prórroga No. 1 al contrato de obra. Dicho comunicado se encuentra actualmente en revisión por parte de la interventoría con el fin de emitir el respectivo concepto.

A fecha de corte del presente informe, el avance programado del Contrato de Obra es del 91% contra un ejecutado del 26,69%, con lo cual se tiene un atraso del -64,31%. Como se observa el atraso continua incrementando semana a semana, y a la fecha solo se han implementado 2 frentes con rendimientos de aproximadamente 30 M3 de cuneta al día, con lo cual es pertinente por parte de esta Interventoría advertir que de no implementarse al menos 2 frentes adicionales en la siguiente semana, y no lograr un rendimiento superior a 50 M3 por frente no será posible lograr completar la meta física del proyecto en el plazo establecido.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

En la presente semana, el Contratista continua la ejecución de los trabajos con un (1) retrocargador, una (1) volqueta, un (1) vibrocompactador de llantas de 3 ton, dos (2) plantas eléctricas, un (1) vibrador de concreto, una (1) rana compactadora, una (1) pulidora y herramienta menor, adicional cuenta con un (1) Ingeniero residente, un (1) ingenieros de apoyo, un (1) topógrafo, un (1) cadenero, dos (2) operadores de maquinaria, un (1) maestro, cuatro (4) oficiales, diecisiete (17) ayudantes, un (1) mecánico, un (1) conductor (1 de volqueta) y tres (3) auxiliares de trafico.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha de corte del presente informe, el avance financiero del proyecto equivale al **26,69%.**

El 9 de julio de 2025 se recibió el comunicado Ad-157 del contratista, mediante el cual fueron remitidos los documentos soporte del Acta Parcial No. 1. Posteriormente, tras la revisión realizada por la interventoría, se emitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-198 del 16 de julio de 2025 y su alcance CGS-COR_BOJ-25-199 del 17 de Julio de 2025, en los cuales se formularon observaciones al respecto. Posteriormente, el 25 de Julio de 2025 el contratista presenta la subsanación de observaciones al acta parcial No. 1 mediante comunicado Ad-172 el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría a la fecha de corte del presente informe semanal.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista realiza prueba de densidades con resultados satisfactorios y toma muestras de cilindros de concreto por cada jornada de colocación de concreto. A la fecha el Contratista no ha remitido a la Interventoría la totalidad de los resultados de los ensayos a compresión de los cilindros, y la caracterización del material que utiliza en obra, únicamnte se han presentado los de la planta que suministra la subbase granular.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

El contratista realiza jornadas de orden y aseo al finalizar cada jornada de trabajo para evitar acumulación de residuos procedente del avance del proyecto. Se ha solicitado recoger los residuos de icopores de los almuerzos, los cuales han sido levantados.

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Se continúa a la espera de la respuesta a algunos de los oficios mencionados en el capítulo 6 del presente informe relacionados con el área SST.

- El 24 de julio de 2025 se solicitó al contratista de obra señalizar y realizar el lleno de materiales en los accesos de los predios del K0+000 al K2+800 para evitar accidentes tanto del personal de obra como de las personas que se desplazan por estos sitios, debido que a la fecha no se han fundido en concreto.

- El 25 de julio de 2025 se llevó a cabo un recorrido en compañía del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo **(**SST**)**, a partir del cual se generaron las siguientes observaciones y comentarios:

1. Solamente está habilitado el frente de obra 3 ubicado en el K2+590.
2. Se realiza toma de asistencia del personal del contratista, asistiendo un total de 25 trabajadores.
3. Se observa que no todo el personal tiene dotación institucional y equipo EPP completo
4. Faltan carpas, señalización, punto de hidratación, botiquín en el frente de obra.
5. La maquinaria no cuenta con la inspección preoperacional.
6. No se realizó charla de seguridad.
7. No se encontro en campo el profesional SST del contratista.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Se continúa a la espera de la respuesta a algunos de los oficios mencionados en el capítulo 6 del presente informe relacionados con el área SST.

- El 24 de julio de 2025 se solicitó al contratista de obra señalizar y realizar el lleno de materiales en los accesos de los predios del K0+000 al K2+800 para evitar accidentes tanto del personal de obra como de las personas que se desplazan por estos sitios, debido que a la fecha no se han fundido en concreto.

- El 25 de julio de 2025 se llevó a cabo un recorrido en compañía del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), a partir del cual se generaron las siguientes observaciones y comentarios:

1. Solamente está habilitado el frente de obra 3 ubicado en el K2+590.
2. Se realiza toma de asistencia del personal del contratista, asistiendo un total de 25 trabajadores.
3. Se observa que no todo el personal tiene dotación institucional y equipo EPP completo
4. Faltan carpas, señalización, punto de hidratación, botiquín en el frente de obra.
5. La maquinaria no cuenta con la inspección preoperacional.
6. No se realizó charla de seguridad.
7. No se encontro en campo el profesional SST del contratista.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

- Actas de vecindad: Se encuentra pendiente la respuesta del contratista al oficio CGS-COR_BOJ-25-159, mediante el cual se realizaron observaciones a las actas de vecindad el 9 de julio de 2025, en atención al comunicado Ad-134 del 17 de junio de 2025.

- Acreditación de Mano de Obra No Calificada: El 25 de julio de 2025, el contratista remitió el comunicado Ad-171, mediante el cual dio respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-201 de la interventoría, en el que se presentaron observaciones a la documentación MONC revisada. A la fecha de corte del presente informe, dicho comunicado se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

- Valla Informativa: Mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-162 del 9 de julio de 2025, la interventoría solicitó al contratista la correcta instalación de la valla informativa del contrato, teniendo en cuenta las deficientes condiciones en que fue encontrada en reiteradas visitas realizadas los días 26/05/2025, 28/06/2025, 07/07/2025 y 08/07/2025, tal como se evidencia en el registro fotográfico del oficio. A la fecha de corte del presente informe no se ha recibido respuesta formal de parte del contratista al oficio descrito.

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Implementación del programa de salud ocupacional y seguridad industrial del personal de obra.	Contratista	3/08/2025
Seguimiento al Plan de contingencia, para superar el atraso.	Interventoría	3/08/2025
Revisión de la solicitud de prórroga e inclusión de ítems NP	Interventoría	3/08/2025
Revisión de la Subsanación a las Observaciones del Acta Parcial N° 1	Interventoría	3/08/2025
Implementación de PMT completo	Contratista	3/08/2025
Entrega Actas de Vecindad con la subsanación de Obervaciones	Contratista	3/08/2025
Atención de observaciones hechas a la documentación MONC	Interventoría	3/08/2025
Instalación correcta de la Valla Informativa del Proyecto	Contratista	3/08/2025

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En consideración con lo indicado por la Entidad y lo tratado en comité de seguimiento del 13 de Junio de 2025, el Contratista entregará los APUs No Previstos, así como el balance del Contrato en consideración de los alcances fisicos identificados en los inventarios realizados.

El Contratista mediante comunicado Ad-135 del 17 de Junio remitió consolidados los APUs No previstos requeridos para las actividades no contempladas dentro del Presupuesto oficial que luego de la revisión realizada por la interventoría a este y a los comunicados Ad-127 y Ad-128, fueron realizadas las observaciones emitidas en el oficio CGS-COR_BOJ-25-168 del 01 de Julio de 2025 donde se solicita la atención de las mismas punto a punto y una atención integral de los comentarios realizados, así como la remisión de los Análisis de Precios Unitarios (APU) correspondientes a los ítems No Previstos debidamente ajustados, junto con el respectivo balance corregido.

Posteriormente, el 11 de julio de 2025, la Interventoría emitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-186, mediante el cual dio respuesta al comunicado Ad-155 del 04 de Julio de 2025, formulando nuevamente observaciones a los APUS no previstos. En atención a dichas observaciones, el contratista presentó su subsanación a través de correo electrónico el 12 de julio de 2025 que luego de la revisión realizada por la interventoría presentó nuevamente observaciones mediante oficio CGS-COR_BOJ-25-202 del 18 de Julio de 2025.

En respuesta al oficio CGS-COR_BOJ-25-202 del 18 de Julio de 2025, el contratista remite el comunicado Ad-168 del 21 de Julio del 2025 con la subsanación de las observaciones hechas en el oficio mencionado el cual a la fecha de corte del presente informe semanal se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría.

En complemento con lo anterior, el contratista allegó el comunicado Ad-174 del 26/07/2025 con la justificación técnica solicitada, la solicitud N° 1 para la inclusión de ítems no previstos y la solicitud de Prórroga No. 1 al contrato de obra. Dicho comunicado se encuentra actualmente en revisión por parte de la interventoría con el fin de emitir el respectivo concepto.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El 9 de julio de 2025 se recibió el comunicado Ad-157 del contratista, mediante el cual fueron remitidos los documentos soporte del Acta Parcial No. 1. Posteriormente, tras la revisión realizada por la interventoría, se emitió el oficio CGS-COR_BOJ-25-198 del 16 de julio de 2025 y su alcance CGS-COR_BOJ-25-199 del 17 de Julio de 2025, en los cuales se formularon observaciones al respecto. Posteriormente, el 25 de Julio de 2025 el contratista presenta la subsanación de observaciones al acta parcial No. 1 mediante comunicado Ad-172 el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la interventoría a la fecha de corte del presente informe semanal.

'Con corte en la presente semana se observa un avance del 5,59%, lo que nos da un acumulado del 25,59%, contra un programado semanal del 6% y acumulado del 86%, generando un atraso del 60,41%, por lo que se hace necesario que el contratista incremente el personal y maquinaria para cada frente de trabajo, teniendo en cuenta que los frentes que se encuentran en obra actualmente laboran con personal mínimo y el mismo equipo para estos frentes,

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Fecha: 21 de julio de 2025
Actividad: Cargue de dobletroques con material proveniente de excavación hacia escombrera en Mosquera.



Fecha: 21 de julio de 2025
Actividad: Frente 1 - K1+250 - K1+283, fundida de cunetas en concreto de 3500 PSI con fibra.



Fecha: 22 de julio de 2025
Actividad: Frente 2 - K1+480 - Nivelación de losas con topografía.



Fecha: 22 de julio de 2025
Actividad: Frente 1 - K1+260. Fundida de losas de cunetas en V hacia mayores.



Fecha: 23 de julio de 2025
Actividad: Frente 2 - K1+342 - K1+380, sector con subbase granular instalada para instalar formaleta.



Fecha: 24 de julio de 2025
Actividad: Frente 1 - K1+290 - K1+300 - Formaleta instalada para fundir cunetas.



Fecha: 23 de julio de 2025
Actividad: Frente 1 - K1+310. Losas de cuneta fundidas el día anterior, pendiente losas intermedias.



Fecha: 25 de julio de 2025
Actividad: Frente 3 - K2+490. Formaleta instalada para fundida de cuentas, a la espera de concreto, con hoy se completa el tercer día sin despacho de concreto de 3500 PSI.



Fecha: 26 de julio de 2025
Actividad: Frente 3 - K2+400. PMT instalado para iniciar labores en obra.



Fecha: 26 de julio de 2025
Actividad: Frente 2 - K2+410 hacia mayores. Sector sin señales de aproximación, no protección de excavación con formaleta y no delineadores contra espacio público.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Miguel Chunza Camelo
