
MUNICIPIO DE PASTO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

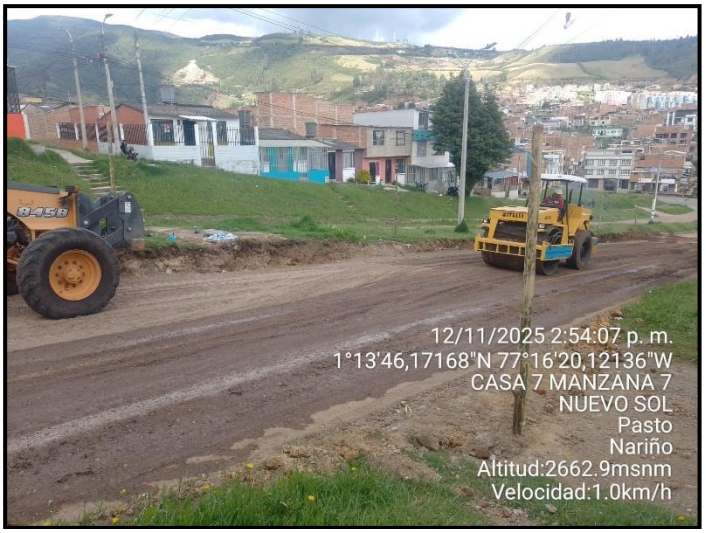

INTERVENTORIA DEL CONTRATO DE OBRA No. 20254196 DE 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)

INFORME DE INTERVENTORIA No.2

SGD INGENIERIA SAS
R.L. DIEGO FERNANDO TRUJILLO PORTILLA

Noviembre 2025

1. **INTRODUCCION** por una parte la Entidad MUNICIPIO DE PASTO y, por la otra, la empresa A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S convienen ejecutar el contrato No. 20254196 cuyo objeto es: "El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)". Dicho contrato se ejecutará a partir del 19 de septiembre de 2025 con diseños suministrado por la alcaldía.

   Luego de iniciado el contrato la empresa A.P.P. CONTROL INGENIERIA S.A.S da en cesión los derechos del contrato No. 20254196 a la empresa PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA firmado así el día 21 de octubre de 2025.

   El Municipio de Pasto a través del procedimiento de contratación CM-2025-7 delega a SGD INGENIERIA S.A.S. cuyo objeto es: "Interventoría Técnica, Financiera, Ambiental y Jurídica para la ejecución del contrato cuyo objeto es realizar la obra de mantenimiento y rehabilitación malla vial urbana comunas 10 a 12 del municipio de Pasto (SU-0045-069)", contrato anteriormente suscrito.

   En el presente informe de interventoría, se muestra el desarrollo de las actividades, y labores ejecutadas durante el periodo 19 de septiembre de 2025 al 19 de octubre de 2025 del seguimiento al contrato.

2. DATOS DEL CONTRATO

No Contrato:	20254196
Fecha Contrato:	12 de septiembre de 2025
Valor Contrato:	MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS ($1.986.282.000.00)
Objeto:	El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069
Plazo:	Cuatro (04) meses
Contratista:	PANAVIAS INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES S.A.
Interventor:	SGD INGENIERIA SAS
Supervisor:	Ingeniero Wilber Morillo Arteaga

Pólizas y vigencia:

Vigencia Cumplimiento:	30/06/2026
Vigencia Anticipo:	30/06/026
Vigencia Prestaciones Sociales:	31/12/2028
Vigencia Póliza Estabilidad:	3 años a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo y entrega final de la obra a entera satisfacción.

3. ACTAS DE OBRA

Acta de inicio de obra:	19 de septiembre de 2025
Acta socialización proyecto	01 de octubre de 2025
Cesión de derechos del contrato No. 20254196:	21 de octubre de 2025

4. AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA

- **Estado inicial de la obra.**
  En el municipio de Pasto, la mayor parte de las vías que conforman la red urbana y en especial las vías de la comuna 10 a 12 en la ciudad, han cumplido su periodo de vida útil de servicio por lo que presentan daños y fallas localizadas en su estructura. Esto, aunando el aumento del parque automotor del municipio, en conjunto con los factores climáticos adversos, han incrementado los problemas de transitabilidad vehicular y peatonal, aumento en el tiempo de viajes, costos de operación vehicular, incremento en accidentes de tránsito, deterioro de la imagen del sector y disminución en el nivel de vida de sus habitantes.
  La mayor parte de la malla vial de los sectores a intervenir presentan deterioro en capa de rodadura y en algunos casos deterioro en la estructura, las cuales serán intervenidas para alcanzar un nivel óptimo de transitabilidad.

- **Avance físico**
  Para el periodo comprendido entre el 19 de octubre y 19 de noviembre de 2025, el proyecto alcanza un 1.5 % de avance físico contractual. A continuación, se detalla el avance de las actividades hasta la fecha.

  - Demolición concreto hidráulico

  Durante este nuevo mes, comienza las actividades de demolición para despejar el área del proyecto. Se ha priorizado la remoción de las estructuras existentes en la calzada, en particular reposiciones defectuosas por acometidas domiciliarias y rotura en algunas tapas de cámaras existentes en la vía. El propósito de estas demoliciones es dejar una capa de rodadura uniforme.

ITEM	1.04	Demolicion concreto hidraulico	UN:	M3	CANT:	2.97

DESCRIPCION GRAFICA	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
			Cantid	Longitud	Ancho	Espesor	
	Demolición de concreto hidráulico existente cámara K0+13.90	M3	1.00	1.60	1.90	0.09	0.27
	Negativo Tapa cámara		-1.00	Ø	1.00	0.09	-0.07
	Demolición de concreto hidráulico existente cámara K0+41.50	M3	1.00	2.00	1.30	0.09	0.23
	Negativo Tapa cámara		-1.00	Ø	1.00	0.09	-0.07
	Demolición de concreto hidráulico existente cámara K0+80.20	M3	1.00	1.80	2.40	0.09	0.39
	Negativo Tapa cámara		-1.00	Ø	1.00	0.09	-0.07
	Demolición de concreto hidráulico existente cámara K0+121.80	M3	1.00	1.70	1.00	0.08	0.14
	Negativo Tapa cámara		-1.00	Ø	1.00	0.08	-0.06
	Demolición de concreto hidráulico existente cámara K0+126.80	M3	1.00	1.80	1.80	0.08	0.26
	Negativo Tapa cámara		-1.00	Ø	1.00	0.08	-0.06
	Demolicion estructuras existentes en concreto hidraulico K0+139.80	M3	1.00	3.30	1.00	0.15	0.50
			1.00	0.95	2.35	0.15	0.33
			1.00	2.50	1.00	0.15	0.38
			1.00	1.70	1.05	0.15	0.27
			1.00	1.00	1.70	0.15	0.26
	Demolicion acometida domiciliaria existente K0+159.80	M3	1.00	1.30	0.97	0.06	0.08
	Demolicion acometida domiciliaria existente K0+175.30		1.00	1.80	0.77	0.15	0.21

- Excavación Mecánica en Materiales Varios sin Clasificar

Durante este mes, las actividades de excavación han concluido exitosamente en dos frentes clave del proyecto. Se finalizaron todas las excavaciones necesarias para adecuar el terreno y asegurar una base sólida en las áreas donde se instalará adoquín en los sectores de la floresta y la calle 33 aledaño a la avenida Aranda.

ITEM	1.06	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIALES VARIOS SIN CLASIFICAR.	UN:	M3	CANT:	348.06

DESCRIPCION GRAFICA	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
			Cantid	Longitud	Ancho	Espesor	
	Excavacion mecanica calle 33 entre avenida Aranda y carrera 29 entre la K0+000 y K0+020	M3	1.00	20.00	7.40	0.33	48.84
	Excavacion mecanica calle 33 entre avenida Aranda y carrera 29 entre la K0+020 y K0+060		1.00	40.00	7.50	0.35	105.00
	Excavacion mecanica calle 33 entre avenida Aranda y carrera 29 entre la K0+060 y K0+077.70		1.00	17.70	7.60	0.38	51.12
	Excavacion mecanica calle 33 fallo en interseccion con avenida Aranda K0+077.10	M3	1.00	1.80	7.30	0.20	2.63
	Excavacion mecanica calle 33 fallo K0+000	M3	1.00	2.00	3.50	0.20	1.40
	Excavacion mecanica calle costado izquierdo Parroquia San Francisco Javier carrera 28A con calle 31C	M3	1.00	58.00	6.31	0.38	139.07

- Retiro y Disposición de Material Sobrante con pago de escombrera.

Durante este mes, iniciaron labores de retiro y disposición de material, se llevó a cabo la evacuación del material saliente por medio de volquetas, también se realizaron actividades de cargue a mano para asegurar la limpieza del área, la optimización de la eficiencia en zonas específicas del proyecto y el cumplimiento de todas las normativas ambientales.

ITEM	1.07	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	UN:	M3	CANT:	348.03

DESCRIPCION GRAFICA	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
			Cantid	Longitud	Ancho	Espesor	
	Desalojo excavacion mecanica carrera 19 fase 2 desde la K0+286,6 hasta la K0+306.80	M3	1.00	20.00	7.60	0.33	50.16
	Desalojo excavacion mecanica calle 33 entre avenida Aranda y carrera 29 entre la K0+020 y K0+060		1.00	40.00	7.50	0.35	105.00
	Desalojo excavacion mecanica calle 33 entre avenida Aranda y carrera 29 entre la K0+060 y K0+077.70		1.00	17.70	7.40	0.38	49.77
	Desalojo excavacion mecanica calle 33 fallo en interseccion con avenida Aranda K0+077.10	M3	1.00	1.80	7.30	0.20	2.63
	Desalojo excavacion mecanica calle 33 fallo K0+000	M3	1.00	2.00	3.50	0.20	1.40
	Desalojo excavacion mecanica calle costado izquierdo Parroquia San Francisco Javier carrera 28A con calle 31C	M3	1.00	58.00	6.31	0.38	139.07

- Compactación de la Subrasante:

Con el objetivo de asegurar una base sólida para la nueva estructura vial, se llevó a cabo la compactación de la subrasante en las áreas donde se ha trabajado. Este paso es esencial para mejorar la estabilidad del terreno y garantizar que tenga la capacidad de carga necesaria para soportar las siguientes capas de la carretera. Con este proceso, la vía está lista para continuar con las próximas fases de construcción.

ITEM	2.01	COMPACTACIÓN SUBRASANTE	UN:	M2	CANT:	1900.96

DESCRIPCION GRAFICA	DESCRIPCION	UN	DIMENSIONES				Valor
			Cantid	Longitud	Ancho	Espesor	
	Compactacion subrasante carrera 19 frente a Bloques de Monterey carril izquierdo subiendo desde la abscisa K0+000 hasta la K0+101.10	M2	1.00	101.80	3.55		361.39
	Negativo tapas de camaras existentes desde la la abscisa K0+000 hasta la K0+101.10		-1.00	1.70	1.90		-3.23
			-1.00	1.30	1.90		-2.47
			-1.00	1.80	2.40		-4.32
	Compactacion subrasante carrera 19 con calle 33 en ambos carriles desde la abscisa K0+101.10 hasta la K0+131.10	M2	1.00	10.00	7.60		76.00
			1.00	10.00	7.50		75.00
			1.00	10.00	7.20		72.00
	Negativo tapas de camaras existentes desde la la abscisa K0+101.10 hasta la K0+131.10		-1.00	1.80	1.80		-3.24
			-1.00	2.40	3.10		-7.44
	Compactacion subrasante carrera 19 con calle 33 en ambos carriles desde la abscisa K0+131.10 hasta la K0+178.50	M2	1.00	10.00	7.30		73.00
			1.00	10.00	7.50		75.00
			1.00	10.00	7.10		71.00
			1.00	10.00	7.10		71.00
			1.00	10.00	7.12		71.20
			1.00	6.50	7.12		46.28
	Negativo tapas de camaras existentes desde la la abscisa K0+131.10 hasta la K0+178.50		-1.00	2.00	1.70		-3.40
	Compactacion subrasante calle 33 entrre avenida aranda y carrera 29	M2	1.00	77.70	7.30		567.21
	Compactacion subrasante calle costado izquierdo Parroquia San Francisco Javier carrera 28A con calle 31C		1.00	58.00	6.31		365.98

- Avance de tiempo.
  Con corte al 19 de noviembre de 2025, el proyecto ha completado 2 de los 4 meses del plazo contractual. Esto representa un avance de tiempo del 50%, demostrando un retraso en la ejecución dentro del cronograma establecido.

- Avance financiero.
  Hasta la fecha el proyecto no ha tenido un avance financiero significativo siendo así que el 1.5% del valor del contrato se haya ejecutado, lo que se traduce en $7,386,425.00

- Control Ambiental y Señalización
  De acuerdo con el instructivo IN-I-002, se confirma la ejecución efectiva y completa del plan de acción socioambiental. Esto asegura que las medidas para mitigar impactos sociales y ambientales se han implementado cabalmente. Asimismo, se ha verificado el cumplimiento riguroso del Plan de Manejo de Tráfico (PMT) de señalización en todas las actividades del proyecto. Esto garantiza la seguridad y fluidez vehicular en las zonas de obra.

- Comparación con lo programado.
  De acuerdo con el cronograma contractual, el proyecto debería haber alcanzado un 50% de avance para el 19 de noviembre de 2025. El avance real de la obra es del 1.5% demostrando un retraso significativo en el cronograma.

- Análisis de problemas surgidos y emisión concepto técnico de alternativas de solución.
  Hasta el momento no ha surgido ningún problema significativo ni con la población ni en obra.

5. ENSAYOS DE LABORATORIO

Hasta la fecha de corte de 19 de octubre de 2025 no se ha llevado a cabo ningún ensayo de laboratorio por parte de contratista.

6. BALANCE FINANCIERO

Breve descripción de los pagos, amortizaciones y saldo del contrato.

Concepto	Valor	Amortización	Pagos	Saldo
Valor del Contrato	$1.986.282.000.00			
Pago anticipo	-	-	-	-
Pago Actas parciales	-	-	-	-
Pago Acta Final	-	-	-	-
Totales	$1.986.282.000			

7. ACTAS Y PREACTAS ANEXAS AL CONTRATO DE OBRA.

Conforme al seguimiento realizado para el periodo de reporte correspondiente al mes de octubre, se constató que el contratista no radicó ante la administración municipal ninguna documentación de soporte para cobro, incluyendo actas y preactas, lo que resultó en la ausencia de facturación para el periodo.

8. SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	DESCRIPCION DEL CUMPLIMENTO	ESTADO DE EJECUCIÓN
1.	Preparar, implementar y mantener un sistema de aseguramiento de la calidad de las obras.	Avance similar al programado.	En proceso
2.	Estudiar y analizar los planos, informes, especificaciones suministradas por el Municipio de Pasto para la ejecución de las obras.	Avance similar al programado.	En proceso
3.	Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a las obras del proyecto, teniendo en cuenta los procesos de elaboración de los materiales y exigir a los proveedores los certificados de garantía de calidad que avalen el cumplimiento de la calidad específica.	Avance similar al programado.	En proceso
4.	Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyectos, para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.	Avance similar al programado.	En proceso
5.	Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificación, control y seguimiento de los programas de construcción de las obras.	Avance similar al programado.	En proceso
6.	Mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de las obras en relación con su avance, calidad y costo.	Avance similar al programado.	En proceso
7.	Determinar, en coordinación con la Supervisión y/o Interventoría los presupuestos de las obras extras o adicionales.	Avance similar al programado.	En proceso

8.	Preparar y presentar cuando la Alcaldía de Pasto lo requiera, informes técnicos y de programación, en los cuales se analice el programa de ejecución de los trabajos, los documentos de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demás aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras día a día. Sin embargo, se deberá presentar informes quincenales escritos y fotográficos con los anteriores aspectos.	Avance similar al programado.	En proceso
9.	El proponente deberá mantener mínimo un (01) frente de trabajo, para la ejecución del contrato, el no acatamiento dará lugar a la aplicación de la póliza única por incumplimiento. Para tal efecto, deberá mantener personal calificado y competente en número suficiente para un adecuado y oportuno desempeño de las obligaciones. El personal mínimo será: un (1) director de obra, además el personal técnico administrativo consistirá en: un (01) residente de obra, cuya permanecía en obra será del 100%, un (01) residente SISO, cuya permanencia en obra será del 30%, un (1) técnico auxiliar SISO, cuya permanencia en obra será del 100%; cuyos currículos se presentarán a la Supervisión y/o Interventoría para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos.	No cumple	Pendiente
10.	Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.	Avance similar al programado.	En proceso
11.	Realizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendados.	Avance similar al programado.	En proceso

12.	Asistir a reuniones periódicas con el Municipio, con el objeto de analizar todos los aspectos que requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecución de las obras, a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de obra, control de costos, problemas de diseño, reclamaciones, entre otras.	Avance similar al programado.	En proceso
13.	Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos	No cumple	Pendiente
14.	Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad industrial de todo el personal que tenga acceso a las obras en forma permanente o temporal.	Avance similar al programado.	En proceso
15.	Atender de forma oportuna todos los requerimientos de tipo jurídico y administrativo derivados de reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden debidamente resueltos.	Avance similar al programado.	En proceso
16.	Responder por daños causados a terceros en desarrollo del contrato, igualmente responderá por los daños que se deriven del incumplimiento del contrato.	Avance similar al programado.	En proceso
17.	Ejecutar trabajos y obras contratadas de acuerdo con el programa de trabajo e inversiones presentado y aprobado por el Supervisor y/o Interventor.	Avance similar al programado.	En proceso

18.	Realizar los contratos laborales de todo el personal que trabaje en las obras y realizar las respectivas afiliaciones a seguridad social a nombre del empleador (Contratista), su verificación será mediante los soportes generados por la nómina electrónica ante la DIAN.	Avance similar al programado.	En proceso
19.	Llevar registro completo del equipo de construcción, indicando el modelo, marca, serie, capacidad, potencia, estado, utilización entre otros.	Avance similar al programado.	En proceso
20.	Ejecutar las demás actividades afines que sean propias con la ejecución del objeto contractual. Al finalizar las obras, el contratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto efectuarán una visita de inspección a las mismas con el objeto de determinar su estado	Avance similar al programado.	En proceso
21.	Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que le pertenezcan o que se hayan usado bajo su dirección, a más tardar el último día de ejecución de la obra, en caso de que no cumpla con esta obligación, el Municipio realizará los trabajos y cargará su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final.	Avance similar al programado.	En proceso
22.	El Contratista se obliga al cumplimiento de lo establecido en el numeral 3.5. GESTIÓN AMBIENTAL - PLAN DE MANEJOAMBIENTAL de los estudios previos que hacen parte integral del respectivo proceso de contratación.	Avance similar al programado.	En proceso
23.	Instalar una valla informativa sobre el proyecto.	Avance similar al programado.	En proceso

24.	Las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de la ingeniería para la ejecución de obras, que respete el entorno natural y social del área de influencia, en el cual se desarrolla para el efecto, dará estricto cumplimiento al PAGA (Programa de Adaptación de las Guías Ambientales). El PAGA debe corresponder al objeto y alcance de la obra y una vez aprobado, es el soporte contractual para el seguimiento y control ambiental por parte del Supervisor y/o Interventor	Avance similar al programado.	En proceso

8. ANEXOS AL INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISION.

ANEXO 1 – Avance cronograma de obra.
ANEXO 2 – Estado general del tiempo.
ANEXO 3 – Control diario del personal del contratista de obra.
ANEXO 4 – Control diario del equipo del contratista de obra.
ANEXO 5 – Control Ambiental y señalización de Obras.
ANEXO 6 – Bitácora de obra.
ANEXO 7 – Oficio por parte de interventoría solicitando planillas de seguridad social a contratista

ANEXO 1

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

PERIODO 19 DE OCT A 19 DE NOV 2025

CONTRATO No: 20254196 CONTRATISTA PANAVIAS SA OBRA: El CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)

ITEM	DESCRIPCION / DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
001	Corte pavimento asfáltico con cortadora																														
002	Corte pavimento rígido con cortadora																														
003	Demolición pavimento asfáltico compresor																														
004	Demolición concreto hidráulico								x	x	x	x	x																		
005	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco																														
006	Excavación mecánica en materiales varios sin clasificar.	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x
007	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x
008	Compactación subrasante	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x	x	x	x			x	x
009	Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %																														
010	Base granular																														
011	Base granular para bacheo																														
012	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19, incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible.																														
013	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para parcheo, Incluye imprimación y sello de juntas en pavimento flexible.																														
014	Adoquín en concreto tipo cruz, 10 cm de espesor incluye suministro, instalación y base arena de 5cm.																														
015	Concreto premezclado 4000 psi acelerante a 3 días parcheo																														
016	Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17,5 Mpa (2500 PSI), altura 15 cm y espesor de 12.5 cm																														
017	Acero de refuerzo de resistencia 420 Mpa																														
018	Juntas pavimento rígido, incluye corte y sellado.																														
019	Reconstrucción sumidero tipo empopasto																														

Interventor

Contratista

ANEXO 2

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MES 19 DE OCT A 19 DE NOV 2025

CONTRATO No: 20254196 CONTRATISTA *Panavias e Ingeniería & Construcciones S.A.* OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO

DIA / Estado del Tiempo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
seco mañana																															
seco tarde																															
lluvia mañana	X				X							X			X	X		X				X	X	X					X		
lluvia tarde		X	X	X				X	X	X	X						X		X						X	X				X	

Interventor

Panavias e Ingeniería & Construcciones S.A.
Contratista

ANEXO 3

DEPENDENCIA: SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION MES 19 DE OCT A 19 DE NOV 2025

CONTRATO No: 20254196 CONTRATISTA *Panavias e Ingeniería & Construcciones S.A.* OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069).

DIA / PERSONAL EN OBRA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
INGENIERO RESIDENTE OBRA	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	
INGENIERO DIRECTOR OBRA					X					X								X					X	X						X	
SISO	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	
MAESTRO OBRA	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	
ALBAÑIL	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	
AYUDANTE OBRA	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	
OPERADOR MOTONIVELADORA	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	
OPERADOR VIBROCOMPACTADOR	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	
CONDUCTOR VOLQUETA	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	
OPERADOR RETROEXCAVADORA CAT	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	
OPERADOR RETROCARGADOR																															
OPERADOR COMPRESOR MARTILLO NEUMATICO																															
CONDUCTOR CAMIONETA																															
TOPOGRAFO									X	X							X														
CADENERO									X	X							X														

Interventor

Panavias e Ingeniería & Construcciones S.A.
Contratista

ANEXO 4

DEPENDENCIA: SECREATRIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION — MES: nov-22

CONTRATO No: LP-2025-6 — CONTRATISTA: Panavias e Ingeniería & Construcciones S.A. — OBRA: MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10

DIA / EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MOTONIVELADORA																															
VIBROCOMPACTADOR RODILLO 7 TON	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	
VOLQUETA DOBLETROQUE	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	
VOLQUETA SENCILLA	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	
RETROEXCAVADORA ORUGA																															
RETROCARGADOR "PAJARITA"	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A			A	A	
COMPRESOR AIRE + MARTILLO NEUMATICO PARA DEMOLICIONES																															
CAMIONETA ESTACAS																															
ESTACION TOTAL									A	A							A	A													

CONVENCIONES

ACTIVO = **A**

REPARACION = **R**

INACTIVO = **I**

0 — Interventor

Panavias e Ingeniería & Construcciones S.A. — Contratista

ANEXO 5

PROYECTO			
"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA, PROMOVIENDO UNA CONECTIVIDAD EFICIENTE Y SEGURA, VIGENCIA 2025 DEL MUNICIPIO DE PASTO"			
NOMBRE CONTRATISTA:	PANAVIAS SA	**NIT:**	**901282606-0**
NOMBRE INTERVENTORÍA:	SGD INGENIERIA SAS	**NIT:**	**891201840-6**
CONTRATO No:	20254196	**FECHA INICIO OBRA:**	19 DE SEPTIEMBRE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION MALLA VIAL URBANA COMUNAS 10 a 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO (SU-0045-069)		

I. LISTADO DE IMPACTOS AMBIENTALES MÁS SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO

ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	CALIFICACIÓN
	NO SE ENCUENTRAN IMPACTOS	

II. PROGRAMAS AMBIENTALES A IMPLEMENTAR

1. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPO EN OBRA	☑
2. PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO	☑
3. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES	☐
4. PROGRAMA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	☐
5. PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y EL AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA	☑
6. PROGRAMA PARA EL CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS	☑
7. PROGRAMA DE USO Y ALMACENAMIENTO ADECUADO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	☑
8. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DE LA FLORA Y FAUNA	☑
9. PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN	☑

III. LUGARES DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBRANTE

NOMBRE ESCOMBRERA	LOCALIZACIÓN	No. RESOLUCIÓN AMBIENTAL	AUTORIDAD AMBIENTAL QUE AUTORIZA

IV. PROVEEDORES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

TIPO DE MATERIAL	NOMBRE DEL PROVEEDOR	UBICACIÓN DE LA FUENTE DE MATERIALES	No. RESOLUCIÓN AMBIENTAL

Nota: anexar registro

V. CAMPAMENTOS

APLICA SI ☐ NO ☑

CUENTA CON ZONAS DE COMIDA, VESTIER, OFICINAS, ETC
SI ☐ NO ☑

No. DE BAÑOS CERO

LAS ZONAS SE ENCUENTRAN SEÑALIZADAS
SI ☑ NO ☐

SE ESTABLECEN RUTAS DE EVACUACIÓN
SI ☐ NO ☑

VI. MAQUINARIA Y EQUIPOS EN OBRA

No. VOLQUETAS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN OBRA: CERO

No. VEHÍCULOS CON CERTIFICACIÓN TÉCNICOMECANICA VIGENTE: CERO

VII. GESTIÓN DE LA FAUNA Y LA FLORA

No. DE ÁRBOLES PRESENTES EN LA ZONA A INTERVENIR: NO APLICA

No. DE ÁRBOLES PROTEGIDOS: NO APLICA

No. DE ÁRBOLES TRASPLANTADOS: NO APLICA

No. DE ÁRBOLES TALADOS: NO APLICA

ÁREA DE COBERTURA VEGETAL REMOVIDA: NO APLICA

ÁREA DE COBERTURA VEGETAL REUTILIZADA: NO APLICA

LA CAPA VEGETAL FUE ALMACENADA Y PROTEGIDA: SI ☐ NO ☑


SE REALIZÓ RESCATE O TRASLADO DE ALGUNA ESPECIE ANIMAL: SI ☐ NO ☑

SE IMPLEMENTA EL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO: SI ☐ NO ☑

CONTRATISTA	SUPERVISIÓN	INTERVENTORIA
PANAVIAS SA	WILBER MORILLO	SGD INGENIERIA SAS


REHABILITACIÓN ANTIGUA SALIDA NORTE
PASO ALTERNADO CIERRE A MEDIA CALZADA
TRANSITE CON PRECAUCIÓN

ANEXO 6

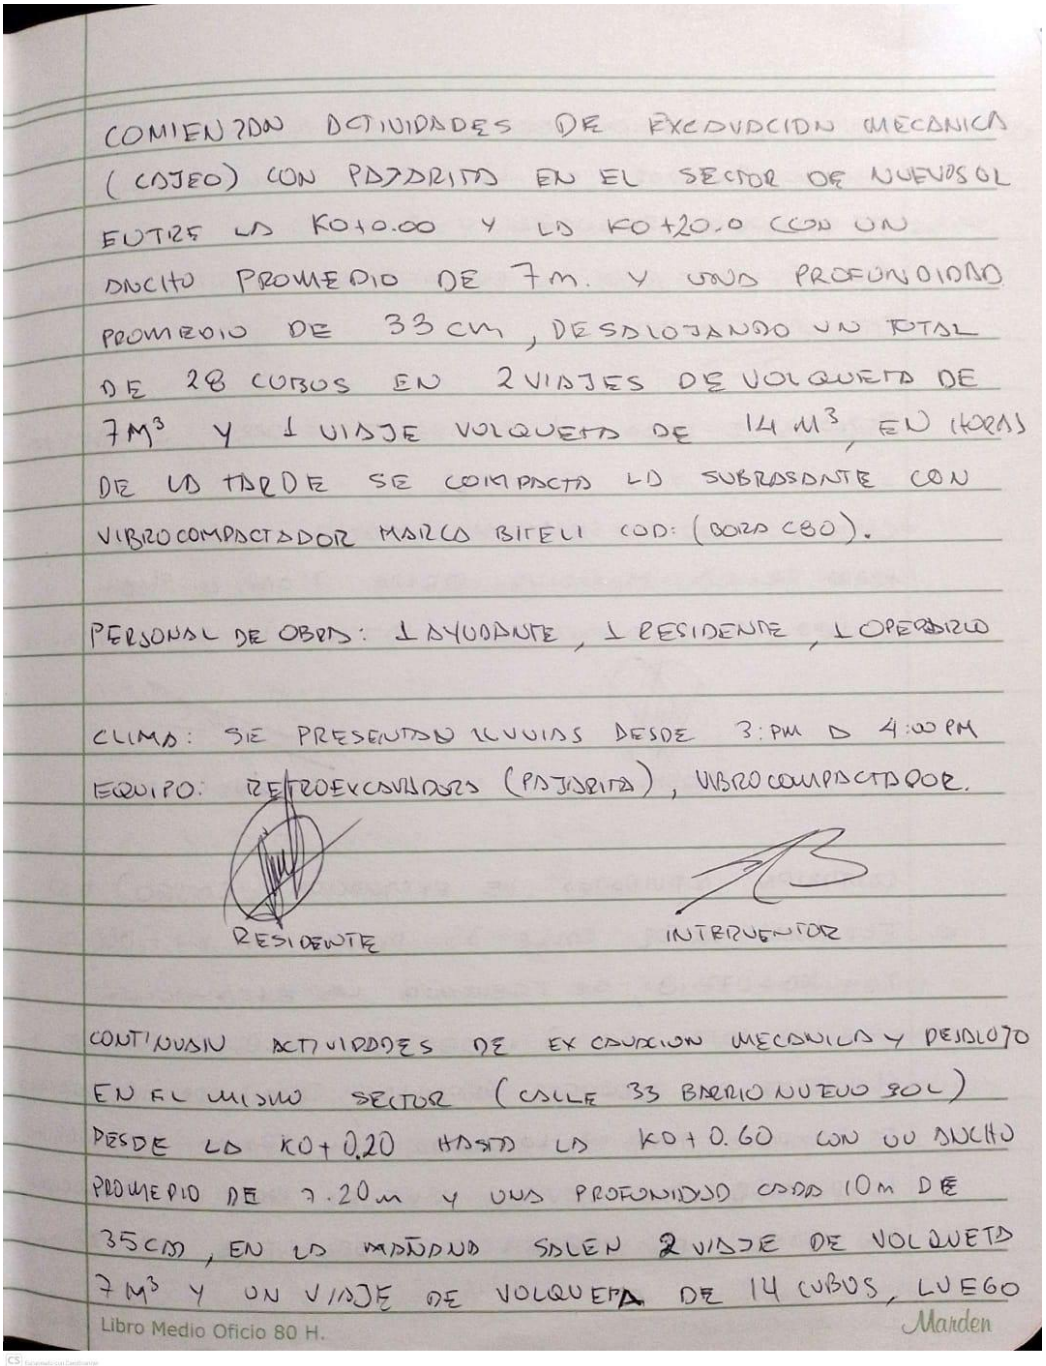

COMIENZAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MECANICA (CAJEO) CON PAJARITA EN EL SECTOR DE NUEVO SOL ENTRE LA KO+0.00 Y LA KO+20.0 CON UN ANCHO PROMEDIO DE 7m. Y UNA PROFUNDIDAD PROMEDIO DE 33 CM, DESALOJANDO UN TOTAL DE 28 CUBOS EN 2 VIAJES DE VOLQUETA DE 7M³ Y 1 VIAJE VOLQUETA DE 14 M³, EN HORAS DE LA TARDE SE COMPACTA LA SUBRASANTE CON VIBROCOMPACTADOR MARCA BITELI COD: (BORA C80).

PERSONAL DE OBRA: 1 AYUDANTE, 1 RESIDENTE, 1 OPERARIO

CLIMA: SE PRESENTAN LLUVIAS DESDE 3:PM A 4:00 PM

EQUIPO: RETROEXCAVADORA (PAJARITA), VIBROCOMPACTADOR.

RESIDENTE

INTERVENTOR

CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION MECANICA Y DESALOJO EN EL MISMO SECTOR (CALLE 33 BARRIO NUEVO SOL) DESDE LA KO+0.20 HASTA LA KO+0.60 CON UN ANCHO PROMEDIO DE 7.20m Y UNA PROFUNDIDAD CADA 10m DE 35CM, EN LA MAÑANA SALEN 2 VIAJE DE VOLQUETA 7M³ Y UN VIAJE DE VOLQUETA DE 14 CUBOS, LUEGO

Libro Medio Oficio 80 H.

Marden

EL FRENTE DE TRABAJO SE TRASLADA DESDE LA ANTIGUA SALIDA AL NORTE, COMENZANDO ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL SECTOR DEL BARRIO NUEVO SOL EN LA CALLE 33 ENTRE AVENIDA ARAUJO Y CARRERA 29, PARA INSTALACION DE ADOQUIN, SE INSTALAN 20 GUADUAS, 10 A CADA LADO, CADA 10 METROS PARA PASAR NIVELES.

PERSONAL DE OBRA: 1 ING. RESIDENTE, 1 MAESTRO, 2 AYUDANTES


CLIMA: FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA.

RESIDENTE

INTERVENTOR

CON PERSONAL DE LA ALCALDIA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE PARCHEO Y SUMINISTRO EN EL SECTOR DEL MERCADO DE LOS 2 PUENTES EN LA CARRERA 24 CON AVENIDA SANTANDER, SE RETIRA CARPA ASFALTICA CON EL USO DE PAJARITA; Y SE COMPACTA BASE Y ASFALTO CON EL USO DE BENITIN, SE REALIZAN 3 PARCHES MOSTRADOS EN EL SIGUIENTE ESQUEMA:

Libro Medio Oficio 80 H. Marden

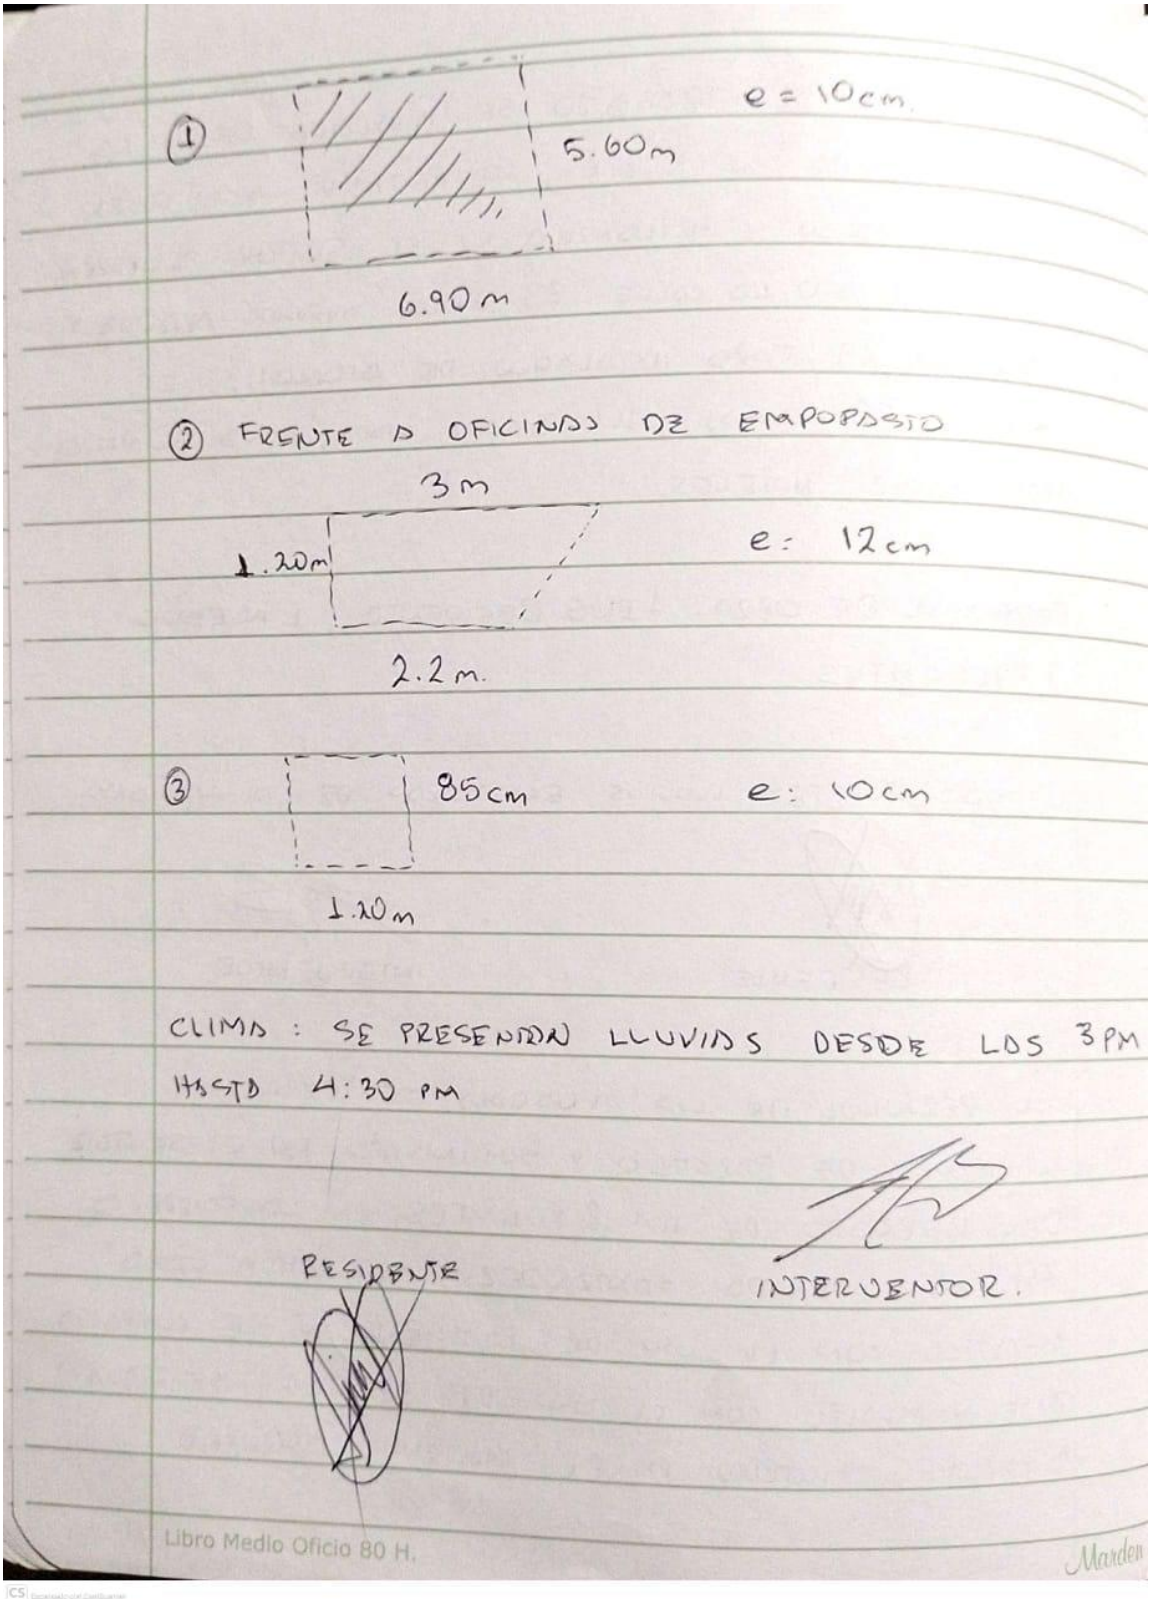
1
5.60m
e = 10cm
6.90 m
2 FRENTE A OFICINAS DE EMPOPASTO
3 m
1.20m
e: 12cm
2.2 m.
3
85cm
e: 10cm
1.20 m
CLIMA : SE PRESENTAN LLUVIAS DESDE LOS 3PM
HASTA 4:30 PM
RESIDENTE
INTERVENTOR.
Libro Medio Oficio 80 H.

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 MAESTRO DE OBRA
1 AYUDANTE, 1 OPERADOR

CLIMA: SE PRESENTAN LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE

EQUIPO: RETROEXCAVADORA Y VIBROCOMPACTADOR.

RESIDENTE

INTERVENTOR.


COMIENZAN ACTIVIDADES DE NIVELACION PARA INSTALACION DE ESTRUCTURAS DE ADOQUIN, SEGUN DISEÑOS ENTREGADOS POR ALCALDIA. LOS ESPESORES SON LOS SIGUIENTES:

MEJORAMIENTO CON BASE	15 cm
CAMA DE ARENA	4 cm
ADOQUIN.	10 cm

EL EQUIPO UTILIZADO PARA LA NIVELACION ES LA MOTONIVELADORA. LLEGANDO AL NIVEL REQUERIDO A MEDIO DIA PARA LUEGO COMPACTAR LA SUBRASANTE CON VIBROCOMPACTADOR, SALE 1 VIAJE DE VOLQUETA SENCILLA DE ESCOMBROS. EN HORAS DE LA TARDE LLEGA LA BASE PARA UN TOTAL DE 5 VIAJES DE VOLQUETA DOBLE, LA MOTONIVELADORA ES LA ENCARGADA DE REGAR EL MATERIAL. SE IRRIGA, SE COMPACTA. CON VIBROCOMPACTADOR

Libro Medio Oficio 80 H.

Marden

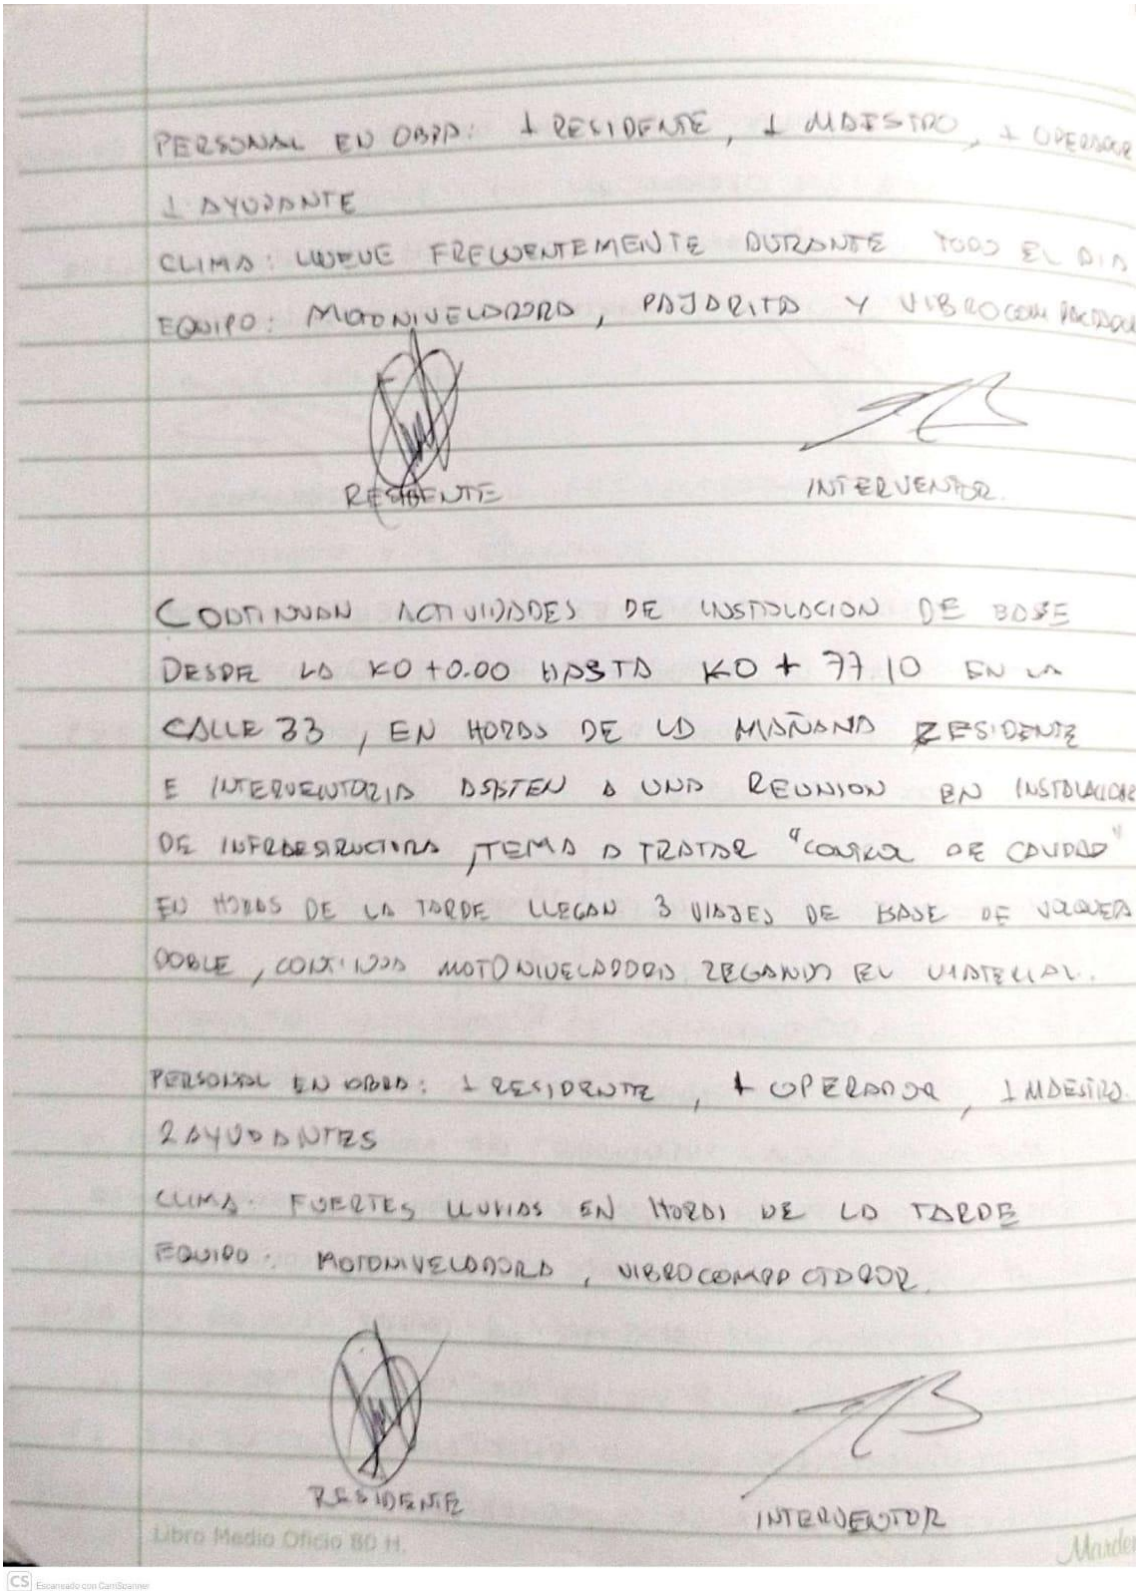

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE, 1 MAESTRO, 1 OPERADOR
1 AYUDANTE
CLIMA: LLUEVE FRECUENTEMENTE DURANTE TODO EL DIA
EQUIPO: MOTONIVELADORA, PAJARITA Y VIBROCOMPACTADOR

RESIDENTE

INTERVENTOR

CONTINUAN ACTIVIDADES DE INSTALACION DE BASE DESDE LA KO+0.00 HASTA KO+77.10 EN LA CALLE 33, EN HORAS DE LA MAÑANA RESIDENTE E INTERVENTORIA ASISTEN A UNA REUNION EN INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA, TEMA A TRATAR "CARGA DE CAUDAL" EN HORAS DE LA TARDE LLEGAN 3 VIAJES DE BASE DE VOLQUETA DOBLE, CONTINUA MOTONIVELADORA LEGANDO EL MATERIAL.

PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE, 1 OPERADOR, 1 MAESTRO
2 AYUDANTES
CLIMA: FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA TARDE
EQUIPO: MOTONIVELADORA, VIBROCOMPACTADOR

RESIDENTE

INTERVENTOR

Libro Medio Oficio 80 H.

Escaneado con CamScanner

CONTINUAN ACTIVIDADES DE CONFORMACION DE BASE PARA EL MISMO SECTOR CALLE 33, LLEGAN 2 VIAJES DE MATERIAL EN LA MAÑANA, ESTE SE RIEGO, SE IRRIGA Y SE COMPACTA EN HORAS DE LA TARDE COMIENZAN ACTIVIDADES DE LOCALIZACION Y REPLANTEO EN EL SECTOR DE LA IGLESIA DE ARANDA EN EL COSTADO IZQUIERDO (CARRERA 28A CON CALLE 31C) DONDE SE VA INICIAR APROBACION, EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA REALIZO TRABAJOS Y ENTREGA PLANO DE LEVANTAMIENTO A INTERVENTORIA PARA APROBACION DE ANCHO DE CALZADA DE 6.31 m

PERSONAL DE OBRA : 1 RESIDENTE, 1 OPERADOR, 1 MAESTRO 1 AYUDANTE

CLIMA : SE PRESENTAN LLUVIAS LEVES EN HORAS DEL MAÑANA

EQUIPO : 1 MOTONIVELADORA, 1 VIBROCOMPACTADOR,


RESIDENTE

INTERVENTOR.

CONTINUAN ACTIVIDADES DE CONFORMACION DE BASE POR LA CALLE 33 SECTOR NUEVO SOL PARA LLEGAR A NIVEL DE ARENA.

Marden

Libro Medio Oficio 80 H.

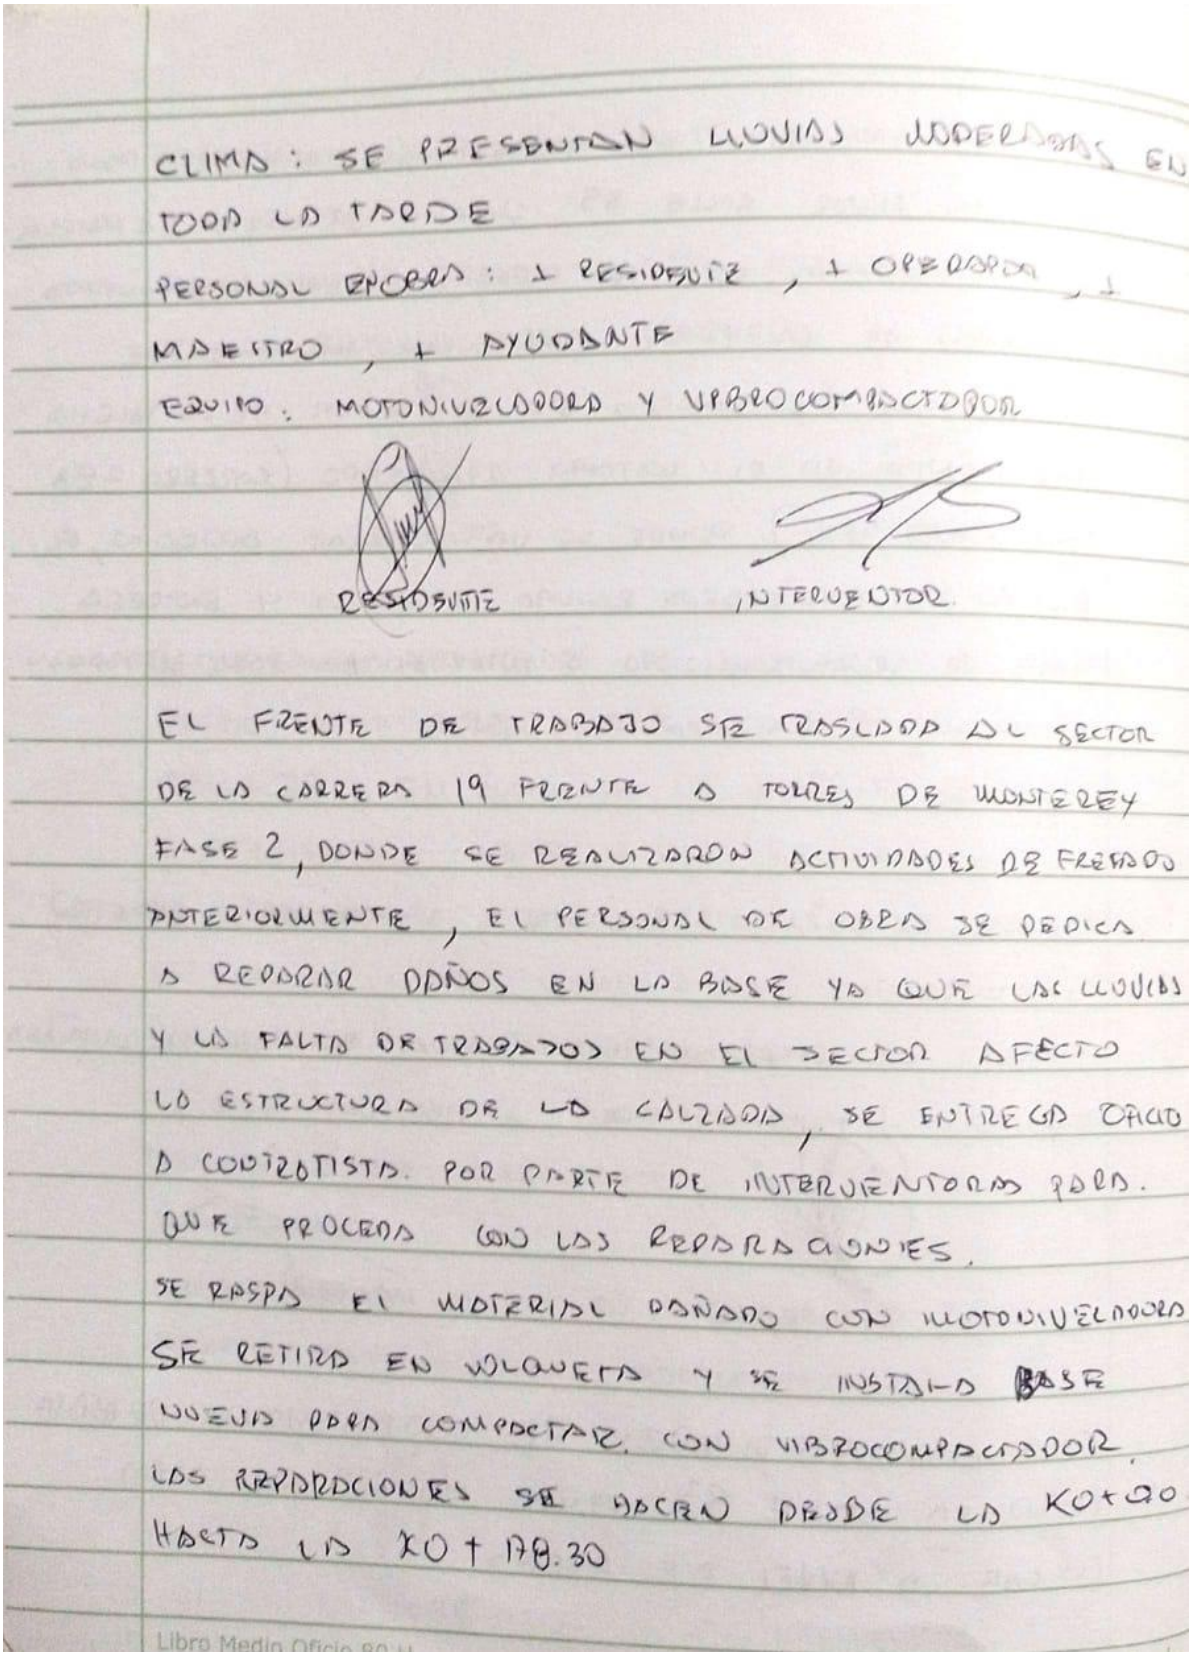

CLIMA: SE PRESENTAN LLUVIAS MODERADAS EN TODA LA TARDE

PERSONAL OBRA: 1 RESIDENTE, 1 OPERADOR, 1 MAESTRO, 1 AYUDANTE

EQUIPO: MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADOR

RESIDENTE

INTERVENTOR

EL FRENTE DE TRABAJO SE TRASLADA AL SECTOR DE LA CARRERA 19 FRENTE A TORRES DE MONTEREY FASE 2, DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE FRESADO ANTERIORMENTE, EL PERSONAL DE OBRA SE DEDICA A REPARAR DAÑOS EN LA BASE YA QUE LAS LLUVIAS Y LA FALTA DE TRABAJOS EN EL SECTOR AFECTO LA ESTRUCTURA DE LA CALZADA, SE ENTREGA OFICIO A CONTRATISTA. POR PARTE DE INTERVENTORIA PARA. QUE PROCEDA CON LAS REPARACIONES.

SE RASPA EL MATERIAL DAÑADO CON MOTONIVELADORA SE RETIRA EN VOLQUETA Y SE INSTALA BASE NUEVA PARA COMPACTAR CON VIBROCOMPACTADOR.

LAS REPARACIONES SE HACEN DESDE LA K0+00 HASTA LA K0+178.30

DE LA EXCAVACION SE COMPACTA LA SUBRASANTE CON VIBROCOMPACTADOR, EN LA TARDE SALEN 2 VIAJES DE VOLQUETA PEQUEÑA Y 2 VIAJES DE VOLQUETA DOBLE. CONTINUA LA COMPACTACION HASTA EL FINAL DE LA JORNADA

PERSONAL DE OBRA: 1 RESIDENTE DE OBRA, 1 MAESTRO 1 AYUDANTE Y 1 OPERADOR.


CLIMA: SE PRESENTAN FUERTES LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA DESDE 7:am a 9:am

EQUIPO: RETROEXCAVADORA (PAJARITA), VIBROCOMPACTADOR

RESIDENTE

INTERVENTOR

CONTINUAN ACTIVIDADES DE EXCAVACION (CAJEO) EN EL MISMO SECTOR CALLE 33 DESDE LA K0+060 A K0+ K0+077.10, SE TERMINA LA EXCAVACION. CON UN TOTAL DE 3 VIAJES DE VOLQUETA DOBLE Y 4 VIAJES DE VOLQUETA SENCILLA, TERMINADA LA EXCAVACION SE COMPACTA TODA LA LONGITUD DEL TRAMO CON VIBRO-COMPACTADOR, SE REVISAN NIVELES PARA LA INSTALACION DE BASE, EL ESPESOR EXCAVADO FUE DE 38 cm

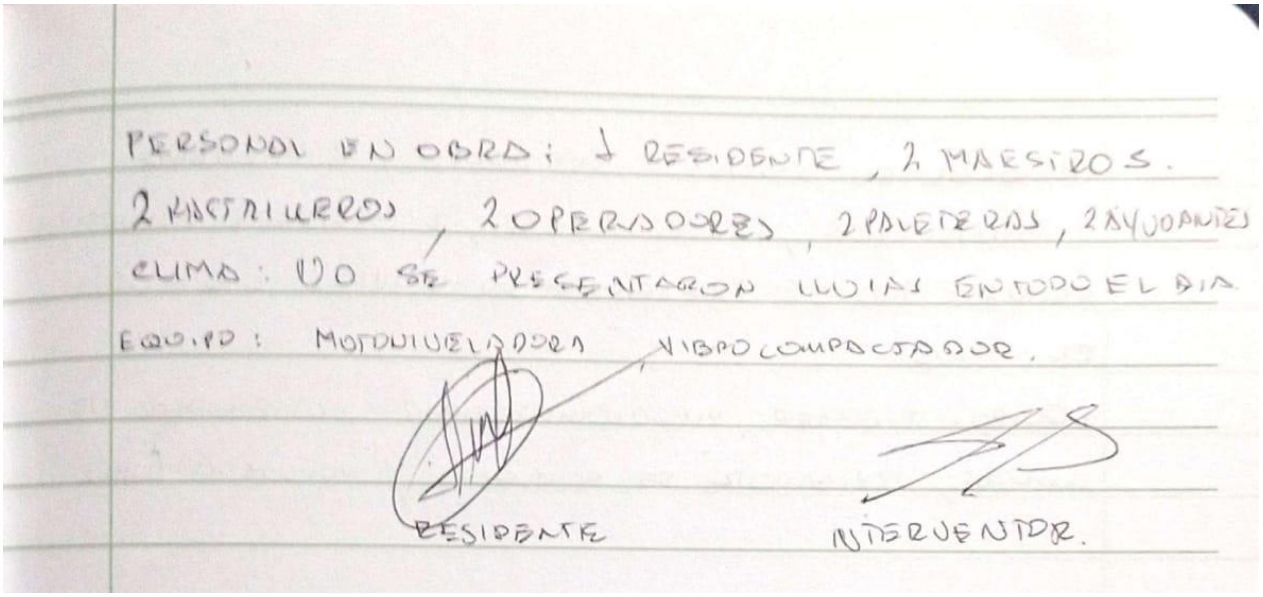
PERSONAL EN OBRA: 1 RESIDENTE, 2 MAESTROS.
2 MAESTRILLEROS, 2 OPERADORES, 2 PALETEROS, 2 AYUDANTES
CLIMA: NO SE PRESENTARON LLUVIAS EN TODO EL DIA
EQUIPO: MOTOSOLDADORA VIBROCOMPACTADOR.
RESIDENTE
INTERVENTOR.

ANEXO 7

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891201940	6	PANAVIAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	OBRA	CCIAL VALLE DE ATRIZ CJF 301	PASTO-NARIÑO	7311118	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	19406701149464798191	E		2025/11/12	2025/11/11	BANCO AV VILLAS	7	$10,228,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

			EMPLEADO																NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	tipo identificacion	Identificacion	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	lnr	vct	irl	vto	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Dias	IBC	Cotizante	Codigo	Aporte	Dias	IBC	Cotizante	Codigo	Aporte	Dias	IBC	Cotizante	Codigo	Aporte	Dias	IBC	Cotizante	Codigo	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
1	CC	98545375	ANO CARLOS	X																	23/01/01	29	$1,376,050	29	$1,376,050	$220,100	ESSC16	29	$1,376,050	$55,100	CCF30	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$1,376,050	$55,100	30	$1,376,050	$55,100	29	$55,100	SI	29	$1,376,050	$55,100	30	$55,100	SI	$426,200
2	CC	98523035	CARVAJAL LUIS																		25-14	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
3	CC	12972684	CHAPAL MANUEL																		25-14	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
4	CC	87110925	CHAVEZ ANTONIO																		23/01/01	0	$0	0	$0	$0	EPS017	0	$0	$0	CCF30	0	$0	$0	14-23	0	$0	$0	30	$0	$0	0	$0	SI	0	$0	$0	30	$0	SI	$23,100
5	CC	98545143	CHAVEZ JESUS																		23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
6	CC	5103802	CHOLLO JUAN																		23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS42	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
7	CC	12979919	DELGADO CARLOS																		23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
8	CC	5087492	DIAZ GERMAN																		23/01/01	0	$0	0	$0	$0	EPS005	0	$0	$0	CCF30	0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
9	CC	98545493	LOPEZ JESUS																		23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
10	CC	27090888	HERNANDEZ MARIA																		23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
11	CC	87214804	JIMENEZ LUIS																		25-14	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
12	CC	98386337	JIMENEZ LIBARDO																		23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
13	CC	98544020	LUCUMI AUGUSTO																		25-14	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
14	SC	7659314	MONTILLA JOSE										X								25-14	16	$759,200	16	$759,200	$121,500	EPS041	16	$759,200	$30,400	CCF30	16	$759,200	$30,400	14-23	16	$759,200	$30,400	30	$759,200	$30,400	16	$30,400	SI	16	$759,200	$30,400	30	$30,400	SI	$121,500
15	SC	7659314	MONTILLA JOSE																		25-14	14	$664,300	14	$664,300	$106,300	EPS041	14	$664,300	$26,600	CCF30	14	$664,300	$26,600	14-23	14	$664,300	$26,600	30	$664,300	$26,600	14	$26,600	SI	14	$664,300	$26,600	30	$26,600	SI	$205,800
16	CC	14695135	MOTOA RICARDO																		23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
17	CC	10891160705	NARVAEZ JAMES										X								23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
18	CC	98545457	NARVAEZ CARLOS																		23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
19	CC	1085336901	OSORIO HELARD	X	X																25-14	1	$47,450	1	$47,450	$7,600	ESSC18	1	$47,450	$1,900	CCF30	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$1,900	30	$47,450	$1,900	1	$1,900	SI	1	$47,450	$1,900	30	$1,900	SI	$14,800
20	CC	27222364	PALACIOS GILMA																		23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
21	CC	12967756	SANTOYA JESUS																		25-14	30	$3,000,000	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF30	30	$3,000,000	$120,000	14-23	30	$3,000,000	$120,000	30	$3,000,000	$120,000	30	$120,000	SI	30	$3,000,000	$120,000	30	$120,000	SI	$928,800
22	CC	12994115	VANIA OSCAR										X								25-14	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	0	$0	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$284,000
23	CC	98545438	ZAMUDIO CARLOS																		23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
24	CC	1085336942	RIVERA EDITH	X	X																23/01/01	1	$47,450	1	$47,450	$7,600	EPS041	1	$47,450	$1,900	CCF30	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	$1,900	30	$47,450	$1,900	1	$1,900	SI	1	$47,450	$1,900	30	$1,900	SI	$14,800
25	CC	12745178	RODRIGUEZ JESUS																		25-14	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
26	CC	1,8006489	RAMIREZ MANUEL										X								25-14	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
27	CC	1087561465	PLAZA DIEGO	X																	23/01/01	0	$0	0	$0	$0	EPS017	0	$0	$0	CCF30	29	$1,206,647	$55,100	14-23	29	$1,376,050	$55,100	30	$1,376,050	$55,100	29	$55,100	SI	0	$0	$0	30	$0	SI	$27,600
28	CC	98545401	PLAZA HERNAN																		23/01/01	30	$1,423,500	30	$1,423,500	$227,800	ESSC18	30	$1,423,500	$57,000	CCF30	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$57,000	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	30	$1,423,500	$57,000	30	$57,000	SI	$440,900
29	CC	98545378	PLAZA LUIS																		25-14	29	$1,376,050	29	$1,376,050	$220,200	EPS037	29	$1,376,050	$55,100	CCF30	29	$1,376,050	$55,100	14-23	29	$1,376,050	$55,100	30	$1,376,050	$55,100	29	$55,100	SI	29	$1,376,050	$55,100	30	$55,100	SI	$426,200
Total	Afiliados(29)																					534,249.550		$13,480,000				538,540.080		$51,341,700			335,573.447		$1,222,900		538,540.080		$52,334,900										$10,183,300
