LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

INFORME No. 4 DE INTERVENTORIA -FINAL
PARA CONTRATO DE INTERVENTORIA N° MC-026-2025



"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

SUPERVISOR DEL CONTRATO:
ARQ. JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA

CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA:
LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

PERIODO EVALUADO:
DEL 12 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2025 Y DEL 08 DE AGOSTO AL 11 DE OCTUBRE DE 2025

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUBARÁ – BOYACÁ
2025

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 5
1. ASPECTOS CONTRACTUALES 6
1.1 PROCESO DE SELECCIÓN 6
1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO 6
2. DIAGNÓSTICO Y ALCANCE DEL PROYECTO 6
2.1 ESTADO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE 6
2.2 ALCANCE DEL PROYECTO 7
2.3 ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 8
2.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 9
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 11
3.1 Generalidades del contrato de interventoría 11
3.1.1 informe contractual – Ficha técnica del contrato de interventoría 11
3.2 GARANTIAS DEL COTRATO 12
3.2.1 Pólizas de legalización 12
3.2.2 Pólizas Ampliadas según acta de inicio 12
3.2.3 Pólizas Ampliadas según actas de suspensión y reinicio No.1 13
3.2.4 Pólizas Ampliadas según Modificación No.02 Adicional No.01 prorroga No. 01 al contrato MC-026-2025 13
3.2.5 Pólizas Ampliadas según acta de recibo final contrato MC-026-2025 14
3.3 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES: 14
3.4 COMITES DE OBRA: 14
3.5 ACTOS ADMINITRATIVOS: 16
4. INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA 17
4.1 Recursos de equipos del consultor 17
4.2 Personal de la interventoría 18
4.3 Seguridad industrial 19
5.0 INTERVENTORIA TECNICA 21
5.1 Actividades generales de la interventoría para el seguimiento técnico de la obra: 21
5.2 Control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio 23
5.3 Certificación de materiales y equipos 26
5.3.1 Equipos de topografía 26
5.3.2 Otros equipos utilizados por la interventoría 27
5.3.3 Certificación de calidad de materiales 28
5.4 Bitácora diaria de obra 29
5.5.1 Personal Profesional 30
5.5.1.1 Residente (Ingeniero civil y/o Arquitecto) 30
5.5.1.2 Supervisor SST o HSE 32
5.5.2 Gastos operacionales 34
5.5.2.1 Gasto de oficina (papelería, impresión de planos y Otros) Edición de informes, fotocopias y reproducciones documentales 34
5.5.2.2 Oficina 35

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

5.5.2.3 Ensayos de laboratorio (resistencia a la compresión de la estructura de concreto) 36
5.6 Control de avance de las actividades de la consultoría 38
5.7 Condiciones contractuales 39
5.7.1 Adición contractual en valor y plazo 41
5.8 Cantidades de interventoría ejecutadas 41
6.0 INTERVENTORIA FINANCIERA 43
7.0 REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENTORIA 45
8. CONCLUSIONES 56

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

CONTENIDO DE TABLAS

Tabla 1. Ficha técnica del contrato de interventoría 11
Tabla 2 Pólizas de legalización contrato de interventoría MC-026-2025 12
Tabla 3 Ampliación de Pólizas contrato de interventoría MC-026-2025, según acta de inicio 13
Tabla 4 Ampliación de Pólizas contrato de interventoría MC-026-2025, ampliadas según acta de reinicio No.1 de fecha 08 de agosto de 2025 13
Tabla 5 Ampliación de Pólizas contrato de interventoría MC-026-2025, ampliadas según Modificación No.02 Adicional No.01 prorroga No. 01 de fecha 11 de septiembre de 2025 13
Tabla 6 Relación de Comité Técnicos del Contrato de Obra No. LP-001-2025 14
Tabla 7 Actos Administrativos Contrato de Interventoría No. MC-026-2025 16
Tabla 8 Personal del contrato de consultoría No. MC-026-2025 en el mes de mayo de 2025 18
Tabla 9 Personal del contrato de consultoría No. MC-026-2025 en el mes de junio de 2025 18
Tabla 10 Personal del contrato de consultoría No. MC-026-2025 en el mes de julio de 2025 18
Tabla 11 Personal del contrato de consultoría No. MC-026-2025 en el mes de agosto de 2025 19
Tabla 12 Personal del contrato de consultoría No. MC-026-2025 en el mes de septiembre de 2025 19
Tabla 13 Resultado de ensayos de laboratorio practicados durante la ejecución del contrato de obra No. LP–001-2025 por parte de esta interventoría 23
Tabla 14 Condiciones contractuales contrato de interventoría MC-026-2025 39
Tabla 15 Cantidades ejecutadas mes 3 contrato de interventoría MC-026-2025 ... 41
Tabla 16 Avance total del contrato de interventoría MC-026-2025 44

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

INTRODUCCIÓN

Mediante la Licitación Pública No. LP-001-2025, la Alcaldía Municipal de Cubará adjudicó a la firma PCA GROUP S.A.S., representada legalmente por la señora Ximena Damaris Mora Buitrago, la ejecución del proyecto "Reposición del sistema de alcantarillado sanitario en la Calle No. 3 entre la Vía Nacional y la Carrera No. 2 del municipio de Cubará, Departamento de Boyacá".

La supervisión integral del contrato de obra fue ejercida a través del Contrato de Interventoría No. MC-026-2025, suscrito con la Ingeniera Leidy Diana Trigos Jiménez, quien tuvo a su cargo la interventoría técnica, administrativa y financiera del proyecto, velando por el cumplimiento de las especificaciones contractuales, normativas y de calidad durante todo el proceso constructivo.

Se conformó un equipo interdisciplinario de interventoría cuyo objetivo fue garantizar que las actuaciones del contratista se ajustaran a lo pactado, promoviendo la transparencia, la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la obtención de una obra de calidad, ejecutada en los tiempos establecidos y en beneficio directo de la comunidad.

El presente documento constituye el Informe Final de Interventoría correspondiente al cuarto mes de seguimiento, y consolida la totalidad de las actividades desarrolladas entre el 12 de mayo y el 11 de octubre de 2025, fecha en que se culminaron los trabajos de obra. En él se registró el avance físico y financiero acumulado, se verificó el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y de seguridad, y se documentó el cierre administrativo y contractual del proyecto, tras la firma del Acta de Recibo Final el 14 de octubre de 2025(siguiente día hábil).

La labor de interventoría se rigió por lo establecido en el pliego de condiciones, los diseños aprobados, la normatividad de contratación estatal y los principios de eficiencia, economía y transparencia que orientan la gestión pública.

Este informe es dirigido a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas del Municipio de Cubará, con el propósito de dejar constancia formal de la ejecución satisfactoria del contrato, sustentar la entrega final de la obra y aportar las recomendaciones pertinentes para su adecuada operación y mantenimiento.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

1. ASPECTOS CONTRACTUALES

1.1 PROCESO DE SELECCIÓN

La Administración Municipal de Cubará adelantó el proceso de selección mediante la invitación pública No. MC-026-2025, con respaldo presupuestal mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000265 del 28 de abril de 2025, destinado a contratar la interventoría del proyecto de reposición del sistema de alcantarillado sanitario.

1.2 CELEBRACION DEL CONTRATO

Se procedió a la suscripción del contrato de interventoría No. MC-026-2025 el día doce (12) de mayo de 2025 entre el señor alcalde del Municipio de Cubará y la firma contratista LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ, el cual tiene por objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No. 3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No. 2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.", con un valor de TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($33.049.275).

2. DIAGNÓSTICO Y ALCANCE DEL PROYECTO

2.1 ESTADO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE

Antes del inicio de la ejecución del contrato de obra, la red de alcantarillado sanitario existente en la Calle No. 3, entre la Vía Nacional y la Carrera No. 2 del municipio de Cubará, presentaba un avanzado deterioro en su infraestructura, con tramos colapsados, sedimentación interna y obstrucciones frecuentes que impedían el correcto flujo de las aguas residuales.

Se evidenciaron además acometidas domiciliarias en mal estado, diferencias en diámetros de tubería y presencia de materiales no acordes con las especificaciones técnicas vigentes, lo cual ocasionaba reboses e infiltraciones que afectaban la salubridad y el bienestar de la comunidad.

Estas condiciones fueron diagnosticadas en la etapa previa al inicio de la obra y constituyeron la base técnica que justificó la intervención.

Con la ejecución del proyecto, dichas deficiencias fueron corregidas en su totalidad, logrando la renovación completa del sistema sanitario en el tramo

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202 | 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

objeto del contrato, garantizando la funcionalidad y durabilidad de la nueva red instalada.

2.2 ALCANCE DEL PROYECTO

El contrato de obra No. LP-001-2025 comprendió la reposición del sistema de alcantarillado sanitario en la Calle No. 3 entre la Vía Nacional y la Carrera No. 2 del municipio de Cubará, Departamento de Boyacá.

Dentro de su alcance se incluyó la instalación de tubería sanitaria en PVC, la construcción de pozos de inspección y cajas domiciliarias, así como la ejecución de obras complementarias necesarias para la correcta operación del sistema, incluyendo reposición de andenes y recuperación de las zonas intervenidas.

El proyecto fue ejecutado conforme a los diseños y especificaciones técnicas aprobadas, bajo la supervisión permanente de la interventoría, cumpliendo los objetivos de mejorar el sistema de evacuación de aguas residuales y optimizar las condiciones sanitarias del sector.

A la fecha de terminación del contrato (11 de octubre de 2025), la totalidad de las actividades programadas fueron finalizadas y verificadas satisfactoriamente, alcanzando un avance físico del 100% y permitiendo la suscripción del acta de recibo final el 14 de octubre de 2025.

2.2.1 Objetivo técnico de la intervención

El proyecto tuvo como finalidad garantizar el transporte eficiente de las aguas residuales domésticas hacia el sistema de tratamiento, minimizando los riesgos de rebosamientos e infiltraciones, y contribuyendo de manera directa a la mejora de las condiciones sanitarias y de salubridad del sector intervenido.

Para ello, se ejecutó la instalación de una nueva red sanitaria construida con materiales y procedimientos que cumplen con los estándares técnicos y de calidad establecidos en las normas nacionales e internacionales vigentes, garantizando la durabilidad, funcionalidad y operatividad del sistema.

2.2.2 Actividades a ejecutar

El contrato de obra contempló, entre otras, las siguientes actividades específicas, las cuales fueron ejecutadas en su totalidad y verificadas por la interventoría durante el proceso constructivo:

- Localización y replanteo topográfico.
- Excavación mecánica y manual en conglomerado.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

- Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC Ø 8" y Ø 6".
- Instalación de accesorios: kit silla YEE 8"x6", kit de codo en PVC 45° 6", con hidrosellos.
- Construcción de cajas de inspección de 0,60 x 0,60 x 0,60 m en concreto reforzado.
- Relleno compactado con material de la excavación.
- Retiro y disposición final del material sobrante.
- Aplicación de arena para protección de tubería.
- Emboquillado de tubería.
- Construcción de solado de limpieza en concreto de 2.500 PSI (E=0,05 m).
- Construcción de placa de fondo en concreto de 3.000 PSI (E=0,10 m).
- Instalación de anillo y tapa en concreto reforzado de 3.000 PSI para pozos (Dext=1,40 m).
- Construcción de cañuelas en concreto 3.000 PSI para pozos y cajas de registro.
- Demolición de placas en concreto de 3.000 PSI.
- Reposición de andenes en concreto de 3.000 PSI (E = 0,10 m).
- Obras complementarias y limpieza final del área intervenida.

Cada una de estas actividades fue revisada y aprobada por la interventoría, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normas de calidad, localización exacta de los elementos instalados y el cronograma contractual establecido.

2.3 ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

El proyecto ejecutado se enmarca dentro de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Municipal de Cubará, orientado al fortalecimiento de la infraestructura básica de saneamiento, la mitigación de riesgos sanitarios y la promoción de un entorno urbano más saludable y sostenible.

La ejecución de esta obra contribuyó al mejoramiento integral de la calidad de vida de los habitantes del sector intervenido, al reducir las fallas del sistema de alcantarillado y prevenir afectaciones ambientales y de salud pública.

El cumplimiento del 100% del alcance físico programado y la recepción final a satisfacción reflejan el compromiso institucional con la eficiencia en la inversión de los recursos públicos y la sostenibilidad de las soluciones implementadas.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO


2.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolló en la zona urbana del municipio de Cubará, ubicado en el Departamento de Boyacá, al nororiente del país, en límites geográficos con la República de Venezuela y el Departamento de Arauca.

La intervención se concentró específicamente en la Calle No. 3, en el tramo comprendido entre la Vía Nacional y la Carrera No. 2, sector donde se identificaron fallas estructurales y funcionales en el sistema de alcantarillado sanitario existente. Estas condiciones motivaron la priorización del proyecto por parte de la administración municipal, dada la necesidad urgente de mitigar los impactos sobre la salubridad pública y el deterioro progresivo de la infraestructura.

La siguiente ilustración muestra la ubicación general del municipio dentro del contexto departamental y nacional:

Ilustración 1. Ubicación general del municipio de cubara

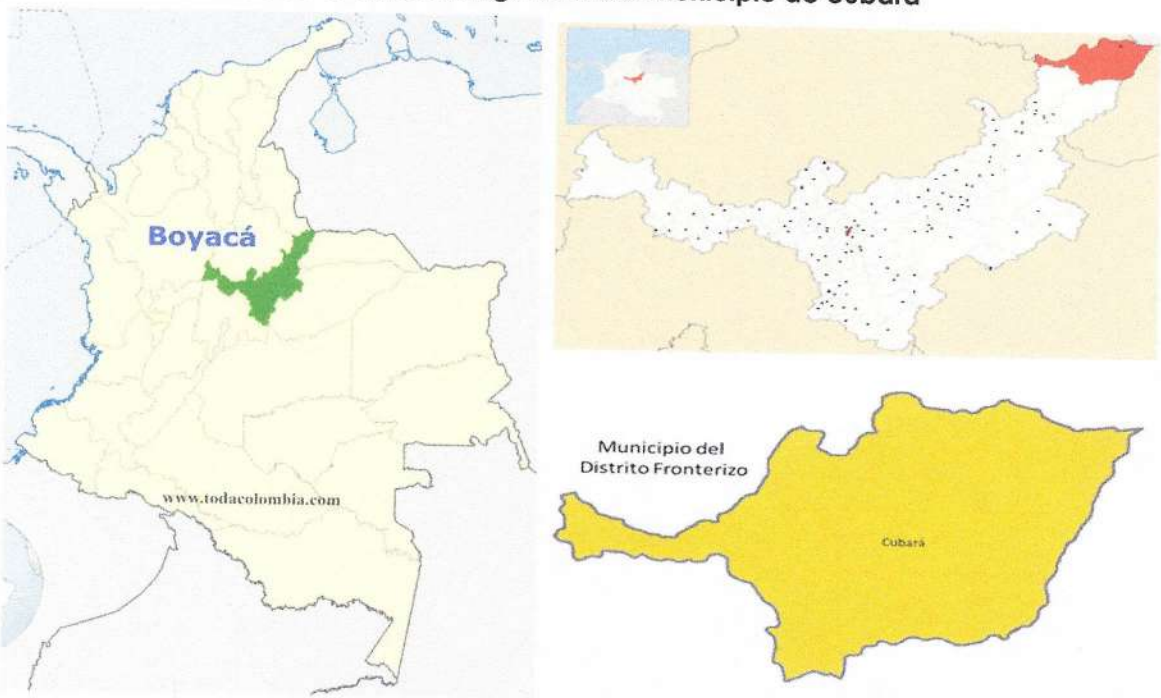

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Ilustración 2. Ubicación específica del sector a intervenir



Fuente: Google earth

Por su parte, el alcance de la interventoría, contratada mediante el Contrato No. MC-026-2025, incluyo la verificación y seguimiento integral de los siguientes aspectos:

Técnico: cumplimiento de especificaciones de diseño, materiales, procesos constructivos y normativas aplicables.

Administrativo: revisión de documentos, legalización del contrato de obra, actas, cronogramas, y cumplimiento de obligaciones contractuales.

Financiero: seguimiento al uso eficiente de los recursos, control de cantidades de obra ejecutadas, y revisión de pagos conforme a avances físicos certificados.

Social y ambiental: verificación del cumplimiento de normas de seguridad industrial, manejo ambiental, gestión de residuos, y relación con la comunidad afectada.

La interventoría se realizó de forma continua durante todo el periodo de ejecución del contrato de obra, con el propósito de garantizar que esta se desarrollara conforme a los términos pactados, dentro de los plazos establecidos, y con los más altos estándares de calidad técnica y transparencia en el uso de los recursos públicos.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

3.1 Generalidades del contrato de interventoría

3.1.1 informe contractual – Ficha técnica del contrato de interventoría

Tabla 1. Ficha técnica del contrato de interventoría

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARA
CONTRATISTA DE OBRA:	PCA GROUP S.A.S. R/L XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO
SUPERVISOR:	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	MC-026-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NO. 3, ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA NO. 2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
C.C. No:	27.601.897 de Cúcuta, Norte de Santander
VALOR DEL CONTRATO:	$ 33.049.275.00
PLAZO CONTRACTUAL:	TRES (03) MESES
VALOR DEL ANTICIPO (30%):	N/A
FECHA INICIO:	12 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	11 DE AGOSTO DE 2025
FECHA SUSPENSION No.1:	08 DE JULIO DE 2025
FECHA DE REINICIO No.1:	08 DE AGOSTO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION	11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ESTADO DEL CONTRATO:	TERMINADO
MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO PRINCIPAL	
ADICIÓN No. 01 DE VALOR DEL CONTRATO:	$ 11.016.425.00

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL:	$ 44.065.700.00
ADICIÓN VALOR DEL ANTICIPO:	$ 0.0
ANTICIPO CONTRATO PRINCIPAL + ADICIONAL:	$ 0.0
ADICIÓN No. 01 EN PLAZO:	UN (01) MES
PLAZO DE EJECUCIÓN MODIFICADO:	CUATRO (04) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	11 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL	14 DE OCTUBRE DE 2025 (Siguiente día hábil)
PERIODO DEL INFORME	
FECHA DE CORTE DEL INFORME:	12 DE MAYO DE 2025 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025

3.2 GARANTIAS DEL COTRATO

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de Cubara en el Contrato de Interventoría No. MC-026-2025, se suscribió con la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual.

3.2.1 Pólizas de legalización

Las pólizas de legalización fueron expedidas el 12 de mayo de 2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, tomadas por LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ y como beneficiario el Municipio de Cubara.

Tabla 2 Pólizas de legalización contrato de interventoría MC-026-2025

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
0	12/05/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000107428	$ 3.304.928.00	12/05/2025	12/12/2025
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 3.304.928.00	12/05/2025	12/12/2025

3.2.2 Pólizas Ampliadas según acta de inicio

Las pólizas fueron ampliadas según acta de inicio del 12 de mayo de 2025, expedidas el 19 de mayo de 2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

COLOMBIA, tomadas por LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ y como beneficiario el Municipio de Cubara.

Tabla 3 Ampliación de Pólizas contrato de interventoría MC-026-2025, según acta de inicio

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
1	19/05/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000107428	$ 3.304.928.00	12/05/2025	12/12/2025
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 3.304.928.00	12/05/2025	12/12/2025

3.2.3 Pólizas Ampliadas según actas de suspensión y reinicio No.1

Las pólizas fueron ampliadas según acta de suspensión No. 1 del día 08 de julio de 2025 y acta de reinicio No.1 del día 08 de agosto de 2025., expedidas el 12 de agosto de 2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, tomadas por LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ y como beneficiario el Municipio de Cubara.

Tabla 4 Ampliación de Pólizas contrato de interventoría MC-026-2025, ampliadas según acta de reinicio No. 1 de fecha 08 de agosto de 2025

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
2	12/08/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000107428	$ 3.304.928.00	12/05/2025	15/01/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 3.304.928.00	12/05/2025	15/01/2026

3.2.4 Pólizas Ampliadas según Modificación No.02 Adicional No.01 prorroga No. 01 al contrato MC-026-2025

Las pólizas fueron ampliadas según Modificación No.02 Adicional No.01 prorroga No. 01 de fecha 11 de septiembre de 2025., expedidas el 11 de septiembre de 2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, tomadas por LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ y como beneficiario el Municipio de Cubara.

Tabla 5 Ampliación de Pólizas contrato de interventoría MC-026-2025, ampliadas según Modificación No. 02 Adicional No. 01 prorroga No. 01 de fecha 11 de septiembre de 2025

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
3	11/09/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000107428	$ 4.406.570.00	12/05/2025	15/02/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 4.406.570.00	12/05/2025	15/02/2026

3.2.5 Pólizas Ampliadas según acta de recibo final contrato MC-026-2025

Las pólizas fueron ampliadas según acta de recibo final de fecha 14 de octubre de 2025., expedidas el 23 de octubre de 2025 por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, tomadas por LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ y como beneficiario el Municipio de Cubara.

Tabla 6 Ampliación de Pólizas contrato de interventoría MC-026-2025, ampliadas según acta de recibo final de fecha 14 de octubre de 2025

Anexo	FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
4	23/10/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SOLIDARIA DE COLOMBIA	400-47-994000107428	$ 4.406.570.00	12/05/2025	15/02/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO			$ 4.406.570.00	12/05/2025	15/02/2026

3.3 IMPOSICIÓN DE MULTAS Y SANCIONES:

No se generaron multas ni sanciones al contratista de la interventoría durante el periodo del presente informe.

3.4 COMITES DE OBRA:

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito las siguientes actas de comités técnicos desarrollados entre las partes:

Tabla 7 Relación de Comité Técnicos del Contrato de Obra No. LP-001-2025

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
04/07/2025	1	•El análisis de una interferencia técnica encontrada durante las excavaciones (box culvert de alcantarillado	JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Supervisor del Contrato LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
		pluvial). •La evaluación de las condiciones climáticas adversas que afectan el normal desarrollo de la obra.	Interventoría Externa ING. XAVIER FERNANDO OCHOA Ing. Residente de Obra
20/08/2025	2	•Presentación y análisis de la solicitud de adición en valor y plazo al contrato de obra. •Evaluación de la necesidad de adición en valor y plazo al contrato de interventoría.	JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Supervisor del Contrato LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ Interventoría Externa XIMENA DAMARIS MORA BUITRAGO R/L PCA GROUP S.A.S. Contratista ING. XAVIER FERNANDO OCHOA Ing. Residente de Obra
10/09/2025	3	Atención a la comunidad para socializar inicio del siguiente tramo	JAEL ADRIANA TORRES Secretaria (e) de Planeación y obras publicas ING DIEGO ALEJANDRO SIERRA Profesional de apoyo a la secretaria de planeación y obras publicas LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ Interventoría Externa ING. XAVIER FERNANDO OCHOA Ing. Residente de Obra

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA	No. DE ACTA DE COMITE	TEMAS TRATADOS	PARTICIPANTES DEL COMITÉ
			RAUL CARREÑO RODRIGUEZ Personero Municipal Comunidad beneficiada

3.5 ACTOS ADMINITRATIVOS:

Durante la ejecución del contrato de interventoría con corte a la fecha del presente informe, se han suscrito los siguientes actos administrativos:

Tabla 8 Actos Administrativos Contrato de Interventoría No. MC-026-2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
12/05/2025	Acta de inicio	Iniciación del contrato de Interventoría No. MC-026-2025	JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ CONTRATISTA
18/06/2025	Acta parcial No. 1	Acta parcial No. 1 contrato de Interventoría No. MC-026-2025	GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde municipal JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ CONTRATISTA
08/07/2025	Acta de Suspensión No. 1	Suspensión temporal por condiciones climáticas del contrato de obra, objeto de esta interventoría	JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ CONTRATISTA
08/08/2025	Acta de Reinicio No. 1	Reinicio del contrato de Interventoría No. MC-026-2025 dadas las condiciones que permiten el reinicio de las actividades del contrato de obra.	GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde municipal JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ CONTRATISTA

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	MOTIVO DEL ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
25/08/2025	Acta parcial No. 2	Acta parcial No. 2 contrato de Interventoría No. MC-026-2025	GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde municipal JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ CONTRATISTA
11/09/2025	Modificación No.02 Adicional No.01 prorroga No. 01	Realizar la Modificación No.02 Adicional No.01 prorroga No. 01 al contrato de Interventoría No. MC-026-2025	GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ Interventoría Externa
26/09/2025	Acta parcial No. 3	Acta parcial No. 3 contrato de Interventoría No. MC-026-2025	GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde municipal JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ CONTRATISTA

4. INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA

4.1 Recursos de equipos del consultor

Durante la ejecución del contrato de interventoría, el equipo no dispuso de maquinaria propia, ya que sus funciones se centraron en la revisión, verificación y validación de los resultados obtenidos por el contratista. Esta labor se complementó con la supervisión de los ensayos de laboratorio realizados por entidades debidamente acreditadas.

Para el cumplimiento de sus funciones, el consultor contó con equipos de oficina y herramientas tecnológicas necesarias para la recolección, procesamiento y archivo digital de la información generada durante el seguimiento diario a la ejecución del contrato, lo cual permitió un control documental organizado y eficiente durante toda la vigencia del proyecto.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

4.2 Personal de la interventoría

Las actividades de interventoría durante la ejecución del contrato fueron desarrolladas por el personal propuesto inicialmente, de acuerdo con las necesidades técnicas y administrativas del proyecto. Debido a la magnitud y complejidad de los trabajos, el personal laboró conforme a lo establecido en el contrato de consultoría, manteniendo una asignación estable y especializada durante toda la etapa de supervisión.

La firma contratista LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ no realizó cambios en el personal profesional ofertado en la propuesta original, lo cual contribuyó a la continuidad y consistencia del seguimiento técnico y administrativo.

A continuación, se relaciona el personal administrativo de la interventoría que participó durante la totalidad del contrato, así como las planillas de pago correspondientes al período de ejecución comprendido entre el 12 de mayo y el 11 de octubre de 2025.

Tabla 9 Personal del contrato de consultoría No. MC-026-2025 en el mes de mayo de 2025

N	NOMBRE	C.C	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	AFILIADO A				No. PLANILLA
							EPS	AFP	ARL	CAJA	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3.000.000	12/05/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9486849979
2	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	625.000	12/05/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9486850491

Tabla 10 Personal del contrato de consultoría No. MC-026-2025 en el mes de junio de 2025

N	NOMBRE	C.C	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	AFILIADO A				No. PLANILLA
							EPS	AFP	ARL	CAJA	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3.000.000	12/05/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9488900648
2	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	1.423.500	12/05/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9488879713

Tabla 11 Personal del contrato de consultoría No. MC-026-2025 en el mes de julio de 2025

N	NOMBRE	C.C	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	AFILIADO A				No. PLANILLA
							EPS	AFP	ARL	CAJA	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3.000.000	12/05/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9489960375
2	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	1.423.500	12/05/2025	08/07/202	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9488900629

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Tabla 62 Personal del contrato de consultoría No. MC-026-2025 en el mes de agosto de 2025

N	NOMBRE	C.C	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	AFILIADO A				No. PLANILLA
							EPS	AFP	ARL	CAJA	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3.000.000	12/05/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9492178404
2	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	1.423.500	08/08/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9492179043

Tabla 13 Personal del contrato de consultoría No. MC-026-2025 en el mes de septiembre de 2025

N	NOMBRE	C.C	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	AFILIADO A				No. PLANILLA
							EPS	AFP	ARL	CAJA	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3.000.000	12/05/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9492694609
2	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	1.423.500	08/08/2025		NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9492694920

Tabla 14 Personal del contrato de consultoría No. MC-026-2025 en el mes de octubre de 2025

N	NOMBRE	C.C	CARGO	SALARIO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO	AFILIADO A				No. PLANILLA
							EPS	AFP	ARL	CAJA	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA	3.000.000	12/05/2025	11/10/2025	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9494608601
2	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	1.423.500	08/08/2025	11/10/2025	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COMFABOY	9494291365

Anexo 1. Copias planillas de seguridad social a corte del presente informe

4.3 Seguridad industrial

A lo largo de la totalidad de la ejecución del contrato, se implementaron y mantuvieron de manera permanente las medidas de prevención y control encaminadas a garantizar condiciones de trabajo seguras para el personal del contratista, el equipo de interventoría y la comunidad circundante.

Los frentes de obra contaron con señalización adecuada, delimitación perimetral y avisos de seguridad que restringieron el acceso a personas no autorizadas y minimizaron riesgos durante las actividades constructivas.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

El contratista garantizó la dotación, uso y renovación de los Elementos de Protección Personal (E.P.P.) correspondientes a cada actividad, conforme a la evaluación de riesgos. Adicionalmente, se llevaron a cabo charlas diarias de seguridad y capacitaciones periódicas orientadas al uso correcto de los E.P.P., la prevención de actos y condiciones inseguras, y el fomento de la cultura de autocuidado.

La interventoría, por su parte, realizó un seguimiento continuo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) del contratista, verificando el cumplimiento de los protocolos, la documentación de inspecciones, las capacitaciones impartidas y la aplicación de medidas correctivas cuando fue necesario.

El profesional HSE asignado a la interventoría, con dedicación del 25%, efectuó supervisiones periódicas, registró las condiciones de seguridad en campo y emitió observaciones y recomendaciones orientadas al mejoramiento continuo del entorno laboral.

Como resultado de la gestión preventiva y el cumplimiento de los protocolos de seguridad durante todo el proyecto, no se registró ningún incidente o accidente de trabajo, lo cual evidencia un desempeño satisfactorio en materia de seguridad y salud en el trabajo y contribuyó a la culminación exitosa de la obra en un entorno controlado y seguro.





Calle 2 No. 5 – 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

5.0 INTERVENTORIA TECNICA

5.1 Actividades generales de la interventoría para el seguimiento técnico de la obra:

Durante la ejecución del contrato, la interventoría desarrolló las siguientes actividades generales de seguimiento técnico y administrativo, orientadas a garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual:

- Realización de Comités de Obra para tratar el estado del contrato, avance físico, y situaciones presentadas, buscando soluciones oportunas a las inquietudes técnicas y administrativas.
- Atención a requerimientos presentados por el contratista en aspectos técnicos, administrativos y de manejo de recursos.
- Verificación permanente de la vigencia de las pólizas contractuales, asegurando que la Alcaldía de Cubará permaneciera protegida ante los eventos previstos.
- Organización y planeación de las labores de interventoría, con base en el cronograma y los alcances técnicos establecidos.
- Control diario de obra, por frente de trabajo y a nivel de actividades, insumos y maquinaria.
- Control de calidad con base en las especificaciones de construcción y normativa técnica aplicable.
- Supervisión y solicitud del cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista.
- Manejo y archivo sistemático de todos los documentos legales y técnicos generados durante la ejecución del contrato.
- Comunicación formal al contratista sobre irregularidades o incumplimientos detectados durante el desarrollo del contrato.
- Elaboración oportuna de los Informes de Interventoría, reflejando el avance de los trabajos según los formatos y directrices establecidos en los términos de referencia.
- Vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales laborales y de seguridad industrial por parte del contratista.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

- Elaboración y suscripción de Actas de Inicio, Visitas, Parciales, Reunión y otras actas de acuerdo.

- Control y evaluación periódica del avance de los trabajos conforme al programa contractual.

5.1.1 Actividades técnicas ejecutadas

Para el seguimiento técnico, se implementaron las siguientes actuaciones especializadas:

- Seguimiento diario en campo con la presencia de la ingeniera residente de obra, controlando los requerimientos técnicos establecidos en las especificaciones y optimizando los procedimientos constructivos para todos los ítems del contrato.

- Registro sistemático en la bitácora de obra de todos los aspectos relevantes: actividades realizadas, equipo utilizado, personal presente e insumos empleados.

- Revisión y control permanente de diseños y planos del proyecto, asegurando que la obra se ejecutara conforme a lo aprobado.

- Control de calidad y características de los materiales adquiridos por el contratista, verificando que cumplieran con las especificaciones técnicas y normativas aplicables.

- Verificación del equipo mínimo y su estado de funcionamiento, incluyendo la revisión de certificados de garantía de fábrica en cuanto a calidad, cantidad y oportunidad de uso.

- Medición periódica de ítems ejecutados, con base en los avances físicos verificados en campo.

- Verificación de la ejecución de trabajos conforme a los términos de referencia, la propuesta técnico-económica, la metodología y las especificaciones pactadas en el contrato de obra.

- Control de calidad de concretos mediante el seguimiento y verificación de ensayos de resistencia a la compresión, realizados de acuerdo con las normas NSR-10 y NTC correspondientes, garantizando que el concreto utilizado cumpliera con las especificaciones de diseño y resistencia exigidas.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

5.2 Control de calidad de materiales y ensayos de laboratorio

5.2.1 Ensayos de concreto realizados por la interventoría

Como parte de las actividades de control de calidad establecidas en el contrato de interventoría, se ejecutaron ensayos de resistencia a la compresión de concreto de manera independiente, con el fin de verificar que los materiales utilizados por el contratista cumplieran con las especificaciones técnicas del proyecto.

Estos ensayos fueron realizados por la interventoría en un laboratorio acreditado, sobre muestras tomadas directamente en obra de los principales elementos estructurales del sistema de alcantarillado sanitario, tales como cajas de inspección, placas de fondo, anillos de pozo y solados de limpieza.

El programa de muestreo cubrió los diferentes períodos de ejecución de la obra, garantizando una verificación representativa de la calidad del concreto a lo largo de todo el proceso constructivo. Una vez se completó el número de ensayos establecido en el ítem correspondiente del contrato de interventoría, se dio por cumplida esta actividad sin necesidad de muestras adicionales.

Todos los resultados obtenidos demostraron que el concreto empleado alcanzó y superó las resistencias especificadas en los diseños, por lo que no se generaron observaciones o requerimientos técnicos asociados a la calidad del material.

A continuación, se presenta la tabla consolidada con los resultados de los ensayos propios realizados por la interventoría:

Tabla 7 Resultados de ensayos de laboratorio practicados por la interventoría durante la ejecución del contrato de obra No. LP-001-2025

No. DEL CONTRATO DE OBRA:	LP-001-2025		NOMBRE DE LA PRUEBA O ENSAYO:	ENSAYO DE COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	
CONTRATISTA DE OBRA:	PCA GROUP S.A.S		NOMBRE DEL LABORATORIO:	LABSOILS S.A.S.	
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ		UBICACIÓN DEL LABORATORIO:	MUNICIPIO DE SARAVENA	
LOCALIZACION DE LA OBRA:	CUBARA - BOYACA		DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:	CONCRETO PARA SOLADO, PLACA DE FONDO, ANILLO, CAJA DE FONDO	

			DESCRIPCION						
FECHA DE FUNDIDO	PROBETA No.	ENSAYO	NORMA/ ESPECIFICACION	PROCEDENCIA DE MUESTRA	No. MUESTRAS	DIAS DE FALLADO	RESISTENCIA ESPECIFICA DE DISEÑO	RESULTADO RESISTENCIA PSI	CUMPLE (SI/NO)

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

3/06/2025	1	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	NTC-550-673	SOLADO	1	7	2500 PSI	1847	SI
	1		NTC-550-673		1	14		2305	SI
	1		NTC-550-673		1	28		2955	SI
	1		NTC-550-673		1	28		3005	SI
04/06/2025	2	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	NTC-550-673	PLACA DE FONDO	1	7	3000 PSI	2304	SI
	2		NTC-550-673		1	14		2927	SI
	2		NTC-550-673		1	28		3331	SI
	2		NTC-550-673		1	28		3367	SI
04/06/2025	3	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	NTC-550-673	SOLADO	1	7	2500 PSI	1837	SI
	3		NTC-550-673		1	14		2345	SI
	3		NTC-550-673		1	28		2925	SI
	3		NTC-550-673		1	28		2981	SI
05/06/2025	4	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	NTC-550-673	ANILLO	1	7	3000 PSI	2336	SI
	4		NTC-550-673		1	14		2892	SI
	4		NTC-550-673		1	28		3324	SI
	4		NTC-550-673		1	28		3368	SI
05/06/2025	5	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	NTC-550-673	PLACA DE FONDO	1	7	3000 PSI	2318	SI
	5		NTC-550-673		1	14		2936	SI
	5		NTC-550-673		1	28		3315	SI
	5		NTC-550-673		1	28		3379	SI
06/06/2025	6	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	NTC-550-673	ANILLO	1	7	3000 PSI	2379	SI
	6		NTC-550-673		1	14		2955	SI
	6		NTC-550-673		1	28		3433	SI
	6		NTC-550-673		1	28		3455	SI
06/06/2025	7	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	NTC-550-673	CAJA INSPECCION	1	7	3000 PSI	2401	SI
	7		NTC-550-673		1	14		2896	SI
	7		NTC-550-673		1	28		3512	SI
	7		NTC-550-673		1	28		3553	SI
10/06/2025	8	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	NTC-550-673	CAJA INSPECCION	1	7	3000 PSI	2318	SI
	8		NTC-550-673		1	14		2990	SI
	8		NTC-550-673		1	28		3387	SI
	8		NTC-550-673		1	28		3426	SI
16/06/2025	9	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	NTC-550-673	CAJA INSPECCION	1	7	3000 PSI	2205	SI
	9		NTC-550-673		1	14		2925	SI
	9		NTC-550-673		1	28		3270	SI
	9		NTC-550-673		1	28		3322	SI
	10	COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRAULICO	NTC-550-673	CAJA INSPECCION	1	7	3000 PSI	2220	SI
	10		NTC-550-673		1	14		2814	SI
	10		NTC-550-673		1	28		3350	SI
	10		NTC-550-673		1	28		3391	SI

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO









Calle 2 No. 5 – 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Conclusión del control de calidad:

Los ensayos de resistencia a la compresión realizados de manera independiente por la interventoría confirmaron que el concreto utilizado en la obra cumplió integralmente con los parámetros de diseño y calidad exigidos, validando así el correcto desempeño de los materiales y procesos constructivos ejecutados por el contratista.

5.3 Certificación de materiales y equipos

5.3.1 Equipos de topografía

Dentro del presupuesto asignado al contrato de interventoría no se contempló la partida para actividades de topografía, por lo cual la interventoría no dispuso de equipos ni de personal topográfico propio. En consecuencia, se realizó el seguimiento y supervisión de las labores topográficas ejecutadas por el contratista de obra, quien fue el responsable de adelantar los procesos de replanteo, nivelación y demás actividades relacionadas, conforme a los diseños y especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

En cumplimiento de lo solicitado por la interventoría, el contratista de obra presentó la relación de los equipos topográficos empleados y los respectivos certificados de calibración vigentes, expedidos por laboratorios acreditados. A lo largo del proyecto, se verificó periódicamente la vigencia de dichos certificados y se constató que los equipos mantuvieron su validez y condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades topográficas requeridas.

Los equipos topográficos utilizados por el contratista durante la ejecución del contrato fueron los siguientes:

EQUIPO:	ESTACION TOTAL
MARCA:	TOPCON
MODELO:	GTS-245NW
FECHA DE CALIBRACIÓN:	26-04-2025
ESTADO:	BUENO
REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO:	SEIS MESES
VIBRACIONES/ RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDONEO



LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

EQUIPO:	NIVEL AUTOMATICO
MARCA:	TOPCON
MODELO:	AT – B4
FECHA DE CALIBRACIÓN:	22/01/2025
ESTADO:	BUENO
REGULARIDAD DEL MANTENIMIENTO:	SEIS MESES
VIBRACIONES/ RUIDOS:	NO PRESENTA
IDONEIDAD DE OPERARIOS:	IDONEO



5.3.2 Otros equipos utilizados por la interventoría

La firma consultora LEIDY DIANA TRIGOS JIMÉNEZ, en su calidad de interventora del contrato de obra No. LP-001-2025, dispuso de los recursos técnicos y administrativos necesarios para la coordinación, supervisión y control de las actividades objeto del contrato. Durante la ejecución del contrato se utilizaron equipos de oficina y elementos tecnológicos que permitieron el desarrollo eficiente de actividades como la redacción de informes, digitación de información, elaboración de oficios, gestión documental, registro fotográfico y procesamiento de datos.

Entre los equipos empleados se encuentran:

- Escritorios
- Sillas ergonómicas
- Archivadores
- Computadores portátiles y de escritorio
- Impresoras multifuncionales
- Escáneres
- Cámaras fotográficas digitales

Estos recursos estuvieron disponibles durante todo el periodo contractual, en estado óptimo de funcionamiento y con la disponibilidad requerida para el cumplimiento de las labores propias de la interventoría, lo cual contribuyó al desarrollo ordenado y documentado del seguimiento técnico y administrativo del proyecto.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO





5.3.3 Certificación de calidad de materiales

Durante toda la ejecución del contrato de obra, se realizó seguimiento y verificación permanente de la calidad de los materiales empleados en el proyecto, como parte de las actividades de control técnico desarrolladas por la interventoría.

En cumplimiento de esta labor, se solicitó de manera periódica al contratista la entrega de las certificaciones de calidad emitidas por los proveedores o fabricantes, correspondientes a los materiales suministrados e instalados en cada fase de la obra, entre ellos:

- Tubería de PVC sanitario en diámetros de 6" y 8"
- cemento
- Acero de refuerzo

La interventoría revisó de forma detallada toda la documentación allegada, constatando que los certificados presentados acreditaron el cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas (NTC) aplicables y de las especificaciones establecidas en los estudios y diseños del proyecto.

Con base en la verificación documental realizada a lo largo del proyecto, se concluyó que los materiales utilizados cumplieron con las especificaciones técnicas y requisitos normativos aplicables, por lo cual fueron considerados aptos para su incorporación en la obra y no se generaron observaciones por calidad de materiales.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

5.4 Bitácora diaria de obra

La bitácora de obra fue aperturada el día 12 de mayo de 2025 y fue suscrita diariamente por los profesionales responsables de la ejecución y supervisión del proyecto, durante toda la vigencia del contrato.

Cabe señalar que, a partir del 13 de junio de 2025, se realizó el cambio del ingeniero residente de obra, pasando del ingeniero Brayan Michel Parrado Lizcano al ingeniero Xavier Fernando Ochoa, quien asumió las responsabilidades técnicas y administrativas del cargo. Este cambio fue debidamente informado, avalado por la interventoría y documentado en el informe mensual correspondiente al mes 2 de seguimiento.

Durante la totalidad de la ejecución del contrato, los profesionales responsables del diligenciamiento de la bitácora fueron:

XAVIER FERNANDO OCHOA, M.P. No. 121037-0513527 NTS – Ingeniero Residente de Obra.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMÉNEZ, M.P. No. 54202-188037 NTS – Ingeniera de Interventoría.

La bitácora registró de manera continua y detallada las actividades ejecutadas, los recursos empleados, las condiciones climáticas, las novedades técnicas y administrativas, así como las observaciones de interventoría, constituyéndose en un documento fundamental para la trazabilidad del proceso constructivo.

5.5 Alcance del contrato de interventoría

El contrato de interventoría MC-026-2025 tuvo como finalidad ejercer el seguimiento técnico, administrativo y financiero al contrato de obra LP-001-2025, garantizando que su ejecución se realizara conforme a las especificaciones contractuales, normas vigentes y principios de eficiencia, eficacia y transparencia.

Las actividades definidas para el cumplimiento del objeto contractual comprendieron:

Costos de Personal Profesional:

Ingeniero Residente: Encargado de la supervisión técnica directa de las actividades constructivas, verificación de cumplimiento del cronograma, control de calidad y aseguramiento del cumplimiento de especificaciones técnicas del proyecto.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Supervisor HSE: Encargado de realizar el seguimiento al cumplimiento de los protocolos de seguridad industrial, salud en el trabajo y gestión ambiental durante la ejecución de la obra. Cabe señalar que este profesional estuvo vinculado al contrato con una disponibilidad equivalente al 25% de tiempo, de acuerdo con lo estipulado en el presupuesto aprobado.

Gastos Operacionales:

Gastos de oficina: Incluye los insumos básicos para el funcionamiento administrativo de la interventoría, tales como papelería, materiales de oficina y demás elementos necesarios para el desarrollo de actividades internas.

Impresión de planos y otros documentos técnicos: Reproducción de documentos necesarios para la adecuada supervisión de la obra.

Edición de informes: Redacción, estructuración, revisión y presentación de los informes periódicos requeridos por la entidad contratante.

Fotocopias y reproducciones documentales: Copia de planos, actas, informes y demás documentos necesarios para la trazabilidad del proceso de interventoría.

Oficina: Alojamiento físico temporal o permanente para el equipo interventor durante la ejecución del contrato.

Ensayos de laboratorio: Evaluación de calidad de materiales mediante pruebas técnicas, tales como la resistencia a la compresión del concreto estructural, de acuerdo con las normas técnicas vigentes.

5.5.1 Personal Profesional

5.5.1.1 Residente (Ingeniero civil y/o Arquitecto)

Durante toda la ejecución del contrato, el ingeniero residente designado por la interventoría realizó el seguimiento técnico diario a las actividades constructivas ejecutadas por el contratista. Las acciones incluyeron, entre otras:

- Supervisión continua de actividades como excavaciones, instalación de tubería sanitaria de 8", construcción de cajas de inspección, relleno con material producto de la excavación y otras labores contempladas en el cronograma de obra.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO


- Revisión y validación de las cantidades reportadas por el contratista, con elaboración de registros actualizados de avance físico y mediciones parciales.
- Coordinación y seguimiento a ensayos de laboratorio programados, incluyendo pruebas de resistencia del concreto y verificación de calidad de materiales.
- Generación y archivo sistemático de evidencias fotográficas y documentales como soporte de las actividades ejecutadas.
- Control de la ejecución conforme al cronograma contractual, verificando el cumplimiento de metas parciales y reportando cualquier desviación detectada.
- Participación activa en reuniones de obra, comités técnicos y en la elaboración de observaciones técnicas dirigidas al contratista, con seguimiento a los compromisos pactados.

Estas actividades permitieron consolidar el seguimiento técnico del proyecto, verificar la calidad de los procesos constructivos y contribuir al cumplimiento integral del objeto contractual.to.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	PRESENTE INFORME	TOTAL, ACUMULADO
			TIEMPO (MESES)	TIEMPO (MESES)	CANT	CANT
1	**COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL**					
1.01	Residente (Ingeniero Civil y/o Arquitecto)	Mes	3	4	1	4

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

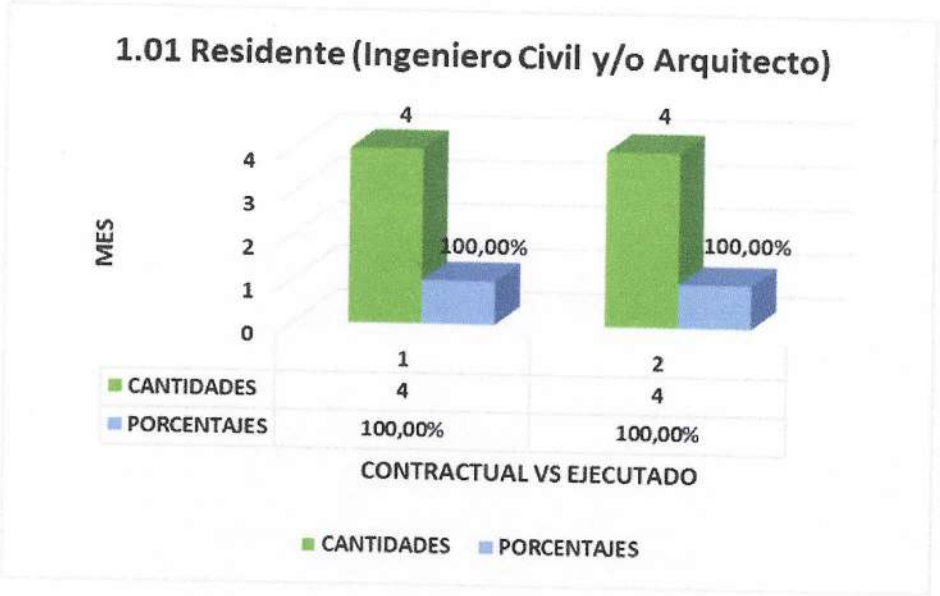

5.5.1.2 Supervisor SST o HSE

Durante toda la ejecución del contrato, el profesional HSE de la interventoría, con una dedicación del 25% conforme a lo establecido en el presupuesto del contrato, desarrolló labores de seguimiento, verificación y control en materia de seguridad, salud en el trabajo y gestión ambiental.

Entre las principales actividades realizadas a lo largo del proyecto se destacaron:

- Verificación en campo del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por parte del contratista, con énfasis en la utilización de elementos de protección personal (EPP) por el personal operativo.
- Revisión de protocolos de ingreso al frente de trabajo, constatando la aplicación de inducciones de seguridad, entrega de EPP y reporte de condiciones inseguras.
- Seguimiento a las condiciones de orden y aseo en las áreas intervenidas, identificando factores de riesgo y emitiendo recomendaciones para la aplicación de medidas correctivas.
- Registro y control de condiciones ambientales, verificando el adecuado manejo de residuos, la prevención de vertimientos y la protección de cuerpos de agua y suelos circundantes.
- Participación en reuniones de seguridad con el contratista, en las cuales se socializaron riesgos identificados y se establecieron acciones de mejora.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

- Revisión de formatos y reportes de seguimiento HSE, incluyendo registros fotográficos y listados de verificación diligenciados durante las visitas de campo.

- Supervisión del cumplimiento del cronograma HSE del contratista y análisis documental del cumplimiento de

La gestión del profesional HSE permitió mantener el control preventivo en los frentes de obra y contribuyó al desarrollo de las actividades constructivas en condiciones seguras, lográndose la ejecución de la obra sin incidentes ni accidentes laborales reportables y con estricto cumplimiento normativo en seguridad, salud y ambiente.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	PRESENTE INFORME	TOTAL, ACUMULADO
			TIEMPO (MESES)	TIEMPO (MESES)	CANT	CANT
1	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL					
1.02	Supervisor SST o HSE	Mes	3	4	1	4



Calle 2 No. 5 – 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

5.5.2 Gastos operacionales

5.5.2.1 Gasto de oficina (papelería, impresión de planos y Otros) Edición de informes, fotocopias y reproducciones documentales


Durante toda la ejecución del contrato de interventoría, se incurrió en gastos operativos necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de seguimiento técnico, administrativo y documental. Estos gastos estuvieron orientados al soporte logístico, administrativo y técnico de la gestión contractual, y se detallan a continuación:

- **Papelería y elementos de oficina:** utilizados para la elaboración de registros físicos, actas, formatos de control, bitácoras, oficios y demás documentos internos requeridos para el seguimiento y control de obra.
- **Impresión de planos y documentos técnicos:** se imprimieron planos de diseño, detalles constructivos, cronogramas y formatos de medición, necesarios para la verificación en campo y el soporte de las actividades de supervisión.
- **Edición y presentación de informes:** se realizaron actividades de redacción, revisión, corrección, diagramación e impresión de los cuatro informes mensuales de interventoría, así como del informe final, en cumplimiento de los lineamientos contractuales establecidos.
- **Fotocopias y reproducciones documentales:** se efectuaron copias de actas de visita, registros fotográficos, informes de avance, certificaciones y demás soportes requeridos para la trazabilidad, archivo y entrega formal a la entidad contratante.

Estos gastos se enmarcaron dentro de las actividades previstas en el alcance del contrato de interventoría y respondieron a la necesidad de garantizar una gestión documental ordenada, la trazabilidad del proceso y el cumplimiento integral de los objetivos contractuales.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	PRESENTE INFORME	TOTAL, ACUMULADO
			TIEMPO (MESES)	TIEMPO (MESES)	CANT	CANT
2	**GASTOS OPERACIONALES**					
2.01	Gasto de oficina (papelería, impresión de planos y Otros) Edición de informes, fotocopias y reproducciones documentales	Mes	3	4	1	4

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

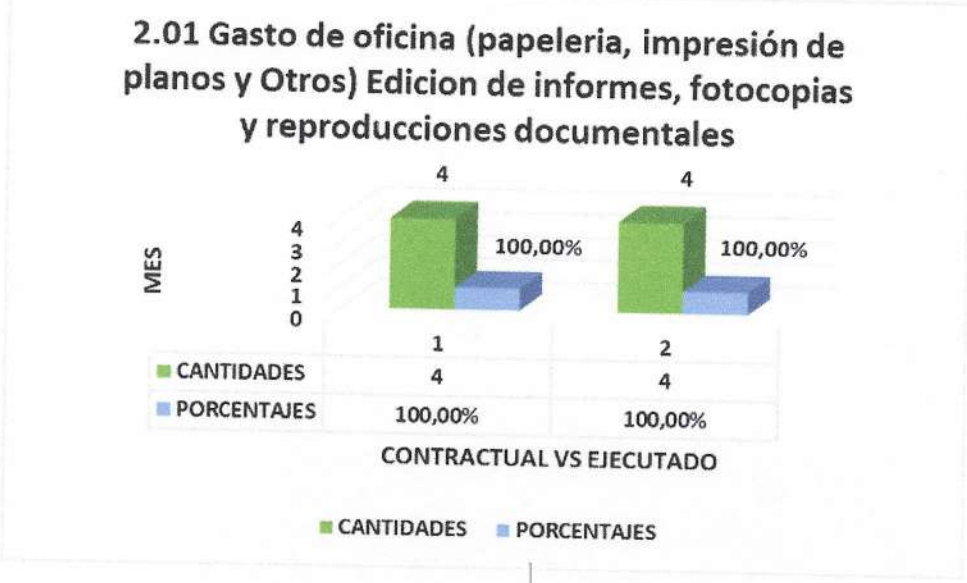

5.5.2.2 Oficina

Durante toda la ejecución del contrato de interventoría, se dispuso de un espacio físico adecuado que sirvió como base operativa para el desarrollo de las labores administrativas y técnicas del equipo interventor. Esta oficina permitió el cumplimiento eficiente de las actividades de supervisión y facilitó la organización documental requerida.

Entre las funciones principales que cumplió este espacio se encuentran:

- Elaboración, archivo y revisión de documentos contractuales, informes mensuales, actas, mediciones, certificaciones y demás soportes técnicos generados durante el proyecto.
- Realización de reuniones de coordinación interna del equipo de interventoría, así como encuentros de seguimiento con el contratista y la entidad contratante, cuando fue necesario.
- Almacenamiento temporal de planos, formatos físicos, registros de laboratorio, evidencias fotográficas impresas y documentación soporte del proceso constructivo.
- Acceso a recursos de conectividad y herramientas tecnológicas (computadores, impresoras, escáner, internet), indispensables para la elaboración oportuna de informes, gestión documental digital y comunicación formal.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

La disponibilidad continua de esta oficina permitió mantener condiciones adecuadas de trabajo, asegurar el archivo organizado de la información técnica y administrativa, y facilitar la interacción entre los actores involucrados en la ejecución del contrato durante los 4 meses de duración del mismo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	PRESENTE INFORME	TOTAL, ACUMULADO
			TIEMPO (MESES)	TIEMPO (MESES)	CANT	CANT
2	**GASTOS OPERACIONALES**					
2.02	Oficina	Mes	3	4	1	4



5.5.2.3 Ensayos de laboratorio (resistencia a la compresión de la estructura de concreto)

Durante toda la ejecución del contrato de interventoría, se llevaron a cabo ensayos de laboratorio orientados a verificar la calidad del concreto utilizado en los elementos estructurales del sistema de alcantarillado sanitario, tales como anillos de pozos, placas de fondo, cajas de inspección y solados de limpieza, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto y a las normas colombianas vigentes.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Las actividades desarrolladas incluyeron:

- **Toma de muestras de concreto fresco** en campo durante las fundiciones ejecutadas, para la elaboración de probetas cilíndricas de acuerdo con la norma NTC 396.

- **Curado controlado de cilindros** en condiciones estandarizadas, siguiendo los lineamientos de la norma INVIAS 2013, garantizando la trazabilidad y confiabilidad de los resultados.
- **Realización de ensayos de resistencia a la compresión** a diferentes edades (7, 14 y 28 días) sobre las probetas fabricadas, ejecutados en laboratorio acreditado.

- **Seguimiento y análisis técnico** de todos los resultados obtenidos, con verificación de su conformidad respecto a los parámetros de diseño establecidos.

Todos los resultados de resistencia a la compresión obtenidos a lo largo del proyecto fueron satisfactorios, cumpliendo y en la mayoría de los casos superando las resistencias especificadas en el diseño de mezcla (2.500 PSI y 3.000 PSI, según el elemento).

Una vez se completó el número de ensayos previstos en el ítem correspondiente del contrato de interventoría, se dio por concluida esta actividad, contando con la totalidad de los resultados consolidados y analizados.

La gestión de ensayos de laboratorio permitió validar la calidad del concreto empleado en la obra, no generándose observaciones técnicas ni requerimientos correctivos asociados a la resistencia estructural del material.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS	PRESENTE INFORME	TOTAL, ACUMULADO
			TIEMPO (MESES)	TIEMPO (MESES)	CANT	CANT
2	**GASTOS OPERACIONALES**					
2.03	Ensayos de laboratorio (resistencia a la compresión de la estructura de concreto)	Mes	3	4	1	4

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



5.6 Control de avance de las actividades de la consultoría


A fecha de corte del presente informe, el estado de avance del contrato de interventoría es el siguiente:

Nueva Fecha de finalización del contrato: 11 de octubre de 2025


Porcentaje de tiempo transcurrido: 100%

CONTROL DE AVANCE FÍSICO

Porcentaje de avance físico de la interventoría a fecha 11 de octubre de 2025: 100 %

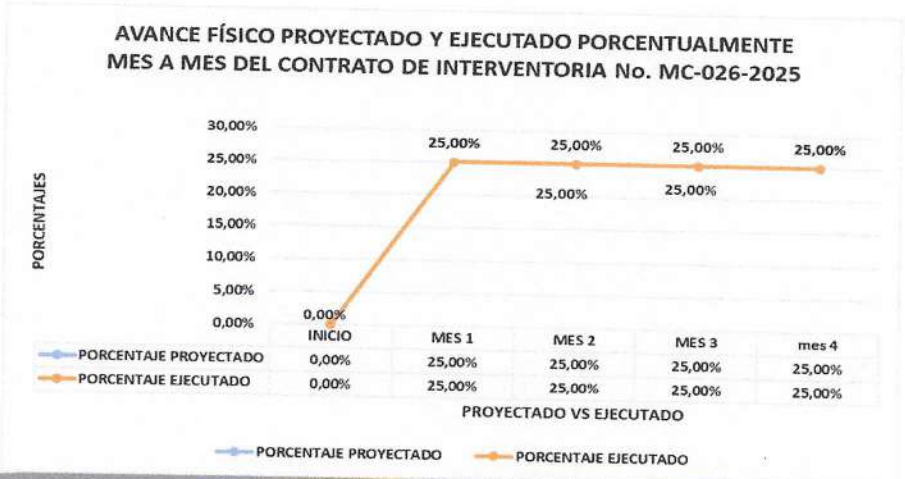

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

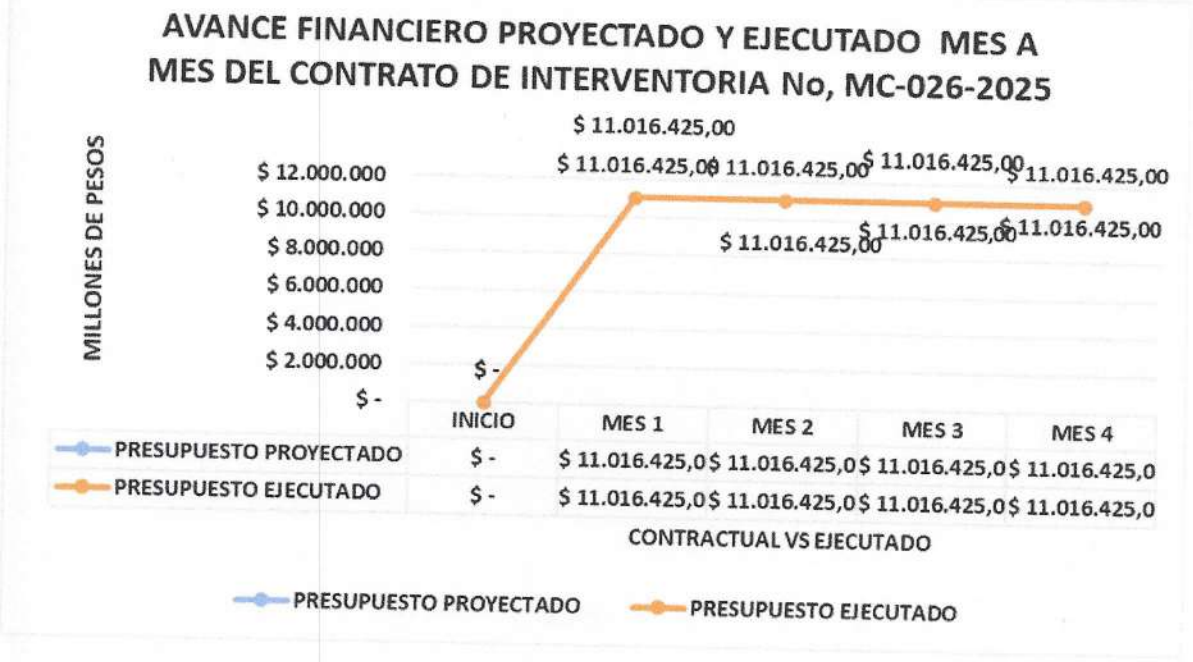

5.7 Condiciones contractuales

El contrato de obra suscrito entre el Municipio de Cubara y la firma contratista LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido

Tabla 16 Condiciones contractuales contrato de interventoria MC-026-2025

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO (MESES)	SUELDO BASICO	VALOR PARCIAL
1	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL					
1,01	Residente (Ingeniero Civil y/o Arquitecto)	1	100%	3,00	$ 3.000.000,00	$ 9.000.000,00
1,02	Supervisor SST o HSE	1	25%	3,00	$ 2.500.000,00	$ 1.875.000,00
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL						$ 10.875.000,00
TOTAL COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOS					2,30	**$ 25.012.500,00**

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	SUELDO BASICO	COSTO TOTAL

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

2	GASTOS OPERACIONALES					
2,01	Gasto de oficina (papelería, impresión de planos y Otros) Edición de informes, fotocopias y reproducciones documentales	MES	1,00	3	$ 120.000,00	$ 360.000,00
2,02	Oficina	MES	1,00	3	$ 300.000,00	$ 900.000,00
2,03	Ensayos de laboratorio (resistencia a la compresión de la estructura de concreto)	MES	1,00	3	$ 500.000,000	$ 1.500.000,00

TOTAL GASTOS OPERACIONALES	**$ 2.760.000,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR	$ 25.012.500,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	$ 2.760.000,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$ 27.772.500,00**
IVA =19%	$ 5.276.775,00
VALOR TOTAL	**$ 33.049.275,00**

Calle 2 No. 5 – 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

5.7.1 Adición contractual en valor y plazo

Mediante el Acta de modificación No. 02 Adicional No. 01 Prorroga No. 01 suscrita entre el Municipio de Cubará y la firma contratista LEIDY DIANA TRIGOS JIMÉNEZ, se formalizó una adición al contrato de interventoría MC-026-2025, tanto en valor como en plazo. El valor inicial de TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($33.049.275,00) fue adicionado en la suma de once millones dieciséis mil cuatrocientos veinte cinco pesos ($11.016.425.00), para un valor contractual total de cuarenta y cuatro millones sesenta y cinco mil setecientos pesos ($ 44.065.700.00).

De igual forma, el plazo inicial de TRES (3) meses fue prorrogado en UN (01) mes, quedando establecido un plazo contractual total de CUATRO (04) meses.

La modificación tuvo origen en la necesidad de garantizar la cobertura técnica y administrativa de la interventoría durante el tiempo adicional requerido para la ejecución del contrato de obra principal.

5.8 Cantidades de interventoría ejecutadas

Durante toda la ejecución del contrato de interventoría No. MC-026-2025, se registraron de manera sistemática las cantidades efectivamente desarrolladas por el equipo interventor, tanto en los ítems de personal profesional como en los gastos operacionales previstos en el presupuesto contractual. Este registro permitió realizar un seguimiento financiero detallado, evidenciar el cumplimiento integral de las actividades contratadas y garantizar el control de los recursos asignados a lo largo de los cuatro meses de duración del contrato.

A continuación, se presenta la tabla consolidada con las cantidades ejecutadas durante el cuarto mes y el acumulado total del contrato, conforme al avance físico y financiero verificado:

Tabla 17 Cantidades ejecutadas mes 4 contrato de interventoría MC-026-2025

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	DEDICACIÓN	TIEMPO (MESES)	SUELDO BASICO	VALOR PARCIAL	CANTIDADES EJECUTADAS MES 1	CANTIDADES EJECUTADAS MES 2	CANTIDADES EJECUTADAS MES 3	CANTIDADES EJECUTADAS MES 4	CANTIDADES ACUMULADAS	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
1	COSTOS DE PERSONAL PROFESIONAL											
1,01	y/o Arquitecto)	1	100%	4,00	$ 3.000.000,00	$ 12.000.000,00	1	1	1	1	4	$ 12.000.000,00
1,02	Supervisor SST o HSE	1	25%	4,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	1	1	1	1	4	$ 2.500.000,00
SUBTOTAL COSTOS PERSONAL						$ 14.500.000,00						$ 14.500.000,00
TOTAL COSTO DE PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOS					2,30	**$ 33.350.000,00**						$ 33.350.000,00

ITEM	CARGO / OFICIO	UNIDAD	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	SUELDO BASICO	COSTO TOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS MES 1	CANTIDADES EJECUTADAS MES 2	CANTIDADES EJECUTADAS MES 3	CANTIDADES EJECUTADAS MES 4	CANTIDADES ACUMULADAS	TOTAL EJECUTADO ACUMULADO
2	GASTOS OPERACIONALES											
2,01	Gasto de oficina (papeleria, impresión de planos y Otros) Edicion de informes, fotocopias y reproducciones documentales	MES	1,00	4	$ 120.000,00	$ 480.000,00	1	1	1	1	4	$ 480.000,00
2,02	Oficina	MES	1,00	4	$ 300.000,00	$ 1.200.000,00	1	1	1	1	4	$ 1.200.000,00
2,03	Ensayos de laboratorio (resistencia a la compresion de la estructura de concreto)	MES	1,00	4	$ 500.000,000	$ 2.000.000,00	1	1	1	1	4	$ 2.000.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES						**$ 3.680.000,00**						**$ 3.680.000,00**
TOTAL COSTOS PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR						$ 33.350.000,00						$ 33.350.000,00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES						$ 3.680.000,00						$ 3.680.000,00
SUBTOTAL COSTO DIRECTO						**$ 37.030.000,00**						**$ 37.030.000,00**
IVA =19%						$ 7.035.700,00						$ 7.035.700,00
VALOR TOTAL						**$ 44.065.700,00**						**$ 44.065.700,00**

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Durante el cuarto mes de ejecución del contrato de interventoría, el presupuesto ejecutado fue de **ONCE MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($11.016.425,00)**, valor correspondiente a la ejecución de los diferentes ítems del contrato, incluyendo:

- Honorarios del personal profesional asignado a las actividades de seguimiento, control, revisión y supervisión técnica, administrativa y financiera.

- Gastos operacionales necesarios para el desarrollo de las labores de interventoría, tales como insumos de oficina, uso de instalaciones, reproducción de documentos y ensayos de laboratorio de resistencia a la compresión del concreto.

A la fecha de corte del presente informe, la ejecución acumulada del contrato asciende a **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($44.065.700.00)**, equivalente a la suma de los valores ejecutados durante el primer, segundo, tercer y cuarto mes de actividades.

6.0 INTERVENTORIA FINANCIERA

Durante la ejecución del contrato de interventoría, no se constituyó cuenta para el manejo de anticipo, dado que este no fue contemplado en las condiciones contractuales.

A la fecha de cierre del contrato, se aplicaron recursos por valor total de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($44.065.700,00), correspondientes a la ejecución de cuatro (04) meses de actividades de interventoría, incluyendo honorarios del equipo técnico y gastos operacionales necesarios para el desarrollo del seguimiento, control y supervisión del contrato de obra.

Se deja constancia que, dentro de este valor acumulado, se realizaron tres pagos parciales por valor de ONCE MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($11.016.425,00) por mes, para un total pagado de TREINTA Y TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($33.049.275,00), correspondientes a los tres primeros meses de ejecución. El saldo correspondiente al cuarto mes se encuentra en proceso de pago conforme a los trámites administrativos de la entidad.

La verificación documental de los soportes de pago fue realizada de manera oportuna, así como el seguimiento al cumplimiento financiero del contrato, manteniéndose la ejecución dentro de los parámetros programados.


LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

La ejecución del contrato de interventoría durante todo el período se mantuvo dentro de los parámetros establecidos, permitiendo el cumplimiento del objeto contractual y el logro de las metas definidas. La consultoría prestó acompañamiento permanente al contratista de obra, con comunicación continua al supervisor del contrato, y cada uno de los profesionales adscritos a la interventoría cumplió con sus obligaciones técnicas y administrativas.

De conformidad con la programación financiera del contrato, se presentan los siguientes valores consolidados al cierre:

Tabla 18 Avance total del contrato de interventoría MC-026-2025

VALOR CONTRACTUAL ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR
$ 44.065.700.00	$ 44.065.700.00	$ 0.0
100%	100%	0.0%

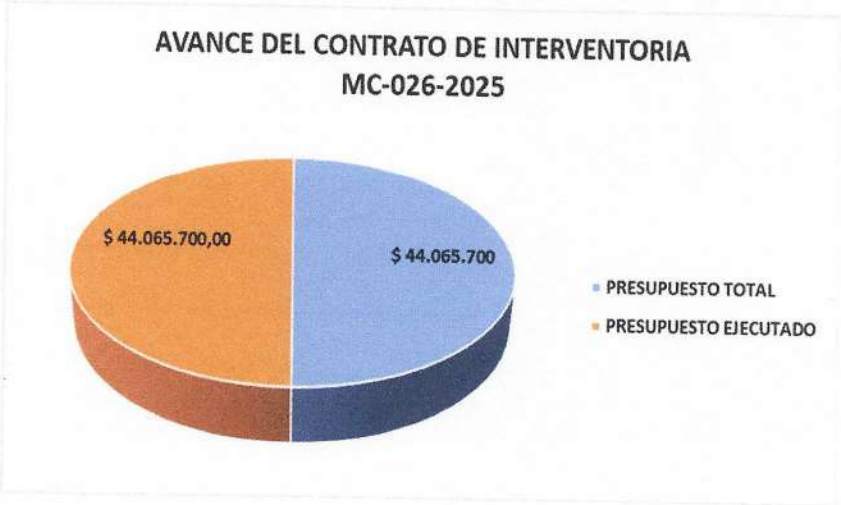

Cierre financiero y relación con el avance físico de la obra:

Si bien durante algunos periodos el avance físico de la obra reportado por el contratista se situó por debajo de lo programado, la interventoría cumplió en su totalidad con el alcance y cronograma establecidos en el contrato MC-026-2025, realizando el seguimiento técnico, administrativo y financiero correspondiente, y manteniendo una articulación constante con todas las partes involucradas.

Al finalizar el proyecto, se logró la ejecución financiera completa del contrato de interventoría, coincidiendo con la culminación al 100% del contrato de obra LP-001-2025, lo que evidencia la eficiencia en la gestión de los recursos y el cumplimiento integral de los compromisos contractuales asumidos.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

7.0 REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENTORIA

Durante toda la ejecución del contrato de interventoría No. MC–026–2025, el equipo técnico designado realizó seguimiento constante al desarrollo del contrato de obra LP-001-2025, verificando in situ el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los planos aprobados y las condiciones contractuales establecidas.

La interventora LEIDY DIANA TRIGOS JIMÉNEZ dispuso del personal profesional idóneo y suficiente para cumplir con los términos pactados en el contrato de interventoría, garantizando el acompañamiento técnico, administrativo y financiero de manera equitativa, armónica y oportuna a lo largo de los cuatro meses de ejecución del proyecto.

Como parte de la documentación de soporte del seguimiento realizado, se generó un registro fotográfico sistemático que evidenció la participación activa del equipo de interventoría en campo, las condiciones de obra, los materiales utilizados, los avances por ítem y las actividades de control de calidad ejecutadas.

A continuación, se presenta una selección del registro fotográfico representativo de las principales actividades supervisadas durante todo el contrato, como constancia gráfica del desarrollo del proyecto.





Descripción: Inspección de equipos en obra

Calle 2 No. 5 – 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO





Descripción: Inspección y seguimiento de ejecución de actividades diarias






Descripción: Revisión de señalización y equipos en campo

Calle 2 No. 5 – 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

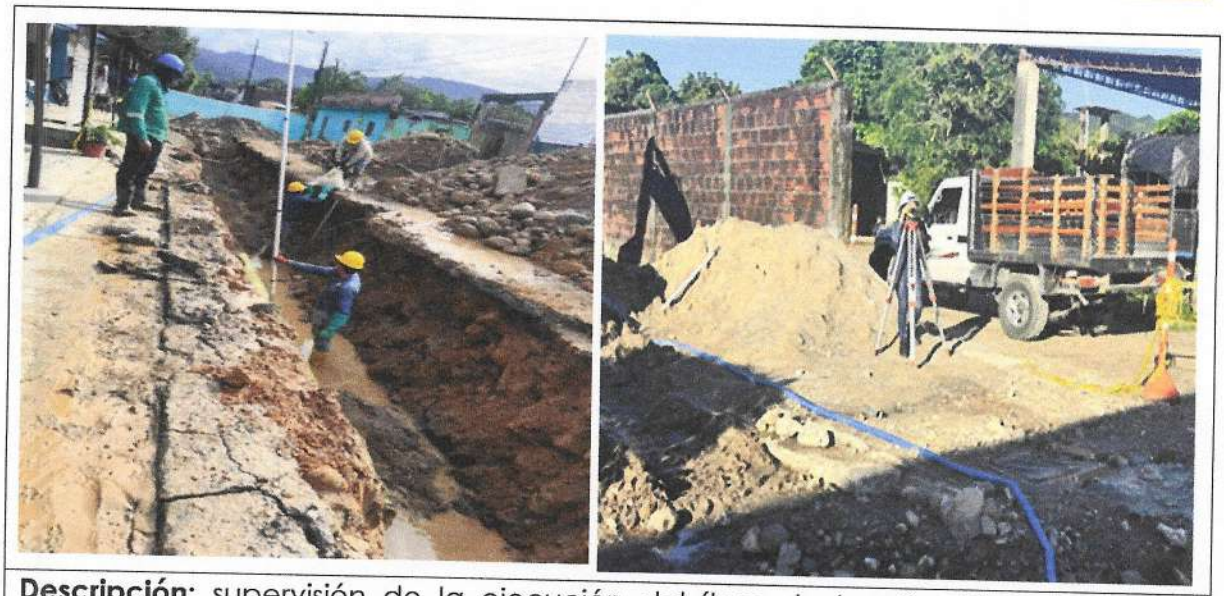

Descripción: supervisión de la ejecución del ítem de localización y replanteo topográfico



Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de excavación mecánica y a la instalación de la tubería principal.

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



Descripción: supervisión y seguimiento a la actividad de excavación manual para cajas de inspección.



Descripción: supervisión y seguimiento a la actividad de suministro e instalación de tubería sanitaria de 8" y 6"

Calle 2 No. 5 – 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com


LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO





Descripción: supervisión y seguimiento a la actividad de suministro e instalación de kit silla yee sanitaria 8"x6" y kit de codo en pvc 45° 6" con hidrosellos 6"



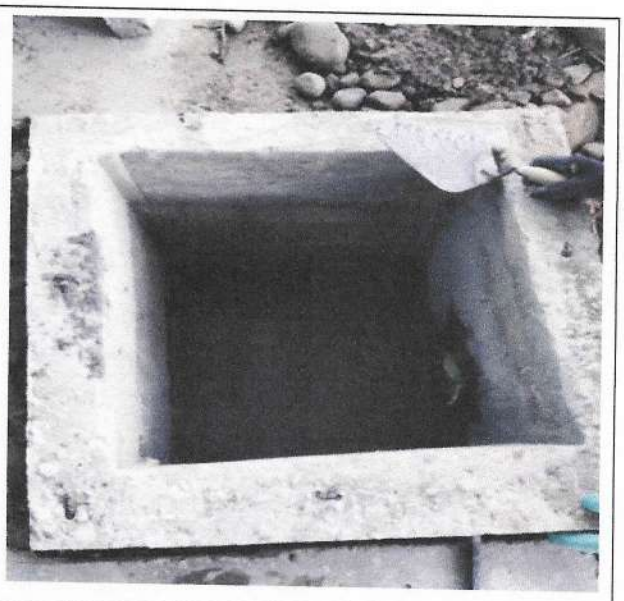

Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de construcción de cajas de inspección de medidas internas de 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m en concreto reforzado (incluye tapa); espesor de paredes y tapa e=0,10 m.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO





Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de relleno compactado con material de la misma excavación.





Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de retiro y disposición de material sobrante

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de extendido de arena para protección de la tubería.



Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de emboquillado de tuberia

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO




Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de fundida de concreto de 2.500 psi para solado de limpieza con espesor de 0,05 m.



Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de fundida de placa de fondo en concreto de 3000 PSI E=0,10 M

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

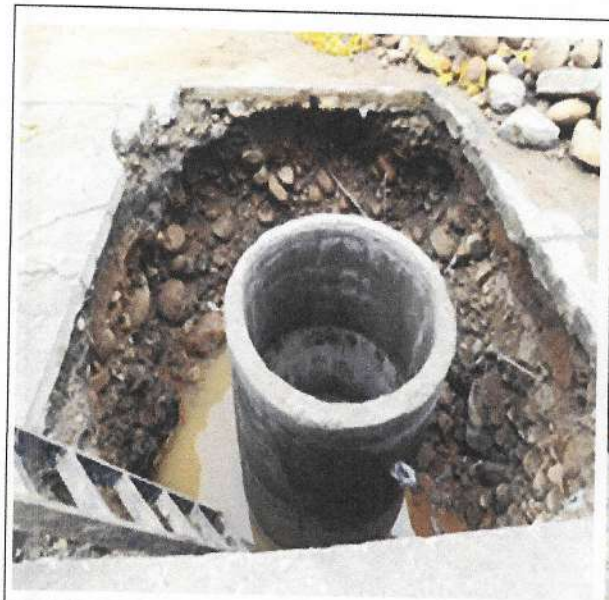



Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de fundida de anillo en concreto 3000 PSI para pozo, E=0,10 M diametro EXT=1,40 M





Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de fundida de tapa en concreto 3000 psi, reforz, d ext=1,40 m e=0,20 m para pozo de inspección incl aro y tapa hf

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de cañuela en concreto de 3000 PSI para pozo de inspección DINT. 1.20 M



Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de cañuela en concreto de 3000 PSI para caja de registro area de 0,6 X 0,6 M

Calle 2 No. 5 – 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO



Descripción: Supervisión y seguimiento a la actividad de demolición de placa en concreto de 3.000 psi.

Calle 2 No. 5 – 09 Barrio El jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

8. CONCLUSIONES

1. La interventora LEIDY DIANA TRIGOS JIMÉNEZ cumplió con el objeto del Contrato de Interventoría No. MC-026-2025, ejecutando las actividades técnicas, administrativas y financieras requeridas para la supervisión del proyecto "Reposición del sistema de alcantarillado sanitario en la Calle No. 3 entre la Vía Nacional y la Carrera No. 2 del municipio de Cubará, Departamento de Boyacá".

2. Durante toda la ejecución del contrato, la interventora mantuvo al día el pago de aportes a seguridad social y parafiscales del personal asignado, verificándose el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social sin observaciones.

3. La interventoría alcanzó un avance físico y financiero del 100%, correspondiente a la ejecución total del valor contratado actualizado de CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($44.065.700,00), distribuido en los cuatro (04) meses de duración del contrato, incluida la adición en valor y plazo aprobada mediante acta modificatoria.

4. Se realizó un seguimiento continuo a las actividades constructivas, verificando el cumplimiento de especificaciones, planos y normativa técnica. Los ensayos de laboratorio de resistencia a la compresión del concreto, ejecutados de manera independiente por la interventoría, confirmaron que los materiales empleados cumplieron con los parámetros de calidad exigidos.

5. A lo largo del proyecto se mantuvo un estricto control del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), lográndose la ejecución de la obra sin accidentes ni incidentes laborales reportables.

6. La interventoría contó de manera permanente con los recursos logísticos, operativos y de oficina necesarios, lo cual permitió garantizar la trazabilidad documental, la eficiencia en la supervisión y el archivo organizado de toda la información generada.

7. Se mantuvo una coordinación permanente con la Entidad Contratante (Alcaldía de Cubará) y el Contratista de Obra (PCA GROUP S.A.S.), asegurando el flujo oportuno de información, la atención de requerimientos y el reporte formal de avances y novedades.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Anexo No.1
Seguridad social del representante legal

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El Jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1544787342	9486849979	I	2025/06/25	2025/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA									X									230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF10	30	$3,000,000	$60,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	No	$1,123,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$60,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,123,800

2025/06/10 04:33 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1642857613	9488900648	I	2025/07/22	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA									X									230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF10	30	$3,000,000	$60,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	No	$1,123,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$60,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,123,800

2025/07/21 07:17 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-07	2025-07	1725766979	9489960375	I	2025/08/26	2025/08/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$533,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	No	$533,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$533,400

2025/08/25 04:21 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

111

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1795233663	9492178404	I	2025/09/22	2025/09/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA									X									230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF10	30	$3,000,000	$60,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	No	$1,123,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$60,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,123,800

2025/09/22 03:17 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

111

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1822979534	9492694609	I	2025/10/23	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA									X									230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF16	30	$3,000,000	$60,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	No	$1,123,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$60,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,123,800

2025/10/02 07:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1937543873	9494608601	I	2025/11/26	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA									X									230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF10	30	$3,000,000	$60,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	No	$1,123,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$60,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,123,800

2025/11/18 01:44 PM

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Anexo No.2
Seguridad social del personal empleado

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El Jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

aportes en línea

Planilla Resumen

1114

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1545482561	9486850491	E	2025/06/25	2025/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$401,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA o ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUBARA (1 Afiliados)						$901,550	$144,300			$901,550	$112,700			$901,550	$36,100			$901,550		$62,800		$901,550	$45,200		$401,100
Centro de Trabajo: SURA ARL V (1 Afiliados)						$901,550	$144,300			$901,550	$112,700			$901,550	$36,100			$901,550		$62,800		$901,550	$45,200		$401,100
Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$901,550	$144,300			$901,550	$112,700			$901,550	$36,100			$901,550		$62,800		$901,550	$45,200		$401,100
1	CC 1115739500	ALVAREZ CAICEDO LISETH NATALIA	X	23030 1	19	$901,550	$144,300	EPS041	19	$901,550	$112,700	CCF10	19	$901,550	$36,100	14-11	19	$901,550	6.960%	$62,800	19	$901,550	$45,200	No	$401,100
Total Afiliados(1)						$901,550	$144,300			$901,550	$112,700			$901,550	$36,100			$901,550		$62,800		$901,550	$45,200		$401,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1545482561	9486850491	E	2025/06/25	2025/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$401,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$144,300	$0	$0	$144,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$144,300	$0	$0	$144,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,800	$0	$0	$62,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$62,800	$0	$0	$62,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$36,100	$0	$0	$36,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$36,100	$0	$0	$36,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$112,700	$0	$0	$112,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$112,700	$0	$0	$112,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,100	$0	$0	$27,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$27,100	$0	$0	$27,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,100	$0	$0	$18,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$18,100	$0	$0	$18,100
TOTAL				1	$401,100	$0	$0	$401,100

2025/06/10 08:01 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1544787342	9486849979	I	2025/06/25	2025/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA									X									230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF10	30	$3,000,000	$60,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	No	$1,123,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$60,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,123,800

2025/06/10 04:33 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

1116

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1642855325	9488879713	E	2025/07/22	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$633,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vtp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUBARA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
Centro de Trabajo: SURA ARL V (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200
1	CC 1115739500	ALVAREZ CAICEDO LISETH NATALIA		23030 f	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$99,100		$1,423,500	$71,300		$633,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-07	1642855325	9488879713	E	2025/07/22	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$633,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,100	$0	$0	$99,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$99,100	$0	$0	$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,800	$0	$0	$42,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$42,800	$0	$0	$42,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
TOTAL				1	$633,200	$0	$0	$633,200

2025/07/21 07:18 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1642857613	9488900648	I	2025/07/22	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA									X									230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF10	30	$3,000,000	$60,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	No	$1,123,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$60,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,123,800

aportes en línea

Planilla Resumen

111

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1642861365	9488900629	E	2025/08/26	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$179,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUBARA (1 Afiliados)																							$379,600	$60,800			$379,600	$47,500			$492,294	$19,700			$379,600		$26,500		$492,294	$24,700		$179,200
Centro de Trabajo: SURA ARL V (1 Afiliados)																							**$379,600**	**$60,800**			**$379,600**	**$47,500**			**$492,294**	**$19,700**			**$379,600**		**$26,500**		**$492,294**	**$24,700**		**$179,200**
Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																							**$379,600**	**$60,800**			**$379,600**	**$47,500**			**$492,294**	**$19,700**			**$379,600**		**$26,500**		**$492,294**	**$24,700**		**$179,200**
1	CC	1115739500	ALVAREZ CAICEDO LISETH NATALIA				X												X		230301	8	$379,600	$60,800	EPS041	8	$379,600	$47,500	CCF10	8	$492,294	$19,700	14-11	8	$379,600	6.960%	$26,500	8	$492,294	$24,700	No	$179,200
Total	**Afiliados(1)**																						$379,600	$60,800			$379,600	$47,500			$492,294	$19,700			$379,600		$26,500		$492,294	$24,700		$179,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1642861365	9488900629	E	2025/08/26	2025/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$179,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,800	$0	$0	$60,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$60,800	$0	$0	$60,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,500	$0	$0	$26,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$26,500	$0	$0	$26,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,700	$0	$0	$19,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$19,700	$0	$0	$19,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$47,500	$0	$0	$47,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$47,500	$0	$0	$47,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,800	$0	$0	$14,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$14,800	$0	$0	$14,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,900	$0	$0	$9,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$9,900	$0	$0	$9,900
TOTAL				1	$179,200	$0	$0	$179,200

2025/07/21 07:21 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

1119

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1725766979	9489960375	I	2025/08/26	2025/08/25	BANCO DAVIVIENDA	0	$533,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	No	$533,400
Total	**Afiliados(1)**																						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$99,100		$0	$0		$533,400

2025/08/25 04:21 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

1120

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1795184473	9492179043	E	2025/09/22	2025/09/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,512,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUBARA (2 Afiliados)																						$3,400,367	$544,100			$3,400,367	$425,200			$3,400,367	$136,100			$3,400,367		$236,800		$3,400,367	$170,300		$1,512,500
Centro de Trabajo: SURA ARL V (2 Afiliados)																						$3,400,367	$544,100			$3,400,367	$425,200			$3,400,367	$136,100			$3,400,367		$236,800		$3,400,367	$170,300		$1,512,500
Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																						$3,400,367	$544,100			$3,400,367	$425,200			$3,400,367	$136,100			$3,400,367		$236,800		$3,400,367	$170,300		$1,512,500
1	CC	1115739500	ALVAREZ CAICEDO LISETH NATALIA	X																23030 1	26	$1,233,700	$197,400	EPS041	26	$1,233,700	$154,300	CCF10	26	$1,233,700	$49,400	14-11	26	$1,233,700	6.960%	$85,900	26	$1,233,700	$61,800	No	$548,800
2	CC	88256586	MONROY GUTIERREZ LUIS ALEJANDRO	X																23030 1	26	$2,166,667	$346,700	EPS037	26	$2,166,667	$270,900	CCF10	26	$2,166,667	$86,700	14-11	26	$2,166,667	6.960%	$150,900	26	$2,166,667	$108,500	No	$963,700
Total		**Afiliados(2)**																				$3,400,367	$544,100			$3,400,367	$425,200			$3,400,367	$136,100			$3,400,367		$236,800		$3,400,367	$170,300		$1,512,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-09	1795184473	9492179043	E	2025/09/22	2025/09/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,512,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$544,100	$0	$0	$544,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$544,100	$0	$0	$544,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$236,800	$0	$0	$236,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$236,800	$0	$0	$236,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$136,100	$0	$0	$136,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$136,100	$0	$0	$136,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$425,200	$0	$0	$425,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$270,900	$0	$0	$270,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$154,300	$0	$0	$154,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$102,200	$0	$0	$102,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$102,200	$0	$0	$102,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$68,100	$0	$0	$68,100
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$68,100	$0	$0	$68,100
TOTAL				2	$1,512,500	$0	$0	$1,512,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1795233663	9492178404	I	2025/09/22	2025/09/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA									X									230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF10	30	$3,000,000	$60,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	No	$1,123,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$60,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,123,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1822912108	9492694920	E	2025/10/23	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,744,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUBARA (2 Afiliados)							$3,923,500	$627,800			$3,923,500	$490,500			$3,923,500	$157,000			$3,923,500		$273,100		$3,923,500	$196,300		$1,744,700
Centro de Trabajo: SURA ARL V (2 Afiliados)							$3,923,500	$627,800			$3,923,500	$490,500			$3,923,500	$157,000			$3,923,500		$273,100		$3,923,500	$196,300		$1,744,700
Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (2 Afiliados)							$3,923,500	$627,800			$3,923,500	$490,500			$3,923,500	$157,000			$3,923,500		$273,100		$3,923,500	$196,300		$1,744,700
1	CC	1115739500	ALVAREZ CAICEDO LISETH NATALIA		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC	88256586	MONROY GUTIERREZ LUIS ALEJANDRO		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$312,500	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
Total			**Afiliados(2)**				$3,923,500	$627,800			$3,923,500	$490,500			$3,923,500	$157,000			$3,923,500		$273,100		$3,923,500	$196,300		$1,744,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-10	1822912108	9492694920	E	2025/10/23	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,744,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$627,800	$0	$0	$627,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$627,800	$0	$0	$627,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$273,100	$0	$0	$273,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$273,100	$0	$0	$273,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$157,000	$0	$0	$157,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$157,000	$0	$0	$157,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$490,500	$0	$0	$490,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$312,500	$0	$0	$312,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$117,800	$0	$0	$117,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$117,800	$0	$0	$117,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,500	$0	$0	$78,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$78,500	$0	$0	$78,500
TOTAL				2	$1,744,700	$0	$0	$1,744,700

2025/10/02 06:47 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

1123

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1822979534	9492694609	I	2025/10/23	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA									X									230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF10	30	$3,000,000	$60,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	No	$1,123,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$60,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,123,800

2025/10/02 07:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1822979534	9492694609	I	2025/10/23	2025/10/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,123,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$480,000	$0	$0	$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$480,000	$0	$0	$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,800	$0	$0	$208,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$208,800	$0	$0	$208,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$60,000	$0	$0	$60,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$375,000	$0	$0	$375,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$375,000	$0	$0	$375,000
TOTAL				1	$1,123,800	$0	$0	$1,123,800

2025/10/02 07:16 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1937520271	9494291365	E	2025/11/26	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,744,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CUBARA (2 Afiliados)						$3,923,500	$627,800			$3,923,500	$490,500			$3,923,500	$157,000			$3,923,500		$273,100		$3,923,500	$196,300		$1,744,700
Centro de Trabajo: SURA ARL V (2 Afiliados)						$3,923,500	$627,800			$3,923,500	$490,500			$3,923,500	$157,000			$3,923,500		$273,100		$3,923,500	$196,300		$1,744,700
Ciudad: CUBARA Depto: BOYACA (2 Afiliados)						$3,923,500	$627,800			$3,923,500	$490,500			$3,923,500	$157,000			$3,923,500		$273,100		$3,923,500	$196,300		$1,744,700
1	CC 1115739500	ALVAREZ CAICEDO LISETH NATALIA		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$178,000	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$1,423,500	$71,300	No	$633,200
2	CC 88256586	MONROY GUTIERREZ LUIS ALEJANDRO		230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$312,500	CCF10	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	6.960%	$174,000	30	$2,500,000	$125,000	No	$1,111,500
Total Afiliados(2)						$3,923,500	$627,800			$3,923,500	$490,500			$3,923,500	$157,000			$3,923,500		$273,100		$3,923,500	$196,300		$1,744,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	CL 8 25 08	SARAVENA-ARAUCA	8892593	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1937520271	9494291365	E	2025/11/26	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,744,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$627,800	$0	$0	$627,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$627,800	$0	$0	$627,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$273,100	$0	$0	$273,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	$273,100	$0	$0	$273,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$157,000	$0	$0	$157,000
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$157,000	$0	$0	$157,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$490,500	$0	$0	$490,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$312,500	$0	$0	$312,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$178,000	$0	$0	$178,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$117,800	$0	$0	$117,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$117,800	$0	$0	$117,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$78,500	$0	$0	$78,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$78,500	$0	$0	$78,500
TOTAL				2	$1,744,700	$0	$0	$1,744,700

2025/11/18 01:36 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27601897		TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 25 8 28	CUBARA-BOYACA	8820550	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10	1937543873	94946086O1	I	2025/11/26	2025/11/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,123,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	27601897	TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA									X									230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$375,000	CCF10	30	$3,000,000	$60,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	No	$1,123,800
Total	**Afiliados(1)**																						$3,000,000	$480,000			$3,000,000	$375,000			$3,000,000	$60,000			$3,000,000	$208,800		$0	$0		$1,123,800

2025/11/18 01:44 PM

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Anexo No.3
Nominas

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El Jardin
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118618905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 12 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE MAYO DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO														DESCUENTOS					FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.	BONO ESPECIAL	E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	ING. RESIDENTE DE INTERV.	100.000,00	19	1.900.000									76.000	76.000		152.000	1.748.000	
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
5																				
6																				
	TOTALES					1.900.000							0		76.000	76.000		152.000	1.748.000	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	-	711.740	CESANTIAS	8,33%	158.270	EPS	12,5%	237.500,00
I.C.B.F	3%	-		PRIMA	8,33%	158.270	PENSION	16%	304.000,00
CAJA DE COMPENSACION	2%	38.000,00		VACACIONES	4,17%	79.230	ARP	6,960%	132.240,00
TOTAL APORTES		38.000,00		INTERESES	1%	19.000			
				TOTAL		414.770	TOTAL		673.740

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118616905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 12 DE MAYO DE 2025 AL 30 DE MAYO DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO														DESCUENTOS					FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.	BONO ESPECIAL	E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	
1	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	47.450,00	19	901.550									36.062	36.062		72.124	829.426	NATALIA ALVAREZ C
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
4																				
5																				
6																				
	TOTALES					901.550							0		36.062	36.062		72.124	829.426	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	18.031,00	400.829	CESANTIAS	8,33%	75.099	EPS	12,5%	112.693,75
I.C.B.F	3%	27.046,50		PRIMA	8,33%	75.099	PENSION	16%	144.248,00
CAJA DE COMPENSACION	4%	36.062,00		VACACIONES	4,17%	37.595	ARP	6,960%	62.747,88
TOTAL APORTES		81.139,50		INTERESES	1%	9.016			
				TOTAL		196.808	TOTAL		319.690

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118616905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO													BONO ESPECIAL	DESCUENTOS					FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.		E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	ING. RESIDENTE DE INTERV.	100.000,00	30	3.000.000									120.000	120.000		240.000	2.760.000	
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
5																				
6																				
	TOTALES					3.000.000							0		120.000	120.000		240.000	2.760.000	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	-	1.123.800	CESANTIAS	8,33%	249.900	EPS	12,5%	375.000,00
I.C.B.F	3%	-		PRIMA	8,33%	249.900	PENSION	16%	480.000,00
CAJA DE COMPENSACION	2%	60.000,00		VACACIONES	4,17%	125.100	ARP	6,960%	208.800,00
TOTAL APORTES		60.000,00		INTERESES	1%	30.000	TOTAL		1.063.800
				TOTAL		654.900			

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118616905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 01 DE JUNIO DE 2025 AL 30 DE JUNIO DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO														DESCUENTOS					FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.	BONO ESPECIAL	E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	
1	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	47.450,00	30	1.423.500				-					56.940	56.940		113.880	1.309.620	NATALIA ALVAREZ C
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
4																				
5																				
6																				
	TOTALES					1.423.500							0		56.940	56.940		113.880	1.309.620	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	28.470,00	632.888	CESANTIAS	8,33%	118.578	EPS	12,5%	177.937,50
I.C.B.F	3%	42.705,00		PRIMA	8,33%	118.578	PENSION	16%	227.760,00
CAJA DE COMPENSACION	4%	56.940,00		VACACIONES	4,17%	59.360	ARP	6,960%	99.075,60
TOTAL APORTES		128.115,00		INTERESES	1%	14.235			
				TOTAL		310.750	TOTAL		504.773

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118616905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 01 DE JULIO DE 2025 AL 08 DE JULIO DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO													BONO ESPECIAL	DESCUENTOS					FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.		E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	ING. RESIDENTE DE INTERV.	47.450,00	8	379.600									15.184	15.184		30.368	349.232	
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
5																				
8																				
	TOTALES					379.600							0		15.184	15.184		30.368	349.232	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	-	142.198	CESANTIAS	8,33%	31.621	EPS	12,5%	47.450,00
I.C.B.F	3%	-		PRIMA	8,33%	31.621	PENSION	16%	60.736,00
CAJA DE COMPENSACION	2%	7.592,00		VACACIONES	4,17%	15.829	ARP	6,960%	26.420,16
TOTAL APORTES		7.592,00		INTERESES	1%	3.796	TOTAL		134.606
				TOTAL		82.867			

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118616905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 01 DE JULIO DE 2025 AL 08 DE JULIO DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO														DESCUENTOS					FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.	BONO ESPECIAL	E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	
1	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	47.450,00	8	379.600									15.184	15.184		30.368	349.232	NATALIA ALVAREZ C
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
4																				
5																				
6																				
	TOTALES					379.600							0		15.184	15.184		30.368	349.232	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	7.592,00		CESANTIAS	8,33%	31.621	EPS	12,5%	47.450,00
I.C.B.F	3%	11.388,00	168.770	PRIMA	8,33%	31.621	PENSION	16%	60.736,00
CAJA DE COMPENSACION	4%	15.184,00		VACACIONES	4,17%	15.829	ARP	6,960%	26.420,16
TOTAL APORTES		34.164,00		INTERESES	1%	3.796			
				TOTAL		82.867	TOTAL		134.606

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118616905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 08 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO													BONO ESPECIAL	DESCUENTOS					FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.		E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	ING. RESIDENTE DE INTERV.	100.000,00	23	2.300.000									92.000	92.000		184.000	2.116.000	
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
5																				
6																				
	TOTALES					2.300.000							0		92.000	92.000		184.000	2.116.000	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	-	861.580	CESANTIAS	8,33%	191.590	EPS	12,5%	287.500,00
I.C.B.F	3%	-		PRIMA	8,33%	191.590	PENSION	16%	368.000,00
CAJA DE COMPENSACION	2%	46.000,00		VACACIONES	4,17%	95.910	ARP	6,960%	160.080,00
TOTAL APORTES		46.000,00		INTERESES	1%	23.000			
				TOTAL		502.090	TOTAL		815.580

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118616905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 08 DE AGOSTO DE 2025 AL 30 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO														DESCUENTOS					FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.	BONO ESPECIAL	E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	
1	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	47.450,00	23	1.091.350									43.654	43.654		87.308	1.004.042	NATALIA ALVAREZ C
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
4																				
5																				
6																				
	TOTALES					1.091.350							0		43.654	43.654		87.308	1.004.042	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	21.827,00		CESANTIAS	8,33%	90.909	EPS	12,5%	136.418,75
I.C.B.F	3%	32.740,50		PRIMA	8,33%	90.909	PENSION	16%	174.616,00
CAJA DE COMPENSACION	4%	43.654,00	485.214	VACACIONES	4,17%	45.509	ARP	6,960%	75.957,96
				INTERESES	1%	10.914			
TOTAL APORTES		98.221,50		TOTAL		238.242	TOTAL		386.993

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118616905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO													BONO ESPECIAL	DESCUENTOS					FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.		E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	ING. RESIDENTE DE INTERV.	100.000,00	30	3.000.000									120.000	120.000		240.000	2.760.000	
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
5																				
6																				
	TOTALES					3.000.000							0		120.000	120.000		240.000	2.760.000	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	-	1.123.800	CESANTIAS	8,33%	249.900	EPS	12,5%	375.000,00
I.C.B.F	3%	-		PRIMA	8,33%	249.900	PENSION	16%	480.000,00
CAJA DE COMPENSACION	2%	60.000,00		VACACIONES	4,17%	125.100	ARP	6,960%	208.800,00
TOTAL APORTES		60.000,00		INTERESES	1%	30.000	TOTAL		1.063.800
				TOTAL		654.900			

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118616905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO														DESCUENTOS					FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.	BONO ESPECIAL	E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	
1	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	47.450,00	30	1.423.500									56.940	56.940		113.880	1.309.620	NATALIA ALVAREZ C
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
4																				
5																				
6																				
	TOTALES					1.423.500							0		56.940	56.940		113.880	1.309.620	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	28.470,00	632.888	CESANTIAS	8,33%	118.578	EPS	12,5%	177.937,50
I.C.B.F	3%	42.705,00		PRIMA	8,33%	118.578	PENSION	16%	227.760,00
CAJA DE COMPENSACION	4%	56.940,00		VACACIONES	4,17%	59.360	ARP	6,960%	99.075,60
TOTAL APORTES		128.115,00		INTERESES	1%	14.235			
				TOTAL		310.750	TOTAL		504.773

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118616905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO														DESCUENTOS					FIRMA DEL TRABAJADOR
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.	BONO ESPECIAL	E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	
1	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ	27.601.897	ING. RESIDENTE DE INTERV.	100.000,00	11	1.100.000									44.000	44.000		88.000	1.012.000	
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
5																				
6																				
	TOTALES					1.100.000							0		44.000	44.000		88.000	1.012.000	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	-	412.060	CESANTIAS	8,33%	91.630	EPS	12,5%	137.500,00
I.C.B.F	3%	-		PRIMA	8,33%	91.630	PENSION	16%	176.000,00
CAJA DE COMPENSACION	2%	22.000,00		VACACIONES	4,17%	45.870	ARP	6,960%	76.560,00
TOTAL APORTES		22.000,00		INTERESES	1%	11.000			
				TOTAL		240.130	TOTAL		390.060

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Cra 8 24-54 Barrio Villa Fanny
Telefax: 3118616905
Saravena - Arauca

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025

PERIODO DE PAGO: 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 11 DE OCTUBRE DE 2025

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

	TOTAL DEVENGADO														DESCUENTOS					
	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	JORNAL	D.T	SUELDO	D.I.	VALOR	D.F	VALOR	E.D	VALOR	T. DEV.	BONO ESPECIAL	E.PS	PEN.	PREST	T.DED.	NETO	FIRMA DEL TRABAJADOR
1	LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO	1.115.739.500	HSE DE INTERVENTORIA	47.450,00	11	521.950									20.878	20.878		41.756	480.194	NATALIA ALVAREZ C
2						-									0	0		0	0	
3															0	0		0	0	
4																				
5																				
6																				
	TOTALES					521.950							0		20.878	20.878		41.756	480.194	

APORTES			TOTAL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL+PARAFISCALES	PROVISIONES			PAGOS TOTALES		
SENA	2%	10.439,00		CESANTIAS	8,33%	43.478	EPS	12,5%	65.243,75
I.C.B.F	3%	15.658,50		PRIMA	8,33%	43.478	PENSION	16%	83.512,00
CAJA DE COMPENSACION	4%	20.878,00	232.059	VACACIONES	4,17%	21.765	ARP	6,960%	36.327,72
				INTERESES	1%	5.220			
TOTAL APORTES		46.975,50		TOTAL		113.942	TOTAL		185.083

APROBADO POR

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
CONTRATISTA
NIT. 27601897-7

MANUEL FRANCISCO ARRIETA BARRIOS
CONTADOR
T.P. 97907-T

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Anexo No.4
Paz y salvo del personal

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El Jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

NIT. 27601897-7

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	**LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ**
CEDULA No.	27.601.897
CARGO	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FECHA DE INGRESO	12-may-25
FECHA DE RETIRO	11-oct-25
TOTAL DIAS	153
TIEMPO SUSPENDIDO	30
TOTAL DIAS TRABAJADOS	123
JORNAL	$ 100.000,00
TOTAL DEVENGADO	$ 12.300.000,00
SUELDO PROMEDIO MENSUAL	$ 3.000.000,00
CESANTIAS	$ 1.025.000,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$ 42.025,00
VACACIONES	$ 512.500,00
PRIMA DE SERVICIOS	$ 1.025.000,00
TOTAL A PAGAR POR PRESTACIONES SOCIALES	**$ 2.604.525,00**
TOTAL A PAGAR	**2.604.525,00**

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

YO, **LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ** , IDENTIFICADO CON CÉDULA **27.601.897**
CERTIFICO QUE RECIBI , TODO LO CONCERNIENTE A SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES , Y DEMAS PAGOS LABORALES A QUE TUVE DERECHO DURANTE EL TIEMPO QUE LABORE EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025 CON LA ING. LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ , POR LO TANTO ME DECLARO A PAZ Y SALVO.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LAS PARTES A LOS 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
NIT. 27601897-7

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
C.C.27.601.897

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021880377NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

NIT. 27601897-7

LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES

NOMBRE DEL EMPLEADO	**LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO**
CEDULA No.	1.115.739.500
CARGO	HSE DE INTERVENTORIA
FECHA DE INGRESO	12-may-25
FECHA DE RETIRO	11-oct-25
TOTAL DIAS	153
TIEMPO SUSPENDIDO	30
TOTAL DIAS TRABAJADOS	123
JORNAL	$ 20.833,33
TOTAL DEVENGADO	$ 2.562.500,00
SUELDO PROMEDIO MENSUAL	$ 625.000,00
CESANTIAS	$ 213.542,00
INTERESES SOBRE CESANTIAS	$ 8.755,22
VACACIONES	$ 106.770,83
PRIMA DE SERVICIOS	$ 213.542,00
TOTAL A PAGAR POR PRESTACIONES SOCIALES	**$ 542.610,06**
TOTAL A PAGAR	**542.610,06**

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

YO, **LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO**, IDENTIFICADO CON CÉDULA **1.115.739.500** CERTIFICO QUE RECIBI , TODO LO CONCERNIENTE A SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES , Y DEMAS PAGOS LABORALES A QUE TUVE DERECHO DURANTE EL TIEMPO QUE LABORE EN EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025 CON LA ING. LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ , POR LO TANTO ME DECLARO A PAZ Y SALVO.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA POR LAS PARTES A LOS 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
NIT. 27601897-7

NATALIA ALVAREZ C
LISETH NATALIA ALVAREZ CAICEDO
C.C. 1.115.739.500

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Anexo No.5
Parafiscales

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El Jardin
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

comfaboy
unidos para crecer

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.

4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA con nit 27601897 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
24/02/2025	849481914077	4	20,300	202501	20,300	$502,848	$502,848
31/03/2025	849483700818	4	176,900	202502	176,900	$4,420,967	$4,420,967
31/03/2025	849483700820	4	244,300	202503	244,300	$6,105,144	$6,105,144
11/06/2025	849486850491	1	36,100	202505	36,100	$901,550	$901,550
21/07/2025	849488879713	1	57,000	202506	57,000	$1,423,500	$1,423,500
21/07/2025	849488900629	1	19,700	202507	19,700	$492,294	$492,294
22/09/2025	849492179043	2	136,100	202508	136,100	$3,400,367	$3,400,367
03/10/2025	849492694920	2	157,000	202509	157,000	$3,923,500	$3,923,500
18/11/2025	849494291365	2	157,000	202510	157,000	$3,923,500	$3,923,500
18/11/2025	849494608564	2	40,700	202511	40,700	$1,013,572	$1,013,572
TOTALES:			$1,045,100		$1,045,100	$26,107,242	$26,107,242

FECHA DE EXPEDICION: 20/11/2025

Cordialmente;

LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | Versión 2 | 13/09/2018
Certificación de aportes 2025 Afil.:031385 NIT: 27601897

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Financiera

BIENESTAR FAMILIAR

ESTADO DE PAGOS

APORTES PARAFISCALES AL ICBF

PLANILLA INTEGRADA DE LIQUIDACION DE APORTES - PILA

Señor (a)

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

NIT : 27601897

CL 8 25 08

Arauca

Señor Aportante :

La coordinación del Grupo de Tesorería certifica que en nuestros archivos históricos se encuentran los pagos realizados por su empresa al ICBF por concepto del aporte parafiscal 3% liquidados a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) de la siguiente manera :

Periodo	Fecha	Numero Planilla	Operador	Banco	Valor Aporte	Valor Mora
2025-02	31/03/2025	9483700818	Gestión y Contacto	BANCO DAVIVIENDA S.A.	132800,00	500,00
2025-03	31/03/2025	9483700820	Gestión y Contacto	BANCO DAVIVIENDA S.A.	183300,00	0,00
2025-05	11/06/2025	9486850491	Gestión y Contacto	BANCO DAVIVIENDA S.A.	27100,00	0,00
2025-06	21/07/2025	9488879713	Gestión y Contacto	BANCO DAVIVIENDA S.A.	42800,00	0,00
2025-07	21/07/2025	9488900629	Gestión y Contacto	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14800,00	0,00
2025-08	22/09/2025	9492179043	Gestión y Contacto	BANCO DAVIVIENDA S.A.	102200,00	0,00
2025-09	03/10/2025	9492694920	Gestión y Contacto	BANCO DAVIVIENDA S.A.	117800,00	0,00
2025-10	18/11/2025	9494291365	Gestión y Contacto	BANCO DAVIVIENDA S.A.	117800,00	0,00
2025-11	18/11/2025	9494608564	Gestión y Contacto	BANCO DAVIVIENDA S.A.	30500,00	0,00
Total					769100,00	500,00

La presente certificación NO aplica para exenciones.

INFORMACION ACTUALIZADA AL : 01/12/2025

Los pagos anteriormente descritos fueron extraídos del histórico en el aplicativo NSIR y NO incluyen las devoluciones efectuadas por mayor valor aportado, ni los pagos realizados por otros canales diferentes a PILA.

Fecha de Generación : lunes, 1 de diciembre de 2025 9:15

CERTIFICADO ELECTRONICO

Atentamente :

Sede Nacional

Avenida Carrera 68 # 64C - 75

Linea Gratuita Nacional 01 8000 918080

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección Financiera

BIENESTAR FAMILIAR



Tarsicio Andres Osorio Rodriguez

Coordinador(a) Grupo de Tesorería

Vigencia 2025

Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

Certificación Tributaria por Vigencia

Para los efectos de los artículos 108, 114 y 664 (modificado por el artículo 25 de la ley 788 de 2002) del Estatuto Tributario, el artículo 34 de la Ley 119 de 1994 y demás normas concordantes; el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA certifica que:

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ

Con Número de identificación: 27601897

Canceló un total de aportes a nivel nacional de: QUINIENTOS TRECE MIL CIEN PESOS M/CTE. ($513,100) correspondientes a los Aportes Parafiscales por la vigencia 2025, discriminados así:

Periodo	Valor
Enero	0
Febrero	88,900
Marzo	122,200
Abril	0
Mayo	18,100
Junio	28,500

Periodo	Valor
Julio	9,900
Agosto	68,100
Septiembre	78,500
Octubre	78,500
Noviembre	20,400
Diciembre	0
Total por Vigencia	513,100

Este documento no tiene validez para fines tributarios. No tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

Aclaración: En virtud a lo determinado en la Ley 1819 de 2016, estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. Así mismo las personas naturales empleadoras estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-11-25

Generado por : Elfridis Centeno MejÃa

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web https://certificadoempresarios.sena.edu.co/ enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 1044641895 y el Número de Certificado: 443606

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Anexo No.6
Gastos de oficina

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El Jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

1150

PAPELERÍA Q'Nota

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE4315
Fecha Emisión: 2025-06-16 17:09:46
Fecha validación: 2025-06-16 17:17:52-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-16

Nº Resolución: 18764080546997 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 2701 hasta 5000 **Fecha:** 2024-09-30 **hasta** 2026-09-30

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: LAURA YANED DAZA CABALLERO **NIT:** 40505599-3 **Actividad Económica:** 4761 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 15 25 59 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3213220708 **Contacto:** LAURA YANED DAZA **E-mail:** lauradazacaballero123@gmail.com	**Razón social/Nombre:** TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA **NIT:** 27601897-7 **Actividad Económica:** 4220 **Dirección:** CR 8 24 54 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3118616905 **Contacto:** TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA **E-mail:** leidydianatrigosj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702148000043	4.00	94	RESMA BOND TAMAÑO CARTA X 500HJ	15,126.05	IVA 19.00	11,495.80		72,000.00
2	1586	1.00	94	OPALINA PAQUETE X 25 UNIDADES	5,882.35	IVA 19.00	1,117.65		7,000.00
3	1165	2.00	94	MARCADOR SHARPIE FINE COLOR SURTIDO	2,100.84	IVA 19.00	798.32		5,000.00
4	7702111007086	2.00	94	AZ CARTA NORMA	5,882.35	IVA 19.00	2,235.29		14,000.00
5	2953505088227	1.00	94	RESALTADOR DOBLE PUNTA OSO PANDA X 5 UND REF E8665	6,218.49	IVA 19.00	1,181.51		7,400.00
6	7501014511023	1.00	94	BOLIGRAFO BIC CAJA X 12 UNDS	5,042.02	IVA 19.00	957.98		6,000.00
7	1357	1.00	94	PLANILLERO ECONOMICO	4,033.61	IVA 19.00	766.39		4,800.00
8	7703064861213	1.00	94	REGLA PELIKAN 30 CM	3,193.28	IVA 19.00	606.72		3,800.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	100,840.34	19,159.66

Totales	
SUBTOTAL:	100,840.34
TOTAL Base Imponible:	100,840.34
IVA	19,159.66
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	120,000.00
TOTAL en letras: Ciento Veinte Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2025-06-16			0				

Ésta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y s.s. 772-774 del Código de Comercio. con ésta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este titulo valor.
Pagos por consignación o transferencia a las siguiente cuenta de AHORROS 4-736-00-04985-8 BANCO AGRARIO

CUFE: 7ed521ce12f6fbe4b1d5c5367b92c01bb2dfaeb0a96478288fcd628ff310d9d53e08748e8117c3c395d6f86e472e334e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-784

1151

PAPELERÍA Q'Nota

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE4532
Fecha Emisión: 2025-07-14 17:06:55
Fecha validación: 2025-07-14 17:11:59-05:00
Fec. Vcto.: 2025-07-14

N° Resolución: 18764080546997 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 2701 hasta 5000 **Fecha:** 2024-09-30 **hasta** 2026-09-30

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: LAURA YANED DAZA CABALLERO
NIT: 40505599-3
Actividad Económica: 4761
Responsabilidad: No aplica – Otros -
Dirección: CR 15 25 59 - SARAVENA - - Arauca - CO
Teléfonos: 3213220708
Contacto: LAURA YANED DAZA
E-mail: lauradazacaballero123@gmail.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA
NIT: 27601897-7
Actividad Económica: 4220
Dirección: CR 8 24 54 - SARAVENA - - Arauca - CO
Teléfonos: 3118616905
Contacto: TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA
E-mail: leidydianatrigosj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7702148000043	2.00	94	RESMA BOND TAMAÑO CARTA X 500HJ	15,126.05	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
2	7702111007086	2.00	94	AZ CARTA NORMA	6,302.52	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
3	1076	6.00	94	SEPARADOR CARTULINA COLORES NEON	1,260.50	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
4	1724	2.00	94	TINTA EPSON 544 GENERICA COLORES SURTIDOS	16,806.72	IVA 19.00	6,386.55		40,000.00
5	7709759032890	1.00	94	BOLIGRAFO RETRACTIL OFI-ESCO 052 X 12	6,722.69	IVA 19.00	1,277.31		8,000.00
6	7709990345551	1.00	94	LAPIZ NEGRO OFI ESCO X 12 REF OE- 150	5,000.00	IVA 0.00	0.00		5,000.00
7	1112	6.00	94	SOBRE DE MANILA RADIOGRAFIA X UNIDAD	336.13	IVA 19.00	383.19		2,400.00
8	7709990509205	1.00	94	COSEDORA GRANDE PLASTICA REF OE-309	6,302.52	IVA 19.00	1,197.48		7,500.00

Total Items	8

Impuestos

Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	99,075.64	18,824.36
IVA : 0.00%	5,000.00	0.00

Totales

SUBTOTAL:	104,075.64
TOTAL Base Imponible:	104,075.64
IVA	18,824.36
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	122,900.00
TOTAL en letras: Ciento Veintidos Mil Novecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2025-07-14			0				

Ésta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y s.s. 772-774 del Código de Comercio. con ésta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este título valor.
Pagos por consignación o transferencia a las siguiente cuenta de AHORROS 4-736-00-04985-8 BANCO AGRARIO

CUFE: 79c21fd0b03fdf4990443fc8283fdf3057f650905613331710 86d13f49b7d248c7560affc0b3b40ab3a7c10721fb6e27
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390136-6

PAPELERÍA Q'Nota

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE4877
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 11:27:25
Fecha validación: 2025-08-28 11:35:30-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

Nº Resolución: 18764080546997 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 2701 hasta 5000 **Fecha:** 2024-09-30 **hasta** 2026-09-30

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LAURA YANED DAZA CABALLERO **NIT:** 40505599-3 **Actividad Económica:** 4761 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 15 25 59 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3213220708 **Contacto:** LAURA YANED DAZA **E-mail:** lauradazacaballero123@gmail.com	**Razón social/Nombre:** TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA **NIT:** 27601897-7 **Actividad Económica:** 4220 **Dirección:** CR 8 24 54 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3118616905 **Contacto:** TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA **E-mail:** leidydianatrigosj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	7707294389868	4.00	94	RESMA BOND TAMAÑO CARTA MARFIL X 500 HJ	15,126.05	IVA 19.00	11,495.80		72,000.00
2	1076	5.00	94	SEPARADOR CARTULINA COLORES NEON	1,260.50	IVA 19.00	1,197.48		7,500.00
3	1002	200.00	94	FOTOCOPIAS	168.07	IVA 19.00	6,386.55		40,000.00
4	7702163141691	1.00	94	BORRADOR DORICOLOR PEQUEÑO	420.17	IVA 19.00	79.83		500.00
Total Items		4							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	100,840.34	19,159.66

Totales	
SUBTOTAL:	100,840.34
TOTAL Base Imponible:	100,840.34
IVA	19,159.66
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	120,000.00
TOTAL en letras: Ciento Veinte Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2025-08-28			0				

Ésta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y s.s. 772-774 del Código de Comercio. con ésta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este título valor.
Pagos por consignación o transferencia a las siguiente cuenta de AHORROS 4-736-00-04985-8 BANCO AGRARIO

CUFE: fe9c622c3b25747ef968b3d88e68309dd5d7742c18eb0b819818f55747890a593248d2cf88e77e826e8ca2b91dc48b80
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

PAPELERÍA Q'Nota

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE5462
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 17:45:02
Fecha validación: 2025-10-30 17:53:06-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

Nº Resolución: 18764098609147 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 5001 hasta 20000 **Fecha:** 2025-09-13 **hasta** 2027-09-13

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LAURA YANED DAZA CABALLERO **NIT:** 40505599-3 **Actividad Económica:** 4761 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 15 25 59 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3213220708 **Contacto:** LAURA YANED DAZA **E-mail:** lauradazacaballero123@gmail.com	**Razón social/Nombre:** TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA **NIT:** 27601897-7 **Actividad Económica:** 4220 **Dirección:** CR 8 24 54 - SARAVENA - Arauca - CO **Teléfonos:** 3118616905 **Contacto:** TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA **E-mail:** leidydianatrigosj@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	1123	12.00	94	CARPETA CUATRO ALAS BLANCA ECO	1,512.61	IVA 19.00	3,448.74		21,600.00
2	1454	3.00	94	TACO NOTAS PERIODICO	840.34	IVA 19.00	478.99		3,000.00
3	7702003579097	1.00	94	PEGANTE BARRA STIC 22 GM	4,621.85	IVA 19.00	878.15		5,500.00
4	7702111571600	3.00	94	AZ CARTA PLASTIFICADA NORMA	6,554.62	IVA 19.00	3,736.13		23,400.00
5	7709990345568	3.00	94	BOLIGRAFO OFI ESCO REF OE- 076F	6,302.52	IVA 19.00	3,592.44		22,500.00
6	7702148000043	6.00	94	RESMA BOND TAMAÑO CARTA X 500HJ	15,126.05	IVA 19.00	17,243.70		108,000.00
7	7708013947994	1.00	94	TIJERA 8" TITANIUM OE-229	8,235.29	IVA 19.00	1,564.71		9,800.00
8	1091	10.00	94	PASTA POLICOVER OFICIO COLOR SURTIDO	840.34	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
9	7702124333974	1.00	94	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO KEEPERMATE	2,436.97	IVA 19.00	463.03		2,900.00
10	1093	4.00	94	CARPETA DE PRESENTACION TAMAÑO CARTA	420.17	IVA 19.00	319.33		2,000.00
11	7703336203123	1.00	94	REGLA PLASTICA	1,092.44	IVA 19.00	207.56		1,300.00
Total Items		11							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	176,470.58	33,529.42

Totales	
SUBTOTAL:	176,470.58
TOTAL Base Imponible:	176,470.58
IVA	33,529.42
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	210,000.00
TOTAL en letras: Doscientos Diez Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2025-10-30			0				

Ésta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y s.s. 772-774 del Código de Comercio. con ésta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este título valor.
Pagos por consignación o transferencia a las siguiente cuenta de AHORROS 4-736-00-04985-8 BANCO AGRARIO

CUFE: b40ffd89982039dce5ed3d5d6f572a1fe5483f10d41bb0005538ce628cec26a1fbfd75352b1b308527b7564ffd953b93
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

PAPELERÍA Q'Nota

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE5462
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-30 17:45:02
Fecha validación: 2025-10-30 17:53:06-05:00
Fec. Vcto.: 2025-10-30

Ésta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo No. 671 y s.s. 772-774 del Código de Comercio. con ésta, el comprador declara haber recibido real y materialmente la mercancía descrita en este título valor.
Pagos por consignación o transferencia a las siguiente cuenta de AHORROS 4-736-00-04985-8 BANCO AGRARIO

CUFE: b40ffd89982039dce5ed3d5d6f572a1fe5483f10d41bb0005538ce628cec26a1fbfd75352b1b308527b7564ffd953b93
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Anexo No.7
Alquiler de oficina

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El Jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DESTINADO A OFICINA

Entre los suscritos a saber **LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ** Mayor de edad, vecina del Municipio de Saravena, identificada con cédula de ciudadanía No. 27.601.897 de Cúcuta, domiciliada en la carrera 8 # 24 - 54, quien en adelante se denominará **EL ARRENDADOR**; y **HENRY BORRERO MERCHAN** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 88.255.608 de Cúcuta, domiciliado en la calle 25 # 8- 28 Barrio Villa Fanny, actuando en nombre propio, quien en adelante se denominará **EL ARRENDATARIO**; hemos convenido celebrar el presente contrato de arrendamiento de inmueble destinado a oficina, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO:
El ARRENDADOR da en arrendamiento al ARRENDATARIO un inmueble ubicado en la calle 2 No. 5 - 09, barrio El jardín, municipio de Cubara, departamento de Boyacá, destinado exclusivamente para oficina.

SEGUNDA – DURACION:
El presente contrato tendrá una duración de tres (03) meses, contado a partir del día doce (12) de mayo de 2025 y hasta el día doce (12) de agosto de 2025, fecha en la cual el ARRENDATARIO se compromete a restituir el inmueble en las mismas condiciones en que lo recibió, salvo el deterioro natural por el uso.

TERCERA - CANON MENSUAL:
El precio mensual que el ARRENDATARIO se obliga a pagar al ARRENDADOR por el uso y goce del inmueble es de **TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000.00).**

CUARTA - OPORTUNIDAD PARA EL PAGO:
El ARRENDATARIO se obliga a pagar al ARRENDADOR el canon mensual dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

QUINTA – DESTINACION:
El ARRENDATARIO se obliga a utilizar el inmueble exclusivamente como oficina para la ejecución del Contrato de Interventoría No. MC-026-2025, cuyo objeto es: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"**, y no podrá darle otro uso o destinación sin previa autorización escrita del ARRENDADOR.

SEXTA. - SERVICIOS PUBLICOS Y PAGO:
El inmueble cuenta con los servicios públicos de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado. El pago mensual y oportuno de dichos servicios corresponderá en su totalidad al ARRENDADOR.

SÉPTIMA – ESTADO DEL INMUEBLE:
El ARRENDATARIO declara haber recibido el inmueble objeto de este contrato, junto con los servicios antes descritos, en buen estado, y se obliga a devolverlo al ARRENDADOR al finalizar el contrato, en el mismo estado en que lo recibió, exceptuando el deterioro natural derivado del uso legítimo y del transcurso del tiempo.

OCTAVA - REPARACIONES:
El ARRENDATARIO tendrá a su cargo las reparaciones locativas y aquellas necesarias por hechos atribuibles a él o a sus dependientes. No podrá realizar mejoras o modificaciones sin consentimiento previo y por escrito del ARRENDADOR.

NOVENA – TERMINACIÓN Y PRÓRROGA:
Este contrato terminará por el vencimiento del término pactado. Las partes podrán prorrogarlo mediante comunicación escrita enviada con al menos un (1) mes de anticipación a la fecha de vencimiento.

DÉCIMA – SUBARRIENDO:
El ARRENDATARIO no podrá subarrendar total ni parcialmente el inmueble, sin autorización expresa y por escrito del ARRENDADOR.

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202-88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN:
El ARRENDATARIO podrá ceder este contrato únicamente con la autorización previa y por escrito del ARRENDADOR, o en caso de enajenación del respectivo establecimiento de comercio.

PARÁGRAFO FINAL:
Para constancia se firma en Cubara el día doce (12) de mayo de 2025.

ARRENDATARIO
HENRY BORRERO MERCHAN
C.C 88.255.608

ARRENDADOR
LEIDY DIANA TRIGOS J.
C.C 27.601.897

1159

Cubara, 13 de junio de 2025

CUENTA DE COBRO

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
NIT. 27601897-7

Debe a:

HENRY BORRERO MERCHAN
CC. 88.255.608 de Cúcuta

POR CONCEPTO DE

Alquiler de local comercial para el desarrollo del Contrato de interventoría No. MC-026-2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 al 12 de junio de 2025

LA SUMA DE

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

($300.000.00).

HENRY BORRERO MERCHAN
CC. 88.255.608 de Cúcuta

Cubara, 14 de junio de 2025

$ 300.000,00

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO No. 201

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
NIT. 27.601.897-7

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025	
	Descuento	300.000,00
	total a pagar	300.000,00

CHEQUE No. **EFECTIVO** X

BANCO

DEBITESE A:

	PREPARADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: Harry Borrero O.

C.C o Nit: 88.255.608

Cubara, 14 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
NIT. 27601897-7

Debe a:

HENRY BORRERO MERCHAN
CC. 88.255.608 de Cúcuta

POR CONCEPTO DE

Alquiler de local comercial para el desarrollo del Contrato de interventoría No. MC-026-2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, correspondiente al periodo comprendido entre el 12 de junio de 2025 al 12 de julio de 2025.

.

LA SUMA DE

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

($300.000.00).

HENRY BORRERO MERCHAN
CC. 88.255.608 de Cúcuta

1162

Cubara, 15 de julio de 2025

$ 300.000,00

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO No. 205

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
NIT. 27.601.897-7

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025	
	Descuento	300.000,00
	total a pagar	300.000,00

CHEQUE No.		**EFECTIVO**	X	**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**	
BANCO					
DEBITESE A:					
	PREPARADO	**APROBADO**	**CONTABILIZADO**	**NOMBRE:**	Henry Barrera R.
				C.C o Nit:	88.255.60 8

Cubara, 08 de septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
NIT. 27601897-7

Debe a:

HENRY BORRERO MERCHAN
CC. 88.255.608 de Cúcuta

POR CONCEPTO DE

Alquiler de local comercial para el desarrollo del Contrato de interventoría No. MC-026-2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, correspondiente al periodo comprendido entre el 08 de agosto de 2025 al 08 de septiembre de 2025.

.

LA SUMA DE

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

($300.000.00).

HENRY BORRERO MERCHAN

Cubara, 09 de septiembre de 2025

$ 300.000,00

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO No. 211

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
NIT. 27.601.897-7

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025	
	Descuento	300.000,00
	total a pagar	300.000,00

CHEQUE No. **EFECTIVO** X

BANCO

DEBITESE A:

	PREPARADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: Henry Borrero M.

C.C o Nit: 88.255.608

Cubara, 09 de octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
NIT. 27601897-7

Debe a:

HENRY BORRERO MERCHAN
CC. 88.255.608 de Cúcuta

POR CONCEPTO DE

Alquiler de local comercial para el desarrollo del Contrato de interventoría No. MC-026-2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE No.3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA No.2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, correspondiente al periodo comprendido entre el 08 de septiembre de 2025 al 08 de octubre de 2025.

.

LA SUMA DE

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

($300.000.00).

HENRY BORRERO MERCHAN

Cubara, 10 de octubre de 2025

$ 300.000,00

TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

COMPROBANTE DE EGRESO No. 219

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
NIT. 27.601.897-7

CODIGO	CONCEPTO	VALOR
	ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL PARA EJECUCION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MC-026-2025	
	Descuento	300.000,00
	total a pagar	300.000,00

CHEQUE No. **EFECTIVO** X

BANCO

DEBITESE A:

	PREPARADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: Henry Barrero R

C.C o Nit: 88.255608

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 542021 88037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Anexo No.8
Ensayos de laboratorio realizados de interventoría

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El Jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LABSOILS S.A.S.

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS

NIT. 901.270.750-1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673	Código: FRC
	Revisión: 01
	Fecha:

Proyecto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NO. 3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA NO. 2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
Solicitante:	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ NIT. 27601897-7	Contrato No.:	MC-026-2025
Supervisor:	JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA - S. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPIO DE CUBARA	Contrato No.:	-

FECHA DE TOMA	LOCALIZACION	ELEMENTO ESTRUCTURAL	SLUMP (CM)	EDAD CILINDRO (DÍAS)	DIMENCIONES CILINDRO		FECHA DE ROTURA	CARGA KN	RESISTENCIA				OBSERVACIONES
					D (CM)	H (CM)			NOMINAL PSI	ENSAYO PSI	ENSAYO Mpa	ENSAYO %	
3/06/2025	POZO 1 Y POZO 2	SOLADO		7	10.0	20.0	10/06/2025	100.0	2500	1847	13	74%	f'c=17.5 Mpa (2500 psi)
				14	10.0	20.0	17/06/2025	124.8	2500	2305	16	92%	
				28	10.0	20.0	1/07/2025	160.0	2500	2955	21	118%	
				28	10.0	20.0	1/07/2025	162.7	2500	3005	21	120%	
4/06/2025	POZO 1 Y POZO 2	PLACA DE FONDO		7	10.0	20.0	11/06/2025	124.8	3000	2304	16	77%	f'c=21 Mpa (3000 psi)
				14	10.0	20.0	18/06/2025	158.5	3000	2927	20	98%	
				28	10.0	20.0	2/07/2025	180.4	3000	3331	23	111%	
				28	10.0	20.0	2/07/2025	182.3	3000	3367	24	112%	
4/06/2025	POZO 3	SOLADO		7	10.0	20.0	11/06/2025	99.5	2500	1837	13	73%	f'c=17.5 Mpa (2500 psi)
				14	10.0	20.0	18/06/2025	127.0	2500	2345	16	94%	
				28	10.0	20.0	2/07/2025	158.4	2500	2925	20	117%	
				28	10.0	20.0	2/07/2025	161.4	2500	2981	21	119%	
5/06/2025	POZO 1 Y POZO 2	ANILLO		7	10.0	20.0	12/06/2025	126.5	3000	2336	16	78%	f'c=21 Mpa (3000 psi)
				14	10.0	20.0	19/06/2025	156.6	3000	2892	20	96%	
				28	10.0	20.0	3/07/2025	180.0	3000	3324	23	111%	
				28	10.0	20.0	3/07/2025	182.4	3000	3368	24	112%	
5/06/2025	POZO 3	PLACA DE FONDO		7	10.0	20.0	12/06/2025	125.5	3000	2318	16	77%	f'c=21 Mpa (3000 psi)
				14	10.0	20.0	19/06/2025	159.0	3000	2936	21	98%	
				28	10.0	20.0	3/07/2025	179.5	3000	3315	23	110%	
				28	10.0	20.0	3/07/2025	183.0	3000	3379	24	113%	
6/06/2025	POZO 3	ANILLO		7	10.0	20.0	13/06/2025	128.8	3000	2379	17	79%	f'c=21 Mpa (3000 psi)
				14	10.0	20.0	20/06/2025	160.0	3000	2955	21	98%	
				28	10.0	20.0	4/07/2025	185.9	3000	3433	24	114%	
				28	10.0	20.0	4/07/2025	187.1	3000	3455	24	115%	
6/06/2025	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	CAJA INSPECCION		7	10.0	20.0	13/06/2025	130.0	3000	2401	17	80%	f'c=21 Mpa (3000 psi)
				14	10.0	20.0	20/06/2025	156.8	3000	2896	20	97%	
				28	10.0	20.0	4/07/2025	190.2	3000	3512	25	117%	
				28	10.0	20.0	4/07/2025	192.4	3000	3553	25	118%	

1

	EJECUTOR ENSAYO	DIGITÓ - CALCULÓ	REVISÓ
Empresa:	LABSOILS SAS - LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS		
Firma:			
Nombre:	JOSE ANDERSON CORDERO PALOMINO	SANDRA EMILCE SEPULVEDA CELIS	
Cargo:	LABORATORISTA	M.P. 121037-0546125 NTS INGENIERO LABORATORIO	

CALLE 16A No. 23-66 B. PABLO ANTONIO HERNÁNDEZ
CEL. 3228843100 - 3203943317
SARAVENA - ARAUCA

LABSOILS S.A.S.

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS

NIT. 901.270.750-1

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO NTC 673	Código: FRC
	Revisión: 01
	Fecha:

Proyecto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE NO. 3 ENTRE LA VÍA NACIONAL Y LA CARRERA NO. 2 DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"		
Solicitante:	LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ NIT. 27601897-7	Contrato No.:	MC-026-2025
Supervisor:	JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA - S. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FISICA MUNICIPIO DE CUBARA	Contrato No.:	-

FECHA DE TOMA	LOCALIZACION	ELEMENTO ESTRUCTURAL	SLUMP (CM)	EDAD CILINDRO (DÍAS)	DIMENCIONES CILINDRO		FECHA DE ROTURA	CARGA KN	RESISTENCIA				OBSERVACIONES
					D (CM)	H (CM)			NOMINAL	ENSAYO			
									PSI	PSI	Mpa	%	
10/06/2025	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	CAJA INSPECCION		7	10.0	20.0	17/06/2025	125.5	3000	2318	16	77%	f'c=21 Mpa (3000 psi)
				14	10.0	20.0	24/06/2025	161.9	3000	2990	21	100%	
				28	10.0	20.0	8/07/2025	183.4	3000	3387	24	113%	
				28	10.0	20.0	8/07/2025	185.5	3000	3426	24	114%	
16/06/2025	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	CAJA INSPECCION		7	10.0	20.0	23/06/2025	119.4	3000	2205	15	73%	f'c=21 Mpa (3000 psi)
				14	10.0	20.0	30/06/2025	158.4	3000	2925	20	98%	
				28	10.0	20.0	14/07/2025	177.1	3000	3270	23	109%	
				28	10.0	20.0	14/07/2025	179.9	3000	3322	23	111%	
25/06/2025	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	CAJA INSPECCION		7	10.0	20.0	2/07/2025	120.2	3000	2220	16	74%	f'c=21 Mpa (3000 psi)
				14	10.0	20.0	9/07/2025	152.4	3000	2814	20	94%	
				28	10.0	20.0	23/07/2025	181.4	3000	3350	23	112%	
				28	10.0	20.0	23/07/2025	183.6	3000	3391	24	113%	

2

EJECUTOR ENSAYO	DIGITÓ - CALCULÓ	REVISÓ
LABSOILS SAS - LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS		
Firma:		
Nombre: JOSE ANDERSON CORDERO PALOMINO	SANDRA EMILCE SEPULVEDA CELIS	
Cargo: LABORATORISTA	M.P. 121037-0546125 NTS INGENIERO LABORATORIO	

CALLE 16A NO. 23-66 B. PABLO ANTONIO HERNÁNDEZ
CEL. 3228843100 - 3203943317
SARAVENA - ARAUCA

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Anexo No.9
Certificación bancaria

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El Jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo
Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 27601897 de CUCUTA, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad con el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-736-03-06744-1, fecha de apertura: 12/24/2024.

Se expide en SARAVENA, a los veinte y seis (26) días del mes de agosto de 2025, con destino a: SOLICITUD DEL INTERESADO

Banco Agrario de Colombia
Of. Saravena - Arauca

DIRECTOR (A) OFICINA
FIRMA AUTORIZADA

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
INGENIERA CIVIL
MP. 54202188037NTS
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

Anexo No.10
Factura – Rut

Calle 2 No. 5 - 09 Barrio El Jardín
Email: leidydianatrigosj@gmail.com

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
NIT 27.601.897
CRA 8 24 54
Tel: (037) 3118616905
Saravena - Colombia
leidydianatrigosj@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 27

Señores	MUNICIPIO DE CUBARA		
NIT	800.099.196-2	**Teléfono**	(000) 3102574494
Dirección	C 4 4 43	**Ciudad**	Cubará - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/12/2025, 12:08
Expedición	24/12/2025, 12:18
Vencimiento	24/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTR-1	ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA N° 026-2025 OBJETO DEL CONTRATO: Interventoría técnica, administrativa y financiera para el proyecto: Reposición del sistema de alcantarillado sanitario en la Calle N° 3 entre la vía nacional y Carrera N° 2 del Municipio de Cubara Departamento de Boyacá.	1.00	11,016,425.00	0 %	0.00	11,016,425.00

Total items: 1

Total Bruto	11,016,425.00
Total a Pagar	11,016,425.00

Valor en Letras:
Once millones dieciseis mil cuatrocientos veinticinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - Consignación $ 11,016,425.00

Observaciones:
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $33.049.275,00
VALOR DEL ADICIONAL: $11.016.425,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $44.065.700,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 01: $11.016.425,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 02: $11.016.425,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 03: $11.016.425,00
VALOR NETO A PAGAR: $11.016.425,00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103379299 aprobado en 20251218 prefijo FE desde el número 25 al 48 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4220 Construcción de proyectos de servicio público Tarifa
CUFE: d7cf85880d50ca1ca05b808655b94b94ac42586fd3d0a4cb80fcf7e4fa3de3239740e04c514089a15565bde3490df118

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141147737671

(415)7707212489984(8020) 000014114773767 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 7 6 0 1 8 9 7	7	Impuestos y Aduanas de Arauca 3 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	27601897	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TRIGOS	JIMENEZ	LEIDY	DIANA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Boyacá 1 5	Cubará 2 2 3

41. Dirección principal: CL 2 5 09 BRR EL JARDIN

42. Correo electrónico: facturacionleidytrigos@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 8 6 1 6 9 0 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 2 0	2 0 0 5 0 5 1 1	7 1 1 2	2 0 0 5 0 5 1 1	4 2 9 0	4 1 1 1	3 1 1 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 22 48 52

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: TRIGOS JIMENEZ LEIDY DIANA

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 27-10-2025 09:12:48AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO
