INFORME DE ACTIVIDADES

Tipo de Informe:	Final [X]	Parcial [ ]	Pago No: 1

Número del contrato: SVIV SAMC 009 DE 2025	**Fecha del contrato:** 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	**Fecha de Iniciación:** 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	**Fecha de Terminación final:** 20 DE DICIEMBRE DEL 2025
Nombre del Contratista: RN INGENERIA S.A.S R/L JOSE JULIAN ROJAS NUMA		**Identificación del Contratista:** NIT: 900.830.873-9 C.C. R/L: 79.789.690	
OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.			
Nombre del Supervisor: **ING. OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA**		**Cargo del Supervisor:** Profesional Universitario Área De Vías Y Carreteables	**Dependencia:** AREA DE VIAS, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
Estado actual del desarrollo del contrato (Porcentaje de ejecución): 100%			
VALOR A PAGAR: $627.786.449,00 Cuenta Ahorros No.318-000030-31DE BANCOLOMBIA			

Obligaciones / Productos programados (según contrato, cronograma y/o asignaciones)	**Actividades / Productos desarrollados frente a lo programado**
1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Cumpli con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	Desarrolle el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas contratado
3) Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Se garantizó la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4) Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	No se presentó ninguna reclamación que directa o indirectamente pudiera afectar el objeto del contrato o sus obligaciones, por lo tanto, no fue necesario dar a conocer información de este tipo a la Entidad
5) Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos	Se abstuvo de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	competente (cuando aplicaban intervenciones)
6) Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.	Se acreditó el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad
7) Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.	Se identificaron las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato
8) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.	Se implementaron las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra
9) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	Se dio cabal cumplimiento al pacto de transparencia y a las declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10) Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.	No se presentó ningún cambio en la composición del capital social del contratista, ni en los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, ni en su pertenencia a un grupo empresarial, por lo tanto, no fue necesario informar a la Entidad sobre tales aspectos
11) Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como es el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.	No se presentó ninguna situación que implicara una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas en Colombia o en el extranjero, por lo tanto, no fue necesario informar a la Entidad Estatal.
12) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	No se presentó ninguna circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
13) Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones para evitar	Durante la ejecución del contrato, se observaron las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, y se tomaron

que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	todas las precauciones necesarias para evitar que se produjeran en las zonas de los campamentos de trabajo accidentes o condiciones insalubres; así mismo, se dotó al personal y se aseguró el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP)."
14) Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial; si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	No se presentaron modificaciones en la composición del capital social, ni en la existencia de pactos o acuerdos de accionistas, ni en la pertenencia a un grupo empresarial, ni en la condición de matriz, subordinada o sucursal de sociedad extranjera, ni en información relevante de índole jurídica, comercial o financiera de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas; por tanto, no fue necesario informar periódicamente a la Entidad sobre dichos aspectos
15) Visitar, inspeccionar, investigar e informarse de todas las circunstancias técnicas, topográficas, geológicas, hidráulicas, ecológicas, climáticas, de acceso, condiciones y variables sociales y de seguridad que puedan influir o afectar los trabajos.	Se visitaron, inspeccionaron, investigaron y se recopiló información sobre todas las circunstancias técnicas, topográficas, geológicas, hidráulicas, ecológicas, climáticas, de acceso, condiciones y variables sociales y de seguridad que pudieron influir o afectar los trabajos.
16) obligación muy fundamental será la de informar por escrito al interventor de todo error o deficiencia que observa en la ejecución del contrato. El hecho de que los proponentes no se informaren debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutadas los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones a EL CONTRATANTE.	No se presentaron errores ni deficiencias en la ejecución del contrato, y dado que no se designó interventor, no fue necesario informar por escrito sobre situaciones de esta naturaleza. Además, el contratista se informó debidamente sobre los detalles y condiciones bajo las cuales se ejecutarían los trabajos, por lo que no se generaron reclamaciones posteriores al Contratante
17) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y dificultades que puedan presentarse y en	Obre con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y dificultades que

general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normatividad pertinente.	puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios y demás normatividad pertinente.
18) Elaborar un cronograma de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato, Debera ejecutar las obras en el plazo máximo previsto en el cronograma.	Elaborare un cronograma de las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato, ejecute las obras en el plazo máximo previsto en el cronograma.
19) De conformidad con lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, dar cumplimiento a sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de Compensación Familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. El incumplimiento de esta obligación será causal para la imposición de multas sucesivas, hasta tanto se de el cumplimiento. Si durante la ejecución del contrato o la fecha de su liquidación se observa la persistencia de este incumplimiento por cuatro meses, El Contratante dará aplicación a la clausula excepcional de caducidad administrativa, según lo señalado por el artículo 1 de la ley 828 de 2003.	Se dio cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubo lugar. No se presentó incumplimiento alguno que diera lugar a la imposición de multas sucesivas ni a la aplicación de la cláusula excepcional de caducidad administrativa prevista en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, ya que durante toda la ejecución del contrato y hasta su liquidación, se mantuvo el cumplimiento permanente de dichas obligaciones.
20) Dar cumplimiento a sus obligaciones con la contribución con el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción –FIC–, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1074 de 1983 "Por medio del cual se reglamenta el Decreto número 2375 de 1974. Esta obligación debe estar a paz y salvo a la liquidación del contrato.	Se dio cumplimiento a sus obligaciones con la contribución con el Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción –FIC–, de conformidad con lo estipulado en el Decreto 1074 de 1983 "Por medio del cual se reglamenta el Decreto número 2375 de 1974. Esta obligación esta a paz y salvo a la liquidación del contrato.
21) Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y presentarse ante el CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo	Mantuve mi domicilio actualizado durante la vigencia del contrato y presentó disponibilidad para la suscripción del acta de liquidación en el momento requerido.

para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación.	
22) Tramitar por su cuenta y riesgo todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar las obras objeto del proyecto.	Tramite por mi cuenta y riesgo todos los permisos y licencias que se requieran para ejecutar las actividades del contrato.
23) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo.	Se respondio por las actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo.
24) constituir las políticas señaladas en el texto del contrato.	Cumpli las políticas señaladas en el texto del contrato.
25) Debe realizar la instalación de la señalética requerida en desarrollo de las obras y todas las medidas de seguridad industrial o adoptar según la normatividad vigente. Además, Elaborar y presentar el documento relacionado con Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.	realize la instalación de la señalética requerida en el desarrollo de las obras y todas las medidas de seguridad industrial o adoptar según la normatividad vigente. Además, Elaborare y presente el documento relacionado con Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
26) Evaluar e inspeccionar las áreas donde se ejecutarán los trabajos de acuerdo con la programación presentada con el fin de controlar las áreas contiguas y hacer las recomendaciones pertinentes.	Se evaluaron e inspeccionaron las áreas donde se ejecutaron los trabajos, de acuerdo con la programación presentada, con el fin de controlar las áreas contiguas y realizar las recomendaciones pertinentes
27) Pagar los impuestos y tributos que para tal efecto requiera la Ley 80 de 1993 y la normatividad Municipal, departamental y Nacional vigente.	Se Pagaron los impuestos y tributos que para tal efecto requiera la Ley 80 de 1993 y la normatividad Municipal, departamental y Nacional vigente.
28) Consultar con la Asesoría Jurídica de la Entidad las inquietudes de orden legal que se presenten en relación con la ejecución del contrato.	No se presentaron inquietudes de orden legal en relación con la ejecución del contrato, por lo que no fue necesario consultar con la Asesoría Jurídica de la Entidad
29) Suministrar los materiales, equipos y herramientas necesarios para realizar los trabajos y pruebas necesarias (si ello hay lugar) durante la ejecución del contrato.	Se suministraron los materiales, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de los trabajos; no fue requerido realizar pruebas durante la ejecución del contrato

30) Elaborar los informes relacionados con la ejecución del contrato procurando porque la redacción sea clara y precisa y remitir a EL CONTRATANTE copia en medio magnético y físico de cada una de las informes o productos finales. La periodicidad del informe deberá ser cada vez que se presente un acta parcial de obra. Adicional se deberá presentar informe ambiental, informe de manejo del concreto e informe de seguridad industrial y salud ocupacional de la obra.	Elaborare los informes relacionados con la ejecución del contrato procurando que la redacción sea clara y precisa y remitir a EL CONTRATANTE copia en medio magnético y físico de cada una de las informes o productos finales. La periodicidad del informe deberá ser cada vez que se presente un acta parcial de obra. Adicional se presento presentar informe ambiental, informe de manejo del concreto e informe de seguridad industrial y salud ocupacional de la obra.
31) Realizar reuniones con la Interventoría y/o supervisión, tanto al inicio como durante la ejecución del contrato.	Durante la ejecución del contrato lleve a cabo reuniones programadas relacionadas con el proyecto.
32) Mantener durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás ofrecidos en la propuesta.	Manteve durante la ejecución del contrato el recurso humano, técnico, físico y demás acordado en el contrato.
33) Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempeño para la ejecución de los trabajos.	Realice las recomendaciones que contribuyan al mejor desempeño para la ejecución de las obras.
34) informar de inmediato y por escrito, a la interventoría y/o supervisión la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que puedan afectarla ejecución del contrato, incluyendo las recomendaciones que procedan según el caso.	Durante la ejecución del contrato, no se presento hechos o situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que afectaran la ejecución del proyecto. En consecuencia, no tuve la necesidad de informar sobre este tipo de eventos, cumpliendo con lo establecido en el contrato en este aspecto.
35) elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos para ello el mismo día en que se constituya la póliza.	Elaboré y suscribí el acta de inicio de ejecución del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos para ello el mismo día en que se constituya la póliza.
36) Asistir a todas las reuniones programadas que sean para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar.	Asisti a las reuniones programadas que sean para lograr la debida ejecución del contrato y elaborar las actas a que haya lugar.

37) Solicitar previo al vencimiento del plazo contractual, las ampliaciones de plazo que se requieran indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento acompañado con los respectivos soportes de avance de obra, concepto del interventor si es el caso, cronograma ajustado y demás documentos técnicos que le permitan al supervisor analizar la solicitud.	Se solicitó, previo al vencimiento del plazo contractual, la ampliación del plazo requerida, indicando de manera detallada y debidamente sustentada los motivos de hecho y de derecho que fundamentaron la solicitud, la cual estuvo acompañada de los respectivos soportes de avance de obra, el concepto del interventor, cuando aplicó, el cronograma de ejecución ajustado y los demás documentos técnicos necesarios que permitieron al supervisor del contrato realizar el análisis correspondiente.
38) Tramitar oportunamente las actas de suspensión y reanudación del contrato, si ello fuere necesario	El desarrollo del proyecto se llevó a cabo sin interrupciones que lo justificaran. Por lo tanto, no tuve que realizar este procedimiento.
39) El contratista se obliga a atender todas las observaciones y requerimientos presentados a los trabajos presentadas por la Entidad, la Interventoría y/o supervisión y demás entidades competentes (si a ello hay lugar).	Atendí todas las observaciones y requerimientos presentados por la Entidad.
40) Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del Contrato.	mantuve la confidencialidad de la información proporcionada para la ejecución del objeto contractual
41) El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la normatividad vigente sobre trabajo en alturas (leyes, decretos, resoluciones, etc.) y, en especial, las indicaciones emitidas en la circular 070 de 2009 del Ministerio de la Protección Social.	No se realizaron trabajos en alturas durante la ejecución del contrato; por lo tanto, no fue necesario aplicar la normatividad vigente sobre trabajo en alturas, incluyendo lo establecido en la Circular 070 de 2009 del Ministerio de la Protección Social.
42) Presentar oportunamente las actas de avance de obra, junto con las respectivas facturas, anexando los certificados originales de pago de aportes de seguridad social y parafiscal.	Entrege oportunamente las actas de avance de obra, junto con las respectivas facturas, anexando los certificados originales de pago de aportes de seguridad social y parafiscal.
43) Instalar una valla informativa sobre el proyecto la cual debe seguir los lineamientos del Municipio.	No se instaló la valla informativa sobre el proyecto, ya que no fue requerida por el Municipio durante la ejecución del contrato.

44) Llevar un registro fotográfico donde se evidencie el inicio, ejecución y terminación de la obra, según las actividades descritas en el cronograma aportado.	Se realizo un registro fotográfico donde se evidencie el inicio, ejecución y terminación de la obra, según las actividades descritas en el cronograma .
45) Incorporar como mínimo el cinco por ciento (5%) de personal técnico, operativo y profesional de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en procesos de reincorporación o reintegración y sujetos de especial protección constitucional para el cumplimiento del contrato.	Se incorporó como mínimo el cinco por ciento (5%) de personal técnico, operativo y profesional perteneciente a población en pobreza extrema, personas desplazadas por la violencia, en procesos de reincorporación o reintegración, y sujetos de especial protección constitucional para el cumplimiento del contrato
46) Las demás que fueran necesarias para el normal desarrollo del contrato.	Cumplí con todas las obligaciones adicionales derivadas del desarrollo del objeto contractual, atendiendo las disposiciones legales y contractuales.

Otras actividades realizadas
La documentación de las actividades requeridas para este informe hace parte de los archivos de la secretaria de vías, infraestructura y vivienda, en el cual lo sustenta la revisión que hacen la secretaria y a la satisfacción de las entregas, **JOSE JULIAN ROJAS NUMA – R/L RN INGENIERIA S.A.S.** **C.C.79.789.690 de BOGOTA**
En calidad de supervisor del contrato anotado, manifiesto que el Contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas para el trámite del acta final. Igualmente, certifico que el Contratista acreditó los pagos de aportes al Régimen de Seguridad Social integral para dicho periodo. Por lo anterior, se puede proceder a efectuar el pago correspondiente, conforme se señala en la cláusula de valor y forma de pago del contrato de obra pública No SVIV SAMC 009 DE 2025 (CO1.PCCNTR.7873158) de 16 de septiembre de 2025 **OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA** Profesional Universitario Área de Vías, infraestructura y vivienda Supervisor

REGISTRO FOTOGRÁFICO


ACTIVIDADES PRELIMINARES

Desmonte y limpieza manual del terreno





Localización y replanteo

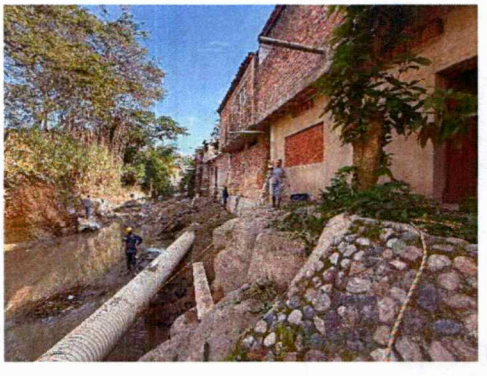



Demolición de concreto, pavimento y/o andenes





Demolición de estruturas en concreto reforzado





MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS

Excavación mecánica





Excavacion manual










Retiro de escombros

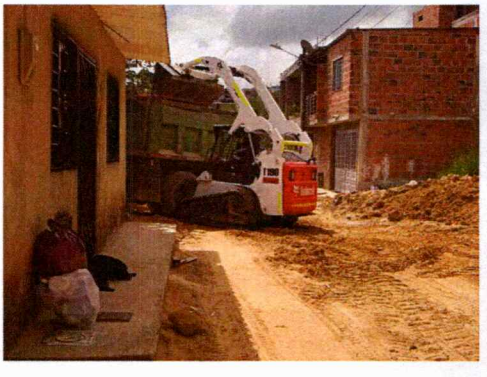






Suministro e instalación de recebo compactado










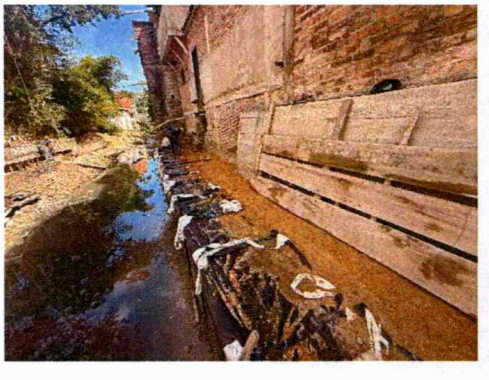

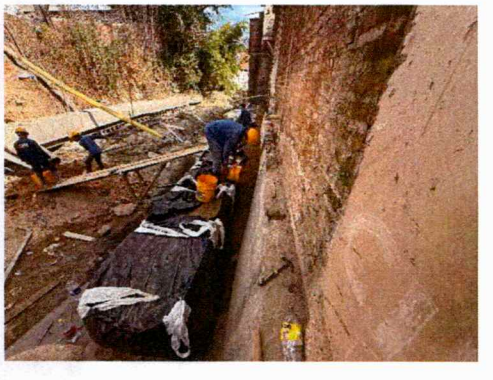

Suministro e instalación de pedraplén compactado





DESVIO Y MANEJO DE AGUAS

Desvió del cauce de canal abierto






Desvió de aguas de red principal de alcantarillado sanitario





ESTRUCTURAS

Reposición de concreto 3000psi, espesor 10cm, incluye malla electrosoldada 6mmx15x15 cm

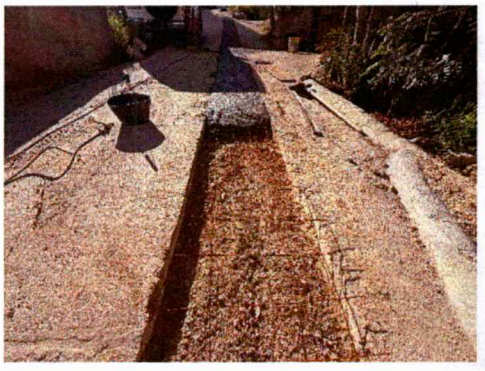





Concreto ciclópeo (60%-40%)





Concreto de 3000 PSI





Suministro, instalación de geocontenedores y relleno en suelo cemento al 3% con material en clasificación ASTHO a-1 (0.75x0.45x0.20)





Acero de refuerzo






Pozo de inspección de H:1.2 a H:1.8 mts





Pozo de inspección de H:2 a H:2.4 mts

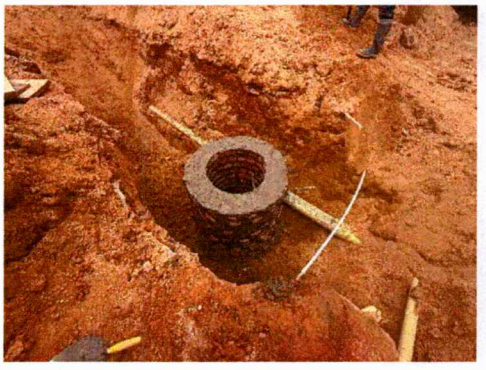



Caja de inspección sanitaria domiciliarias 60x60x60cm





Mantenimiento de pozo de inspección H<2m





Muro en gaviones





Revoque impermeabilizado e=5cm, para gaviones, incluye malla metálica





Suministro e instalación de geotextil NT 2000





REPOSICION DE REDES DE LACANTARILLADO

Extracción de redes domiciliarias existentes






Colchón de arena





Suministro e instalación de tubería PVC 8"



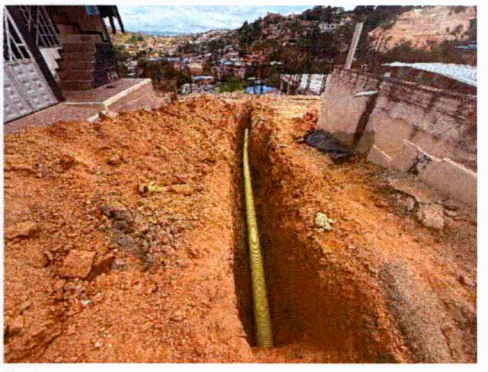

Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 24"





Suministro e instalación de SILLA YEE 8" a 4", para acometidas domiciliarias





Suministro e instalación de tubería PVC 4"





SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTO

NP01. pozo de inspección de H:4,3





NP02. pozo de inspección de H:2,7 (pozo villa mar) y pozo 11







NP03. suministró e instalación de tubería corrugada PVC 6"



NP04. Nivelación de pozo existente; incluye tapa en hierro (pozo 5)





NP05. suministró e instalación de tubería corrugada PVC 12"







NP06. concreto ciclópeo (60%-40%) con fraguado rápido






NP07. suministro e instalación de concreto simple de 17,5 MPA (2500 psi) para recubrimiento (incluye malla de refuerzo)

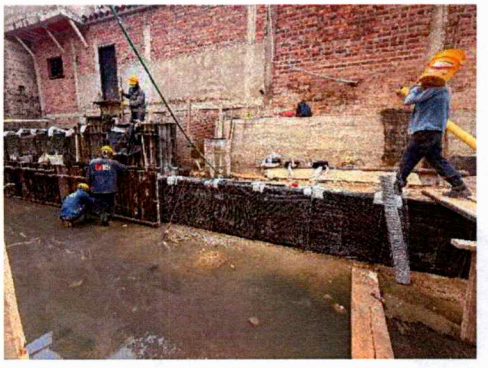

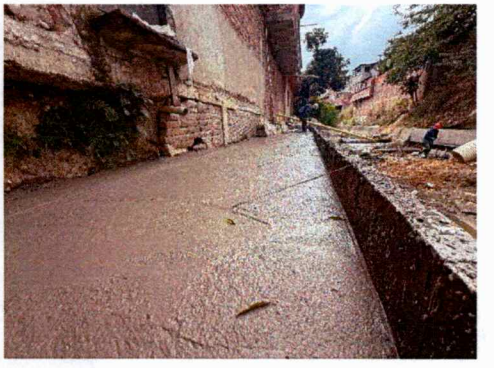

NP08. proceso constructivo se encofrado, suministro, instalación de geocontenedores y relleno en suelo cemento al 3% con material en clasificación ASTHO A-1(0,94*0,94*1,15)



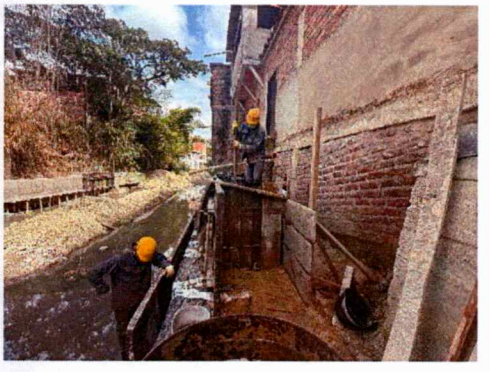

NP09. ciclópeo con anclajes de acero reforzado







RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	21/09/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 1 Del: 16 de septiembre de 2025 Al: 21 de septiembre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 5 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 78 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0,577%	0,577%
Valor básico de la Obra programada:	$ 3.621.541,24	$ 3.621.541,24

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	6,07%	6,07%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 38.096.324,00	$ 38.096.324,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No. No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial: $ 508.259.112,00
Valor Actualizado: $ 627.786.449,00
Plazo Inicial: TRES (03) meses
Plazo Actualizado: TRES (03) meses
Fecha de Iniciación: 16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento: 12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No. N/A
Valor Inicial: N/A
Valor Actualizado: N/A
Plazo Inicial: TRES (03) meses
Plazo Actualizado: TRES (03) meses
Fecha de Iniciación: 16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento: 12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LOCALIZACION Y REPLANTEO, DEMOLICION DE PISO, PAVIMENTO O ANDENES DE CONCRETO, EXCAVACION MECANICA Y EXCAVACION MANUAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO, POZO DE INSPECCION DE 1.2-1.8, COLCHON DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 8",

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DEMOLICION DE PISO, PAVIMENTO O ANDENES DE CONCRETO, EXCAVACION MECANICA Y EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO, POZO DE INSPECCION DE 1.2-1.8, COLCHON DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 8", NIVELACIION DE POZO EXISTENTE; INCLUYE TAPA DE HIERRO,

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción: LOCALIZACION Y REPLANTEO,




Descripción: DEMOLICION DE PISO, PAVIMENTO O ANDENES DE CONCRETO,




Descripción: EXCAVACION MECANICA

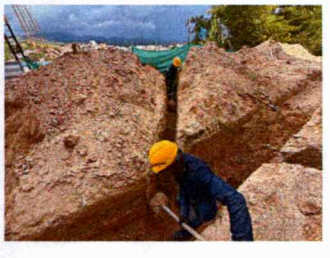


Descripción: EXCAVACION MANUAL

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	21/09/2025




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO




Descripción:
POZO DE INSPECCION DE 1.2-1.8,




Descripción:
COLCHON DE ARENA




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 8"

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	28/09/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 2 Del: 22 de septiembre de 2025 Al: 28 de septiembre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 11 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 72 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	2,561%	3,138%
Valor básico de la Obra programada:	$ 16.075.626,07	$ 19.697.167,32

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	7,70%	13,77%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 48.364.533,00	$ 86.460.857,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	$ 508.259.112,00
Valor Actualizado:	$ 627.786.449,00
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION DE PISO, PAVIMENTO O ANDENES DE CONCRETO, EXCAVACION MECANICA Y EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO, POZO DE INSPECCION DE 1.2-1.8, COLCHON DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 8", NIVELACIION DE POZO EXISTENTE; INCLUYE TAPA DE HIERRO,

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO, REPOSICION DE CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 10CM, INCLUYE MALLA DE 6*15*15, POZO DE INSPECCION DE 1.2-1.8, CAJAS DE INSPSCCION SANITARIA DE 60*60*60, EXTRACION DE REDES SANITARIAS EXISTENTES, COLCHON DE ARENA, SUMINSTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4", PARA ACOMETIDAS DOMISILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 4", POZO DE INSPECCION DE 4,3 MT

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En la semana transcurrida, se llevaron a cabo las labores de demolición de concreto, pavimento y andenes y su respectiva disposicion final (Retiro de escombros)
El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE


REGISTRO FOTOGRÁFICO









Descripción: DEMOLICION DE PISO, PAVIMENTO O ANDENES DE CONCRETO






Descripción: EXCAVACION MECANICA



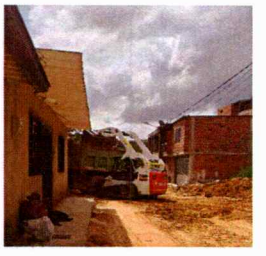

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	28/09/2025

Descripción:
EXCAVACION MANUAL







Descripción:
RETIRO DE ESCOMBROS





Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO






Descripción:
POZO DE INSPECCION DE 1.2-1.8





Descripción:
COLCHON DE ARENA





Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CORRUGADA PVC 8"

Descripción:
NIVELACIION DE POZO EXISTENTE; INCLUYE TAPA DE HIERRO

Descripción:

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	5/10/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 3 Del: 29 de septiembre de 2025 Al: 5 de octubre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 17 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 66 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,22%	8,36%
Valor básico de la Obra programada:	$ 32.782.758,83	$ 52.479.926,14
Obra Física Ejecutada (%)	7,28%	21,05%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 45.698.695,00	$ 132.159.552,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	$ 508.259.112,00
Valor Actualizado:	$ 627.786.449,00
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO, REPOSICION DE CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 10CM, INCLUYE MALLA DE 6*15*15, POZO DE INSPECCION DE 1.2-1.8, CAJAS DE INSPSCCION SANITARIA DE 60*60*60, EXTRACION DE REDES SANITARIAS EXISTENTES, COLCHON DE ARENA, SUMINSTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4", PARA ACOMETIDAS DOMISILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 4", POZO DE INSPECCION DE 4,3 MT

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO, LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION MECANICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO, DESVIOS DEL CAUCE CANAL ABIERTO, POZO DE INSPECCION DE 2 -2,4 MTS, CAJAS DE INSPSCCION SANITARIA DE 60*60*60,MANTENIMIENTO DE POZO DE INSPECCION. EXTRACION DE REDES SANITARIAS EXISTENTES, COLCHON DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 8", SUMINSTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4", PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 4", POZO DE INSPECCION DE 2,7 MT , SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 12".

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En la semana transcurrida, se han completado las siguientes actividades del contrato: excavación mecánica, que ha permitido la preparación del terreno con la maquinaria adecuada, para la instalacion de tuberias sanitarias de la red principal y de acometidas de la misma; Estas tareas se han llevado a cabo de acuerdo con los requerimientos del contrato, cumpliendo con los estándares de calidad y los plazos establecidos.

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Descripción:	Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO	REPOSICION DE CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 10CM, INCLUYE MALLA DE 6*15*15,

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	5/10/2025





Descripción:
POZO DE INSPECCION DE 1.2-1.8,






Descripción:
CAJAS DE INSPSCCION SANITARIA DE 60*60*60,





Descripción:
EXTRACION DE REDES SANITARIAS EXISTENTES

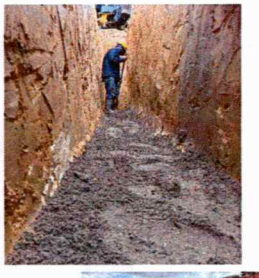



Descripción:
COLCHON DE ARENA






Descripción:
, SUMINSTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4", PARA ACOMETIDAS DOMISILIARIAS





Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 4"





Descripción:
, POZO DE INSPECCION DE 4.3 MT

Descripción:

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	12/10/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 4 Del: 6 de octubre de 2025 Al: 12 de octubre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 23 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 60 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,668%	14,027%	Obra Física Ejecutada (%)	7,76%	28,82%
Valor básico de la Obra programada:	$ 35.582.739,66	$ 88.062.665,80	Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 48.741.920,00	$ 180.901.472,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	$ 508.259.112,00
Valor Actualizado:	$ 627.786.449,00
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO, LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION MECANICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO, DESVIOS DEL CAUCE CANAL ABIERTO, POZO DE INSPECCION DE 2 -2,4 MTS, CAJAS DE INSPSCCION SANITARIA DE 60*60*60,MANTENIMIENTO DE POZO DE INSPECCION. EXTRACION DE REDES SANITARIAS EXISTENTES, COLCHON DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 8", SUMINSTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4", PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 4", POZO DE INSPECCION DE 2,7 MT , SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 12".

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO, CONCRETO CICLOPEO (60%-40%), CAJAS DE INSPSCCION SANITARIA DE 60*60*60 COLCHON DE ARENA, SUMINSTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4", PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 4",

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En la semana transcurrida, se han completado satisfactoriamente las actividades del contrato, que incluyen la excavación manual, suministro e instalación de recebo compactado, y la extracción de redes domiciliarias existentes. Además, se ha realizado el colchón de arena, así como la instalación de tuberías sanitarias de PVC de 8" y 4", y la silla Yee de 8" a 4" para la transición de tuberías. Finalmente, se llevó a cabo el retiro de escombros, dejando el área limpia y despejada de residuos generados durante las etapas previas. Todas estas tareas se han ejecutado conforme a los requerimientos del contrato, cumpliendo con los estándares y plazos estipulados.

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente

OBSERVACIONES


Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción:
DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO

Descripción:
LOCALIZACION Y REPLANTEO





Descripción:
EXCAVACION MECANICA






Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	12/10/2025






Descripción:
DESVIOS DEL CAUCE CANAL ABIERTO






Descripción:
POZO DE INSPECCION DE 2 -2,4 MTS



Descripción:
CAJAS DE INSPSCCION SANITARIA DE 60*60*60




Descripción:
MANTENIMIENTO DE POZO DE INSPECCION





Descripción:
EXTRACION DE REDES SANITARIAS EXISTENTES






Descripción:
COLCHON DE ARENA




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 8"

Descripción:
SUMINSTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4" PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS,




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 4"




Descripción:
, POZO DE INSPECCION DE 2,7 MT




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 12"

Descripción:

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	19/10/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 5 Del: 13 de octubre de 2025 Al: 19 de octubre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 29 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 54 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,14%	23,16%
Valor básico de la Obra programada:	$ 57.352.102,48	$ 145.414.768,28

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	6,78%	35,59%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 42.540.909,00	$ 223.442.381,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	$ 508.259.112,00
Valor Actualizado:	$ 627.786.449,00
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO, CONCRETO CICLOPEO (60%-40%), CAJAS DE INSPSCCION SANITARIA DE 60*60*60 COLCHON DE ARENA, SUMINSTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4", PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 4",

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EXCAVACIONMECANICA Y MANUAL, SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO, POZO DE INSPECCION DE 1.2-1.8, CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS DOMICILIARIAS, MURO EN GAVIONES, COLCHON DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 8", SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 4", POZO DE INSPECCIONDE 2,7, SUMINISTRO E INSTALACION DE 6"

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En la semana transcurrida, se completaron satisfactoriamente varias actividades . Se llevó a cabo la excavación mecanica del terreno, lo que permitió la preparación adecuada para las siguientes fases del proyecto. Se realizó el suministro e instalación de recebo compactado, estableciendo una base sólida y estable para las futuras estructuras. Se colocó un colchón de arena para proporcionar una capa protectora y de soporte para las instalaciones subsiguientes. Además, se completó el retiro de escombros, asegurando que el área de trabajo se mantuviera limpia y despejada.

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción:
EXCAVACIÓN MANUAL





Descripción:
RETIRO DE ESCOMBROS





Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECEBO COMPACTADO




Descripción:
CONCRETO CICLOPEO (60%-40%)

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	19/10/2025






Descripción:
CAJAS DE INSPSCCION SANITARIA DE 60*60*60





Descripción:
COLCHON DE ARENA





Descripción:
SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE SILLA YEE 8" A 4"




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC 4"

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	26/10/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 6 Del: 20 de octubre de 2025 Al: 26 de octubre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 35 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 48 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	14,50%	37,66%
Valor básico de la Obra programada:	$ 91.016.595,33	$ 236.431.363,61
Obra Física Ejecutada (%)	7,81%	43,398%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 49.007.045,00	$ 272.449.426,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	$ 508.259.112,00
Valor Actualizado:	$ 627.786.449,00
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EXCAVACIONMECANICA Y MANUAL, SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO, POZO DE INSPECCION DE 1.2-1.8, CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS DOMICILIARIAS, MURO EN GAVIONES, COLCHON DE ARENA, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 8", SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 4", POZO DE INSPECCIONDE 2,7, SUMINISTRO E INSTALACION DE 6"

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, REPOSICION DE CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 10CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, CAJAS SANITARIAS DOMICILIARIAS, MUERO EN GAVIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 4"

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

En la semana transcurrida, se han completado las siguientes actividades del contrato: excavación manual, que permitió la adecuación del terreno; suministro e instalación de recebo compactado, proporcionando una base sólida; extracción de redes domiciliarias existentes, limpiando el área para nuevas instalaciones; colchón de arena, que se colocó para ofrecer un soporte adecuado y proteger las tuberías; suministro e instalación de tubería sanitaria PVC de 8", garantizando una adecuada infraestructura de saneamiento; suministro e instalación de silla Yee para la transición de tuberías de 8" a 4", facilitando la conexión entre diferentes secciones de tuberías; y retiro de escombros, que ha dejado el área limpia y despejada.

El equipo de trabajo se mantuvo comprometido con los estándares de seguridad y calidad establecidos, promoviendo un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descripción: EXCAVACION MECANICA




Descripción: EXCAVACION MANUAL




Descripción: SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO




Descripción: POZO DE INSPECCION DE 1.2-1.8




Descripción: ,CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS DOMICILIARIAS




Descripción: MURO EN GAVIONES

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	26/10/2025




Descripción:
COLCHON DE ARENA




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 8"




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4"



Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 4"




Descripción:
, POZO DE INSPECCIONDE 2.7,



Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE 6"

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	2/11/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 7 Del: 27 de octubre de 2025 Al: 2 de noviembre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 41 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 42 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	11,50%	49,16%
Valor básico de la Obra programada:	$ 72.201.185,32	$ 308.632.548,93
Obra Física Ejecutada (%)	4,73%	48,13%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 29.692.357,00	$ 302.141.783,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	$ 508.259.112,00
Valor Actualizado:	$ 627.786.449,00
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, REPOSICION DE CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 10CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, CAJAS SANITARIAS DOMICILIARIAS, MUERO EN GAVIONES, SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4", SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 4"

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DESMONTE Y LIMPIEZA DE TERRENO, LOCALIZACION Y REPLANTEO, DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, ECAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDRAPLAN COMPACTADO, DESVIO DEL CAUCE DE CANAL ABIERTO, DESVIO DE AGUAS DE RED PRINCIPALDE ALCANTARILLADO, CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS DOMICILIARIAS, MURO EN GAVIONES, REVOQUE IMPERMEABILIZADO PARA GAVIONES, INCLUYE MALLA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000, CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) CON FRAGUADO RAPIDO

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descripción: EXCAVACIÓN MANUAL





Descripción: RETIRO DE ESCOMBROS





Descripción: REPOSICION DE CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 10CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA




Descripción: CAJAS SANITARIAS DOMICILIARIAS




Descripción: MUERO EN GAVIONES




Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE 8" A 4"




Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 4"

Descripción:

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	9/11/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 8 Del: 3 de noviembre de 2025 Al: 9 de noviembre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 47 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 36 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,95%	59,12%	Obra Física Ejecutada (%)	9,46%	57,59%
Valor básico de la Obra programada:	$ 62.491.230,20	$ 371.123.779,13	Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 59.375.235,00	$ 361.517.018,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	$ 508.259.112,00
Valor Actualizado:	$ 627.786.449,00
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DESMONTE Y LIMPIEZA DE TERRENO, LOCALIZACION Y REPLANTEO, DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, ECAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDRAPLAN COMPACTADO, DESVIO DEL CAUCE DE CANAL ABIERTO, DESVIO DE AGUAS DE RED PRINCIPALDE ALCANTARILLADO, CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS DOMICILIARIAS, MURO EN GAVIONES, REVOQUE IMPERMEABILIZADO PARA GAVIONES, INCLUYE MALLA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000, CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) CON FRAGUADO RAPIDO

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DEMOLICION DE PISO, PAVIMENTO O ANDENES EN CONCRETO, DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO, SUMINISTRO DE PEDRAPLEN COMPACTADO, CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, MUERO EN GAVIONES, REVOQUE IMPERMEABILIZADO PARA GAVIONES, INCLUYE MALLA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 24 ", CONCRETO CICLOPEO (60-40%) CON FRAGUADO RAPIDO.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descripción: DESMONTE Y LIMPIEZA DE TERRENO




Descripción: LOCALIZACION Y REPLANTEO




Descripción: DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO




Descripción: EXCAVACION MANUAL




Descripción: RETIRO DE ESCOMBROS




Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE RECEBO COMPACTADO


RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	9/11/2025




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE PEDRAPLAN COMPACTADO




Descripción:
DESVIO DEL CAUCE DE CANAL ABIERTO

Descripción:
DESVIO DE AGUAS DE RED PRINCIPALDE ALCANTARILLADO




Descripción:
CAJAS DE INSPECCION SANITARIAS DOMICILIARIAS




Descripción:
MURO EN GAVIONES




Descripción:
REVOQUE IMPERMEABILIZADO PARA GAVIONES, INCLUYE MALLA




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000,




Descripción:
CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) CON FRAGUADO RAPIDO

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	16/11/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 9 Del: 10 de noviembre de 2025 Al: 16 de noviembre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 53 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 30 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	8,03%	67,15%
Valor básico de la Obra programada:	$ 50.429.918,23	$ 421.553.697,36
Obra Física Ejecutada (%)	9,86%	67,44%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 61.882.615,00	$ 423.399.633,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	508259112
Valor Actualizado:	627786449
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION DE PISO, PAVIMENTO O ANDENES EN CONCRETO, DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO, SUMINISTRO DE PEDRAPLEN COMPACTADO, CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, MUERO EN GAVIONES, REVOQUE IMPERMEABILIZADO PARA GAVIONES, INCLUYE MALLA METALICA, SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 24 ", CONCRETO CICLOPEO (60-40%) CON FRAGUADO RAPIDO.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO, SUMINISTRO DE PEDRAPLEN COMPACTADO, REPOSICION DE CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 10CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, ACERO DE REFUERZO,REVOQUE IMPERMEABILIZADO PARA GAVIONES, INCLUYE MALLA METALICA,CONCRETO CICLOPEO (60-40%) CON FRAGUADO RAPIDO.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING.RESIDENTE


REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descripción: DEMOLICION DE PISO, PAVIMENTO O ANDENES EN CONCRETO




Descripción: DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO

Descripción: EXCAVACION MANUAL




Descripción: RETIRO DE ESCOMBROS




Descripción: SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO





Descripción: SUMINISTRO DE PEDRAPLEN COMPACTADO


RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	16/11/2025





Descripción:
CONCRETO DE 3000 PSI

Descripción:
ACERO DE REFUERZO




Descripción:
MUERO EN GAVIONES




Descripción:
REVOQUE IMPERMEABILIZADO PARA GAVIONES, INCLUYE MALLA METALICA




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2000




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE 24 "




Descripción:
, CONCRETO CICLOPEO (60-40%) CON FRAGUADO RAPIDO.

Descripción:

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	23/11/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 10 Del: 17 de noviembre de 2025 Al: 23 de noviembre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 59 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 24 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	7,91%	75,06%
Valor básico de la Obra programada:	$ 49.684.440,95	$ 471.238.138,31
Obra Física Ejecutada (%)	10,33%	77,78%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 64.875.529,00	$ 488.275.162,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	508259112
Valor Actualizado:	627786449
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO, EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO, SUMINISTRO DE PEDRAPLEN COMPACTADO, REPOSICION DE CONCRETO 3000 PSI, ESPESOR 10CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, ACERO DE REFUERZO,REVOQUE IMPERMEABILIZADO PARA GAVIONES, INCLUYE MALLA METALICA,CONCRETO CICLOPEO (60-40%) CON FRAGUADO RAPIDO.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION MANUAL, CONCRETO CICLOPEO (60-40%) ,CONCRETO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZON, MANTENIMIENTO DE POZO DE INSPECCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 24" CONCRETO CICLOPEO (60-40%) CON FRAGUADO RAPIDO.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Descripción:
DEMOLICION DE ESTRUCTURA EN CONCRETO REFORZADO




Descripción:
EXCAVACIÓN MANUAL




Descripción:
RETIRO DE ESCOMBROS




Descripción:
SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO




Descripción:
SUMINISTRO DE PEDRAPLEN COMPACTADO




Descripción:
,REPOSICION DE CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 10CM, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA, ACERO

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	23/11/2025




Descripción:
ACERO DE REFUERZO




Descripción:
REVOQUE IMPERMEABILIZADO PARA GAVIONES, INCLUYE MALLA METALICA




Descripción:
,CONCRETO CICLOPEO (60-40%) CON FRAGUADO RAPIDO.

Descripción:

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	30/11/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 11 Del: 24 de noviembre de 2025 Al: 30 de noviembre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 65 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 18 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,42%	81,49%
Valor básico de la Obra programada:	$ 40.317.009,73	$ 511.555.148,04

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	6,82%	84,60%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 42.826.367,00	$ 531.101.529,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	508259112
Valor Actualizado:	627786449
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION MANUAL, CONCRETO CICLOPEO (60-40%) ,CONCRETO 3000 PSI, ACERO DE REFUERZON, MANTENIMIENTO DE POZO DE INSPECCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 24" CONCRETO CICLOPEO (60-40%) CON FRAGUADO RAPIDO.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA



EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO,CONCRETO 3000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCONTENEDORES Y RELLENO EN SUELO CEMENTO AL 3% EN MATERIAL CLASIFICADO ASTHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 24", suministro e instalacion de concreto simple de 17,5 MPA (2500 psi) para recubrimiento (incluye malla de refuerzo), proceso contructivo se encofrado, suministro, instalacion de geocontenedores y relleno en suelo cemento al 3% con material en clasificacion ASTHO A-1(0,94*0,94*1,15)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Descripción: LOCALIZACION Y REPLANTEO




Descripción: EXCAVACION MANUAL





Descripción: CONCRETO CICLOPEO (60-40%)




Descripción: CONCRETO 3000 PSI






Descripción: ACERO DE REFUERZO





Descripción: MANTENIMIENTO DE POZO DE INSPECCION

Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 24"




Descripción: CONCRETO CICLOPEO (60-40%) CON FRAGUADO RAPIDO.

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	7/12/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 12 Del: 1 de diciembre de 2025 Al: 7 de diciembre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 71 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 12 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	3,489%	84,97%
Valor básico de la Obra programada:	$ 21.900.491,13	$ 533.455.639,17

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	7,89%	92,49%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 49.535.942,00	$ 580.637.471,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	508259112
Valor Actualizado:	627786449
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EXCAVACION MANUAL, RETIRO DE ESCOMBROS, SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO,CONCRETO 3000 PSI, SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCONTENEDORES Y RELLENO EN SUELO CEMENTO AL 3% EN MATERIAL CLASIFICADO ASTHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 24", suministro e instalacion de concreto simple de 17,5 MPA (2500 psi) para recubrimiento (incluye malla de refuerzo), proceso contructivo se encofrado, suministro, instalacion de geocontenedores y relleno en suelo cemento al 3% con material en clasificacion ASTHO A-1(0,94*0,94*1,15)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO, suministro e instalacion de concreto simple de 17,5 MPA (2500 psi) para recubrimiento (incluye malla de refuerzo)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción:
EXCAVACION MANUAL






Descripción:
RETIRO DE ESCOMBROS


Descripción:
SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO






Descripción:
CONCRETO 3000 PSI





Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOCONTENEDORES Y RELLENO EN SUELO CEMENTO AL 3% EN MATERIAL




Descripción:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 24"

Descripción:
suministro e instalacion de concreto simple de 17,5 MPA (2500 psi) para recubrimiento (incluye malla de refuerzo),




Descripción:
proceso contructivo se encofrado, suministro, instalacion de geocontenedores y relleno en suelo cemento al 3% con material en clasificacion ASTHO A-1(0,94*0,94*1,15)

RN Ingeniería S.A.S	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	14/12/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 13 Del: 8 de diciembre de 2025 Al: 14 de diciembre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 77 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 6 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	9,48%	94,45%	Obra Física Ejecutada (%)	1,63%	94,12%
Valor básico de la Obra programada:	$ 59.488.681,88	$ 592.944.321,0	Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 10.257.242,00	$ 590.894.713,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No.	No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial:	508259112
Valor Actualizado:	627785449
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	N/A
Valor Actualizado:	N/A
Plazo Inicial:	TRES (03) meses
Plazo Actualizado:	TRES (03) meses
Fecha de Iniciación:	16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento:	12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO, suministro e instalacion de concreto simple de 17,5 MPA (2500 psi) para recubrimiento (incluye malla de refuerzo)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RETIRO DE ESCOMBROS,
proceso contructivo se encofrado, suministro, instalacion de geocontenedores y relleno en suelo cemento al 3% con material en clasificacion ASTHO A-1(0,94*0,94*1,15), ciclopeo con anclajes de acero reforzado

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE


REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción:
SUMINISTRO DE RECEBO COMPACTADO





Descripción:
suministro e instalacion de concreto simple de 17,5 MPA (2500 psi) para recubrimiento (incluye malla de refuerzo)

	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA	VERSIÓN:
RN Ingeniería S.A.S	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	20/12/2025

CONTRATISTA DE OBRA: RN INGENIERIAS S.A.S. CONTRATO No: No. SVIV SAMC 009 DE 2025
INTERVENTORÍA: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA CONTRATO No: N/A

Semana Número: 14 Del: 15 de diciembre de 2025 Al: 20 de diciembre de 2025
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 76 Días
Tiempo restante para la finalización del contrato: 0 Días
Supervisor Contrato de Interventoría: 0

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL RETIRO, VILLA MAR Y CASTILLOS DEL NORTE, MUNCIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER.

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	5,55%	90,52%
Valor básico de la Obra programada:	$ 34.842.128,66	$ 568.297.767,8

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	5,88%	100%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 36.891.736,00	$ 627.786.449,00

CONTRATO DE OBRA:

Contratista: RN INGENIERIAS S.A.S.
Contrato No. No. SVIV SAMC 009 DE 2025
Valor Inicial: 508259112
Valor Actualizado: 627786449
Plazo Inicial: TRES (03) meses
Plazo Actualizado: TRES (03) meses
Fecha de Iniciación: 16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento: 12 dediciembre de 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

Interventor: OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Contrato No. N/A
Valor Inicial: N/A
Valor Actualizado: N/A
Plazo Inicial: TRES (03) meses
Plazo Actualizado: TRES (03) meses
Fecha de Iniciación: 16 de septiembre de 2025
Fecha de Vencimiento: 12 dediciembre de 2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

RETIRO DE ESCOMBROS,
proceso contructivo se encofrado, suministro, instalacion de geocontenedores y relleno en suelo cemento al 3% con material en clasificacion ASTHO A-1(0,94*0,94*1,15), ciclopeo con anclajes de acero reforzado

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

OBSERVACIONES

Firma
Nombre ELIZABETH RINCON
ING RESIDENTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Descripción:
RETIRO DE ESCOMBROS,



Descripción:
proceso contructivo se encofrado, suministro, instalacion de geocontenedores y relleno en suelo cemento al 3%





Descripción:
ciclopeo con anclajes de acero reforzado

Descripción:
