

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1		**CRONOGRAMA ESTUDIOS Y DISEÑOS RED FLUVIAL LOTE 1**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 2.932.226.232,00**
2		**ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INFRAESTRUCTURA FLUVIAL EN LOS DEPARTAMENTOS DE VAUPÉS Y AMAZONAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE NAVEGABILIDAD EN LA RED FLUVIAL NACIONAL**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 2.932.226.232,00**
3		**GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 156.408.000,00**
4		Director de Consultoría	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 25.848.000,00
5		Ingeniero residente de campo y estudios	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 59.040.000,00
6		Ingeniero Auxiliar	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 58.896.000,00
7		Dibujante	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 12.624.000,00
8		**GRUPO 2 - COSTOS POR VOLUMENES TÉCNICOS**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 1.010.000.000,00**
9		**HITO 1 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE ALTERNO PUCARÓN**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 193.000.000,00**
10		**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	**10 días**	**jue 1/01/26**	**mié 14/01/26**		**$ 17.000.000,00**
11		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 1/01/26	mié 7/01/26		$ 1.700.000,00
12		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 8/01/26	mié 14/01/26	11	$ 15.300.000,00
13		**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 6.000.000,00**
14		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	12	$ 600.000,00
15		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	14	$ 3.600.000,00
16		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	15	$ 1.800.000,00
17		**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
18		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	12	$ 1.000.000,00
19		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	18	$ 5.000.000,00
20		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	19CC	$ 2.000.000,00
21		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	20	$ 2.000.000,00
22		**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
23		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	18CC	$ 1.000.000,00
24		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	23	$ 6.000.000,00
25		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	24	$ 3.000.000,00
26		**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	**25 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/02/26**		**$ 10.000.000,00**
27		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	12	$ 1.000.000,00
28		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	15 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26	27	$ 4.500.000,00
29		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	28	$ 4.500.000,00
30		**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**mié 4/02/26**		**$ 15.000.000,00**

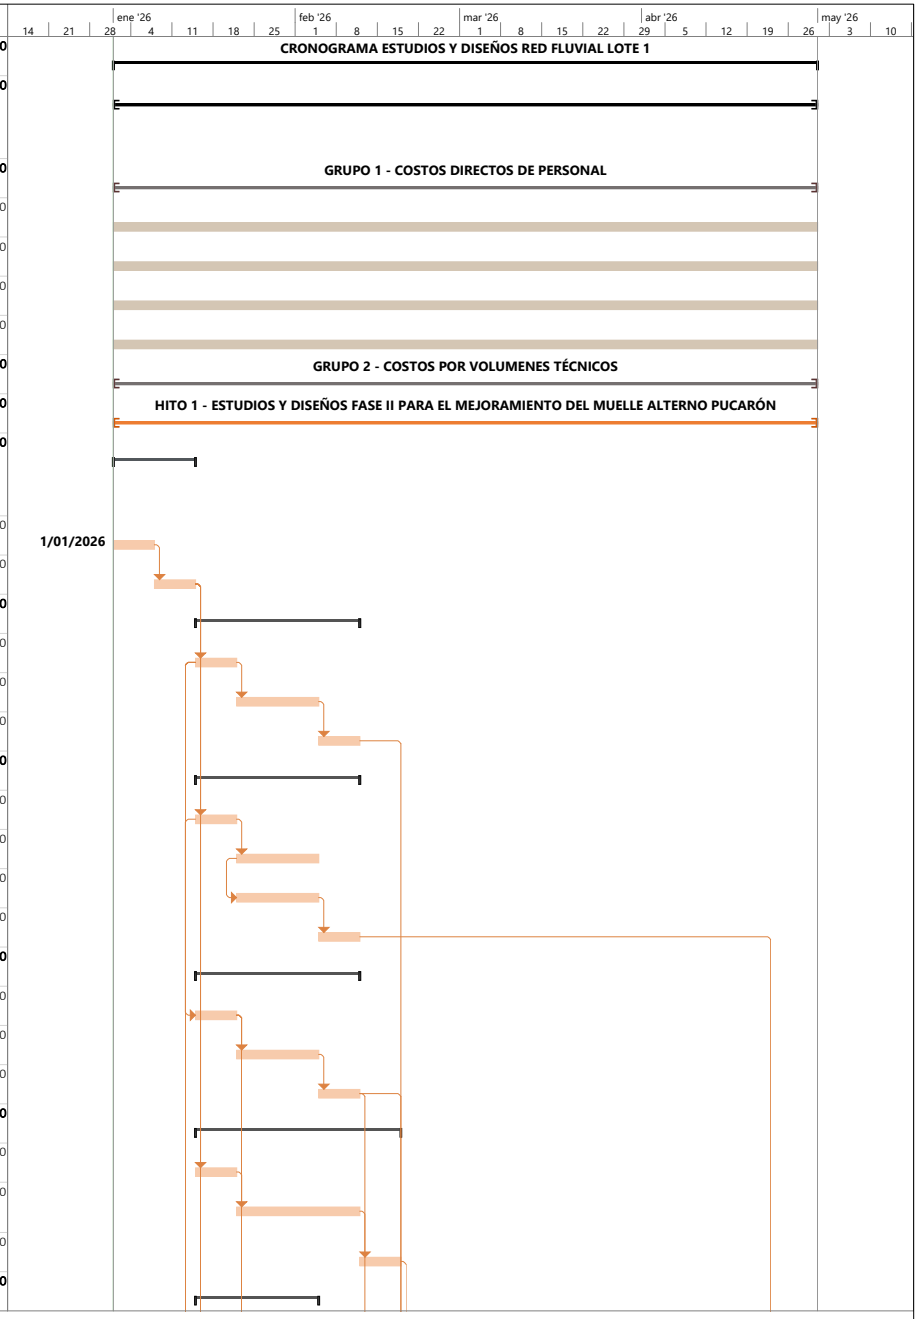

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
31		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	12	$ 1.500.000,00
32		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	12 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26	31	$ 13.500.000,00
33		**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	**12 días**	**jue 19/02/26**	**vie 6/03/26**		**$ 27.000.000,00**
34		Metodología aprobada por Interventoría	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	16;25;32;29	$ 2.700.000,00
35		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	34	$ 24.300.000,00
36		**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	**15 días**	**lun 9/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 13.000.000,00**
37		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	35	$ 1.300.000,00
38		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	37	$ 11.700.000,00
39		**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 16.000.000,00**
40		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	38	$ 1.600.000,00
41		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	40	$ 9.600.000,00
42		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	41	$ 4.800.000,00
43		**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 53.000.000,00**
44		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	12	$ 5.300.000,00
45		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	12	$ 5.300.000,00
46		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	12	$ 10.600.000,00
47		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	46	$ 10.600.000,00
48		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	47	$ 5.300.000,00
49		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 2/04/26	mié 8/04/26	48	$ 15.900.000,00
50		**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 6.000.000,00**
51		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	12	$ 600.000,00
52		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	50 días	jue 29/01/26	mié 8/04/26	51	$ 5.400.000,00
53		**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**		**$ 4.000.000,00**
54		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	42;49;52	$ 400.000,00
55		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26	54	$ 3.600.000,00
56		**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	**45 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 6.000.000,00**
57		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	44CC	$ 600.000,00
58		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	35 días	jue 29/01/26	mié 18/03/26	57	$ 5.400.000,00
59		**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 0,00**
60		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	55CC;58;21	$ 0,00
61		**HITO 2 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE TARAIRA**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 193.000.000,00**

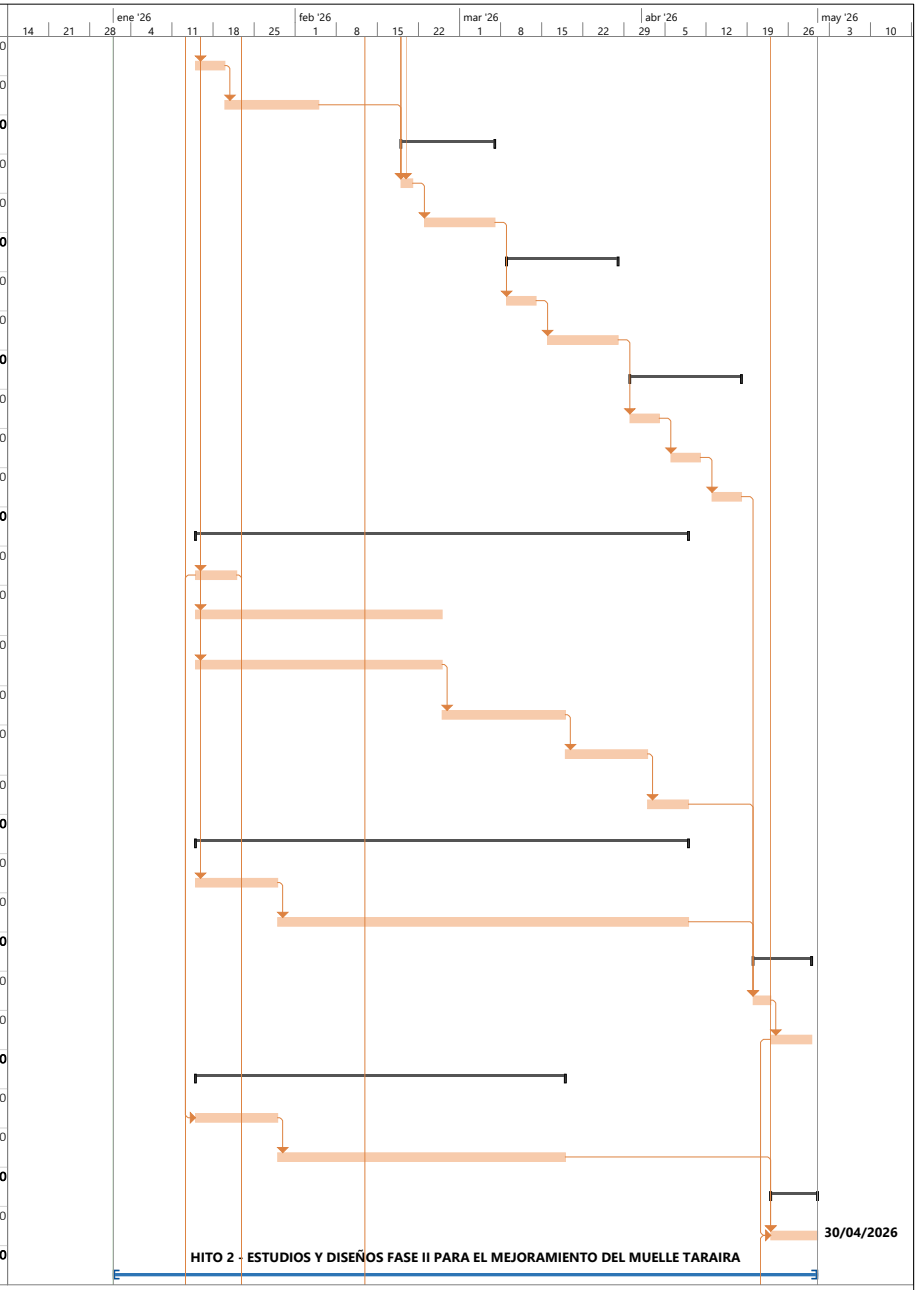

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
62		**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	**10 días**	**jue 1/01/26**	**mié 14/01/26**		**$ 17.000.000,00**
63		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 1/01/26	mié 7/01/26		$ 1.700.000,00
64		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 8/01/26	mié 14/01/26	63	$ 15.300.000,00
65		**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 6.000.000,00**
66		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	64	$ 600.000,00
67		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	66	$ 3.600.000,00
68		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	67	$ 1.800.000,00
69		**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
70		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	64	$ 1.000.000,00
71		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	70	$ 5.000.000,00
72		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	71CC	$ 2.000.000,00
73		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	72	$ 2.000.000,00
74		**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
75		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	70CC	$ 1.000.000,00
76		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	75	$ 6.000.000,00
77		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	76	$ 3.000.000,00
78		**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	**25 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/02/26**		**$ 10.000.000,00**
79		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	64	$ 1.000.000,00
80		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	15 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26	79	$ 4.500.000,00
81		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	80	$ 4.500.000,00
82		**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**mié 4/02/26**		**$ 15.000.000,00**
83		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	64	$ 1.500.000,00
84		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	12 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26	83	$ 13.500.000,00
85		**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	**12 días**	**jue 19/02/26**	**vie 6/03/26**		**$ 27.000.000,00**
86		Metodología aprobada por Interventoría	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	68;77;84;81	$ 2.700.000,00
87		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	86	$ 24.300.000,00
88		**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	**15 días**	**lun 9/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 13.000.000,00**
89		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	87	$ 1.300.000,00
90		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	89	$ 11.700.000,00
91		**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 16.000.000,00**
92		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	90	$ 1.600.000,00

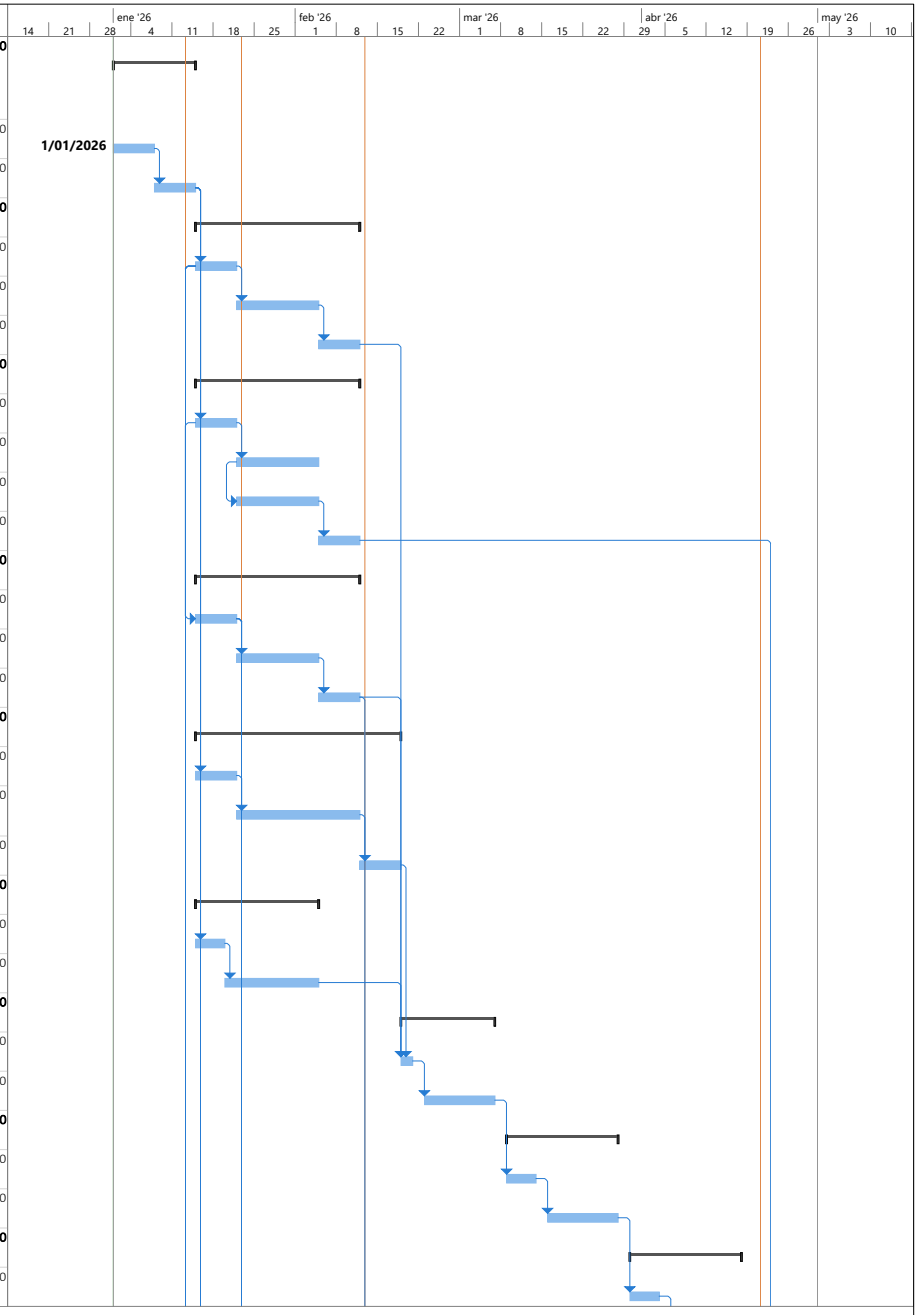

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
93		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	92	$ 9.600.000,00
94		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	93	$ 4.800.000,00
95		**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 53.000.000,00**
96		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	64	$ 5.300.000,00
97		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	64	$ 5.300.000,00
98		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	64	$ 10.600.000,00
99		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	98	$ 10.600.000,00
100		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	99	$ 5.300.000,00
101		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 2/04/26	mié 8/04/26	100	$ 15.900.000,00
102		**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 6.000.000,00**
103		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	64	$ 600.000,00
104		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	50 días	jue 29/01/26	mié 8/04/26	103	$ 5.400.000,00
105		**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**		**$ 4.000.000,00**
106		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	94;101;104	$ 400.000,00
107		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26	106	$ 3.600.000,00
108		**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	**45 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 6.000.000,00**
109		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	96CC	$ 600.000,00
110		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	35 días	jue 29/01/26	mié 18/03/26	109	$ 5.400.000,00
111		**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 0,00**
112		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	73;107CC;110	$ 0,00
113		**HITO 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PACOA**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 208.000.000,00**
114		**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	**10 días**	**jue 1/01/26**	**mié 14/01/26**		**$ 19.000.000,00**
115		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 1/01/26	mié 7/01/26		$ 1.900.000,00
116		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 8/01/26	mié 14/01/26	115	$ 17.100.000,00
117		**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 6.000.000,00**
118		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	116	$ 600.000,00
119		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	118	$ 3.600.000,00
120		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	119	$ 1.800.000,00
121		**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
122		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	116	$ 1.000.000,00

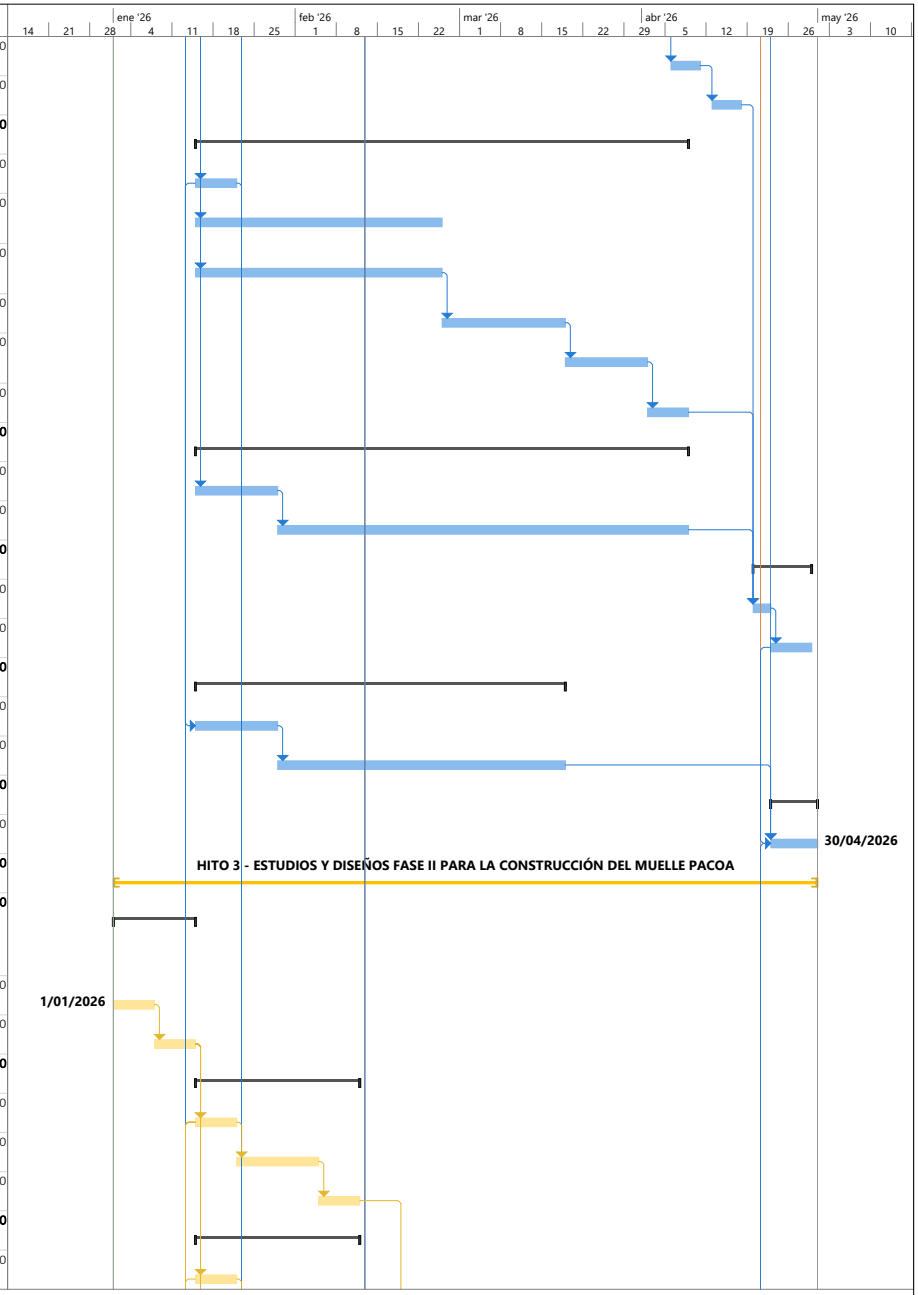

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
123		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	122	$ 5.000.000,00
124		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	123CC	$ 2.000.000,00
125		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	124	$ 2.000.000,00
126		**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 11.000.000,00**
127		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	122CC	$ 1.100.000,00
128		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	127	$ 6.600.000,00
129		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	128	$ 3.300.000,00
130		**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	**25 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/02/26**		**$ 11.000.000,00**
131		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	116	$ 1.100.000,00
132		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	15 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26	131	$ 4.950.000,00
133		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	132	$ 4.950.000,00
134		**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**mié 4/02/26**		**$ 18.000.000,00**
135		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	116	$ 1.800.000,00
136		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	12 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26	135	$ 16.200.000,00
137		**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	**12 días**	**jue 19/02/26**	**vie 6/03/26**		**$ 28.000.000,00**
138		Metodología aprobada por Interventoría	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	120;129;133;1	$ 2.800.000,00
139		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	138	$ 25.200.000,00
140		**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	**15 días**	**lun 9/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 14.000.000,00**
141		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	139	$ 1.400.000,00
142		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	141	$ 12.600.000,00
143		**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 19.000.000,00**
144		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	142	$ 1.900.000,00
145		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	144	$ 11.400.000,00
146		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	145	$ 5.700.000,00
147		**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 53.000.000,00**
148		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	116	$ 5.300.000,00
149		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	116	$ 5.300.000,00
150		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	116	$ 10.600.000,00
151		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	150	$ 10.600.000,00
152		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	151	$ 5.300.000,00
153		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 2/04/26	mié 8/04/26	152	$ 15.900.000,00

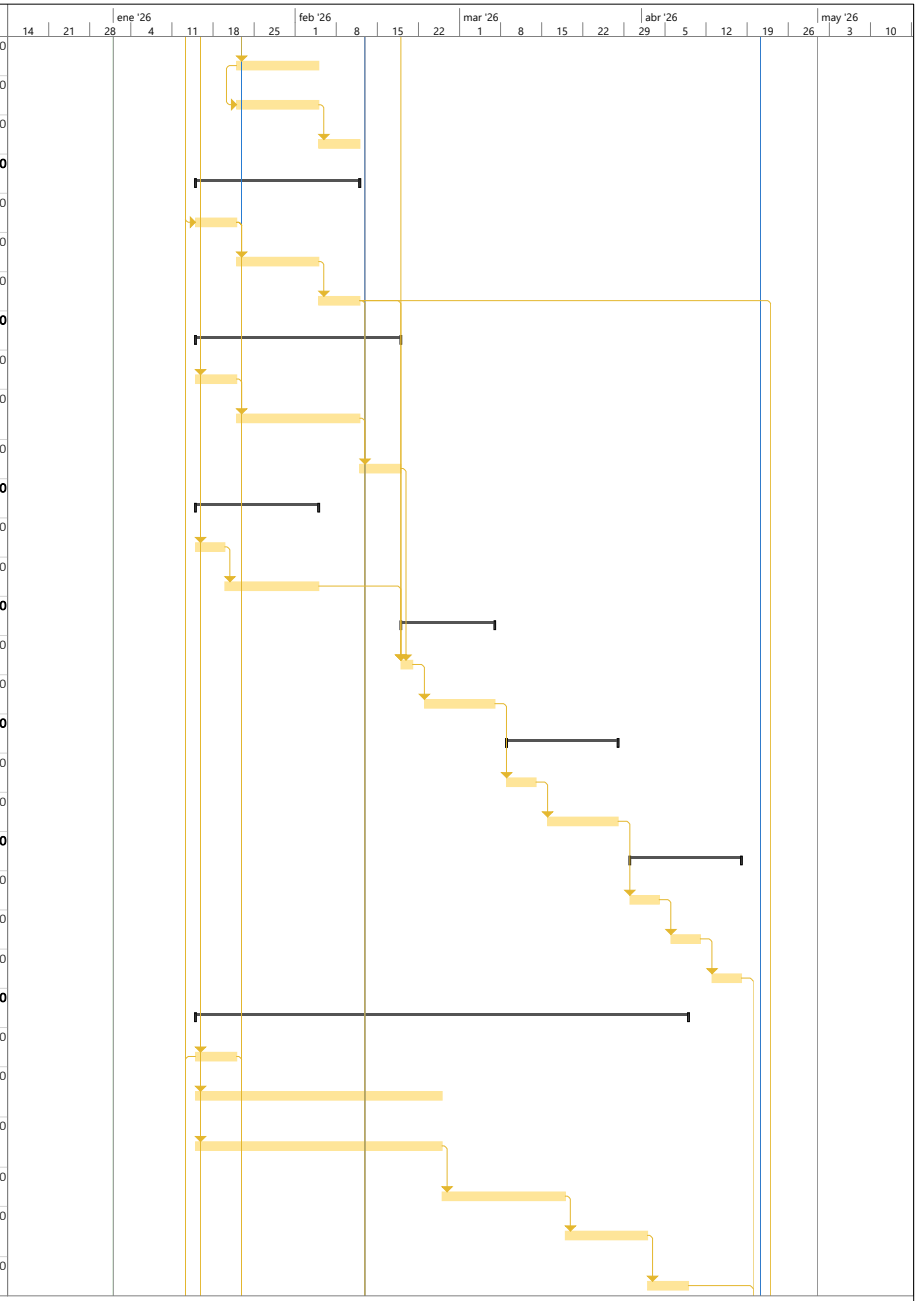

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
154		**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 7.000.000,00**
155		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	116	$ 700.000,00
156		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	50 días	jue 29/01/26	mié 8/04/26	155	$ 6.300.000,00
157		**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**		**$ 4.000.000,00**
158		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	146;153;156	$ 400.000,00
159		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26	158	$ 3.600.000,00
160		**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	**45 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 8.000.000,00**
161		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	148CC	$ 800.000,00
162		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	35 días	jue 29/01/26	mié 18/03/26	161	$ 7.200.000,00
163		**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 0,00**
164		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	129;159CC;162	$ 0,00
165		**HITO 4 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE MIRITÍ - PARANÁ**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 208.000.000,00**
166		**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	**10 días**	**jue 1/01/26**	**mié 14/01/26**		**$ 19.000.000,00**
167		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 1/01/26	mié 7/01/26		$ 1.900.000,00
168		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 8/01/26	mié 14/01/26	167	$ 17.100.000,00
169		**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 6.000.000,00**
170		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	168	$ 600.000,00
171		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	170	$ 3.600.000,00
172		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	171	$ 1.800.000,00
173		**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
174		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	168	$ 1.000.000,00
175		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	174	$ 5.000.000,00
176		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	175CC	$ 2.000.000,00
177		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	176	$ 2.000.000,00
178		**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 11.000.000,00**
179		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	174CC	$ 1.100.000,00
180		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	179	$ 6.600.000,00
181		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	180	$ 3.300.000,00
182		**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	**25 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/02/26**		**$ 11.000.000,00**
183		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	168	$ 1.100.000,00
184		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	15 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26	183	$ 4.950.000,00

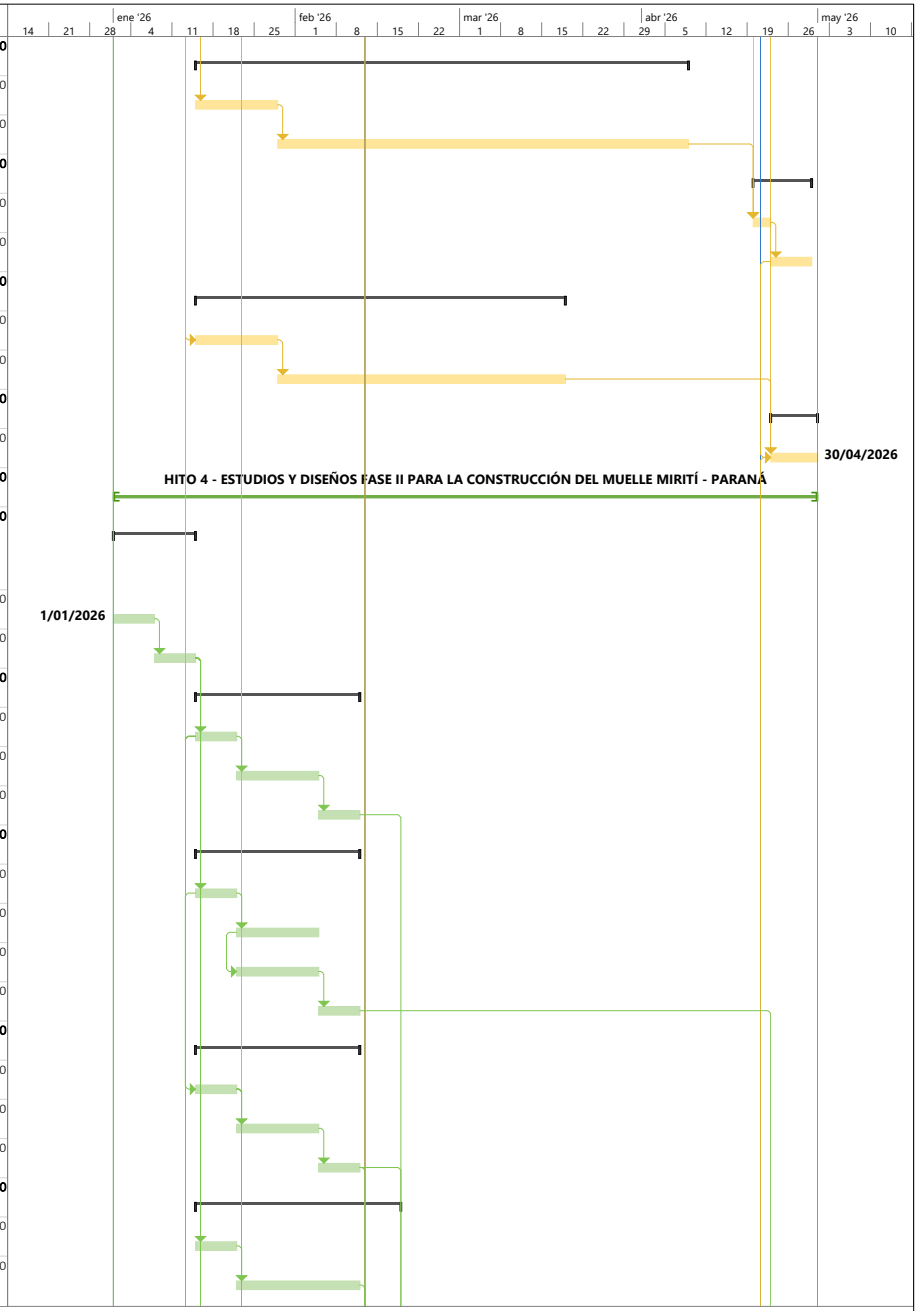

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
185		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	184	$ 4.950.000,00
186		**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**mié 4/02/26**		**$ 18.000.000,00**
187		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	168	$ 1.800.000,00
188		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	12 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26	187	$ 16.200.000,00
189		**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	**12 días**	**jue 19/02/26**	**vie 6/03/26**		**$ 28.000.000,00**
190		Metodología aprobada por Interventoría	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	172;181;185;1	$ 2.800.000,00
191		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	190	$ 25.200.000,00
192		**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	**15 días**	**lun 9/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 14.000.000,00**
193		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	191	$ 1.400.000,00
194		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	193	$ 12.600.000,00
195		**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 19.000.000,00**
196		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	194	$ 1.900.000,00
197		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	196	$ 11.400.000,00
198		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	197	$ 5.700.000,00
199		**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 53.000.000,00**
200		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	168	$ 5.300.000,00
201		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	168	$ 5.300.000,00
202		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	168	$ 10.600.000,00
203		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	202	$ 10.600.000,00
204		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	203	$ 5.300.000,00
205		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 2/04/26	mié 8/04/26	204	$ 15.900.000,00
206		**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 7.000.000,00**
207		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	168	$ 700.000,00
208		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	50 días	jue 29/01/26	mié 8/04/26	207	$ 6.300.000,00
209		**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**		**$ 4.000.000,00**
210		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	198;205;208	$ 400.000,00
211		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26	210	$ 3.600.000,00
212		**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	**45 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 8.000.000,00**
213		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	200CC	$ 800.000,00
214		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	35 días	jue 29/01/26	mié 18/03/26	213	$ 7.200.000,00
215		**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 0,00**

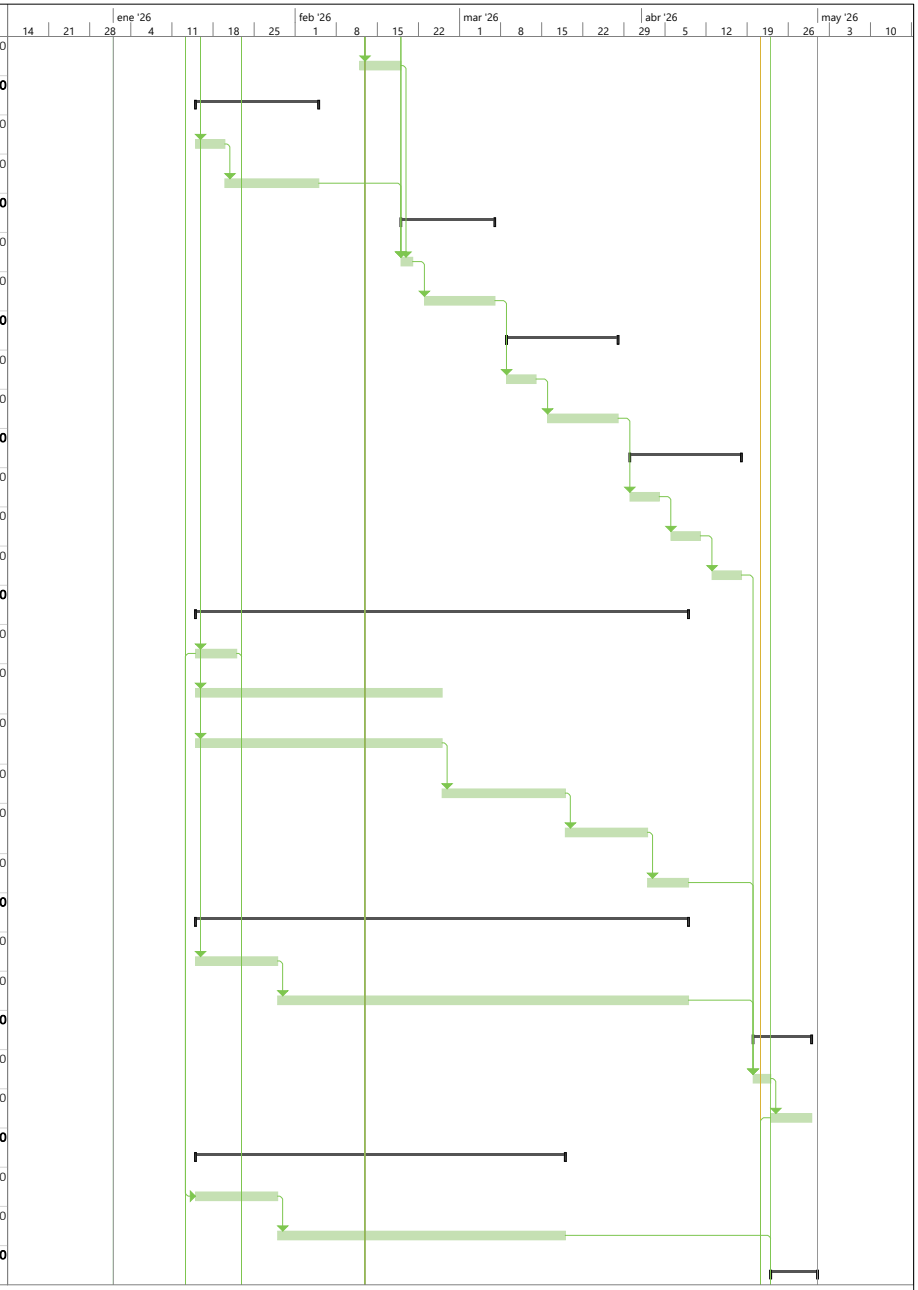

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
216		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	177;211CC;214	$ 0,00
217		**HITO 5 - ESTUDIOS Y DISEÑOS FASE II PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE LA VICTORIA**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 208.000.000,00**
218		**ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES, RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE DIAGNÓSTICO EXISTENTE E IDENTIFICACIÓN DE VÍAS DE ACCESO (CARRETERO Y/O FLUVIAL)**	**10 días**	**jue 1/01/26**	**mié 14/01/26**		**$ 19.000.000,00**
219		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 1/01/26	mié 7/01/26		$ 1.900.000,00
220		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 8/01/26	mié 14/01/26	219	$ 17.100.000,00
221		**ESTUDIO CARTOGRÁFICO, TOPOGRÁFICO Y BATIMÉTRICO**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 6.000.000,00**
222		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	220	$ 600.000,00
223		Entrega del volumen preliminar revisado y aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	222	$ 3.600.000,00
224		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	223	$ 1.800.000,00
225		**ESTUDIO DE GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 10.000.000,00**
226		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	220	$ 1.000.000,00
227		Informe geológico y geomorfológico estructural del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	226	$ 5.000.000,00
228		Informe análisis preliminar de las amenazas geológicas aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	227CC	$ 2.000.000,00
229		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	228	$ 2.000.000,00
230		**ESTUDIO DE GEOTECNIA**	**20 días**	**jue 15/01/26**	**mié 11/02/26**		**$ 11.000.000,00**
231		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	226CC	$ 1.100.000,00
232		Informe geotecnia del proyecto aprobado por Interventoría	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	231	$ 6.600.000,00
233		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 5/02/26	mié 11/02/26	232	$ 3.300.000,00
234		**ESTUDIO DE HIDROLOGÍA, HIDRÁULICA, SOCAVACIÓN Y DINÁMICA FLUVIAL**	**25 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/02/26**		**$ 11.000.000,00**
235		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	220	$ 1.100.000,00
236		Informe estudio hidrológico para el mejoramiento, para estabilizar sitios críticos y construcción de estructuras aprobado por interventoría	15 días	jue 22/01/26	mié 11/02/26	235	$ 4.950.000,00
237		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 12/02/26	mié 18/02/26	236	$ 4.950.000,00
238		**ESTUDIO DE TRANSPORTE PASAJEROS Y/O CARGA Y CARACTERIZACIÓN DE LA EMBARCACIÓN TIPO**	**15 días**	**jue 15/01/26**	**mié 4/02/26**		**$ 18.000.000,00**
239		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26	220	$ 1.800.000,00
240		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	12 días	mar 20/01/26	mié 4/02/26	239	$ 16.200.000,00
241		**ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE DISEÑO**	**12 días**	**jue 19/02/26**	**vie 6/03/26**		**$ 28.000.000,00**
242		Metodología aprobada por Interventoría	2 días	jue 19/02/26	vie 20/02/26	224;233;237;2	$ 2.800.000,00
243		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 23/02/26	vie 6/03/26	242	$ 25.200.000,00
244		**DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO DEL TERMINAL O MUELLE**	**15 días**	**lun 9/03/26**	**vie 27/03/26**		**$ 14.000.000,00**
245		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 9/03/26	vie 13/03/26	243	$ 1.400.000,00
246		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	10 días	lun 16/03/26	vie 27/03/26	245	$ 12.600.000,00

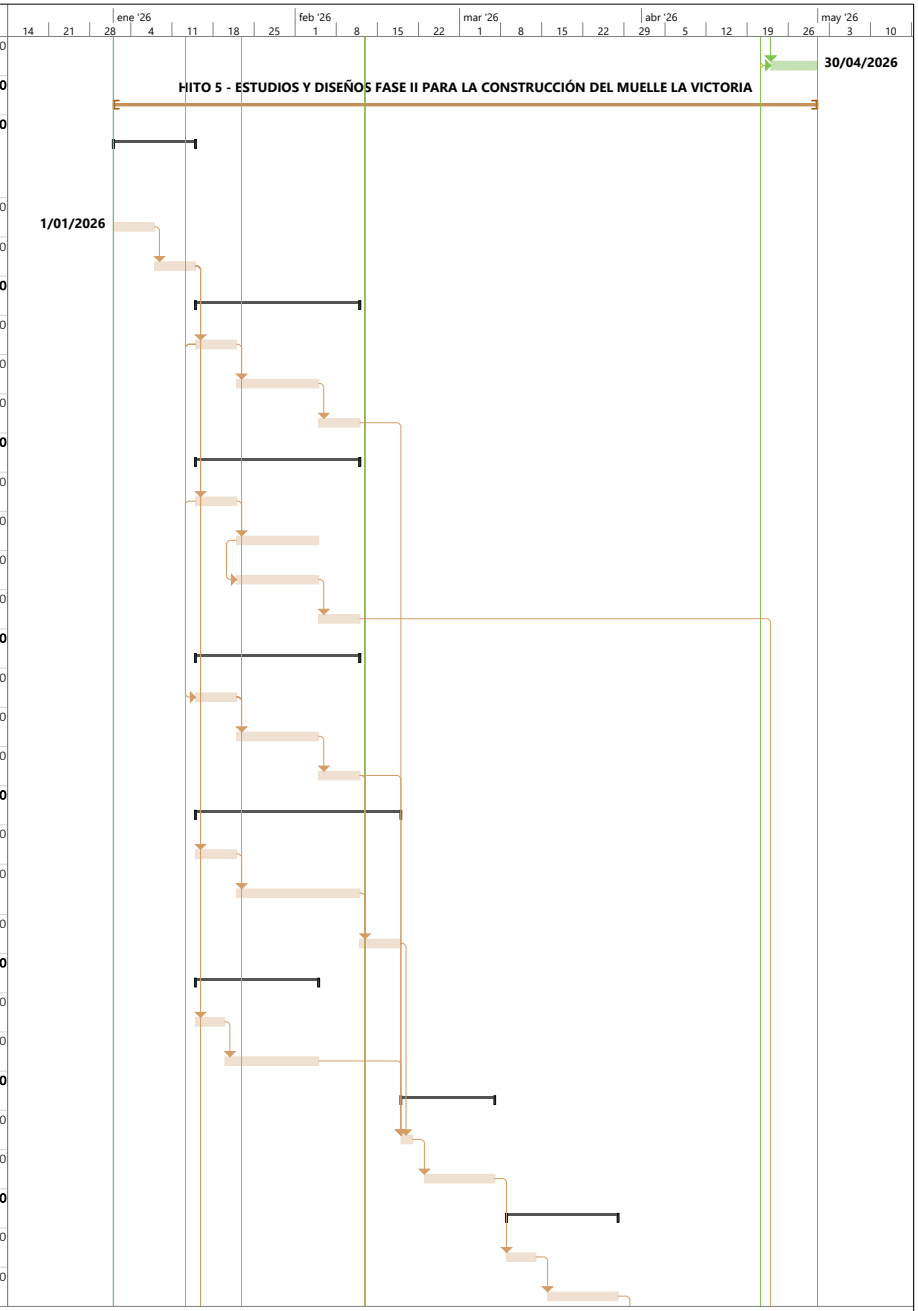

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
247		**ESTUDIO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL MUELLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**	**15 días**	**lun 30/03/26**	**vie 17/04/26**		**$ 19.000.000,00**
248		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	lun 30/03/26	vie 3/04/26	246	$ 1.900.000,00
249		Informe de los estudios y diseños de las estructuras de protección aprobado por interventoría	5 días	lun 6/04/26	vie 10/04/26	248	$ 11.400.000,00
250		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	lun 13/04/26	vie 17/04/26	249	$ 5.700.000,00
251		**GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 53.000.000,00**
252		Metodología aprobada por Interventoría	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	220	$ 5.300.000,00
253		Informe del Área de influencia y línea base- Informe de impactos ambientales y sociales-aprobado por el interventor	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	220	$ 5.300.000,00
254		Planes de Manejo, Permisos, Plan de Inversión Ambiental y Social, e Informe gestión y pronunciamientos, permisos ambientales aprobado por la interventoría	30 días	jue 15/01/26	mié 25/02/26	220	$ 10.600.000,00
255		Documento lineamientos PAGA aprobado por la interventoría	15 días	jue 26/02/26	mié 18/03/26	254	$ 10.600.000,00
256		Informe de incorporación de la información predial en sistema de información geográfica SIG aprobado por la interventoría	10 días	jue 19/03/26	mié 1/04/26	255	$ 5.300.000,00
257		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 2/04/26	mié 8/04/26	256	$ 15.900.000,00
258		**GESTIÓN PREDIAL Y CATASTRAL**	**60 días**	**jue 15/01/26**	**mié 8/04/26**		**$ 7.000.000,00**
259		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	220	$ 700.000,00
260		Entrega del volumen aprobado por Interventoría	50 días	jue 29/01/26	mié 8/04/26	259	$ 6.300.000,00
261		**ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y PRESUPUESTO**	**8 días**	**lun 20/04/26**	**mié 29/04/26**		**$ 4.000.000,00**
262		Metodología aprobada por Interventoría	3 días	lun 20/04/26	mié 22/04/26	250;257;260	$ 400.000,00
263		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	5 días	jue 23/04/26	mié 29/04/26	262	$ 3.600.000,00
264		**ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO - ECONÓMICA DEL PROYECTO**	**45 días**	**jue 15/01/26**	**mié 18/03/26**		**$ 8.000.000,00**
265		Metodología aprobada por Interventoría	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	252CC	$ 800.000,00
266		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	35 días	jue 29/01/26	mié 18/03/26	265	$ 7.200.000,00
267		**INFORME FINAL EJECUTIVO**	**6 días**	**jue 23/04/26**	**jue 30/04/26**		**$ 0,00**
268		Entrega del volumen revisado y aprobado por la interventoría	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	229;263CC;266	$ 0,00
269		**GRUPO 3 - OTROS COSTOS**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 1.297.647.657,00**
270		Viáticos Director, Especialistas y otros profesionales (Incluye hospedaje, alimentación y desplazamientos)	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 100.750.000,00
271		Reconocimiento prima regional residente de campo y estudios, e Ingeniero Auxiliar	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 15.000.000,00
272		Transportes Aéreos Director, Especialistas y otros profesionales (S/Comprobante Pago y Pasabordo)	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 42.000.000,00
273		Adquisición de Cartografía (Imágenes de satélite y fotos aéreas existentes) S/Comprobante Pago	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	14CC;66CC;118	$ 2.000.000,00
274		Levantamiento topobatimétrico detallado (S/comprobante) (incluye personal, equipos, materiales, viáticos, desplazamiento, transporte)	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	14CC;66CC;118	$ 24.000.000,00
275		Alquiler de vehículo (4x4 de 2000 cc o superior, modelo hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye conductor, combustible y/o peajes, para uso exclusivo de la zona del proyecto)	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 6.100.000,00
276		Otros transportes especiales (s/comprobante) (vehículo/día, vehículo/mes (incluye conductor, combustible y/o peajes para uso exclusivo de la zona del proyecto) helicóptero, alquiler de lancha (incluye combustible y motorista) entre otros).	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 125.000.000,00

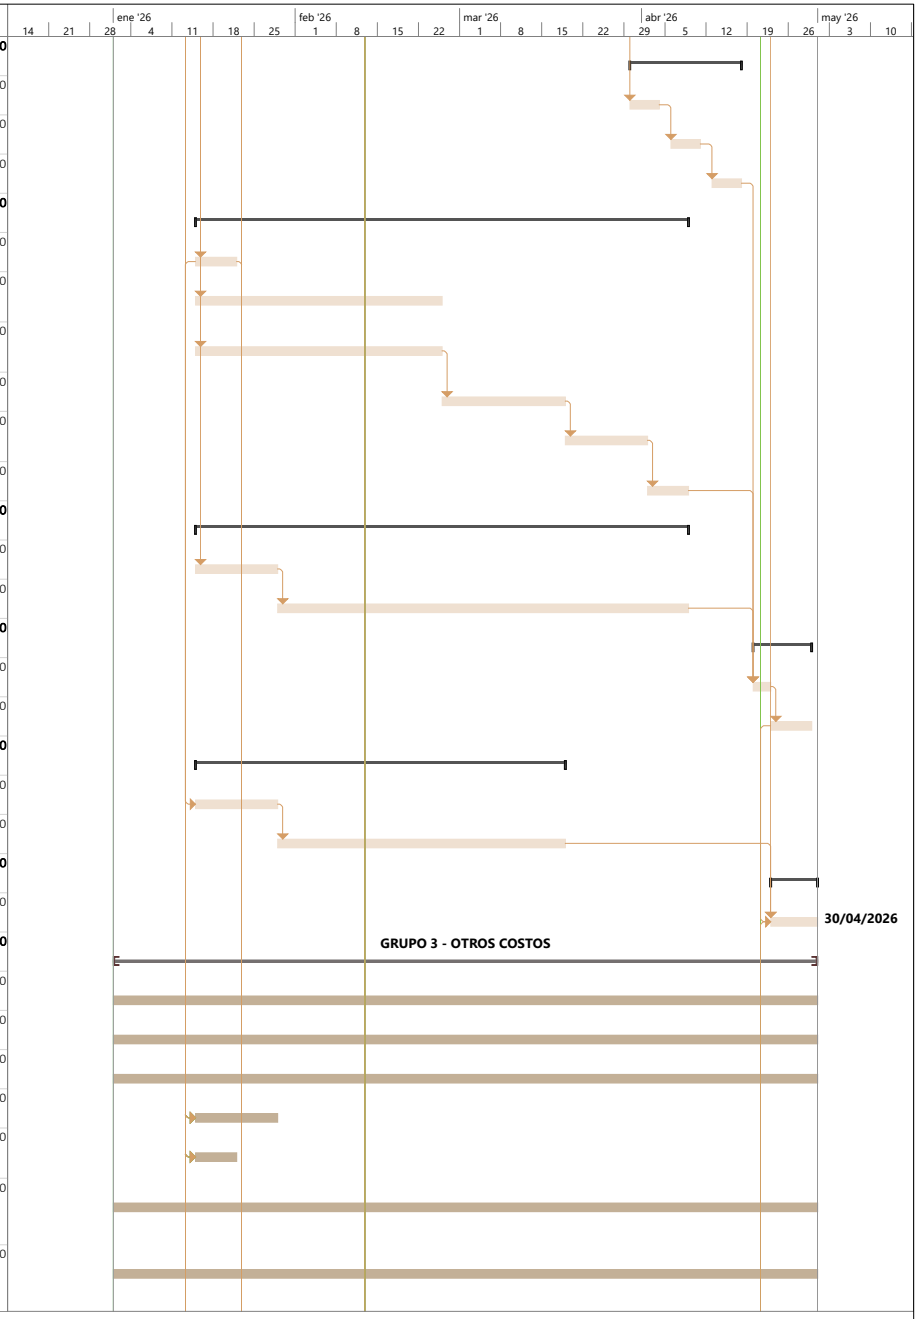

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
277		Edición de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos magnéticos)	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 1.000.000,00
278		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Alterno Pucarón (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	60CC	$ 5.000.000,00
279		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Taraira (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	112CC	$ 5.000.000,00
280		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Pacoa(S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	164CC	$ 5.000.000,00
281		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle Miriti - Paraná (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	216CC	$ 5.000.000,00
282		Edición de Informes Finales de todos los volúmenes Muelle La Victoria (S/comprobante) (Incluye impresión, ploteo de planchas original en papel de seguridad, una copia en papel bond y cuatro copias en archivos magnéticos)	6 días	jue 23/04/26	jue 30/04/26	268CC	$ 5.000.000,00
283		Georreferenciación (Incluye par puntos con GPS de precisión milimétrica materializados en campo con mojones en concreto y platina de bronce, estimado pares de punto)	10 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26	14CC;66CC;118	$ 20.000.000,00
284		Apiques (Incluye equipo, material, transporte, personal y reparación a condición inicial de estructura)	5 días	jue 22/01/26	mié 28/01/26	23;75;127;179	$ 3.600.000,00
285		Perforaciones en Suelos (incluye equipo, material, transportes y personal (viáticos))	5 días	jue 22/01/26	mié 28/01/26	23;75;127;179	$ 152.000.000,00
286		Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o Coluviones (incluye equipo, material, transportes y personal(viáticos))	5 días	jue 22/01/26	mié 28/01/26	23;75;127;179	$ 75.000.000,00
287		Ensayos de Laboratorio y/o Diagnóstico (S/comprobante) (Incluye toma de muestras, comisión de laboratorio con viáticos y transporte de personal, transporte de muestras, regatas, núcleos, ensayos para diagnóstico, fuentes de materiales, perforaciones, mezc	5 días	jue 29/01/26	mié 4/02/26	284;285;286	$ 208.050.625,00
288		Ensayos de Batimetría y socavación (S/comprobante) (incluye todos los equipos siguiendo estándares vigentes, motorista, lancha, gasolina, batimetrista inspector, auxiliar de batimetría, equipo completo de batimetría, edición de planos, entre otros)	5 días	jue 15/01/26	mié 21/01/26	14CC;66CC;118	$ 119.200.000,00
289		Gestiones Ambientales, Sociales, Arqueológicas, Prediales y de Sostenibilidad (S/comprobante) (Adquisición de información, compra de documentos, costos de reuniones sociales, pago trámites ambientales, costos de gestiones arqueológicas, muestreos ambienta	10 días	jue 22/01/26	mié 4/02/26	44;96;148;200	$ 83.000.000,00
290		Estudios técnicos adicionales y/o complementarios y/o trabajos de campo particulares	30 días	jue 12/02/26	mié 25/03/26	25;77;129;181	$ 295.947.032,00
291		**IMPUESTOS**	**86 días**	**jue 1/01/26**	**jue 30/04/26**		**$ 468.170.575,00**
292		IVA	86 días	jue 1/01/26	jue 30/04/26		$ 468.170.575,00

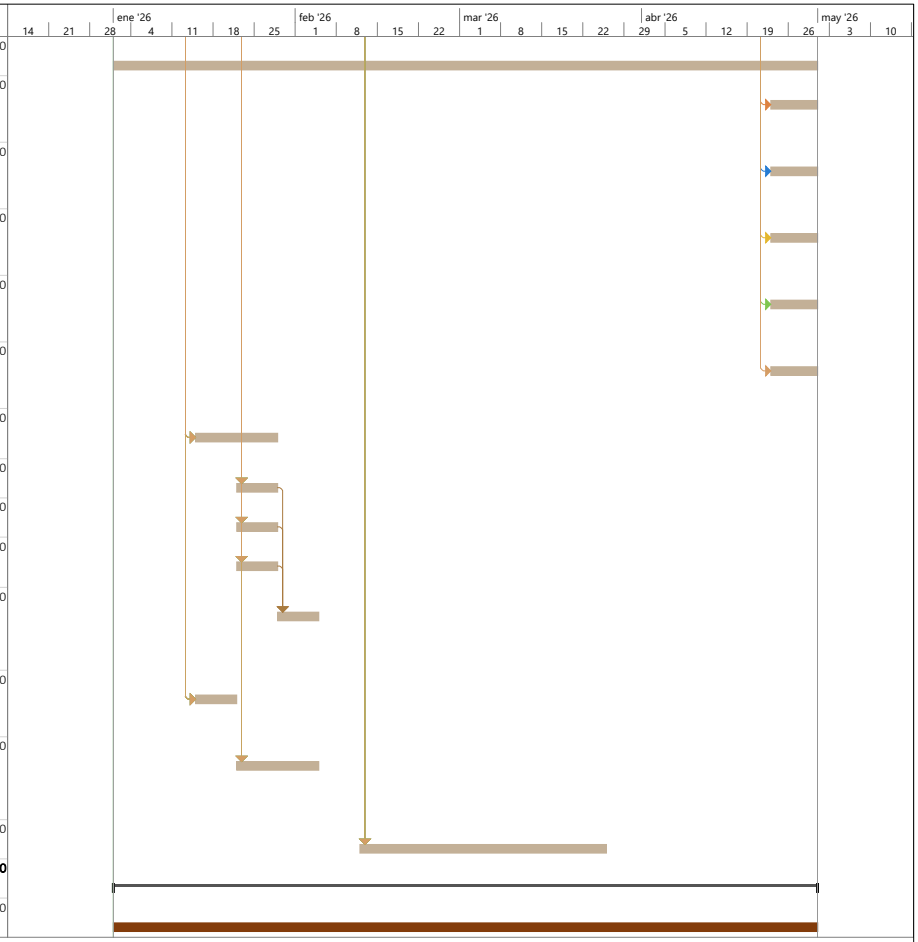

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 16/12/25

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Progreso
Progreso manual
