

Id	Texto10	Modo de tarea	Nombre de tarea	Texto2	Texto1	Costo	Duración	Comienzo	Fin
1			**MANTENIMIENTO, ADECUACIONES Y REPARACIONES DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE SINCELEJO Y COROZAL**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**$ 1,788,889,708.00**	**89 días**	**jue 25/09/25**	**vie 30/01/26**
2			inicio			$ 0.00	0 días	jue 25/09/25	jue 25/09/25
3			**TORRE GENTIUM**			**$ 153,320,587.94**	**83 días**	**jue 25/09/25**	**jue 22/01/26**
4	**1**		**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE BATERIAS SANITARIAS**			**$ 142,475,752.38**	**15 días**	**jue 18/12/25**	**lun 12/01/26**
5	**1.01**		Desmonte de Sanitarios	UND	12.00	$ 1,084,123.91	2 días	jue 18/12/25	lun 22/12/25
6	**1.02**		Desmonte de lavamanos	UND	12.00	$ 758,891.38	2 días	jue 18/12/25	lun 22/12/25
7	**1.03**		Demolicion de enchape de muros y piso	M2	66.00	$ 1,391,329.24	3 días	jue 18/12/25	mar 23/12/25
8	**1.04**		Desmonte y retiro de tuberia sanitaria de 4"	ML	54.00	$ 948,540.73	5 días	vie 19/12/25	lun 29/12/25
9	**1.05**		Desmonte y retiro de tuberia sanitaria de 2"	ML	30.00	$ 379,422.48	3 días	mar 23/12/25	lun 29/12/25
10	**1.06**		Suministro e Instalacion de tuberia sanitaria de 4"	ML	50.00	$ 2,572,681.45	3 días	mar 23/12/25	lun 29/12/25
11	**1.07**		Suministro e Instalacion de tuberia saniaria de 2"	ML	15.00	$ 415,264.13	5 días	vie 19/12/25	lun 29/12/25
12	**1.08**		Suministro e Instalacion de enchape para muros de baños	M2	236.96	$ 65,529,359.58	6 días	lun 29/12/25	mié 7/01/26
13	**1.09**		Suministro e Instalacion de enchape piso baño	M2	25.00	$ 2,048,564.18	6 días	lun 29/12/25	mié 7/01/26
14	**1.10**		Suministro e instaalcion de lavamano corrido	ML	10.00	$ 15,718,502.10	4 días	mié 31/12/25	mié 7/01/26
15	**1.11**		Sumnistro e instalacion de sanitario ahorrador	UND	9.00	$ 8,908,834.41	4 días	lun 29/12/25	lun 5/01/26
16	**1.12**		Suministro e instalacion de espejo	M2	15.00	$ 2,721,741.20	2 días	mié 7/01/26	vie 9/01/26
17	**1.13**		Sumnistro e instalacion de grifería para lavamanos	UND	20.00	$ 8,153,070.07	3 días	mié 31/12/25	mar 6/01/26
18	**1.14**		Suministro e instalacion de Rejilla Piso baño	UND	12.00	$ 867,054.64	2 días	mié 31/12/25	lun 5/01/26
19	**1.15**		Suministro e instalacion de Valvula o llave de paso de 1/2"	UND	12.00	$ 246,237.76	2 días	mié 7/01/26	vie 9/01/26
20	**1.16**		Suministro e instalacion de caja de registro 15x15	UND	12.00	$ 549,311.53	1 día	mié 7/01/26	jue 8/01/26
21	**1.17**		Suministro e instalacion de Secador de manos en acero inoxidable	UND	12.00	$ 14,110,462.07	3 días	mié 7/01/26	lun 12/01/26
22	**1.18**		suministro e instalacion de Dispensador de Jabon liquido acero inoxidable 1000 ml de 20x13cm	UND	6.00	$ 704,113.42	2 días	mié 7/01/26	vie 9/01/26
23	**1.19**		Suministro e instalacion de orinales	UND	6.00	$ 9,730,530.89	5 días	mié 31/12/25	jue 8/01/26
24	**1.20**		Punto sanitario para bateria sanitaria de 4"	UND	6.00	$ 696,020.52	5 días	vie 19/12/25	lun 29/12/25
25	**1.21**		Punto sanitario para lavamanos y orinales de 2"	UND	20.00	$ 1,641,095.07	4 días	mié 24/12/25	mié 31/12/25
26	**1.22**		Punto sanitario de sifon de piso de 2"	UND	6.00	$ 458,510.09	4 días	mié 24/12/25	mié 31/12/25
27	**1.23**		Construccion de lavatratero incluye punto sanitario, rejillas de piso, llave de chorro, instalacion de enchape y todo lo que se requiera para su correcto funcionamiento y adecuacion de area para almacenamiento de insumos de aseo.	GLB	1.00	$ 2,842,091.53	1 día	mié 7/01/26	jue 8/01/26
28	**2**		**REPARACION DE CUBIERTA 4TO PISO**		**0**	**$ 10,844,835.56**	**8 días**	**lun 12/01/26**	**jue 22/01/26**
29	**2.01**		DESMONTE DE CUBIERTA INCLUYE ESTRUCTURA	M2	21.00	$ 332,021.75	1 día	lun 12/01/26	mar 13/01/26
30	**2.02**		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA BLANCA 11,8 X 1,07 2MM CRESTA ALTA	M2	21.00	$ 1,474,289.22	1 día	mar 13/01/26	mié 14/01/26
31	**2.03**		CONSTRUCCION DE REDOBLON EN CONCRETO	ML	16.00	$ 339,308.71	2 días	mar 13/01/26	jue 15/01/26
32	**2.04**		IMPERMEABILIZACION DE REDOBLON.	ML	16.00	$ 268,549.98	2 días	mar 13/01/26	jue 15/01/26
33	**2.05**		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA APOYO DE CUBIERTA	ML	24.00	$ 3,033,399.17	2 días	jue 15/01/26	lun 19/01/26
34	**2.06**		REPARACION DE CIELO RASO EN DRYWALL INCLUYE DESMONTE Y RETIRO DEL EXISTENTE	M2	50.00	$ 5,397,266.73	3 días	lun 19/01/26	jue 22/01/26
35	**3**		**ADECUACIONES**		**0**	**$ 0.00**	**0 días**	**jue 25/09/25**	**jue 25/09/25**
36	~~2.01~~		~~SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA EN LYON DE ALATA RESISTENCIA 3 MM PARA PROTECCION CONTRA CAIDAS~~	~~M2~~	~~0~~	~~$ 0.00~~	~~7 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 6/10/25~~
37			**PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL**		**0**	**$ 232,742,152.77**	**79 días**	**jue 9/10/25**	**vie 30/01/26**
38	**4**		**ADECUACIONES Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA**		**0**	**$ 232,742,152.77**	**79 días**	**jue 9/10/25**	**vie 30/01/26**
39	~~4.01~~		~~DESMONTE Y SUMINISTRO DEL LOGO INSTITUCIONAL EN LETRAS DE ACERO INOXIDABLE CON CORTE LASER COLOR A ELECCION H: 20 CM Y ESCUDO EN ACERO INOXIDABLE EN CONTRASTE SATINADO D: 30 CM~~	~~UND~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
40	**4.02**		MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES Y LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS Y/O BRAZO	UND	40.00	$ 2,448,141.54	5 días	lun 19/01/26	lun 26/01/26
41	**4.03**		SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO CIERRA PUERTA HIDRAULICO CON CAPACIDAD MAYOR A 60 KG INCLUYE DESISTALANCION DE EXISTENTE DEFECTUOSO.	UND	2.00	$ 297,608.86	1 día	lun 26/01/26	mar 27/01/26
42	~~4.04~~		~~MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PUERTA PEATONAL DE VIDRIO UBICADA EN FACHADA PRINCIPAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE COROZAL, INCLUYE: DESMONTE DE HOJA EN CRISTAL TEMPLADO PARA AJUSTE DE BISAGRA HIDRAULICA, ACCESORIOS DE ORO, CERRADURAS, MANIJAS, NIVELACION.~~	~~UND~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~2 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 29/09/25~~
43	~~4.05~~		~~MANTENIMIENTO MURO DE MAMPOSTERIA AFECTADO INCLUYE: DEMOLICIÓN DE FRISO EXISTENTE, FRISO 1:3 E=1.5 CM MÁXIMO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MALLAVENA, ESTUCO Y PINTURA TIPO 1.~~	~~M2~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~5 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~jue 2/10/25~~
44	**4.06**		PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	M2	1020.17	$ 33,492,757.33	17 días	mar 6/01/26	jue 29/01/26
45	**4.07**		PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	2400.00	$ 48,616,213.10	41 días	jue 9/10/25	vie 5/12/25
46	**4.08**		PINTURA VINILO TIPO I PARA CIELOS RAZOS, DOS MANOS SOBRE DRYWALL O LOSA, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	M2	1100.00	$ 17,953,321.65	25 días	jue 30/10/25	jue 4/12/25
47	**7.04**		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO 60x60 de 40W INCRUSTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE, RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTE y DISPOSICION FINAL.	UND	84.00	$ 21,463,861.61	15 días	vie 9/01/26	vie 30/01/26
48	~~4.09~~		~~CORTINA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE INCLUYE: ANCLAJES, RETIRO DE LAS EXISTENTES Y TODOS LOS DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO.~~	~~ML~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~6 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 3/10/25~~
49	~~4.10~~		~~CIRCUITO CERRADO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA PARQUEADERO~~	~~GLB~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~6 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 3/10/25~~
50	**N.P.**		**ITEMS NO PREVISTOS**			**$ 108,470,248.68**	**17 días**	**mar 30/12/25**	**vie 23/01/26**
51	**10.05**		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAJAS DE PIEDRA PARA FACHADA COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	12.00	$ 5,958,021.27	3 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26
52	**NP 21**		DESMONTE Y SUMINISTRO DEL LOGO INSTITUCIONAL EN LETRAS DE ACERO INOXIDABLE CON CORTE LASER COLOR A ELECCION H: 20 CM Y ESCUDO EN ACERO INOXIDABLE EN CONTRASTE SATINADO D: 30 CM	GLB	1.00	$ 11,796,540.71	2 días	mar 30/12/25	vie 2/01/26
53	**NP 22**		ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES	M2	200.00	$ 10,744,095.95	4 días	mié 7/01/26	mar 13/01/26
54	**NP 35**		ESTUCO PARA INTERIORES Y EXTERIORES	ML	500.00	$ 13,707,385.00	6 días	vie 9/01/26	lun 19/01/26
55	**13.03**		DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ACARREO PARA DISPOSICION FINAL	M2	270.00	$ 2,845,900.71	6 días	mié 7/01/26	jue 15/01/26
56	**10.01**		CIELO RASO EN PANEL PVC ESPECIFICACIÓN 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos baterías no conductor de electricidad	M2	270.00	$ 47,139,452.01	6 días	mié 14/01/26	jue 22/01/26
57	**NP 26**		CORTINEROS EN PANEL PVC ESPECIFICACIÓN 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos -baterías no conductor de electricida	ML	50.00	$ 5,728,661.78	3 días	mar 20/01/26	vie 23/01/26
58	**NP 31**		MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VENTANERIA METALICA	UND	5.00	$ 1,676,472.50	2 días	lun 19/01/26	mié 21/01/26
59	**NP 32**		PINTURA TIPO ESMALTE PARA SOCALOS	ML	28.93	$ 249,449.91	2 días	lun 19/01/26	mié 21/01/26
60	**NP 34**		DESMONTE DE PUERTA METALICA	UND	1.00	$ 54,122.89	1 día	lun 19/01/26	mar 20/01/26
61	**NP 36**		FABRICACION DE MURO EN DRYWALL DOS CARAS PARA CIERRE DE PUERTA DE JUZGADO EN SALA DE AUDIENCIA	GLB	1.00	$ 838,175.00	1 día	lun 19/01/26	mar 20/01/26
62	**NP 55**		REPARACIÓN DE HUMEDADES EN PARED CON RELLENO	M2	158.00	$ 7,731,970.95	3 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26
63			**TORRE C**		**0**	**$ 125,339,691.44**	**12 días**	**vie 2/01/26**	**mar 20/01/26**
64	**5**		**ADECUACIONES**		**0**	**$ 125,339,691.44**	**12 días**	**vie 2/01/26**	**mar 20/01/26**
65	**5.01**		Construccion de columna en superboard, incluye estructura, aplicación de graniplast y 2 manos de pintura	mL	14.00	$ 1,685,410.03	3 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26
66	**5.02**		Suministro e instalación de Rubatex para tuberia de aire acondicionad	mL	40.00	$ 1,342,575.82	2 días	vie 2/01/26	mar 6/01/26
67	~~5.03~~		~~Suministro e instalación de tablero de distribución con 1 totalizador de 80 A, 1 analizador de red, 5 breaker's trifásicos de 40 A, barrajes de fases, neutro y tierra.~~	~~un~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
68	**5.04**		Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 4 AWG + 1 # 4 AWG + 1 # 6 AWG de Cu.	m	32.00	$ 4,094,998.10	2 días	lun 5/01/26	mié 7/01/26
69	**5.05**		Suministro e instalación de breaker industrial de 80 A. Incluye conexión en el tablero principal regulado existente y conexión en los barrajes de neutro y tierra.	un	1.00	$ 573,601.84	1 día	mié 7/01/26	jue 8/01/26
70	**5.06**		Suministro e instalación de 12 circuitos con espacio para totalizador	un	4.00	$ 2,800,138.93	3 días	mié 7/01/26	lun 12/01/26
71	**5.07**		Suministro e instalación de breaker industrial de 40 A.	un	4.00	$ 1,944,184.31	3 días	mié 7/01/26	lun 12/01/26
72	**7.11**		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONO POLAR 1 X 20 AMP INCLUYE CONEXIONADO, MARCACIÓN Y ROTULADO CON CÓDIGO DE COLORES.	un	28.00	$ 1,178,355.42	3 días	mié 7/01/26	lun 12/01/26
73	**7.13**		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA REGUALADA COLOR NARANJA DE 15AMP 125V CON POLO A TIERRA	un	161.00	$ 10,884,135.65	4 días	lun 12/01/26	vie 16/01/26
74	**8.03**		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12 X 5 CON TAPA TORNILLO BLANCA	m	233.00	$ 22,224,244.94	6 días	lun 12/01/26	mar 20/01/26
75	**7.03**		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENO No. 3X12 (F+N+T). 3 LINEAS: NEUTRO, FASE Y POLO TIERRA	m	3437.00	$ 64,020,406.12	6 días	lun 12/01/26	mar 20/01/26
76	**7.01**		TUBERIA PVC SCH-40 1/2 X 3M INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m	208.00	$ 3,310,510.14	7 días	vie 9/01/26	mar 20/01/26
77	**N.P.**		**ITEMS NO PREVISTOS**			**$ 11,281,130.14**	**2 días**	**vie 16/01/26**	**mar 20/01/26**
78	**NP 37**		Suministro e instalación de tablero de distribución con 1 totalizador de 80 A, 1 analizador de red, 5 breaker's trifásicos de 40 A, barrajes de fases, neutro y tierra.	UND	1.00	$ 11,281,130.14	2 días	vie 16/01/26	mar 20/01/26
79			**TORRE AYB**		**0**	**$ 1,277,487,275.85**	**88 días**	**jue 25/09/25**	**jue 29/01/26**
80	**6**		**IMPERMEABILIZACION DE PLACA**		**0**	**$ 0.00**	**0 días**	**jue 25/09/25**	**jue 25/09/25**
81	~~6.01~~		~~SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFÁLTICO AUTOPROTEGIDO CON FOIL DE ALUMINIO PARA CUBIERTA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA.~~	~~m2~~	~~0~~	~~$ 0.00~~	~~6 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 3/10/25~~
82	**7**		**INSTALACIONES REDES ELECTRICAS**		**0**	**$ 402,870,946.59**	**48 días**	**jue 20/11/25**	**jue 29/01/26**
83	**7.01**		TUBERIA PVC SCH-40 1/2 X 3M INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m	150.00	$ 2,387,386.75	9 días	lun 1/12/25	vie 12/12/25
84	~~7.02~~		~~SALIDA DE LUCES EN CABLE ENCAUCHETADO CAL#4MG CON TOMA AEREA, INCLUYE PRENSA ESTOPA, TAPA DE CAJA, CONECTORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA.~~	~~UND~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~5 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~jue 2/10/25~~
85	**7.03**		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE LIBRE DE HALOGENO No. 3X12 (F+N+T). 3 LINEAS: NEUTRO, FASE Y POLO TIERRA	mL	2500.00	$ 46,567,068.75	30 días	jue 11/12/25	lun 26/01/26
86	**7.04**		SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PANEL CUADRADO 60x60 de 40W INCRUSTADA SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS INCLUYE DESMONTE, RETIRO DE LUMINARIAS EXISTENTE y DISPOSICION FINAL.	UND	81.00	$ 20,697,295.12	8 días	lun 12/01/26	jue 22/01/26
87	**7.05**		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL REDONDO DE 12" INCRUSTAR	UND	5.00	$ 213,915.16	2 días	jue 22/01/26	lun 26/01/26
88	**7.06**		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL REDONDO DE 18" INCRUSTAR	UND	12.00	$ 644,074.30	5 días	jue 22/01/26	jue 29/01/26
89	**7.07**		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS	UND	17.00	$ 1,419,504.81	5 días	mar 30/12/25	mié 7/01/26
90	**7.08**		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS	UND	9.00	$ 1,075,853.06	5 días	mar 30/12/25	mié 7/01/26
91	**7.09**		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE INCLUYE CABLEADO PARA 3 MTS Y ACCESORIOS	UND	8.00	$ 1,194,118.26	6 días	vie 2/01/26	lun 12/01/26
92	**7.1**		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER MONO POLAR 1 X 15 AMP INCLUYE CONEXIONADO, MARCACIÓN Y ROTULADO CON CÓDIGO DE COLORES.	UND	13.00	$ 547,093.59	3 días	lun 12/01/26	jue 15/01/26
93	**7.11**		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER ENCHUFABLE DE 1X20A 10KA INCLUYE CONEXIONADO, MARCACIÓN Y ROTULADO CON CÓDIGO DE COLORES.	UND	60.00	$ 2,525,047.32	3 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26
94	**7.12**		SUMINSTRO E INSTALACION DE TOMA BLANCO INTEGRAL DE 15AMP 125V CON POLO A TIERRA	UND	190.00	$ 13,119,282.74	10 días	mié 7/01/26	mié 21/01/26
95	**7.13**		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA REGUALADA COLOR NARANJA DE 15AMP 125V CON POLO A TIERRA	UND	149.00	$ 10,072,895.72	10 días	vie 9/01/26	vie 23/01/26
96	~~7.14~~		~~Suministro e instalación de tablero de distribución con 1 totalizador graduable con ajusta cerca a 665 A, 1 analizador de red, 1 DPS, 15 breaker's, siete unidades de 60 A, cinco unidades de 80 A, tres unidades de 150 A, todos trifásicos, barrajes de fases~~	~~un~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~16 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 17/10/25~~
97	~~7.15~~		~~Suministro e instalación de tablero de distribución con 1 totalizador de 150 A, 1 analizador de red, 8 breaker's trifásicos de 40 A, barrajes de fases, neutro y tierra.~~	~~un~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~16 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 17/10/25~~
98	**7.16**		Suministro e instalación bandeja tipo ducto de 30 cm x 8 cm galvanizada con tapa atornillada.	m	36.00	$ 7,893,875.41	16 días	jue 20/11/25	vie 12/12/25
99	~~7.17~~		~~Suministro e instalación de cable alimentador de 3 x (5 # 250 kcmil) Fase Al Serie 8000 + 1 x (5 #250 kcmil) Neutro Al 8000 + 2 x # 2/0 AWG Tierra Cu.~~	~~m~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~16 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 17/10/25~~
100	~~7.18~~		~~Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable # 25~~	~~un~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~16 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 17/10/25~~
101	**7.19**		Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable 2/0 A	un	4.00	$ 115,064.66	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
102	~~7.2~~		~~Suministro e instalación de breaker industrial graduable con ajuste cerca a 665 A. Incluye conexión en el tablero principal y conexión en los barrajes de neutro y tierra.~~	~~un~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~16 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 17/10/25~~
103	**7.21**		Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 1/0 AWG + 1 # 1/0 AWG + 1 # 2 AWG de Cu.	m	72.00	$ 22,453,300.12	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
104	**7.22**		Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable # 1/0	un	20.00	$ 502,724.47	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
105	**7.23**		Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable # 2 A	un	4.00	$ 72,949.59	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
106	~~7.24~~		~~Suministro e instalación de breaker industrial de 150 A. Incluye conexión en el tablero principal regulado existente y conexión en los barrajes de neutro y tierra.~~	~~un~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~16 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 17/10/25~~
107	**7.25**		Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 4 AWG + 1 # 4 AWG + 1 # 6 AWG de Cu.	m	120.00	$ 15,356,242.86	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
108	**7.26**		Suministro e instalación de tablero de 42 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.	Un	2.00	$ 2,904,962.39	7 días	jue 20/11/25	lun 1/12/25
109	**7.27**		Suministro e instalación de tablero de 36 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.	Un	1.00	$ 1,398,554.30	2 días	jue 20/11/25	lun 24/11/25
110	**7.28**		Suministro e instalación de tablero de 24 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.	Un	10.00	$ 11,960,009.34	7 días	jue 20/11/25	lun 1/12/25
111	**7.29**		Suministro e instalación de tablero de 12 circuitos trifásico de breakers enchufables con espacio para totalizador y puerta.	Un	5.00	$ 3,500,173.67	5 días	jue 20/11/25	jue 27/11/25
112	**7.3**		Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 6 AWG + 1 # 6 AWG + 1 # 8 AWG de Cu.	m	92.00	$ 8,155,850.23	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
113	**7.31**		Suministro e instalación alimentador libre de Halógenos de 3 # 8 AWG + 1 # 8 AWG + 1 # 8 AWG de Cu.	m	162.00	$ 9,399,410.51	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
114	**7.32**		Suministro e instalación bandeja tipo ducto de 20 cm x 8 cm galvanizada con tapa atornillada.	m	12.00	$ 2,082,676.61	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
115	**7.33**		Suministro e instalación bandeja tipo ducto de 30 cm x 8 cm galvanizada con tapa atornillada.	m	72.00	$ 13,991,497.96	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
116	**7.34**		Suministro e instalación de bandeja tipo malla de 20 cm * 5 cm. Incluye soporte y cable de equpotencialización	m	192.00	$ 36,626,834.21	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
117	**7.35**		Suministro e instalación de cable alimentador de cable de 2 # 8 AWG Fase + 1# 10 AWG Tierra.	m	800.00	$ 27,195,039.20	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
118	**7.36**		Suministro e instalación de marco en aluminio para luminaria de 60*6	un	53.00	$ 3,906,377.77	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
119	**7.37**		Suministro e instalación de salida de tomacorriente GFCI	un	12.00	$ 956,556.26	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
120	**7.38**		Suministro e instalación de regata, resane y pintura	m	120.00	$ 2,414,872.44	16 días	lun 29/12/25	mié 21/01/26
121	~~7.39~~		~~Suministro e instalación de Salida de aire acondicionado~~	~~un~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~21 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 24/10/25~~
122	**7.4**		Suministro e instalación de breaker monopolar de 1*15 A	un	13.00	$ 547,093.59	3 días	vie 16/01/26	mié 21/01/26
123	**7.41**		Suministro e instalación de breaker monopolar de 1*20 A	un	60.00	$ 2,525,047.32	3 días	vie 16/01/26	mié 21/01/26
124	**7.42**		Suministro e instalación de breaker monopolar de 2*20 A	un	22.00	$ 2,180,639.92	3 días	vie 16/01/26	mié 21/01/26
125	**7.43**		Suministro e instalación de breaker monopolar de 2*30 A	un	20.00	$ 1,982,399.93	3 días	vie 16/01/26	mié 21/01/26
126	**7.44**		Suministro e instalación de breaker monopolar de 2*40 A	un	7.00	$ 758,289.19	3 días	vie 16/01/26	mié 21/01/26
127			**ITEMS NO PREVISTOS PARTE ELECTRICA**			**$ 123,526,969.06**	**21 días**	**mié 17/12/25**	**lun 19/01/26**
128	**NP 38**		TUBERIA EMT-40 3/4 X 3M INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	617.00	$ 17,754,604.54	15 días	mié 17/12/25	vie 9/01/26

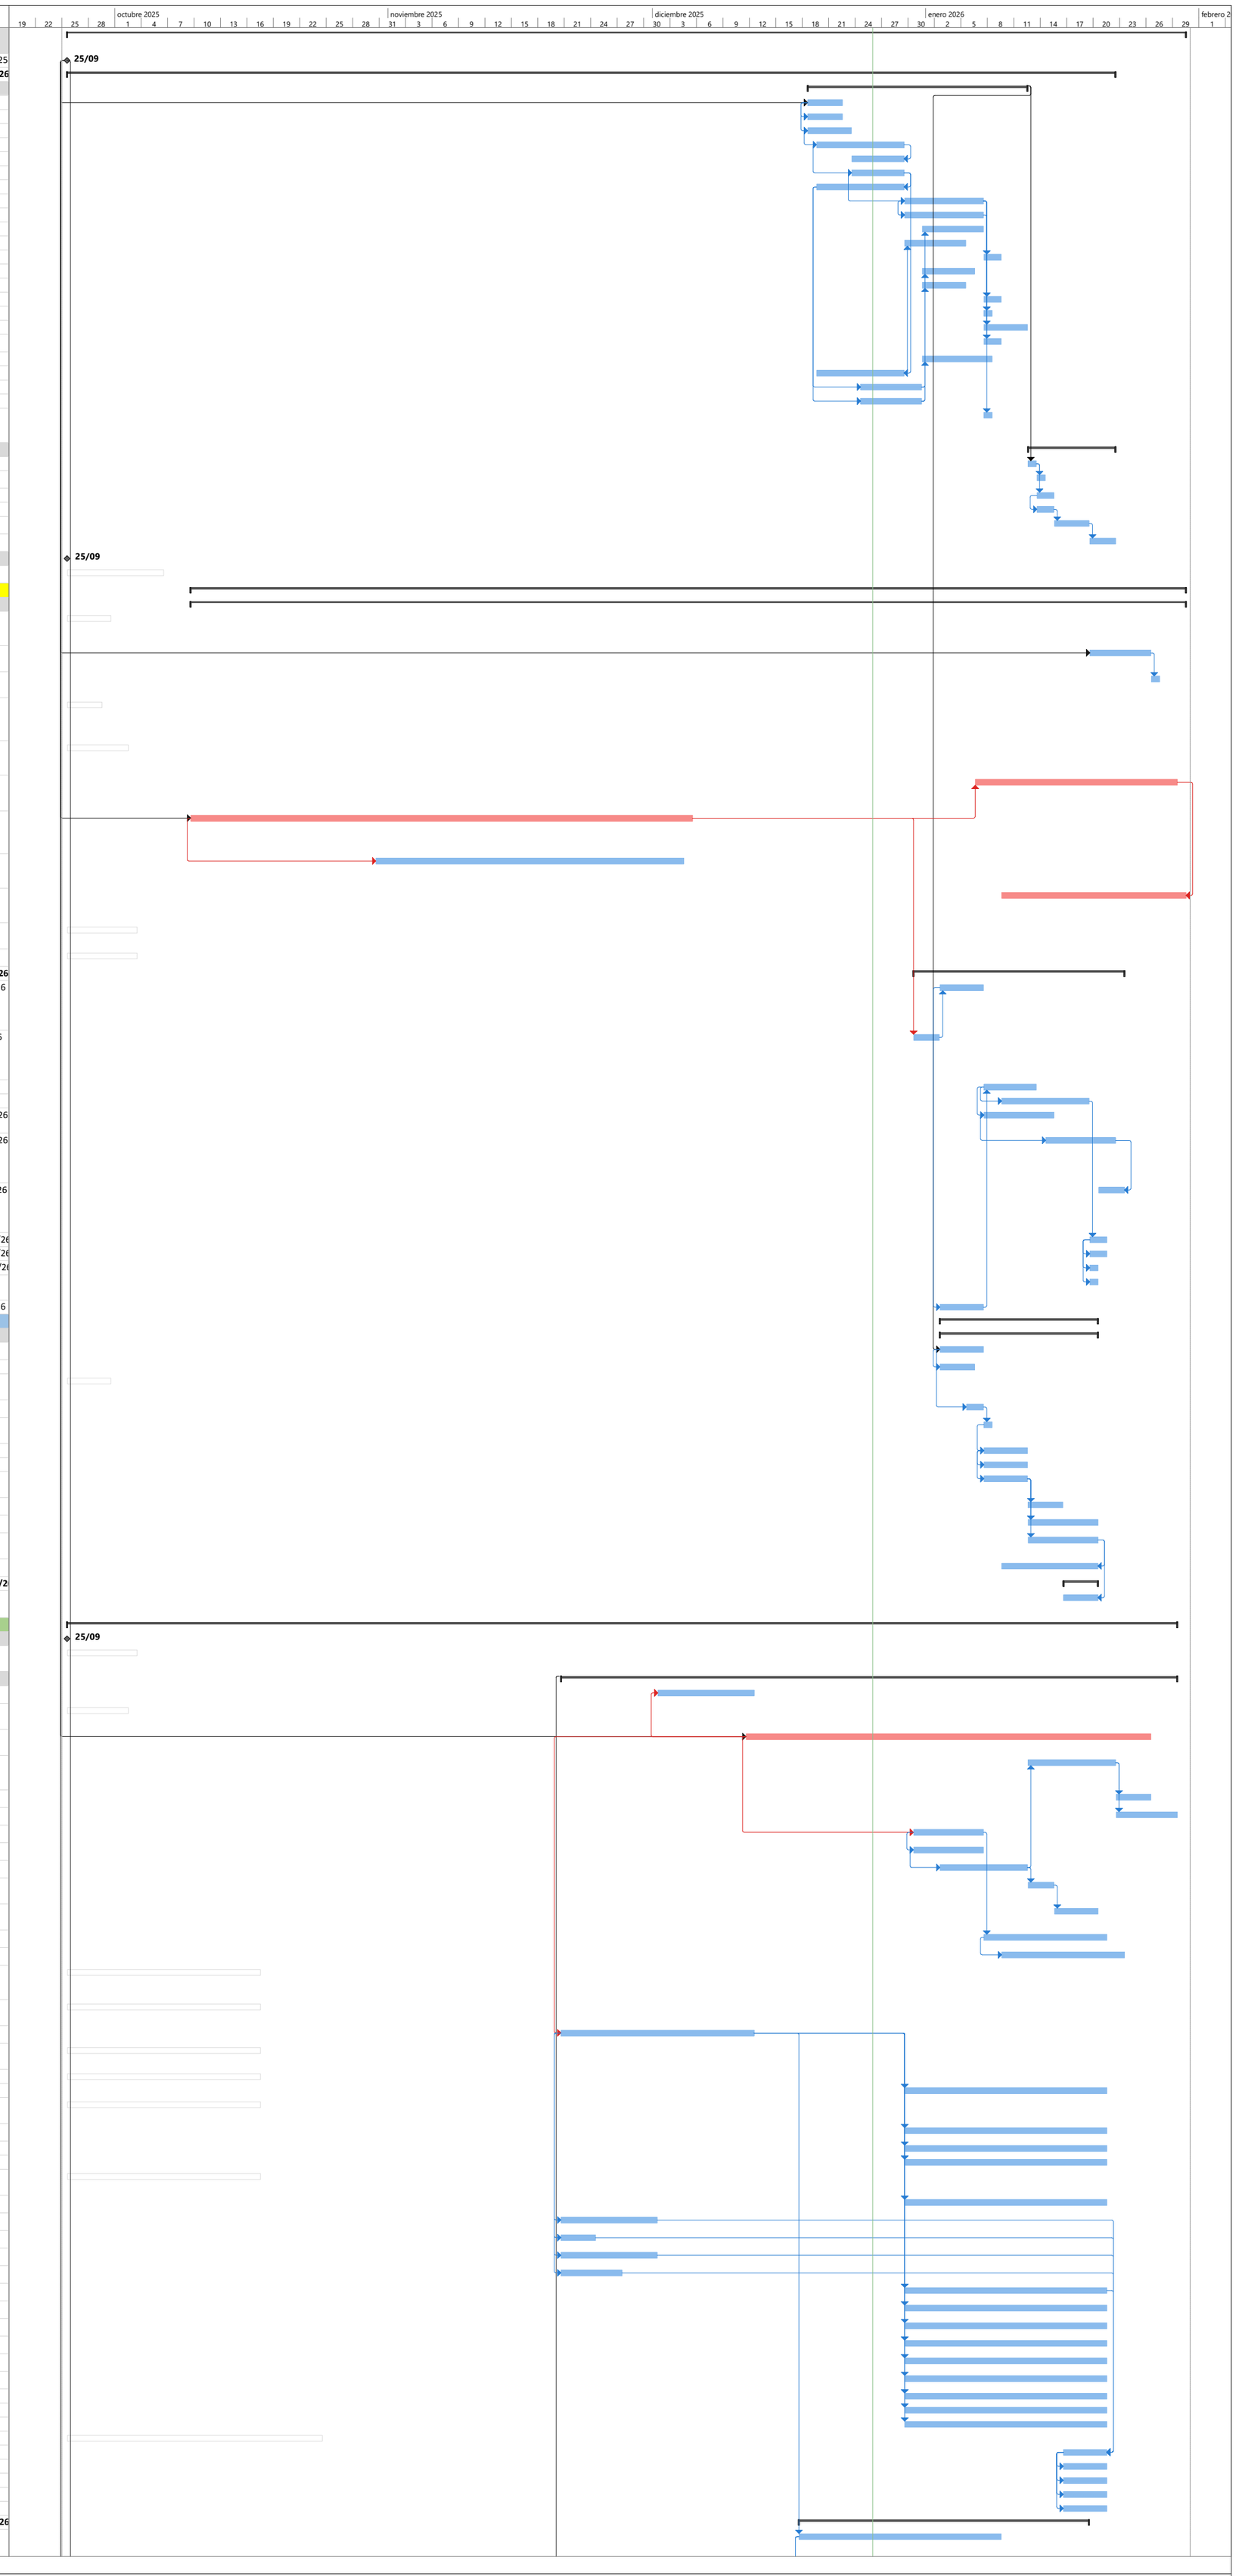

Proyecto: PALACIO DE JUSTICIA
Fecha: vie 26/12/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

Id	Texto10	Modo de tarea	Nombre de tarea	Texto2	Texto1	Costo	Duración	Comienzo	Fin
129	**NP 39**		SALIDA DE LUCES EN CABLE ENCAUCHETADO 3X16AWG CON TOMA AEREA. INCLUYE PRENSA ESTOPA, TAPA DE CAJA, CONECTORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	98.00	$ 9,630,670.72	12 días	vie 19/12/25	jue 8/01/26
130	**NP 40**		Suministro e instalación de tablero de distribución con 1 totalizador graduable 560 - 800 AMP Capacidad de Ruptura 70 KA, con ajustado cerca a 665 Amp, 1 analizador de red, 1 DPS, 17 breaker's (3 de 3x150 amp , 5 de 3x80 amp, 7 de 3x63 amp + 2 de reserva);	UND	1.00	$ 36,496,307.15	4 días	lun 29/12/25	lun 5/01/26
131	**NP 41**		Suministro e instalación de tablero de distribución con 1 totalizador de 150 Amp, 1 analizador de red, 8 breaker's trifásicos de 40 Amp y 2 breakers de reserva, barrajes de fases, neutro y tierra.	UND	1.00	$ 14,365,088.03	5 días	lun 29/12/25	mar 6/01/26
132	**NP 42**		Suministro e instalación de cable alimentador de 3 x (5 # 250 kcmil) Fase Al Serie 8000 HHFR-LS + 1 x (5 #250 kcmil) Neutro Al S8000 HHFF-LS+ 2 x # 2/0	ML	26.00	$ 23,595,652.69	4 días	mar 6/01/26	lun 12/01/26
133	**NP 43**		Suministro e instalación de breaker industrial 560 - 800 Amp graduable con ajuste cerca a 665 A. Incluye conexión en el tablero principal y conexión en los barrajes de neutro y tierra.	UND	1.00	$ 11,810,457.00	2 días	mar 6/01/26	jue 8/01/26
134	**NP 44**		SUMINISTRO E INSTLACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION CON BRAKER DE 3 X150 , 1 BREAKER DE 3X80, TODOS TRIFASICOS, BARRAJE DE FASE	UND	1.00	$ 5,734,584.45	2 días	jue 8/01/26	lun 12/01/26
135	**NP 45**		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA RAWELT + LIQUID TIGHT DE 3/4" Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	22.00	$ 3,323,833.25	4 días	mar 6/01/26	lun 12/01/26
136	**NP 46**		ACOMETIDA PARA AIRE ACONDICIONADO DE TABLERO A MANEJADORAS X 3 LINEAS (2N°10+1N°12) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION	UND	1.00	$ 27,862.23	2 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26
137	**NP 47**		SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIOANDO DE MANEJADORAS A CONDESADIRAS EN 3# 12 (1 FASE+1 NEUTRO+1 TIERRA)+ 2#14 (2SEÑALES) INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA	UND	1.00	$ 29,270.36	3 días	mié 14/01/26	lun 19/01/26
138	**NP 54**		Suministro e instalación de terminal de ojo ponchable para cable # 300 kcmil	UND	16.00	$ 758,638.64	3 días	mié 14/01/26	lun 19/01/26
139	**8**		**INSTALACIONES REDES DE DATOS**		**0**	**$ 190,289,236.34**	**18 días**	**jue 18/12/25**	**jue 15/01/26**
140	**8.01**		SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	6460.00	$ 58,294,529.66	10 días	vie 26/12/25	lun 12/01/26
141	**8.02**		SALIDA DE DATOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION (INCLUYE PICORD CAT 6A	UND	167.00	$ 43,144,240.48	10 días	mar 30/12/25	mié 14/01/26
142	**8.03**		SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA METALICA DE 12 X 5 CON TAPA TORNILLO BLANCA	ML	540.00	$ 51,506,833.77	14 días	jue 18/12/25	vie 9/01/26
143	**8.04**		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TROQUEL TRIPLE 1 TOMA NORMAL, 1 TOMA REGULADO 1 DATOS COLOR BLANCO TAPA TORNILLO	UND	147.00	$ 7,366,355.15	4 días	vie 9/01/26	jue 15/01/26
144	**8.05**		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TROQUEL DOBLE 1 TOMA NORMAL 1 DATOS COLOR BLANCO TAPA TORNILLO	UND	19.00	$ 701,424.81	2 días	vie 9/01/26	mar 13/01/26
145	**8.06**		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA TROQUEL SENCILLO 1 TOMA NORMAL TAPA TORNILLO BLANCO	UND	27.00	$ 524,406.12	3 días	vie 9/01/26	mié 14/01/26
146	**8.07**		SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO DE CIERRE FINAL PARA CANALETA	UND	88.00	$ 2,352,244.00	10 días	jue 18/12/25	lun 5/01/26
147	**8.08**		SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH CORD CAT 6A 3MT AZU	UND	167.00	$ 12,120,777.75	8 días	mar 30/12/25	lun 12/01/26
148	**8.09**		SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH 48 PORT GIGABIT SMART SWITCH, 48 PTO 10/100/100 4 SFP ADMINISTRABLE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA	UND	2.00	$ 13,685,303.60	4 días	jue 8/01/26	mié 14/01/26
149	**8.10**		SUMINISTRO DE PATCH PANEL DE 48PTOS	UND	2.00	$ 593,121.00	2 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26
150	**9**		**MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA**		**0**	**$ 219,178.89**	**4 días**	**jue 15/01/26**	**mié 21/01/26**
151	**9.01**		MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METALICA DE ACCESO A DEPENDENCIAS INCLUYE NIVELACION, AJUSTES, LUBRICACION DE BISAGRA Y/O RODAMIENTOS Y/O BRAZO CIERRA PUERTA Y SUMINISTRO DE	UND	1.00	$ 54,700.59	3 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26
152	**9.02**		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA EN PUERTA METALICA INCLUYE MANTENIMIENTO Y RETIRO DE LA CERRADURA EN MAL ESTADO	UND	1.00	$ 164,478.30	3 días	vie 16/01/26	mié 21/01/26
153	**10**		**ACABADOS**		**0**	**$ 218,135,269.42**	**88 días**	**jue 25/09/25**	**jue 29/01/26**
154	**10.01**		CIELO RASO EN PANEL PVC ESPECIFICACIÓN 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos baterías no	M2	1000.00	$ 174,590,563.00	54 días	jue 25/09/25	mié 10/12/25
155	**10.02**		SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRYWALL CON LAMINA DE 8MM BASE 9 PARA MURO DE CUARTO DE RACK	M2	50.00	$ 7,767,205.25	5 días	mié 21/01/26	mié 28/01/26
156	**10.03**		PINTURA VINILO TIPO I COLOR IGUAL AL EXISTENTE PARA MUROS INTERIORES, TRES MANOS SOBRE PAÑETE O ESTUCO, INCLUYE RASPADA, RESANES, FILETES, JUNTAS, SUMINISTRO, LIMPIEZA, ANDAMIO Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	700.00	$ 17,063,695.60	6 días	mié 21/01/26	jue 29/01/26
157	~~10.04~~		~~INSTALACION DE MALLA PARA PREVENIR EL INGRESO DE PALOMAS EN CAMARA EN PISOS 2,3,4,5 Y 6~~	~~M2~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~12 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 13/10/25~~
158	**10.05**		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAJAS DE PIEDRA PARA FACHADA COLOR IGUAL O SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA APLICACIÓN.	M2	10.00	$ 4,965,017.30	2 días	lun 5/01/26	mié 7/01/26
159			**ITEN NO PREVISTOS**			**$ 13,748,788.27**	**15 días**	**mié 17/12/25**	**vie 9/01/26**
160	**NP 26**		CORTINEROS EN PANEL PVC ESPECIFICACIÓN 50 % PVC dimensionadas por 250mmx6m blanco nevado (acabado blanco mate superficie lisa montaje tipo machimbre - aislante térmico acústico - auto extinguible - resistente a hongos -baterías no conductor de electricida	ML	120.00	$ 13,748,788.27	15 días	mié 17/12/25	vie 9/01/26
161	**11**		**MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA**		**0**	**$ 1,495,881.90**	**3 días**	**mar 7/10/25**	**vie 10/10/25**
162	~~11.01~~		~~SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA Y REPARACION DE REDES ELECTRICAS QUE FUERE NECESARIAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO~~	~~UND~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
163	**11.02**		MANTENIMIENTO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA REPARACION DE REVOQUE ACERO EXPUESTO A INTEMPERIE	M2	16.00	$ 1,495,881.90	3 días	mar 7/10/25	vie 10/10/25
164	**12**		**CUBIERTA PUENTE TERCER PISO CONECCION ENTRE TORRE AYB, TORRE LAS MARIAS Y TORRE GENTIUM**		**0**	**$ 0.00**	**0 días**	**jue 25/09/25**	**jue 25/09/25**
165	~~12.01~~		~~DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE~~	~~M2~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
166	~~12.03~~		~~SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTALAS EN ALUMINIO CUERPO FIJO~~	~~M2~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
167	~~12.03~~		~~SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS EN ALUMINIO BATIENTES~~	~~M2~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~4 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mié 1/10/25~~
168	~~12.04~~		~~SUMINISTRO E INSTALACION DE ALFAJIA DE 12 CM~~	~~ML~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~2 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 29/09/25~~
169	~~12.05~~		~~SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR 6 MM DE 2,95 X 2,10 M CRISTAL~~	~~M2~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
170	~~12.06~~		~~CANALETA AMAZONA DE PARA AGUAS LLUVIAS DE 4"~~	~~ML~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
171	~~12.07~~		~~BAJANTE PARA CANALETAS AMAZONAS DE 6X6 CM~~	~~ML~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~2 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 29/09/25~~
172	~~12.08~~		~~DESMONTE Y REEMPLAZO DE SUPERBOARD~~	~~M2~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~6 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 3/10/25~~
173	~~12.09~~		~~PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIOR~~	~~M2~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~2 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 29/09/25~~
174	**13**		**REPARACION DE CUBIERTAS**		**0**	**$ 0.00**	**0 días**	**jue 25/09/25**	**jue 25/09/25**
175	~~12.01~~		~~DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE~~	~~M2~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
176	~~12.01~~		~~DESMONTE DE VIGA CANAL METALICA~~	~~ML~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~1 día~~	~~jue 25/09/25~~	~~vie 26/09/25~~
177	~~13.02~~		~~DEMONTE DE CONDENSADORAS DE AIRES ACONDICIONADOS~~	~~UND~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~2 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 29/09/25~~
178	~~13.03~~		~~DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL Y ACARREO PARA DISPOSICION FINAL~~	~~M2~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~2 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 29/09/25~~
179	~~13.04~~		~~DESMONTE DE LUMINARIAS Y DISPOSICION FINAL DE LUMINARIAS EXISTENTES~~	~~UND~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
180	~~13.05~~		~~MONTAJE DE CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO~~	~~UND~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~2 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 29/09/25~~
181	~~13.06~~		~~SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA CANAL METALICA CALIB~~	~~ML~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~8 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 7/10/25~~
182	~~13.07~~		~~SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS~~	~~ML~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~2 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 29/09/25~~
183	~~2.03~~		~~SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA BLANCA 11.8 X 1.07 2MM CRESTA ALTA~~	~~M2~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~5 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 2/10/25~~
184	~~2.03~~		~~CONSTRUCCION DE REDOBLON EN CONCRETO~~	~~ML~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
185	~~2.04~~		~~IMPERMEABILIZACION DE REDOBLON.~~	~~ML~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
186	**14**		**MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DE BATERIAS SANITARIAS**		**0**	**$ 464,476,762.71**	**87 días**	**jue 25/09/25**	**mié 28/01/26**
187	**1.01**		Desmonte de Sanitarios	UND	24.00	$ 2,168,247.83	8 días	jue 25/09/25	mar 7/10/25
188	**1.02**		Desmonte de lavamanos	UND	13.00	$ 822,132.33	8 días	jue 25/09/25	mar 7/10/25
189	**1.03**		Demolicion de enchape de muros y piso	M2	337.03	$ 7,104,843.26	15 días	jue 2/10/25	jue 23/10/25
190	**1.04**		Desmonte y retiro de tuberia sanitaria de 4"	ML	66.00	$ 1,159,327.55	7 días	jue 16/10/25	lun 27/10/25
191	**1.05**		Desmonte y retiro de tuberia sanitaria de 2"	ML	48.00	$ 607,075.97	8 días	jue 16/10/25	mar 28/10/25
192	~~1.06~~		~~Suministro e Instalacion de tuberia sanitaria de 4"~~	~~ML~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~5 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~jue 2/10/25~~
193	~~1.07~~		~~Suministro e Instalacion de tuberia sanitaria de 2"~~	~~ML~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~5 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~jue 2/10/25~~
194	**1.08**		Suministro e Instalacion y enchape para muros de baños	M2	300.00	$ 82,961,916.73	15 días	mar 4/11/25	mar 25/11/25
195	**1.09**		Suministro e Instalacion y enchape piso baño	M2	91.70	$ 7,514,133.14	8 días	jue 13/11/25	mar 25/11/25
196	**1.1**		Suministro e instaalcion de lavamano corrido	ML	16.00	$ 25,149,603.35	9 días	jue 15/01/26	mié 28/01/26
197	**1.11**		Suministro e instalacion de sanitario ahorrador	UND	17.00	$ 16,827,798.34	9 días	mar 18/11/25	lun 1/12/25
198	**1.12**		Suministro e instalacion de espejo	M2	16.00	$ 2,903,190.62	3 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26
199	**1.13**		Suministro e instalacion de griferia para lavamanos	UND	24.00	$ 9,783,684.08	6 días	jue 15/01/26	vie 23/01/26
200	**1.14**		Rejilla Piso	UND	13.00	$ 939,309.20	3 días	jue 15/01/26	mar 20/01/26
201	~~1.15~~		~~Valvula o llave de paso de 1/2"~~	~~UND~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
202	~~1.16~~		~~Suministro e instalacion de caja de registro 15x15~~	~~UND~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~3 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~mar 30/09/25~~
203	~~1.17~~		~~Secador de mano~~	~~UND~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~7 días~~	~~jue 25/09/25~~	~~lun 6/10/25~~
204	**1.18**		suministro e instalacion de Dispensador de Jabon liquido acero inoxidable 1000 ml de 20x13cm	UND	13.00	$ 1,525,579.08	2 días	mar 20/01/26	jue 22/01/26
205	**1.19**		Suministro e instalacion de orinales	UND	11.00	$ 17,839,306.64	6 días	mar 20/01/26	mié 28/01/26
206	**1.20**		Punto sanitario para bateria sanitaria de 4"	UND	66.00	$ 7,656,225.72	3 días	lun 27/10/25	jue 30/10/25
207	**1.21**		Punto sanitario para lavamanos y orinales de 2"	UND	48.00	$ 3,938,628.17	3 días	mar 28/10/25	vie 31/10/25
208	**1.22**		Punto sanitario de sifon de piso de 2"	UND	13.00	$ 993,438.54	2 días	lun 10/11/25	mié 12/11/25
209	**N.P.**		**ITEMS NO PREVISTOS**		0.00	$ 274,582,322.16	**31 días**	**jue 11/12/25**	**mar 27/01/2**
210	**NP 22**		DEMOLICION PLANTILLA DE PISO	M2	91.70	$ 3,048,530.16	3 días	jue 11/12/25	mar 16/12/25
211	**NP 23**		DESMONTE DE DIVISIONES EN ALUCOBON	M2	70.00	$ 3,159,275.00	3 días	jue 11/12/25	mar 16/12/25
212	**NP 24**		LEVANTE DE MURO EN BLOQUE 009	M2	90.00	$ 10,326,922.07	4 días	jue 11/12/25	mié 17/12/25
213	**NP 25**		MACHONES DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000PSI DE 0.09 MX 0,20	ML	20.00	$ 2,464,786.41	9 días	lun 15/12/25	lun 29/12/25
214	**NP 26**		VIGA DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.09MX0.20 M	ML	20.00	$ 3,141,321.29	5 días	lun 22/12/25	mar 30/12/25
215	**NP 27**		ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:4	M2	100.00	$ 6,193,855.35	2 días	jue 11/12/25	lun 15/12/25
216	**NP 28**		PAÑETE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	150.00	$ 8,290,002.08	4 días	jue 11/12/25	mié 17/12/25
217	**NP 29**		CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN PARA BAÑO. COMPUESTA POR CABINAS ENTANBORADA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE 304 ANTIMAGNETICO ACABADO 2B , COMPUESTOS POR ACCESORIOS DE FIJACIÓN EN ACERO INOX CON CHAPETAS INFERIORES, BISAGRAS EN ACERO INOX, MANIJAS	M2	58.00	$ 93,060,197.57	6 días	jue 11/12/25	vie 19/12/25
218	**NP 30**		BARRA EN ACERO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	UND	12.00	$ 3,669,953.11	2 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25
219	**NP 31**		SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE	UND	11.00	$ 4,591,267.33	1 día	vie 19/12/25	lun 22/12/25
220	**NP 32**		Suministro e Instalacion de tuberia sanitaria de 4". Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalacion	ML	74.00	$ 7,930,700.95	6 días	vie 12/12/25	lun 22/12/25
221	**NP 33**		Suministro e Instalacion de tuberia saniaria de 2". Incluye todos los elementos para su correcta instalacion	ML	62.00	$ 3,008,614.98	6 días	vie 12/12/25	lun 22/12/25
222	**NP 34**		Regata muro en mampostería para tubería de hasta ø 2". Incluye resane	ML	42.00	$ 885,391.33	2 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25
223	**NP 34.1**		Tapa registro en acero inoxidable 15 cm x 15 cm	UN	23.00	$ 4,314,955.85	3 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26
224	**NP 34.2**		Caja de inspección 60x60	UN	1.00	$ 811,687.38	2 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25
225	**NP 34.3**		Mantenimiento cajas de inspección	UN	1.00	$ 236,930.15	2 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25
226	**NP 34.4**		Relleno con material seleccionado de excavación	M3	7.97	$ 1,350,303.79	2 días	mié 24/12/25	lun 29/12/25
227	**NP 34.5**		Reconstrucción placa de contrapiso 3000 psi	M3	5.72	$ 923,674.01	2 días	lun 29/12/25	mié 31/12/25
228	**NP 34.6**		suministro e instalacion de tableta roja para exteriores	M2	14.67	$ 2,726,445.30	3 días	mié 31/12/25	mar 6/01/26
229	**NP 34.7**		suministro e instalacion de ceramica para exteriores	M2	9.00	$ 985,968.46	3 días	mié 31/12/25	mar 6/01/26
230	**NP 34.8**		Perforación tanque para tubería y nmiple pasamuro de	UN	1.00	$ 158,101.73	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25
231	**NP 34.9**		Resane de aberturas existentes del tanque de entrada y salida	UND	3.00	$ 146,078.43	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25
232	**NP 34.10**		Demolicion de placa de contrapiso	M2	15.00	$ 474,316.79	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25
233	**NP 34.11**		Excavacion manual de terreno adecuado para cimentac	M3	15.00	$ 677,567.78	1 día	jue 11/12/25	vie 12/12/25
234	**N.P**		**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**			**$ 112,005,474...**	**31 días**	**jue 11/12/25**	**mar 27/01/2**
235	**N.P. 35,1,**		**Desmonte y retiro de tubería pvc presión**			**$ 3,842,542.38**	**4 días**	**mar 16/12/2**	**lun 22/12/25**
236	**N.P. 35,1,**		Desmonte y retiro de tubería pvc presión de 1/2"	ML	132.00	$ 1,935,673.61	3 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25
237	**N.P. 35,1,**		Desmonte y retiro de tubería pvc presión de 3/4"	ML	54.00	$ 826,265.18	2 días	jue 18/12/25	lun 22/12/25
238	**N.P. 35,1,**		Desmonte y retiro de tubería pvc presión de 1"	ML	12.00	$ 191,939.50	1 día	mar 16/12/25	mié 17/12/25
239	**N.P. 35,1,**		Desmonte y retiro de tubería pvc presión de 1 1/	ML	12.00	$ 201,084.63	1 día	mar 16/12/25	mié 17/12/25
240	**N.P. 35,1,**		Desmonte y retiro de tubería pvc presión de 1 1/	ML	6.00	$ 105,571.37	1 día	mar 16/12/25	mié 17/12/25
241	**N.P. 35,1,1,6**		Desmonte y retiro de columna de agua en tubería pvc presión de 2"	ML	24.00	$ 582,008.09	1 día	mar 16/12/25	mié 17/12/25
242	**N.P. 35,1,**		**Suministro e instalación de tubería PVC-P**			**$ 2,921,220.41**	**5 días**	**lun 22/12/25**	**mar 30/12/2**
243	**N.P. 35,1,**		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 9	ML	72.00	$ 1,524,127.10	3 días	lun 22/12/25	vie 26/12/25
244	**N.P. 35,1,2,2**		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 11 ø ¾"	ML	30.00	$ 731,378.61	2 días	vie 26/12/25	mar 30/12/25
245	**N.P. 35,1,2,3**		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 13,5 ø 1"	ML	6.00	$ 176,047.70	1 día	lun 22/12/25	mar 23/12/25
246	**N.P. 35,1,2,4**		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 ø 1 ¼"	ML	6.00	$ 224,303.37	2 días	mar 23/12/25	vie 26/12/25
247	**N.P. 35,1,2,5**		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 ø 1 ½"	ML	6.00	$ 265,363.63	2 días	vie 26/12/25	mar 30/12/25
248	**N.P. 35,1,3**		**Suministro e instalación de tubería PVC-P descolgada**			**$ 853,197.68**	**1 día**	**vie 2/01/26**	**lun 5/01/26**
249	**N.P. 35,1,3,1**		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 9 descolgada ø ½"	ML	18.00	$ 488,800.45	1 día	vie 2/01/26	lun 5/01/26
250	**N.P. 35,1,3,2**		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 11 descolgada ø ¾"	ML	12.00	$ 364,397.23	1 día	vie 2/01/26	lun 5/01/26
251	**N.P. 35,1,4**		**Suministro e instalación de tubería PVC-P embebida**			**$ 1,686,139.88**	**2 días**	**mar 30/12/25**	**vie 2/01/26**
252	**N.P. 35,1,4,1**		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 9 embebida ø ½"	ML	42.00	$ 952,710.97	2 días	mar 30/12/25	vie 2/01/26
253	**N.P. 35,1,4,2**		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 11 embebida ø ¾"	ML	12.00	$ 313,828.19	2 días	mar 30/12/25	vie 2/01/26
254	**N.P. 35,1,4,3**		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 13,5 embebida ø 1"	ML	6.00	$ 190,167.72	1 día	mar 30/12/25	mié 31/12/25
255	**N.P. 35,1,4,4**		Suministro e instalación de tubería PVC-P RDE 21 embebida ø 1¼"	ML	6.00	$ 229,433.00	1 día	mié 31/12/25	vie 2/01/26
256	**N.P. 35,1,**		**Columna de agua en tubería PVC-P**			**$ 1,578,533.69**	**2 días**	**vie 2/01/26**	**mar 6/01/26**
257	**N.P. 35,1,**		Columna de agua en tubería PVC-P RDE 21 ø 2"	ML	24.00	$ 1,578,533.69	2 días	vie 2/01/26	mar 6/01/26

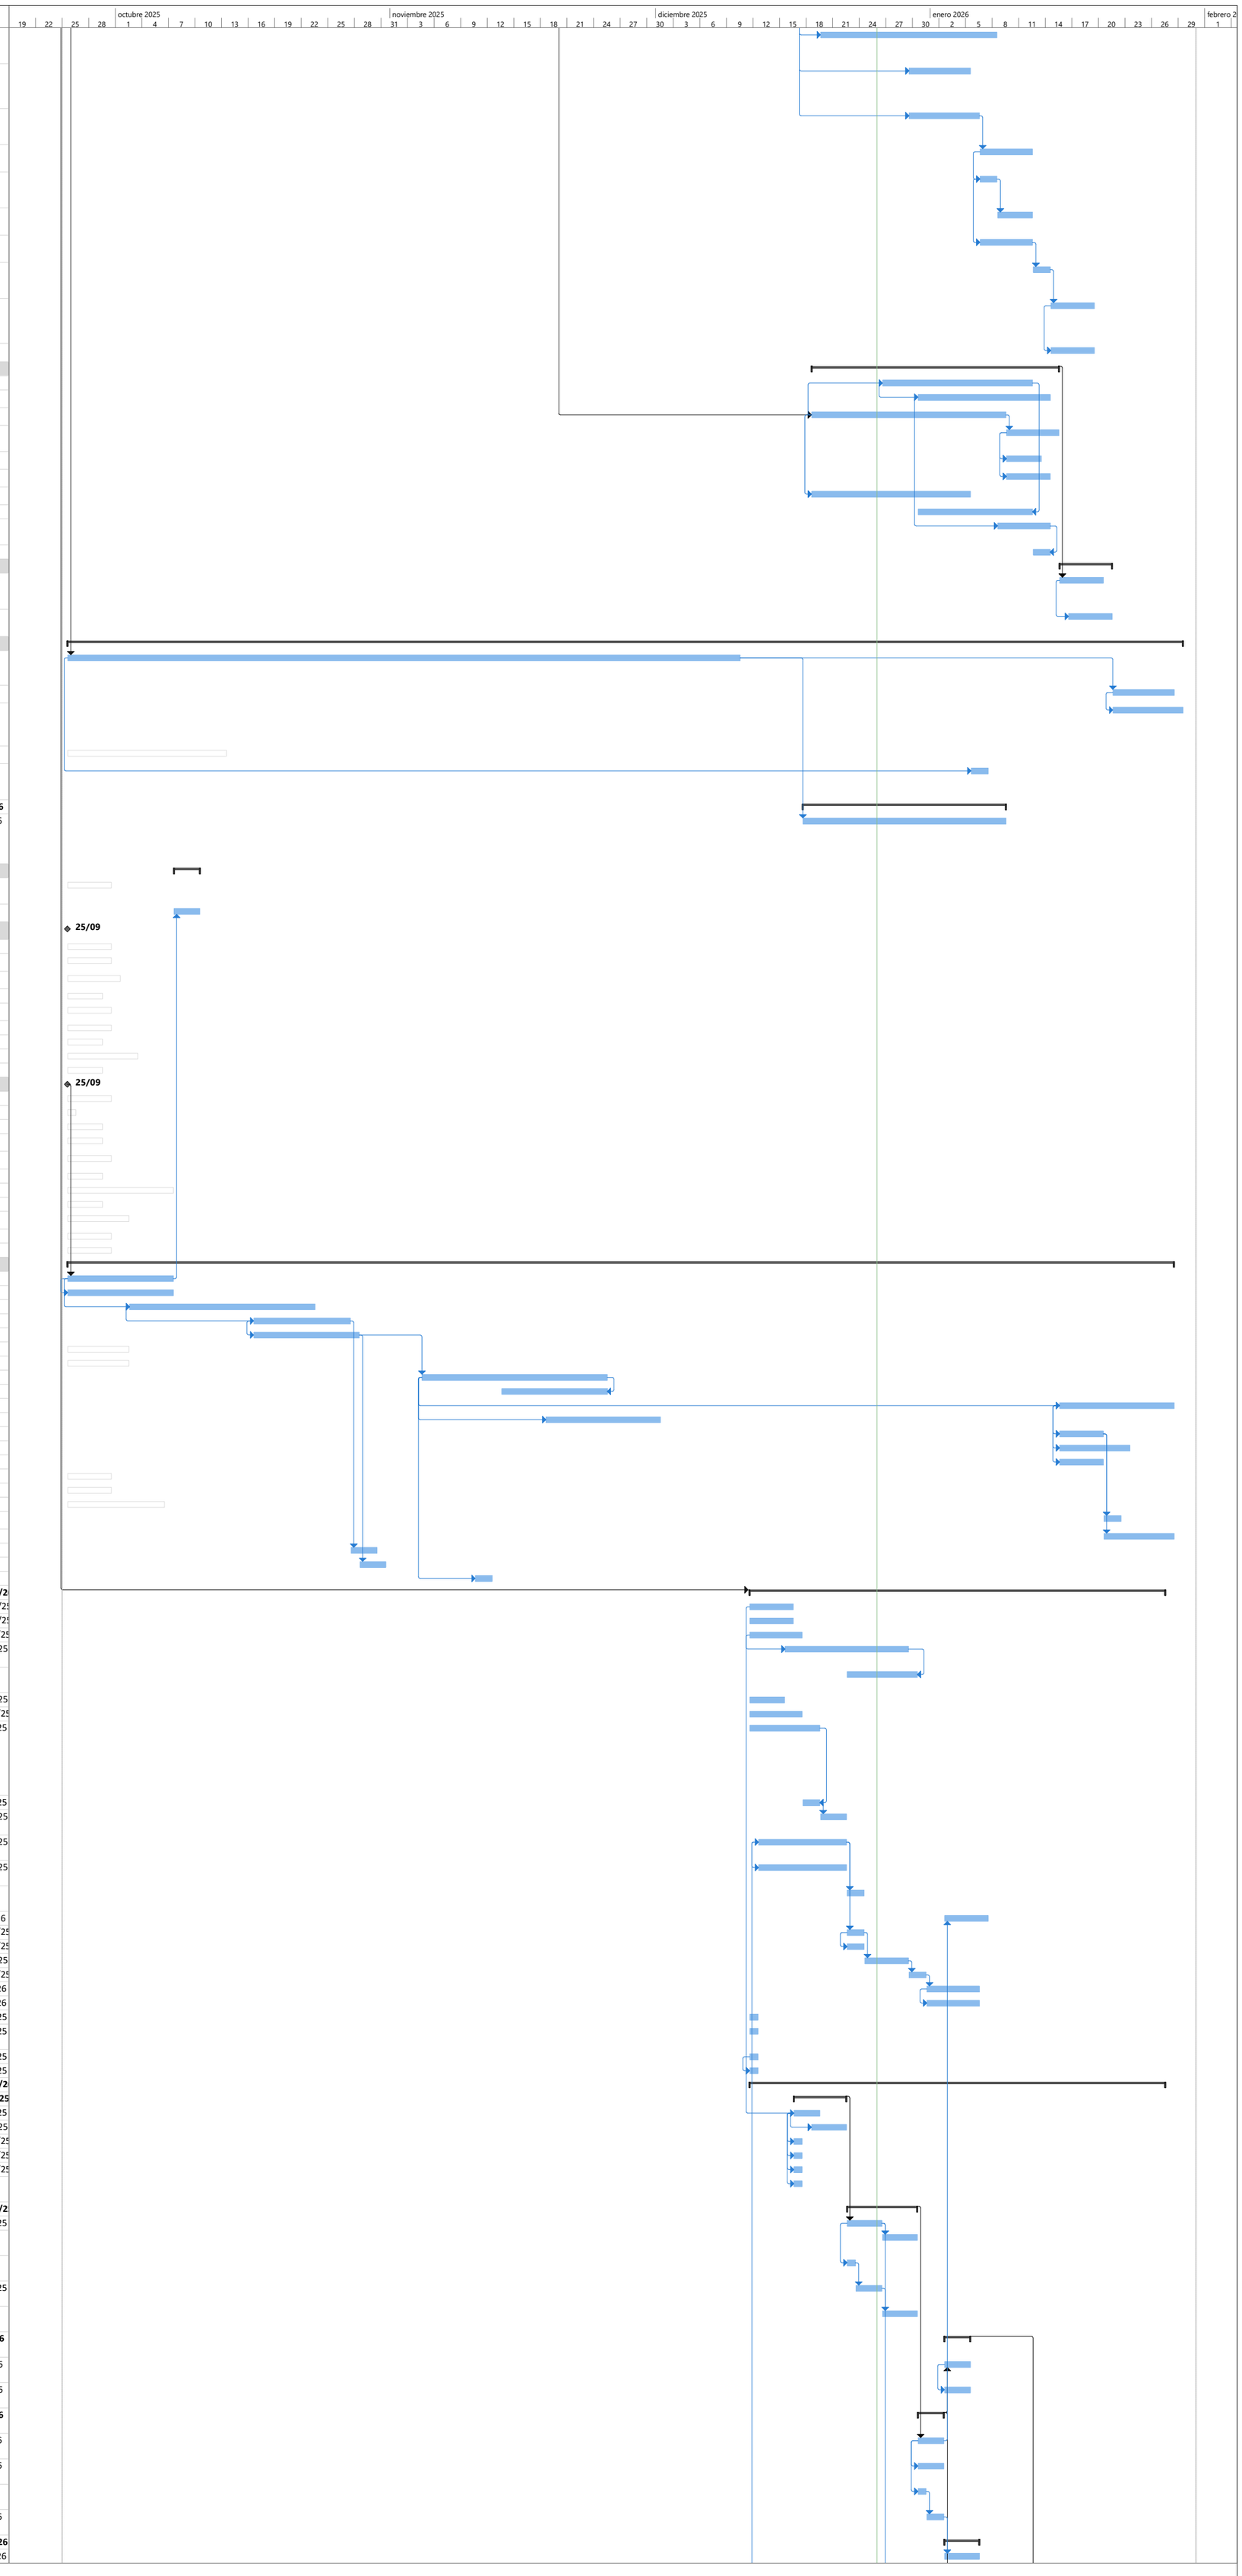

Proyecto: PALACIO DE JUSTICIA
Fecha: vie 26/12/25

Tarea · Resumen · Hito inactivo · solo duración · solo el comienzo · Hito externo · División crítica
División · Resumen del proyecto · Resumen inactivo · Informe de resumen manual · solo fin · Fecha límite · Progreso
Hito · Tarea inactiva · Tarea manual · Resumen manual · Tareas externas · Tareas críticas · Progreso manual

Id	Texto10	Modo de tarea	Nombre de tarea	Texto2	Texto1	Costo	Duración	Comienzo	Fin
258	**N.P. 35,1,6**		**Suministro e instalacionde tubería en Acero Inoxidable tipo 316L SCH 40 adsoada a concreto**			**$ 35,069,600.48**	**7 días**	**lun 12/01/26**	**mié 21/01/26**
259	**N.P. 35,1,6,1**		Suministro e instalacionde tubería en Acero Inoxidable tipo 316L SCH 40 adsoada a concreto ø 2"	ML	6.00	$ 2,795,617.95	2 días	lun 19/01/26	mié 21/01/26
260	**N.P. 35,1,6,2**		Suministro e instalacionde tubería en Acero Inoxidable tipo 316L SCH 40 adsoada a concreto ø 2½"	ML	60.00	$ 22,457,880.42	5 días	lun 12/01/26	lun 19/01/26
261	**N.P. 35,1,6,3**		Suministro e instalacionde tubería en Acero Inoxidable tipo 316L SCH 40 adsoada a concreto ø 3"	ML	6.00	$ 5,449,788.06	2 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26
262	**N.P. 35,1,7**		Suministro e instalacionde tubería en Acero Inoxidable tipo 316L SCH 40 adsoada a concreto ø 2½" trabajo en altura con silla de suspensión	ML	6.00	$ 4,366,314.05	2 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26
263	**N.P. 35,1,8**		**Suministro e instalación accesorio en acero inoxidable 316**			**$ 9,842,549.77**	**4 días**	**lun 12/01/26**	**vie 16/01/26**
264	**N.P. 35,1,8,1**		Suministro e instalación accesorio en acero inoxidable 316 ø 2"	UN	6.00	$ 901,778.30	4 días	lun 12/01/26	vie 16/01/26
265	**N.P. 35,1,8,2**		Suministro e instalación accesorio en acero inoxidable 316 ø 2 ½"	UN	25.00	$ 7,332,290.43	4 días	lun 12/01/26	vie 16/01/26
266	**N.P. 35,1,8,3**		Suministro e instalación accesorio en acero inoxidable 316 ø 3"	UN	4.00	$ 1,608,481.04	1 día	lun 12/01/26	mar 13/01/26
267	**N.P. 35,1,9**		**Válvula de compuerta NRS NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.**			**$ 9,137,030.78**	**3 días**	**vie 2/01/26**	**mié 7/01/26**
268	**N.P. 35,1,9,1**		Válvula de compuerta NRS ø ½" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.	UN	7.00	$ 1,317,760.68	3 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26
269	**N.P. 35,1,9,2**		Válvula de compuerta NRS ø ¾" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.	UN	10.00	$ 2,188,449.14	3 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26
270	**N.P. 35,1,9,3**		Válvula de compuerta NRS ø 1" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.	UN	3.00	$ 857,422.08	3 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26
271	**N.P. 35,1,9,4**		Válvula de compuerta NRS ø 1 ¼" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.	UN	2.00	$ 733,436.65	3 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26
272	**N.P. 35,1,9,5**		Válvula de compuerta NRS ø 1 ½" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.	UN	1.00	$ 490,315.61	3 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26
273	**N.P. 35,1,9,6**		Válvula de compuerta NRS ø 2" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.	UN	1.00	$ 747,364.54	3 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26
274	**N.P. 35,1,9,7**		Válvula de compuerta NRS ø 2 ½" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR.	UN	2.00	$ 2,802,282.08	3 días	vie 2/01/26	mié 7/01/26
275	**N.P. 35,1,**		**Suministro e instalación punto de agua fría**			**$ 10,083,580.52**	**7 días**	**vie 26/12/25**	**mié 7/01/26**
276	**N.P. 35,1,**		Suministro e instalación punto de agua fría ø ½"	UN	49.00	$ 4,385,073.70	3 días	vie 26/12/25	mié 31/12/25
277	**N.P. 35,1,**		Medidor de agua ø 2"	UN	2.00	$ 4,604,605.92	1 día	mar 6/01/26	mié 7/01/26
278	**N.P. 35,1,12**		Conexión a red existente metálica ø 2" - Acero Inoxidable ø 2½"	UN	1.00	$ 166,082.44	1 día	mar 6/01/26	mié 7/01/26
279	**N.P. 35,1,13**		Conexión a red existente PVC ø 1½"" - Acero Inoxidable ø 2½"	UN	1.00	$ 927,818.46	1 día	mar 6/01/26	mié 7/01/26
280	**N.P. 35,1,**		**Niple pasa muros en acero inoxidable L ≤ 0,5**			**$ 465,074.94**	**2 días**	**mié 14/01/2**	**vie 16/01/26**
281	**N.P. 35,1,14,1**		Niple pasa muros en acero inoxidable 316 L ≤ 0,5 m ø 2"	UN	1.00	$ 425,043.70	1 día	mié 14/01/26	jue 15/01/26
282	~~N.P. 35,1,14,2~~		~~Niple pasa muros en acero inoxidable 316 L ≤ 0,5 m ø 2½"~~	~~UN~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~1 día~~	~~jue 11/12/25~~	~~vie 12/12/25~~
283	~~N.P. 35,1,14,3~~		~~Niple pasa muros en acero inoxidable 304 L ≤ 0,5 m ø 3"~~	~~UN~~	~~0.00~~	~~$ 0.00~~	~~1 día~~	~~jue 11/12/25~~	~~vie 12/12/25~~
284	**N.P. 35,1,15**		Marcación de bajantes de tuberías en PVC con aerosol que incluya flecha con sentido del flujo, agua desaguada y número de bajante. Color azul rey u similar para agua potable, cian o similar para PVC-S ALL y verde para PVC-S ARD	UN	12.00	$ 40,031.24	1 día	jue 15/01/26	vie 16/01/26
285			**INSTALACIONES SANITARIAS**			**$ 36,526,004.33**	**31 días**	**jue 11/12/25**	**mar 27/01/2**
286	**N.P. 35,2,1**		**Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria**			**$ 3,378,257.89**	**3 días**	**jue 11/12/25**	**mar 16/12/25**
287	**N.P. 35,2,1,1**		Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 6"	ML	4.77	$ 1,455,226.54	2 días	jue 11/12/25	lun 15/12/25
288	**N.P. 35,2,1,2**		Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria ø 8"	ML	5.48	$ 1,923,031.35	2 días	vie 12/12/25	mar 16/12/25
289	**N.P. 35,2,2**		**Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria descolgada**			**$ 6,493,099.30**	**3 días**	**mar 16/12/25**	**vie 19/12/25**
290	**N.P. 35,2,2,1**		Suministro e instalación de tubería PVC Sanitaria descolgada 8"	ML	16.52	$ 6,493,099.30	3 días	mar 16/12/25	vie 19/12/25
291	**N.P. 35,2,**		**Suministro e instalación de tubería PVC Li**			**$ 846,381.38**	**2 días**	**lun 15/12/25**	**mié 17/12/2**
292	**N.P. 35,2,**		Suministro e instalación de tubería PVC Livian	ML	26.07	$ 846,381.38	2 días	lun 15/12/25	mié 17/12/25
293	**N.P. 35,2,4**		**Sumnistro e instalación de bajante PVC Sanitaria**			**$ 6,084,935.15**	**3 días**	**lun 15/12/25**	**jue 18/12/25**
294	**N.P. 35,2,**		Sumnistro e instalación de bajante PVC-S ø 4	ML	66.18	$ 6,084,935.15	3 días	lun 15/12/25	jue 18/12/25
295	**N.P. 35,2,5**		**Suministro e instalación de columa de ventilación en tubería PVC Liviana**			**$ 2,805,080.29**	**4 días**	**jue 18/12/25**	**mié 24/12/25**
296	**N.P. 35,2,5,1**		Suministro e instalación de columa de ventilación en tubería PVC Liviana ø 4"	ML	18.33	$ 1,393,681.28	2 días	jue 18/12/25	lun 22/12/25
297	**N.P. 35,2,6**		Sifón PVC-S 180° ø 2". Incluye rejilla metálica cuadrada 10x10 y sosco	UN	12.00	$ 1,411,399.01	2 días	lun 22/12/25	mié 24/12/25
298	**N.P. 35,2,7**		**Suministro e instalación punto sanitario y ventilación**			**$ 1,560,066.76**	**2 días**	**mié 17/12/25**	**vie 19/12/25**
299	**N.P. 35,2,**		Suministro e instalación punto ventilación ø 2	UN	23.00	$ 1,560,066.76	2 días	mié 17/12/25	vie 19/12/25
300	**N.P. 35,2,8**		**Válvula de compuerta NRS NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. Incluye tapa plástica**			**$ 1,797,614.58**	**2 días**	**lun 5/01/26**	**mié 7/01/26**
301	**N.P. 35,2,8,1**		Válvula de compuerta NRS ø 3" NP16 - Wog non-shock, cuerpo y disco en cobre, vástago en latón resistente a la deszincificación DZR. Incluye tapa plástica	UN	1.00	$ 1,797,614.58	2 días	lun 5/01/26	mié 7/01/26
302	**N.P. 35,2,**		**Cúpula tragante con sosco**			**$ 6,615,015.08**	**10 días**	**jue 18/12/25**	**lun 5/01/26**
303	**N.P. 35,2,**		Cúpula tragante en aluminio con sosco ø 6" x	UN	2.00	$ 495,387.22	4 días	lun 22/12/25	lun 29/12/25
304	**N.P. 35,2,**		Transición Acero Inoxidable ø 3" - PVC ø 4"	UN	1.00	$ 1,066,121.20	4 días	lun 22/12/25	lun 29/12/25
305	**N.P. 35,2,**		Junta de expansión PVC ø 4"	UN	24.00	$ 4,464,434.69	4 días	jue 18/12/25	mié 24/12/25
306	**N.P. 35,2,**		Niple pasamuro en acero inoxidable ø 3"	UN	1.00	$ 589,071.97	4 días	lun 29/12/25	lun 5/01/26
307	**N.P. 35,2,13**		**Suministro e instalacionde tubería en Acero Inoxidable tipo sanitario**			**$ 2,957,005.32**	**2 días**	**lun 12/01/26**	**mié 14/01/26**
308	**N.P. 35,2,13,1**		Suministro e instalacionde tubería en Acero Inoxidable tipo sanitaria adosada a concreto ø 3"	ML	6.00	$ 1,306,446.61	2 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26
309	**N.P. 35,2,13,2**		Suministro e instalacionde tubería en Acero Inoxidable tipo sanitaria descolga ø 3"	ML	7.00	$ 1,650,558.71	2 días	lun 12/01/26	mié 14/01/26
310	**N.P. 35,2,14**		**Suministro e instalación de acceosrios para tubería en acero inxoidable**			**$ 3,988,548.58**	**5 días**	**mar 20/01/26**	**mar 27/01/26**
311	**N.P. 35,2,14,1**		Suministro e instalación de acceosrios para tubería en acero inxoidable ø = 3"	UN	7.00	$ 2,814,841.81	2 días	mar 20/01/26	jue 22/01/26
312	**N.P. 35,2,15**		Marcación de bajantes de tuberías en PVC con aerosol que incluya flecha con sentido del flujo, agua desaguada y número de bajante. Color azul rey u similar para agua potable, cian o similar para PVC-S ALL y verde para PVC-S ARD	UN	18.00	$ 60,046.86	3 días	mar 20/01/26	vie 23/01/26
313	**N.P. 35,2,**		Válvula minivent	UN	1.00	$ 289,171.66	2 días	jue 22/01/26	lun 26/01/26
314	**N.P. 35,2,**		Rejilla ventilación en acero inoxidable 5" x 4½	UN	1.00	$ 241,567.19	1 día	lun 26/01/26	mar 27/01/26
315	**N.P. 35,2,**		Terminal de ventilación en HD ø 4"	UN	1.00	$ 370,762.20	1 día	lun 26/01/26	mar 27/01/26
316	**N.P. 35,2,19**		Conexión terminalde ventilación en HD ø 4" a bajante PVC-S ø 4"	UN	1.00	$ 166,016.68	1 día	lun 26/01/26	mar 27/01/26
317	**N.P. 35,2,20**		Malla metálica resistente a la corrosión con mesh de 630 x 787 / m para terminal de ventilación	UN	1.00	$ 46,142.18	1 día	lun 26/01/26	mar 27/01/26

