INFORME DE INSTALACIÓN

Contenido

Informe de Instalación..... ¡Error! Marcador no definido.
1. Introducción..... 2
2. Ejecución..... 3
2.1 Raqueo de los equipos 3
2.2 Conexiones de fibra de los equipos..... 4
2.3 Actualización de firmware..... 4
2.4 configuración de IP Xclarity..... 5

Tabla de Figuras

Imagen 1 Ubicación parte frontal de los equipos 3
Imagen 2 Ubicación parte posterior de los equipos 3
Imagen 3 Conexiones de fibra de los equipos..... 4
Imagen 4 Selección de actualizaciones..... 4
Imagen 5 Inicio de las actualizaciones 4
Imagen 6 Finalización exitosa de las actualizaciones..... 5
Imagen 7 Cambio de IPs para XClarity..... 5

1. Introducción

Fecha:	Septiembre 19 de 2025
Contrato:	1497-2025
Contratante:	Superintendencia de Industria y Comercio.
Contratista:	UT AC INFRAESTRUCTURA 2025
NIT:	901.966.233-3
Objeto del contrato:	Adquisición, instalación, configuración, implementación y puesta en funcionamiento de una solución de servidores físicos que permita la renovación y fortalecimiento de los servicios de gestión para la Superintendencia de Industria y Comercio.

El presente documento tiene como propósito formalizar, la entrega de servicios correspondientes a la solución tecnológica adquirida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de acuerdo con los términos del contrato vigente.

REFERENCIA	SERIAL	NUMERO DTO	CANTIDAD
7D73TT7B00	JZ00T7AG	LE000041499	01
7D73TT7B00	JZ00T7AH	LE000041499	01
7D73TT7B00	JZ00T7AK	LE000041499	01

2. Ejecución

2.1 Raqueo de Equipos

Iniciamos la actividad con la revisión de los equipos recibidos y la ubicación en las unidades indicadas por el cliente



Imagen 1 Ubicación parte frontal de los equipos



Imagen 2 Ubicación parte posterior de los equipos

2.2 conexiones de fibra de los equipos

Se realizaron las conexiones de fibra solicitadas con acompañamiento de los ingenieros del cliente
Se realiza una conexión de fibra por cada equipo en el port 0


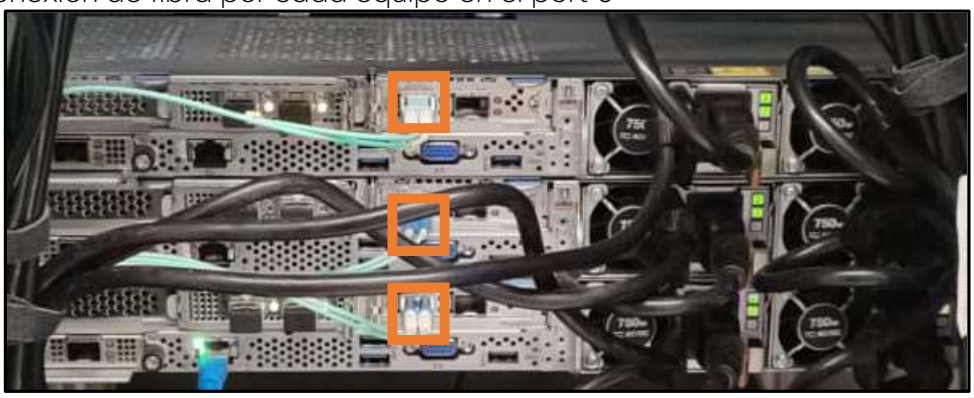


Imagen 3 Conexiones de fibra de los equipos

2.3 Actualización de firmware

Se realiza la actualización de firmware para cada uno de los equipos de manera independiente

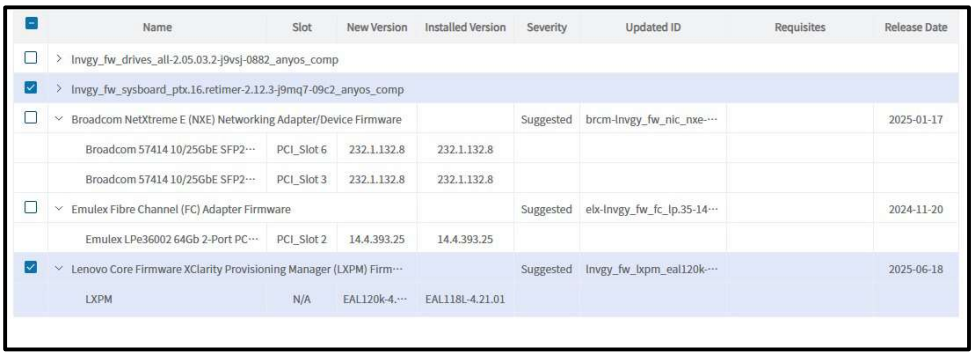

Name	Slot	New Version	Installed Version	Severity	Updated ID	Requisites	Release Date
Invgy_fw_drives_all-2.05.03.2-j9vsj-0882_anyos_comp							
Invgy_fw_sysboard_ptx.16.retimer-2.12.3-j9mq7-09c2_anyos_comp							
Broadcom NetXtreme E (NXE) Networking Adapter/Device Firmware				Suggested	brcm-lnvgy_fw_nic_nxe-···		2025-01-17
Broadcom 57414 10/25GbE SFP2···	PCI_Slot 6	232.1.132.8	232.1.132.8				
Broadcom 57414 10/25GbE SFP2···	PCI_Slot 3	232.1.132.8	232.1.132.8				
Emulex Fibre Channel (FC) Adapter Firmware				Suggested	elx-lnvgy_fw_fc_lp.35-14···		2024-11-20
Emulex LPe36002 64Gb 2-Port PC···	PCI_Slot 2	14.4.393.25	14.4.393.25				
Lenovo Core Firmware XClarity Provisioning Manager (LXPM) Firm···				Suggested	lnvgy_fw_lxpm_eal120k···		2025-06-18
LXPM	N/A	EAL120k-4.···	EAL118L-4.21.01				

Imagen 4 Selección de actualizaciones

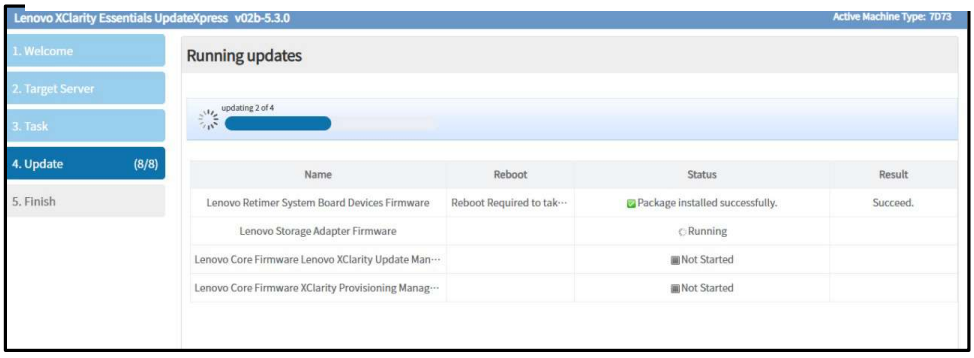


Imagen 5 Inicio de las actualizaciones

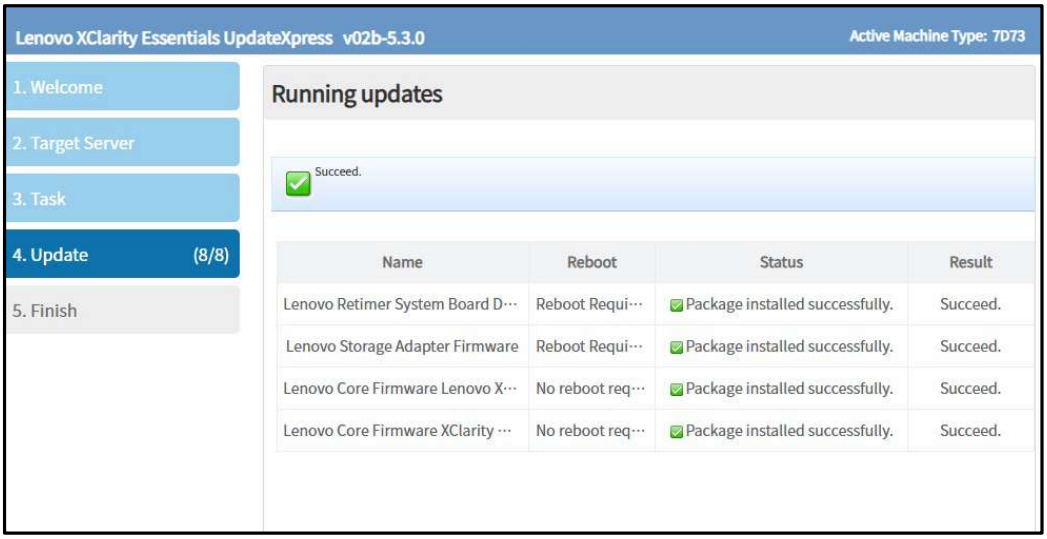


Imagen 6 Finalización exitosa de las actualizaciones

2.4 configuración de IP XClarity

Se realiza la configuración de las IPs las cuales dio el cliente para poder acceder a los equipos de manera remota en la interfaz XClarity



Imagen 7 Cambio de IPs para XClarity

Nota:
Se asignaron para los 03 equipos el usuario y contraseña:
USUARIO: USERID
CONTRASEÑA: Lenovo123*

Se recomienda que el cliente cambie estas credenciales y las mantenga seguras



Agustin Navas Cadena
Gerente de Operaciones
gerenciaoperaciones@conviest.com
