INFORME DE SUPERVISIÓN Y CONTRATO DE OBRA MINIMA CUANTIA
Contrato No MS-MC-059-2025

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y LEGALIZACIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED, DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SACHICA. No MS-MC-059-2025.

1. DATOS GENERALES

Tabla 1. Datos generales tipo de informe y supervisor.

TIPO DE INFORME	**PERIÓDICO**		**FINAL**	X
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE**	20-11-2025	**HASTA**	18-12-2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ			
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			
CARGO:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS			

2. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO SUPERVISADO

Una vez la administración municipal de Sáchica inició el proceso de contratación pública **No. MS-MC-059-2025** y completó el proceso de evaluación, se adjudicó el contrato de mínima cuantía al proponente **OMEGA GROUP COMPANY S.A.S** con NIT: 900917352-9 y su representante legal **CARLOS YESID TORRES BUSTOS** con C.C. 1.049.607.946 expedida en Tunja. A continuación, se presentan datos relevantes del contrato adjudicado:

Tabla 2. Información del contrato de obra.

CONTRATO No:	**MS-MC-059-2025.**
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	13 DE NOVIEMBRE DE 2025.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHICA
CONTRATISTA	OMEGA GROUP COMPANY S.A.S NIT: 900917352-9
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS YESID TORRES BUSTOS C.C. 1.049.607.946 expedida en Tunja

OBJETO:	CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y LEGALIZACIÓN ANTE EL OPERADOR DE RED, DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE SACHICA.
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO SETECIENTOS (35.895.700,00)
PLAZO TOTAL:	UN (01) MES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO:	20 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	19 DE DICIEMBRE DEL 2025
SUPERVISOR	**ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

3. LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

La localización de las actividades ejecutadas por el contratista, en cumplimiento total del objeto contractual y hasta la fecha del presente informe, corresponde a la construcción, mejoramiento y legalización ante el operador de red, del sistema eléctrico de la Institución Educativa Nueva Generación Sede Primaria del Municipio de Sáchica.

Ilustración 1. Localización de las actividades desarrolladas por el Contratista – Institución Educativa Nueva Generación



4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. Contrato No MS-MC-059-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato. Todas las actividades aquí contempladas cuentan con la supervisión correspondiente, garantizando que éstas cumplan con las especificaciones y estándares establecidos.


Tabla 3. Cuadro de ítems y cantidades del presupuesto contractual.

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.
BLOQUE 1, 2 Y 3				
1,1	2.10.22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 2 +4 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	ML	14,00
1,2	2.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 2"	UND	1,00
1,3	2.10.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP	UND	1,00
1,4	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	UND	2,00
1,5	2.10.236	BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL FIJO DE 3X100 AMP.	UND	1,00
1,6	2.10.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 1/0 AWG EN COBRE	ML	108,00
1,7	2.10.24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 6 AWG EN COBRE	ML	27,00
1,8	2.10.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (F, N, T) (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4").	ML	36,00
1,9	2.10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"	UN	4,00

1,10	2.10.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W	UN	4,00
1,11	2.10.137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UN	2,00
1,12		TRAMITES DE LEGALIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE ENERGÍA ANTE EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ	UN	1,00
1,13		LEVANTAMIENTO DE PLANO AS-BUILT DISEÑO ELECTRICO,ILUMINACION Y MEMORIAS DE CALCULO, PARA BLOQUES 1,2,3	UN	1,00
1,14		CERTIFICACIÓN RETIE PARA INSTALACIÓN TRIFASICA DESDE CONEXIÓN CON OPERADOR DE RED, EQUIPO DE MEDIDA, CIRCUITO ALIMENTADOR HASTA TABLERO GENERAL	Un	1,00
BLOQUE 4				
2,1	2.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 1 1/2"	UND	1,00
2,2	2.10.20	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	ML	15,00
2,3	2.10.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP	UND	1,00
2,4	2.10.233	BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL FIJO DE 3X50 AMP.	UND	1,00
2,5	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	UND	1,00
2,6	2.10.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.6 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1 1/4")	ML	15,00
2,7		TRAMITES DE LEGALIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE ENERGÍA ANTE EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ	UN	1,00
2,8		LEVANTAMIENTO DE PLANO AS-BUILT DISEÑO ELECTRICO, ILUMINACION Y MEMORIAS DE CALCULO	UN	1,00

El contratista adelantó las actividades asignadas como obligaciones en el objeto contractual, las cuales se mencionan a continuación:

1. **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 2 +4 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)**

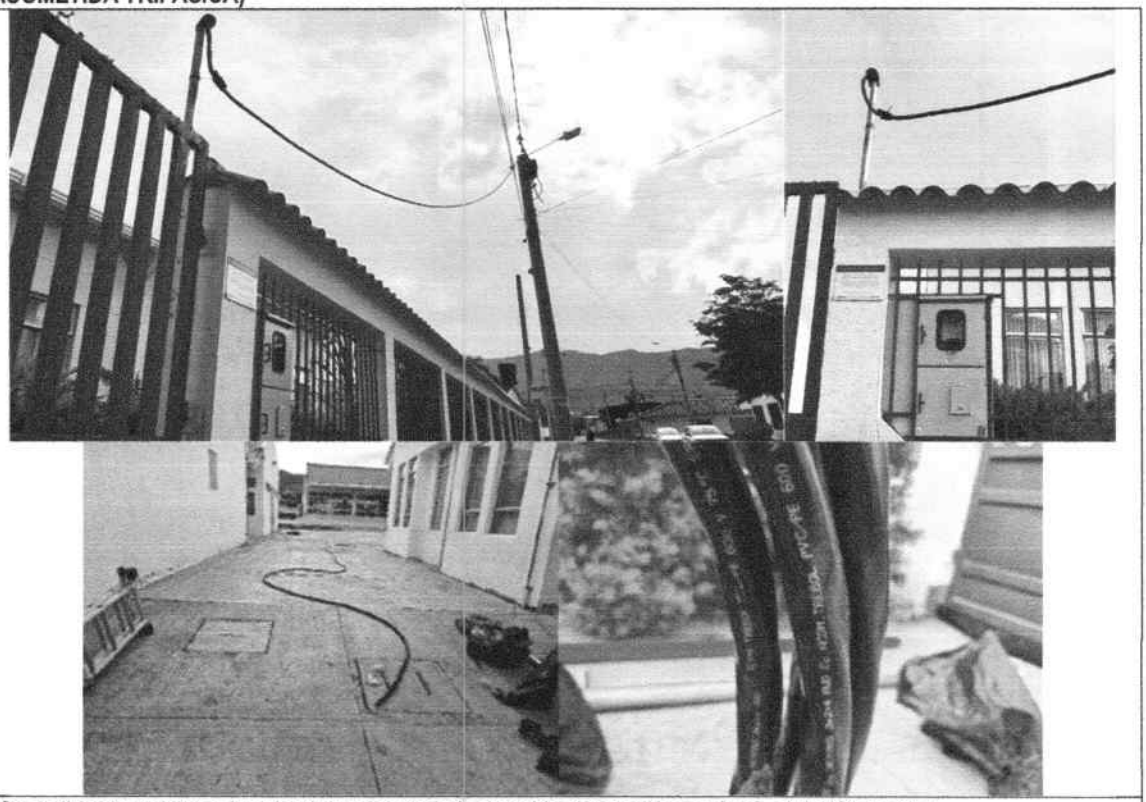

Se realiza el suministro, instalación y conexionado de cable concéntrico no. 3 x 2 +4 AWG en cobre.

2. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 2"**




Se realiza el suministro e instalación de elementos de acometida subterránea. conexión desde red trenzada de b.t., bajante en ducto IMC de 2"

3. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP**




Se verificó suministro e instalación de gabinete para equipo de medida trifásico empotrado. Incluye contador de energía electrónico trifásico 5 a 100 AMP

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).

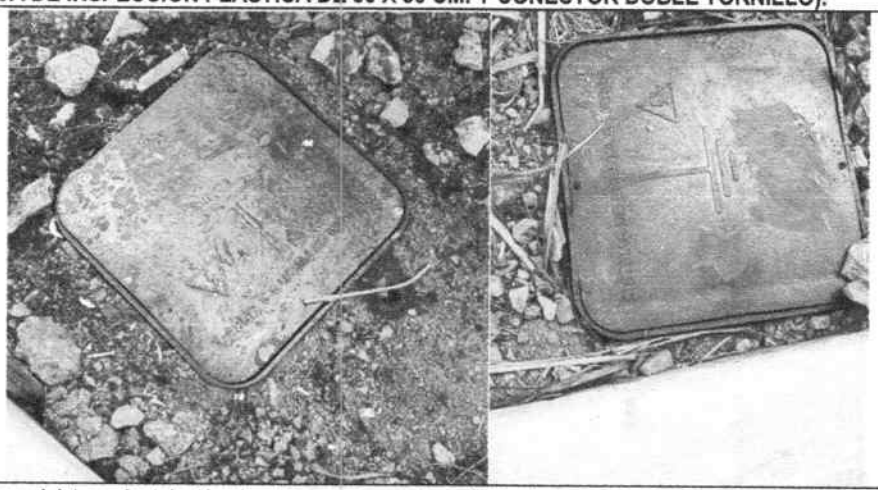

Se realiza el suministro e instalación de sistema de puesta a tierra de un electrodo de CU x 2.44 m. (incluye caja de inspección plástica de 30 x 30 cm. y conector doble tornillo).

5. BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL FIJO DE 3X100 AMP.

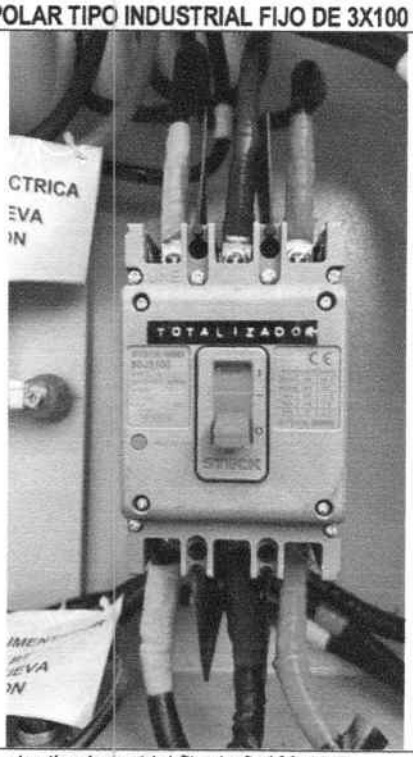

Se instaló breaker termomagnético tripolar tipo industrial fijo de 3x100 AMP.

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

6. **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 1/0 AWG EN COBRE**




Se realiza suministro, instalación y conexionado de cable No. 1/0 AWG en cobre

7. **SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 6 AWG EN COBRE**




Se verificó el suministro, instalación y conexionado de cable no. 6 AWG en cobre

8. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (F, N, T) (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4").**

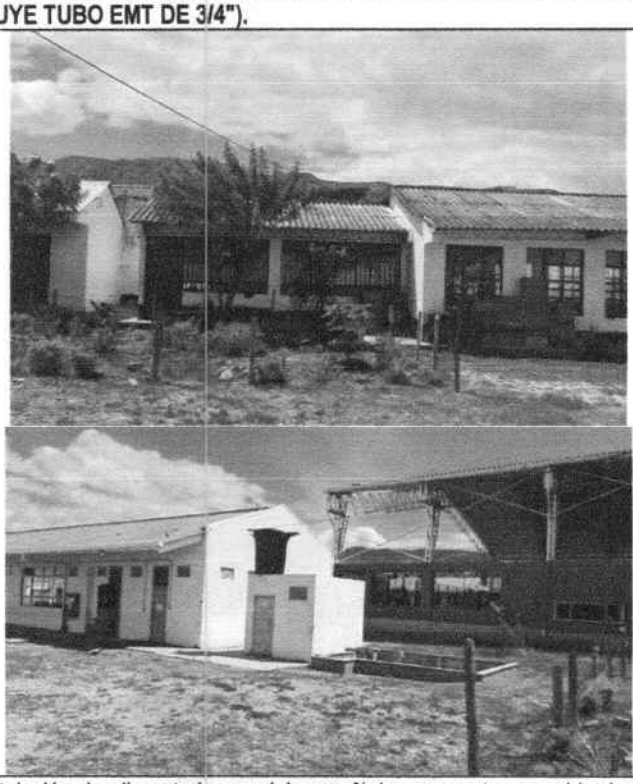


Se realizó suministro e instalación de alimentador parcial monofásico expuesto, en cable de cobre no.10 AWG (F, N, T) (incluye tubo EMT de 3/4").

9. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"**

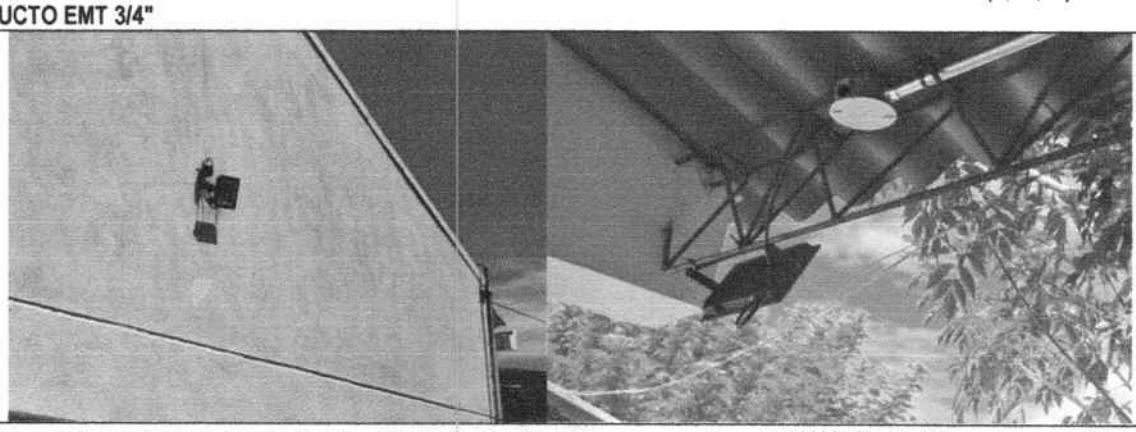


Se verificó suministro e instalación de salida de iluminación expuesta en calibre 12 AWG (F, N, T) en ducto emt 3/4"

10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W

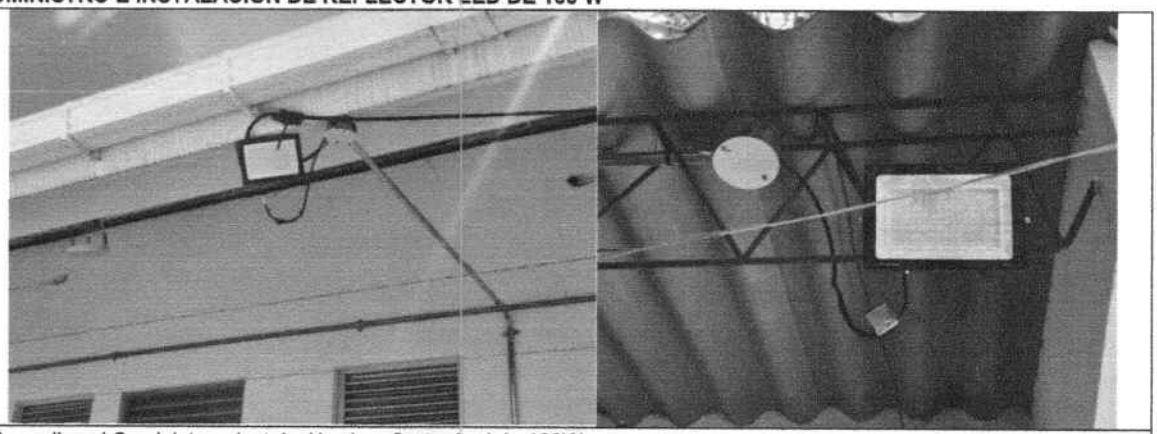

Se realiza el Suministro e instalación de reflector Led de 100W

11. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).

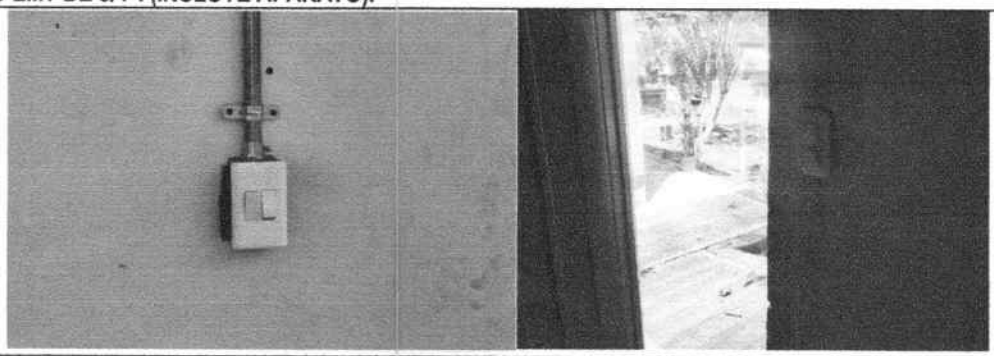

Se verificó el suministro e instalación de salida completa para interruptor sencillo, en calibre 12 AWG y ducto EMT de 3/4". (incluye aparato).

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

12. TRAMITES DE LEGALIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE ENERGÍA ANTE EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ



EBSA S.A.E.S.P.

EBSA Al contestar cite este número: ENT-TUN-0014206-2025

10-12-2025 09:46 PMDestino: 10000 DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE - Origen: MUNICIPIO

Tunja, Boyacá 10 de diciembre de 2025

Señores
Empresa de Energia de Boyacá S.A ESP
Ciudad

Asunto: SOLICITUD DE RECIBO TÉCNICO CONEXIONES COMPLEJAS (CUENTAS NUEVAS)

Tipo solicitud Solicitud de Recibo Técnico Conexiones Complejas (cuentas nuevas)

Número de cuenta 0

Detalles del caso: DOCUMENTOS MATRICULA TRIFASICA PARA BLOQUES 1, 2,3 COLEGIO NUEVA GENERACION


Peticionario
Tipo persona: Jurídica
Nombre: MUNICIPIO DE SACHICA
Documento: Nit 800019846
Pais: Colombia
Departamento: BOYACÁ
Municipio: SÁCHICA
Dirección: K 4 5 10
Teléfono o celular: 3232166031
Correo: comercial.omegaingenieria@gmail.com;
Autoriza envio de información a través de: Correo electrónico

Se adjuntan los siguientes archivos:
1. CONSOLIDADO MATRICULA BLOQUE 1,2,3.pdf
2. MEMORIAS DE CALCULO BLOQUES 1,2,3 COLEGIO NUEVA GENERACION SACHICA.pdf
3. DISEÑO ELECTRICO BLOQUES 1,2,3.- 4 COLEGIO NUEVA GENERACION-Presentación1.pdf

Atentamente, MUNICIPIO DE SACHICA
Nit. 800019846
K 4 5 10 SÁCHICA, BOYACÁ
COLOMBIA
Tel. 3232166031
Cel 3232166031
comercial.omegaingenieria@gmail.com

Se radicaron los documentos necesarios para los tramites de legalización para obtención de matrícula de energía ante empresa de energía de Boyacá

13. LEVANTAMIENTO DE PLANO AS-BUILT DISEÑO ELECTRICO, ILUMINACION Y MEMORIAS DE CALCULO, PARA BLOQUES 1,2,3

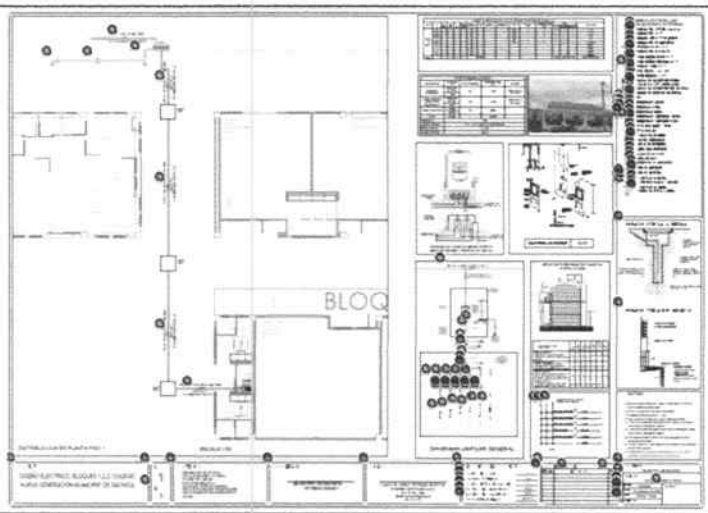

Se presenta levantamiento de plano as-built diseño eléctrico, iluminación y memorias de cálculo, para bloques 1,2,3

14. CERTIFICACIÓN RETIE PARA INSTALACIÓN TRIFASICA DESDE CONEXIÓN CON OPERADOR DE RED, EQUIPO DE MEDIDA, CIRCUITO ALIMENTADOR HASTA TABLERO GENERAL




Se presenta certificación RETIE para instalación trifásica desde conexión con operador de red, equipo de medida, circuito alimentador hasta tablero general.

15. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 1 1/2"




Se realiza suministro e instalación de elementos de acometida subterránea. conexión desde red trenzada de b.t., bajante en ducto imc de 1 1/2"

16. SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)

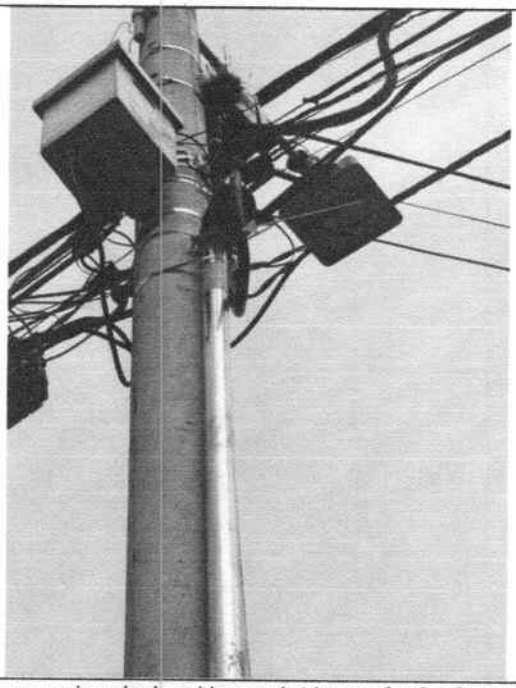

Se verifica suministro, instalación y conexionado de cable concéntrico no. 3 x 6 + 8 awg en cobre (acometida trifásica)

17. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP

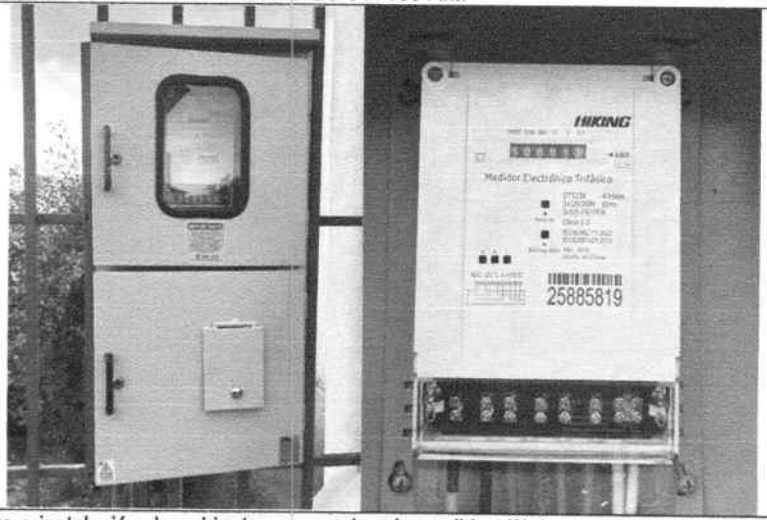


Se verificó suministro e instalación de gabinete para equipo de medida trifásico empotrado. incluye contador de energía electrónico trifásico 5 a 100 amp

18. **BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL FIJO DE 3X50 AMP.**




Se realiza instalación de breaker termomagnético tripolar tipo industrial fijo de 3x50 AMP.

19. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).**

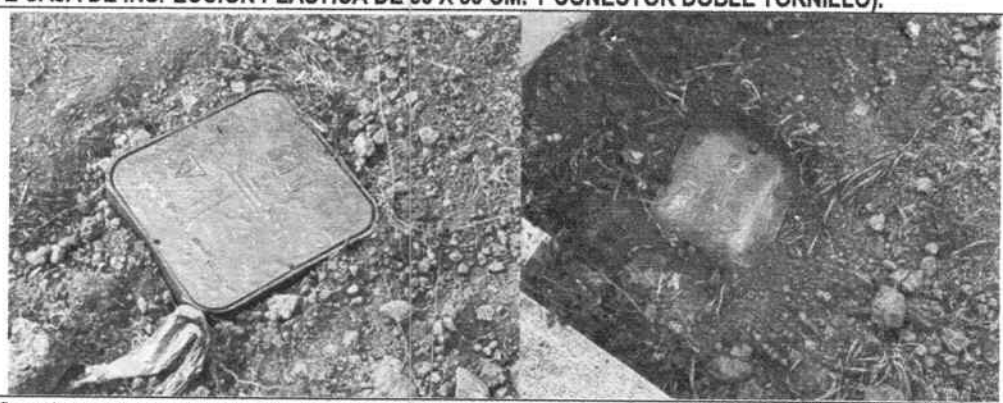

Se verifica el suministro e instalación de sistema de puesta a tierra de un electrodo de CU x 2.44 m. (incluye caja de inspección plástica de 30 x 30 cm. y conector doble tornillo).

20. **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.6 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1 1/4")**

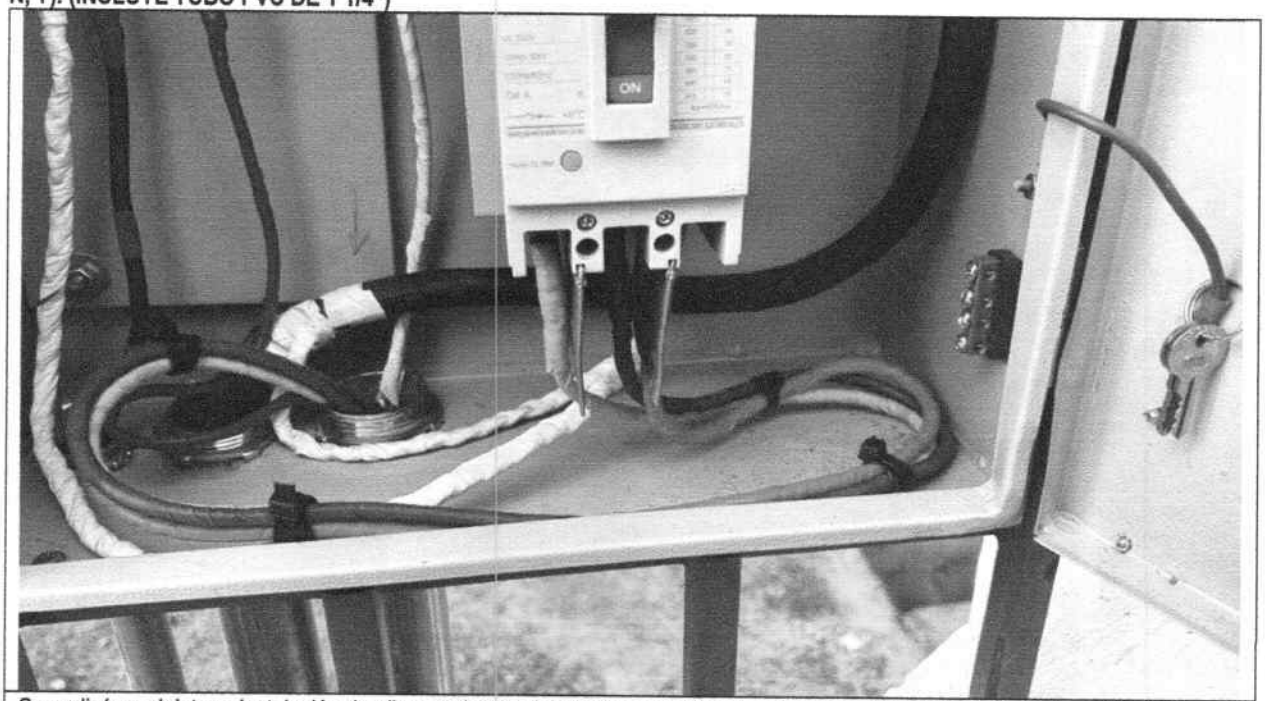

Se realizó suministro e instalación de alimentador parcial trifásico en cable de cobre no.6 AWG (3F, N, T). (incluye tubo PVC de 1 1/4")


21. **TRAMITES DE LEGALIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE ENERGÍA ANTE EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ**


EBSA

Se realizaron tramites de legalización para obtención de matrícula de energía ante empresa de energía de Boyacá

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Adriana Alejandra Torres Pérez	Apoyo de planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación y obras Publicas

22. LEVANTAMIENTO DE PLANO AS-BUILT DISEÑO ELECTRICO, ILUMINACION Y MEMORIAS DE CALCULO

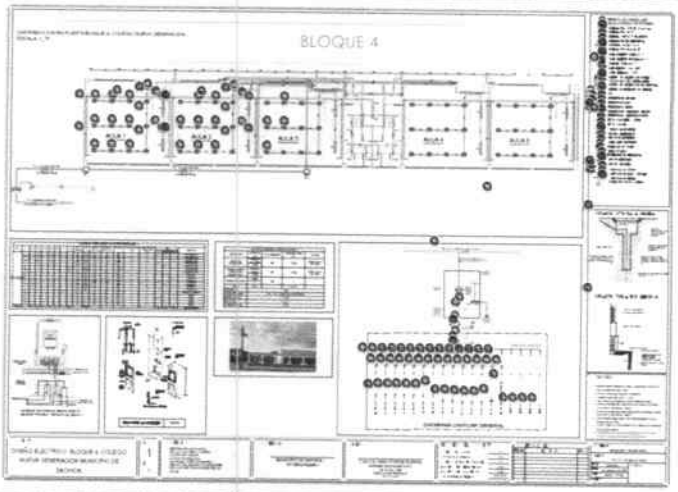

Se realizó el levantamiento de plano as-built diseño eléctrico, iluminación y memorias de calculo

4.1 RESUMEN DEL VALOR EJECUTADO – PERIODO 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025

A la fecha de corte del presente informe, se registra un valor ejecutado de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO SETECIENTOS (35.895.700,00), correspondiente a las cantidades e ítems desarrollados hasta el momento. Este valor representa un **100%** de avance respecto a las cantidades contractuales.

Tabla 5. Resumen de cantidades y valor ejecutado del contrato en la presente acta

ITEM	SUB ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
BLOQUE 1,2,3						
1,1	2.10.22	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 2 +4 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	ML	14,00	198.900,00	2.784.600,00
1,2	2.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 2"	UND	1,00	814.000,00	814.000,00

1,3	2.10.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP	UND	1,00	846.600,00	846.600,00
1,4	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	UND	2,00	775.400,00	1.550.800,00
1,5	2.10.236	BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL FIJO DE 3X100 AMP.	UND	1,00	349.000,00	349.000,00
1,6	2.10.27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 1/0 AWG EN COBRE	ML	108,00	57.400,00	6.199.200,00
1,7	2.10.24	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE No. 6 AWG EN COBRE	ML	27,00	14.100,00	380.700,00
1,8	2.10.63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EXPUESTO, EN CABLE DE COBRE No.10 AWG (F, N, T) (INCLUYE TUBO EMT DE 3/4").	ML	36,00	45.200,00	1.627.200,00
1,9	2.10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"	UN	4,00	195.100,00	780.400,00
1,10	2.10.192	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 100 W	UN	4,00	173.700,00	694.800,00
1,11	2.10.137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	UN	2,00	193.700,00	387.400,00
1,12		TRAMITES DE LEGALIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE ENERGÍA ANTE EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ	UN	1,00	1.625.000,00	1.625.000,00
1,13		LEVANTAMIENTO DE PLANO AS-BUILT DISEÑO ELECTRICO,ILUMINACION Y	UN	1,00	5.070.000,00	5.070.000,00

		MEMORIAS DE CALCULO, PARA BLOQUES 1,2,3				
1,14		CERTIFICACIÓN RETIE PARA INSTALACIÓN TRIFASICA DESDE CONEXIÓN CON OPERADOR DE RED, EQUIPO DE MEDIDA, CIRCUITO ALIMENTADOR HASTA TABLERO GENERAL	Un	1,00	3.055.000,00	3.055.000,00
					SUBTOTAL	**26.164.700,00**
BLOQUE 4						
2,1	2.10.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA. CONEXIÓN DESDE RED TRENZADA DE B.T., BAJANTE EN DUCTO IMC DE 1 1/2"	UND	1,00	430.000,00	430.000,00
2,2	2.10.20	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO No. 3 x 6 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA TRIFÁSICA)	ML	15,00	76.000,00	1.140.000,00
2,3	2.10.40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA EQUIPO DE MEDIDA TRIFÁSICO EMPOTRADO. INCLUYE CONTADOR DE ENERGÍA ELECTRONICO TRIFASICO 5 A 100 AMP	UND	1,00	846.000,00	846.000,00
2,4	2.10.233	BREAKER TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR TIPO INDUSTRIAL FIJO DE 3X50 AMP.	UND	1,00	305.000,00	305.000,00
2,5	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	UND	1,00	775.000,00	775.000,00
2,6	2.10.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.6 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1 1/4")	ML	15,00	82.000,00	1.230.000,00
2,7		TRAMITES DE LEGALIZACIÓN PARA OBTENCIÓN DE MATRÍCULA DE ENERGÍA ANTE	UN	1,00	1.625.000	1.625.000,00

		EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ				
2,8		LEVANTAMIENTO DE PLANO AS-BUILT DISEÑO ELECTRICO, ILUMINACION Y MEMORIAS DE CALCULO	UN	1,00	3.380.000	3.380.000,00
					SUBTOTAL	**9.731.000,00**
VALOR TOTAL DE LA OBRA						**35.895.700,00**

5. BALANCE FINANCIERO

Tabla 12. Balance financiero.

VALOR DEL CONTRATO	$ 35.895.700,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 35.895.700,00
SALDO POR EJECUTAR	$0.00
SALDO A PAGAR ACTA FINAL:	**$ 35.895.700,00**

VALOR TOTAL A CANCELAR PRESENTE ACTA: **TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO SETECIENTOS (35.895.700,00)**

6. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

En el periodo de ejecución comprendido entre el PERIODO DE 20 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2025, el municipio recibió a satisfacción las actividades adelantadas por el contratista en desarrollo del objeto contractual, correspondientes al Contrato de Mínima Cuantía No. **MS-MC-059-2025**.

7. PROCEDE PAGO

Una vez revisados los términos del contrato y verificado que todas las condiciones han sido cumplidas adecuadamente por OMEGA GROUP COMPANY S.A.S con representante legal CARLOS YESID TORRES BUSTOS con C.C. 1.049.607.946 expedida en Tunja, procede realizar el pago correspondiente conforme a lo acordado.

Tabla 6. Aprobación pagos.

SI	NO
X	

8. OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

- Las actividades de construcción, mejoramiento y legalización ante el operador de red, del sistema eléctrico de la Institución Educativa Nueva Generación Sede Primaria del Municipio de Sáchica, se desarrollaron de manera satisfactoria, cumpliendo con los procedimientos técnicos establecidos. Se garantizó la correcta instalación de los elementos contratados, el cumplimiento de las especificaciones del proyecto y la adecuada ejecución de los trabajos.
- La ejecución de la obra se llevó a cabo en óptimas condiciones, sin presentarse inconvenientes técnicos o logísticos que afectaran su desarrollo, las actividades culminaron en el tiempo estipulado contractualmente, garantizando la calidad y funcionalidad de los trabajos ejecutados.
- La ejecución de la obra presenta un 100% de avance físico y financiero, evidenciando el cumplimiento total de las actividades programadas. Este resultado refleja una adecuada gestión del contratista y el cumplimiento de los lineamientos técnicos, administrativos y de calidad exigidos en el contrato, garantizando así la correcta finalización de los trabajos ejecutados.

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO
