FECHA (D/M/A): Septiembre 18 /2025		BITACORA DE OBRA
1. DATOS GENERALES		
TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Bachas.	
RANGO: 0	CANTIDAD: 4.87	
ZONA: 5	FRENTE DE TRABAJO: 2	Alcaldía de Medellín — Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
COMUNA: 14		REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA
BARRIO: Villa Carlota		

2. DATOS DEL CONTRATO	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	**CONTRATO No.** 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	**CONTRATO No.** 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		**JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:**
INICIO:	7:00Am	Lluvias durante la jornada, y se hacen mitigaciones en otro punto.
TERMINACIÓN:	6:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:		
	MAÑANA	Con lluvias
	TARDE	Con lluvias

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se ubican las áreas donde se va a intervenir
- Se realiza la instalación de la señalización según PMT.
- Demarcación, demolición y retiro del pavimento existente
- Compactación de la base granular, para observar su estado
- Se imprima las áreas con emulsión asfáltica. en frío
- Aplicación y compactación de la mezcla asfáltica MDC-19 con EAP TIBIA, proveniente de la planta.
- Se recoge el material sobrante en la volqueta (Escombro)
- Limpieza y aseo del área de trabajo.

Observaciones: En la intervención #1 se realiza una nivelación y se realza una válvula.

- Se presentan lluvias durante la jornada, esto retrazo las activida. del día.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE:	Henry Lopera
	Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA / Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE:
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 18/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vara.	X	—	Vialmaid
2	Encargado	—	—	—	—
3	Liguero	Laivar Enrique Padilla.	X	—	EYP
4	Rastrillero	Javier Mondal Soto.	X	—	EYP
5	Rastrillero	—	—	—	—
6	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	EYP
7	Ayudante	Cristian Alejandro Jimenez.	X	—	EYP
8	Ayudante	Alvaro Antonio Mora.	X	—	EYP
9	Ayudante	Jaime Ernay Carmona	X	—	EYP
10	Ayudante	Luis Felipe Arboleda	X	—	EYP
11	Ayudante	Hugo Rios.	X	—	EYP
12	Ayudante		—	—	
13	Ayudante		—	—	
14	Ayudante		—	—	
15	Ayudante		—	—	
16	Operador Rodillo manual	Alvaro Antonio Mora.	X	—	EYP
17	Operador compresor	Misael Ortega.	X	—	J y H
18	Operador fresadora		—	—	
19	Operador finisher		—	—	
20	Operador Retroexcavadora		—	—	
21	Operador Vibrocompactador		—	—	
22	Operador Compactador llantas		—	—	
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	
24	Operador Equipo Imprimación	Laivar Enrique Padilla	X	—	EYP
25	Operador Mini cargador		—	—	
26	Operador Barredora		—	—	
27	Coductor Carrotanque		—	—	
28	Conductor Camión	William Colorado	X	—	Josa. Alomid
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo Arango	X	—	EYP
30	Controladora Vial.	Ana Yordanis Aguirre.	X	—	EYP
			—	—	
			—	—	
			—	—	
			—	—	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingersoll Rand.	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación	Mormita	X	—	
10	Placa vibratoria	Honda EC 30	X	—	
11	Soplador		—	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		X	—	
15	Camión	Isuzu 52P 329	X	—	
16	Volqueta(s)	Internacional SIMV 676	X	—	
17	Barco Movil.	5Y6	X	—	
		—	—	—	
		—	—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 18 / 2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5019549	149589	1	CL 18 CR 44	5.60	4.00	0.05	22.40	1.12	2.69
5019539	161356	2	CR 44 CL 18 - 24	3.25	0.82	0.11	2.67	0.29	0.70
2000017	150599	3	CR 48 CL 19A - 18	1.66	1.80	0.13	2.99	0.39	0.93
2000016	159784	4	CR 48 CL 19A - 40	784	0.82.	0.13	1.51	0.20	0.47
2000767	161364	5	CL 44 CR 52 - 336	0.60	0.60	0.05	0.36	0.02	0.04
2000767	161358	6	CL 44 CR 52 - 320	0.90	0.40	0.05	0.36	0.02	0.04
TOTALES							30.29	2.04	4.87

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234043	SMV 676	4.87	—	141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23765	SMV 676	Sencilla	1	Principal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Septiembre 18/2025

10. ESQUEMAS

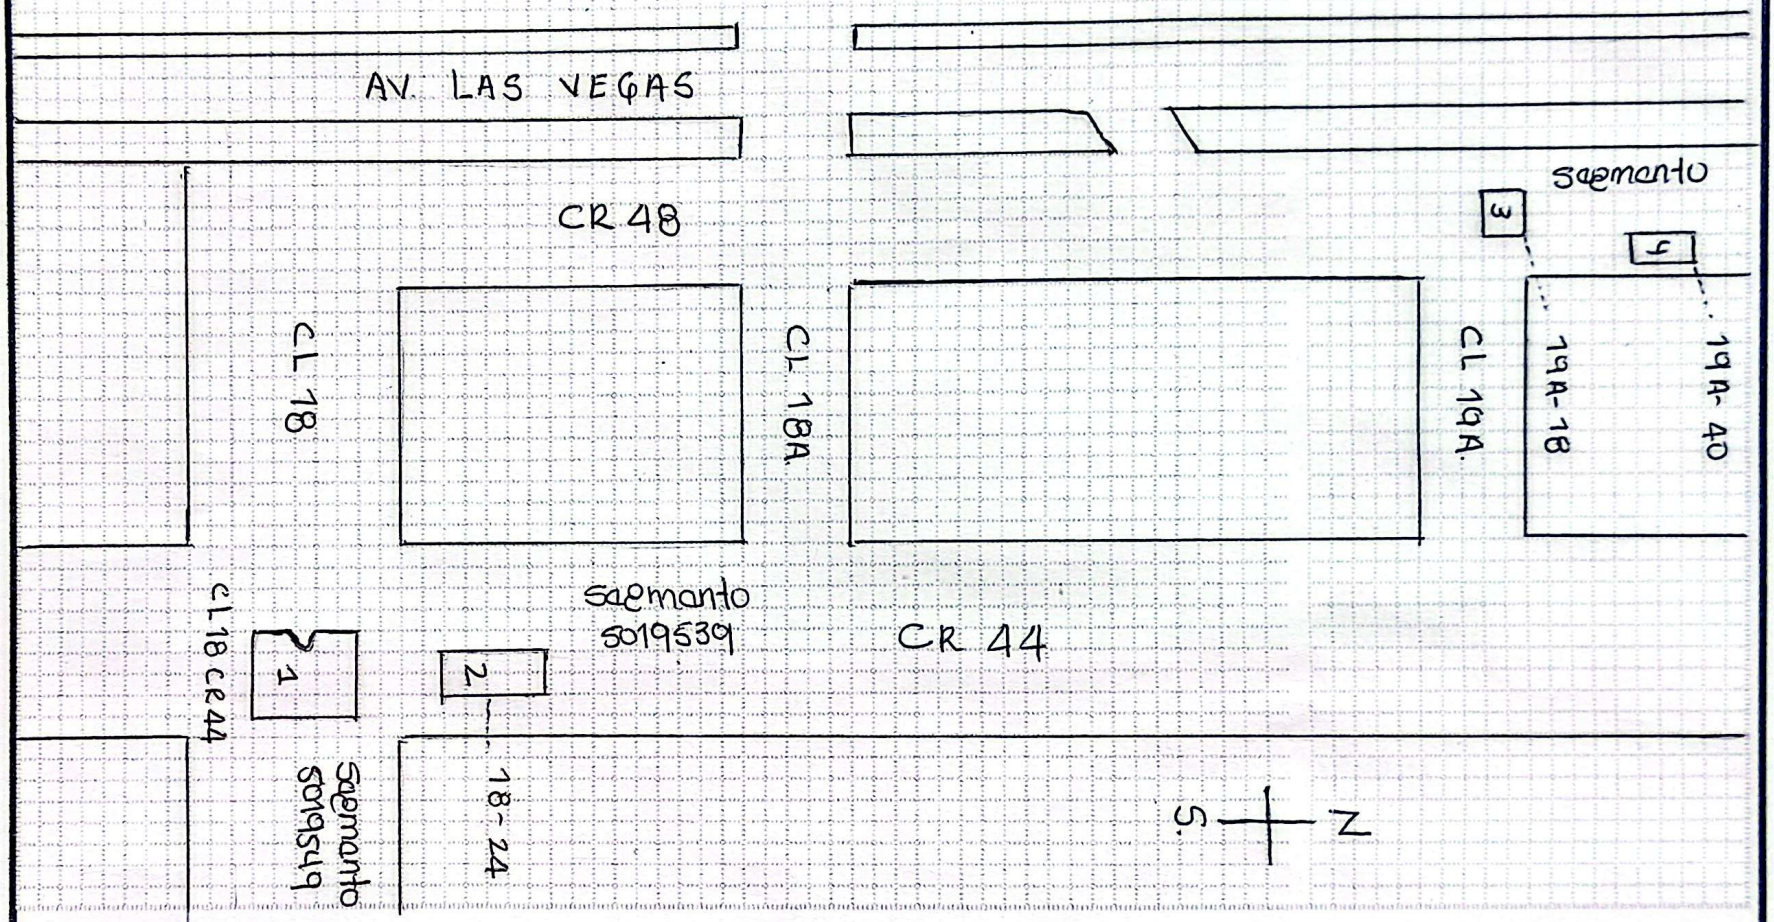

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	0	CANTIDAD:	4-87
BARRIO	Villa Carlota	DIRECCIÓN	CL 18 CR 44

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 234043

FECHA: 18/09/2025

HORA: 8:28:06 AM

CONDUCTOR: MATEO ARANGO

PLACA: SMV676

OBRA: 2302

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.32 Tonnes

PESO TARA: 7.45 Tonnes

PESO NETO: 4.87 Tonnes

PRODUCTO:11

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.87 Tonnes

Henry Lopera
Interventoria

Henry Lopera
Interventoria

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900243227-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23765**

PROCOPAL S.A.
19 SEP 2025
DESPACHOS - BASCULA

PROVEEDOR: SUM 2058

VALE POR UN VIAJE: Escombro

PLACA No: SMV676 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
