FECHA (D/M/A): Septiembre 19 / 2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Baches
RANGO: O	CANTIDAD: 4-81 Ton
ZONA: 6	FRENTE DE TRABAJO: 2
COMUNA: 16	
BARRIO: La Palma	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES: INICIO : 7:00Am TERMINACIÓN: 4:30 Pm	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: Se realizan 2 direcciones en zonas distintas.

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se ubican los puntos que van hacer intervenidos
- Instalación de la señalización segun PMT.
- Demarcación, demolición y retiro del pavimento existente
- Compactación de la base granular, para observar su estado.
- Imprimación con emulsión asfaltica en frio.
- Aplicación y compactación de la mezcla asfaltica MDC 19 con RAP TIBIA, proveniente de la planta Procopal.
- Recogida de los escombros en la volqueta
- Limpieza y aseo del area de trabajo
- Retiro ola la señalización PMT.

Observación: Se realizo bache mediatico en CR 27 CL 20 sur-181 San Lucas.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Henry Lopera. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 19 /2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vara	X	—	Vialmad
2	Encargado	—	X	—	—
3	Liguero	Lavar Enrique Padilla	X	—	EYP
4	Rastrillero	Javier Manual Soto	X	—	EYP
5	Rastrillero	—	—	—	—
6	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	EYP
7	Ayudante	Cristian Alejandro Jimenez	X	—	EYP
8	Ayudante	Alvaro Antonio Mora	X	—	EYP
9	Ayudante	Jaime Ernay Carmona	X	—	EYP
10	Ayudante	Luis Falipe Arbolada	X	—	EYP
11	Ayudante	Hugo Rios.	X	—	EYP
12	Ayudante		—	—	
13	Ayudante		—	—	
14	Ayudante		—	—	
15	Ayudante		—	—	
16	Operador Rodillo manual	Alvaro Antonio Mora	X	—	EYP
17	Operador compresor	Misael Olaya	X	—	J y H
18	Operador fresadora		—	—	
19	Operador finisher		—	—	
20	Operador Retroexcavadora		—	—	
21	Operador Vibrocompactador		—	—	
22	Operador Compactador llantas		—	—	
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	
24	Operador Equipo Imprimación	Lavar Enrique Padilla	X	—	EYP
25	Operador Mini cargador		—	—	
26	Operador Barredora		—	—	
27	Coductor Carrotanque		—	—	
28	Conductor Camión	William Colorado	X	—	Josa Hamid
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo Arango	X	—	EYP
30	Controladora Vial	Ana Yardanis Aguirre	X	—	EYP
			—	—	
			—	—	
			—	—	
			—	—	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecorodd EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingersoll Rand	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación	Marmita	X	—	
10	Placa vibratoria	Honola FC 30	X	—	
11	Soplador		—	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		—	—	
15	Camión	Isuzu SZP 329	X	—	
16	Volqueta(s)	Internacional SMV 676	X	—	
17	Baño Movil	S y E	X	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 19/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4003121	161429	1	CR 80 CL 25	3.60	3.65	0.77	73.74	7.45	3.47
4001590	161431	2	CR 27 CL 20SUR-181-10m	1.30	0.65	0.10	0.85	0.08	0.20
4001590	161255	3	CR 27 CL 20SUR-181	1.85	1.71	0.15	3.16	0.47	1.14
TOTALES							77.15	2.00	4.81

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234062	SMV 676	4.81	—	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
	SMV 676	Sencillo	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A):

10. ESQUEMAS

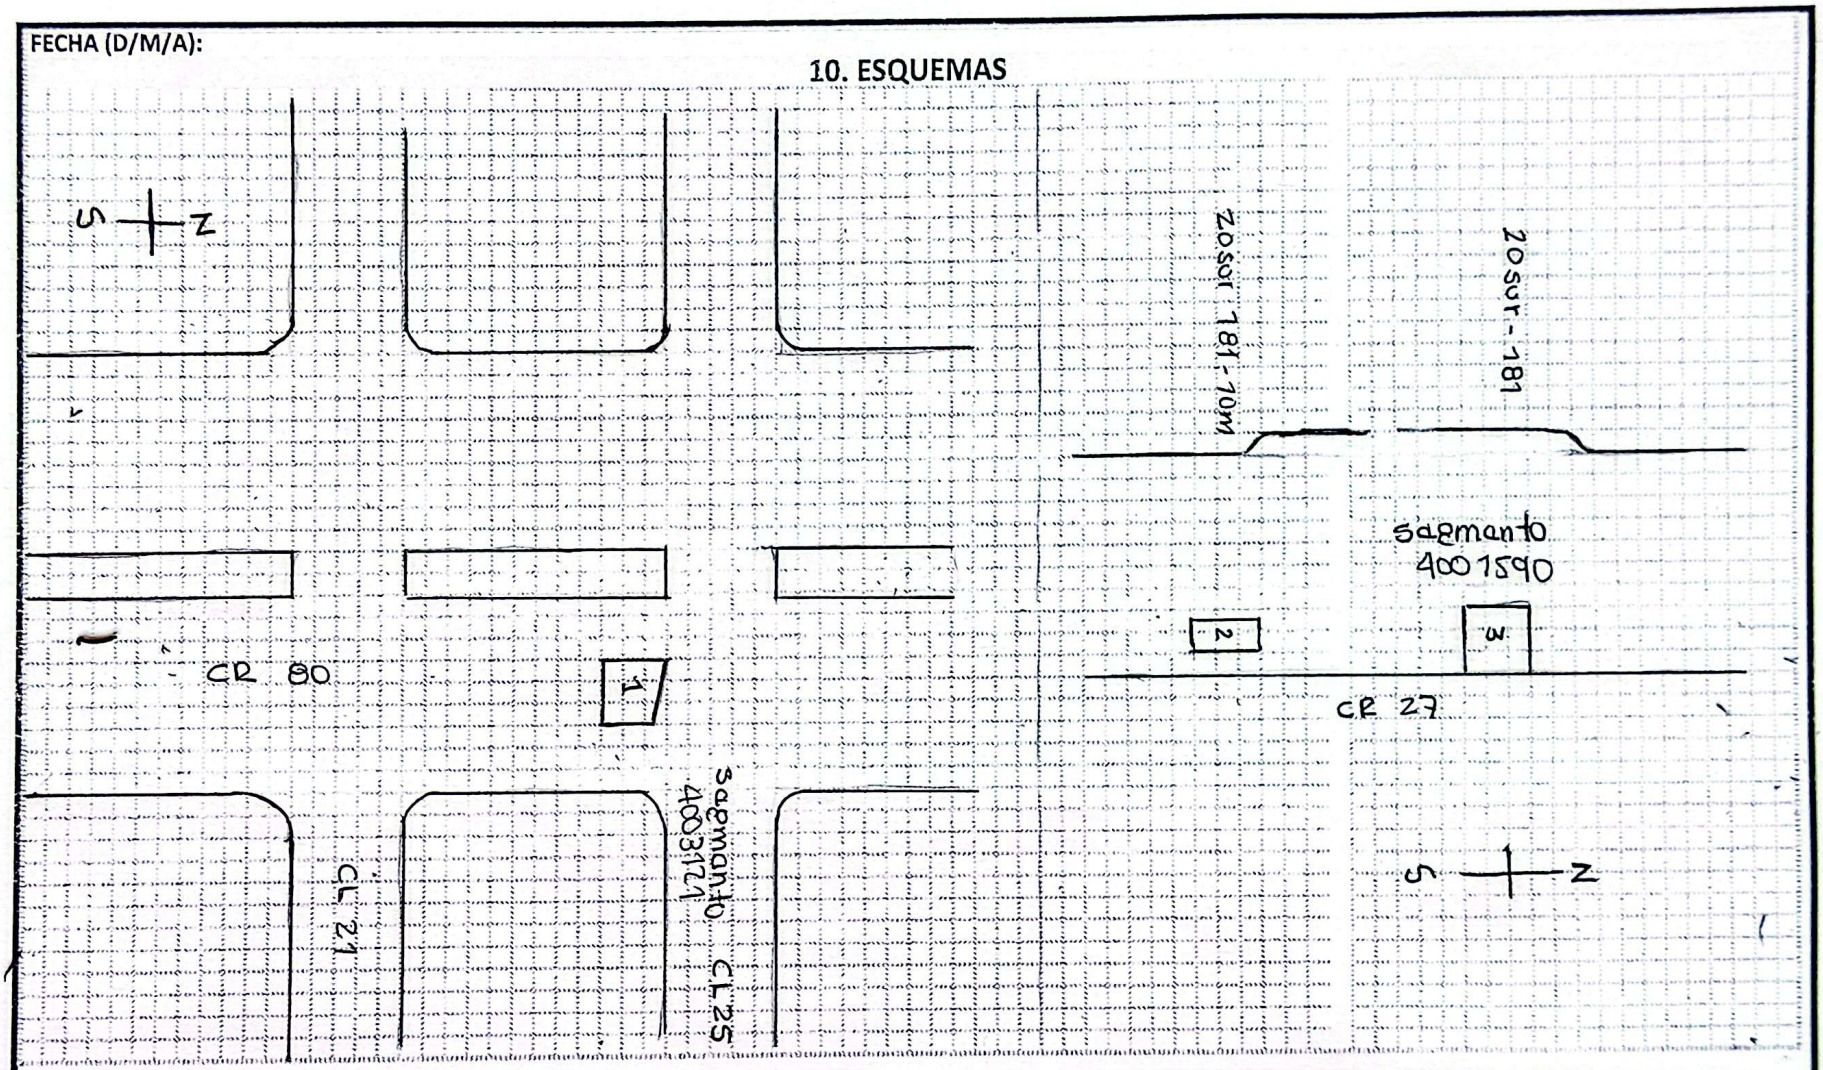

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.81 TDn
BARRIO	La Palma	DIRECCIÓN	CR 80 CL 25

Powered by CamScanner

ESTRUCTURAS

PROCOPAL S.A.
Ingenieros

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 234062

FECHA: 19/09/2025

HORA: 8:15:28 AM

CONDUCTOR: MATEO ARANGO

PLACA: SMV676

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 12.32 Tonnes

PESO TARA: 7.51 Tonnes

PESO NETO: 4.81 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 2

TOTAL DESPACHADA: 15.84 Tonnes

Henry Lopera
Interventoria

Henry Lopera
Interventoria

Estructuras y Pavimentos SAS

PROCOPAL S.A.
ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

22 SEP 2025

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS NO. 22594

DESPACHOS - BASCULA

PROVEEDOR: Sum 2058

19-09-2025

VALE POR UN VIAJE: Escombro

PLACA No: SMV 676 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Jaime A. Vela
Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
