FECHA (D/M/A): Septiembre 23/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Baches
RANGO: 0	CANTIDAD: 4.03
ZONA	4
COMUNA	11
BARRIO	El Velodromo
FRENTE DE TRABAJO:	2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 Am	—
TERMINACIÓN: 5:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleada.

TARDE: Soleado

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Ubicación de los baches que van hacer intervenidos
- Instalación de la señalización según PMT.
- Demarcación, demolición y retiro del pavimento existente
- Compactación de la base granular, para observar su estado
- Se imprime las areas con emulsion asfáltico en frio.
- Aplicación y compactación de la mezcla asfaltica MDC-19 con RAP TIBIA, proveniente de la planta PROCOPAL.
- Se recoge el material sobrante en la volqueta (Escombro)
- Limpieza y aseo del area de trabajo.
- Retiro de la señalización PMT

Observaciones: Se realizaron 6 mitigaciones sobre la cl 70 a la altura del C.C. VISCAYA y 1 en la cl 72 sur cr 49 sobre el puente de la aguacatala.

5. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Harry Lopera. Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 23 /2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	X	—	Vialmaol
2	Encargado	—	—	—	—
3	Liguero	Laivar Enrique Padilla	X	—	E Y P
4	Rastrillero	Javiar Manuel Soto	X	—	E Y P
5	Rastrillero	—	—	—	—
6	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	E Y P
7	Ayudante	Cristian Alejandro Jimenez	X	—	E Y P
8	Ayudante	Alvairo Antonio Mora.	X	—	E Y P
9	Ayudante	Jaime Ernay Carmona	X	—	E Y P
10	Ayudante	Luis Felipe Arboleda.	X	—	E Y P
11	Ayudante	Hugo Rios	X	—	E Y P
12	Ayudante		—	—	
13	Ayudante		—	—	
14	Ayudante		—	—	
15	Ayudante		—	—	
16	Operador Rodillo manual	Alvairo Antonio Mora	X	—	E Y P
17	Operador compresor	Misael Ortega	X	—	J y H
18	Operador fresadora		—	—	
19	Operador finisher		—	—	
20	Operador Retroexcavadora		—	—	
21	Operador Vibrocompactador		—	—	
22	Operador Compactador llantas		—	—	
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	
24	Operador Equipo Imprimación	Laivar Enrique Padilla	X	—	E Y P
25	Operador Mini cargador		—	—	
26	Operador Barredora		—	—	
27	Coductor Carrotanque		—	—	
28	Conductor Camión	Willian Colorado	X	—	Josa Hamid
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo Arango	X	—	E Y P
30	Controladora Vial	Ana Yardenis Aguirre	X	—	E Y P
—	—		—	—	
—	—		—	—	
—	—		—	—	
—	—		—	—	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingersoll Rand.	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación	Marmita	X	—	
10	Placa vibratoria	Honda FC 30	X	—	
11	Soplador		—	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		—	—	
15	Camión	Isuzu SZP 329	X	—	
16	Volqueta(s)	Internacional SMV 676	X	—	
17	Baño Movil	S y E	X	—	
—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 23/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
2000103	157813	1	CR 80 CL 4566-74	2.85	1.85	0.13	5.27	0.69	1.65
2000103	161581	2	CR 80 CL 4566 -94	1.40	1.00	0.13	1.40	0.18	0.44
4002853	161582	3	CR 80 CL 4566-136	6.65	0.61	0.13	406	0.53	1.27
5004064	161608	4	CR 80 CL 46 -74	1.10	2.68	0.13	2.95	038	0.92
4001475	161609	5	CL 10 CR 32 - 90	0.70	0.50	0.05	0.35	002	0.04
4001475	161610	6	CL 10 CR 32 - 78	0.70	0.55	0.05	0.39	0.02	0.05
4001475	161612	7	CL 10 CR 32-67	0.70	0.50	0.05	0.35	0.02	0.04
4001475	161613	8	CL 10 CR 30A-344	1.60	070	0.04	1.12	0.04	0.11
4001475	161614	9	CL 10 CR 30A-337	3.10	0.80	0.03	2.48	0.07	0.18
4001475	161615	10	CL 10 CR 30A-331	1.50	0.50	0.04	0.75	003	0.07
4003468	161616	11	CL 12 Sur CR 49-28	1.10	0.40	0.06	0.44	0.03	0.06
TOTALES							19.56	2.01	4.83

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234723	SMV 676	4.83	—	140


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23767	SMV 676	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Septiembre 23 /2025

10. ESQUEMAS

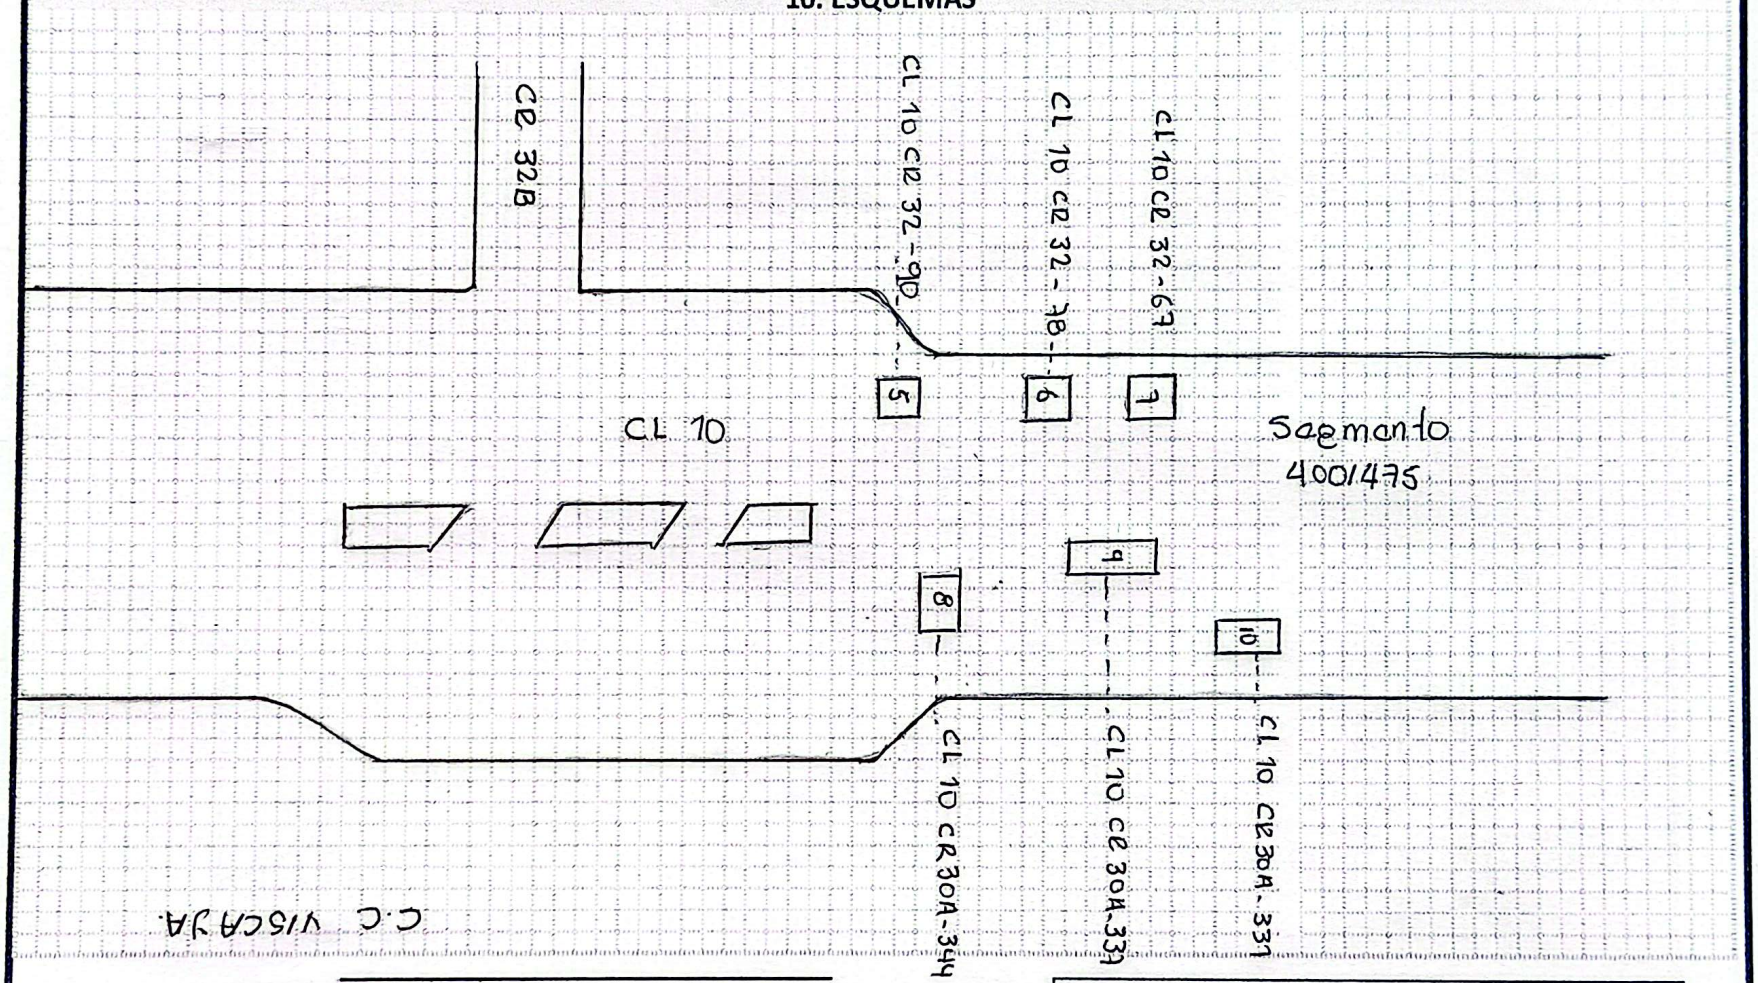


TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.83 Ton.
BARRIO	Las Lomas Nº 1	DIRECCIÓN	Cl 10 CR 32B Y 30A

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 23 /2025

10. ESQUEMAS

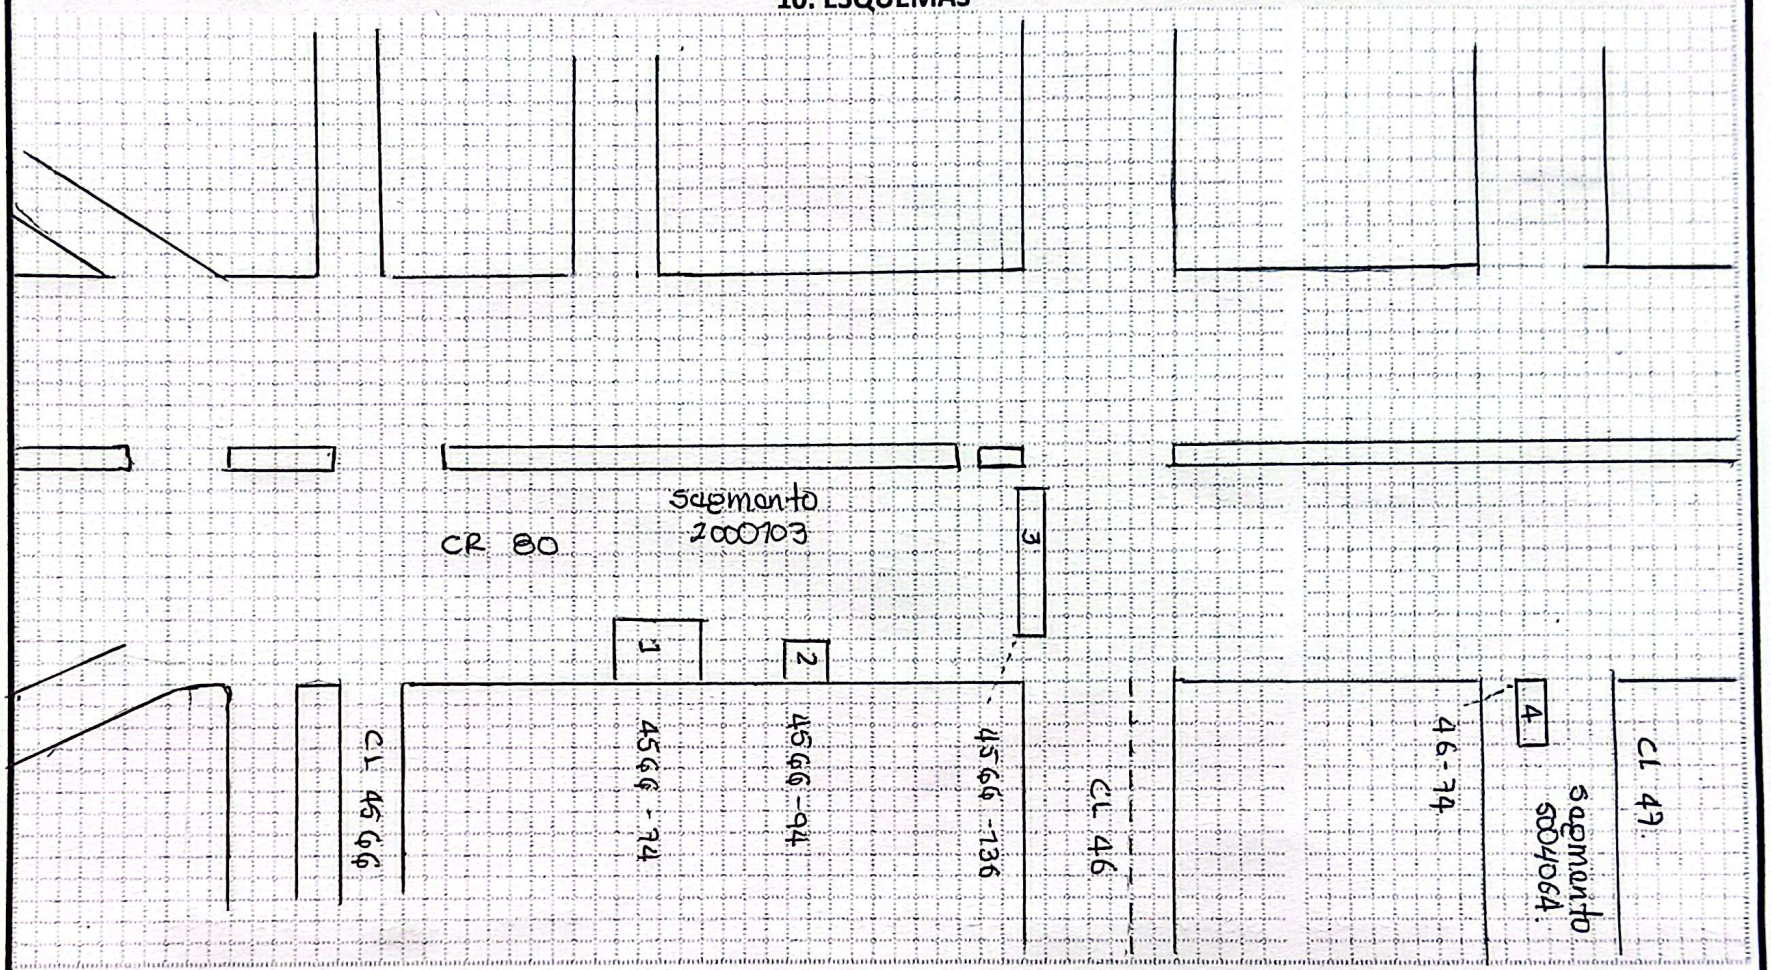

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.83
BARRIO	El Valodromo	DIRECCIÓN	CR 80 CL 46

Powered by CamScanner

EST Y PAVS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Cont...

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 234123

FECHA: 23/09/2025

HORA: 8:56:55 AM

CONDUCTOR: MATEO ARANGO

PLACA: SHV676

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906398

PESO BRUTO: 12.30 Tonnes

PESO TARA: 7.47 Tonnes

PESO NETO: 4.83 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°c

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.83 Tonnes

Henry Lopara
Interventoria

Henry Lopara
Interventoria

Estructuras y Pavimentos SAS

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23767**

PROVEEDOR: SUM 7058

VALE POR UN VIAJE: Escombros

23/9/25

PLACA No.: [illegible] CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: Parcial

24 SEP 2025

RECIBIDO POR:

DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

L S.A.

Powered by CamScanner
