FECHA (D/M/A): Septiembre 26/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD): Baches

RANGO: 0

CANTIDAD: 4.83 Ton

ZONA: 6

COMUNA: 16

BARRIO: La Palma) San Bernardo

FRENTE DE TRABAJO: 2

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025 — CONTRATO No. 4600105052 DE 2025

INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377 — CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:
INICIO: 7:00 Am
TERMINACIÓN: 3:30 Pm

JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS: —

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:

MAÑANA: Soleado

TARDE: Con lluvias

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se identifican los baches que se van a intervenir
- Se hace instalación de la señalización segun PMT.
- Demolición y retiro del pavimento existente.
- Compactación de la base granular, para observar su estado.
- Se aplica emulsión asfaltica en frio sobre las areas.
- Aplicación y compactación de la mezcla asfaltica MDC 19 con RAP TIBIA, proveniente de la planta.
- Se recoge el material sobrante en la volqueta (escombro)
- Limpieza y aseo del area donde se realizo la jornada
- Retiro de la señalización PMT.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Henry Lopera Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Sept. 26 / 2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vera	X	—	Vialmad.
2	Encargado	—	—	—	—
3	Liguero	Laivar Enrique Padilla	X	—	E Y P
4	Rastrillero	Javier Manuel soto	X	—	E Y P.
5	Rastrillero	—	—	—	—
6	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	E Y P
7	Ayudante	Cristian Alejandro Jimenez.	X	—	E Y P
8	Ayudante	Alvaro Antonio Mora	X	—	E Y P
9	Ayudante	Jaime Ernay Carmona	X	—	E Y P
10	Ayudante	Luis Falipe Arbolada	X	—	E Y P
11	Ayudante	Hugo Rios	X	—	E Y P.
12	Ayudante		—	—	
13	Ayudante		—	—	
14	Ayudante		—	—	
15	Ayudante		—	—	
16	Operador Rodillo manual	Alvaro Antonio Mora	X	—	E Y P
17	Operador compresor	Misael Ortega	X	—	J Y H.
18	Operador fresadora		—	—	
19	Operador finisher		—	—	
20	Operador Retroexcavadora		—	—	
21	Operador Vibrocompactador		—	—	
22	Operador Compactador llantas		—	—	
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	
24	Operador Equipo Imprimación	Laivar Enrique Padilla	—	—	E Y P
25	Operador Mini cargador		—	—	
26	Operador Barredora		—	—	
27	Coductor Carrotanque		—	—	
28	Conductor Camión	William Colorado	X	—	Josa Hamid
29	Conductor Volqueta(s)	Mateo Arango	X	—	E Y P
30	Controladora vial	Ana Yordanis Aguirre	X	—	E Y P
			—	—	
			—	—	
			—	—	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingersoll Rand.	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación	Marmita	X	—	
10	Placa vibratoria	Honda FC 30	X	—	
11	Soplador		—	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		—	—	
15	Camión	Isuzu SZP 329	X	—	
16	Volqueta(s)	Internacional SMV 676	X	—	
17	Baño Movil	S Y E	X	—	
-	—	—	—	—	
-	—	—	—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Septiembre 26 /2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
4003095	161806	1	CR 80 CL 25	1.80	3.00	0.04	5.40	0.22	0.52
4003095	161805	2	CR 80 CL 25 frente	0.70	7.90	0.11	5.53	0.61	1.46
2000723	161807	3A	CR 80 CL 20A - 779	0.85	1.00	0.11	0.85	0.09	0.22
2000723	161807	3B	CR 80 CL 20A - 779	6.50	0.75	0.11	4.88	0.54	1.29
2000723	161809	4	CR 80 CL 20A - 99	3.60	0.54	0.12	1.94	0.23	0.56
2000723	161810	5	CR 80 CL 20A - 87	5.30	0.51	0.12	2.70	0.32	0.78
TOTALES							21.30	2.01	4.83 ✓

MEZCLA ASFALTICA

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234219	SMV 676	4.83 ✓	—	141


BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23770	SMV 676	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Septiembre 26/2025

10. ESQUEMAS

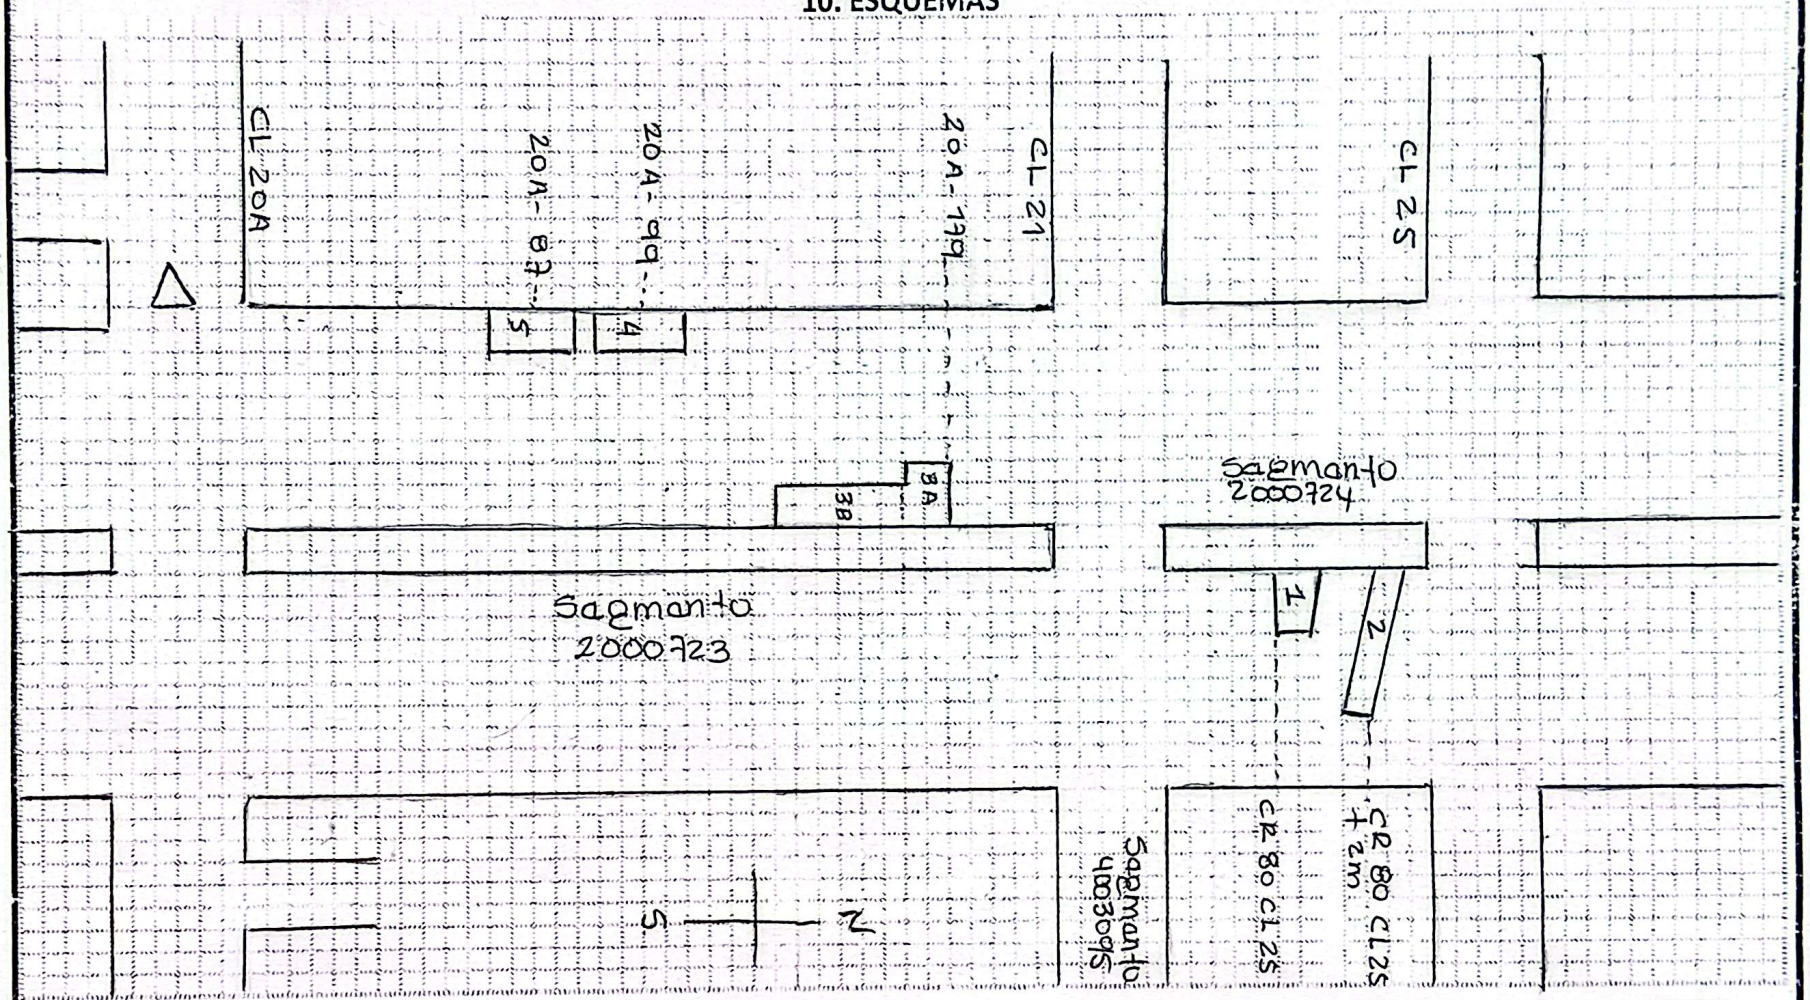

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.83 Ton
BARRIO	San Bernardo	DIRECCIÓN	CR 80 CL 25

Powered by CamScanner

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

PROCOPAL S.A.
Ingeniero

TIQUETE DE BASCULA: 234219

FECHA: 26/09/2025

HORA: 8:00:21 AM

CONDUCTOR: MATEO ARANGO

PLACA: SRV676

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890906388

PESO BRUTO: 12.32 Tonnes

PESO TARA: 7.49 Tonnes

PESO NETO: 4.83 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 141°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.83 Tonnes

Hanry Lopara
Interventoria

Hanry Lopara
Interventoria

Estructuras y Pavimentos S.A.S

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23770

PROVEEDOR: SCM 2058

VALE POR UN VIAJE: Escombros

26/9/25

PLACA No: SMV 676 CAPACIDAD: 5 M3

DESTINO: Porcal

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

PROCOPAL S.A. 890.906.388-0

Firma Autorizada

Calle 10 Sur Nº 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/Colombia

Powered by CamScanner
