FECHA (D/M/A): Septiembre 29/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Baches
RANGO: 0	CANTIDAD: 4.82 Ton ✓
ZONA: 4	FRENTE DE TRABAJO: 2
COMUNA: 12	
BARRIO: Simón Bolivar	

Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA, ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO: 7:00 Am	—
TERMINACIÓN: 3:00 Pm	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	
MAÑANA	Soleada.
TARDE	Soleada

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

- Se identifican los puntos para intervenir.
- Se hace instalación de la señalización, segun PMT.
- Demarcación, demolición y retiro del pavimento existente.
- Compactación de la base granular, para observar su estado.
- Se imprima las áreas con emulsión asfáltica en frio
- Aplicación y compactación de la mezcla asfaltica MDC-19 con RAP TIBIA, proveniente de la planta.
- Recogido de los escombros en la volqueta.
- Limpieza y aseo del area de trabajo
- Retiro de la señalización PMT.

observaciones: Se traslada la cuadrilla para la cl 9 cr 84 para atender mediatico.

Se reparancia al bache 4 y 5 para realizar nucleo

5. VISITANTES

Vanessa Vargas B. — Jorge Monsalve — Luisa Restrepo (social).

6. FIRMAS

NOMBRE: Vo. Bo. TECNÓLOGO CONTRATISTA	Henry Lopera Vo. Bo. TECNÓLOGO INTERVENTOR
FIRMA 229	FIRMA (Edwin D. Cruz A.)
NOMBRE: Edwin Rodriguez Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Septiembre 29/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA Si	ASISTENCIA No	EMPRESA DE VINCULACIÓN
1	Tecnólogo/Ingeniero	Jaime Vara	X	—	Vialmad
2	Encargado	—	—	—	—
3	Liguero	Laivar Enrique Padilla	X	—	E Y P
4	Rastrillero	Javier Monsal Soto	X	—	E Y P
5	Rastrillero	—	—	—	—
6	Ayudante	Simon Uran Jaramillo	X	—	E Y P
7	Ayudante	Cristian Alejandro Jimenez.	X	—	E Y P
8	Ayudante	Alvaro Antonio Mora.	X	—	E Y P
9	Ayudante	Jaime Ernay Carmona	X	—	E Y P
10	Ayudante	Luis Felipe Arbolada	X	—	E Y P
11	Ayudante	Hugo Rios.	X	—	E Y P
12	Ayudante		—	—	
13	Ayudante		—	—	
14	Ayudante		—	—	
15	Ayudante		—	—	
16	Operador Rodillo manual	Alvaro Antonio Mora	X	—	E Y P
17	Operador compresor	Misael Ortega	X	—	J Y H
18	Operador fresadora		—	—	
19	Operador finisher		—	—	
20	Operador Retroexcavadora		—	—	
21	Operador Vibrocompactador		—	—	
22	Operador Compactador llantas		—	—	
23	Operador Cortador Asfalto		—	—	
24	Operador Equipo Imprimación	Laivar Enrique Padilla	X	—	E Y P
25	Operador Mini cargador		—	—	
26	Operador Barredora		—	—	
27	Coductor Carrotanque		—	—	
28	Conductor Camión	William Colorado	X	—	Jose Hamid
29	Conductor Volqueta(s)	Hatao Arango	X	—	E Y P
30	Controladora vial	Ana Yadolanis Aguirre	X	—	E Y P
			—	—	
			—	—	
			—	—	
			—	—	

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN Si	OPERACIÓN No	NOVEDAD
1	Rodillo manual	Ecoroad EC 770	X	—	
2	Compresor	Ingersoll Rand.	X	—	
3	Fresadora		—	—	
4	Finisher		—	—	
5	Retroexcavadora		—	—	
6	Vibrocompactador		—	—	
7	Compactador llantas		—	—	
8	Cortador Asfalto		—	—	
9	Equipo Imprimación	Marmita	—	—	
10	Placa vibratoria	Honda FC 30	X	—	
11	Soplador		—	—	
12	Mini cargador		—	—	
13	Barredora		—	—	
14	Carrotanque		—	—	
15	Camión	Isuzu SZP 329	X	—	
16	Volqueta(s)	Internacional SMV 676	X	—	
17	Baño Movil	S y E	X	—	
	—	—	—	—	
	—	—	—	—	

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Septiembre 29/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES


SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
S005118	161891	1	CR 81 CL 370 - 3	2.45	0.75	0.08	1.84	0.15	0.35
S005118	161892	2A	CR 81 CL 370 75	3.20	1.74	0.11	3.65	0.40	0.96
S005118	161892	2B	CR 81 CL 37 75	2.95	0.75	0.11	2.21	0.24	0.58
S005118	161893	3	CR 81 CL 37-75 11M	1.00	0.75	0.10	0.75	0.08	0.18
S009001	161927	4A	CL 9 CR 84B - 44	1.70	1.48	0.10	2.52	0.25	0.60
S009001	161927	4B	CL 9 CR 84B - 44	0.50	0.60	0.10	0.30	0.03	0.07
S008999	154983	5	CL 9 CR 84C.	5.25	1.65	0.10	8.66	0.87	2.08
TOTALES							19.93	2.02	4.82

MEZCLA ASFALTICA					BOTADA DE ESCOMBROS				
REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)	REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
234255	SMV 676	4.82	—	140		SMV 676	Sencilla	1	Procopal

Powered by CamScanner

FECHA (D/M/A): Septiembre 29/2025

10. ESQUEMAS

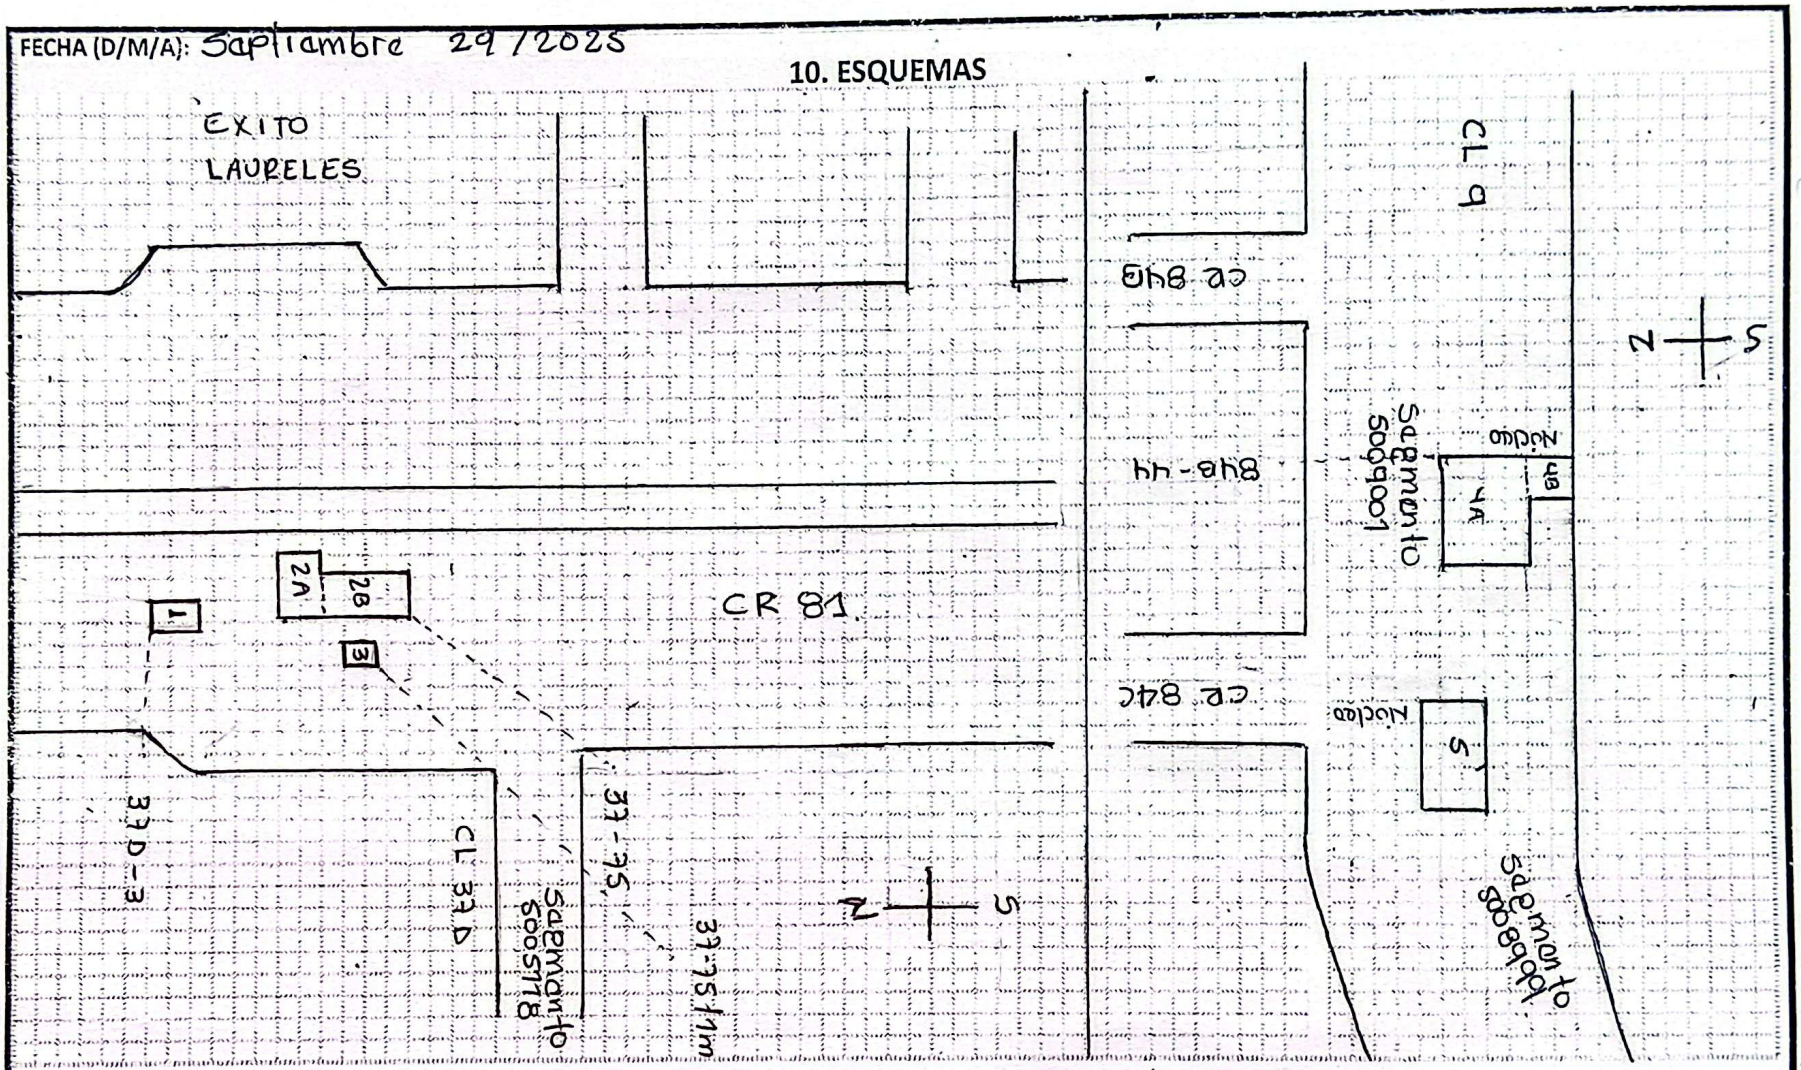

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Bachas	FRENTE	2
RANGO:	0	CANTIDAD:	4.82 Ton ✓
BARRIO	Simón Bolivar	DIRECCIÓN	CR 81 CL 37

Powered by CamScanner

ESTYP PAVOS

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratistas

PROCOPAL S.A.
DESPACHOS-BASCULA

TIQUETE DE BASCULA: 234255

FECHA: 29/09/2025

HORA: 7:59:54 AM

CONDUCTOR: MATEO ARANGO

PLACA: SMV676

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904388

PESO BRUTO: 12.24 Tonnes

PESO TARA: 7.42 Tonnes

PESO NETO: 4.82 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 1

TOTAL DESPACHADA: 4.82 Tonnes

Henry Lopera
Interventoria

Estructuras y Pavimentos S.A.S

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23771**

PROVEEDOR: SUM 2058

VALE POR UN VIAJE: Escombros

PLACA No: SMV676 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: Procopal

RECIBIDO POR:

24/9/25

PROCOPAL S.A.
30 SEP 2025
DESPACHOS-BASCULA

NOTA IMPORTANTE
Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia

Powered by CamScanner
