FECHA (D/M/A): 22/09/2025	BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Puntual		
RANGO:	1N	CANTIDAD:	10.00 Ton
ZONA	6	FRENTE DE TRABAJO:	4
COMUNA	16		
BARRIO	La Mota.		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:		JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO :	8:00 A.M	N/A
TERMINACIÓN:	6:00 P.M	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:		
	MAÑANA	Seco
	NOCHE ~~TARDE~~	Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalación de señalización vertical según PMT, cerramiento del sitio de intervención con balizas, malla, maletines y conos, Instalación de Flasher luminosos. Apoyo de auxiliar vial. Adecuación de Punto ecológico.
Marcación de baches a intervenir. Demolición y retiro de escombro, Compactación de material granular existente.
Imprimación con emulsión asfaltica en Frio.
- Instalación de mezcla MDG19 RAP Tibia, Planta de mezcla PROVIPAL.
- Compactación mecanica.
- Recolección de escombro y limpieza del area intervenida.
- Retiro de señalización y cerramiento.
- Sale 1 viaje de escombro, volqueta sencilla, lugar de disposicion Provipal.

5. VISITANTES

Cristian D. Cortes A.	

6. FIRMAS

NOMBRE: Mauricio Delgado Vallejo Mauricio Delgado Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Alejandra Arango Betancur Vo. Bo. TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE: Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	NOMBRE: Jose Luis Guzman. A Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 22/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Manuel Fernando Delgado Vallejo	x		
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona	x		
4	Rastrillero	Miguel Guerra	x		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Victor Mejia	x		
7	Ayudante	Leimar Pereda	x		
8	Ayudante	Alberto Suarez	x		
9	Ayudante	Delvi Pino	x		
10	Ayudante	Alejandro Ceballos Goez	x		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Carlos Ortega	x		
17	Operador compresor	Javier Ramirez Giraldo	x		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Daniel Hernandez	x		
29	Conductor Volqueta(s)	Giovani Castaño	x		
30	AUX. Vial.	Roth Mery Aguirre	x		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna LP 6500	x		
2	Compresor	KAESER C185	x		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	x		
10	Placa vibratoria	Honda	x		
11	Soplador	KAESER C185	x		
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TTT997 CHEVROLET	x		
16	Volqueta(s)	TJZ305	x		

FECHA (D/M/A): 22/09/2025

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES			Area	Vol	Ton
				L (m)	A (m)	e (m)	(m2)	(m3)	(kg)
2000714	161587	1A	DG75B CLZA-169	2.08	1.25	0.15	2.60	0.39	0.94
"	"	1B	"	1.35	1.95	0.15	2.63	0.39	0.95
5009050	156654	2	DG75B CLZA-71	0.90	6.16	0.15	5.54	0.83	2.00
5009050	156961	3A	DG75B CLZA-59	11.75	0.80	0.16	9.40	1.50	3.61
"	"	3B	"	1.20	1.50	0.16	1.80	0.29	0.69
2000913	153899	4	DG75B CLZA-29	0.75	6.70	0.15	5.03	0.75	1.81
TOTALES							27.00	4.16	10.00

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234109	TJZ305	10.00		140°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
234191	TJZ305	Sencilla	1	PROPAL

FECHA (D/M/A): 22/09/2025

10. ESQUEMAS

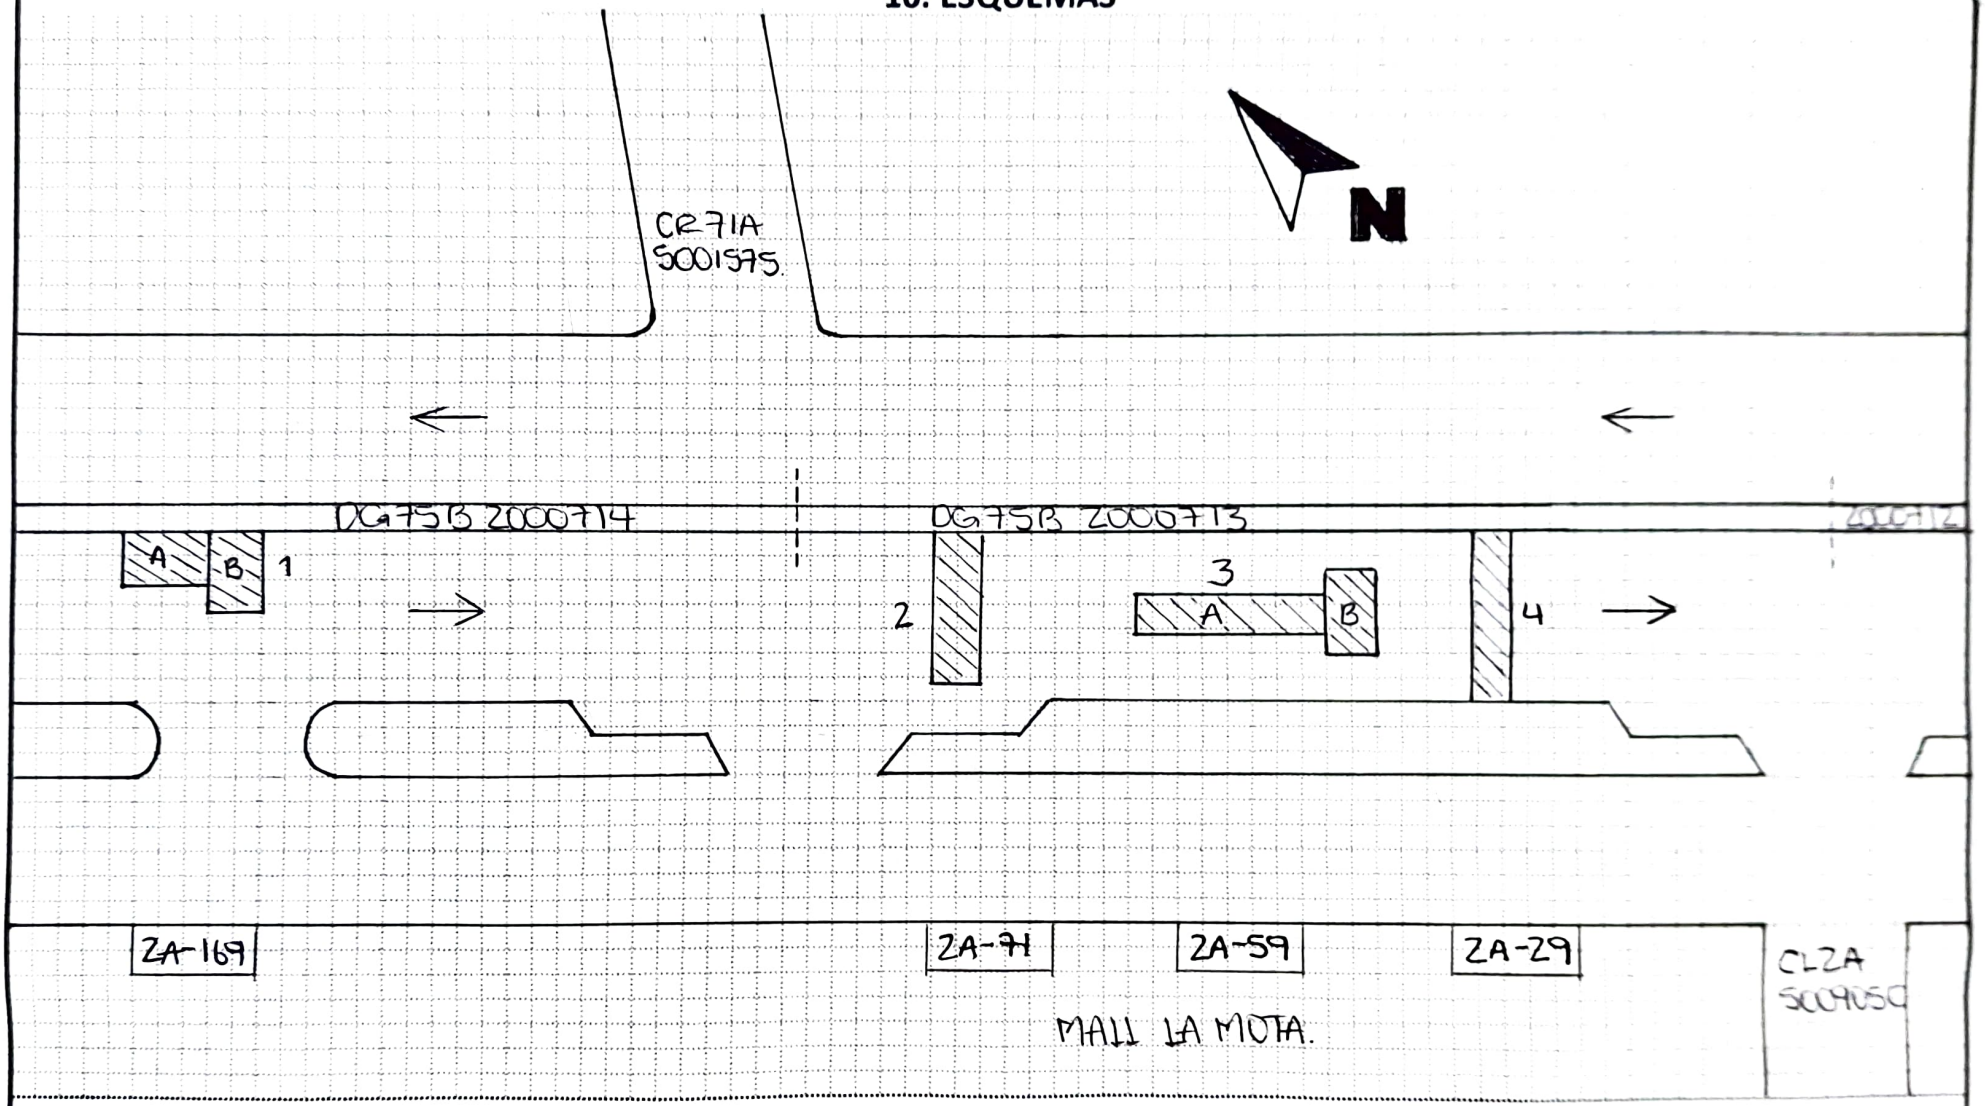

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	4
RANGO:	1 NOCTURNO	CANTIDAD:	10.00 Ton ✓
BARRIO	La Mota	DIRECCIÓN	DG 75B CL ZA CR 71A

PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 234109

FECHA: 22/09/2025

HORA: 6:32:36 PM

CONDUCTOR: HENRY PUERTA

PLACA: TJZ305

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAV MED

CLIENTE: 890904378

PESO [illegible] 03 Tonnes

8.03 Tonnes

[illegible]ZIO: 10.00 Tonnes

PRODUCTO:112

MEZ. DENSA TIBIA CON RAP MDC19

TEMPERATURA: 140°C

VIAJE NUMERO: 11

TOTAL DESPACHADA: 1[illegible]

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S

NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS **Nº 23191**

PROVEEDOR: Vialmed

VALE POR UN VIAJE: Estribo

22/09/25

PLACA No: TJZ 305 CAPACIDAD: 5 M3

DESTINO: proceso

RECIBIDO POR:

PROCOPAL S.A.

23 SEP 2025

DESPACHOS - BARRIO

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuel Delgado

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia
