FECHA (D/M/A): 23/09/2025

BITACORA DE OBRA

1. DATOS GENERALES

TIPO DE INTERVENCIÓN (POR RANGOS O ACTIVIDAD):	Mantenimiento Rutinal		
RANGO:	1 N	CANTIDAD:	10.02 Ton
ZONA	6	FRENTE DE TRABAJO:	4
COMUNA	16		
BARRIO	La Mota		

Alcaldía de Medellín
Ciencia, Tecnología e Innovación

REHABILITACIÓN , MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA , ASOCIADA

2. DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL MED 2025	CONTRATO No. 4600105052 DE 2025
INTERVENTORIA: CONSORCIO MEDURBANO 20005377	CONTRATO No. 4600105322 DE 2025

HORARIO DE LABORES:	JUSTIFICACIÓN HORAS EXTRAS:
INICIO : 8:00 P.m	N/A
TERMINACIÓN: 5:30 a.m	

3. REPORTE DEL ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA: Seco
	~~NOCHE~~ TARDE: Seco

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES

Instalación de señalización vertical segun PMT, cerramiento del sitio de intervención con balizas, malla, maletines y conos. Instalacion de Flasher luminosos. Se solicita contratista suministrar mas Flasher, los que hay son muy pocos y aparte estan en mal estado.
Adecuación de Punto ecologico. Marcación de baches a intervenir.
- Demolicion y retiro de escombro, compactacion de material granular existente. Imprimación con emulsión asfaltica en Frio.
Instalacion de mezcla MDC19 RAP Tibia, Planta de mezcla PROCOPAL.
- Compactación mecanica.
- Recolección de escombro y limpieza del area intervenida
- Retiro de señalizacion y cerramiento.
- Apoyo de 1 auxiliar vial.

5. VISITANTES

6. FIRMAS

NOMBRE: Manuel Delgado Vallejo Manuel Delgado.	Alejandra Franco Betancur
Vo. Bo. TECNOLOGO CONTRATISTA	Vo. Bo TECNOLOGO INTERVENTOR
FIRMA	FIRMA
NOMBRE:	NOMBRE: José Luis Guzmán.
Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE CONTRATISTA	Vo. Bo. INGENIERO RESIDENTE INTERVENTOR

FECHA (D/M/A): 23/09/2025

7. CONTROL DIARIO DE PERSONAL

No	CARGO	NOMBRE COMPLETO	ASISTENCIA		EMPRESA DE VINCULACIÓN
			SI	No	
1	Tecnólogo/Ingeniero	Manuel Fernando Delgado Vallejo	X		
2	Encargado				
3	Liguero	Carlos Carmona	X		
4	Rastrillero	Miguel Guerra	X		
5	Rastrillero				
6	Ayudante	Victor Mejia	X		
7	Ayudante	Leimar Perea	X		
8	Ayudante	Alberto Suarez	X		
9	Ayudante	Deivi Pino	X		
10	Ayudante	Alejandro Caballos Goez	X		
11	Ayudante				
12	Ayudante				
13	Ayudante				
14	Ayudante				
15	Ayudante				
16	Operador Rodillo manual	Carlos Ortega	X		
17	Operador compresor	Javier Ramirez Giraldo	X		
18	Operador fresadora				
19	Operador finisher				
20	Operador Retroexcavadora				
21	Operador Vibrocompactador				
22	Operador Compactador llantas				
23	Operador Cortador Asfalto				
24	Operador Equipo Imprimación				
25	Operador Mini cargador				
26	Operador Barredora				
27	Coductor Carrotanque				
28	Conductor Camión	Daniel Hernandez	X		
29	Conductor Volqueta(s)	Giovani Castaño	X		
30	Aux Vial	Ruth Mery Aguirre	X		

8. MAQUINARIA Y EQUIPO

No	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	DESCRIPCIÓN (MARCA-REFERENCIA-MODELO)	OPERACIÓN		NOVEDAD
			Si	No	
1	Rodillo manual	Husqvarna IP6500	X		
2	Compresor	KAESER CI85	X		
3	Fresadora				
4	Finisher				
5	Retroexcavadora				
6	Vibrocompactador				
7	Compactador llantas				
8	Cortador Asfalto				
9	Equipo Imprimación	Marmita	X		
10	Placa vibratoria	Honda	X		
11	Soplador	KAESER CI85	X		
12	Mini cargador				
13	Barredora				
14	Carrotanque				
15	Camión	TTT997 CHEVROLET	X		
16	Volqueta(s)	IJZ305	X		

FECHA (D/M/A): 23/09/2025.

9. CALCULO DE CANTIDADES

SEGMENTO	CONSECUTIVO HUECOS MED	FIGURA No.	DIRECCIÓN	DIMENSIONES L (m)	DIMENSIONES A (m)	DIMENSIONES e (m)	Area (m2)	Vol (m3)	Ton (kg)
5009050	161658	1A ✓	DG75BCL2A -3.00m	1.80	1.75	0.135	3.15	0.43	1.02
"	"	1B ✓	"	3.75	1.87	0.135	7.01	0.95	2.27
5009050	161659	2 ✓	DG75BCL2A -17.00m	3.80	1.77	0.13	6.73	0.89	2.10
2000712	149618	3 ✓	DG75BCL2-132	12.60	0.85	0.18	10.71	1.93	4.63
TOTALES							27.60	4.17	10.02 —

MEZCLA ASFALTICA


REMISIÓN No	PLACA VOLQ	CANT (TON)	ACUM (TON)	TEMP (°C)
234135 ✓	TJZ305	10.02 ✓		142°

BOTADA DE ESCOMBROS

REMISIÓN No	PLACA VOLQ	TIPO (DOBLE/SENCILLA)	No VIAJES	SITIO DISPOSICIÓN
23192 ✓	TJZ305	sencilla	1 ✓	Procopal ✓

FECHA (D/M/A): 23/09/2025

10. ESQUEMAS

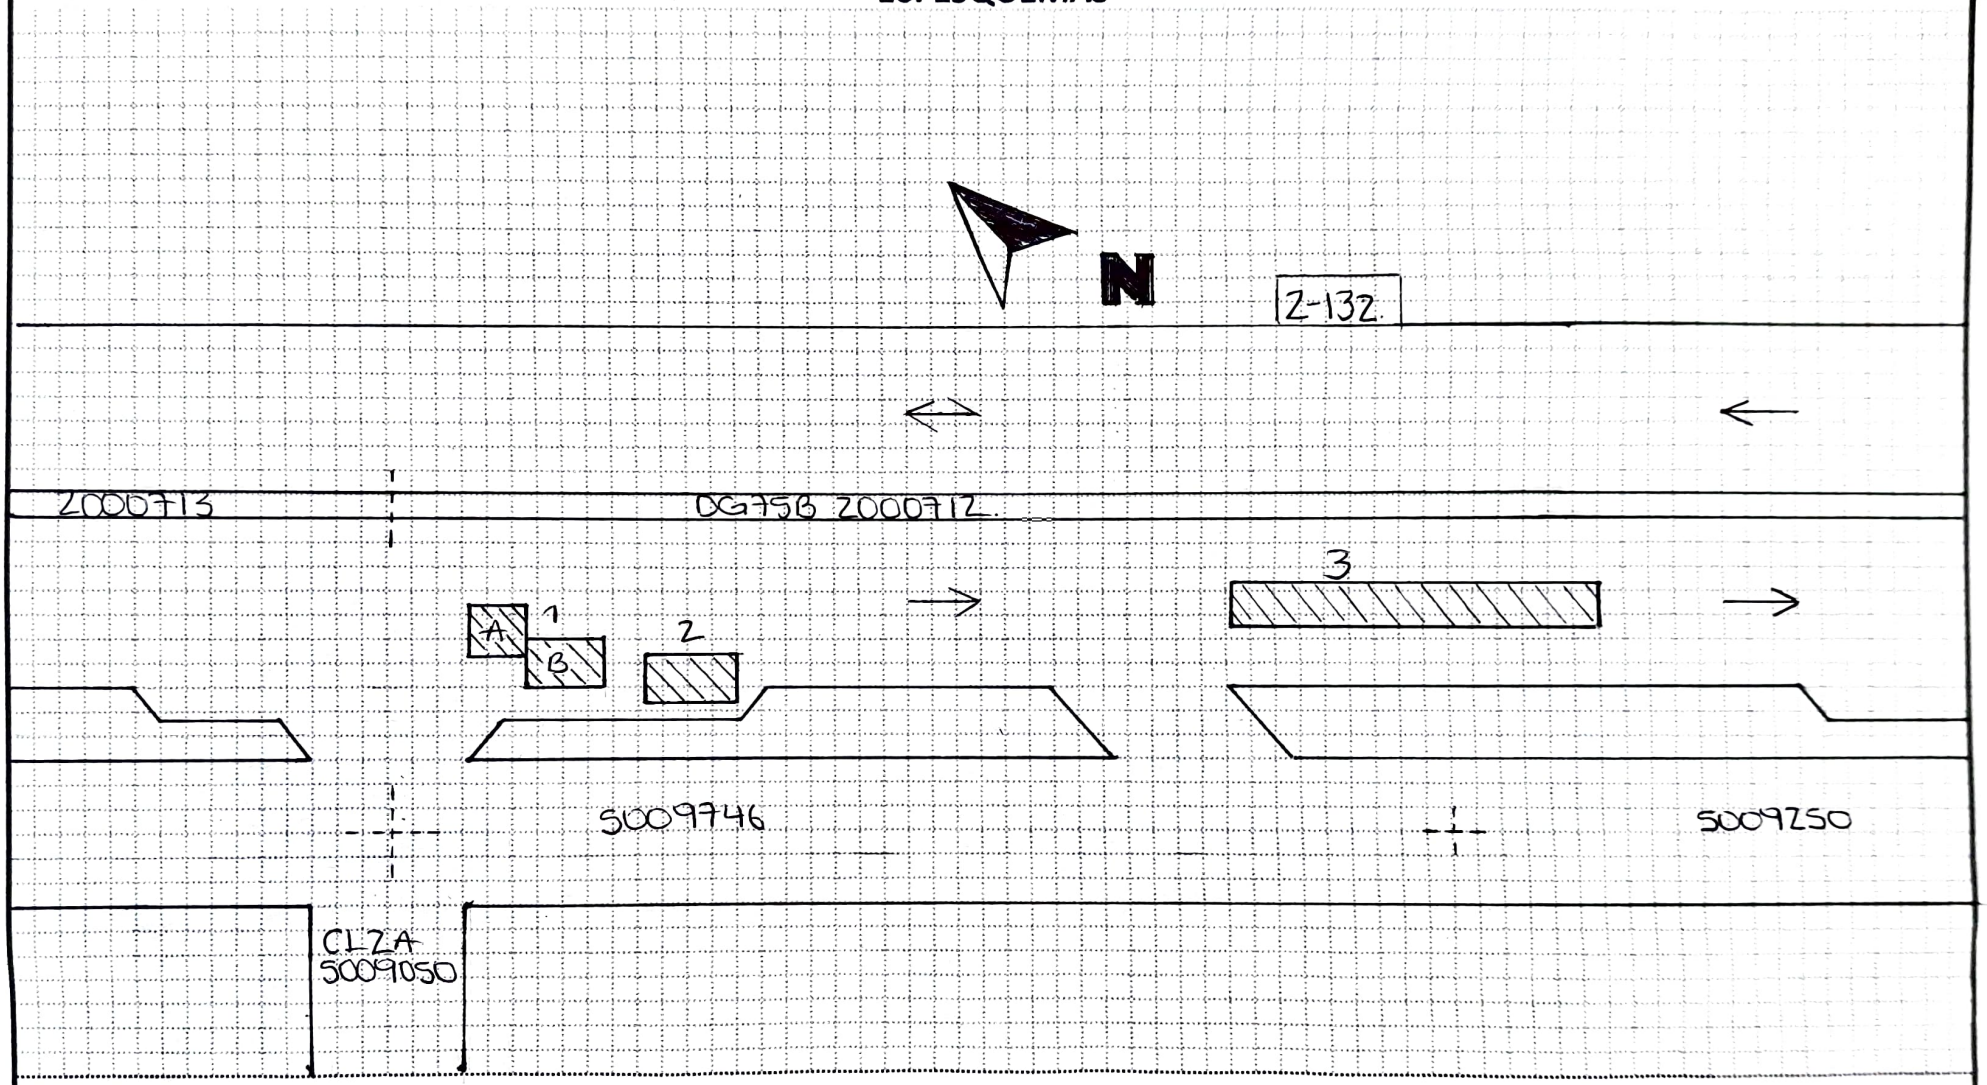

TIPO DE INTERVENCIÓN:	Mantenimiento Puntual	FRENTE	4
RANGO:	1 NOCTURNO	CANTIDAD:	10.02 Ton.
BARRIO	La Mota.	DIRECCIÓN	DG75B CLZA CLZ.



PROCOPAL S.A.

Ingenieros Contratista

TIQUETE DE BASCULA: 23135

FECHA: 23/09/2025

HORA: 6:32:25 PM

CONDUCTOR: HENRY PUERTA

PLACA: TJZ305

OBRA: 2307

SUMIN.MEZ ASF. ESTRUC. PAVIMENTO

CLIENTE: 890904

PESO BRUTO: 18.12 Ton

PESO TARA: 8.10 Ton

PESO NETO: 10.02

PRODUCTO: 112

MEZ. DENSA TIPIA CONFORME

TEMPERATU

VIAJE N

TOTA

Estructuras y Pavimentos

ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S
NIT: 900.243.322-4

SOLICITUD DE MATERIALES GRANULADOS Nº 23192

PROVEEDOR: Cmed

VALE POR UN VIAJE: Escombro

PLACA No: TJZ 303 CAPACIDAD: 3 M3

DESTINO: procopal

23/09/25

PROCOPAL S.A.

24 SEP 2025

DESPACHOS - BASCULA

RECIBIDO POR:

NOTA IMPORTANTE

Para efectos de liquidación, este recibo no será aceptado si tiene enmendaduras o borrones.

Manuel Delgado

Firma Autorizada

Calle 10 Sur N° 50FF-28 Tel: 3615450 - Medellín/ Colombia
